FUENTES DE MATERIALES.



PLA DE MANEJO DE TRAFICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA PARA LOS PRIMEROS 5 KM DESDE EL CRUCE CON LA RUTA 45 DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DEPARTAMENTO DE SANTANDER


AÑO 2020

A continuación, se describe la ubicación y distancia de las principales fuentes de materiales que se proponen para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la via secundaria para los primeros 5 Km desde el cruce con la ruta 45 del municipio de Puerto Wilchez Departamento de Santander”:


- Para el suministro de los materiales pétreos tales como: Arena, triturado, cemento hasta el municipio de puerto wilchez el cual esta ubicado de la obra a 47 Km.



- El material para terraplén (bolo de rio) y la base granular necesarias para el desarrollo del proyecto se suministrará desde la planta de procesamiento de materiales AVENSA, la cual se encuentra a 20 Km del proyecto.

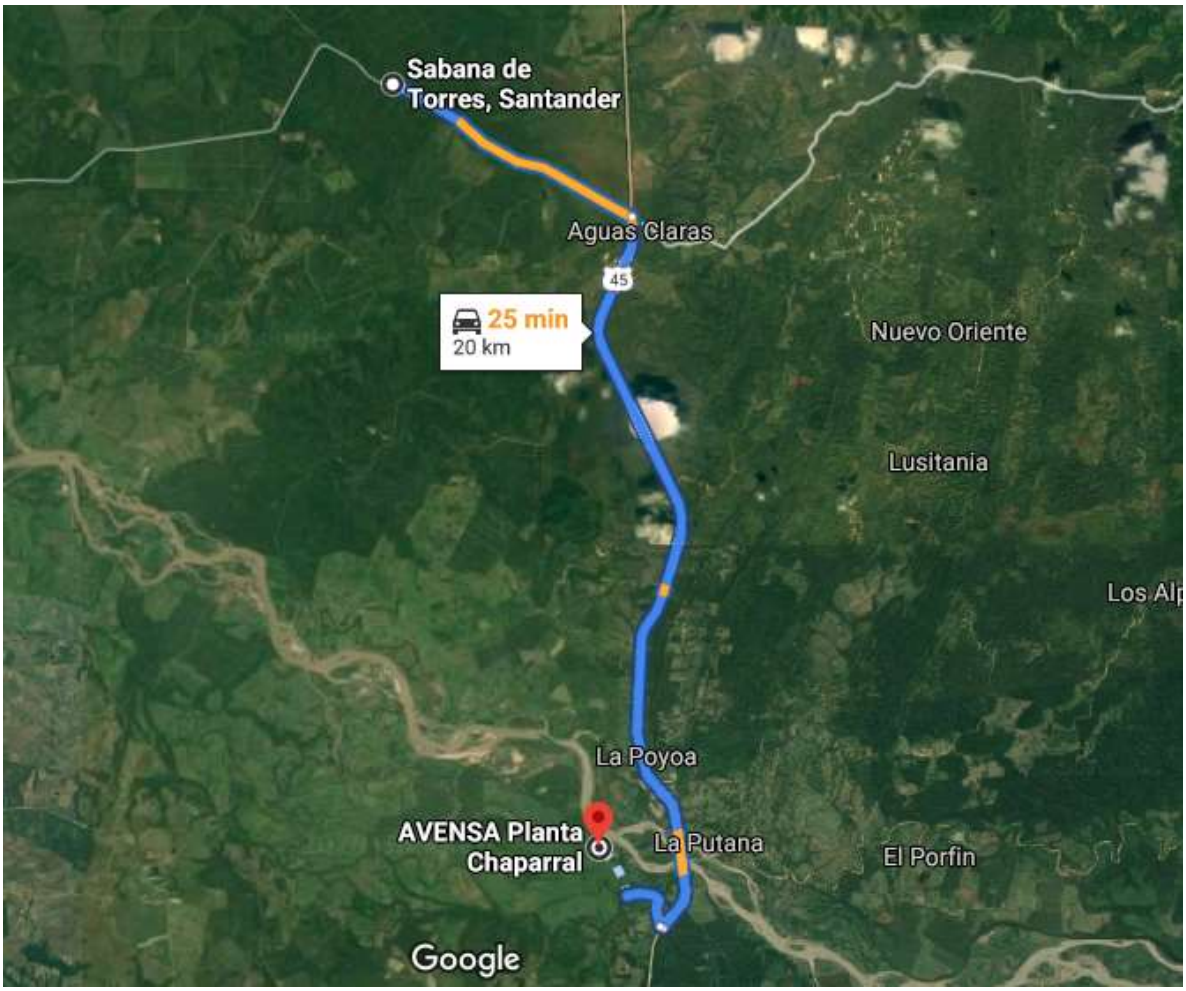

- El suministro de mezcla densa en caliente MDC 19 y MDC 25 necesaria para realizar la actividad de pavimentación de los 4.8 Km del proyecto se suministrará de la planta de asfalto ASA S.A.S que se encuentra a 26.5 Km del proyecto.

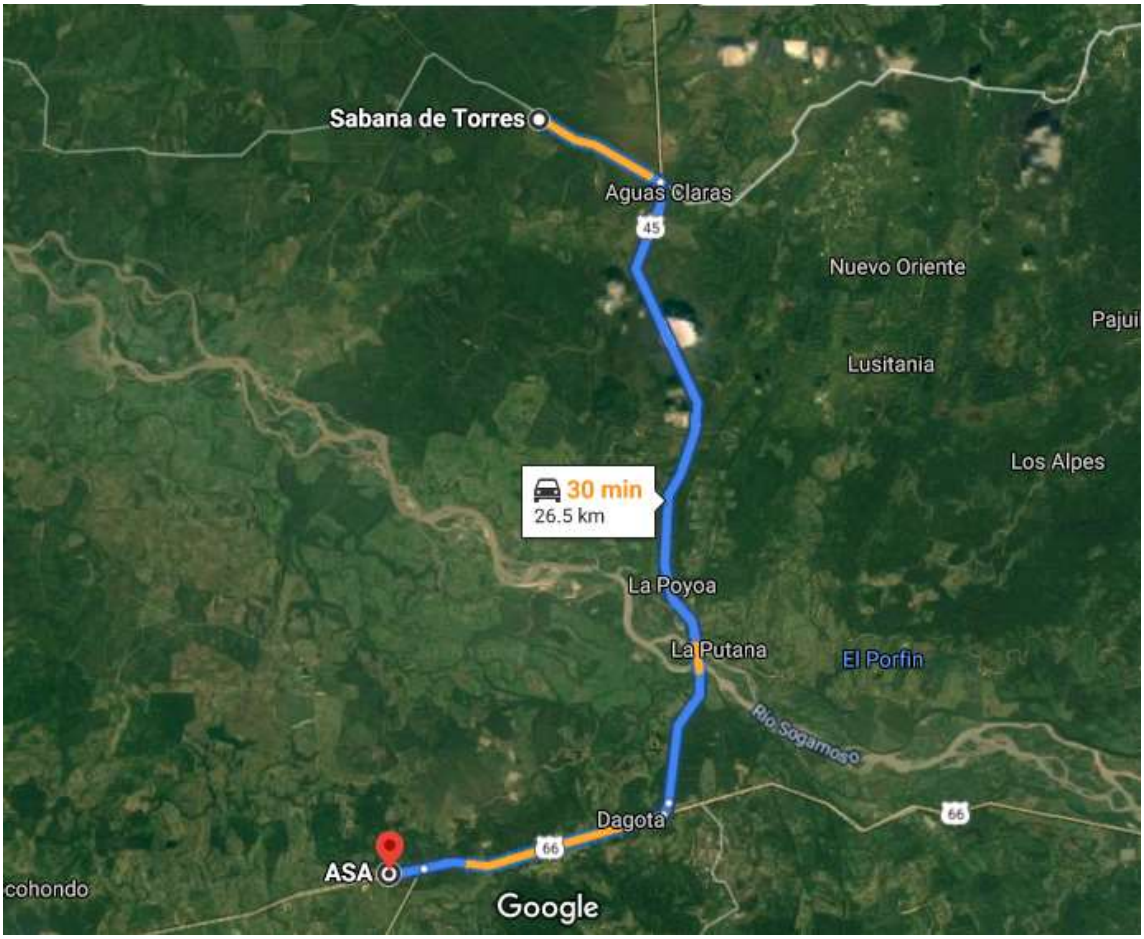

- La distancia al sitio de disposición de materiales se encuentra a una distancia aproximada de 20 Km, del proyecto.



Denis Yineth Piño Mariño
MAT. PROFESIONAL No 01117-10920
Ingeniera en Transporte y Vías.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción.
Universidad Santo Tomas Tunja.
