CONSTRUCCIONES S.A.S
Alta tecnología para Colombia y el mundo

Al contestar cite Radicado: R-00268-202101776-UAECOB Id: 81316
Folios: 468 Fecha: 2021-05-20 15:22:03
Anexos: 1 CD/DVD
Remitente : G Y G CONSTRUCCIONES SAS - GUSTAVO E GIL GARAY
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Bogotá D.C, 19 de Mayo de 2021

INTER-BOMBEROS 258-2021

Señores:
SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
Contratista Grupo Infraestructura
Subdirección de Gestión Corporativa
UAECOB
satuesta@bomberosbogota.gov.co

REF: UAECOB-CONTRATO 627 DE 2020 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIONES Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C",

Asunto: Remisión factura Mes # 5 ZONA NORTE

Cordial Saludo.

Muy respetuosamente remitimos a usted documento del asunto mencionado con sus respectivos anexos, según clausulado del contrato UAECOB-CONTRATO 620-2020, Informe Mensual de avance y seguimiento de obra

- Acta de corte # 5 con sus respectivas memorias
- Cuadro de control
- Certificación correcto equilibrio de la ecuación económica del contrato
- Informe mensual incluye componente ambiental y siso
- Certificación cumplimiento ofrecimiento personal conforme a la propuesta
- Certificación R.C.D producto de las labores
- Formato de vigencia y correcta cobertura de las garantías contractuales
- Formato informe de ejecución
- Factura electrónica # 40 por valor de $ 104.101.777.54
- Certificación de pago de parafiscales

	Realizó:	Revisó:	Aprobó:	Página:		No. Anexos:
Nombre:	J.S.M	B.P.O	G.E.G	1 de 2	Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA / CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Por nuestra sociedad	
Firma:						
Cargo:	Residente Interventoría	Departamento Jurídico	Director de Interventoría			FOLIOS

- Fotocopia de la tarjeta profesional Contadora Nuredy Galeano
- Vigencia contadora Nuredy Galeano vigente
- Fotocopia de la cedula contadora Nuredy Galeano
- CD – soporte magnético

Cordialmente;

GUSTAVO E GIL GARAY
Director de Interventoría
GyG Construcciones S.A.S

MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. 8.798.107 de Galapa (ATL)

INFORME MENSUAL 5 DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE OBRA.

CONTRATO -620-2020

27 DE FEBRERO DEL 2021 AL 26 DE MARZO

2021

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIONES Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C."

MAURICIOPABA • INGENIERÍA CIVIL

Calle 21 #11-50 Interior 6 Manzana C
Los Alcaparros Chía – Cundinamarca
Teléfonos: 8855544 – 8855445 – 3153332792
E-mail: admon@esfuerzovertical.com

1. INTRODUCCIÓN

La empresa **MAURICIO PABA – INGENIERÍA CIVIL**, Realizara el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, adecuaciones y mejoras a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

Este mantenimiento estará enfocado en la denominada componente norte que comprende las siguientes estaciones y dependencias; B-1, B-4, B-6, B-6, B-7 estación antigua, B-7 estación actual, B-12 B-13, B-14, B15 y EDIFICO COMANDO.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LUMINARIAS, TOMAS ELECTRICAS E INTERRUPTORES)

2.1.1. Este proceso consiste en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, que incluyan: iluminación, redes normal y regulada, salidas eléctricas normales y reguladas, tableros eléctricos y plantas eléctricas, avisos luminosos, lámparas ultravioletas, estufas eléctricas y de gas, tableros de protección y baja tensión y redes internas en general, atendiendo a las políticas ambientales de la unidad en lo relacionado con la instalación paulatina de elementos ahorradores o de bajo consumo.

En el caso de luminarias, esta actividad incluye el desmonte, limpieza de lámparas y/o balas, revisión del estado de tubos fluorescentes, especulares, reposición de tubos, cambio de balastro (si se requiere) reparación de conexionado de lámparas con cambio de cableado, comprobación del estado del sistema, rearmado del sistema, probar el encendido y reinstalación de la lámpara; independización del circuito eléctrico según necesidad (incluye cable, break, interruptor y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento).

2.2. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.

2.2.1. Este proceso consiste en el mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, que comprenden redes de agua potable, redes sanitarias, redes de agua lluvia, sanitarios, lavamanos, orinales, lavaplatos, sifones de piso, tanques de almacenamiento. En el caso de requerirse el cambio de algún aparato o accesorios hidráulicos, estos deberán ser reemplazados por elementos de bajo consumo o ahorradores disponibles en el mercado previa aprobación de la interventoría y de la supervisión del contrato.

2.3. CERRAJERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA, DE MADERA Y PUESTOS DE TRABAJO.

2.3.1. Este proceso consiste en el mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento de: puertas, ventanas, chapas, divisiones modulares o

prefabricadas, mobiliario de oficina que comprende: escritorios gabinetes archivadores, mesas bibliotecas, archivos, estantes, sillas, movimiento o traslado o reubicación de puesto de trabajo (incluye el traslado de las redes eléctricas, voz y datos).

2.4. PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA

2.4.1. Este proceso consiste en el mantenimiento en perfecto estado de pintura muros, cielos rasos, carpintería metálica y de madera, fachadas, cubiertas. La pintura es uno de los elementos que sufre un alto nivel de deterioro en las instalaciones de la Entidad, se debe tener claro que el mejor mantenimiento es el que evita la agresión que suelen sufrir los muros y paredes debido a la acción de los usuarios y elementos que se utilizan cotidianamente en las sedes que generan que se deteriore con facilidad.

2.5. PISOS

2.5.1. Se realizará por parte del contratista un recorrido de reconocimiento y evaluación del estado de los pisos de las diferentes sedes de la UAECOB, con el fin de obtener como resultado la valoración de cada una de las áreas y así programar por sedes la ejecución de la actividad, los pisos pueden ser de baldosas, cerámicas, de arcilla (rojos), pinturas epóxicas, hormigón o adoquines, entre otros.

2.6. CIELO RASO

2.6.1. Para la realización de esta actividad se deben tener en cuenta varios aspectos, los cuales dependen del tipo de cielo raso al que se vaya a intervenir, entre los cuales se encuentran:

2.6.1.1. **Cielo raso en fibra mineral:** Se debe realizar la verificación técnica de la estructura metálica (perfilería) que soporta los módulos, anclajes de techo y muro, tensores de la perfilería y los módulos de fibra mineral, los cuales deben ser valorados según su estado, si se encuentran en estado bueno. Regular, se pueden recuperar y pintar para dejarlo habilitado de nuevo, si su estado es regular –malo se debe hacer el cambio de la pieza por una nueva de iguales características que las existentes.

2.6.1.2. **Cielo Raso en Dry Wall, PVC o plano**: Se realizará la verificación técnica del estado de su estructura, juntas de dilatación y pintura, se deberá evaluar si existen grietas que puedan afectar la estabilidad del cielo raso, si fuere necesario se deberá desmontar y armar nuevamente dejándolo en buen estado. Si se presentan humedades se debe verificar de donde

proviene y debe ser corregida, evaluando si el cielo raso necesita cambio o solo mantenimiento y pintura.

2.7. CUBIERTAS DE LAS EDIFICACIONES.

Verifica y realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de la cubierta plana (cubiertas en concreto) o cubiertas de teja de cualquier material teniendo en cuenta la corrección de goteras fisuras o el cambio del flanches, terminaciones o remates.

2.8. EDIFICIO COMANDO

2.8.1. Dentro de las dependencias a intervenir se encuentra el edifico comando como sede administrativa del cuerpo Oficial De Bomberos De Bogotá para tal fin se lista las siguientes actividades a desarrollar de acuerdo los requerimientos vistos en campo y a solicitud de los departamentos de infraestructura correspondiente.




2.8.1.1. PINTURA GENERAL COMANDO

Descripción: 3.4.1. Este proceso consiste en el mantenimiento en perfecto estado de pintura muros, cielos rasos, carpintería metálica y de madera, fachadas, cubiertas. La pintura es uno de los elementos que sufre un alto nivel de deterioro en las instalaciones de la Entidad, se debe tener claro que el mejor mantenimiento es el que evita la agresión que suelen sufrir los muros y paredes debido a la acción de los usuarios y elementos que se utilizan cotidianamente en las sedes que generan que se deteriore con facilidad.

5.11	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco. Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	M2	1033.77

MAURICIOPABA .
INGENIERÍA CIVIL

MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. 8.798.107 de Galapa (ATL)

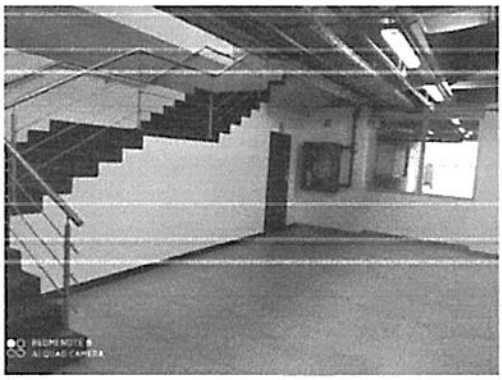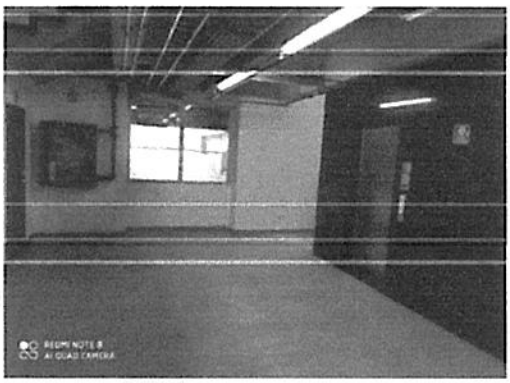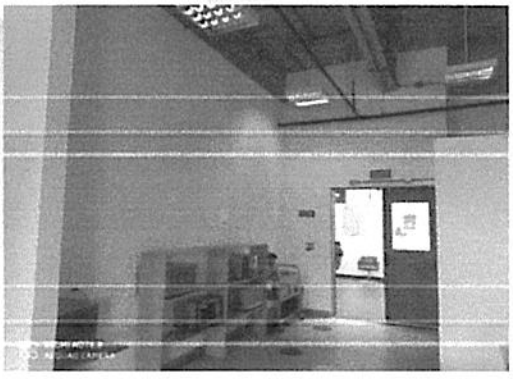ANTES	DESPUÉS
	
	


MAURICIOPABA • INGENIERÍA CIVIL

Calle 21 #11-50 Interior 6 Manzana C
Los Alcaparros Chía – Cundinamarca
Teléfonos: 8855544 – 8855445 – 3153332792
E-mail: admon@esfuerzovertical.com

2.8.1.1.1. **Silicona perimetral para ventaneria**

Descripción: consiste en la instalación de silicona en el contorno de la ventaneria costado occidental para evitar la filtración de agua.

NP20	Silicona perimetral para ventaneria	ML	250.50

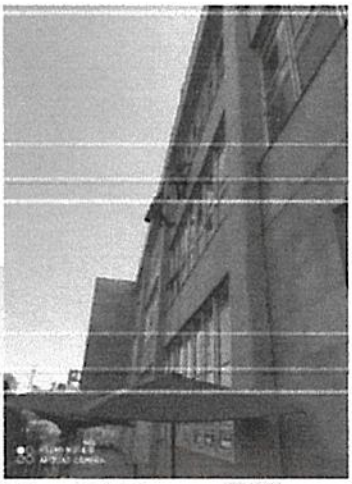ANTES	DESPUÉS
	

2.9. ESTACIÓN PUENTE ARANDA B-4




2.9.1. Dentro de las dependencias a intervenir se encuentra la estación de Puente Aranda B-4 para tal fin se lista las siguientes actividades a desarrollar de acuerdo los requerimientos vistos en campo y a solicitud de los departamentos de infraestructura correspondiente.

Dentro de las dependencias a intervenir se encuentra el BRAE (BUSQUEDA RESCATE ANIMALES EN EMERGENCIA) espacio para el desarrollo de cirugías menores y salvamento de animales.


5.3	Reposición pintura en esmalte sintético, alta calidad (2 manos) para carpintería metálica sobre lámina llena. Incluye lijada y aplicación 2 manos de pintura anticorrosivo si se requiere, remates lineales y color indicado.	M2	102.23
5.10	Suministro y aplicación de pintura tráfico para sala de maquinas, parqueaderos alta calidad (2 manos).	M2	181.47
6.3	Reposición Porcelanato gris Tipo Cemento 60 X 60 ANTIDESLIZANTE. Incluye alistado de piso impermeabilizado si se requiere y pegacor o similar, remates lineales y corte de piezas con máquina.	M2	38.02
6.4	Reposición enchape muro blanco 25 x 35. Incluye desmonte tableta existente y mortero de pega y alistado de piso si se requiere, cargue y retiro de escombros a botadero, remates lineales y cortadora de ladrillo.	M2	30.68
6.6	Reposición guardaescobas h = 0.08 m en cerámica. Incluye corte a máquina y pegacor o similar.	ML	38.99
.8.17	Reposición de ventana metálica de 80x90 cm., lámina cold rolled, incluye marco con lámina cold rolled calibre 18 para hoja pasador para candado, tornillos de anclajes y mano de obra	UN	5.00
.8.18	Reposición de ventana metálica de 40x40 cm., lámina col rolled, incluye marco con lámina cold rolled calibre 18 para hoja pasador para candado, tornillos de anclajes y mano de obra	UN	1.00
.10.19	Reposición tubería sanitaria PVC 2". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	ML	3.20
.10.20	Reposición tubería sanitaria PVC 3". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	ML	2.78
.10.21	Reposición tubería sanitaria PVC 4". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	ML	10.05
.10.30	Reposición red de suministro tubería PVC presión 3/4". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	ML	13.66
.10.33	Reposición red de suministro CPVC 1/2". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	ML	11.20
NP21	Suministro e instalación de muros en Super Board 6MM a dos (2) Caras	M2	9.65
NP22	Suministro e instalación de muros en Super Board 6 MM a una cara incluye Frescasa	M2	103.04
NP23	Fabricación e instalación de escaleras para acceso a los contenedores, con 3 huellas de 30 cm, contrahuellas de	UN	3


MAURICIOPABA • INGENIERÍA CIVIL


	16.6 cm en lamina alfajor 1/8 con estructura interna en tubo cuadrado de 1 1/2" Cal 16 con acabado en pintura electroestatica.		
NP25	Suministro e instalación de concreto 3000 psi para zapatas	M3	5.01
NP27	Fabricación e instalación de puerta sencilla en lamina Coll Rod calibre 18 y terminación en pintura (2.00 x 1.00)	UN	3

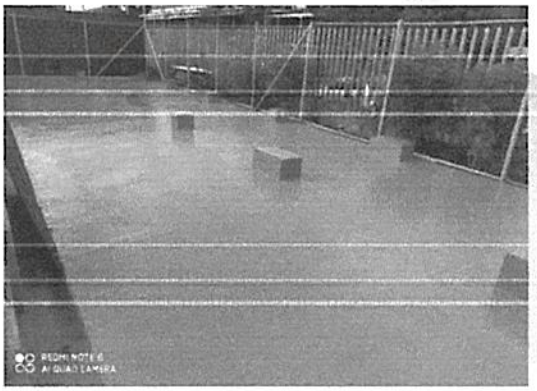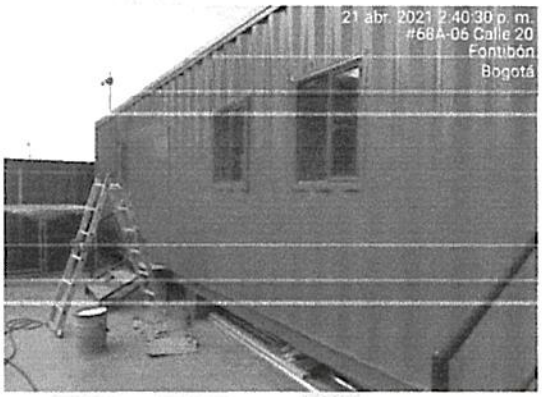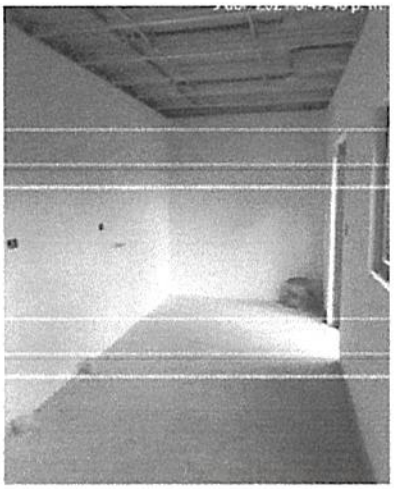
ANTES	DESPUÉS
	
	


MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. 8.798.107 de Galapa (ATL)

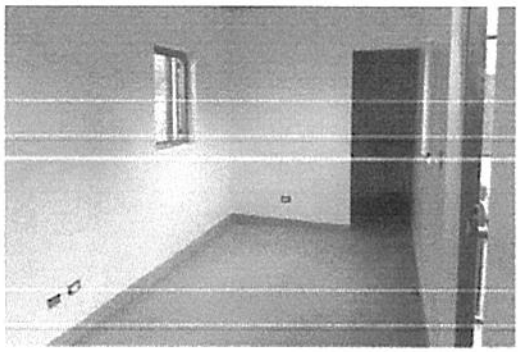

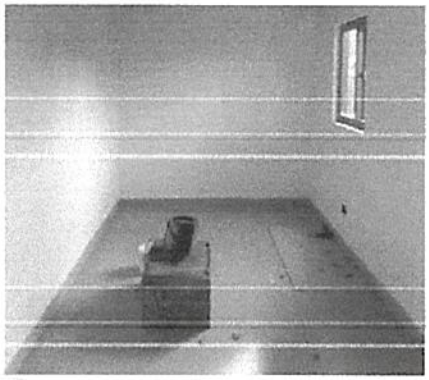


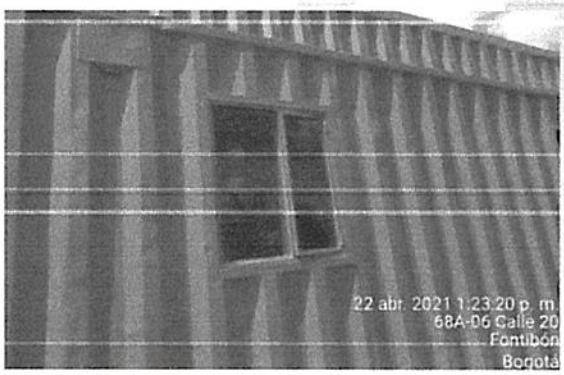

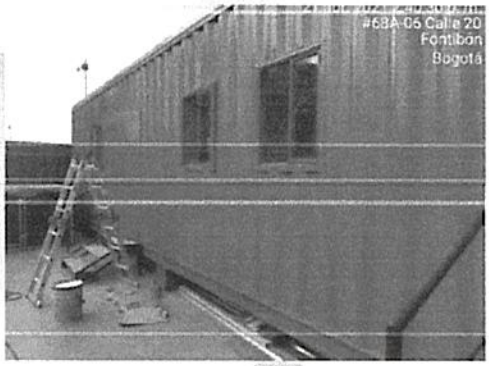







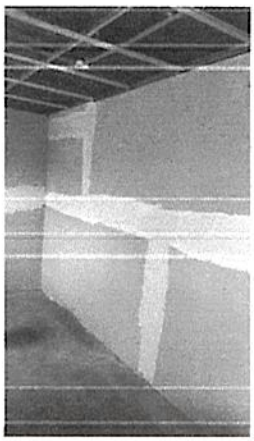



Calle 21 #11-50 Interior 6 Manzana C
Los Alcaparros Chía – Cundinamarca
Teléfonos: 8855544 – 8855445 – 3153332792
E-mail: admon@esfuerzovertical.com


MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. 8.798.107 de Galapa (ATL)

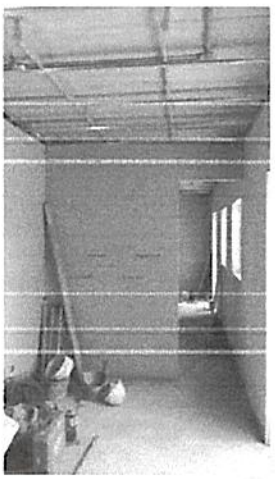

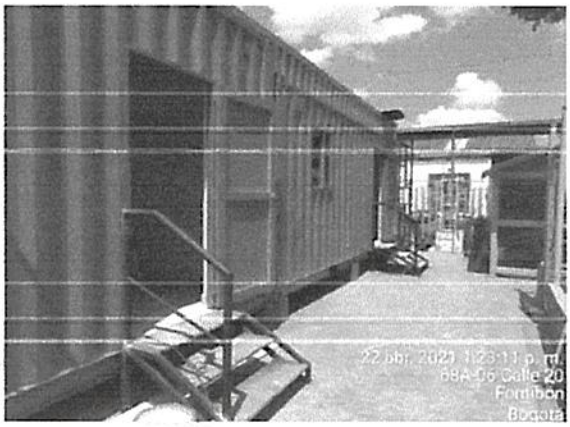

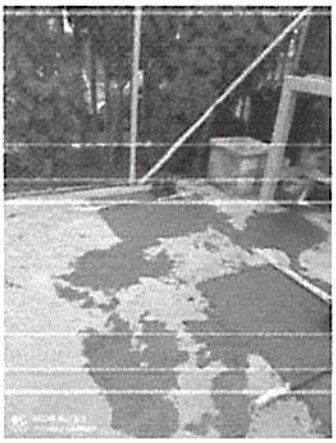

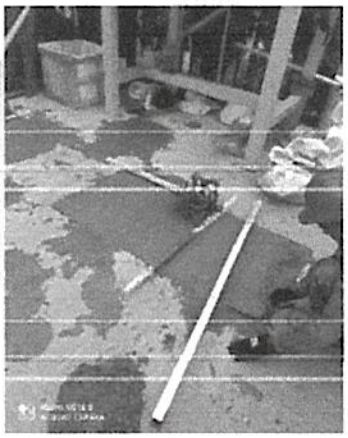

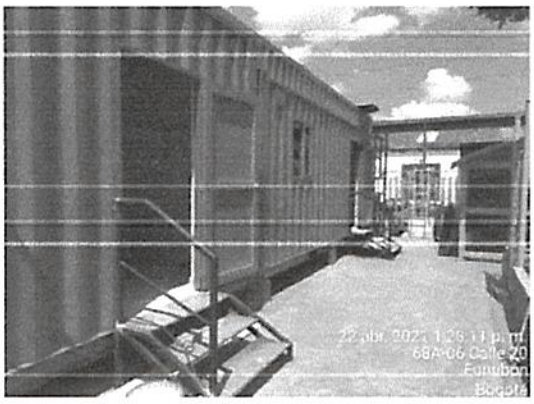

Calle 21 #11-50 Interior 6 Manzana C
Los Alcaparros Chía – Cundinamarca
Teléfonos: 8855544 – 8855445 – 3153332792
E-mail: admon@esfuerzovertical.com


2.10. ESTACIÓN CAOBOS SALAZAR

2.10.1. Dentro de las dependencias a intervenir se encuentra la estación de CAOBOS SALAZAR B-13 para tal fin se lista las siguientes actividades a desarrollar de acuerdo los requerimientos vistos en campo y a solicitud de los departamentos de infraestructura correspondiente.

2.11. Construcción Placa Estación Caobos Salazar

1.12	Excavación manual. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.	M3	57.33
1.13	Relleno en material granular seleccionado tipo Recebo B-200. Incluye extendida y compactación con equipo vibrocompactador.	M3	33.56
3.7	Reconstrucción caja de inspección en ladrillo recocido entre 0.80 x 0.80 y 1.00 x 1.00 m. Incluye demolición placa de concreto, descapote, excavación y adecuación trampa de sólidos y/o desarenador si se requiere, aplicación pañete 1:3 impermeabilizado,	UN	1
.10.18	Reposición punto sanitario PVC 4". Incluye desmonte punto existente, excavación, relleno y reposición accesorios.	UN	2.00
.10.21	Reposición tubería sanitaria PVC 4". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	ML	33.0
.10.24	Reposición punto hidráulico agua fría PVC RDE-21 de 1/2". Incluye desmonte punto existente y reposición accesorios.	UN	1.00
.10.29	Reposición red de suministro tubería PVC presión 1/2". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	ML	21.5
NP26	Suministro e instalación de sistema de presión 2 bombas 1 tanque 200 lt	UN	1

MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. 8.798.107 de Galapa (ATL)

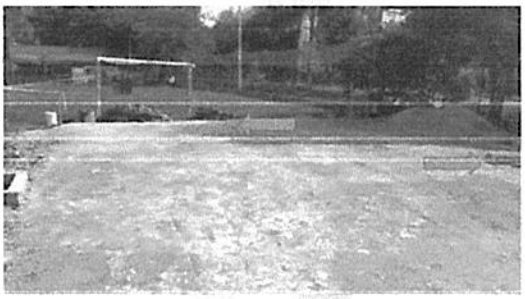ANTES	DESPUÉS
	
	
 	

MAURICIOPABA • INGENIERÍA CIVIL

Calle 21 #11-50 Interior 6 Manzana C
Los Alcaparros Chía – Cundinamarca
Teléfonos: 8855544 – 8855445 – 3153332792
E-mail: admon@esfuerzovertical.com

3. ESTIMACIÓN DE COSTOS

3.1. Descripción

3.1.1. El presupuesto de obra se generó en base al contrato tomando los ítems contractuales que se acoplaran las actividades requeridas en cada uno de los requerimientos de la entidad y ya que este presupuesto en una bolsa de mantenimiento no se tiene unas cantidades iniciales fijas pero si un tope presupuestal.

El presupuesto inicial se toma de las actividades contractuales más los adicionales de obra u obras no previstas las cuales se enviaran los análisis de precios unitarios (A.P.U.) para revisión y aprobación por parte de interventoría.
Ver anexo 1 (Presupuesto De Obra)

.

4. ACTA MENSUAL DE OBRA

4.1. Descripción

En el cual se debe incluir el detalle del valor del acta mensual (que será el producto de las cantidades efectivamente ejecutadas en el período, multiplicadas por los precios unitarios pactados), con los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU´s) debidamente aprobados por el interventor de la obra.

5. ANEXOS

Ver anexo 1 (Acta De Obra 5)
Ver anexo 2 (Cuadro control 5)

ACTA PARCIAL DE OBRA N°5 - CONTRATO DE OBRA N° UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, adecuaciones y mejoras a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: MAURICIO RAFAEL PAVA PINZON C.C. N°: 6.798.107 Galapa REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO RAFAEL PAVA PINZON C.C. N°: 6.798.107 Galapa

INTERVENTORIA: GyG Construcciones S.A.S NIT: REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR C.C. N°:

	LOCALIZACION	BOGOTA D.C.				VALOR ADICIONAL	$			FECHA DE INICIO: 27 OCTUBRE 2020						FECHA DE FINAL: 26 ABRIL 2021				
																PERIODO FACTURADO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2021 AL 26 DE MARZO DEL 2021				
	VALOR INICIAL	$ 800.000.000				VALOR FINAL														
		VALOR TOTAL A PAGAR					$													104,101,777.54
							EDIFICIO COMANDO			ESTACION B-4 PUENTE ARANDA			ESTACION B-13 CAOBOS			EJECUTADO CONTRACTUAL CORTE 5			EJECUTADO CONTRACTUAL TOTAL		
1	PRELIMINARES						CORTE 5			CORTE 5			CORTE 5			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	VR. UNITARIO	VR. BALANCE	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	VR. UNITARIO	VR. BALANCE
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	VR. UNITARIO	PRECIOS UNITARIOS ANTES DE AIU		CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VR. TOTAL							
1.12	Excavacion manual. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.	M3	1.00	$ 49,338.00	$ 49,338.00			$ -			$ -		57.33	$ 2,828,744.89		57.33	$ 49,338.00	$ 2,828,744.89	62.36	$ 49,338.00	$ 3,076,026.95
1.13	Relleno en material granular seleccionado tipo Recebo B-200 Incluye extendida y compactación con equipo vibrocompactador	M3	1.00	$ 84,938.00	$ 84,938.00			$ -			$ -		33.56	$ 2,850,731.63		33.56	$ 84,938.00	$ 2,850,731.63	33.56	$ 84,938.00	$ 2,850,731.63
3.7	Reconstruccion caja de inspección en ladrillo recocido entre 0.80 x 0.80 y 1.00 x 1.00 m. Incluye demolición placa de concreto, descapote, excavación y adecuación trampa de sólidos y/o desarenador si se requiere, aplicación pañete 1:3 impermeabilizado.	UN	1.00	252,286.00	252,286.00			$ -			$ -		1.00	$ 252,286.00		1.00	$ 252,286.00	$ 252,286.00	1.00	$ 252,286.00	$ 252,286.00
	SUB-TOTAL				$ 1,145,672.50															
4	PAÑETES																			
5.3	Reposición pintura en esmalte sintético, alta calidad (2 manos) para carpintería metálica sobre lámina llena. Incluye lijada y aplicación 2 manos de pintura anticorrosivo si se requiere, remates lineales y color indicado.	M2	1.00	16,816.00	16,816.00			$ -		102.23	$ 1,719,166.64			$ -		102.23	$ 16,816.00	$ 1,719,166.64	102.23	$ 16,816.00	$ 1,719,166.64
5.10	Suministro y aplicación de pintura tráfico para sala de maquinas, perqueaderos alta calidad (2 manos).	M2	1.00	35,320.00	35,320.00			$ -		181.47	$ 6,408,361.46			$ -		181.47	$ 35,320.00	$ 6,409,361.46	231.53	$ 35,320.00	$ 8,177,544.24
5.11	Reposición pintura en vinilo tipo 1 (3 manos) sobre pañete y/o estuco. Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones)	M2	1.00	18,165.00	18,165.00	1033.77	$	18,778,441.13		$ -			$ -			1,033.77	$ 18,165.00	$ 18,778,441.13	3,070.93	$ 18,165.00	$ 55,783,504.30
6.3	Reposición Porcelanato gris Tipo Cemento 60 X 60 ANTIDESLIZANTE. Incluye alistado de piso impermeabilizado si se requiere y pegacor o similar, remates lineales y corte de piezas con maquina.	M2	1.00	87,472.00	87,472.00			$ -		38.02	$ 3,325,549.86			$ -		38.02	$ 87,472.00	$ 3,325,549.86	38.02	$ 87,472.00	$ 3,325,549.86
6.4	Reposición enchape muro blanco 25 x 35 . Incluye desmonte tableta existente y mortero de pega y alistado de piso si se requiere, cargue y retiro de escombros a botadero, remates lineales y cortadora de ladrillo.	M2	1.00	75,146.00	75,146.00			$ -		30.68	$ 2,305,667.15			$ -		30.68	$ 75,146.00	$ 2,305,667.15	30.68	$ 75,146.00	$ 2,305,667.15
6.6	Reposición guardaescobas h = 0.08 m en cerámica . Incluye corte a máquina y pegacor o similar	ML	1.00	20,952.00	20,952.00			$ -		38.99	$ 816,918.48			$ -		38.99	$ 20,952.00	$ 816,918.48	88.09	$ 20,952.00	$ 1,845,661.68
	SUB-TOTAL				$ 1,442,696.00															
8	CARPINTERIA METALICA																			
8.17	Reposición de ventana metalica de 60x60 cm., lámina cold rolled, incluye marco con lámina cold rolled calibre 18 para hoja pesador para candado, tornillos de anclajes y mano de obra	UN	1.00	261,368.00	261,368.00			$ -		5.00	$ 1,306,840.00			$ -		5.00	$ 261,368.00	$ 1,306,840.00	5.00	$ 261,368.00	$ 1,306,840.00
8.18	Reposición de ventana metalica de 40x40 cm., lámina cold rolled, incluye marco con lámina cold rolled calibre 18 para hoja pesador para candado, tornillos de anclajes y mano de obra	UN	1.00	141,279.00	141,279.00			$ -		1.00	$ 141,279.00			$ -		1.00	$ 141,279.00	$ 141,279.00	1.00	$ 141,279.00	$ 141,279.00
10.18	Reposición punto sanitario PVC 4". Incluye desmonte punto existente, excavación, relleno y reposición accesorios.	UN	1.00	148,849.00	148,849.00			$ -			$ -		2.00	$ 297,698.00		2.00	$ 148,849.00	$ 297,698.00	3.00	$ 148,849.00	$ 446,547.00
10.19	Reposición tubería sanitaria PVC 2". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	ML	1.00	45,412.00	45,412.00			$ -		3.20	$ 145,318.40			$ -		3.20	$ 45,412.00	$ 145,318.40	4.40	$ 45,412.00	$ 199,812.80
10.20	Reposición tubería sanitaria PVC 3". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	ML	1.00	65,593.00	65,593.00			$ -		2.78	$ 182,348.54			$ -		2.78	$ 65,593.00	$ 182,348.54	5.09	$ 65,593.00	$ 333,868.37
10.21	Reposición tubería sanitaria PVC 4". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	ML	1.00	85,778.00	85,778.00			$ -		10.05	$ 862,068.90		33.00	$ 2,830,674.00		43.05	$ 85,778.00	$ 3,692,742.90	43.05	$ 85,778.00	$ 3,692,742.90
10.24	Reposición punto hidráulico agua fría PVC RDE-21 de 1/2" Incluye desmonte punto existente y reposición accesorios.	UN	1.00	120,088.00	120,088.00			$ -			$ -		1.00	$ 120,088.00		1.00	$ 120,088.00	$ 120,088.00	8.00	$ 120,088.00	$ 960,704.00
10.29	Reposición red de suministro tubería PVC presión 1/2" incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	ML	1.00	51,466.00	51,466.00			$ -			$ -		21.50	$ 1,106,519.00		21.50	$ 51,466.00	$ 1,106,519.00	21.50	$ 51,466.00	$ 1,106,519.00
10.30	Reposición red de suministro tubería PVC presión 3/4" incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	ML	1.00	55,503.00	55,503.00			$ -		13.66	$ 758,170.98			$ -		13.66	$ 55,503.00	$ 758,170.98	13.66	$ 55,503.00	$ 758,170.98
10.33	Reposicion red de suministro CPVC 1/2". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	ML	1.00	45,412.00	45,412.00			$ -		11.20	$ 508,614.40			$ -		11.20	$ 45,412.00	$ 508,614.40	11.20	$ 45,412.00	$ 508,614.40
NP19	Silicona perimetral para ventaneria	ml	260	$ 5,003.44	1,260,860.00	250.50	$	1,253,361.72			$ -			$ -		250.50	$ 5,003.44	$ 1,253,361.72	250.50	$ 5,003.44	$ 1,253,361.72
NP21	Suministro e instalacion de muros en Super Board 6MM a dos (2) Caras	M2	10	$ 94,810.14	948,101.40			$ -		9.65	$ 914,443.80			$ -		9.65	$ 94,810.14	$ 914,443.80	9.65	$ 94,810.14	$ 914,443.80
NP22	Suministro e instalacion de muros en Super Board 6 MM a una cara incluye Frescasa	M2	100	$ 92,334.38	9,233,438.00			$ -		103.04	$ 9,513,672.64			$ -		103.04	$ 92,334.38	$ 9,513,672.64	103.04	$ 92,334.38	$ 9,513,672.64
NP23	Fabricación e instalación de escaleras para acceso a los contenedores, con 3 huellas de 30 cm, contrahuellas de 16.6 cm en lámina alfajor 1/8 con estructura interna en tubo cuadrado de 1 1/2" Cal 16 con acabado en pintura electrostatica	UN	3	$ 743,361.98	2,230,085.94			$ -		3.00	$ 2,230,085.94			$ -		3.00	$ 743,361.98	$ 2,230,085.94	3.00	$ 743,361.98	$ 2,230,085.94
NP25	Suministro e instalacion de concreto 3000 psi para zapatas	M3	5.1	$ 655,575.00	3,343,432.50			$ -		5.01	$ 3,285,741.90			$ -		5.01	$ 655,575.00	$ 3,285,741.90	5.01	$ 655,575.00	$ 3,285,741.90

NEAK	Suministro e instalacion de sistema de presion 2 bombas 1 tanque 200 lt	UN	1	$ 13,109,145.00	13,109,145.00		$ -		$ -	1.00	$ 13,109,145.00	1.00	$ 13,109,145.00	$ 13,109,145.00	1.00	$ 13,109,145.00	$ 13,109,145.00
NPAZ	Fabricación e instalación de puerta sencilla en lamina Cal Rod calibre 18 y terminación en pintura (2.00 x 1.00)	UN	3	$ 844,845.00	2,534,535.00		$ -	3.00	$ 2,534,535.00		$ -	3.00	$ 844,845.00	$ 2,534,535.00	3.00	$ 844,845.00	$ 2,534,535.00
	SUB-TOTAL				$ 196,722,073.43												
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 413,16,413.00		$ 20,631,893		$ 36,959,784		$ 23,385,837			$ 80,397,473.00			$ 486,151,285.05
A I U		29.5%			$12,335,842.00		$5,909,382.00		$10,903,136.00		$6,901,787.00			$23,714,304.54			$148,364,629.09
ADMINISTRACION		23.5%			$9,826,857.06		$4,707,473.87		$8,685,549.14		$5,498,033.33			$18,891,056.16			$118,593,551.99
IMPREVISTOS		0%			$0.00		$0.00		$0.00		$0.00			$0.00			$0.00
UTILIDAD		6%			$2,508,984.78		$1,201,908.17		$2,217,587.02		$1,403,753.19			$4,823,248.38			$29,769,077.10
IVA SOBRE UTILIDAD		0%			$0.00		$0.00		$0.00		$0.00			$0.00			$0.00
COSTO TOTAL					$54,112,255.00		$25,941,184.85		$47,882,919.58		$30,297,873.52			$104,101,777.54			$842,515,914.15

COMPONENTE NORTE	$ 600,000,000.00

CORTE 1	$ 85,959,278.000
CORTE 2	$ 257,165,048.87
CORTE 3	$ 72,682,336.09
CORTE 4	$ 122,606,475.43
CORTE 5	$ 104,101,777.54
SALDO COMPONENTE NORTE	$ 157,484,085.17

MAURO RAFAEL PARAPIZON
REPRESENTANTE LEGAL
MAURO RAFAEL PARAPIZON
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS E ESPINOSA COBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R L GyG Consultores S A S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-13								

CAPITULO	1	PRELIMINARES		
ITEM No:	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
1.12	M3	Excavación manual. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
EXCAVACION PLACA	12.55	9.30	0.40	1.00	46.69
FOSO	2.2	2.20	2.20	1.00	10.65
				Subtotal	57.33
				Pasa....	
				TOTAL	57.33

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARIA SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ING. CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-13								

CAPITULO	1	PRELIMINARES		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
1.12	M3	Excavación manual. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

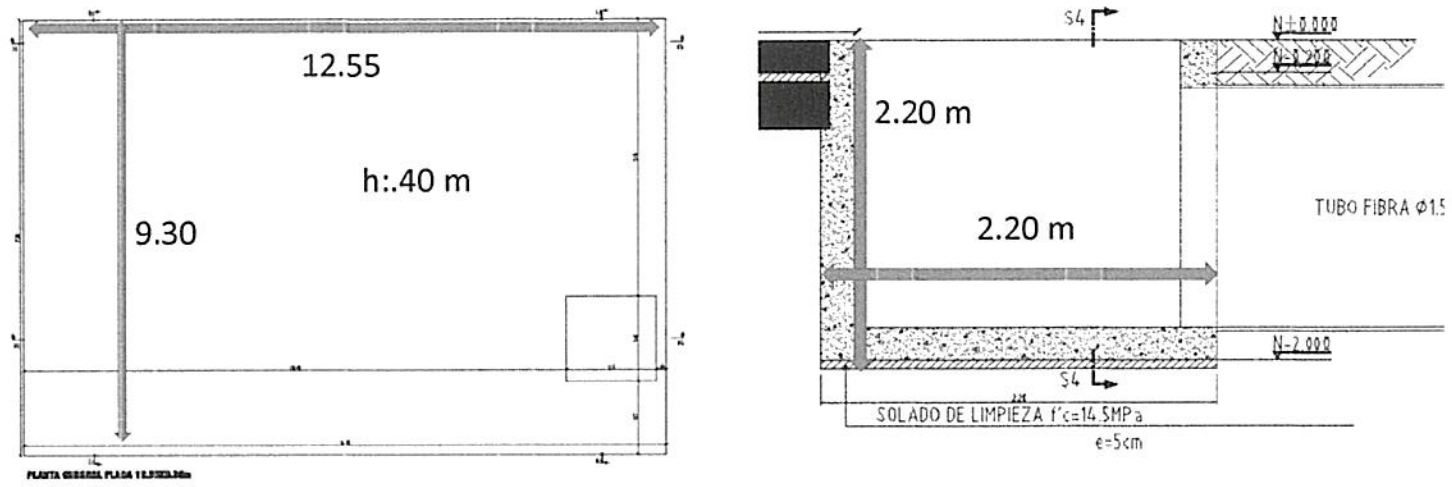

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESCOVAR ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-13								

CAPITULO	1	PRELIMINARES		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
1.13	M3	Relleno en material granular seleccionado tipo Recebo B-200. Incluye extendida y compactación con equipo vibrocompactador.	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
PLACA	12.55	9.30	0.30	1.00	35.01
FOSO	2.2	2.20	0.30	-1.00	-1.45
				Subtotal	33.56
				Pasa....	
				TOTAL	33.56

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-13								

CAPITULO	1	PRELIMINARES		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
1.13	M3	Relleno en material granular seleccionado tipo Recebo B-200. Incluye extendida y compactación con equipo vibrocompactador.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

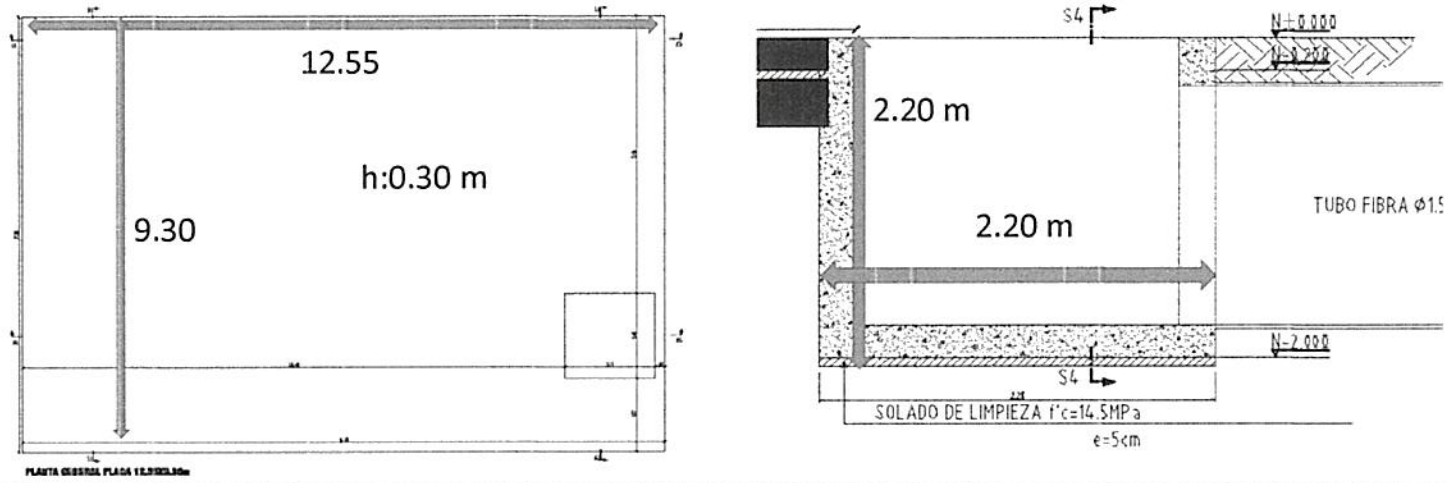

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504685
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-13								

CAPITULO	3	MAMPOSTERIA		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
3.7	UNIDAD	Reconstrucción caja de inspección en ladrillo recocido entre 0.80 x 0.80 y 1.00 x 1.00 m. Incluye demolición placa de concreto, descapote, excavación y adecuación trampa de sólidos y/o desarenador si se requiere, aplicación pañete 1:3 impermeabilizado,	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
PLACA CAOBOS SALASAR				1.00	1.00
					-
				Subtotal	1.00
				Pasa....	
				TOTAL	1.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

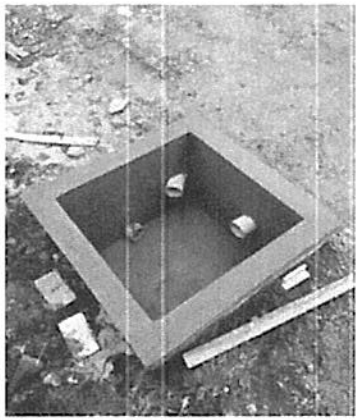

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE:
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-13								

CAPITULO	3	MAMPOSTERIA		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.7	UNIDAD	Reconstrucción caja de inspección en ladrillo recocido entre 0.80 x 0.80 y 1.00 x 1.00 m. Incluye demolición placa de concreto, descapote, excavación y adecuación trampa de sólidos y/o desarenador si se requiere, aplicación pañete 1:3 impermeabilizado,	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

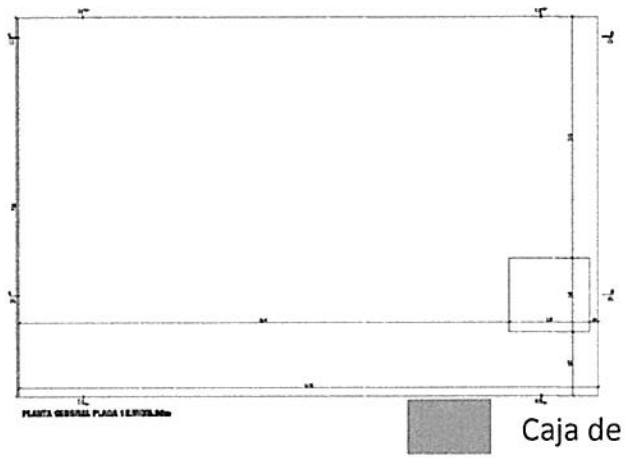

Caja de 80x80

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS EDUARDO ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPÍTULO		
	5	PINTURA

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.3	M2	Repoción pintura en esmalte sintético, alta calidad (2 manos) para carpintería metálica sobre lámina llena. Incluye lijada y aplicación 2 manos de pintura anticorrosivo si se requiere, remates lineales y color indicado	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
CONTENEDOR BRAE	18.28		2.70	2.00	98.71
CONTENEDOR BRAE	2.43		2.70	2.00	13.12
VANOS PUERTAS	1		2.00	-3.00	-6.00
VANOS VENTANAS	0.8		0.90	-5.00	-3.60
				Subtotal	102.23
				Pasa....	
				TOTAL	102.23

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS E. ESQUIVEL ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	5	PINTURA		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
5.3	M2	Reposición pintura en esmalte sintético, alta calidad (2 manos) para carpintería metálica sobre lámina llena. Incluye lijada y aplicación 2 manos de pintura anticorrosivo si se requiere, remates lineales y color indicado.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

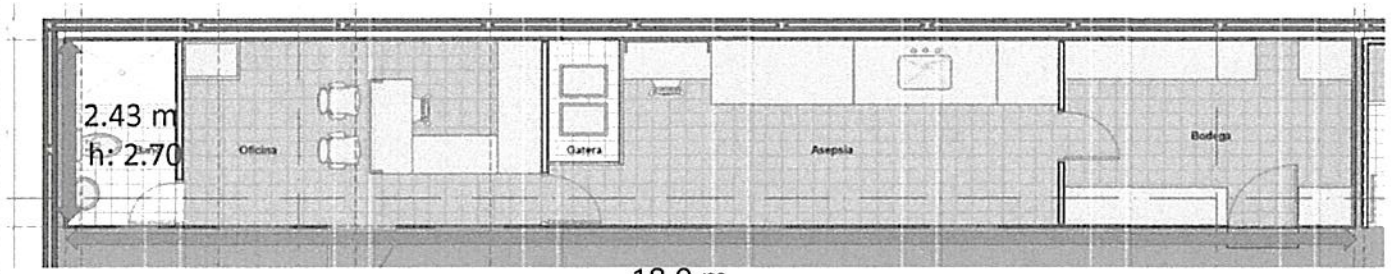

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	1	de	3
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No	FECHA
5.10	M2	Suministro y aplicación de pintura tráfico para sala de maquinas, parqueaderos alta calidad (2 manos)	5	12/05/2021

AREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
PISO BRAE	20.58	5.00		1.00	102.90
PINTURA MUROS BRAE	1.37	2.45		1.00	3.36
	1.37	2.45		1.00	3.36
	2.15	2.45		1.00	5.27
	5	2.45		1.00	12.25
	11.85	2.45		1.00	29.03
	2.15	2.45		1.00	5.27
BRAE BODEGA	2.15	2.15		1.00	4.62
	5.7	2.15		1.00	12.26
	5.7	2.15		1.00	12.26
	2.15	2.15		1.00	4.62
VANOS VENTANAS Y PUERTAS	2	1.00		-3.00	-6.00
	0.9	0.80		-5.00	-3.60
	0.4	0.40		-1.00	-0.16
	0.66	2.00		-3.00	-3.96
				Subtotal	181.47
				Pasa....	
				TOTAL	181.47

PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA

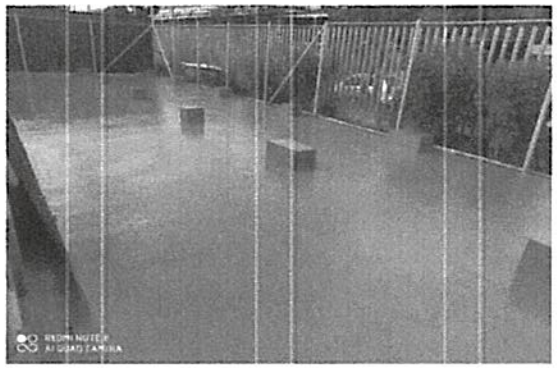

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


ARQ CARLOS E. ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO										
CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	2	de	3
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.10	M2	Suministro y aplicación de pintura tráfico para sala de maquinas, parqueaderos alta calidad (2 manos).	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

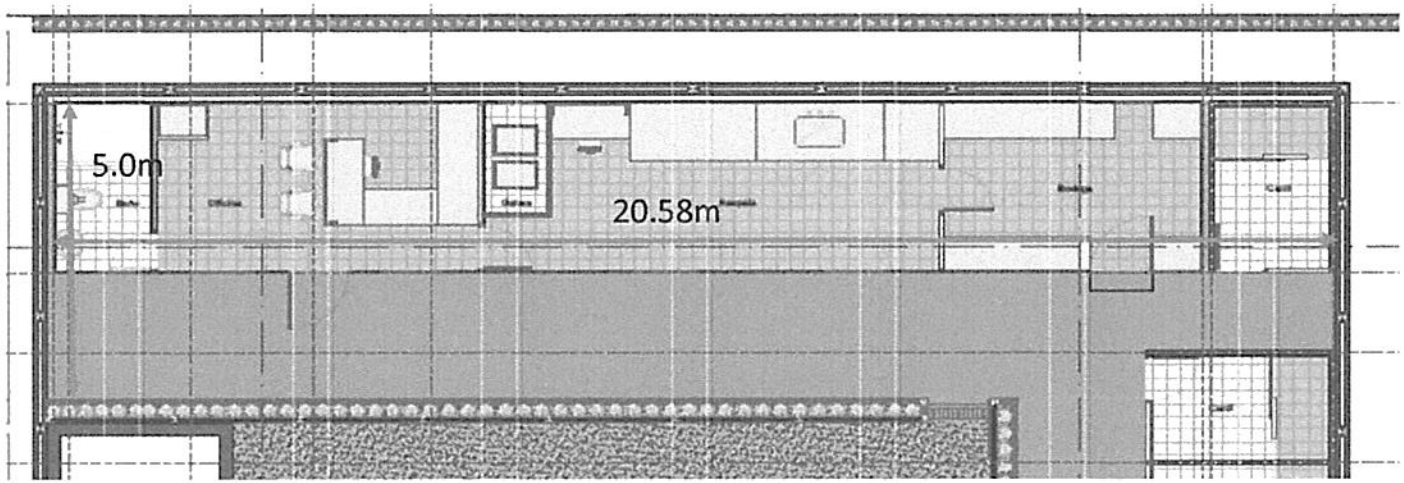

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	3	de	3
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPÍTULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
5.10	M2	Suministro y aplicación de pintura tráfico para sala de maquinas, parqueaderos alta calidad (2 manos)	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS E. ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	1	de 21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.							
OFICINA:	ESTACION B-4							

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/05/2021

AREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
SUB DIRECTOR OPERATIVO					
A	2.57		2.84	1.00	7.30
	2.2		3.52	1.00	7.74
VANO PUERTA	2.07		0.75	-1.00	-1.55
BAÑO TECHO	1.4	2.47		1.00	3.46
MUROS BAÑO	1.4		0.40	1.00	0.56
MUROS BAÑO	2.7		0.40	1.00	1.08
MURO ENTRADA SUB DIRECCION					
B	8.4		2.83	1.00	23.77
VANO PUERTA	2.17		1.85	-1.00	-4.01
MURO COSTADO ORIENTE					
C	7.9		0.90	1.00	7.11
MURO COSTADO ORIENTE 2					
C	5.3		0.90	1.00	4.77
MURO ENTRADA OFICINA TERCER PISO					
F	3.03		2.84	1.00	8.61
VANO PUERTA	2.18		1.84	-1.00	-4.01
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			Subtotal		54.82
			Pasa....		
			TOTAL		54.82

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



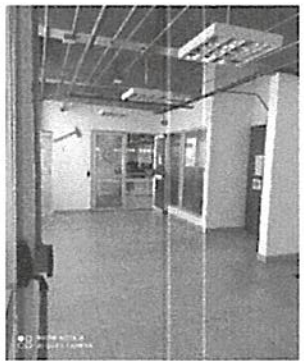

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	2	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposicion pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

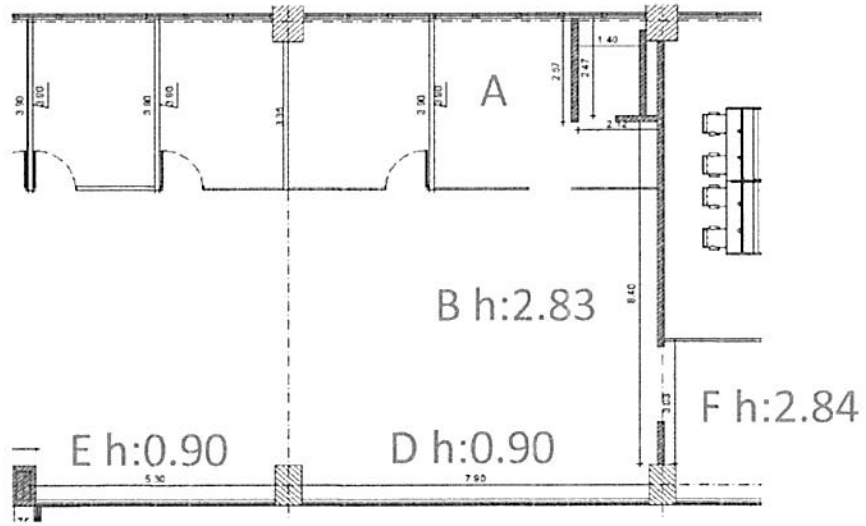

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 CONTRATISTA DE OBRA	ING. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON CONTRATISTA DE OBRA	ARQ. CARLOS ESQUIVEL ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	3	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposicion pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/03/2021

ÁREA O LUGAR ESPECÍFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
MURO COSTADO OCCIDENTAL					
G	2.55		3.50	1.00	8,93
VANO VENTANA	2.02		2.38	-1.00	-4,81
MURO COSTADO OCCIDENTAL 2					
H	0.9		3.50	1.00	3,15
	1.48		3.50	1.00	5,18
VANO PUERTA	1.48		3.20	-1.00	-4,74
	0.9		2.82	1.00	2,54
	0.16		2.82	1.00	0,45
	0.77		2.82	1.00	2,17
	1.51		3.50	1.00	5,29
VANO PUERTA5	1.51		2.30	-1.00	-3,47
	0.77		3.50	1.00	2,70
I	5.4		3.50	1.00	18,90
VANO VENTANA	2.02		2.48	-2.00	-10,04
MURO SALA SITUACIONAL - CONTRALORIA					
J	0.68		3.50	1.00	2,38
	1.49		3.50	1.00	5,22
VANO PUERTA	1.49		2.20	-1.00	-3,28
	0.79		2.82	1.00	2,23
	0.16		2.82	1.00	0,45
	0.75		2.82	1.00	2,12
	1.49		3.50	1.00	5,22
VANO PUERTA	1.19		2.20	-1.00	-2,62
	0.75		3.50	1.00	2,63
SALA SITUACIONAL					
K	5.42		3.50	1.00	18,97
VANO VENTANA	2.05		2.48	-2.00	-10,17
				Subtotal	49,48
				Pasa ...	$4,82
				TOTAL	104,36

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

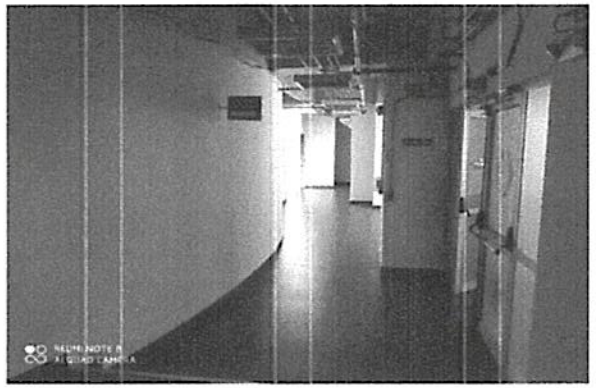

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ.JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESGUERRA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	4	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPÍTULO	5	PINTURAS		
ÍTEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/5/2021

ÁREA O LUGAR ESPECÍFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
GESTION DOCUMENTAL -ESCUELA FORMACION BOMBERIL					
L	0.82		3.50	1.00	2.87
	1.5		3.50	1.00	5.25
VANO PUERTA	1.5		2.20	-1.00	-3.30
	0.82		2.82	1.00	2.31
	0.16		2.82	1.00	0.45
	0.78		2.82	1.00	2.20
	1.49		3.50	1.00	5.22
	1.49		2.20	-1.00	-3.28
	0.78		3.50	1.00	2.73
INFORMACION PUBLICA PRENSA -CENTRO DE COORDINACIÓN					
M	2.82		3.50	1.00	9.87
VANO PUERTA	2.59		2.03	-1.00	-5.26
	3		2.90	1.00	8.70
VANO PUERTA	2.3		3.00	-1.00	-6.90
	1.57		3.50	1.00	5.50
VANO GABINETA	1		0.82	-1.00	-0.82
	1.04		2.82	1.00	2.93
N	6.32		1.00	1.00	6.32
	7.0		1.00	1.00	7.00
P	1.04		2.82	1.00	2.93
	3.06		3.50	1.00	10.71
VANO PUERTA	2.3		1.85	-1.00	-4.26
	1		2.82	1.00	2.82
Q	5.45		1.00	1.00	5.45
				Subtotal	60.33
				Pasa...	104.30
				TOTAL	164.62

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

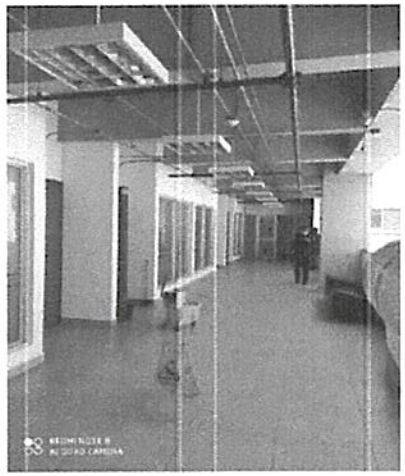

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY GARMENDIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESGUERRA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOS-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	5	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/5/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

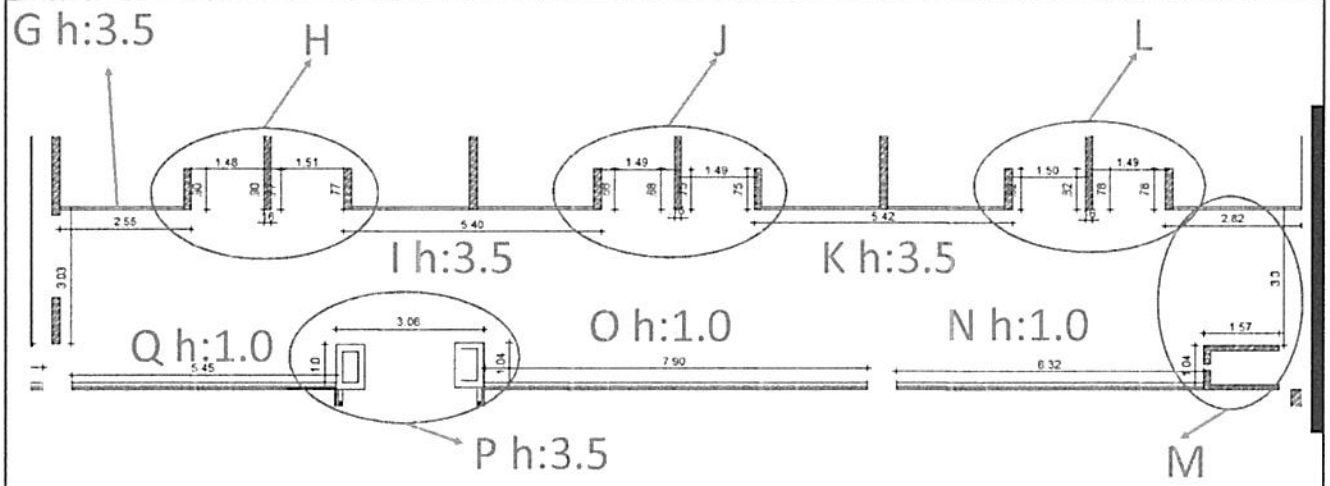

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504685 CONTRATISTA DE OBRA	QUIEN RECIBE ARQ. JOSÉ MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON CONTRATISTA DE OBRA	ARQ.CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	5	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/5/2021

ÁREA O LUGAR ESPECÍFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
ESCUELA FORMACION BOMBERIL					
R	7,04		2,82	1,00	19,85
VANO VENTANA	1,45		2,67	-1,00	-3,87
	3,4		2,86	1,00	9,72
	0,56		3,50	1,00	1,96
	0,5		3,50	1,00	1,75
	0,56		3,50	1,00	1,96
	4,32		2,86	1,00	12,36
	2,6		3,50	1,00	9,10
VANO VENTANA	2,02		2,60	-1,00	-5,25
	0,84		3,50	1,00	2,94
	1,65		3,50	1,00	5,78
VANO PUERTA	1,48		3,21	-1,00	-4,78
TERCER PISO ACCESO 04 HALL					
S	3,26		4,34	1,00	14,15
VANO PUERTA	1,53		2,34	-1,00	-3,58
T	12,7		3,50	1,00	44,45
VANO PUERTA	1,53		2,34	-1,00	-3,58
X	1,47		3,50	1,00	5,15
VANO PUERTA	1		2,67	-1,00	-2,67
	1,05		3,50	1,00	3,68
	0,16		3,50	1,00	0,56
	1,05		3,50	1,00	3,68
	1,41		3,50	1,00	4,94
	3,1		2,50	1,00	10,85
VANO PUERTA	0,83		2,67	-2,00	-3,44
	1,4		3,82	1,00	5,35
	1,02		3,50	1,00	3,57
	0,16		3,50	1,00	0,56
	1,03		3,50	1,00	3,61
				Subtotal	139,37
				Pasa....	164,62
				TOTAL	303,99

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

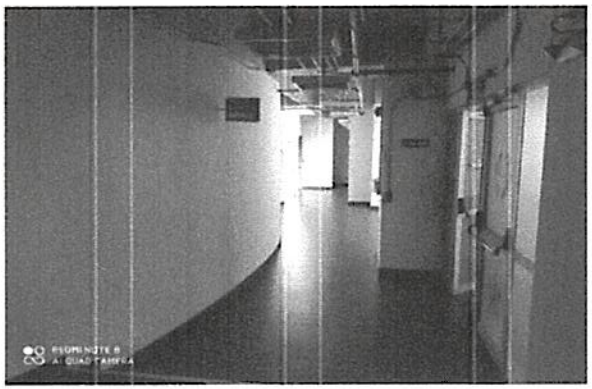

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	7	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco. Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/05/2021

AREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
MURO VENTANA ESCALERA					
Y	1,31		2,82	1,00	3,69
	1,04		2,82	1,00	2,93
	0,59		2,82	1,00	1,66
	0,74		2,82	1,00	2,09
	1		2,82	1,00	2,82
Z	4,35		2,82	1,00	12,27
	2,8		1,60	-1,00	-4,48
A-1	1		2,82	1,00	2,82
	1,14		2,82	1,00	3,21
	0,75		2,82	1,00	2,12
A-2	6		2,82	1,00	16,92
					-
			Subtotal		46,05
			Pasa...		303,99
			TOTAL		350,04

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



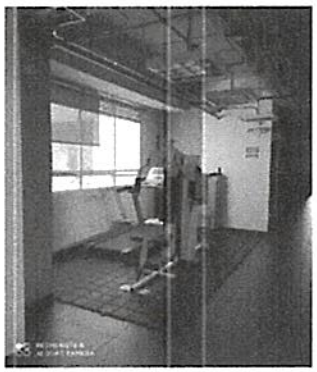

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
107350-4885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. G y G Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESQUIVEL ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. G y G Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	8	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposicion pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/5/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

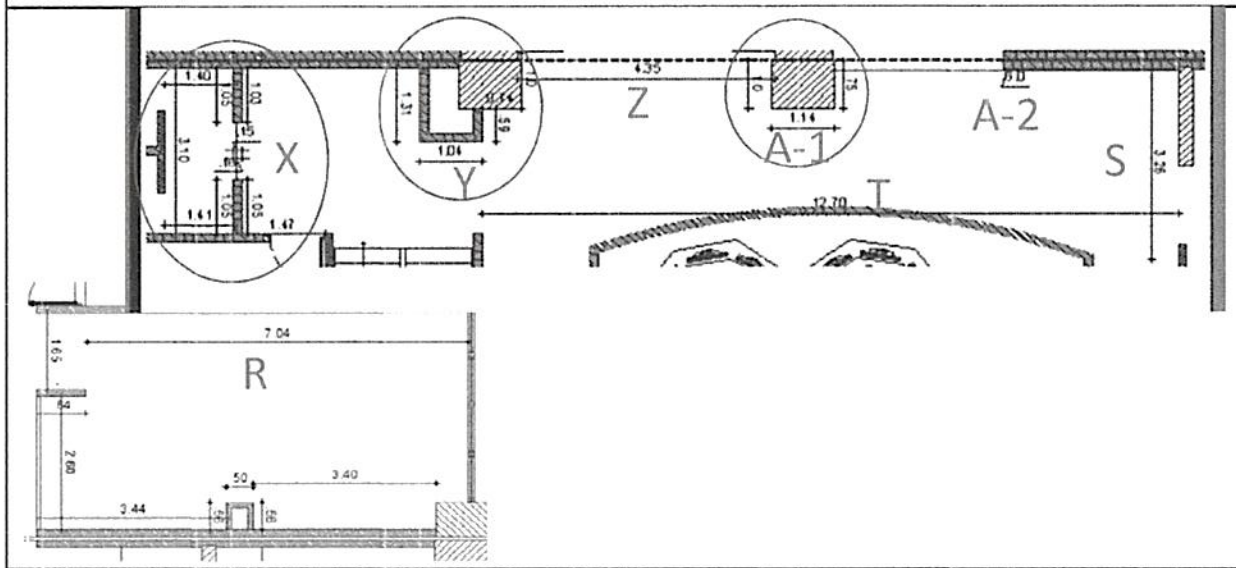

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1072508885 CONTRATISTA DE OBRA	ARQ. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON CONTRATISTA DE OBRA	ARQ.CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	9	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye muro de obra para lleida y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/5/2021

AREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
BAÑOS HOMBRE					
A-3	1.62		0.38	1.00	0.62
	2.48		0.39	1.00	0.97
	1.62		0.70	1.00	1.13
TECHO BAÑOS	1.62		2.48	1.00	4.02
BAÑOS MUJERES					
A-4	1.33		0.39	1.00	0.52
	2.47		0.39	1.00	0.96
	1.3		0.39	1.00	0.51
	2.94		0.39	1.00	0.80
TECHO BAÑOS	1.33		2.49	1.00	3.31
INGRESO ESCALERAS HALL TERCER PISO					
A-5	3.8		3.78	1.00	14.06
A-6	2.35		4.57	1.00	10.79
A-7	3.9		3.91	1.00	15.25
				Subtotal	52.92
				Pasa...	350.04
				TOTAL	402.97

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	10	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposicion pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

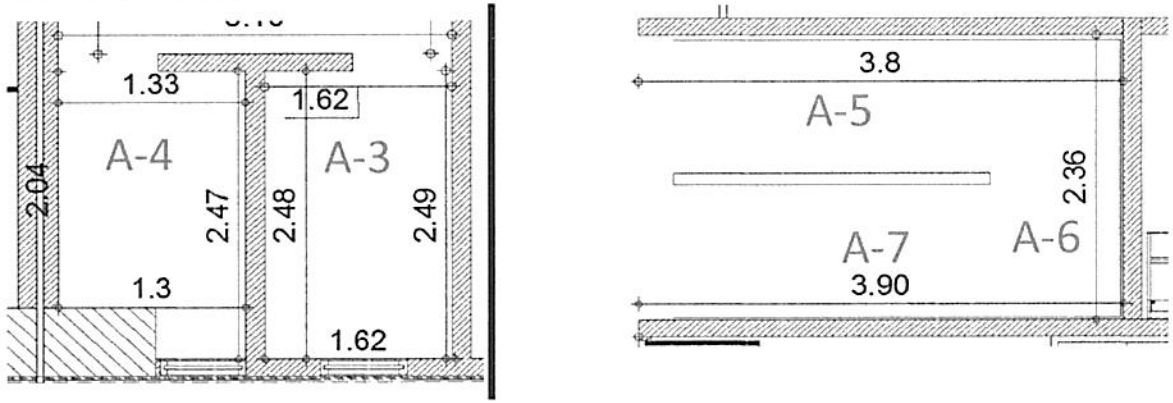

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL FABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	DIA	11	DE	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPÍTULO	5	PINTURAS

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco. Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (Nus y dilataciones)	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECÍFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
CH HABITACIOS Y PASILLOS					
A-6	3.9		2.82	1.00	11.00
A-7	2.44		3.50	1.00	8.54
	0.48		2.57	-2.00	-4.52
	1.49		3.50	1.00	5.19
	2.89		2.82	1.00	8.15
	1.49		1.42	1.00	2.09
A-8	3.07		3.50	1.00	10.75
A-9	0.5		3.50	1.00	2.10
A-10	2.17		3.50	1.00	7.60
VANO PUERTA	0.84		2.10	-1.00	-1.76
A-11	2.19		2.82	1.00	6.18
A-12	0.9		2.82	1.00	2.54
	0.53		2.82	1.00	1.49
A-13	4.4		2.82	1.00	12.41
VANO VENTANA	2.81		0.77	-1.00	-2.16
A-14	1.41		2.82	1.00	3.98
	0.17		2.82	1.00	0.48
	1.41		2.82	1.00	3.98
A-15	5.1		2.82	1.00	14.39
VANO PUERTA	0.9		2.10	1.00	1.89
A-16	3.5		3.50	1.00	12.25
VANO PUERTA	0.95		2.10	-1.00	-2.00
A-17	6.67		3.50	1.00	23.35
A-18	2.5		1.47	1.00	3.68
A-19	2.66		1.60	1.00	4.43
A-20	3.1		1.50	1.00	4.65
A-21	4.16		3.50	1.00	14.56
VANO PUERTA	0.92		2.10	1.00	1.93
A-22	3.57		2.82	1.00	10.07
	0.7		3.50	1.00	2.45
	0.84		2.82	1.00	2.37
	3.25		2.30	1.00	7.50
				Subtotal	177.43
				Pasa....	402.97
				TOTAL	580.40

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504845 CONTRATISTA DE OBRA	ARQ. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. CyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL FABA PINZON CONTRATISTA DE OBRA	ARQ. CARLOS ESQUIVIA ESCORCIA REPRESENTANTE LEGAL R.L. CyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	12	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposicion pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requiesan en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/03/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

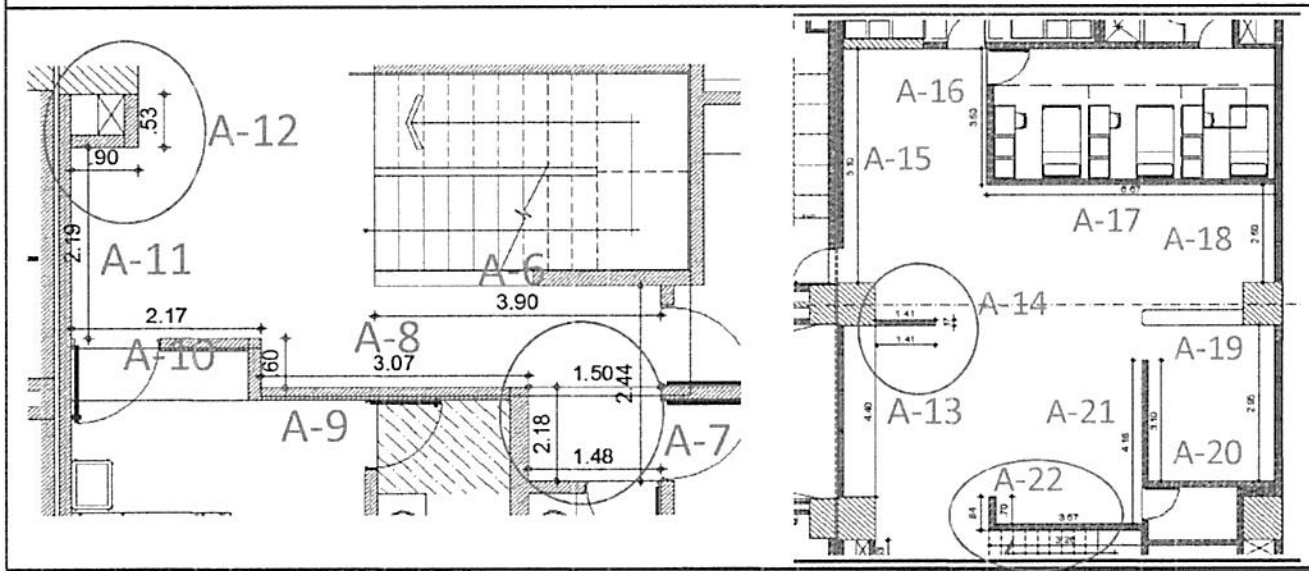

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	13	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/5/2021

ÁREA O LUGAR ESPECÍFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
PISO 04 CUARTO AL LADO DE LAS ESCALERAS					
A-23	6,88		2,82	1,00	19,68
A-24	4,98		2,82	1,00	14,04
VANO VENTANA	3		1,00	-1,00	-3,00
A-25	6,08		2,82	1,00	17,15
A-26	5,43		2,82	1,00	15,31
VANO PUERTA	1		2,00	-1,00	-2,00
COCINETA PISO 1					
A-29*	2,96		4,04	1,00	11,96
VANO PUERTA	0,97		2,10	-1,00	-2,04
A-28	2,35		4,04	1,00	9,49
A-27	2,56		4,04	1,00	10,34
A-26	1,83		4,04	1,00	7,39
COCINETA PISO 2					
A-29	2,9		3,60	1,00	10,44
VANO PUERTA	1,04		2,10	-1,00	-2,18
A-30	2,43		3,60	1,00	8,75
A-31	1,6		3,60	1,00	5,76
A-32	1,6		3,60	1,00	5,76
COCINETA PISO 3					
A-33	2,9		3,60	1,00	10,44
VANO PUERTA	1,04		2,10	-1,00	-2,18
A-34	2,43		3,60	1,00	8,75
A-35	1,6		3,60	1,00	5,76
A-36	1,6		3,60	1,00	5,76
					-
					-
			SubMotal		155,38
			Pasa....		580,40
			TOTAL		735,78

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

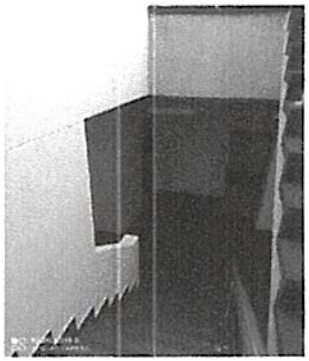

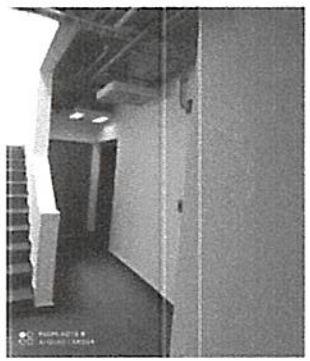

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 CONTRATISTA DE OBRA	MG. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON CONTRATISTA DE OBRA	AFQ.CARLOS E ESGUERRA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	14	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CONTR. No.	FECHA
5.11	M2	Reposicion pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

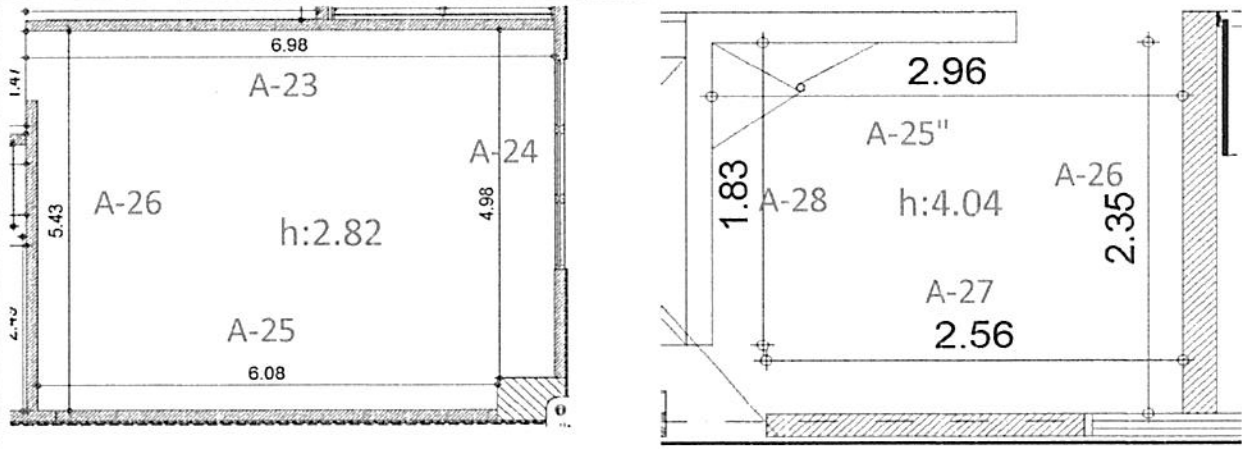

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESGUERRA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	15	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposicion pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/03/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

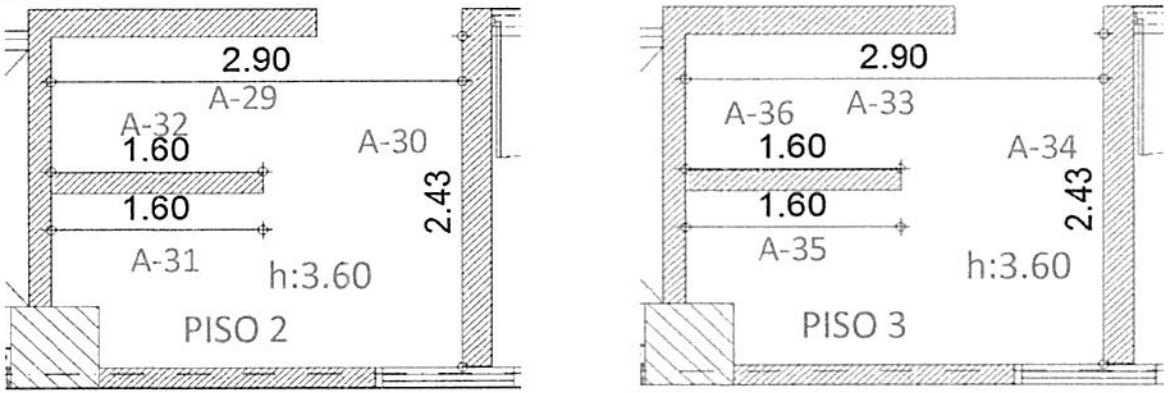

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARIO SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESGUERRA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	16	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/03/2021

AREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO					
A-36	8.68		3.60	1.00	31.25
VANO PUERTA	1.04		2.10	-1.00	-2.18
A37	1.34		2.70	1.00	3.62
	0.4		2.70	1.00	1.08
	0.17		2.70	1.00	0.46
	0.4		2.70	1.00	1.08
A-38	0.48		2.70	1.00	1.30
	0.36		2.70	1.00	0.97
A-39	7.35		2.70	1.00	19.85
VANO VENTANA	5.7		1.88	-1.00	-10.72
A-40	0.33		2.70	1.00	0.89
	0.85		2.70	1.00	2.30
A-41	5.45		2.70	1.00	14.72
VANO VENTANA	5.45		1.83	-1.00	-0.87
SUB DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA CONTROL INTERNO					
A-42	2.83		3.91	1.00	10.28
	0.6		3.91	1.00	2.35
	0.6		3.91	1.00	2.35
	3.14		2.37	1.00	7.44
SUB DIRECCION DE GESTION HUMANA					
A-43	3.14		2.37	1.00	7.44
	3.7		2.37	1.00	8.77
SUB DIRECCION DE GESTION HUMANA 2					
A-44	3.7		2.37	1.00	8.77
	3.7		2.37	1.00	8.77
				Subtotal	110.79
				Pasa...	735.78
				TOTAL	846.57

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ.JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	17	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

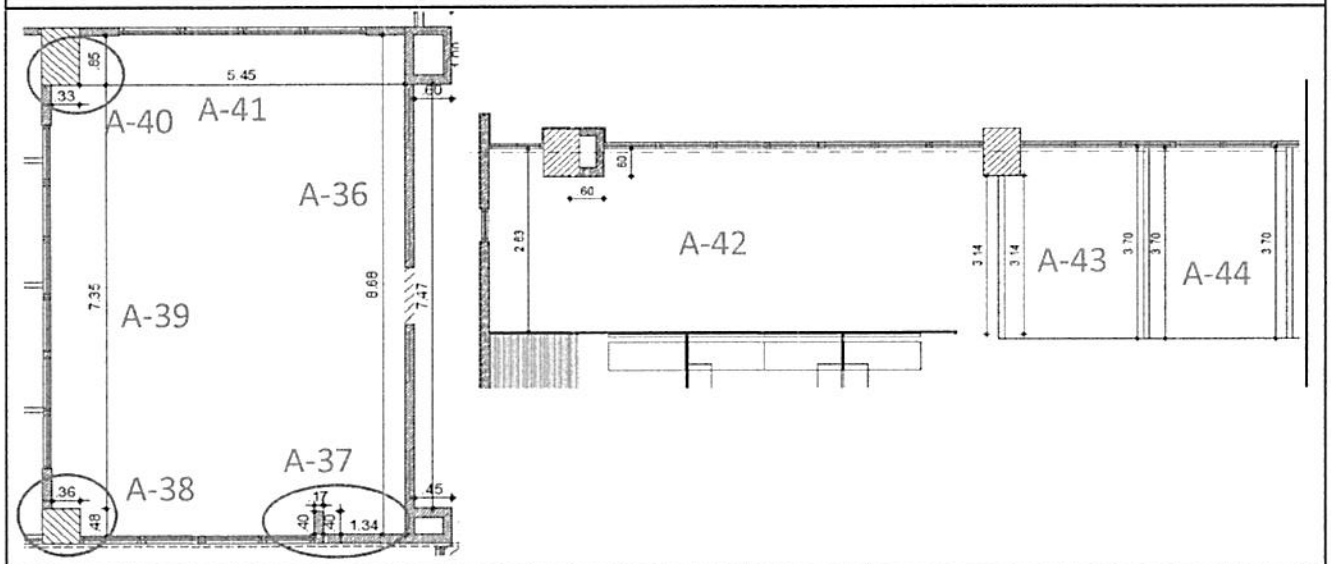

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
107350-4885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	18	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/5/2021

ÁREA O LUGAR ESPECÍFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
OFICINA INFRAESTRUCTURA					
A-45	3,7		2,37	1,00	8,77
	3,14		2,37	1,00	7,44
OFICINA AREA FINANCIERA					
A-46	3,14		2,37	1,00	7,44
	3,7		2,37	1,00	8,77
OFICINA ASESORES					
A-47	3,7		2,37	1,00	8,77
	3,7		2,37	1,00	8,77
OFICINA SUB DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA					
A-48	3,7		2,37	1,00	8,77
	2,31		2,83	1,00	6,54
A-49	2,83		3,51	1,00	7,13
VANO PUERTA	0,76		2,10	-1,00	-1,64
	1,85		0,35	1,00	0,65
	2,4		0,35	1,00	0,84
	1,37		0,35	1,00	0,48
TECHO BAÑOS	1,37		1,85	1,00	2,53
A-50	2,56		3,51	1,00	8,99
	3,7		2,35	1,00	8,70
				Subtotal	92,54
				Pasa...	846,57
				TOTAL	939,51

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
107350-4885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	19	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

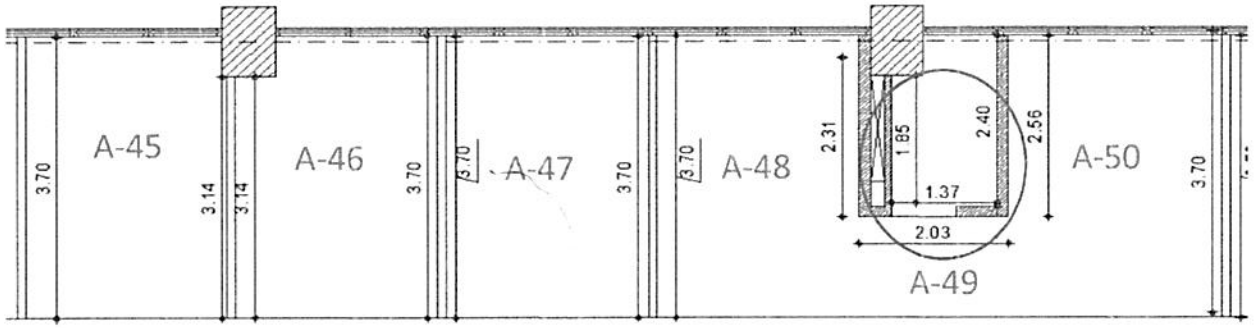

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PAEA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. CyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. CyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	20	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposición pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, Incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECÍFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
OFICINA AREA LOGISTICA					
A-51	3.7		2.37	1.00	8.77
	2.31		2.83	1.00	6.54
A-52	2.03		3.51	1.00	7.13
VANO PUERTA	0.78		2.10	-1.00	-1.64
	1.85		0.35	1.00	0.65
	2.4		0.35	1.00	0.84
	1.37		0.35	1.00	0.48
TECHO BAÑOS	1.37		1.85	1.00	2.53
A-53	2.58		3.51	1.00	8.99
	3.7		2.35	1.00	8.70
OFICINA AREA ADMINISTRACION					
A-54	3.7		2.37	1.00	8.77
	3.7		2.37	1.00	8.77
A-55	3.14		2.37	1.00	7.44
	3.7		2.37	1.00	8.77
A-56	3.7		2.37	1.00	8.77
	3.7		2.37	1.00	8.77
				Subtotal	94.26
				Pasa...	938.51
				TOTAL	1033.77

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1072504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY CARMIENTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	21	de	21
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO CAMANDO								

CAPITULO	5	PINTURAS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
5.11	M2	Reposicion pintura en vinilo tipo I (3 manos) sobre pañete y/o estuco, incluye mano de obra para lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones).	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

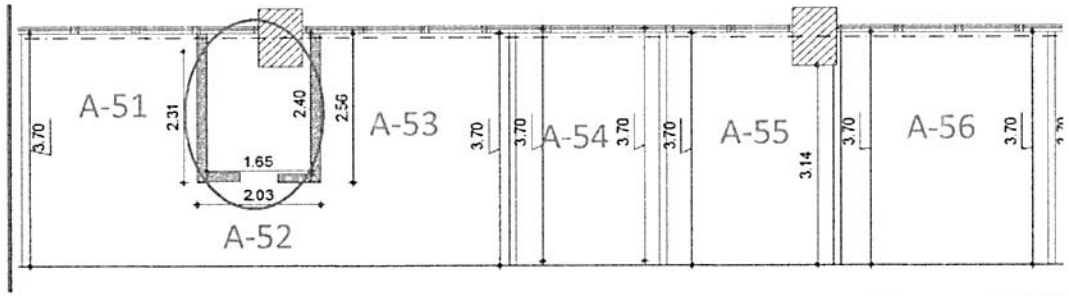

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 CONTRATISTA DE OBRA	ARQ. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. OyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON CONTRATISTA DE OBRA	ARQ.CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. OyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	6	PISOS Y ENCHAPES		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
6.30	M2	Reposición Porcelanato gris Tipo Cemento 60 X 60 ANTIDESLIZANTE. Incluye alistado de piso impermeabilizado si se requiere y pegacor o similar, remates lineales y corte de piezas con máquina.	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
BRAE 40 PIES	11.905	2.15		1.00	25.60
BRAE 20 PIES	5.778	2.15		1.00	12.42
				Subtotal	38.02
				Pasa....	
				TOTAL	38.02

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

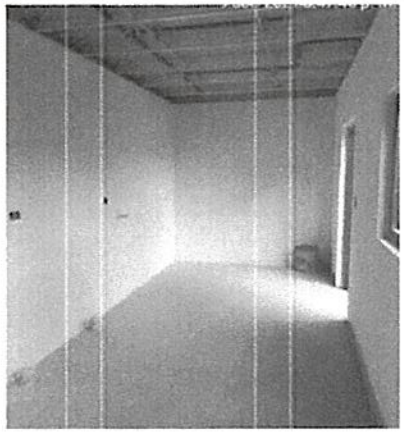

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


ARQ. CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO									
CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO. Realizar el mantenimiento a las instaleciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	6	PISOS Y ENCHAPES		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
6.30	M2	Reposición Porcelanato gris Tipo Cemento 60 X 60 ANTIDESLIZANTE. Incluye alistado de piso impermeabilizado si se requiere y pegacor o similar, remates lineales y corte de piezas con máquina	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

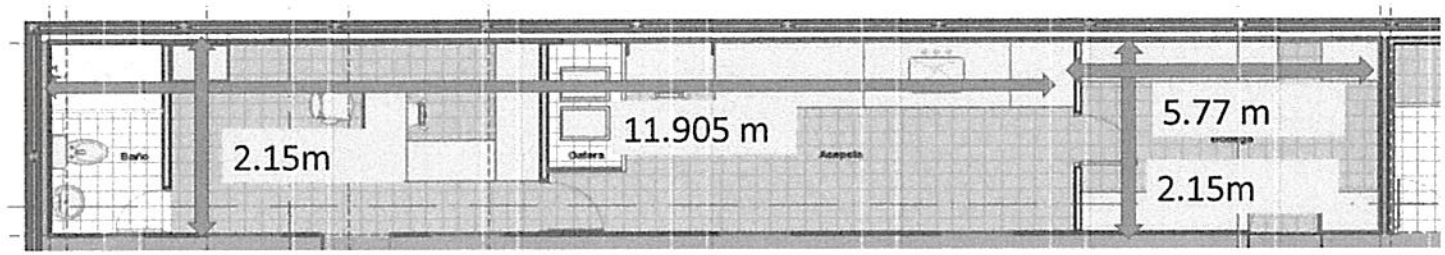

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPÍTULO	6	PISOS Y ENCHAPES		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
6.40	M2	Reposición enchape muro blanco 25 x 35 . Incluye desmonte tableta existente y mortero de pega y alistado de piso si se requiere, cargue y retiro de escombros a botadero, remates lineales y cortadora de ladrillo.	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
baño brae	0.76		2.55	1.00	1.94
	1.42		2.55	1.00	3.62
	0.76		2.55	1.00	1.94
asepsia	2.1		2.55	1.00	5.36
	5.41		2.55	1.00	13.80
	2.1		2.55	1.00	5.36
vano puerta	0.66		2.00	-1.00	-1.32
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			Subtotal		30.68
			Pasa....		
			TOTAL		30.68 ✓

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVEL ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	6	PISOS Y ENCHAPES		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
6.40	M2	Reposición enchape muro blanco 25 x 35 . Incluye desmonte tableta existente y mortero de pega y alistado de piso si se requiere, cargue y retiro de escombros a botadero, remates lineales y cortadora de ladrillo	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

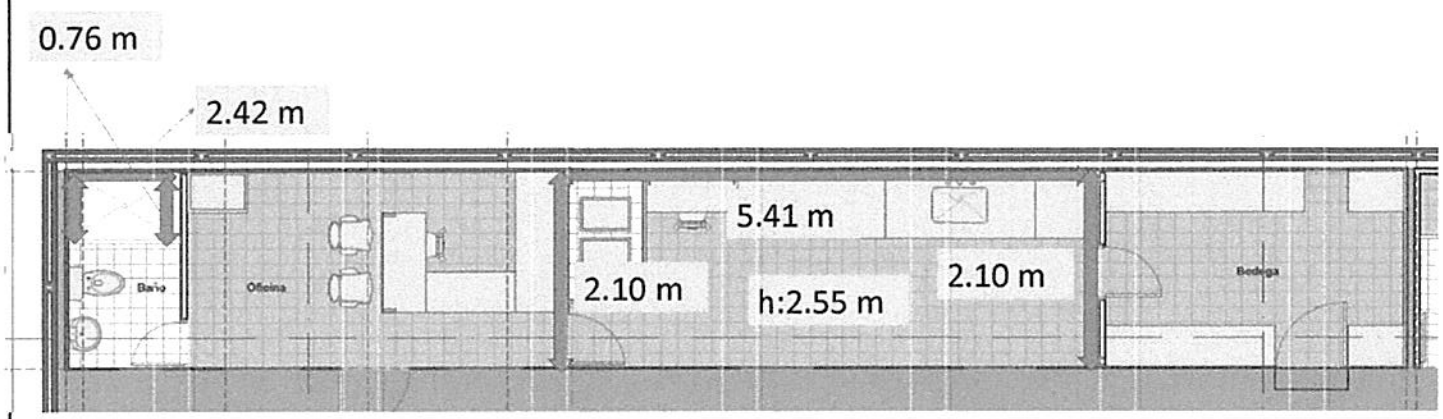

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020 DE 2020 pag 1 de 2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.		
OFICINA:	ESTACION B-4		

CAPITULO		PISOS Y ENCHAPES		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
6.60	ML	Reposición guardaescobas h = 0.09 m en cerámica . Incluye corte a maquina y pegacor o similar.	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
BAÑO BRAE	1.27			1.00	1.37
	1.4			3.00	4.20
	0.66			1.00	0.66
OFICINA BRAE	1.46			1.00	1.46
	4.65			1.00	4.65
	1.47			1.00	1.47
	4.24			1.00	4.24
	0.16			1.00	0.16
ASEPCIA	4.76			1.00	4.76
	0.88			1.00	0.88
	0.16			1.00	0.16
BODEGA	5.69			1.00	5.69
	2.14			1.00	2.14
	5.69			1.00	5.69
	2.14			1.00	2.14
	0.12			1.00	0.12
VANO PUERTA	1			-1.00	-1.00
				1.00	-
				Subtotal	38.99
				Pasa....	
				TOTAL	38.99

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

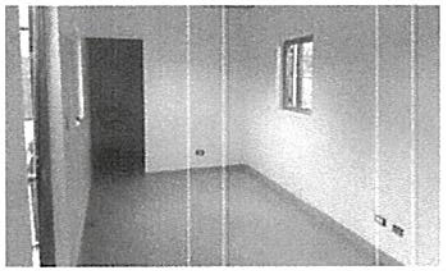

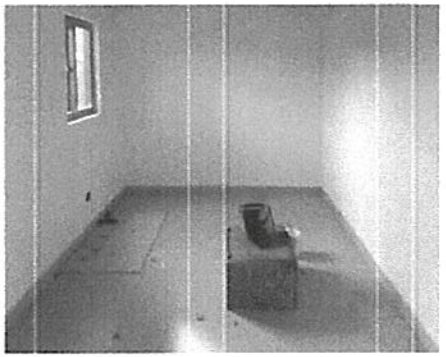

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	6	PISOS Y ENCHAPES		
ITEM Nº	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE Nº	FECHA
6.60	ML	Reposición guardaescobas h = 0.08 m en cerámica . Incluye corte a máquina y pegacor o similar.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 CONTRATISTA DE OBRA	ARQ. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON CONTRATISTA DE OBRA	ARQ.CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag.	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPÍTULO	8	CARPINTERÍA METÁLICA		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
8.17	UNIDAD	Reposición de ventana metálica de 80x90 cm., lámina cold rolled, incluye marco con lámina cold rolled calibre 18 para hoja pasador para candado, tornillos de anclajes y mano de obra	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
BRAE 40 PIES				4.00	4.00
BRAE 20 PIES				1.00	1.00


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	8	CARPINTERÍA METÁLICA		
ITEM No	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**CORTE No.**	**FECHA**
8.17	UNIDAD	Reposición de ventana metálica de 80x90 cm., lámina cold rolled, incluye marco con lámina cold rolled calibre 18 para hoja pasador para candado, tornillos de anclajes y mano de obra	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag.	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	8	CARPINTERÍA METÁLICA		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
8.18	UNIDAD	Reposición de ventana metálica de 40x40 cm., lámina col rolled, incluye marco con lámina cold rolled calibre 18 para hoja pasador para candado, tornillos de anclajes y mano de obra	5	12/05/2021

AREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
BRAE 40 PIES				1.00	1.00
					-
				Subtotal	1.00
				Pasa....	
				TOTAL	1.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

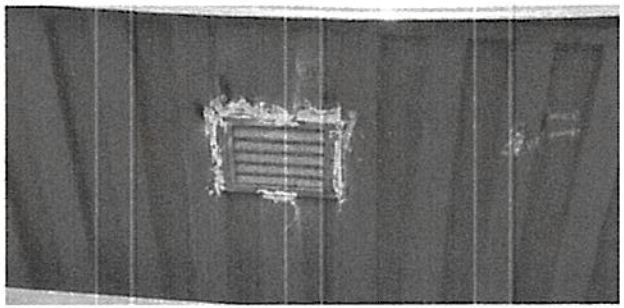

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESGUERRA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag.	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D C								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	8	CARPINTERÍA METÁLICA		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**CORTE No.**	**FECHA**
8.18	UNIDAD	Reposición de ventana metálica de 40x40 cm., lámina col rolled, incluye marco con lámina cold rolled calibre 18 para hoja pasador para candado, tornillos de anclajes y mano de obra	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

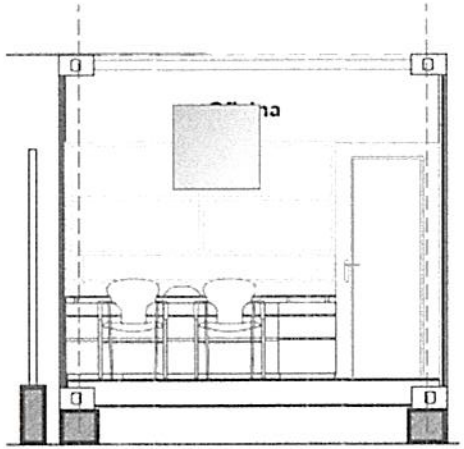

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESCOVAR ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO. Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-13								

CAPITULO	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
10.18	UNIDAD	Reposición punto sanitario PVC 4". Incluye desmonte punto existente, excavación, relleno y reposición accesorios.	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
Placa Caobos				2.00	2.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Subtotal	2.00
				Pasa....	
				TOTAL	2.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

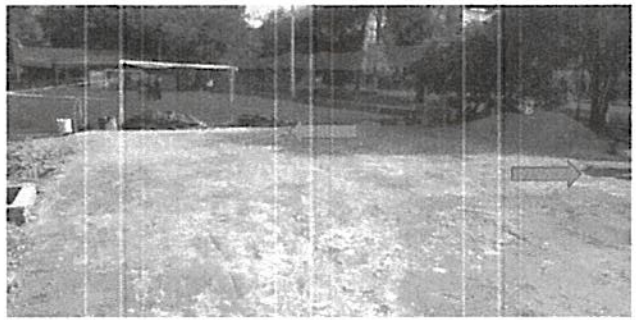

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-13								

CAPITULO	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
10.18	UNIDAD	Reposición punto sanitario PVC 4". Incluye desmonte punto existente, excavación, relleno y reposición accesorios.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

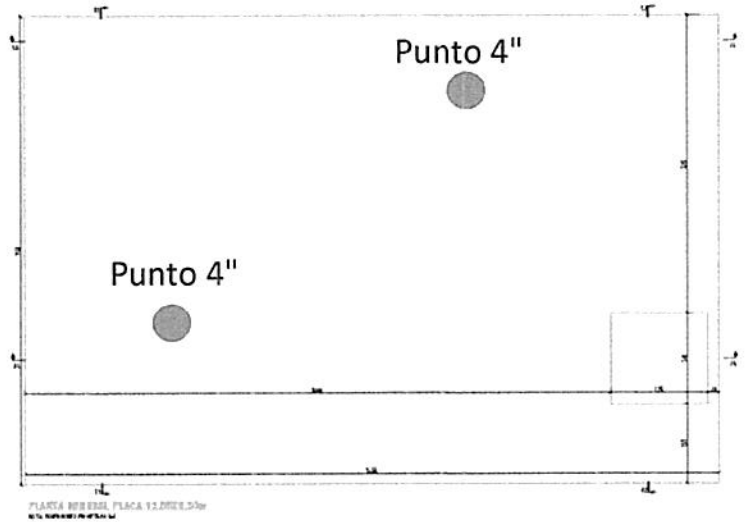

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPÍTULO	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
10.19	ML	Reposición tubería sanitaria PVC 2". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	5	13/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL	PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.		
BRAE salidas lavamanos y desague ducha	0.6			1.00	0.60	
	0.9			1.00	0.90	
	0.9			1.00	0.90	
	0.8			1.00	0.80	
					-	
				Subtotal	3.20	
				Pasa....		
				TOTAL	3.20	

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E. ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag.	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**CORTE No.**	**FECHA**
10.19	ML	Reposición tubería sanitaria PVC 2". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS E. SOLIMA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020 DE 2020 pag 1 de 2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.		
OFICINA:	ESTACION B-4		

CAPITULO		DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
ITEM No.	UNIDAD			
10		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
10.20	ML	Reposición tubería sanitaria PVC 3". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL	PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.		
BRAE ASEPCIA DESAGUE BAÑERA Y LAVAMANOS	0.8			1.00	0.80	
	0.6			1.00	0.60	
	0.58			1.00	0.58	
	0.8			1.00	0.80	
					-	
					-	
					-	
				Subtotal	2.78	
				Pesa....		
				TOTAL	2.78	

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**Nº CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	Pag	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO				
10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**CORTE No.**	**FECHA**
10.20	ML	Reposición tubería sanitaria PVC 3". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

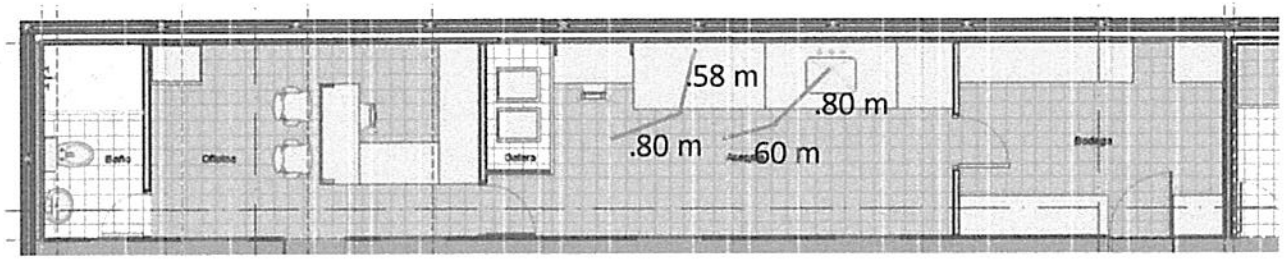

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ. JOSE MARIA SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ CARLOS ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO 620-2020 DE 2020 pag. 1 de 3
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.		
OFICINA:	ESTACION B-4		

CAPÍTULO	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
10.21	ML	Reposición tubería sanitaria PVC 4". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	5	13/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
BRAE	10.05			1.00	10.05
					-
Placa Caobos	19.5			1.00	19.50
	6.5			1.00	6.50
	7			1.00	7.00
					-
					-
				Subtotal	43.05
				Pasa....	
				TOTAL	43.05

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESCOBAR ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO 620-2020	DE	2020	pag.	2	de	3
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
10.21	ML	Reposición tubería sanitaria PVC 4". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

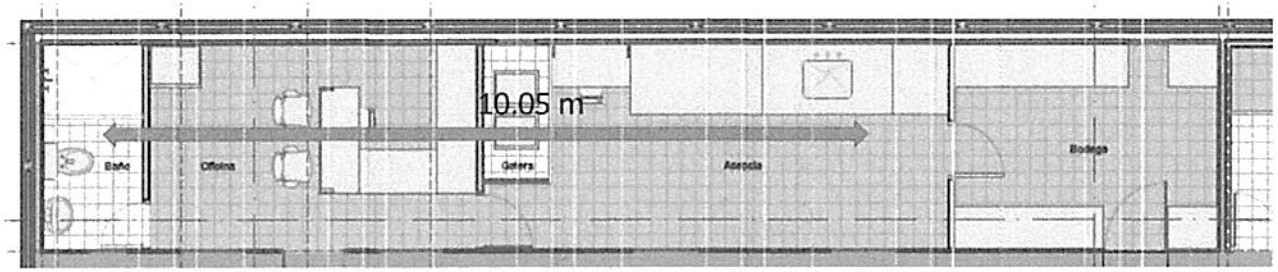

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ CARLOS ESQUIVA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO 620-2020	DE	2020	pag.	3	de	3
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO		
	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
10.21	ML	Reposición tubería sanitaria PVC 4". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

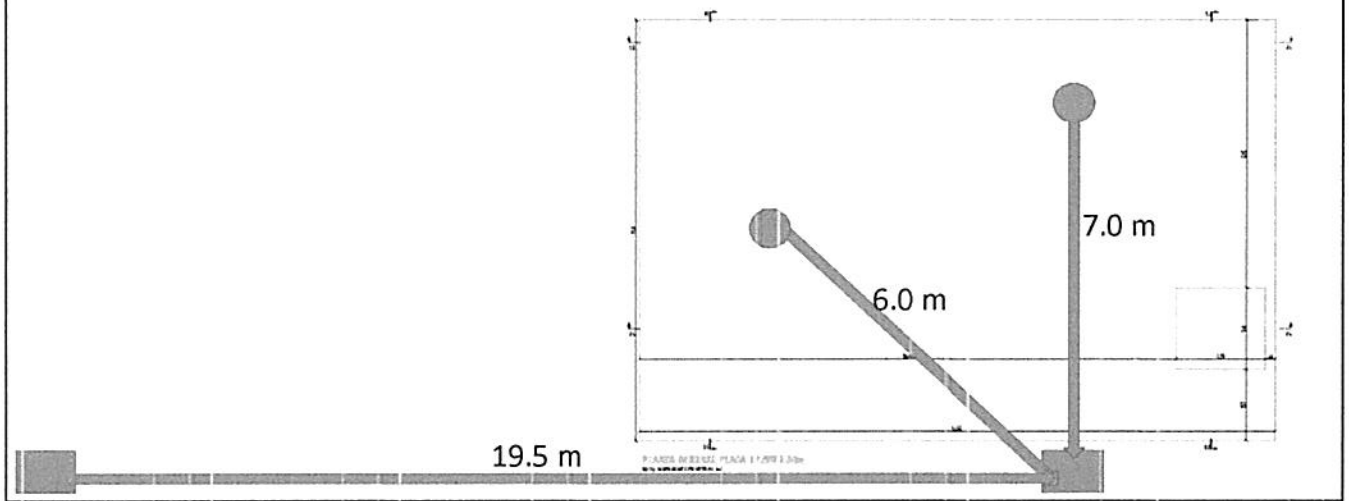

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INGI. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 CONTRATISTA DE OBRA	ARQ. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
INGI. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON CONTRATISTA DE OBRA	ARQ.CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-13								

CAPITULO	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**CORTE No.**	**FECHA**
10.24	UNIDAD	Reposición punto hidráulico agua fría PVC RDE-21 de 1/2" Incluye desmonte punto existente y reposición accesorios	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
Plaza Caobos				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Subtotal	1.00
				Pasa...	
				TOTAL	1.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

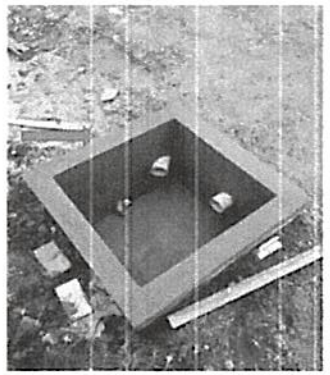

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504685
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyC Construcciones S.A.S.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS E. ESQUIVEL ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyC Construcciones S.A.S.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPÍTULO	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**CORTE No.**	**FECHA**
10.24	UNIDAD	Reposición punto hidráulico agua fría PVC RDE-21 de 1/2" Incluye desmonte punto existente y reposición accesorios	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

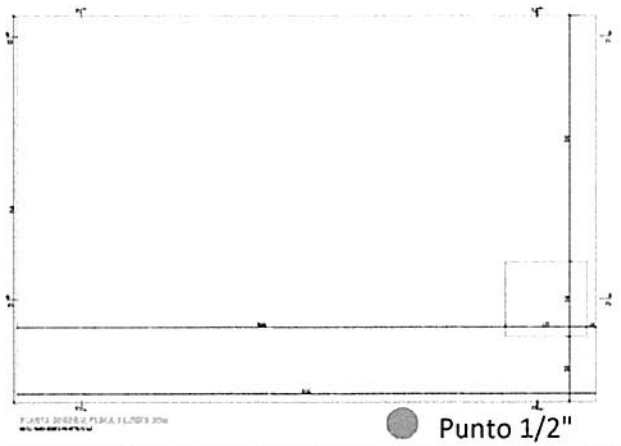

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020 DE 2020 pag. 1 de 2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.		
OFICINA:	ESTACION B-13		

CAPÍTULO		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**CORTE No.**	**FECHA**
10.29	ML	Reposición red de suministro tubería PVC presión 1/2". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
Placa caobos	19.5			1.00	19.50
	2			1.00	2.00
					-
					-
					-
					-
					-
				Subtotal	21.50
				Pasa....	
				TOTAL	21.50

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

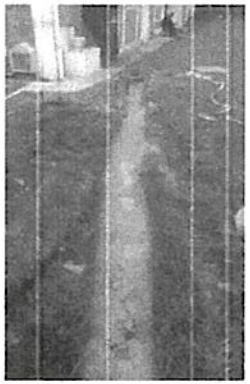

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. ROSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-13								

CAPITULO		
10		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
10.29	ML	Reposición red de suministro tubería PVC presión 1/2". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

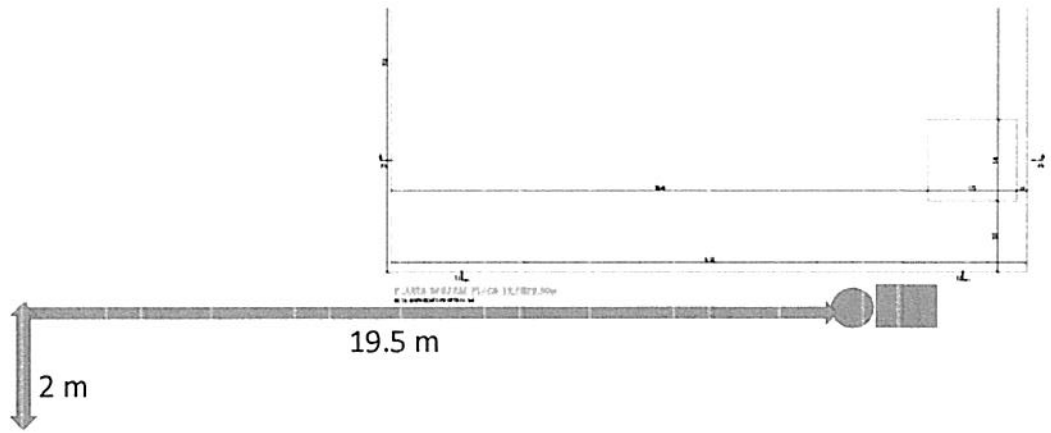

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO 620-2020	DE	2020	pag.	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO		
10		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION
10.30	ML	Reposición red de suministro tubería PVC presión 3/4". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.

CORTE No.	FECHA
5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
BRAE	10.5			1.00	10.50
	3.16			1.00	3.16


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
10.30	ML	Reposición red de suministro tubería PVC presión 3/4" Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

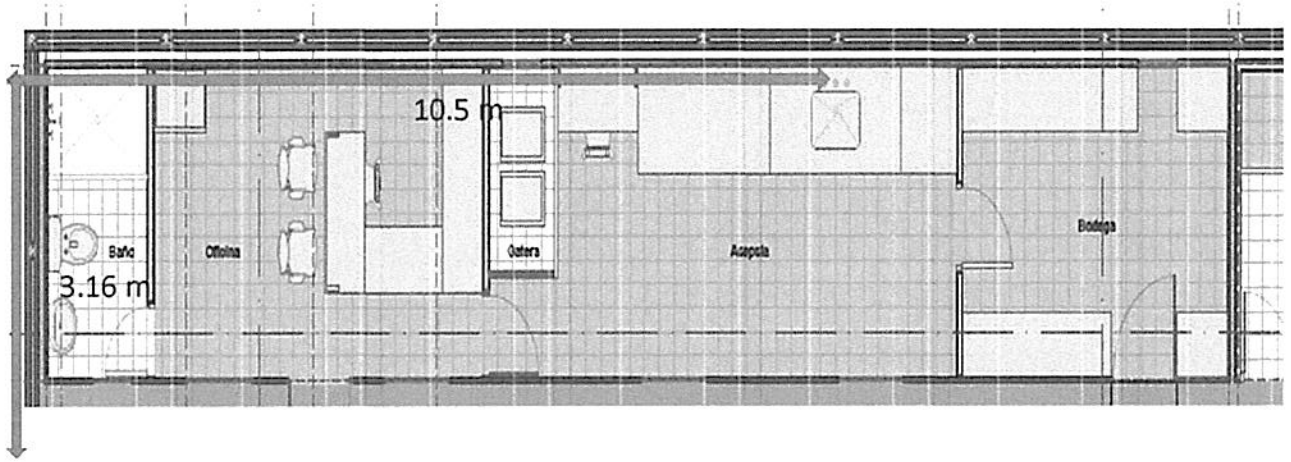

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
10.33	ML	Reposición red de suministro CPVC 1/2". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL	PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
BRAE ASEPCIA Y BAÑOS	9.3			1.00	9.30	
	1.9			1.00	1.90	
				Subtotal	11.20	
				Pasa....		
				TOTAL	11.20	

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**CORTE No.**	**FECHA**
10.33	ML	Reposición red de suministro CPVC 1/2". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

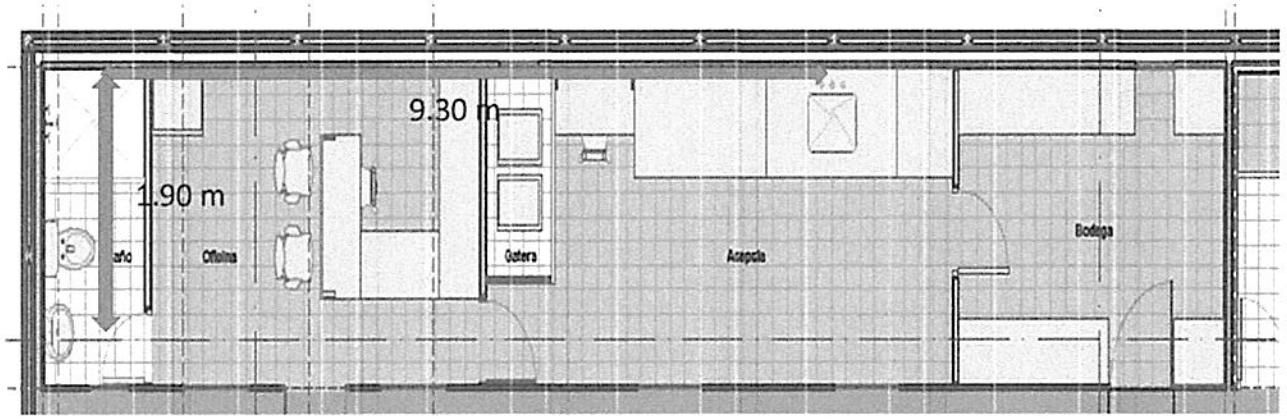

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag.	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO COMANDO								

CAPÍTULO	NP	NO PREVISTOS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CORTE No.	FECHA
NP20	ml	Silicona perimetral para ventaneria	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
ventana tipo V8 H	7.75			12.00	93.00
ventana tipo V9 C	7.75			3.00	23.25
ventana tipo V9 H	3			3.00	9.00
ventana tipo V8 C	7.75			12.00	93.00
ventana tipo V9 C	7.75			3.00	23.25
ventana tipo V9 H	3			3.00	9.00
					-
					-
					-
					-
Subtotal					250.50
Pasa...					
TOTAL					250.50

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

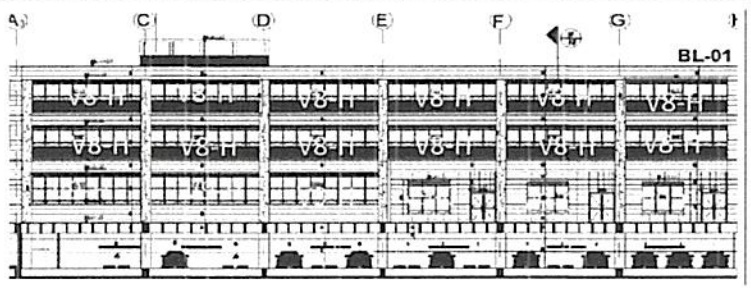

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	N° CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	EDIFICIO COMANDO								


CAPITULO	NP	NO PREVISTOS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
NP20	ml	Silicona perimetral para ventaneria	5	12/05/2021


PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





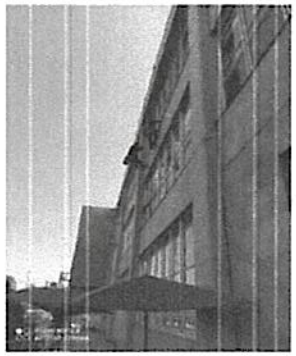



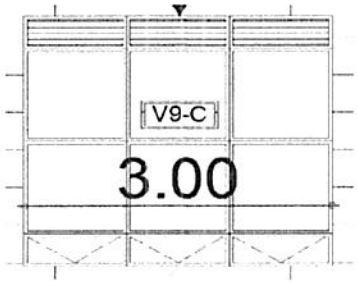

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las deper dencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	14	NO PREVISTOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP21	m2	Suministro e instalacion de muros en Super Board 6MM a dos (2) Caras	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
BAÑO BRAE	2.15		2.55	1.00	5.48
ASEPCIA	2.15		2.55	1.00	5.48
VANO PUERTAS	0.66		2.00	-2.00	-1.32
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Subtotal	9.65
				Pasa ...	
				TOTAL	9.65

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS E ESQUIVEL ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag.	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPÍTULO	14	NO PREVISTOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP21	m2	Suministro e instalacion de muros en Super Board 6MM a dos (2) Caras	5	12/09/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ CARLOS E ESCOBAR ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**Nº CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020 DE 2020 pag 1 de 2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las deper dencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.		
OFICINA:	ESTACION B-4		

CAPITULO	14	NO PREVISTOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP22	m2	Suministro e instalacion de muros en Super Board 8 MM a una cara incluye Frescasa	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
CONTENEDOR 40 PIES	12.05		2.55	2.00	61.46
	2.35		2.55	2.00	11.99
VANO PUERTAS Y VENTANAS	2		1.00	-2.00	-4.00
	0.8		0.90	-4.00	-2.88
	0.4		0.40	-1.00	-0.16
CONTENEDOR 20 PIES	5.898		2.39	2.00	28.19
	2.352		2.39	2.00	11.24
VANO PUERTAS Y VENTANAS	2		1.00	-1.00	-2.00
	0.8		0.90	-1.00	-0.80
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Subtotal	183.04
				Pasa...	
				TOTAL	183.04

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las deper dencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	14	NO PREVISTOS		
ITEM No	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP22	m2	Suministro e instalacion de muros en Super Board 6 MM a una cara incluye Frescasa	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
ING. DANIEL TRIANA RESIDENTE DE OBRA 1073504885 **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ. JOSE MARY SARMIENTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**
ING. EDELBERTO LOZANO DIRECTOR DE OBRA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON **CONTRATISTA DE OBRA**	ARQ. CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL R.L. GyG Construcciones S.A.S **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag.	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPÍTULO	14	NO PREVISTOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP23	UNIDAD	Fabricación e instalación de escaleras para acceso a los contenedores, con 3 huellas de 30 cm, contrahuellas de 18.6 cm en lamina alfajor 1/8 con estructura interna en tubo cuadrado de 1 1/2" Cal 18 con acabado en pintura electroestatica.	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
BRAE				3.00	3.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Subtotal	3.00
				Pasa....	
				TOTAL	3.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag.	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	14	NO PREVISTOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP23	UNIDAD	Fabricación e instalación de escaleras para acceso a los contenedores, con 3 huellas de 30 cm, contrahuellas de 16.6 cm en lamina alfajor 1/8 con estructura interna en tubo cuadrado de 1 1/2" Cal 16 con acabado en pintura electroestatica.	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS E. ESCOBAR ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	Nº CONTRATO DE OBRA	UAECOB-CONTRATO-620-2020	DE	2020	pag	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	14	NO PREVISTOS		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CORTE No.	FECHA
NP25	M3	Suministro e instalación de concreto 3000 psi para zapatas	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZAPATA TIPO 1	0.9	0.90	0.30	8.00	1.94
ZAPATA TIPO 2	1.4	0.70	0.30	8.00	2.35
SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATA TIPO 1	0.9	0.90	0.05	8.00	0.32
SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATA TIPO 2	1.4	0.70	0.05	8.00	0.39
			Subtotal		5.01
			Pasa....		
			TOTAL		5.01

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ CARLOS E ESCUVIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020 DE 2020 pag. 1 de 2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.		
OFICINA:	ESTACION B-13		

CAPÍTULO	14	NO PREVISTOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP26	UNIDAD	Suministro e instalacion de sistema de presion 2 bombas 1 tanque 200 lt	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
ESTACION CAOBOS SALAZAR				1.00	1.00
				Subtotal	1.00
				Pasa...	
				TOTAL	1.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pag.	1	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Ofic al de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	8			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
8.17	UNIDAD	Fabricación e instalación de puerta sencilla en lamina Coll Rod calibre 18 y terminación en pintura (2.00 x 1.00)	5	12/05/2021

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	MEDIDA TOTAL
BRAE 40 PIES				2.00	2.00
BRAE 20 PIES				1.00	1.00


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**N° CONTRATO DE OBRA**	UAECOB-CONTRATO-620-2020	**DE**	2020	pág	2	de	2
OBJETO:	PROYECTO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las deper dencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.								
OFICINA:	ESTACION B-4								

CAPITULO	14	NO PREVISTOS		
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP27	UNIDAD	Fabricación e instalación de puerta sencilla en lamina Coll Rod calibre 18 y terminación en pintura (2.00 x 1.00)	5	12/05/2021

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

ING. DANIEL TRIANA
RESIDENTE DE OBRA
1073504885
CONTRATISTA DE OBRA

ING. EDELBERTO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

ARQ. JOSE MARY SARMIENTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ.CARLOS E ESQUIVA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. GyG Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: ARLURICIO RAFAEL PARA PRADA C.C. N° 8.706.157 Chiquinquirá | REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] N° 4.784.117 Chiquinquirá
INTERVENTORIA: [illegible] | REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] C.C. N°


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL CONTRATO	VR. UNITARIO	ANTES	DESPUES	CORTE 3 CANTIDAD	CORTE 3 VR. TOTAL	ESTACION 5 ANTERIOR CANTIDAD	ESTACION 5 ANTERIOR VR. TOTAL	CORTE CANTIDAD	CORTE VR. TOTAL	DESTINO	RECIBIDO	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE SOLICITUD	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.1	Demolición y retiro a mano de pisos de cerámica, baldosín, tableta, etc., incluye cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	1,00	$ 17.577,00													0,00	$ 17.577,00	$ -
1.2	Demolición y retiro a máquina, de pisos en concreto reforzado, de 0 a entre 0,10 m, incluye cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	1,00	$ 43.940,00													0,00	$ 43.940,00	$ -
1.3	Demolición y retiro a máquina, de pisos en concreto reforzado, de 0 a entre 0,10 m, incluye cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	1,00	$ 59.907,00													0,00	$ 59.907,00	$ -
1.4	Demolición y retiro de muros en concreto, de 0,10 - 0,25 m, incluye cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	1,00	$ 43.940,00									ESTACION 04	OVD Construcciones S.A.S	5/05/2020	27/10/2020	44,45	$ 43.940,00	$ 1.953.601,30
1.5	Demolición y retiro de muros en ladrillo, de 0,10 - 0,25 m, incluye cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	1,00	$ 39.547,00													0,00	$ 39.547,00	$ -
1.6	Demolición estructural, mediante el corte de columnas, columnetas, viga aérea, viga cinta, etc., incluye equipo si se requiere, cargue y disposición de en sitio autorizado.	M3	1,00	$ 229.347,00													0,00	$ 229.347,00	$ -
1.7	Demolición de pisos y cinta en concreto y/o asfalto, incluye quema mezcla, retiro material de pega diseñado en pisos si se requiere y cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	1,00	$ 9.644,00													0,00	$ 9.644,00	$ -
1.8	Demolición de pañete en muros y losas (Sola), incluye limpieza y cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	1,00	$ 9.527,00													0,00	$ 9.527,00	$ -
1.9	Desmonte, apertura, cortina, pantalla, pantallones, cimbras, incluye recuperación de la puntual, relleno sobrante de fundo, protección y/o cubiertas hasta se requiere y retiro sobrantes a sitio autorizado.	UN	1,00	$ 21.459,00													0,00	$ 21.459,00	$ -
1.10	Desmonte y retiro de ventanas metálicas, y/o de madera, incluye protección durante si se requiere y retiro a sitio autorizado.	M2	1,00	$ 32.914,00													0,00	$ 32.914,00	$ -
1.11	Desmonte y retiro de estructura metálica (portón, cubierta, viga, etc.), incluye maquinas y retiro a sitio autorizado.	ML	1,00	$ 21.540,00													0,00	$ 21.540,00	$ -
1.12	Demolición manual, incluye cargue y retiro de escombros a botadero.	M3	1,00	$ 49.209,00							17,93	$ 2.954.744,69	ESTACION 8-17 CAOBOS	OVD Construcciones S.A.S	28/04/2020	13/10/2020	42,93	$ 49.209,00	$ 2.112.226,37
1.13	Retiro en material granular seleccionado tipo Recebo B-200, incluye extendido y compactado con equipo convencional.	M3	1,00	$ 64.809,00							39,26	$ 2.802.731,63	ESTACION 8-13 CAOBOS	OVD Construcciones S.A.S	7/04/2020	13/10/2020	39,26	$ 64.809,00	$ 2.802.731,63
1.14	Relleno con material seleccionado, compactado y de procedencia.	M3	1,00	$ 72.418,00													0,00	$ 72.418,00	$ -
1.15	Desarme y retiro de tuberías de todos los diámetros para redes de cárcamo con pasos hidráulicos, incluye hacia bajo, gabinetes, tapa, tapa flotante y reubicación de los mismos con niveles existentes.	UN	1,00	$ 17.137,00													0,00	$ 17.137,00	$ -
	PISOS-PISTAS																		
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO																		
2.1	Fundición y losa maciza en concreto de 3.000 a 4.000 PSI (1 pato a pato) e = 0,10 m, incluye suministro, formaleta y vaciado de concreto.	M2	1,00	$ 110.084,00													0,00	$ 110.084,00	$ -
2.2	Fundición y losa maciza en concreto de 3.000 a 4.000 PSI (1 pato a pato) e = 0,15 m, incluye suministro, concreto y vaciado de refuerzo, formaleta y vaciado de concreto.	M2	1,00	$ 116.754,00													0,00	$ 116.754,00	$ -
2.3	Fundición y losa en concreto reforzado en concreto de 3.000 a 4.000 PSI (1 pato a pato), e = 0,10 - 0,15 m, incluye suministro, concreto y vaciado de refuerzo vaciado de 10,5 mm y malla de 6 mm cada 0,20 m, incluye suministro, formaleta y vaciado de concreto.	M2	1,00	$ 116.754,00													0,00	$ 116.754,00	$ -
2.4	Preparación de losa en concreto con producto tipo "Vinilo Concentrado" para reparación de pisos, incluye limpieza y retiro de material suelto.	ML	1,00	$ 34.421,00													0,00	$ 34.421,00	$ -
2.5	Preparación de pase en concreto reforzado de 3.000 PSI con marco y contramarco en ángulo de 2" x 1/8" para viga de profundidad entre 0,20 x 0,60 x 1,00 x 1,20 m, incluye suministro y refuerzo en varilla No.	UN	1,00	$ 280.964,00													0,00	$ 280.964,00	$ -

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: MALDONADO RAFAEL PABA PINZON C.C. N° 8.706.107 Duitama | REPRESENTANTE LEGAL: MALDONADO RAFAEL PABA PINZON C.C. N° 8.706.107 Duitama

INTERVENTORIA: DyG Constructores S.A.S NIT REPRESENTANTE LEGAL: DIANA PAOLA ESCOBAR C.C. N°


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMAGEN 1	IMAGEN 2	ESTADO ACTIVIDAD	% EJECUCION	VALOR EJECUTADO	ESTACION DE BOMBEROS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EJECUCION CONTRACTUAL PARCIAL		
4.1	Fijacion de vigas de cimentacion, corona y/o muros en concreto	M3	1,00	$ 425.571,00						ESTACION 04	DyG Constructores S.A.S	03/07/2020	23/10/2020	0,00	$ 425.571,00	$ -
4.2	Concreto de 3000 psi (175 kg/cm²) para viga y columnas	ML	1,00	$ 79.240,00										0,00	$ 79.240,00	$ -
4.3	Tapa Ahella, 0.80 x 0.30 x 0.20 cm en concreto reforzado de 3000 psi incluye anclaje epoxico	UN	1,00	$ 118.997,00										0,00	$ 118.997,00	$ -
4.4	Suministro + instalación de anclajes de 3/8 Con adhesivo químico tipo epoxi empotrado + similar por 10 cm	UN	1,00	$ 20.549,00										0,00	$ 20.549,00	$ -
	SUB-TOTAL															
5	MAMPOSTERIA															
5.1	Pañetado fino sobre muros de ladrillo comun, e=0,015 m, incluye boruna y bolillos	M2	1,00	$ 69.834,00										0,00	$ 69.834,00	$ -
5.2	Pañetado fino en muros de ladrillo a la vista 1 o 2 caras, nivelado, e promedio = 0,015 m, incluye boruna y bolillos	M2	1,00	$ 93.917,00										0,00	$ 93.917,00	$ -
5.3	Pañetado impermeabilizado en muros e=2,0 cm, incluye boruna y bolillos	M2	1,00	$ 99.534,00										0,00	$ 99.534,00	$ -
5.4	Pañetado fino en dilatas e=2,0 cm, incluye boruna y bolillos	M2	1,00	$ 40.017,00										0,00	$ 40.017,00	$ -
5.5	Pañetado + filletes en bordes pretiles, incluye boruna y bolillos	ML	1,00	$ 157.640,00										0,00	$ 157.640,00	$ -
5.6	Suministro y instalación de anti-vandalico en aluminio, incluye demolición existente y su reparación	ML	1,00	$ 7.100,00										0,00	$ 7.100,00	$ -
5.7	Reconstrucción caja de inspección en bloque arcilla de 0,60 x 0,60 x 1,00 x 1,20 m, incluye demolición placa de concreto, excavación, instalación tramos de tuberías y/o accesorios si se requiere, pañetada y/o impermeabilizado	UN	1,00	$ 253.396,00			1,00	$ 253.396,00	ESTACION 04-13 CAMBIOS	DyG Constructores S.A.S	19/04/2021	23/10/2020	1,00	$ 253.396,00	$ 253.396,00
5.8	Canalización (tubería) en bloque, incluido y/o picada manual de 0 a 0,40 m apox, incluye descapote, excavación, relleno en mortero impermeable, e = 0,10 m, tendido doble cara en concreto, para 1,2 impermeabilizado, e = 1,5 cm, incluye Lifer o similar	ML	1,00	$ 10.453,00										0,00	$ 10.453,00	$ -
5.9	Regatas en muro (estilo bloque y/o pisos de concreto para tuberia de 1/2 a 3/4" incluye resane con mortero, retiro de escombros	ML	1,00	$ 26.750,00						ESTACION COMANDO CENTRO + SALA AMERICAS CENTRO	DyG Constructores S.A.S	08/12/2021	23/10/2020	1,00	$ 26.750,00	$ 26.750,00

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: ARMANDO RAFAEL PABA PINZON C.C. N° 9.296.107 Bogotá REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] C.C. N° 1.110.511.xxx

INTERVENTORIA: DyG Construcciones S.A.S. NIT REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] C.C. N°

										ESTADO DE CONTRATO		ESTADO SUPERVISOR		ESTADO INTERVENTOR						EJECUCIÓN CONTRACTUAL TOTAL		
2.10	Suministro e instalación de ventana en aluminio, marcoblack, fijo(s) y pintura en vinilo tipo 1 de 2 manos aspera entre 2.10m a 2.17 m	M2	1,05	77.949,00									ESPECIFICO COMANDO CRATORIO Y SALA AMBULANCIAS	DyG Construcciones S.A.S.	28/12/2020	27/12/2020	14,82	$ 77.949,00	$ 1.155.771,18
2.11	Suministro e instalación de ventana con glaseo blanco para abatimiento de 2mts x 2mts en fuertes.	ML	1,05	31.211,00													0,00	$ 31.211,00	$ -
2.12	Suministro e instalación de ventana en glaseo blanco para abatimiento de 2mts x 2mts en fuertes.	ML	1,05	31.214,00													0,00	$ 31.214,00	$ -
	SUB-TOTAL																		
3	PAREDES																		
3.1	Separación pañete liso muros T.A. incluye remates, limpieza (mano de obra, tipo y elaboración).	M2	1,05	21.281,00													0,00	$ 21.281,00	$ -
3.2	Resane pañete liso muros T.A. incluye remates, limpieza (mano de obra, tipo y elaboración).	M2	1,05	21.281,00													0,00	$ 21.281,00	$ -
3.3	Pañetes y filos liso T.A. bajo placa y/o cielo raso, incluye remates, limpieza (mano de obra, tipo y elaboración).	ML	1,05	17.186,00													0,00	$ 17.186,00	$ -
3.4	Pañete pañete liso T.A. bajo placa y/o cielo raso, incluye remates, limpieza (mano de obra, tipo y elaboración).	M2	1,05	17.186,00													0,00	$ 17.186,00	$ -
3.5	Separación pañete impermeabilizado T.A. muros y/o placas, incluye remates, limpieza (mano de obra, tipo y elaboración).	M2	1,05	18.140,00													0,00	$ 18.140,00	$ -
3.6	Pañete liso de impermeabilizado T.A. muros y/o placas, incluye remates, limpieza (mano de obra, tipo y elaboración).	M2	1,05	18.140,00													0,00	$ 18.140,00	$ -
3.7	Separación pañete, cubetas T.A. incluye remates, limpieza, mano de obra y elementos adicionales.	M2	1,05	21.281,00													0,00	$ 21.281,00	$ -
3.8	Pañete pañete cubetas T.A. incluye remates, limpieza y elementos adicionales.	M2	1,05	21.281,00													0,00	$ 21.281,00	$ -
3.9	Separación impermeabilizado, incluye remates, limpieza (mano de obra, tipo y elaboración).	ML	1,05	11.105,00													0,00	$ 11.105,00	$ -
	SUB-TOTAL																		$ -
4	PINTURAS																		
4.1	Preparación y pintura en vinilo tipo 1, 2 manos, sobre pañete y/o muros, incluye lijado y resanes que se requieran con enduido, remates limpieza (mano de obra, tipo y elaboración) color por definir.	M2	1,05	14.994,00													0,00	$ 14.994,00	$ -
4.2	Preparación pintura y pintura en vinilo tipo 1 (2 manos), incluye remates limpieza (mano de obra, tipo y elaboración) y color según ficha técnica/RAL	M2	1,05	17.206,00													0,00	$ 17.206,00	$ -
4.3	Preparación y pintura en esmalte satinado alta calidad (2 manos) para carpintería metálica sobre lámina lisa, incluye lijado y aplicación 2 manos de pintura anticorrosiva o de requerirse, remates limpieza y color indicado.	M2	1,05	16.876,00				102,23	$ 17.19	16,84			ESTALERA 3x4	DyG Construcciones S.A.S.	28/12/2020	27/12/2020	102,23	$ 16.914,20	$ 1.719.16,84
4.4	Preparación y pintura en esmalte satinado alta calidad (2 manos) para carpintería metálica sobre lámina lisa, incluye lijado y aplicación 2 manos de pintura anticorrosiva o de requerirse, color indicado.	ML	1,05	10.771,00													0,00	$ 10.771,00	$ -
4.5	Preparación y pintura en barniz mate super sintético (2 manos) y se carpintería en madera sobre lámina lisa, incluye lijado y resanes con masilla (tapa poros) si se requiere, remates limpieza y color indicado por la interventoría.	M2	1,05	37.734,00													0,00	$ 37.734,00	$ -
4.6	Preparación y pintura en esmalte mate super sintético y metálicos. Previo y/o similares (2 manos), para carpintería en madera sobre lámina lisa, incluye lijado y resanes con masilla, tapa poros y si se requiere pulido indicado por la interventoría.	ML	1,05	13.976,00													0,00	$ 13.976,00	$ -
4.7	Preparación pintura en humedad acrílica para exteriores, alta calidad (2 manos), incluye anclajes, rellenar en capas de pastas adhesivas, lijando con agua, incluye corrección fisuras y grietas con pintura elastomérica remates limpieza.	M2	1,05	35.567,00													0,00	$ 35.567,00	$ -

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: ARQUICO RAFAEL PARA PRADO C.C. N° 8.796.107 Oficio: REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO ALEJANDRO PRADO C.C. N° 79.777.086-4

INTERVENTORIA: DyG Construcciones S.A.S. NIT: REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FERNANDO [illegible] C.C. N°

									PORTIC COMANDO		ESTACION METROPOLITANA		ESTACION INTERMEDIA								EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTUAL		
5.2	Aplicación pintura intumescente para tipo área Corredores y/o similares, alta humedad fachada. Incluye limpieza inicial.	M2	1,00	47.730,00											EDIFICIO COMANDO	DyG Construcciones S.A.S	12/01/2021	27/10/2020	1.647,53	$ 47.730,00	$ 56.442.203,69
5.3	Pintura de rehabilitación Tipo Tráfico tipo Barras (Líneas divisorias) C manual.	ML	1,00	19.477,00											EDIFICIO COMANDO PARQUEADERO	DyG Construcciones S.A.S	28/12/2020	27/10/2020	771,44	$ 19.477,00	$ 15.053.963,08
5.4	Suministro y aplicación de pintura tráfico para tráfico de trabajos, parqueadero alta calidad (7 meses).	M2	1,00	37.300,00							181,47	$ 3.479.301,40			EDIFICIO COMANDO	DyG Construcciones S.A.S	03/03/2021	27/10/2020	231,59	$ 37.300,00	$ 8.177.544,24
5.5	Aplicación pintura en vinilo tipo 1 (3 manos) sobre cielorraso o dura. Incluye lijado de acre para lijados y retiros que se requieran en estos. Incluye limpieza final y retoques.	M2	1,00	19.165,00					1023,77	$ 19.165,00					EDIFICIO COMANDO	DyG Construcciones S.A.S	03/03/2021	27/10/2020	8.870,89	$ 19.165,00	$ 53.760.704,70
5.6	Aplicación pintura en esmalte sintético (3 manos) para cerramiento metálico (puertas por una sola cara o hojas fijas o con) puertas en hojalata una sola cara. Incluye retiro de una para lijada, empaste parcial, puertas en mueble duro si se requiere aplicación pintura anticorrosiva si se hubiera modificación de cuartos, a veces comunes, clavos, armarios, empastes de interruptores y tomas, emblemas, teléfono eléctrico guardacantones limpieza y retoques por pintura nueva aplicada.	M2	1,00	37.534,00															0,00	$ 37.534,00	$ -
5.13	Aplicación pintura en vinilo tipo 1 (3 manos) sobre columnas, vigas, dinteles en cabrista y demarcación dinteles en franja 0,10 -40a sobre marcos puertas y ventanas existentes una sola cara, incluye retiros en aguas y cubiertas en pintura estado con motivos si se requiere, empaste de protección marco, puertas y ya especialista modificación de muebles internos, cajas tomas, cajas, armarios, empaste y demás por pintura nueva aplicada.	ML	1,00	11.140,00															0,00	$ 11.140,00	$ -
5.14	Aplicación pintura en esmalte sintético 3 manos, para rejillas y puertas incluye retiro de obra para fuera carrito partes pintadas si se requiere aplicación pintura la corrosiva si se requiere limpieza y demás por pintura nueva aplicada.	M2	1,00	34.520,00															0,00	$ 34.520,00	$ -
	SUBTOTAL																		1,00		
6	PINTURA EN EXTERIOR																		1,00		
6.1	Retirado pisos en mortero e = 1,2 cm. Incluye aplicación productos anti vertos pintura está existente y retiro de escombros a botadero.	M2	1,00	31.331,00															0,00	$ 31.331,00	$ -

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: MAURICIO RAFAEL PABA PINEDA C.C. Nº 4.790.157 Bogotá REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO RAFAEL PABA PINEDA C.C. Nº 4.790.157 BOG

INTERVENTORIA: GMO Construcciones S.A.S NIT REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERNANDO GOMEZ C.C. VP

								PORTAL COMPRAS		ESTADO SAP (ITEM Y MONTO)		ESTADO SIPSE (CANTIDAD)						RECEPCIONES CONTRACTUALES PARCIAL		
5.1	Reparacion piso en Fondo ladrillo tenjer, 10 x 10 antideslizante incluye retiro de piso, material aislante y de pegante y pegado o similar, limpieza final y corte de piezas con maquina.	M2	1,00	$ 91.974,00									ESTACION B-4 FUENTE ARANDA	GMO Construcciones S.A.S			40,00	$ 91.974,00	$ 3.678.960,00
5.2	Reparacion Piso ceramico gris Tipo Cemento 50 X 50 ANTIDESLIZANTE, incluye retiro de piso, material aislante y de pegante y pegado o similar, limpieza final y corte de piezas con maquina.	M2	1,00	$ 97.472,00					36,00	$ 3.507.549,84			ESTACION B-4 FUENTE ARANDA	GMO Construcciones S.A.S	0307/2020	21/10/2020	36,00	$ 97.472,00	$ 3.507.549,84
5.3	Reparacion enchape Muro blanco 20 x 30, incluye retiro de las existentes y montaje de borde y detalles de piso de la se requiera, pegue y retiro de sobrantes a botadero incluye limpieza y cerramiento de baños.	M2	1,00	$ 77.146,00													0,00	$ 77.146,00	$ -
5.4	Reparacion cubierta tipo Onix, incluye suministro cubierta similar a la existente y montaje de borde y detalles de piso de la se requiera, pegue y retiro de sobrantes a botadero incluye limpieza y cerramiento de baños.	M2	1,00	$ 91.753,00					16,48	$ 1.511.224,91			ESTACION B-4 FUENTE ARANDA	GMO Construcciones S.A.S	0307/2020	21/10/2020	16,48	$ 91.753,00	$ 1.511.224,91
5.5	Reparacion guardaescoba h = 0,08 m en ceramica incluye retiro a botadero y pegado o similar.	ML	1,00	$ 20.902,00					88,29	$ 816.819,48			EDIFICIO COMANDO SALA AMIGA LAC SALITE	GMO Construcciones S.A.S	0309/2020	21/10/2020	88,29	$ 20.902,00	$ 1.845.941,58
5.6	Reparacion mediacaña en concreto f'c 4 impermeabilizado con producto tipo sika 1 o similares, h = 0,08 m, ir. Incluye demolición medicaña existente y retiro de escombros a botadero.	ML	1,00	$ 50.919,00													0,00	$ 50.919,00	$ -
5.7	Reparación media caña en granito, h = 0,08 m, incluye pegado con mezcla existente y retiro de escombros a botadero.	ML	1,00	$ 54.149,00													0,00	$ 54.149,00	$ -
5.8	Reparacion antejón en concreto entre h = 0,04 y 0,08 m, incluye retiro antejón fracturado, resane con su cultura existente en concreto fc:210 kgf/cm2 con arena semilavada, formaleta y cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	1,00	$ 74.597,00									EDIFICIO COMANDO	GMO Construcciones S.A.S	En EJECUCION	21/10/2020	0,00	$ 74.597,00	$ -
5.9	Pared enchapada con re nento blanco enchape piso y muros 0,60 m, incluye limpieza y adecuacion final.	M2	1,00	$ 9.606,00													0,00	$ 9.606,00	$ -
5.10	Reparacion filos antideslizantes para zonas humedas, incluye pegamento y cemento	ML	1,00	$ 11.520,00													0,00	$ 11.520,00	$ -
5.11	Reparacion filos antideslizantes para escalones y rampas en piso, incluye cemento existente	ML	1,00	$ 11.520,00													0,00	$ 11.520,00	$ -
5.12	Reparacion guardaescoba piedra h: 0,10 incluye pegante y retiro	ML	1,00	$ 29.162,00													0,00	$ 29.162,00	$ -
5.13	Demolicion de viga o fundacion y retiro, incluye y retiro de escombros a botadero	M2	1,00	$ 12.105,00													0,00	$ 12.105,00	$ -
5.14	Limpieza y retiro de la cubierta con vehiculo de izaje, retiro de escombros	M2	1,00	$ 29.736,00													930,00	$ 29.736,00	$ 10.985.731,20
5.15	Viga en Bloque incluye instalación	ML	1,00	$ 14.736,00													0,00	$ 14.736,00	$ -

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: ARQUESO RAFAEL PARA PINZON C.C. N° 8.700.107 Bogota REPRESENTANTE LEGAL VALOR DE LA CONTRATACION C.C. N° 8.700.107 Bogota
INTERVENTORIA: DyO Construcciones S.A.S NIT REPRESENTANTE LEGAL VALOR ESTIMADO ADICIONAL C.C. N°




																					EJECUCION CONTRACTUAL TOTAL		
3	MURO PETREL																				0,00		
																					0,00		
3.1	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 6 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	120.000,00															0,00	$ 120.000,00	$ -
3.2	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	150.000,00															0,00	$ 150.000,00	$ -
3.3	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 10 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	180.000,00															0,00	$ 180.000,00	$ -
3.4	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 12 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	210.000,00															0,00	$ 210.000,00	$ -
3.5	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 15 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	240.000,00															0,00	$ 240.000,00	$ -
3.6	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 19 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	270.000,00															0,00	$ 270.000,00	$ -
3.7	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 5 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	100.000,00															0,00	$ 100.000,00	$ -
3.8	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 6 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	120.000,00															0,00	$ 120.000,00	$ -
3.9	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	150.000,00															0,00	$ 150.000,00	$ -
3.10	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 10 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	180.000,00															0,00	$ 180.000,00	$ -
3.11	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 12 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	210.000,00															0,00	$ 210.000,00	$ -
3.12	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 15 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	240.000,00															0,00	$ 240.000,00	$ -
3.13	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 19 mm, incluye cortes, perforaciones, pulido de bordes, transporte, desperdicios, herramienta y mano de obra.	M2	1,00	270.000,00															0,00	$ 270.000,00	$ -
4	CARPINTERIA METALICA																					
4.1	Ajuste, reparación y mantenimiento de puerta metálica, incluye desmonte y montaje de la misma, cambio de bisagras, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	90.000,00															0,00	$ 90.000,00	$ -
4.2	Suministro e instalación de reja metálica de seguridad, incluye anclajes, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	120.000,00															0,00	$ 120.000,00	$ -
4.3	Suministro e instalación de baranda metálica para escalera, incluye anclajes, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte.	ML	1,00	150.000,00															0,00	$ 150.000,00	$ -
4.4	Suministro e instalación de pasamanos metálico para escalera, incluye anclajes, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte.	ML	1,00	120.000,00															0,00	$ 120.000,00	$ -
4.5	Suministro e instalación de escalera metálica tipo caracol, incluye anclajes, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte.	UN	1,00	2.500.000,00															0,00	$ 2.500.000,00	$ -
4.6	Suministro e instalación de escalera metálica recta, incluye anclajes, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte.	UN	1,00	1.800.000,00															0,00	$ 1.800.000,00	$ -
4.7	Suministro e instalación de puerta metálica de seguridad, incluye marco, hoja, cerradura, bisagras, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	350.000,00															0,00	$ 350.000,00	$ -
4.8	Suministro e instalación de ventana metálica fija, incluye marco, vidrio, anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	280.000,00															0,00	$ 280.000,00	$ -
4.9	Suministro e instalación de ventana metálica corrediza, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	320.000,00															0,00	$ 320.000,00	$ -
4.10	Suministro e instalación de ventana metálica proyectante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.11	Suministro e instalación de ventana metálica tipo persiana, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	350.000,00															0,00	$ 350.000,00	$ -
4.12	Suministro e instalación de ventana metálica tipo celosía, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	280.000,00															0,00	$ 280.000,00	$ -
4.13	Suministro e instalación de ventana metálica tipo basculante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.14	Suministro e instalación de ventana metálica tipo guillotina, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	320.000,00															0,00	$ 320.000,00	$ -
4.15	Suministro e instalación de ventana metálica tipo pivotante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.16	Suministro e instalación de ventana metálica tipo abatible, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.17	Suministro e instalación de ventana metálica tipo proyectante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.18	Suministro e instalación de ventana metálica tipo corrediza, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	320.000,00															0,00	$ 320.000,00	$ -
4.19	Suministro e instalación de ventana metálica tipo persiana, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	350.000,00															0,00	$ 350.000,00	$ -
4.20	Suministro e instalación de ventana metálica tipo celosía, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	280.000,00															0,00	$ 280.000,00	$ -
4.21	Suministro e instalación de ventana metálica tipo basculante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.22	Suministro e instalación de ventana metálica tipo guillotina, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	320.000,00															0,00	$ 320.000,00	$ -
4.23	Suministro e instalación de ventana metálica tipo pivotante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.24	Suministro e instalación de ventana metálica tipo abatible, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.25	Suministro e instalación de ventana metálica tipo proyectante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.26	Suministro e instalación de ventana metálica tipo corrediza, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	320.000,00															0,00	$ 320.000,00	$ -
4.27	Suministro e instalación de ventana metálica tipo persiana, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	350.000,00															0,00	$ 350.000,00	$ -
4.28	Suministro e instalación de ventana metálica tipo celosía, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	280.000,00															0,00	$ 280.000,00	$ -
4.29	Suministro e instalación de ventana metálica tipo basculante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.30	Suministro e instalación de ventana metálica tipo guillotina, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	320.000,00															0,00	$ 320.000,00	$ -
4.31	Suministro e instalación de ventana metálica tipo pivotante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.32	Suministro e instalación de ventana metálica tipo abatible, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.33	Suministro e instalación de ventana metálica tipo proyectante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.34	Suministro e instalación de ventana metálica tipo corrediza, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	320.000,00															0,00	$ 320.000,00	$ -
4.35	Suministro e instalación de ventana metálica tipo persiana, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	350.000,00															0,00	$ 350.000,00	$ -
4.36	Suministro e instalación de ventana metálica tipo celosía, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	280.000,00															0,00	$ 280.000,00	$ -
4.37	Suministro e instalación de ventana metálica tipo basculante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.38	Suministro e instalación de ventana metálica tipo guillotina, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	320.000,00															0,00	$ 320.000,00	$ -
4.39	Suministro e instalación de ventana metálica tipo pivotante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.40	Suministro e instalación de ventana metálica tipo abatible, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.41	Suministro e instalación de ventana metálica tipo proyectante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.42	Suministro e instalación de ventana metálica tipo corrediza, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	320.000,00															0,00	$ 320.000,00	$ -
4.43	Suministro e instalación de ventana metálica tipo persiana, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	350.000,00															0,00	$ 350.000,00	$ -
4.44	Suministro e instalación de ventana metálica tipo celosía, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	280.000,00															0,00	$ 280.000,00	$ -
4.45	Suministro e instalación de ventana metálica tipo basculante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.46	Suministro e instalación de ventana metálica tipo guillotina, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	320.000,00															0,00	$ 320.000,00	$ -
4.47	Suministro e instalación de ventana metálica tipo pivotante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.48	Suministro e instalación de ventana metálica tipo abatible, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.49	Suministro e instalación de ventana metálica tipo proyectante, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	300.000,00															0,00	$ 300.000,00	$ -
4.50	Suministro e instalación de ventana metálica tipo corrediza, incluye marco, hoja, vidrio, herrajes, pintura anticorrosiva y esmalte.	M2	1,00	320.000,00															0,00	$ 320.000,00	$ -

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: ARLINSKO RAFAEL PABA PINZON C.C. N° 9.276.167 Bogotá **REPRESENTANTE LEGAL** VALENTINA TELLEZ PINZON C.C. N° 1.019.117.089

INTERVENTORIA DyG Construcciones S.A.S **NIT** **REPRESENTANTE LEGAL** CARLOS FERNANDO DUQUE C.C. N°

																				RECEPCIONES CONTRATISTA PARCIAL			
2.6	Reparación hueco puerta en obra, 0.72 x 2.20 m de ancho x 3.20 m de altura en lámina cold rolled C.18, 3 capas anticorrosivo y color, marco metálico C.16, 3 capas anticorrosivo y color, incluye retiro de chapas y aplicación pintura anticorrosiva y esmalte (2 capas)	UN	1,00	250.374,00															0,00	$ 250.374,00	$ -
2.7	Reparación cajeo metálico puertas metálicas. Incluye suministro de materiales	UN	1,00	50.457,00															0,00	$ 50.457,00	$ -
2.8	Instalación abatible tipo bisagras convencionales puertas plataformas y otras. Incluye mampuesto y mortero	UN	1,00	130.368,00															0,00	$ 130.368,00	$ -
2.9	Reparación y mantenimiento en malla eslabonada, incluye desalambre y templado a las antiguas condiciones y aplicación pintura anticorrosiva (2 manos, y esmalte super protector (2 manos, en todos diámetros a la requerir	M2	1,00	161.462,00															0,00	$ 161.462,00	$ -
2.10	Reparación puerta grilla tipo batiente. Incluye retiro en aluminio, bisagras, y cerradero puerta exterior y trabajos a alto y bajo 3M2	M2	1,00	491.162,00															0,00	$ 491.162,00	$ -
2.11	Reparación malla plana/ grafila y cerramiento. Incluye elaboración en ángulo de 1 pulgada y refuerzos	M2	1,00	146.726,00															0,00	$ 146.726,00	$ -
2.12	Reparación de pasamanos en seguridad para puertas en madera y hierro en vidrio o similar	UN	1,00	280.842,00															0,00	$ 280.842,00	$ -
2.13	Reparación platina de el alomo de 1/2 para tanto puertas en vidrio	ML	1,00	41.286,00															0,00	$ 41.286,00	$ -
2.14	Reparación de pared y/o muro en lámina para ventana o puerta en desarrollo de 12-15 Lm, incluye pared en lámina perfil tipo omega Cold Rolled, soldadura, antioxidante, esmalte, Pintulux, Disolvente, Mantenimiento	ML	1,00	70.641,00															0,00	$ 70.641,00	$ -
2.15	Reparación barandas y pasamanos metálicos de escalera, incluye alumno de protección	ML	1,00	97.521,00															0,00	$ 97.521,00	$ -
2.16	Reparación de reja fija, enmallado en malla eslabonada cold rolled, incluye marco en ángulo de 1 pulgada, platinas y soldadura	M2	1,00	177.186,00															0,00	$ 177.186,00	$ -
2.17	Reparación de ventana metálica de 40*40 cm, lámina cold rolled, incluye marco con lámina cold rolled calibre 18 para hoja batiente para cerradero, cambios de anclajes y nuevo de obra	UN	1,00	261.368,00					1,00	$ 1.306.840,00		ESTACION B-4	DyG Construcciones S.A.S	22/04/2023	26/10/2020	5,00	$ 261.368,00	$ 1.306.840,00
2.18	Reparación de ventana metálica de 40*40 cm, lámina cold rolled incluye marco con lámina cold rolled calibre 18 para hoja batiente para cerradero, cambios de anclajes y nuevo de obra	UN	1,00	141.279,00					1,00	$ 141.279,00		ESTACION B-4	DyG Construcciones S.A.S	22/04/2023	26/10/2020	1,00	$ 141.279,00	$ 141.279,00
2.19	Reparación de batiente y cerradero a tanto de bisagra en ángulo de 1/2" y varilla a 3/4" de 1m., de longitud de un (1) de ancho	UN	1,00	222.511,00															0,00	$ 222.511,00	$ -
2.20	Reparación en alambre para reja batiente colgante de 4 x 6", en platina de 3/16" con ajustes para ambos lados de bisagra	UN	1,00	26.239,00															0,00	$ 26.239,00	$ -
2.21	Reparación de marco para rejilla en ángulo de 3/4" de medidas 1.05x0.30 m.	UN	1,00	30.274,00															0,00	$ 30.274,00	$ -
2.22	Cerramiento en malla eslabonada cal. 10	M2	1,00	175.800,00															0,00	$ 175.800,00	$ -
2.23	Puerta en malla eslabonada cal. 10, incluye chapas, Pasadores y Antideslizantes	M2	1,00	326.974,00															0,00	$ 326.974,00	$ -
2.24	Cuneta tipo U en lámina doble, incluye instalación	ML	1,00	97.520,00															0,00	$ 97.520,00	$ -
2.25	Fabricación e instalación de pasamanos metálicos en tubería A, N° 3+1 1/2 incluye soporte cada 1.5 mts soldados y pintados en anticorrosivo en pintura con dos (2) manos esquinas por aparte.	ML	1,00	176.967,00															0,00	$ 176.967,00	$ -
2.26	Reparación marcos para ventanas	UN	1,00	56.511,00								ESTACION COMANDO SALA ANEXA LACTANTE	DyG Construcciones S.A.S	09/12/2020	27/10/2020	1,00	$ 56.511,00	$ 56.511,00
	SUB-TOTAL															0,00		
3	**CARPINTERIA EN MADERA Y OFICINA ABIERTA**															0,00		
3.1	Ajuste e instalación puertas en madera entamborada, a = 1,00 - 1,20 m. Incluye desmonte y montaje a la respectiva reparación y ajustes.	UN	1,00	111.807,00												0,00	$ 111.807,00	$ -
3.2	Reparación puerta en triplex entamborada ancho = 0,80 - 0,70 m. Incluye desmonte puerta anterior, chapas y cambio tipo oficina	UN	1,00	428.917,00												0,00	$ 428.917,00	$ -

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: MAURICIO RAFAEL PABA PINZON C.C. N° 1.070.107 Duitama REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] C.C. N° 1.070.107 Duitama

INTERVENTORIA: DyG Construcciones S.A.S NIT: REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ESPARZA ESCOBAR C.C. N°





| | | |

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: MAURICIO RAFAEL PARA PRADA C.C. Nº 9.726.167 Orden a **REPRESENTANTE LEGAL** MAURICIO RAFAEL PARA PRADA C.C. Nº 9.726.167 Orden a

INTERVENTORIA: DyG Construcciones S.A.S **NIT** **REPRESENTANTE LEGAL** CARLOS FERNANDO [illegible] C.C. Nº

						PORTE COMANDO	ESTACIÓN 14 PATIOS Y ANEXOS	ESTACIÓN 15 CENTRO								EJECUCIÓN CONTRACTUAL TOTAL		
[illegible]	Reposicion punto sanitario P.V.C. 3". Incluye demolicion punto existente, excavacion, relleno y resane en el sitio.	UN	1,00	120.577,00								BRAE	DyG Construcciones S.A.S			1,00	$ 120.577,00	$ 141.279,00
[illegible]	Reposicion punto sanitario P.V.C. 4". Incluye demolicion punto existente, excavacion, relleno y resane en el sitio.	UN	1,00	144.948,00							2,00	ESTACION B-13 CAZUCA	DyG Construcciones S.A.S	DIA 17-2-23	27/10/2023	3,00	$ 144.948,00	$ 444.547,00
[illegible]	Reparacion tuberia sanitaria PVC 3". Incluye demolicion tuberia existente, excavacion, relleno y almacenamiento concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	ML	1,00	45.412,00	 							EDIFICIO COMANDO OPERATIVO Y SALA AMIGA LACTANTE	DyG Construcciones S.A.S			1,00	$ 45.412,00	$ 54.494,40
[illegible]	Reparacion tuberia sanitaria PVC 4". Incluye demolicion tuberia existente, excavacion, relleno y almacenamiento concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	ML	1,00	87.040,00	 							EDIFICIO COMANDO OPERATIVO Y SALA AMIGA LACTANTE	DyG Construcciones S.A.S	DIA 17-2-23	27/10/2023	3,21	$ 87.040,00	$ 151.514,67
[illegible]	Reposicion tuberia sanitaria PVC 4". Incluye demolicion tuberia existente, excavacion, relleno y almacenamiento concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	ML	1,00	87.774,00	 						40,00	$ 3.800.742,00	ESTACION B-13 CAZUCA	DyG Construcciones S.A.S	DIA 17-2-23	27/10/2023	40,00	$ 87.774,00	$ 3.800.742,00
[illegible]	Reparacion tuberia sanitaria de 6". Incluye demolicion tuberia existente, excavacion, relleno y almacenamiento concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	ML	1,00	197.952,00												0,00	$ 197.952,00	$ -
[illegible]	Reparacion tuberia sanitaria PVC 3". Incluye accesorios	ML	1,00	82.750,00												0,00	$ 82.750,00	$ -
[illegible]	Reparacion punto red agua fria PVC RDE-11 de 1/2". Incluye demolicion punto existente y resane en el sitio.	UN	1,00	122.094,00	 							BRAE	DyG Construcciones S.A.S			7,00	$ 122.094,00	$ 146.512,80

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a los inmuebles de los dependientes de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: MAURICIO RAFAEL PABA PIÑEROS C.C. Nº 8.708.107 Bogotá REPRESENTANTE LEGAL VALOR DEL CONTRATO $ 4.700.117.000,00

INTERVENTORIA: QUO Construcciones S.A.S NIT REPRESENTANTE LEGAL VALOR DEL CONTRATO $ 0,00

| | | |

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: MAURICIO RAFAEL PABA PINZON C.C. Nº 3.780.107 Duitama **REPRESENTANTE LEGAL** VALOR DE LA ADJUDICACIÓN $ 1.000.000.000 C.C. Nº 3.780.107 DUITAMA

INTERVENTORIA: GyO Construcciones S.A.S. **NIT** **REPRESENTANTE LEGAL** CARLOS EDUARDO LOZANO C.C. Nº



								EDIFICIO COMANDO		ESTACIÓN 14 PUENTE CARANDA		ESTACIÓN 19 LA CANDELARIA						EJECUCIÓN CONTRACTUAL TOTAL					
1.1.2.2	Reparación y gas red de suministro PVC 3" Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	40.164,00										EDIFICIO COMANDO UBATORIO Y SALA AMBULANCIA	GyO Construcciones S.A.S	09/12/2020	27/12/2020	1,00	$ 40.164,00	$ 40.164,00			
1.1.2.3	Reparación y gas red de suministro PVC 3" Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	47.621,00														0,00	$ 47.621,00	$ -			
1.1.2.4	Reparación universal roscada de suministro 3" + 2" Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	95.728,00														0,00	$ 95.728,00	$ -			
1.1.2.5	Reparación de red de suministro PVC 3" + 2" Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	25.988,00														0,00	$ 25.988,00	$ -			
1.1.2.6	Reparación unión roscada 2". Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	40.164,00														0,00	$ 47.164,00	$ -			
1.1.2.7	Reparación unión roscada 2". Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	40.969,00														0,00	$ 40.969,00	$ -			
1.1.2.8	Reparación unión roscada 2". Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	46.967,00														0,00	$ 46.967,00	$ -			
1.1.2.9	Reparación de Bandeja de . Incluye anclaje, Soldadura, retiro de soportes, empaquetadura, desmonte exterior y retiro en sitio.	UN	1,00	454.114,00														0,00	$ 454.114,00	$ -			
1.1.2.10	Reparación de escala Placa metálica , Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	191.737,00														0,00	$ 191.737,00	$ -			
1.1.2.11	Reparación de placa Placa metálica. Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	171.758,00														0,00	$ 171.758,00	$ -			
1.1.2.12	Reparación de chatarra Placa metálica. Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	118.795,00														0,00	$ 118.795,00	$ -			
1.1.2.13	Reparación de pega de mampostería Mampostería. Incluye del tanto adicional.	UN	1,00	51.889,00														0,00	$ 51.889,00	$ -			
1.1.2.14	Reparación aparatos sanitarios. Incluye cemento blanco y accesorios de montaje que se requieran.	UN	1,00	66.772,00														0,00	$ 66.772,00	$ -			
1.1.2.15	Reparación cerradura tipo institucional. Incluye grifería y elementos de montaje que se requieran.	UN	1,00	262.374,00														0,00	$ 262.374,00	$ -			
1.1.2.16	Reparación lavamanos tipo institucional. Incluye grifería y elementos de montaje que se requieran.	UN	1,00	191.737,00										EDIFICIO COMANDO UBATORIO Y SALA AMBULANCIA	GyO Construcciones S.A.S	09/12/2020	27/12/2020	1,00	$ 191.737,00	$ 191.737,00			
1.1.2.17	Reparación sanitario tipo institucional. Incluye grifería y elementos de montaje que se requieran.	UN	1,00	262.374,00														0,00	$ 262.374,00	$ -			
1.1.2.18	Reparación orinal tipo institucional. Incluye grifería y elementos de montaje que se requieran.	UN	1,00	191.737,00														0,00	$ 191.737,00	$ -			
1.1.2.19	Reparación urinal de 2". Incluye accesorios y desmonte exterior existente.	UN	1,00	171.750,00														0,00	$ 171.750,00	$ -			
1.1.2.20	Reparación urinal de 2". Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	171.863,00														0,00	$ 171.863,00	$ -			
1.1.2.21	Reparación Tee de 2" PVCsp, Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	42.756,00										EDIFICIO COMANDO UBATORIO Y SALA AMBULANCIA	GyO Construcciones S.A.S	09/12/2020	23/12/2020	1,00	$ 42.756,00	$ 42.756,00			
1.1.2.22	Reparación codo de 2" PVC. Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	47.412,00														0,00	$ 47.412,00	$ -			
1.1.2.23	Reparación accesorios galvanizados de 1/2" (Tee unión, niple) Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	39.600,00										BPAE	GyO Construcciones S.A.S			1,00	$ 39.600,00	$ 39.600,00			
1.1.2.24	Reparación chapa sobre de 3/4". Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	90.134,00														0,00	$ 90.134,00	$ -			
1.1.2.25	Reparación bisagra sencilla.	UN	1,00	37.857,00														0,00	$ 37.857,00	$ -			
1.1.2.26	Reparación tapón macho PVC de 1/2" incluye desmonte exterior.	UN	1,00	6.216,00														0,00	$ 6.216,00	$ -			
1.1.2.27	Reparación de niple galvanizado de 2" hasta 40 cm.	UN	1,00	29.256,00														0,00	$ 29.256,00	$ -			
1.1.2.28	Reparación niple 1 1/4" hasta 40 cm., incluye accesorios, incluye el desmonte del existente.	UN	1,00	29.256,00														0,00	$ 29.256,00	$ -			
1.1.2.29	Reparación adaptador macho PVC de 1", incluye desmonte exterior y soldadura P.C.	UN	1,00	8.237,00														0,00	$ 8.237,00	$ -			
1.1.2.30	Reparación adaptador macho PVC de 3", incluye desmonte exterior y soldadura P.C.	UN	1,00	7.506,00														0,00	$ 7.506,00	$ -			
1.1.2.31	Reparación codo 1 1/2 galvanizado para presión roscar, incluye desmonte exterior.	UN	1,00	36.027,00														0,00	$ 36.027,00	$ -			
1.1.2.32	Reparación tee 1 1/2 galvanizada para presión roscar, incluye desmonte exterior.	UN	1,00	36.027,00														0,00	$ 36.027,00	$ -			
1.1.2.33	Reparación y retiro de tubería Mampostería. Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	120.107,00														0,00	$ 120.107,00	$ -			
1.1.2.34	Reparación de pendón Mampostería. Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	78.722,00														0,00	$ 78.722,00	$ -			
1.1.2.35	Reparación de Bajo P.V.C. de 3" a 2" Incluye desmonte exterior.	UN	1,00	62.276,00														0,00	$ 62.276,00	$ -			
1.1.2.36	Reparación accesorios de presión PVC de 3 1/2 Unión, Reducción, Codo, y Tee). Incluye retiro existente.	UN	1,00	59.101,00														0,00	$ 59.101,00	$ -			
1.1.2.37	Reparación La válvula para lavamanos, sanitario y lavadero.	UN	1,00	27.199,00														0,00	$ 27.199,00	$ -			
1.1.2.38	Reparación de Bajo P.V.C. 4" a 3" y 4" a 2" incluye retiro del sitio exis.	UN	1,00	30.709,00														0,00	$ 30.709,00	$ -			
1.1.2.39	Reparación de universal de 2" P.V.C. incluye desmonte exterior.	UN	1,00	19.961,00														0,00	$ 19.961,00	$ -			

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: VALDIRSO RAFAEL PABA PINZON C.C. N° 9.270.127 Chiquinquirá REPRESENTANTE LEGAL VALDIRSO RAFAEL PABA PINZON C.C. N° 9.270.127 Chiquinquirá

INTERVENTORIA: DyG Construcciones S.A.S NIT REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERNANDO LOZADA C.C. N°

						EDIFICIO COMANDO		ESTADO Y APTITUD Y MANGA		ESTACION BOMBEROS						EJECUCIÓN CONTRACTUAL TOTAL		
	Provision de tubería de presión de 1/2" de PVC incluye retiro de la existente	ML	1,00	$ 51.210,00							EDIFICIO COMANDO ORATORIO Y SALA AMIGA LACTANTE	DyG Construcciones S.A.S	04/12/2023	31/12/2030	0,24	$ 12.210,00	$ 73.454,40
	Reparación de artículos de presión PVC 1/2" Tuberías, conexiones tee, Bujes, tapones y accesorios, incluye retiro del existente	UN	1,00	$ 38.964,00											0,00	$ 38.964,00	$ -
	Reparación de artículos de presión PVC 1 1/2" Tuberías, conexiones tee, Bujes, tapones y accesorios, incluye retiro del existente	UN	1,00	$ 37.631,00											0,00	$ 37.631,00	$ -
	Instalación unitaria Chek red de 2" incluye retiro del existente	UN	1,00	$ 28.347,00											0,00	$ 28.347,00	$ -
	Reparación de muelle sanitario incluye sombra	UN	1,00	$ 42.590,00											0,00	$ 42.590,00	$ -
	Reparación de tapones para tanqueria y/o lavadero en porcelana y metálicos.	UN	1,00	$ 9.660,00											0,00	$ 9.660,00	$ -
	Instalación de Chapas de 28ft de 1 1/2"	UN	1,00	$ 28.347,00											0,00	$ 28.347,00	$ -
	Reparación e instalación de adaptadores en bronce de 1" para el riego	UN	1,00	$ 64.971,00											0,00	$ 64.971,00	$ -
	Reparación de accesorios de PVC 1" (codos, Tee, uniones, Bujes)	UN	1,00	$ 33.249,00											0,00	$ 33.249,00	$ -
	Reparación manga de 1" incluye retiro existente.	UN	1,00	$ 97.307,00											0,00	$ 97.307,00	$ -
	Instalación y Tome para lluvia para bomberos incluye retiro de la existente y retiro de escombros	UN	1,00	$ 136.205,00											0,00	$ 136.205,00	$ -
	Reparación de válvula de cierre rosadas de 3/4" de tubería de presión de 3/4 pg de Bronce para vapor	UN	1,00	$ 139.147,00											0,00	$ 139.147,00	$ -
	Suelta y Reacoplamiento de tubería (Agua fría (Agua, aire y vapor) en 3/4 pg)	ML	1,00	$ 17.106,00											0,00	$ 17.106,00	$ -
	Instalación de accesorios de PVC SCP (Codos, Tee, Uniones, Bujes Adaptadores, Universales) incluye retiro de la existente	UN	1,00	$ 17.486,00											0,00	$ 17.486,00	$ -
	Reparación de accesorios de PVC 1/2" (Codos, Tee, Uniones, Bujes Adaptadores, Universales)	UN	1,00	$ 27.647,00		 					EDIFICIO COMANDO ORATORIO Y SALA AMIGA LACTANTE	DyG Construcciones S.A.S	04/12/2023	31/12/2030	0,00	$ 27.647,00	$ 167.075,00
	Reparador tanque flotador	UN	1,00	$ 17.486,00											0,00	$ 17.486,00	$ -
	Reparación pileta urinales incluye desmonte del existente	UN	1,00	$ 151.372,00											0,00	$ 151.372,00	$ -
	Reparación Bidoue en Cobre con válvula para fregar incluye suministro del mismo	UN	1,00	$ 78.686,00											0,00	$ 78.686,00	$ -
	Reparación cana entrada o descarga hidráulica del fluxometro incluye retiro y escoba.	UN	1,00	$ 87.779,00											0,00	$ 87.779,00	$ -
	Reparación y/o tubería de presión de 1 1/2" de PVC incluye retiro de la existente.	ML	1,00	$ 67.147,00											0,00	$ 67.147,00	$ -
	Reparación de accesorios de presión PVC 4" (codos, tees,cruces, bus, Bujes, tapones y accesorios) incluye retiro del existente	UN	1,00	$ 74.779,00											0,00	$ 74.779,00	$ -
	Rejilla perimetral	ML	1,00	$ 11.607,00							EDIFICIO COMANDO ORATORIO Y SALA AMIGA LACTANTE	DyG Construcciones S.A.S	30/01/2023	27/10/2030	0,00	$ 11.607,00	$ -
	Reparación y instalación empaque flotador para tapa	UN	1,00	$ 35.897,00											0,00	$ 35.897,00	$ -
	Reparación grifería de lavatorios tipo bar, lavamanos, lavaplatos, ducha y pedestal, incluye mano de obra	UN	1,00	$ 161.933,00											0,00	$ 161.933,00	$ -
	Suministro e instalación de tanque plástico alto de 1000 L	UN	1,00	$ 332.476,00											0,00	$ 332.476,00	$ -
	Suministro e instalación de tanque plástico de 750 de 1000 L	UN	1,00	$ 291.960,00											0,00	$ 291.960,00	$ -
	Suministro e instalación de codos de unión universal desde 1" 1/2" hasta 3" para incrustarlos en tanques de agua de 2" o 3" pulg	UN	1,00	$ 37.196,00											0,00	$ 37.196,00	$ -
	Suministro e instalación flotador completo de cobre 1" para trabajo vertical en tanque de almacenamiento	UN	1,00	$ 165.139,00											0,00	$ 165.139,00	$ -
	Suministro e instalación de flexibles en acero inoxidable de aproximadamente Cable 0,60 mt	UN	1,00	$ 144.442,00											0,00	$ 144.442,00	$ -
	SUB-TOTAL														0,00		
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y OTRAS. TODOS LOS SUMINISTROS DE LOS REPUESTOS DEBEN CUMPLIR CON NORMA TÉCNICA RETIE Y RETILAP**														0,00		
	Reparación automático de 15" Amp. Incluye borneria protección	UN	1,00	$ 77.704,00											0,00	$ 77.704,00	$ -
	Reparación automático de 20 Amp. Incluye borneria externa	UN	1,00	$ 77.704,00											0,00	$ 77.704,00	$ -
	Reparación automático de 30 Amp. Incluye borneria externa	UN	1,00	$ 77.704,00											0,00	$ 77.704,00	$ -
	Reparación automático de 40 Amp. Incluye borneria externa	UN	1,00	$ 77.704,00											0,00	$ 77.704,00	$ -
	Reparación termomagnetico trifasico de 63 Amp. Incluye borneria externa Tipo riel	UN	1,00	$ 127.151,00											0,00	$ 127.151,00	$ -
	Reparación interruptor de 3x30 incluye borneria externa	UN	1,00	$ 125.960,00											0,00	$ 125.960,00	$ -
	Reparación interruptor de 3x50 incluye borneria externa	UN	1,00	$ 160.711,00											0,00	$ 160.711,00	$ -
	Reparación Contactor industrial de 150 Amp. Incluye borneria externa	UN	1,00	$ 211.911,00											0,00	$ 211.911,00	$ -

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: ARMANDO RAFAEL PABA PINZON C.C. N° 6.790.107 Bogotá REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] C.C. N° [illegible]

INTERVENTORIA: GyG Constructores S.A.S. NIT: REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO [illegible] C.C. N°

| | | |

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: SERVICIO RAFAEL PABA PINZON C.C. N° 4.290.167 Bogotá REPRESENTANTE LEGAL VALOR DE LA CONTRATACIÓN $ 1.767.309.000

INTERVENTORIA: CONSORCIO UAECOB UT REPRESENTANTE LEGAL CARLOS EDUARDO ESCOBAR DE LA P.

																						EJECUCIÓN CONTRACTUAL TOTAL	

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de los diferentes de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: ANDRES RAFAEL PARA PINEDA C.C. N° 8.298.107 DE [illegible] REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]

INTERVENTORIA: [illegible] REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]

																				EJECUCIÓN CONTRACTUAL TOTAL		
	Reparación de tubos fluorescentes tipo T5, incluye retiro del tubo antiguo y disposición final.	UN	1,00	39.956,00															0,00	$ 39.956,00	$ -
	Suministro e instalación de tubo led 2 pines enfriado, alimentado únicamente en un punto, incluye base para encender.	UN	1,00	77.764,00															0,00	$ 77.764,00	$ -
	Suministro e instalación de bombillo de incandescente de 100 watts.	UN	1,00	87.530,00															0,00	$ 87.530,00	$ -
	Instalación de Canaleta Ranurada 25x25 mm, incluye retiro de la anterior.	ML	1,00	39.956,00															0,00	$ 39.956,00	$ -
	SUB-TOTAL																		0,00		$ -
12	CERRADURAS Y LLAVES																		0,00		$ -
	Cambio de puertas incluye juego de 3 Bisagras.	UN	1,00	31.281,00															0,00	$ 31.281,00	$ -
	Reparación cerradura tipo oficina, incluye suministro cerradura existente y juego de Bisagras.	UN	1,00	300.219,00															0,00	$ 300.219,00	$ -
	Instalación cerradura tipo industrial de seguridad, incluye suministro cerradura existente y juego de Bisagras.	UN	1,00	194.125,00															1,00	$ 194.125,00	$ 194.125,00
	Reparación cerradura de seguridad tipo puerta, incluye suministro cerradura existente y juego de Bisagras.	UN	1,00	211.779,00															0,00	$ 211.779,00	$ -
	Reparación cerradura sobre de madera, incluye suministro cerradura existente y juego de Bisagras.	UN	1,00	36.731,00															0,00	$ 36.731,00	$ -
	Instalación de cerradura de seguridad tipo puerta con manija y cilindro, incluye retiro anterior.	UN	1,00	97.627,00															0,00	$ 97.627,00	$ -
	Instalación de manijas en pasadores para puertas metálicas de 2 hojas.	UN	1,00	226.209,00															0,00	$ 226.209,00	$ -
	SUB-TOTAL																		1,00		
13	APARATOS EQUIPOS ESPECIALES																		0,00		
	Diagnostico y mantenimiento preventivo de la red y de los de Equipos de Protección contra incendios o tipo de agua (rociadores) a la exigido a la NFPA 25 ULTIMA EDICION. Este mantenimiento debe realizarse de acuerdo al manual de mantenimiento de cada uno de los equipos, incluye mano de obra para limpieza y lubricación del sistema, no incluye cambio de repuestos, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Semestral y Equipo	1,00	2.367.627,00															0,00	$ 2.367.627,00	$ -
	Diagnostico y mantenimiento preventivo de las Lámparas y cableados de las estaciones de bombeos. El cual incluye El mantenimiento del guardador los componentes electricos y electrónicos corrección de fugas en la red, donde posiblemente agua con cambio de componentes y los más mecánicos. El mantenimiento se hará trimestral [illegible]	Bimensual/3 Equipo	1,00	2.014.241,00															0,00	$ 2.014.241,00	$ -
	Diagnostico y mantenimiento preventivo periodico de Planta Electrica entre 50 Kva - 70 Kva instaladas en las estaciones de Bomberos, incluye transferencia electrica. Este mantenimiento debe realizarse de acuerdo al manual de mantenimiento de cada uno de los equipos, no incluye cambio de repuestos, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, cambio de aceite, filtros refrigerante.	Semestral y Planta	1,00	2.149.652,00															0,00	$ 2.149.652,00	$ -
	Diagnostico y mantenimiento preventivo de Planta Electrica encontrada por encima 300 kva marca MOTOR SYSTEMS Generador Stamford capacidad 562 kw voltaje 220 trifasico, incluye transferencia electrica. Este mantenimiento debe realizarse de acuerdo al manual de mantenimiento de cada uno de los equipos, no incluye cambio de repuestos, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, cambio de aceite, filtros, refrigerante.	Semestral y Planta	1,00	4.541.134,00															0,00	$ 4.541.134,00	$ -
	Diagnostico, mantenimiento preventivo de equipos de extractores de monoxido de carbono. Este mantenimiento debe realizarse de acuerdo al manual de mantenimiento de cada uno de los equipos, no incluye cambio de repuestos, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Semestral x Equipo	1,00	454.114,00															0,00	$ 454.114,00	$ -
	Diagnostico, mantenimiento preventivo del sistema de control y lucha electrico del Eramo y Turco de la Estación de bomberos de la [illegible]	Semestral x Equipo	1,00	504.570,00															0,00	$ 504.570,00	$ -
	Revision, Ajustes y Diagnostico de instalaciones electricas con Analizador de Redes en las subestaciones de la UAECOB.	x Estación	1,00	1.513.711,00															0,00	$ 1.513.711,00	$ -
	Diagnostico, mantenimiento preventivo de equipos de presión compuestos por dos motobombas, Tanque Hidroneumatico, tablero de control y mandos, Tuberias y Accesorios, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento (cambio de membranas, chapas, presostatos y válvulas si se requiere), no incluye cambio de repuestos.	Trimestral/ Equipo	1,00	454.921,00															0,00	$ 454.921,00	$ -
	SUB-TOTAL																		0,00		
NP	NO PREVISTOS																		0,00		
	Retiro, rotulado y demolición de superficie pintura señalización bahía peatonal	ML	[illegible]	$ 12.127,00													ESTADIO COMANDO FAP GUE 4DER DE	CHG Construcciones S.A.S	29/11/2021	23/12/2021	1443,00	$ 12.127,00	$ 1.894.605,00

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-628-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: MAURICIO RAFAEL PARA PINZON C.C. N° 8.296.157 Bogotá | REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO RAFAEL PARA PINZON C.C. N° 8.296.157 Bogotá
INTERVENTORA: UAO Constructores S.A.S. NIT. | REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FERNANDO DIAZ C.C. N°

								EJECUCION CONTRACTUAL		EJECUCION ACTUAL PERIODO		EJECUCION ACUMULADO						EJECUCION CONTRACTUAL TOTAL		
	Fabricación e instalación de cerramiento en malla eslabonada #10 H: 2.40 con malla instalada en angulos de 1" x 1/8, cada 3.00 m. Un barandal malla tipo metalico en tubo cuadrado de 1 1/2 cal 18 (medida de anclaje de 50.00 x .2.10, pintado en esmalte negro, mas suministro, e instalacion en cumbrera "EMERGENCIA"	UN	1	$ 6.430.757,20										ESTACION POLICIA B-14	OJO Construcciones S.A.S	15/10/2020	15/12/2020	3,00	$ 6.430.757,20	$ 12.861.426,29
	Desmonte de las 2 mallas para cambio de bisagra instalacion y puesta en funcionamiento del motor y cerrar en funcionamiento la cortina existente "EMERGENCIA"	UN	1	$ 2.315.550,20										ESTACION POLICIA B-14	OJO Construcciones S.A.S	04/12/2020	04/12/2020	1,00	$ 2.315.550,20	$ 2.315.550,20
	Pulimento pulpable en emulsión acrílica h = 0.25 y 0.20 m, incluye todo trabajo de preparación, reparación estructural existente y el retiro, B-200 bulk con pintura semibrillante, remates finales y limpieza y retiro de escombros a botadero.	M2	470	$ 82.534,80										EDIFICIO COMANDO PARQUE-CEFE 05	OJO Construcciones S.A.S	02/07/2020	27/10/2020	856,21	$ 82.724,80	$ 31.731.756,71
	Retiro, resane y aplicación de superficie para redistribuir la lámina en ventanería.	ML	200	$ 4.915,67										EDIFICIO COMANDO	OJO Construcciones S.A.S	02/07/2020	27/10/2020	252,89	$ 4.915,67	$ 1.218.920,34
	Sikaco permeabilizante	ML	200	$ 5.353,44				260,00	$ 1.253.264,72					EDIFICIO COMANDO	OJO Construcciones S.A.S	02/07/2020	27/10/2020	260,00	$ 5.076,44	$ 1.253.264,72
	Suministro e instalación de nueva en Super Board EMAlu de 0,4 mm	M2	10	$ 54.410,14				9,00	$ 614.445,66					ESTACION B-4	OJO Construcciones S.A.S	En EJECUCION	27/10/2020	9,00	$ 54.410,14	$ 614.445,66
	Suministro e instalación de nueva en Super Board 6 Mil Ivory Para Hollow Precast	M2	100,000	$ 72.334,20				9,00	$ 651.017,84					ESTACION B-4	OJO Construcciones S.A.S	En EJECUCION	27/10/2020	107,84	$ 72.334,20	$ 651.017,84

CUADRO CONTROL ACTA DE OBRA 5 UAECOB-CONTRATO-620-2020

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el mantenimiento a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

CONTRATISTA: MAURICIO RAFAEL PARA PINZON C.C. N° 9.730.107 Duitama REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO RAFAEL PARA PINZON C.C. N° 9.730.107 Duitama

INTERVENTORIA: DyG Construcciones S.A.S. NIT. REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ENRIQUE BAQUERO C.C. N°

						EJECUCION CONTRACTUAL ANTERIOR			EJECUCION ACTUAL E INMEDIATA			EJECUCION ESTE CORTE						EJECUCION CONTRACTUAL TOTAL		
5.2.1.1	Fabricación e instalación de escalera para acceso a los contenedores con 3 huellas en 20 cm, contrahuellas de 18,5 cm, ancho de 60 cm, 14 pasos incluye baranda en los costados de 1.10 m de altura según se indica en los costados de los contenedores.	UN	7	$ 742.761,94		3,00	$ 2.228.285,84					ESTACION B-4	DyG Construcciones S.A.S	EN EJECUCION	27/10/2020	3,00	$ 742.761,94	$ 2.228.285,84
5.2.1.2	Suministro e instalación de contrahuella 200 para pasos	M2	5,21	$ 742.761,94	 	5,21	$ 3.735.795,34					ESTACION B-4	DyG Construcciones S.A.S	EN EJECUCION	27/10/2020	5,21	$ 742.761,94	$ 3.735.795,34
5.2.1.3	Suministro e instalación de sistema de proveer 1 bombeo 1 tanque 2000	UN	1	$ 13.109.140,00				1,00	$ 13.109.140,00	ESTACION B-13 CAZUNGA	DyG Construcciones S.A.S		27/10/2020	1,00	$ 13.109.140,00	$ 13.109.140,00
5.2.1.4	Fabricación e instalación de puerta sencilla en lámina Cal # cal calibre 18 y terminación en pintura 1.20m x 1.20)	UN	7	$ 846.940,00		7,00	$ 4.934.515,16			ESTACION B-13 CAZUNGA	DyG Construcciones S.A.S		27/10/2020	3,00	$ 846.940,00	$ 2.534.515,16
	SUB-TOTAL																			
	TOTAL COSTO DIRECTO						$ 17.006.897,00		$ 17.010.670,00		$ 23.710.636,50									$ 402.577.207,00
	A.I.U.	19,7%					$3.349.341,00		$3.350.082,00		$4.670.420,00									$ 142.233.161,79
	UTILIDAD 5 A C B M	10,7%					$1.819.960,00		$1.820.364,00		$2.537.467,00									$ 118.774.611,00
	IMPUESTO 19%	7%					$0,00		$0,00		$0,00									$0,00
	3 % RETE	2%					$1.259.247,00		$1.260.683,00		$1.364.619,00									$23.259.449,00
	RETE GARANTIA (5% ESE)	5%					$0,00		$0,00		$0,00									$0,00
	COSTO TOTAL						$23.435.445,00		$23.441.799,00		$32.283.142,50									$ 687.844.429,79
																				17,1%
	COMPONENTE AIU/TO																SALDO COMPONENTE AIU/TO			$ 102.630.845,00
																				20,0%

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA	HOJA 1/2
		Fecha 17-mar.-21
Depenencia responsable del proyecto o contrato : **SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA**		CONTRATO No: 620-2020

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 06

CONTRATO No. 620 (Número de contrato) DE 2020 (Año de suscripción)

VIGENCIA 6 meses
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☑

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA ☐

UAECOB-003-2020
(Identifique la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, ADECUACIONES Y MEJORAS A LAS INSTALACIOMES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C (GRUPO 1 - ZONA NORTE)

LOCALIZACION DEL PROYECTO DEPENDECIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C. (ZONA NORTE)
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 6 meses
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $800.000.000.00 (ochocientos millones de pesos m/cte)
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

VALOR ADICIONAL AL CONTRATO $0
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** ABRIL (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $800.000.000.00 (ochocientos millones de pesos m/cte)
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR DIANA M. PARRA CARDONA
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos; a los (17) dias del mes de Marzo de 2021, se reunieron MAURICIO RAFAEL PABA PINZON, representante legal del Contratista, CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR, representante legal de la Interventoría y DIANA M. PARRA CARDONA supervisora del contrato, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la supervisión. A continuación se relacionan dichos precios unitarios pactados al contrato.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA	HOJA 2/2
		Fecha 17-mar.-21
Depenencia responsable del proyecto o contrato : **SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA**		CONTRATO No: 620-2020

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 06

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR	TOTAL
NP 20	SILICONA PERIMETRAL PARA VENTANERIA	ML	1	$ 5.003,44	$ 5.003,44
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD 6MM A DOS (2) CARAS	M2	1	$ 94.810,14	$ 94.810,14
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD 6 MM A UNA CARA INCLUYE FRESCASA	M2	1	$ 92.334,38	$ 92.334,38
NP 23	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERAS PARA ACCESO A LOS CONTENEDORES, CON 3 HUELLAS DE 30 CM, CONTRAHUELLAS DE 16.6 CM EN LAMINA ALFAJOR 1/8 CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBO CUADRADO DE 1 1/2" CAL 16 CON ACABADO EN PINTURA ESMALTE	UN	1	$ 743.361,98	$ 743.361,98
NP 24	REPOSICIÓN PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3.000 PSI CURADO, E = 0.20 M. INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO, FORMALETA Y EQUIPO VIBRATORIO.	M2	1	$ 165.171,02	$ 165.171,02
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	1	$ 655.575,00	$ 655.575,00
NP 26	SUNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION 2 BOMBAS Y 1 TANQUE 200 LT	UN	1	$ 13.109.145,00	$ 13.109.145,00
NP 27	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN LAMINA COLL ROD CALIBRE 18 Y TERMINACIÓN EN PINTURA (2.00 X 1.00)	UN	1	$ 844.845,00	$ 844.845,00

Se anexa y hace parte de la presente acta el cuadro de evaluacion económica, teniendo en los precios no previstos del contrato anteriormente mencionado y el analisis de precios unitarios de dichos items

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el dia Miercoles a los (17) dias del mes de Marzo de 2021.

Firma

Nombre : DIANA M PARRA CARDONA

SUPERVISOR CONTRATO

Firma

Nombre : SANDRA M ATUESTA ALVARADO

APOYO A LA SUPERVISION

Firma

Nombre : GUSTAVO ENRIQUE GIL GARAY

DIRECTOR DE INTERVENTORIA GYG CONSTRUCCIONES

Firma

Nombre : DANIEL TRIANA

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Original Oficina Juridica

1era copia : Supervisor

2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato
