	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL No. 15

MES O PERIODO:
OCTUBRE -2019

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**				
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		
2.1	Localización		X		
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		
2.3	Características técnicas del proyecto		X		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato		X		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		X	
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato		X		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		
5.3	Informes especialistas		X		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			X	
5.5	Información otros programas y aplicativos			X	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		X	
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		
7	**Anexos**				
7.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		
7.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		
7.3	Informe, registro fotográfico y video de las actividades social y prediales		X		
7.4	Informe, Registro fotográfico y video de las actividades ambientales		X		
7.5	Libro de Obra		X		

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
LIBERTAD Y ORDEN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 825 DE 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

COPEBA S.A.S.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15
OCTUBRE 01 AL 31 DE 2019
Versión 0

Carrera 21 No. 100 – 20, Oficina 602 - Telefax: 2183292 - 2564013 – 2581094
E-mail: copebaing@yahoo.com

BOGOTÁ D.C.

002

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización
2.2. Inventario y estado inicial de la vía
2.3. Características técnicas del proyecto

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes
3.3. Descripción ítems no previstos
3.4. Estado de avance y accione a seguir por parte de la interventoría

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto
4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra
4.3. Personal contrato de obra
4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra
4.5. Estado general del tiempo
4.6. Resumen ensayos de laboratorio
4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra
4.8. Informe avance físico-financiero del contrato de obra
4.9. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra
- 4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo
- 4.9.2. Seguimiento al programa de obra
- 4.9.3. Seguimiento al programa de inversiones
- 4.9.4. Acta de comité de obra
- 4.9.5. Informes semanales

4.10. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra
4.11. Otros documentos seguimiento mensual
- ✓ Seguimiento a la inversión del anticipo
- ✓ Seguimiento al programa de obra

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 256-4013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

- ✓ Seguimiento al programa de inversiones
- ✓ Acta de comité de obra
- ✓ Acta de reunión
- ✓ Informes semanales

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del contrato
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor
5.3. Informes especialistas
5.4. Informe del programa anual de caja-PAC
5.5. Información de otros programas y aplicativos

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo contrato de interventoría
6.2. Personal contrato de interventoría
6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría
6.6. Seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría
6.7. Otros documentos al seguimiento mensual
- ✓ Seguimiento a la inversión del anticipo

7. ANEXOS

7.1. Relación de la correspondencia
7.2. Registro fotográfico
7.3. Informes especialistas
7.4. Libro de obra

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

ANEXOS

- *ANEXO 1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3*
- *ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4*
- *ANEXO 3. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-6.*
- *ANEXO 4. – INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-8*
- *ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10*
- ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11
- *ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12.*
- *ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-14*
- El ANEXO 9. SEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-15.
- ANEXO 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRAEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-17.
- ANEXO 11. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.
- ANEXO 12. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-2. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO DE OBRA.
- ANEXO 13. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.
- ANEXO 14. MINFRA-MN-IN-6-FR-1. PROGRAMA DE INVERSION O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN
- ANEXO 15. MINFRA-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA INVERSIONES
- ANEXO 16. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1.
- ANEXO 17. MINFRA-MN-IN-14-FR-2. ACTA DE REUNIÓN
- ANEXO 18. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2.
- ANEXO 19. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5
- ANEXO 20. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 256-4013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

- ANEXO 21. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORPIA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9.
- ANEXO 22. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- ANEXO 23. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA-MINFRA-MN-IN-15-FR-16.
- ANEXO 24. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18.
- ANEXO 25. MINFRA-MN-IN-3-FR-1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO
- ANEXO 26. MINFRA-MN-IN-3-FR-2 INFORMA DE INVERSIÓN DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
- *ANEXO 27. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.*
- *ANEXO 28. REGISTRO FOTOGRÁFICO.*
- ANEXO 29. LIBRO DE OBRA.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de la Reforma Rural Integral, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, desarrolla el "Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial" el cual define criterios para priorizar la intervención en las zonas más necesitadas y urgidas para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este Acuerdo, y son: "i. los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; ii. El grado de afectación derivado del conflicto; iii. La debilidad de la institucionalidad administrativa y de capacidad de gestión; iv. Y la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.

El Instituto Nacional de Vías INVIAS con los recursos disponibles ejecuta el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017., con el resultante del bienestar para los usuarios, que comprenden las obras prioritarias que tengan mayor impacto en el mejoramiento del servicio, de tal forma que se garantice una operación segura.

Por tal motivo, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS adjudicó el Contrato de Obra Nº 498 de 2018, de fecha 25 de enero de 2018, a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, quien presentó la propuesta PDS18C00866 de fecha 25 de enero de 2018, la cual fue aprobada por el OCAD PAZ.

Igualmente, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS con el fin de dar acompañamiento técnico al Contrato de obra anteriormente citado, adjudicó el Contrato de Interventoría Nº 825 de 2018, de fecha 30 de mayo de 2018, previo Concurso de Méritos CMA-DO-SRT-032-2018, a la firma COPEBA LTDA, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Los Contratos de Obra e Interventoría tuvieron orden de inicio el día 08 de agosto de 2018. El contrato de obra tiene un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2018, una primera prórroga hasta el 07 de julio de 2019 y una segunda hasta el 07 de noviembre de 2019 y la interventoría tuvo un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2018, una primera prórroga hasta el 07 de julio de 2019 y una segunda hasta el 07 de noviembre de 2019.

El Contrato de Obra consta de dos etapas: una etapa de revisión y ajustes de estudios y diseños, y la otra etapa, que es la correspondiente a la construcción.

La primera etapa se dividió en dos fases. La primera corresponde a los Estudios y Diseños para la cual se definió un mes de plazo al contratista entre el 08 de agosto al 08 de septiembre de 2018 y seguida por la revisión de estos estudios y diseños por parte de la interventoría con un plazo de quince días, desde el 08 de septiembre hasta el 23 de septiembre de 2018. La interventoría realizó acta parcial de aprobación de estudios y diseños el 15 de noviembre de 2018. El día 03 de diciembre de 2018 mediante el oficio SRT-54505, INVÍAS hizo observaciones a dichos estudios. El día 18 de junio de 2019 la interventoría realizó y firmó el acta parcial 2 de aprobación de estudios y diseños. El día 19 de junio de 2019, la interventoría firma el acta de aprobación definitiva de estudios y diseños y radicada en INVÍAS el día 05 de julio de 2019, mediante el oficio ADM-INV-825-2018-170

En el presente Informe Mensual de Interventoría No.14 se reportan las actividades más importantes que se han ejecutado durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2019, correspondiente al catorceavo mes de desarrollo y ejecución de los Contratos de Obra y de Interventoría del Proyecto.

Del Contrato de Interventoría, se incluyen los aspectos generales, las actividades de supervisión y la información financiera. Al final del Informe se incluye algunos comentarios, conclusiones y observaciones de los aspectos más relevantes del desarrollo y ejecución general del Proyecto.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización

De acuerdo con las evaluaciones efectuadas por el INVIAS, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, de algunas vías de red secundaria del Quindío presentan un deterioro que ameritaban su pronta intervención principalmente los tramos Pijao – Guacas, Génova – Guacas.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, del Sistema general de Regalías por EL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD PAZ DEL SGR", "Para financiar proyectos de inversión, que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que el parágrafo 4 y los parágrafos transitorios 7 y 8 del artículo 361 de la constitución política, disponen que los proyectos de inversión que serán financiados con los recursos del SGR correspondientes a los excedentes del ahorro pensional territorial fuente SGR, y aquellos que componen la Asignación para la Paz serán definidos por el OCAD PAZ.

Que el artículo 2 de decreto Ley 1534 de 2017 establece que el OCAD PAZ es responsable de definir los proyectos de inversión que tengan entre sus fuentes de financiación recursos de la Asignación para la Paz, o los recursos a los que se refieren al parágrafo 4 del artículo 361 de la Constitución Política. Este OCAD viabilizará, priorizará y aprobará los proyectos de inversión, y designará la entidad pública ejecutora en los términos señalados en la ley 1530 de 2012".

Como se comenta en el anterior párrafo, el Instituto Nacional de Vías, fue designado como entidad pública ejecutora de los contratos de obra e interventoría, en acuerdo con el "ACUERDO No.3 DEL 25/01/2018, por

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

medio del cual se adoptan las decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos de Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías SGR".

El Objeto del Proyecto es el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

La operación y mantenimiento del corredor vial Pijao - Guacas, Génova – Guacas, se encuentra a cargo del Departamento del QUINDÍO, por tratarse de vías secundarias. El proyecto se localiza al Sur-oriente del Departamento, iniciando sobre la carrera 6 calle 18 del casco urbano del municipio de Pijao, donde termina el pavimento hidráulico e inicia el afirmado de la vía (4°19'50.83"N) / 75°42'24.08"W); pasando por Puente Tabla, sobre el río Lejos, la escuela Juan XXIII, Río Azul, Caserío la Maizena (escuela 7 de Agosto), quebrada La Maizena, Los Chorros, ingreso a la vereda El Jardín, La Laguna, escuela La Laguna, Guacas, siendo estos los puntos intermedios del recorrido; con un tramo de vía de 17.05 Km hasta con el tramo de Génova - Guacas, con las coordenadas (4°13''10.38"N / 75°46'41.80"W), en una longitud de 17,05 km. Los puntos intermedios del tramo Génova-Guacas son: La escuela El Recreo, Finca Venecia, Finca El Porvenir. Quebrada Tamborales, hasta llegar a la glorieta (El caballo) con intersección de la vía Barragán-Génova, con una longitud del tramo Guacas-Génova de 8,35 km y un total de la vía Pijao-Guacas-Génova de 25,40 kms

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

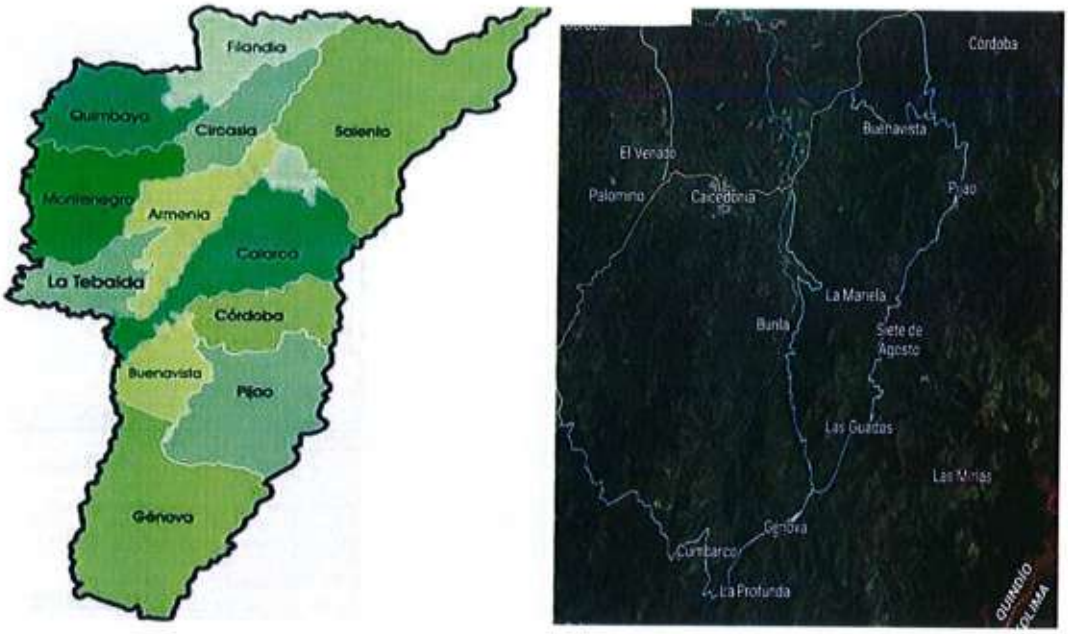


Figura1 - Localización general del Proyecto

2.2. Inventario y estado inicial de la vía

La longitud aproximada de la vía Pijao – Guacas – Génova es de 25.4 Km, subdividida en dos tramos el primero correspondiente al municipio de Pijao que es Pijao – Guacas de longitud 17,05 km y el segundo tramo corresponde al municipio de Génova que es Génova – Guacas con una longitud de 8.35 km. La vía actualmente corresponde a una estructura conformada por una capa de afirmado y materiales granulares de espesores variables. El ancho de la calzada varía entre 4.0 y 5.0 m aproximadamente. La geometría horizontal es bastante irregular, con curvas de radios muy pequeños, algunas inferiores a 20m con deflexiones superiores a 90°; desde el punto de vista vertical el alineamiento presenta dificultades en algunos tramos de gran pendiente, en los cuales se tienen proyectadas las Placa – Huellas.

Existen 4 sitios en el sector de Pijao – Guacas y 5 en el sector Génova - Guacas donde se presenta pérdida de banca, y allí se tiene proyectado la construcción de muros de contención

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com



K 12+839 Aspecto Inicial de la vía




Ancho promedio de la vía 3.7m

Como se observa en el registro anterior, el tramo a intervenir presenta un ancho restringido, lo cual permite una sección inicialmente proyectada de 4.10m que corresponde a dos placas huellas de 0.90 separadas por una franja de piedra pegada 0.90 y dos cunetas de 0.7m y con su respectivo bordillo. En visita efectuada por los especialistas de interventoría y contratista (geólogos y geotecnistas), consideran que la rasante existente se podría utilizar como Subrasante y en algunos sectores como sub-base.


2.3 Características técnicas del Proyecto

El proyecto presenta tres características específicas que son, la construcción de placas huella, la construcción de muros de contención y la construcción de alcantarillas, obras transversales u obras de arte; así:

De las placas huellas existen dos modelos: una con una calzada de 5,00 m y otra con calzada de 4,10 m, dependiendo del ancho disponible

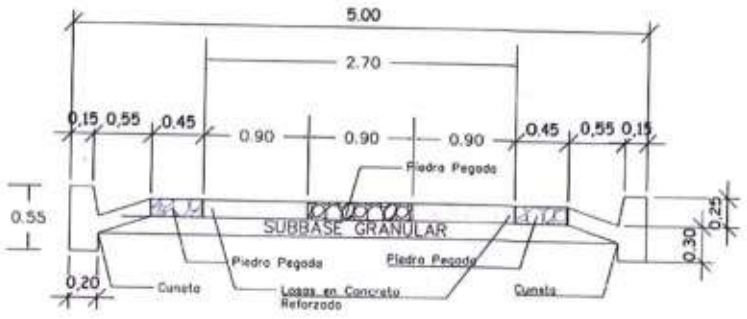

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

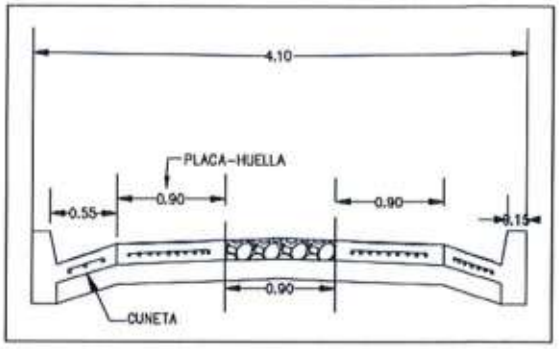

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA PROPUESTA POR EL ESTUDIO
PARA LA VÍA PIJAO – GUACAS – GENOVA

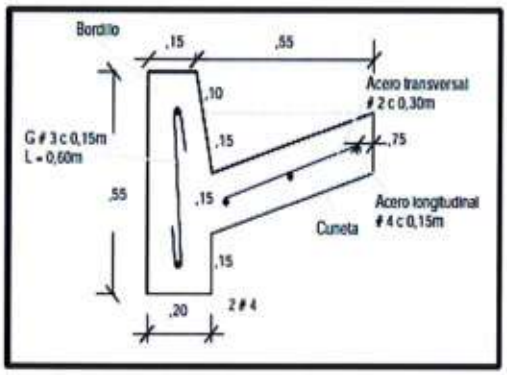


Figura 2.13 Corte Berma-cuneta Sección en la Cuneta

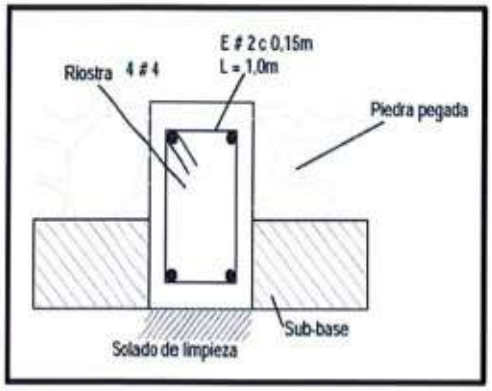


Figura 2.7 Corte Transversal Sección en Piedra Pegada

- Construcción de placas huella entre.

PLACA HUELLA			
PIJAO I GUACAS	DESDE	HASTA	LONGITUD
	K3+169	K3+457	288
	K6+705	K7+005	300
	K10+165	K10+445	280
	K12+275	K12+400	125
	K12+400	K12+580	180
	K12+841	K13+071	230
	Sub-total		**1403**

PLACA HUELLA			
GUACAS I GENOVA	DESDE	HASTA	LONGITUD
	K17+657	K18+002	345
	K18+002	K18+757	755
	K22+232	K22+332	100
	K23+755	K23+810	55
	Sub-total		**1255**

Ancho de calzada de 4.10 m y 5,00 m, con cunetas en concreto de 0.7 m.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

Con los ajustes de los estudios y diseños las placas huellas a construir quedaron así:

PLACA HUELLA					
TRAMO PIJAO-GUACAS	**NOMBRE**	**ABSCISA INICIAL**	**ABSCISA FINAL**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**
	Puente Tabla	K3+159	K3+457	288,00	5,00
	El Sinabrio	K6+749	K6+849	100,00	5,00
	La Maizena	K10+220	K10+500	280,00	4,10
	Silvio	K11+929	K11+939	10,00	5,00
	Los Chorros	K12+275	K12+580	305,00	4,10
	El Jardín	K12+651	K12+841	190,00	4,10
	La Laguna	K12+841	K13+071	230,00	4,10
	TOTAL			**1.403,00**	

PLACA HUELLA					
TRAMO GÉNOVA-GUACAS	**NOMBRE**	**ABSCISA INICIAL**	**ABSCISA FINAL**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**
	El Recreo tramo 1	K17+620	K18+002	282,00	5,00
	El Recreo tramo 2	K18+002	K18+159	157,00	4,10
	El Recreo tramo 3	K18+159	K18+720	561,00	5,00
	Venecia	K22+232	K22+332	100,00	5,00
	Castellanos	K23+755	K23+810	55,00	5,00
	TOTAL			**1.403,00**	

- Construcción de muros de contención.

MUROS DE CONTENCION			
PIJAO / GUACAS	**MURO**	**ABSCISA**	**LONGITUD**
	1	K2+770	14,75
	2	K4+280	13,1
	3	K7+380	10
	4	K8+670	17,05
		Sub-total	**54,9**

MUROS DE CONTENCION			
GENOVA / GUACAS	**MURO**	**ABSCISA**	**LONGITUD**
	1	K18+964	7,1
	2	K19+163	7,4
	3	K19+413	7
	4	K22+321	8,05
	5	K18+380	**5,00**
			34,55

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

- Construcción de alcantarillas

ALCANTARILLAS		
PIJAO / GUACAS	ABSCISA	CANTIDAD
	K4 + 280	1
	K6 + 670	1
	K6 + 878	1
	K6 + 960	1
	K7 + 280	1
	K7 + 380	1
	K8 + 350	1
	K8 + 640	1
	K8 + 750	1
	K10 + 150	1
	K10 + 350	1
	K10 + 545	1
	K10 + 660	1
	K10 + 800	1
	K11 + 933	1
	K12 + 905	1
	K13 + 000	1
	K16 + 668	1
Sub-total		**18**

ALCANTARILLAS		
GENOVA / GUACAS	ABSCISA	CANTIDAD
	K17 + 675	1
	K17 + 814	1
	K17 + 846	1
	K17 + 921.5	1
	K18 + 102	1
	K18 + 444.5	1
	K18 + 757	1
	K18 + 964	1
	K19 + 413	1
Sub-total		**9**

Ajustando los estudios y diseños a la estructura existente de la vía, obras transversales para drenaje en tubería de 36" en reemplazo de algunas existentes de 24" y otras que han colapsado que solo se detectaron con la limpieza de éstas.

Quedando así en junio de 2019 (acta de aprobación de estudios y diseños)

ALCANTARILLAS		
TRAMO PIJAO-GUACAS	**ABSCISA**	**LOCALIZACION**
	K2+770	Muro 1
	K4+095	Colapso finca El Guayabo
	K4+280	Muro 2
	K5+823	Finca El Verdal

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

	K7+280	Finca Baltimore
	K7+380	Muro 3. Finca Baltimore
	K8+350	Finca los cerezos. Muros direccionales
	K8+670	Muro4
	K8+750	
	K10+150	Escuela 7 de agosto. La Maizena
	K10+300	Placa huella La Maizena
	K10+545	Finca El Tabor
	K10+660	Finca El Tabor
	K10+800	Finca El Tabor
	K11+933	Placa huella Silvio
	K12+756	Placa huella El Jardín
	K12+920	Placa huella La Laguna
	K13+000	Placa huella La Laguna
	K13+770	Finca La Laguna
	K16+668	Alto de Guacas
TOTAL	**19 más 1 con muros direccionales**	

En el mes de agosto de 2019, sufrieron colapso las alcantarillas del k11+690 (finca de Silvio) y k14+580 (entrada a la escuela La Laguna), por el tráfico de volquetas del proyecto y existen PQRs de la comunidad solicitando su arreglo.
Por lo anterior balanceando el contrato para reconstruir las dos alcantarillas colapsadas no se van ejecutar la de los muros direccionales k8+350 (no tiene permiso de ocupación de cauce y del k10+545 (está en buen estado)

ALCANTARILLAS		
TRAMO GÉNOVA-GUACAS	**ABSCISA**	**LOCALIZACION**
	K17+675	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K17+700	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K17+738	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K17+818	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K17+885	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K18+023	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K18+105	Placa huella El Recreo 1 tramo

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

	K18+282	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K18+360	Reconstruir cabezal
	K18+714	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K18+964	Muro 1
	K19+413	Muro 3
	K19+682	Finca La Laguna
	K22+252	Finca Venecia
TOTAL	**13 más 1 sola con reconstrucción de cabezal**	

El abscisado que se presenta en los cuadros anteriores de localización de las obras corresponde a la etapa inicial de estudios y diseños.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato

El Contrato de Obra N.º 498 de 2018 tiene como objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMTBE DE 2017.

Contrato Nº	: 498 de 2018
Contratista	: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Valor Inicial	: $5.419.238.921,23 moneda corriente
Plazo Inicial	: Treinta y uno (31) de diciembre de 2018
Prórroga 1	: Al Siete (07) de julio de 2019
Prórroga 2	: Al 07 de noviembre de 2019
Orden de Inicio	: 08 de agosto de 2018

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

Fecha de Terminación : Siete (07) de noviembre de 2019

Contacto : **JOSE MARTÍN VÁSQUEZ ARENAS** –
Director Ejecutivo - Comité Cafeteros del Quindío
Km 3.5 vía Armenia, La Tebaida
Armenia – Colombia
Calle 44B No.57 A-76
PBX (57-6) 736 8999

3.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes de octubre 2019

El seguimiento a la ejecución de obras del contrato se continúa haciendo en el presente mes de octubre, de acuerdo con la nueva reprogramación implementada el mes anterior.

Tramo Pijao - Guacas

Construcción de alcantarillas:
Se ejecutó la construcción de las obras de concreto para las alcantarillas del K4+095, K8+750 y para la alcantarilla del K14+580, esta última que también por la ruptura de un tubo que se encontraba a 20 cms de profundidad respecto a la superficie, tuvo que removerse la alcantarilla existente y construirse una nueva alcantarilla; esto teniendo en cuenta que reemplazó por las obras a realizarse en el k8+350.
Se hizo la conexión entre el descole de la alcantarilla del K2+770 y el disipador existente, se inició la construcción de disipador para la obra del K4+280, también se construyeron canales de descarga para las cunetas del K3+299 y K12+600.
Se instaló tubería para la construcción de alcantarilla en el K9+220, sitio donde permanecía represada agua sobre la vía constantemente.

Construcción de placa huella:
Se terminó la construcción de la placa huella del sector partida para El Sinabrio K6+749 al K6+849, quedando pendiente la terminación del bordillo

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

junto a la alcantarilla del K6+775 y la terminación de la cuneta junto a la alcantarilla del K6+849.

Se terminaron de construir los faltantes en la placa huella del sector La Laguna (K12+841 al K13+071), pero quedan pendientes unas pocas reparaciones de algunas huellas y cunetas que se dilataron. Se terminaron de construir los bordillos que estaban pendientes en la placa huella del sector El Jardín (K12+651 al K12+841).

Construcción de muros de contención:
Los cuatro muros de este tramo se encuentran construidos, pero hace falta adecuar o empalmar con terreno natural susceptible a socavación en K8+670 (muro 4).

Tramo Génova - Guacas

Construcción de alcantarillas:
Se tiene retrasada la construcción de las alcantarillas localizadas en K18+964 (incluyendo disipador) y la del K22+252, se dio inicio con la construcción de la alcantarilla en K19+413 y con la alcantarilla del K19+688.

Construcción de placa huella:
Se terminaron de construir las huellas y cunetas reforzadas para la placa huella comprendida entre el K18+159 y el K18+720.
Se terminó la construcción de filtro para la placa huella del sector Venecia entre el K22+190 y el K22+249 y se dio inicio con la construcción de la placa huella alcanzando una longitud aproximada de 36m.

Respecto a la reprogramación o plan de contingencia se continúa presentando atraso en la construcción de bordillos y de concreto ciclópeo del tramo tres de la placa huella del sector El Recreo, es decir para la placa huella comprendida entre el KK18+159 y el K18+720, en una longitud aproximada de 70 m

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

Se ejecutó la construcción del muro #2 localizado en el K19+163.

Comités Técnicos del Mes de octubre 2019: (ver anexos)

- No.67 - del 03 de octubre de 2019
- No.68 - del 10 de octubre de 2019
- No.69 - del 17 de octubre de 2019
- No.70 - del 23 de octubre de 2019
- No.71 - del 29 de octubre de 2019
- No.16 - del 02 de octubre de 2019 Socio-Ambiental

Informes Semanales del Mes de septiembre 2019: (ver anexos)

- No 61 del 05 de octubre 2019
- No 62 del 12 de octubre 2019
- No 63 del 19 de octubre 2019
- No 64 del 26 de octubre 2019

3.3. Seguimiento ítems no previstos

A la fecha hay ítems no previstos aprobados en el acta de modificación No 1 del 02 de enero de 2019, donde se modificaron los APUS y las cantidades de obra, que son las que se están siguiendo en todas las obras.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

El contrato de obra se prorrogó en el mes de julio de 2019, hasta el día 07 de noviembre de 2019 y el contratista se encuentra haciendo su ejecución de acuerdo con la reprogramación de obra presentada el mes anterior.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

Estado de avance

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Básico del contrato de obra	$ 5.138.283.247,26
Inversión de obra acumulada	$ 4.840.305.921,8
Inversión de obra ejecutada acumulada	$ 4.976.150.824,3
Avance de obra %	96,84%
Revisión y ajuste de estudios y diseño Ejecutado	99.034.808,84
Total, Ejecutado	$ 5.075.185.633,15
% Ejecución del contrato	98,77%

Acciones por parte de la interventoría

- ✓ Control semanal al cumplimiento del contrato.
- ✓ Reiteración mediante oficio, solicitando la caracterización vial y elaboración de planos record.
- ✓ La interventoría con la FNC plantea la modificación del contrato, debido a ítems no previstos y mayores y menores cantidades de obra presentadas durante la ejecución del contrato. También debido al ajuste de los estudios y diseños presentados por la FNC y contemplados en el Volumen XIV Resumen Final Ejecutivo
- ✓ Se ha hecho el seguimiento al plan de contingencia o reprogramación de obras firmado con el contratista, durante los comités de obra semanales.
- ✓ La interventoría ha solicitado a la FNC el orden y adecuación a las obras terminadas para el correspondiente recibo a satisfacción.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto

En el *ANEXO 1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-*

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

15-FR-3 se hace una descripción del avance del proyecto del período 01 de octubre al 30 de octubre de 2019.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

En el *ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4*, en este período se relaciona maquinaria y equipo del contratista durante el período 01 de octubre al 30 de octubre de 2019.

4.3 Personal contrato de obra

En el *ANEXO 3. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-6.* En este período se incluye el personal del contratista que participó en el proyecto durante el periodo 01 de octubre al 30 de octubre de 2019.

4.4. Informe Financiero y presupuestal contrato de obra

En el *ANEXO 4. – INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-8*

4.5. Estado general del tiempo

En el *ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10* se registra el estado del tiempo en el área del proyecto para este período. Se anexa el informe del estado del tiempo del mes de octubre (boletín del IDEAM) del Aeropuerto El Edén de la ciudad de Armenia (Q).

4.6. Resumen ensayos de laboratorio

En el ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11 Para el presente período se relacionan los ensayos de laboratorio del proyecto.

4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

El *ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12*, presenta el seguimiento de la Interventoría sobre el cumplimiento por parte del Contratista de Obra de las obligaciones de afiliación a los sistemas de seguridad social del personal que labora

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

para el Proyecto, en este período.

4.8 Informe avance físico-financiero contrato de obra

El *ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-14.*

4.9 Seguimiento a garantías y seguros contrato de obra

El ANEXO 9. SEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-15.

4.10 Seguimiento del Plan de Calidad del contrato de obra

El ANEXO 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA SEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-17.

4.11. Otros documentos seguimiento mensual

- ✓ **Seguimiento a la inversión anticipo contrato de obra**

El ANEXO 11. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1. El contratista renunció al anticipo del contrato, pues trabaja con recursos propios.

El ANEXO 12. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-2. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO DE OBRA. El contratista renunció al anticipo del contrato, pues trabaja con recursos propios.

- ✓ **Seguimiento al programa de obra**

El ANEXO 13. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.

- ✓ **Seguimiento al programa de inversión**

El ANEXO 14. MINFRA-MN-IN-6-FR-1. PROGRAMA DE INVERSION

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN.

El ANEXO 15. MINFRA-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA INVERSIONES.

- ✓ **Actas de comité de obra**

El ANEXO 16. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1. Se adjuntan copias de las actas de los comités técnicos efectuados durante el periodo 01 de octubre al 31 octubre de 2019.

- ✓ **Actas de reunión**

El ANEXO 17. MINFRA-MN-IN-14-FR-2. ACTA DE REUNIÓN

- ✓ **Informes semanales**

El ANEXO 18. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2. Se adjunta copia de los informes semanales que fueron elaborados durante el presente mes de octubre.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del contrato

El Contrato de Interventoría N.º 825 de 2018, tiene como objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Contrato Nº	: 825 de 2018
Contratista	: COPEBA SAS
Valor Inicial	: $ 518.020.310 MONEDA CORRIENTE- IVA
Plazo Inicial	: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

Orden de Inicio	: 08 DE AGOSTO DE 2018.
Aclaración	: ACLARACION Nº UNO (1) AL CONTRATO Nº 825 DE 2018 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE OCHO (8) MESES.
Fecha Terminación	: 07 de noviembre de 2019
Prorroga 1	: Hasta el 07 de julio de 2019
Prorroga 2	: Hasta el 07 de noviembre de 2019
Contacto	: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100-20 Of. 602 Tel. 2571094 2564013 2183292. Correo electrónico - copebaing@yahoo.com

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor en el mes.

Además de las obligaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones y en los respectivos contratos, la Interventoría ejecutó las siguientes actividades:

✓ Trámite adecuado de la correspondencia, dando respuestas a las comunicaciones enviadas por el Contratista.

✓ Solicitar al contratista la entrega de manera oportuna de los documentos contractuales del contrato de obra 498 de 2018.

✓ Reuniones semanales con el contratista para la realización de los comités de seguimiento al contrato 498 de 2018 durante el mes de octubre de 2019.

✓ Aceptar, si considera pertinente, las recomendaciones del geotecnista y

demás especialistas del Contratista

✓ Se ha hecho seguimiento con el contratista a la reprogramación al plan de contingencia de ejecución de obras durante los comités de obra

5.3. Informes Especialistas de Interventoría

Para el presente período, se presentan informes de especialistas de las áreas Social y Ambiental de la interventoría.

5.4. Informes del Programa anual de caja-PAC

No aplica para este contrato de obra ni para el contrato de interventoría.

5.5. Información otros programas y aplicativos

No aplica para este contrato de obra ni para el contrato de interventoría

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo contrato de interventoría

El ANEXO 19. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5. Para el presente periodo, se relaciona el equipo disponible con el que cuenta la interventoría para el proyecto.

6.2. Personal contrato de interventoría

El ANEXO 20. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7. En el formato mencionado, se relaciona el personal que participó en el proyecto, para el presente mes de octubre.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

El ANEXO 21. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORPIA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9. En el formato mencionado se detalla este informe.

6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

El ANEXO 22. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. Se verificó la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal de interventoría que a la fecha labora en el proyecto.

6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría

El ANEXO 23. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA- MINFRA-MN-IN-15-FR-16. Se relacionaron las garantías entregadas a la entidad contratante, INVIAS, las cuales a la fecha actual han sido modificadas 7 veces.

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

El ANEXO 24. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18.

6.7. Otros documentos seguimiento mensual

- ✓ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

  El ANEXO 25. MINFRA-MN-IN-3-FR-1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO

  Como se mencionó en el anterior informe mensual, la Interventoría renunció de manera voluntaria al anticipo del 20% del contrato de interventoría. Esta renuncia la realizó mediante comunicación ADM-INV-825-2018-023 de fecha 10 de septiembre de 2018 dirigida al INVIAS, y con radicado 77060 de fecha 10 de septiembre de 2018

  El ANEXO 26. MINFRA-MN-IN-3-FR-2 INFORMA DE INVERSIÓN DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7. ANEXOS

7.1. Relación *de correspondencia.*

El *ANEXO 27. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. Se entrega* el formato implementado por la Interventoría para el seguimiento y control de

la correspondencia enviada y recibida, durante el desarrollo del Contrato para el presente período.

7.2 Registro Fotográfico

El *ANEXO 28. REGISTRO FOTOGRÁFICO*. Se entrega el formato implementado por la Interventoría para el registro fotográfico de las actividades realizadas por la interventoría y el contratista a los sitios de obra.

7.3 Libro de Obra

El ANEXO 29. LIBRO DE OBRA, se adjunta copia de los libros de obra de los tramos Pijao –Guacas y Génova – Guacas, correspondientes al mes de octubre de 2019.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

ANEXO 1. RESUMEN ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	1 de 1

FECHA: 27 / 10 / 2019 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — **DIRECCION TERRITORIAL:** QUINDIO — **PERIODO MES:** OCTUBRE DE 2019

CONTRATO DE OBRA No: 0494-2018

OBJETO: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO HO REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIACIÓN	5 de agosto de 2019
FECHA DE REANUDACIÓN	
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 5.419.238.921,23
VALOR ACUMULADO	$ 5.419.238.921,23
ANTICIPO CONCEDIDO	$ -
PLAZO ACUMULADO	11.00
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN	7 de noviembre de 2019
VALOR ADICIONALES	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0625-2018 — INTERVENTOR: COPEBA S.A.S — SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INGENIERO HERNAN DARIO TEJADA ELITO

ALCANCE FISICO DEL CONTRATO PUAO-GUACAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100%
ALISTAMIENTO DE VIAS	KL	60.41
PLACA HUELLA	M	1400.00
ALCANTARILLAS	UNIDAD	10.00
MURO DE CONTENCION	M	34.00

AVANCE FISICO DEL CONTRATO PUAO-GUACAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100.00%
ALISTAMIENTO DE VIAS	KL	25.61
PLACA HUELLA	M	1,062.00
ALCANTARILLAS	UNIDAD	10.00
MURO DE CONTENCION	M	34.00
OTROS	KL	

ALCANCE FISICO DEL CONTRATO GUACAS-GENOVA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100%
ALISTAMIENTO DE VIAS	KL	60.00
PLACA HUELLA	M	1700.00
ALCANTARILLAS	UNIDAD	5.00
MURO DE CONTENCION	M	44.70
OTROS		

AVANCE FISICO DEL CONTRATO GUACAS -GENOVA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJEC
ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100
ALISTAMIENTO DE VIAS	KL	60.00
PLACA HUELLA	M	1,062.00
ALCANTARILLAS	UNIDAD	5.00
MURO DE CONTENCION	M	21.70
OTROS		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			EIP	Costos de interventoría (I)	C/E	I/C
		Obra (SI)	Ajustes (A)	Total (CNA+B)				
En el mes:	$ 621.101.060,00	$ 1.134.101.887,00	$ -	$ 1.134.101.887,00	182,60%	$ 59.969.960,00	100,00%	5,29%
Acumulado:	$ 4.674.217.377,00	$ 4.829.253.329,00	$ -	$ 4.829.253.329,00	103,32%	$ 653.601.234,00	100,00%	13,54%

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2019	$ 5.419.238.921,23
Total	$ 5.419.238.921,23

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año
Contratista:	89,11%	14,97	99,60%	0,03	$ 589.985.592,77	0	-	$ 589.985.592,77
Interventor:	96,30%	14,97	99,60%	0,03	$ 24.961.705,00	0	-	$ 24.961.705,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA)
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA)

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	93.277.529,43
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSION	
VALOR TOTAL	93.277.529,43

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada

ULTIMAS GARANTIAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	25/01/2019	LIQUIDACION CONTRATO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	25/01/2019	07/11/2022
Calidad de Estudios y Diseños	Vigencia 5 años contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de aprobacion definitiva de la complementacion de ajustes a estudios y diseños	
Estabilidad y Calidad de Obra	Vigencia 5 años contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo definitivo o satisfaccion de las obras por parte del Instituto	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	25/01/2019	07/11/2019
Otros		

Documento y fecha de aprobacion ultima garantia y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancion si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

[illegible]
Director de Interventoría
Dirección Tel: (7) 7320710 Ext 7XC

030

ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE **CONTRATO No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	total
Retroexcavadora 1 Cat	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Retroexcavadora 2 CAT 420 F (con martillo)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	I			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	I	A	I	23
Retroexcavadora 3 John Deere 410 J	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Motoniveladora	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Vibro compactador 1	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Vibro compactador 2	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Camioneta doble cabina	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Volquetas de 7 m3 (1)	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			A	I	I	I	I		A	I	I	I	I	I		I	I	I	I	2
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos 1	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	26
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos 2	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	26
Mezcladoras de concreto de minimo 0,5 bultos 3	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	I		I	I	A	A	23
Campero Jeep	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	11
Vibradores de concreto 1 (yamaha YP 3DT)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	26
Vibradores de concreto 2	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	26
Camioneta de estacas	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	25
Vibradores de concreto 3	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Equipo de Topografia	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Planta Electrica	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	I		I	I	I	I	1
Compresor	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Compactadores manual vibratorio (Rana) 1	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Compactadores manual vibratorio (Canguro(2)	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

230 032

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE

CONTRATO No. 0498 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: GÊNOVA - GUACAS (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
Retroexcavadora 1 Cat (con martillo)	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Retroexcavadora 2 John Deere 310 k	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	26
Retroexcavadora 3 John Deere 410 J	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Motoniveladora	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Vibro compactador 1	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Vibro compactador 2	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Camioneta de Estacas	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	26
Volquetas de 7 m3 (1)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	23
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 1	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	27
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 2	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	27
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 3	A	A	A	A	A		I	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	26
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 4	A	A	A	A	A		I	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	25
Vibradores de concreto 1 (yamaha YP 3DT)	I	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	22
Vibradores de concreto 2	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	29
Vibradores de concreto 3	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Vibradores de concreto 4	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Equipo de Topografia	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Compactadores manual vibratorio (Rana) 1	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	0
Planta electrica	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	4
Compactadores manual vibratorio (SALTARIN) (2)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	26
TOTAL DIAS/MAQUINA	8	9	9	9	9	0	7	9	10	10	10	10			10	10	10	10	10	6	9	9	9	10	10	10	0	11	11	11	11	261

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-180530

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

023

ANEXO 3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

	FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: OCTUBRE **CONTRATO DE OBRA No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	total
OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO	DIRECTOR OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA	INGENIERO RESIDENTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JOHANA PARDO	INGENIERO AUXILIAR	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JACQUELINE RAMIREZ	SOCIAL PIJAO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JAIRO ANDRADE RIVERA	OFICIAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JEISON ALEXANDER ARISTIZABAL SALDARRIAGA	AYUDANTE	X																															
JULIO CESAR BARBOSA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X											
EDWAR DARIO BENITEZ SANCHEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
ESENJAWER BETANCOURTH MARIN	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
GERARDO ANTONIO CASTAÑEDA GONZALEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JEISSON STIVEN CASTAÑEDA SANCHEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
VICTOR ALFONSO CASTRO LOZANO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
MARCOS COY ARIZA	OFICIAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X										
ABSALON DUQUE RAMIREZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																				
JORGE ALBERTO DUQUE RAMIREZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X											
CARLOS ANDRES FLOREZ VILLAMIL	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
DIEGO ALEJANDRO GIRALDO FLOREZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X																									
RAUL ANDRES GONZALEZ RIVERA	AYUDANTE	X	X	X	X																												
ANDRES FELIPE GUALTEROS JURADO	AYUDANTE	X																															
	TOTAL																																
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																	

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma Wilker A. Jordan
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

035

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No. 0496 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: PUAO - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	total
GILDARDO HERNANDEZ HERNANDEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																				
JORGE ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																				
PABLO EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	OFICIAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																				
YEISON FABER HERNANDEZ HERNANDEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																				
JOSE RODRIGO JARAMILLO CARDENAS	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X																									
JHON FREDY JURADO JARAMILLO	OFICIAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JULIO CESAR LOPEZ	AYUDANTE	X	X	X	X																												
JOSE IVAN LOPEZ SANCHEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X																								
JHON FREDY MONTOYA VALENCIA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X															
HUGO OJEDA AREVALO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X										
JORGE ANDRES OLIVEROS GONZALEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X																									
LUIS EDWARDO OROZCO PEREZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
CRISTIAN DAVID ORTIZ BARRAGAN	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X															
FABIAN OSORIO BARRAGAN	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
ABEL ANTONIO PULGARIN WALTERO	AYUDANTE	X	X	X	X	X																											
JUAN SEBASTIAN QUICENO GIL	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JHOANY MAURICIO QUINTERO DONOSO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X																						
GUSTAVO QUINTERO LONDOÑO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JHON FREDDY QUINTERO SANCHEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X																									
JOSE ALBERTO RAMIREZ QUINTERO	AYUDANTE	X	X	X	X																												
JOSE DUFAI REYES CASTAÑO	OFICIAL	X	X	X	X																												
FRESNEY RODRIGO ROJAS CORREA	CONDUCTOR	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X																
DIEGO ALEJANDRO TRUJILLO NARANJO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X														
DANIEL SALDARRIAGA SALDARRIAGA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
MARIO DUBAN SNCHEZ DUQUE	OFICIAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
CRISTIAN CAMILO SANCHEZ LANCHEROS	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X						

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma: Wilker A. Jordan
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-223247 QND

Firma:
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

030

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No. 0496 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: PIJAO - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	t
WILLIAN VAQUERO BETANCOURTH	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X															
JUAN CARLOS VARGAS CARDONA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X															
DUBIEL YANIL VARGAS VIVAS	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X															
CRISTIAN DAVID VELASQUEZ COLLAZOS	HERRERO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X				
BRAHYAN STIVEN VIVAS RODAS	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X															
DIEGO FERNANDO TOBON	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X															
YEFERSON ESTIVN CAVADID PULIDO	AYUDANTE	X	X	X	X																												
BRAHIAN DAVID MONTOYA CASTILLO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
LEONEL ROMERO RJAS	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
YEISON SOTO CANO	AYUDANTE	X	X	X	X																												
DIEGO ALEJANDRO TRUJILLO NARANJO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
LUIS FERNANDO SOTO POSDA	ING.SUBCONTRATISTA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:

Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma: Wilker A. Jordan

Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-223247 QND

Firma:

Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoria
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

037

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No. 0498 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: GÉNOVA - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA	ING. RESIDENTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
FABIAN ENRRIQUE SIERRA MORALES	ING.AUXILIAR	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
CLAUDIA LORENA ZULUAGA PARRA	SOCIAL GÉNOVA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JHONATAN ARBOLEDA ALVAREZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X														
JHOAN JAIRO ARBOLEDA POSADA	OFICIAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
ELIBER JULIANO ARIAS TORO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
YEFERSON ARREDONDO CASTRO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X																									
JUAN CAMILO BADILLO VELEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
URIEL BLANDION RENDON	OFICIAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
CARLOS EVELIO CARDONA CASTAÑO	ING.SUBCONTRATSTA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
ANDRES MAURICIO CLAVIJO PULGARIN	HERRERO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																				
JHONATAN DAVID CLAVIJO PULGARIN	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
RIGOBERTO CRUZ HENAO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X																									
GERLEY MAURICIO CUERVO CASTRO	AYUDANTE	X	X																														
WILINTON DAVILA LOPEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
LISMARIO DIOSA GARCIA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X																								
HELMER ANDRES FLOREZ DUQUE	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JHON JAIRO GAMBOA ANGRINO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X																								
HELMER ELIAS GARCIA GOMEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
CARLOS ALBERTO GARCIA HERRERA	OFICIAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
DIEGO FERNANDO GARZON PEÑA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-180530 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

033

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No. 0498 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: GÉNOVA - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																														TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CRISTIAN CAMILO GODOY MARTINEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JOSE ALEJANDRO GONZALES GARCIA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
DAIRO ALEJANDRO GONZALEZ PULGARIN	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
REINEL DE JESUS HENAO CANO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JUAN DAVID HERRERA SALAZAR	CONDUCTOR	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JORGE LEONARDO HOLGUIN ROLDAN	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X																								
CARLOS ANDRES LOPEZ SILVA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X															
SANTIAGO MAHECHA BARRERA	AYUDANTE	X	X																														
DANIEL ALEJANDRO MARIN GARCIA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
DIEGO ALEJANDRO MARIN MARIN	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
NORBERTO MARIN MARIN	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE	X	X																														
CRISTIAN CAMILO MEDINA PARRA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X															
ESLEIDER MENDEZ SILVA	AYUDANTE	X	X																														
PLINIO MENDOZA JARAMILLO	ING.SUBCONTRATISTA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
HECTOR JAIME MONTAÑO ROBLEDO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JHONATAN DAVID MONTENEGRO GUALTERO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X																								
JOSE RICAURTE PARRA CASTIBLANCO	OFICIAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JACINTO PEROOMO IPIA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																				
JHON FABIO PEREZ RENDON	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																				
LUIS FERNANDO PEREZ RENDON	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																				
CARLOS ANDRES PIÑEROS COY	OFICIAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
OSCAR DANILO PULGARIN MIRA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
MICHAEL ALEJANDRO ROMAN MONTOYA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
CESAR AUGUSTO SALGADO ESTRADA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X																									
JESUS ANDRES SILVA GIRALDO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JUAN CARLOS SOTO FRANCO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-180530 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No. 0498 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: GÉNOVA - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
LUIS ALBERTO SUAREZ GARZON	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JOSE ALEXANDER TOVAR VASQUEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
OSCAR IVAN VALENCIA FRANCO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
HAROLD STIVEN VALENCIA QUINTERO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JUAN ANDRES VIDALES HENAO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X																									
JUAN CAMILO ALVAREZ MAHECHA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
JHOBANY ALBERTO ALVAREZ PEREZ	HERRERO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X																	
CRISTIAN CAMILO AMARILES OSORIO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X															
ALVARO FERNANDO ANDREADE CORDOBA	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X						
EDGAR JOHANY CARDONA MORILLO	AYUDANTE	X																															
ANDRES FELIPE GUALTEROS JURADO	AYUDANTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																				
LUIS FERNANDO SOTO POSDA	ING.SUBCONTRATISTA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-180530 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

040

ANEXO 4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-VIA-15-FR-9		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3436 - 2018 — CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2018 — CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: PUAO - IQUICAS Y GENOVA - CUACAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2018	1110	3499-0402-0800-2018-1301001-0001	4503000	NACION	4361	5,419,238,921.23
2018	1110	3499-0402-0800-2018-1301001-0001	4503000	NACION	4361	5,419,238,921.23
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 5,419,238,921.23

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.419 De (29/01/2018)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	Recibo parcial	ago-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,921.23	0.00	5,419,238,921.23	NA		NO	
2	Recibo parcial	sep-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,921.23	0.00	5,419,238,921.23	NA		NO	
3	Recibo parcial	oct-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,921.23	0.00	5,419,238,921.23	NA		NO	
4	Recibo parcial	nov-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,921.23	0.00	5,419,238,921.23	NA		NO	
5	Recibo parcial	dic-18	83,222,527.73	15,812,280.27	99,034,808.00	0.00	0.00	5,320,204,113.23	99,034,808.00	5,320,204,113.23	NA		NO	
6	Recibo parcial	ene-19	329,374,215.00	0.00	329,374,215.00	0.00	0.00	4,990,829,898.23	428,409,023.00	4,990,829,898.23	NA		NO	
7	Recibo parcial	feb-19	431,125,496.00	0.00	431,125,496.00	0.00	0.00	4,559,704,402.23	859,534,521.00	4,559,704,402.23	NA		NO	
8	Recibo parcial	mar-19	377,889,389.00	0.00	377,889,389.00	0.00	0.00	4,181,815,011.23	1,237,423,910.00	4,181,815,011.23	NA		NO	
9	Recibo parcial	abr-19	330,329,628.00	0.00	330,329,628.00	0.00	0.00	3,851,485,383.23	1,567,753,538.00	3,851,485,383.23	NA		NO	
10	Recibo parcial	may-19	459,958,744.00	0.00	459,958,744.00	0.00	0.00	3,391,826,639.23	2,027,412,282.00	3,391,826,639.23	NA		NO	
11	Recibo parcial	jun-19	392,944,786.00	0.00	392,944,786.00	0.00	0.00	2,998,881,853.23	2,420,357,070.00	2,998,881,853.23	NA		NO	
12	Recibo parcial	jul-19	546,147,484.00	0.00	546,147,484.00	0.00	0.00	2,452,734,367.23	2,966,504,554.00	2,452,734,367.23	NA		NO	
13	Recibo parcial	ago-19	359,443,045.00	0.00	359,443,045.00	0.00	0.00	2,093,291,322.23	3,325,947,599.00	2,093,291,322.23	NA		NO	
14	Recibo parcial	sep-19	369,204,033.00	0.00	369,204,033.00	0.00	0.00	1,724,087,289.23	3,695,151,632.00	1,724,087,289.23	NA		NO	
15	Recibo parcial	oct-19	1,134,101,697.00	0.00	1,134,101,697.00	0.00	0.00	589,985,592.23	4,829,253,329.00	589,985,592.23	NA		NO	
	TOTALES		4,813,441,048.73	15,812,280.27	4,829,253,329.00			589,985,592.23	4,829,253,329.00	589,985,592.23				

Todas las Actas aprobadas por la interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	5,138,283,252.00	0.00	5,138,283,252.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	0.00	0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	83,222,528.43	15,812,280.40	99,034,808.83
GESTION PREDIAL (PREACTA)		0.00	0.00
GESTION SOCIAL (PREACTA)	69,113,805.69	13,131,623.31	82,245,430.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	69,113,805.69	13,131,623.31	82,245,430.00
PERMISOS Y GARANTIZACIÓN VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1995 DE 2017	14,647,358.62	2,782,841.18	17,430,000.00
SALDO			
VALOR TOTAL	5,374,380,453.03	44,856,468.20	5,419,238,921.23

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: OSCAR JAIME [illegible]
Director de Obra
Matrícula No. [illegible]

Firma
Nombre: JAIME [illegible]
Director de [illegible]
Matrícula [illegible]

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Carpeta del Contrato Carpeta Los Administradores.
Copia: Interventor y Ejecutor Territorial.

042

ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/10/2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	22	21	24	22	21	24	22	24	24	24	24	24	24	21	20	23	22	22	22	17	22	22	21	24	21	24	24	24	21	24	698
Lluvias moderadas			3		2											2	1		2		2	2	2							3		19
Lluvias intensas		2				3		2							3	2		2		2	5			3		3						27
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Se anexa Boletin Diario del Estado del Tiempo mes Febrero (Registro plubiométrico del IDEAM)

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

044

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/10/2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

SECTOR: GÉNOVA-GUACAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	21	22	24	22	23	22	21	24	22	24	21	24	23	20	21	22	22	21	22	16	21	22	20	24	22	21	24	24	22	24	685
Lluvias moderadas			2		2	1				2		3		1			2		3	2	5		2			2				2		29
Lluvias intensas		3					2	3							4	3		2			3	3		4			3					30
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Se anexa Boletin Diario del Estado del Tiempo mes Febrero (Registro plubiométrico del IDEAM)

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-180530 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

045

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ** I D E A M ***

GRUPO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

BOLETÍN DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

AÑO: 2019
MES: OCTUBRE
DIA: 30

ESTACION AEROPUERTO	PRECIPITACIÓN (mm)			DIAS CON LLUVIA		FENÓMENO METEOROLÓGICO RELEVANTE	TEMPERATURA (°C)		
	DIA	ACUMULADO	PROMEDIO	ACUMULADO	PROMEDIO		MED	MAX	MIN
	30	EN EL MES	MENSUAL	EN EL MES	MENSUAL		DIA 30	DIA 30	DIA 31
Armenia	3,3	219,5	249,7	21	21	Tormenta y Lluvias	21,8	28,0	18,6

ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

MINFRA-MN-IN-15-FR-11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Dia) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA-GUACAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo (dias)	Resultado del Ensayo psi	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
1	9/10/2019	Ensayo a compresión en Cilindros de Concreto	NTC 673/2012	Placa Huella Cinta Derecha K10+230	20	14	22.8	SI	CONCRESERVICIOS
2									
3									

OBSERVACIONES:

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matrícula No.: 25202120989 QND

Firma

Nombre: FABIO ENRIQUE GARRILLO DAZA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 84103-0710

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

340

CONCRESERVICIOS S.A.S.	INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO NTC 673/2010	Código: F-EM-01/07
Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163		CR: 06142
		Inf. Nº: 740413

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra Nº	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm^2)	Relación (h'/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm^3)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm^2)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
020	CINTA CENTRAL K6+760	2019-10-09	30.5	30.6	15.2	181.5	2.01	14	2019-10-23	13701	1.00	2.476	410700	230.8	22.8	21	108.5	Cono y g

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes	FIRMA:	Pág. 1/1
LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	FECHA:	2019-10-23

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA

ANEXO 7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: PUAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO	DIRECTOR OBRA	OCTUBRE	30	7.536.962	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16625743	30	16449008	30	16449008	30	16449008	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	
WILVER ANTONIO JORDAN MOSQUERA	INGENIERO RESIDENT	OCTUBRE	30	1.094.903.632	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16625743	30	16449008	30	16449008	30	16449008	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	
JOHANA PARDO	INGENIERO AUXILIAR	OCTUBRE	30	41.941.541	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16625743	30	16449008	30	16449008	30	16449008	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	
JACQUELINE RAMIREZ	SOCIAL PUAO	OCTUBRE	30	30.396.167	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	8497805480	30	8497805480	30	8497805480	30	8497805480	30	SERVICOL	
JAIRO ANDRADE RIVERA	OFICIAL	OCTUBRE	30	7511681	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639183	30	19639183	30	19639183	30	19639183	30	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
JEHISON ALEXANDER ARISTIZABAL SALDARRIAGA	AYUDANTE	OCTUBRE	1	1.088.706.867	X																													19639183	1	19639183	1	19639183	1	19639183	1	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
JULIO CESAR IBARROSA	AYUDANTE	OCTUBRE	29	4.527.649	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X									19639183	29	19639183	29	19639183	29	19639183	29	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
EDWAR DARIO BENITEZ SANCHEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.088.706.489	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639183	30	19639183	30	19639183	30	19639183	30	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
EYNS JAIMER BETANCOURTH MARIN	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.010.261.661	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639183	30	19639183	30	19639183	30	19639183	30	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
GERARDO ANTONIO CASTAÑEDA GONZALEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	30	4.523.350	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639183	30	19639183	30	19639183	30	19639183	30	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
JHOSEDIN STIVEN CASTAÑEDA SANCHEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.088.709.199	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639183	30	19639183	30	19639183	30	19639183	30	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
VICTOR ALFONSO CASTRO LOZANO	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.094.967.457	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639183	30	19639183	30	19639183	30	19639183	30	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
MARCOS COY ARIZA	OFICIAL	OCTUBRE	22	9.779.837	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X								19639183	22	19639183	22	19639183	22	19639183	22	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
ARSALON DUQUE RAMIREZ	AYUDANTE	OCTUBRE	12	4.524.215	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		19639183	12	19639183	12	19639183	12	19639183	12	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
JORGE ALBERTO DUQUE RAMIREZ	AYUDANTE	OCTUBRE	29	4.523.929	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X									19639183	29	19639183	29	19639183	29	19639183	29	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
CARLOS ANDRES FLOREZ VILLAMIL	AYUDANTE	OCTUBRE	30	10.434.111	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639183	30	19639183	30	19639183	30	19639183	30	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
DIEGO ALEJANDRO CARVAJO FLOREZ	AYUDANTE	OCTUBRE	1	10.364.709.922	X						X																							19639183	1	19639183	1	19639183	1	19639183	1	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
RAUL ANDRES GONZALEZ RIVERA	AYUDANTE	OCTUBRE	4	1.088.367.360	X	X	X	X																										19639183	4	19639183	4	19639183	4	19639183	4	LUIS FERNANDO SATO POSADA	
ANDRES CELIPE OLALCTORES JURADO	AYUDANTE	OCTUBRE	1	1.088.664.230	X																													19639183	1	19639183	1	19639183	1	19639183	1	LUIS FERNANDO SATO POSADA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Union Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obreros. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordo esta obligacion contractual y ratificado mediante el oficio FNC-625-2018-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019.
4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12 correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes.

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matrícula No. 25202120985 QND

Firma
Nombre: [illegible] DUQUE DAZA
Director de Interventoria
Matrícula No. 01[illegible]710

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copia: Interventor, Dirección Territorial

051

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 8498-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GÉNOVA

SECTOR: PUAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
GILDARDO HERNANDEZ HERNANDEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	12	19.395.409	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		19639193	12	19639193	12	19639193	12	19639193	12	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JORGE ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	12	1.087.368.401	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		19639193	12	19639193	12	19639193	12	19639193	12	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
PABLO EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	OFICIAL	OCTUBRE	12	18.354.064	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		19639193	12	19639193	12	19639193	12	19639193	12	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
YESICA FABIAN HERNANDEZ HERNANDEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	12	1.087.362.962	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		19639193	12	19639193	12	19639193	12	19639193	12	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JOSE RODRIGO JARAMILLO CARDENAS	AYUDANTE	OCTUBRE	7	1.089.759.827	X	X	X	X	X		X																							19639193	7	19639193	7	19639193	7	19639193	7	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHON FREDY JURADO JARAMILLO	OFICIAL	OCTUBRE	30	80.095.437	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	19639193	30	19639193	30	19639193	30	19639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JULIO CESAR LOPEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	4	18.491.321	X	X	X	X																										19639193	4	19639193	4	19639193	4	19639193	4	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JOSE IVAN LOPEZ SANCHEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	6	45.744.094	X	X	X	X	X		X	X																						19639193	6	19639193	6	19639193	6	19639193	6	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHON FREDY MONTOYA VALENCIA	AYUDANTE	OCTUBRE	11	1.087.723.247	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X													19639193	11	19639193	11	19639193	11	19639193	11	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
HUGO CURTA AREVALO	AYUDANTE	OCTUBRE	22	14.757.069	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X								19639193	22	19639193	22	19639193	22	19639193	22	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JORGE ANDRES OLIVEROS GONZALEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	7	1.089.759.976	X	X	X	X	X		X																							19639193	7	19639193	7	19639193	7	19639193	7	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
LUIS EDUARDO OROZCO PEREZ	AYUDANTE	OCTUBRE	30	16.493.411	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639193	30	19639193	30	19639193	30	19639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
CRISTIAN DAVID ORTIZ BARRACAN	AYUDANTE	OCTUBRE	11	1.089.368.329	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X													19639193	11	19639193	11	19639193	11	19639193	11	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
FABIAN ORDOÑO BARRACAN	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.089.759.142	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639193	30	19639193	30	19639193	30	19639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
ABEL ANTONIO PULGARIN WALTERO	AYUDANTE	OCTUBRE	6	94.251.991	X	X	X	X	X																									19639193	6	19639193	6	19639193	6	19639193	6	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JUAN NEPOMUCENO QUICENO GIL	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.089.759.585	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639193	30	19639193	30	19639193	30	19639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHONNY MAURICIO QUINTERO CONDINO	AYUDANTE	OCTUBRE	10	1.089.759.601	X	X	X	X	X		X	X	X	X																				19639193	10	19639193	10	19639193	10	19639193	10	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
GUSTAVO QUINTERO CONDINO	AYUDANTE	OCTUBRE	30	18.455.146	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639193	30	19639193	30	19639193	30	19639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHON FREDDY QUINTERO SANCHEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	7	18.453.146	X	X	X	X	X		X																							19639193	7	19639193	7	19639193	7	19639193	7	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JOSE ALBERTO RAMIREZ QUINTERO	AYUDANTE	OCTUBRE	4	1.089.758.930	X	X	X	X																										19639193	4	19639193	4	19639193	4	19639193	4	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JOSE OLIVA REYES CASTAÑO	OFICIAL	OCTUBRE	4	7.467.119	X	X	X	X																										19639193	4	19639193	4	19639193	4	19639193	4	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
EFRAIN ALFONSO ARIAS CORREA	CONDUCTOR	OCTUBRE	10	7.533.054	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X														19639193	10	19639193	10	19639193	10	19639193	10	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DIEGO ALEJANDRO TRUJILLO NARANJO	AYUDANTE	OCTUBRE	19	1.089.713.217	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X													19639193	19	19639193	19	19639193	19	19639193	19	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DANIEL SALDARRIAGA SALDARRIAGA	AYUDANTE	OCTUBRE	11	1.087.714.104	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																			19639193	11	19639193	11	19639193	11	19639193	11	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
MARIO DUBAN SANCHEZ DUQUE	OFICIAL	OCTUBRE	30	94.152.348	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639193	30	19639193	30	19639193	30	19639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
CRISTIAN CAMILO SANCHEZ LANCHEROS	AYUDANTE	OCTUBRE	27	1.089.758.114	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639193	27	19639193	27	19639193	27	19639193	27	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, idóneo. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordó esta obligación contractual y ratificado mediante el oficio FNC-825-2018-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019.
4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12 correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes.

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matricula No: 252021206989 GND

Firma
Nombre: [illegible] CARRILLO DAZA
Director de Interventoría
Matricula No: 0110-0710

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copia: Interventor, Dirección Territorial

052

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: PUAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
WILLIAN VASQUEZ BETANCOURTH	AYUDANTE	OCTUBRE	17	10.548.857.786	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X													19639193	17	19639193	17	19639193	17	19639193	17	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JUAN CARLOS VARGAS CARDONA	AYUDANTE	OCTUBRE	17	9.525.872	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X													19639193	17	19639193	17	19639193	17	19639193	17	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DANIEL YANEL VARGAS VIVAS	AYUDANTE	OCTUBRE	17	1.094.915.167	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X													19639193	17	19639193	17	19639193	17	19639193	17	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
CRISTIAN DAVID VELASQUEZ COLLAZOS	HERRERO	OCTUBRE	28	1.089.709.855	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X			19639193	28	19639193	28	19639193	28	19639193	28	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
BRAYAN STIVEN VIVAS PEDAS	AYUDANTE	OCTUBRE	17	1.094.966.512	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X													19639193	17	19639193	17	19639193	17	19639193	17	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DIEGO FERNANDO TORON	AYUDANTE	OCTUBRE	17	1.089.709.219	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X													19639193	17	19639193	17	19639193	17	19639193	17	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JEFFERSON ESTIVEN CAVADID PULIDO	AYUDANTE	OCTUBRE	4	1004369189	X	X	X	X																												19639193	4	19639193	4	19639193	4	19639193	4	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
BRAHIAN DAVID MENDOZA CASTILLO	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.089.563.207	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639193	30	19639193	30	19639193	30	19639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
LEONEL ROMERO RUAS	AYUDANTE	OCTUBRE	30	16.652.754	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639193	30	19639193	30	19639193	30	19639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
YEISON SOTO CANO	AYUDANTE	OCTUBRE	4	1.089.709.809	X	X	X	X																												19639193	4	19639193	4	19639193	4	19639193	4	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DIEGO ALEJANDRO TRUJILLO NARANJO	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.089.715.017	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639193	30	19639193	30	19639193	30	19639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
LUIS FERNANDO SOTO POSADA	ING. SUBESCRITOR TESTA	OCTUBRE	30	75168891	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	19639193	30	19639193	30	19639193	30	19639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribe el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obreros. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordó esta obligación contractual y ratificado mediante el oficio FNC-825-2018-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019
4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12,correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matricula No.: 2520212099 GND

Firma
Nombre: [illegible]
Consorcio Interventoría
Matricula No.: 01105-0710

Original: Informe mensual. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventoría. Dirección Territorial

052

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		22-FR-22-8
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0486-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: PUAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA	ING. RESIDENTE	OCTUBRE	30	16.466.702	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X			X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	16625743	30	16449008	30	16449008	30	16449008	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	
CRISTHYAN TARRAGUE SIERRA MORALES	INGLAN/JAR	OCTUBRE	30	13.803.080	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16625743	30	16449008	30	16449008	30	16449008	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	
CLAUDIA LORENA ZULUAGA FARFAN	SOCIAL OPERATIVA	OCTUBRE	30	47.949.031	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	8457805460	30	8457805460	30	8457805460	30	8457805460	30	SENACOL	
JHONATAN ARBOLEDA ALVAREZ	AYUDANTE	OCTUBRE	14	1.310.050.505	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X													16639193	14	16639193	14	16639193	14	16639193	14	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHON LIAMO ARBOLEDA POSADA	OFICIAL	OCTUBRE	30	9.669.916	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
ELMER JULIANO ARIAS TORO	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.114.790.080	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
YEFERSON ARREDONDO CASTRO	AYUDANTE	OCTUBRE	7	1.005.367.116	X	X	X	X	X																										16639193	7	16639193	7	16639193	7	16639193	7	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JUAN CAMILO BEDOLLO VELEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.007.319.362	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
URIEL BLANDON RENDON	OFICIAL	OCTUBRE	30	0.007.300	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
CARLOS CAELO CARDONA CASTAÑO	ING SUBCONTRATISTA	OCTUBRE	30	4.527.312	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
ANDRES MAURICIO CLAVIJO PULGARIN	HERRERO	OCTUBRE	14	1.090.483.380	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			16639193	14	16639193	14	16639193	14	16639193	14	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHONATAN DAVID CLAVIJO PULGARIN	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.144.204.985	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
ROBERTO CRUZ HENAO	AYUDANTE	OCTUBRE	7	1.089.967.492	X	X	X	X	X		X																								16639193	7	16639193	7	16639193	7	16639193	7	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DEIBLEY MAURICIO CUERVO CASTRO	AYUDANTE	OCTUBRE	2	1.088.324.296	X	X																													16639193	2	16639193	2	16639193	2	16639193	2	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
WILINTON DAVILA LOPEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.110.463.167	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
USMARO OCHOA GARCIA	AYUDANTE	OCTUBRE	9	1.007.371.763	X	X	X	X	X		X	X																							16639193	9	16639193	9	16639193	9	16639193	9	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
HELMER ANDRES FLOREZ DUQUE	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1089482796	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHON JAIRO CAMPOS ANDRINO	AYUDANTE	OCTUBRE	4	1.005.367.039	X	X	X	X	X		X	X																							16639193	4	16639193	4	16639193	4	16639193	4	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
HELMER ELVIS GARCIA GOMEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	30	13.167.322.913	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
CARLOS ALBERTO GARCIA HERRERA	OFICIAL	OCTUBRE	30	1.089.967.946	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DIEGO FERNANDO GARZON PEÑA	AYUDANTE	OCTUBRE	30	79.987.716	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El interventor es el responsable de la verificacion del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obrerris. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordo esta obligación contractual y ratificado mediante el oficio FNC-825-2019-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019.
4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12 correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes.

Firma
Nombre: OSCAR JAIME ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matricula No : 25202120989 QND

Firma
Nombre: JOSE LEONIDAS CARRILLO DAZA
Director de Interventoria
Matricula No : 07102-0710

Original: Archivo Gestión del contrato (Supervisor o Administrador)
Copias: Interventoría, Contratista Territorial

054

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GENOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
CRISTIAN CAMILO CODEY MARTINEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	14	1.005.367.047	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16639193	14	16639193	14	16639193	14	16639193	14	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JOSE ALEJANDRO GONZALES GARCIA	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.088.984.918	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
DARIO ALEJANDRO GONZALEZ PULGARIN	AYUDANTE	OCTUBRE	14	1.005.993.547	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16639193	14	16639193	14	16639193	14	16639193	14	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
RONEL DE JESUS HENAO CANO	AYUDANTE	OCTUBRE	30	15.332.955	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JUAN DAVID HERRERA SALAZAR	CONDUCTOR	OCTUBRE	30	1.088.709.955	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JORGE LEONARDO HOLGUIN MOLINA	AYUDANTE	OCTUBRE	9	1.096.034.647	X	X	X	X	X		X	X																						16639193	9	16639193	9	16639193	9	16639193	9	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
CARLOS ANDRES LOPEZ SILVA	AYUDANTE	OCTUBRE	17	1.075.273.100	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X													16639193	17	16639193	17	16639193	17	16639193	17	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
SANTIAGO MANCHA MARRERA	AYUDANTE	OCTUBRE	2	1.005.094.456	X	X																												16639193	2	16639193	2	16639193	2	16639193	2	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
DANIEL ALEJANDRO MARIN GARCIA	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.088.683.859	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
DIEGO ALEJANDRO MARIN MARIN	AYUDANTE	OCTUBRE	13	1.005.367.467	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16639193	13	16639193	13	16639193	13	16639193	13	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
NORBERTO MARIN MARIN	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1000027211	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	2	14.777.675	X	X																												16639193	2	16639193	2	16639193	2	16639193	2	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
CRISTIAN CAMILO MEDINA PARRA	AYUDANTE	OCTUBRE	17	1.005.367.627	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X													16639193	17	16639193	17	16639193	17	16639193	17	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
CELEDER MENDEZ SILVA	AYUDANTE	OCTUBRE	2	9.777.969	X	X																												16639193	2	16639193	2	16639193	2	16639193	2	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
PIJAO MENDOZA JARAMILLO	PAO SUBCONTRATISTA	OCTUBRE	30	7.514.801	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
HECTOR JAIME MONTAÑO ROBLEDO	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.088.684.082	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JHONATAN DAVID MONTENEGRO GUALTEROS	AYUDANTE	OCTUBRE	8	1.088.980.769	X	X	X	X	X		X	X																						16639193	8	16639193	8	16639193	8	16639193	8	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JOSE INCALATTE PARRA CASTELLANOS	OFICIAL	OCTUBRE	30	3.931.511	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JACINTO PENDOMO AYA	AYUDANTE	OCTUBRE	14	94.353.025	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16639193	14	16639193	14	16639193	14	16639193	14	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JHON FABIO PEREZ RENDON	AYUDANTE	OCTUBRE	14	4.426.458	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16639193	14	16639193	14	16639193	14	16639193	14	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
LUIS FERNANDO PEREZ RENDON	AYUDANTE	OCTUBRE	14	9.930.770	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16639193	14	16639193	14	16639193	14	16639193	14	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
CARLOS ANDRES PIÑEROS COY	OFICIAL	OCTUBRE	30	9.691.367	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			A	A	A	A	A		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
OSCAR DANILO PULGARIN MIRA	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.088.984.299	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
MICHAEL ALEJANDRO ROMAN MONTOYA	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.107.085.548	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
CESAR AUGUSTO SALCEDO ESTRADA	AYUDANTE	OCTUBRE	7	1.096.066.762	X	X	X	X	X		X																							16639193	7	16639193	7	16639193	7	16639193	7	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JESUS ANDRES SILVA CIRALDO	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.088.982.758	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JUAN CARLOS SOTO FRANCO	AYUDANTE	OCTUBRE	30	9.407.100	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Union Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificacion del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obreros. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordó esta obligacion contractual y ratificado mediante el oficio FNC-625-2018-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019.
4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12 correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes.

Firma:
Nombre: OSCAR ENRIQUE ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matricula No. 25202120980 QND

Firma:
Nombre: JOSE [illegible] CARRILLO GAZA
Matricula No. [illegible]

Original: Informe Mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copia: Interventor, Director Territorial

050

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: PUAO - GUACAS Y GENOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razon Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
LUIS ALBERTO ALVAREZ CARTON	AYUDANTE	OCTUBRE	30	14.893.671	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JOSE ALEXANDER TOVAR VASQUEZ	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.090.482.896	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
OSCAR IVAN VALENCIA FRANCO	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.088.035.305	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
HAROLD STIVEN VALENCIA QUINTERO	AYUDANTE	OCTUBRE	14	1.090.063.754	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16639193	14	16639193	14	16639193	14	16639193	14	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JUAN ANDRES VIVAS PEÑA	AYUDANTE	OCTUBRE	1	1.094.954.300	X	X	X	X	X																									16639193	1	16639193	1	16639193	1	16639193	1	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JUAN CAMILO ALVAREZ MAHECHA	AYUDANTE	OCTUBRE	30	1.088.563.577	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
JHONNY ALBERTO ALVAREZ PEREZ	HERRERO	OCTUBRE	14	80.053.041	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16639193	14	16639193	14	16639193	14	16639193	14	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
CRISTIAN CAMILO AMARILES OSORIO	AYUDANTE	OCTUBRE	17	1.088.663.680	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X													16639193	17	16639193	17	16639193	17	16639193	17	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
ALVARO FERNANDO ANDRADE CORDOBA	AYUDANTE	OCTUBRE	27	1.088.700.054	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					16639193	27	16639193	27	16639193	27	16639193	27	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
EDGAR JOHNNY CARDONA MORILLO	AYUDANTE	OCTUBRE	1	1006647006	X																													16639193	1	16639193	1	16639193	1	16639193	1	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
ANDRES FELIPE QUINTERO JURADO	AYUDANTE	OCTUBRE	14	1006664286	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16639193	14	16639193	14	16639193	14	16639193	14	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	
LUIS FERNANDO SOTO POSADA	ING. RESIDENTE CONTRATISTA	OCTUBRE	30	75156031	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	16639193	30	16639193	30	16639193	30	16639193	30	LUIS FERNANDO SOTO POSSA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribió el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Union Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razon social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El interventor es el responsable de la verificacion del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obreros. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordó esta obligacion contractual y ratificado mediante el oficio FNC-625-2019-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019.
4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12 correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes.

Firma
Nombre: OSCAR XAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matrícula No: 25202120669 ONO

Firma
Nombre: JOSE CARLOS CARRILLO HAZA
Director de Interventoría
Matrícula No: 0110-0710

Original: Informe mensual Archivo de Carpeta del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Supervisor, Contratista

950

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que FEDOR OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO, identificado con CC 79841647 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Período pensión	Período salud	Días	Novedades														Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		
	16625743	E	2019/10/08	AFP	230301	PORVENIR	2019-09	2019-10	30															0	0,1600000	= 1.006.800
				EPS	EPS005	SANITAS			30															0	0,1250000	= 786.600
				ARP	14-11	ARL SURA			30															0	0,0696000	= 438.000
				CCF	CCF22	COLSUBSIDIO			30															0	0,0400000	= 251.700
				SENA	SENA	SENA			30															0	0,0200000	= 125.900
				ICBF	ICBF	ICBF			30															0	0,0300000	= 188.800
				ESAP	ESAP	ESAP			30															0	0,0000000	= 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30															0	0,0000000	= 0

PAGADO

057

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA, identificado con CC 1094909620 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Período pensión	Período salud	Días	Novedades														Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		
	16625743	E	2019/10/08	AFP	230301	PORVENIR	2019-09	2019-10	30															0	0,1600000	= 525.800
				EPS	EPS044	MEDIMAS EPS			30															0	0,1250000	= 410.800
				ARP	14-11	ARL SURA			30															0	0,0696000	= 228.800
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30															0	0,0400000	= 131.500
				SENA	SENA	SENA			30															0	0,0200000	= 65.800
				ICBF	ICBF	ICBF			30															0	0,0300000	= 98.600
				ESAP	ESAP	ESAP			30															0	0,0000000	= 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30															0	0,0000000	= 0

PAGADO

053

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que JOHANNA PATRICIA PARDO CARDENAS, identificado con CC 41941541 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Período pensión	Período salud	Días	Novedades													Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		
	16625743	E	2019/10/08	AFP	230201	PROTECCION	2019-09	2019-10	30																0	0.1600000	= 356.200
				EPS	EPS005	SANITAS			30																0	0.1250000	= 278.300
				ARP	14-11	ARL SURA			30																0	0.0696000	= 155.000
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30																0	0.0400000	= 89.100
				SENA	SENA	SENA			30																0	0.0200000	= 44.600
				ICBF	ICBF	ICBF			30																0	0.0300000	= 66.800
				ESAP	ESAP	ESAP			30																0	0.0000000	= 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30																0	0.0000000	= 0

PAGADO

059

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que FABIAN ENRIQUE SIERRA MORALES, identificado con CC 13993080 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Período pensión	Período salud	Días	Novedades														Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		
				AFP	230301	PORVENIR			30																0	0,1600000	$ 356.200
				EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.			30																0	0,1250000	$ 278.300
				ARP	14-11	ARL SURA			30																0	0,0696000	$ 155.000
	16625743	E	2019/10/08	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	2019-09	2019-10	30																0	0,0400000	$ 89.100
				SENA	SENA	SENA			30																0	0,0200000	$ 44.600
				ICBF	ICBF	ICBF			30																0	0,0300000	$ 66.800
				ESAP	ESAP	ESAP			30																0	0,0000000	$ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30																0	0,0000000	$ 0

PAGADO

030

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA, identificado con CC 18468702 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades														Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		
	16625743	E	2019/10/08	AFP	230301	PORVENIR	2019-09	2019-10	30															0	0.1600000	= 525.800
				EPS	EPS005	SANITAS			30															0	0.1250000	= 410.800
				ARP	14-11	ARL SURA			30															0	0.0696000	= 228.800
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30															0	0.0400000	= 131.500
				SENA	SENA	SENA			30															0	0.0200000	= 65.800
				ICBF	ICBF	ICBF			30															0	0.0300000	= 98.600
				ESAP	ESAP	ESAP			30															0	0.0000000	= 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30															0	0.0000000	= 0

PAGADO

061

aportes en línea

Planilla Resumen

octubre social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568326	9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESPECIALIZADOS ARMENIA	CALLE 17 No 14-48	ARMENIA-QUINDIO	7467373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	504727912	8497805460	E	2019/10/07	2019/10/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$369,634,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: ESPECIALIZADOS ARMENIA (2 Afiliados)																						$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$320,200		$0	$0	$1,424,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Afiliados)																						$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$320,200		$0	$0	$1,424,200
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$160,100		$0	$0	$712,100
1	CC	41949031	ZULUAGA PARRA CLAUDIA LORENA								X									230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS044	30	$2,300,000	$92,000	CCF43	30	$2,300,000	$92,000		30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	$712,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$160,100		$0	$0	$712,100
2	CC	30396182	RAMIREZ TORO JACQUELINE								X									230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF11	30	$2,300,000	$92,000		30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	$712,100
Total Afiliados(2)																						$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$320,200		$0	$0	$1,424,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568326	9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESPECIALIZADOS ARMENIA	CALLE 17 No 14-48	ARMENIA-QUINDIO	7467373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	504727912	8497805460	E	2019/10/07	2019/10/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$369,634,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$736,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$736,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$320,200
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	2	$320,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$184,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$92,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$92,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$184,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$92,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$92,000
TOTAL				2	$1,424,200

290

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

octubre 2019

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 7516691	0	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	8	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CALLE 21 N 13 51 OFICINA 503		0			lfsotoposada@hotmail.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-09	2019-10	16639193	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.418.100	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
109 de 109	16639193	2019-10-22	Sin pagar							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	IGE	INET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	ATP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	RNOL	RNUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento Parafisc
1	CC 1094663477	ALVAREZ MAHECHA JUAN CAMILO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	6.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	N
2	CC 9603041	ALVAREZ PEREZ JHOBANY ALBERTO	828.116	X															0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	386.455	61.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	386.455	48.400	COMFENALC QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	4.100	0,01044	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	149.500	N
3	CC 1094683689	AMARILIS OSORIO CRISTIAN CAMILO	828.116	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	469.266	75.100	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	469.266	58.700	COMFENALC QUINDIO-CCF43	469.266	18.800	469.266	4.900	0,01044	469.266	9.400	14.100	0	0	01	0	181.000	N
4	CC 1094709054	ANDRADE CORDOBA ALVARO FERNANDO	828.116	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	745.305	119.300	0	0	MEDIMAS EPS-SUBSIDIADA-EPS045	745.305	93.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	745.305	29.900	745.305	51.950	0,06960	745.305	15.000	22.400	0	0	01	0	331.700	N
5	CC 751160	ANDRADE RIVERA DARIO	828.116																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	828.116	132.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	N
6	CC 1010096505	ARBOLEDA ALVAREZ JHONATAN	828.116	X															0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	496.870	79.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	496.870	62.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	496.870	19.900	496.870	5.200	0,01044	496.870	10.000	15.000	0	0	01	0	191.800	N
7	CC 9800616	ARBOLEDA POSADA JHON JAIRO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	33.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	6.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	207.600	S
8	CC 1114796660	ARIAS TORO ELIBER JULIANO	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	828.116	132.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	6.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	N
9	CC 1094708697	ARISTIZABAL SALDARRIAGA JHNON ALEXANDER	828.116	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	27.604	4.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	27.604	3.500	COMFENALC QUINDIO-CCF43	27.604	1.200	27.604	2.000	0,06960	27.604	600	900	0	0	01	0	12.700	N

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PNSOL	PNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub. Tipo C	Total	Dias Pens
10	CC 1005367516	ARREDONDO CASTRO YEFERSON	828.116		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	193.228	31.000	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	193.228	24.200	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	193.228	7.800	193.228	13.500	0,00960	193.228	3.900	5.800	0	0	01	0	86.200	
11	CC 1007376362	BADILLO VELEZ JUAN CAMILO	828.116	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	828.116	33.200	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	0	0	0	0	01	0	207.600	
12	CC 9801300	BALDION RENDON URIEL	828.116		X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	828.116	132.500	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	828.116	165.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	
13	CC 4522649	BARBOSA JULIO CESAR	828.116		X														0			21	21	21	21	COLPENSION ES-25-14	579.682	92.800	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	579.682	72.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	579.682	23.200	579.682	40.400	0,00960	579.682	11.600	17.400	0	0	01	0	257.900	
14	CC 1097086689	BENITEZ SANCHEZ EDWARD DARIO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	165.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
15	CC 1010081661	BETANCOURT MARIN ESENIAWER	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	165.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
16	CC 1099683597	BUSTOS MEDINA CRISTIAN CAMILO	828.116		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	27.604	4.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	27.604	3.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	27.604	1.200	27.604	2.000	0,00960	27.604	600	900	0	0	01	0	12.700	
17	CC 1005368160	CADAVID PULIDO YEFERSON ESTIVEN	828.116	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	110.416	17.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	110.416	13.900	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	110.416	4.500	110.416	7.700	0,00960	110.416	2.300	3.400	0	0	01	0	49.500	
18	CC 4522312	CARDONA CASTAÑO CARLOS EVELIO	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	165.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
19	CC 1096962066	CARDONA MORILLO EDGAR JOHANY	828.116		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	27.604	4.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	27.604	3.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	27.604	1.200	27.604	2.000	0,00960	27.604	600	900	0	0	01	0	12.700	
20	CC 4523455	CASTAÑEDA GONZALEZ GERARDO ANTONIO	828.116																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	165.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
21	CC 1097087010	CASTAÑEDA SANCHEZ JEISSON STIVEN	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	165.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
22	CC 1094882457	CASTRO LOZANO VICTOR ALFONSO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	165.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
23	CC 1099683389	CLAVIJO PULGARIN ANDRES MAURICIO	828.116	X															0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	386.455	61.900	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	386.455	48.400	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	4.100	0,01044	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	149.300	
24	CC 1144201085	CLAVIJO PULGARIN JHONATAN DAVID	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	165.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
25	CC 9778837	COY ARIZA MARCOS	828.116	X															0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	607.286	97.200	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	607.286	76.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	607.286	24.300	607.286	42.300	0,00960	607.286	12.200	18.300	0	0	01	0	270.300	
26	CC 1099682682	CRUZ HIGAO RICOBERTO	828.116		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	193.228	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	193.228	24.200	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	193.228	7.800	193.228	13.500	0,00960	193.228	3.900	5.800	0	0	01	0	86.200	
27	CC 1088324286	CUERVO CASTRO GERLEY MAURICIO	828.116		X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	55.208	8.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	55.208	7.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	55.208	2.300	55.208	600	0,01044	55.208	1.200	1.700	0	0	01	0	21.700	
28	CC 1110465167	DAVILA LOPEZ WILINTON	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	165.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	
29	CC 1007371783	DIOSA GARCIA LISMARIO	828.116	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	220.831	35.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	220.831	27.700	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	220.831	8.900	220.831	2.400	0,01044	220.831	4.500	6.700	0	0	01	0	85.600	
30	CC 4524216	DUQUE RAMIREZ ABSALON	828.116	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	331.247	53.000	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	331.247	41.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	331.247	13.300	331.247	23.100	0,00960	331.247	6.700	10.000	0	0	01	0	147.600	

064

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	APTT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PNSOL	PNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub. Tipo C	Total	Exent Parafis
31	CC 4523920	DUQUE RAMIREZ JORGE ALBERTO	828.116		X														0			21	21	21	21	COLPENSION ES-25-14	579.682	92.800	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	579.682	72.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	579.682	33.200	579.682	40.400	0,09960	579.682	11.600	17.400	0	0	01	0	257.900	N
32	CC 1096882796	FLOREZ DUQUE HELMER ANDRES	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,09960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	N
33	CC 14436115	FLOREZ VILLAMIL CARLOS ANDRES	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,09960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	N
34	CC 1005367658	GAMBOA ANGRINO JOHN JAIRO	828.116	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	220.831	35.400	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	220.831	27.700	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	220.831	8.900	220.831	2.400	0,01044	220.831	4.500	6.700	0	0	01	0	85.600	N
35	CC 1116232553	GARCIA GOMEZ HEIMER ELIAS	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	219.500	N
36	CC 1099682946	GARCIA HERRERA CARLOS ALBERTO	828.116																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,09960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	N
37	CC 79887776	GARZON PENA DIEGO FERNANDO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	219.500	N
38	CC 1099709952	GIRALDO FLOREZ DIEGO ALEJANDRO	828.116		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	193.228	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	193.228	24.200	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	193.228	7.800	193.228	13.500	0,06960	193.228	3.900	5.800	0	0	01	0	86.200	N
39	CC 1005367597	GODOY MARTINEZ CRISTIAN CAMILO	828.116	X															0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	386.455	61.900	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	386.455	48.400	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	4.100	0,01044	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	149.300	N
40	CC 1099684018	GONZALEZ GARCIA JOSE ALEJANDRO	828.116																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,09960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	N
41	CC 1005093547	GONZALEZ PULGARIN DAIRO ALEJANDRO	828.116	X															0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	386.455	61.900	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	386.455	48.400	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	4.100	0,01044	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	149.300	N
42	CC 1005367360	GONZALEZ RIVERA RAUL ANDRES	828.116	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	110.416	17.700	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	110.416	13.900	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	110.416	4.500	110.416	7.700	0,09960	110.416	2.200	3.400	0	0	01	0	49.500	N
43	CC 1099684230	GUALTEROS JURADO ANDRES FELIPE	828.116		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	27.604	4.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	27.604	3.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	27.604	1.200	27.604	2.000	0,09960	27.604	600	900	0	0	01	0	12.700	N
44	CC 1099684230	GUALTEROS JURADO ANDRES FELIPE	828.116	X															0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	386.455	61.900	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	386.455	48.400	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	26.900	0,09960	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	172.100	N
45	CC 15532093	HENAO CANO REINEL DE JESUS	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	33.200	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	207.600	S
46	CC 18395609	HERNANDEZ HERNANDEZ GILDARDO	828.116	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	331.247	53.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	331.247	41.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	331.247	13.300	331.247	23.100	0,09960	331.247	6.700	10.000	0	0	01	0	147.600	N
47	CC 1097388427	HERNANDEZ HERNANDEZ JORGE ANDRES	828.116	X															0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	331.247	53.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	331.247	41.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	331.247	13.300	331.247	23.100	0,09960	331.247	6.700	10.000	0	0	01	0	147.600	N
48	CC 18394964	HERNANDEZ HERNANDEZ PABLO EMILIO	828.116	X															0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	331.247	53.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	331.247	41.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	331.247	13.300	331.247	23.100	0,09960	331.247	6.700	10.000	0	0	01	0	147.600	N
49	CC 1097392962	HERNANDEZ HERNANDEZ YEISON FABIR	828.116	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	331.247	53.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	331.247	41.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	331.247	13.300	331.247	23.100	0,09960	331.247	6.700	10.000	0	0	01	0	147.600	N
50	CC 1099709355	HERRERA SALAZAR JUAN DAVID	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,09960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	N
51	CC 1096034647	HOLGUIN ROLDAN JORGE LEONARDO	828.116	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	220.831	35.400	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	220.831	27.700	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	220.831	8.900	220.831	2.400	0,01044	220.831	4.500	6.700	0	0	01	0	85.600	N

690

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PNSOL	PNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub Tipo C	Total	Tip
52	CC 1099709827	ZARAMILLO CARDENAS JOSE RODRIGO	828.116		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-23030	193.228	31.000	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	193.228	24.200	[illegible]-CCF43	193.228	7.800	193.228	13.500	0,00960	193.228	3.900	5.800	0	0	01	0	86.200	
53	CC 89005437	JURADO JARAMILLO JOHN FREDDY	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
54	CC 1849132	LOPEZ JULIO CESAR	828.116	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-23030	110.416	17.700	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	110.416	13.900	COMFENALC QUINDIO-CCF43	110.416	4.500	110.416	7.700	0,00960	110.416	2.300	3.400	0	0	01	0	49.500	
55	CC 4524004	LOPEZ SANCHEZ JOSE IVAN	828.116	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-23030	220.831	35.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	220.831	27.700	COMFENALC QUINDIO-CCF43	220.831	8.900	220.831	15.400	0,00960	220.831	4.500	6.700	0	0	01	0	98.600	
56	CC 1015413192	LOPEZ SILVA CARLOS ANDRES	828.116	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-23030	469.266	75.100	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	469.266	58.700	COMFENALC QUINDIO-CCF43	469.266	18.800	469.266	4.900	0,01044	469.266	9.400	14.100	0	0	01	0	181.000	
57	CC 1005096894	MAHECHA BARRERA SANTIAGO	828.116		X														0			2	2	2	2	PROTECCION-23020	55.208	8.900	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	55.208	7.000	COMFENALC QUINDIO-CCF43	55.208	2.300	55.208	3.900	0,00960	55.208	1.200	1.700	0	0	01	0	25.000	
58	CC 1099602659	MARIN GARCIA DANIEL ALEJANDRO	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION-23020	828.116	132.500	0		ESSC ASMET SALUD-ESSC62	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
59	CC 1005367483	MARIN MARIN DIEGO ALEJANDRO	828.116	X															0			13	13	13	13	PORVENIR-23030	358.851	57.500	0		MEDIMAS EPS-EPS044	358.851	44.900	COMFENALC QUINDIO-CCF43	358.851	14.400	358.851	3.800	0,01044	358.851	7.200	10.800	0	0	01	0	134.600	
60	CC 1099602271	MARIN MARIN NORBERTO	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION-23020	828.116	132.500	0		MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	
61	CC 14277075	MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER	828.116		X														0			2	2	2	2	PORVENIR-23030	55.208	8.900	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	55.208	7.000	COMFENALC QUINDIO-CCF43	55.208	2.300	55.208	600	0,01044	55.208	1.200	1.700	0	0	01	0	21.700	
62	CC 1005367627	MEDINA PARRA CRISTIAN CAMILO	828.116	X															0			17	17	17	17	PROTECCION-23020	469.266	75.100	0		MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	469.266	58.700	COMFENALC QUINDIO-CCF43	469.266	18.800	469.266	4.900	0,01044	469.266	9.400	14.100	0	0	01	0	181.000	
63	CC 9772989	MENDEZ SILVA ESLEIDER	828.116		X														0			2	2	2	2	PROTECCION-23020	55.208	8.900	0		SALUD TOTAL-EPS032	55.208	7.000	COMFENALC QUINDIO-CCF43	55.208	2.300	55.208	600	0,01044	55.208	1.200	1.700	0	0	01	0	21.700	
64	CC 7514402	MENDOZA JARAMILLO PLINIO	828.116	X															0			30	30	30	30	PROTECCION-23020	828.116	132.500	0		SANITAS-EPS005	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	
65	CC 1099684002	MONTANO ROBLEDO HECTOR JAIME	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0		SALUD TOTAL-EPS002	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	
66	CC 1099682760	MONTENEGRO GUALTEROS JHONATAN DAVID	828.116	X															0			8	8	8	8	PROTECCION-23020	220.831	35.400	0		MEDIMAS EPS-EPS044	220.831	27.700	COMFENALC QUINDIO-CCF43	220.831	8.900	220.831	15.400	0,00960	220.831	4.500	6.700	0	0	01	0	98.600	
67	CC 1099683207	MONTOYA CASTILLO BRAHIAN DAVID	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION-23020	828.116	132.500	0		SALUD TOTAL-EPS002	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	
68	CC 1097723247	MONTOYA VALENCIA JOHN FREDDY	828.116	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-23030	469.266	75.100	0		SALUD TOTAL-EPS002	469.266	58.700	COMFENALC QUINDIO-CCF43	469.266	18.800	469.266	32.700	0,00960	469.266	9.400	14.100	0	0	01	0	208.800	
69	CC 74752500	OSEDA AREVALO HUGO	828.116	X															0			22	22	22	22	COLFONDOS-23100	607.286	97.200	0		MEDIMAS EPS-EPS044	607.286	76.000	COMFENALC QUINDIO-CCF43	607.286	24.300	607.286	42.300	0,00960	607.286	12.200	18.300	0	0	01	0	270.300	
70	CC 1099709976	OLIVEROS GONZALEZ JORGE ANDRES	828.116		X														0			7	7	7	7	COLPENSION-25-25-14	193.228	31.000	0		MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	193.228	24.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	193.228	7.800	193.228	13.500	0,00960	193.228	3.900	5.800	0	0	01	0	86.200	
71	CC 1843541	OROZCO PEREZ LUIS EDUARDO	828.116																0			30	30	30	30	COLFONDOS-23100	828.116	132.500	0		SALUD TOTAL-EPS002	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
72	CC 1005369325	ORTIZ BARRAGAN CRISTIAN DAVID	828.116	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-23030	469.266	75.100	0		MEDIMAS EPS-EPS044	469.266	58.700	COMFENALC QUINDIO-CCF43	469.266	18.800	469.266	32.700	0,00960	469.266	9.400	14.100	0	0	01	0	208.800	
73	CC 1099708142	OSORIO BARRAGAN FABIAN	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0		MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	

990

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	AVS	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PNSOL	PNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo C.	Total	Es Per
74	CC 9801517	PARRA CASTIBLANCO JOSE RICAURTE	828.116	X															0			30	30	30	30	PROTECCION-23020	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	
75	CC 94253025	PERDOMO IPIA JACINTO	828.116	X															0			14	14	14	14	PORVENIR-23030	386.455	61.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	386.455	48.400	COMFENALC QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	4.100	0,01044	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	149.300	
76	CC 4428458	PEREZ RENDON JHON FABIO	828.116	X															0			14	14	14	14	PROTECCION-23020	386.455	61.900	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESS062	386.455	48.400	COMFENALC QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	4.100	0,01044	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	149.300	
77	CC 9803220	PEREZ RENDON LUIS FERNANDO	828.116	X															0			14	14	14	14	PROTECCION-23020	386.455	61.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	386.455	48.400	COMFENALC QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	4.100	0,01044	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	149.300	
78	CC 9801302	PINEROS COY CARLOS ANDRES	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0	0	SOS-EPS-EPS018	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
79	CC 1099684206	PULGARIN MIRA OSCAR DANILO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
80	CC 94251981	PULGARIN WALTERO ABIEL ANTONIO	828.116		X														0			6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	165.624	26.500	0	0	SAMTAS-EPS005	165.624	20.800	COMFENALC QUINDIO-CCF43	165.624	6.700	165.624	11.600	0,06960	165.624	3.400	5.000	0	0	01	0	74.000	
81	CC 1099709585	QUICENO GIL JUAN SEBASTIAN	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
82	CC 1099709601	QUINTERO DONOSO JHONNY MAURICIO	828.116	X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-23030	276.039	44.200	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	276.039	34.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	276.039	11.100	276.039	19.300	0,06960	276.039	5.600	8.300	0	0	01	0	123.100	
83	CC 18436248	QUINTERO LONDOÑO GUSTAVO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	33.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	256.600	
84	CC 18435548	QUINTERO SANCHEZ JHON FREDY	828.116		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-23030	193.228	31.000	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	193.228	24.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	193.228	7.800	193.228	13.500	0,06960	193.228	3.900	5.800	0	0	01	0	86.200	
85	CC 1099706600	RAMIREZ QUINTERO JOSE ALBERTO	828.116	X	X														0			4	4	4	4	PORVENIR-23030	110.416	17.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	110.416	13.900	COMFENALC QUINDIO-CCF43	110.416	4.500	110.416	7.700	0,06960	110.416	2.200	3.400	0	0	01	0	49.500	
86	CC 7497110	REYES CASTAÑO JOSE DUFAI	828.116	X															0			4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	110.416	17.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	110.416	13.900	COMFENALC QUINDIO-CCF43	110.416	4.500	110.416	7.700	0,06960	110.416	2.200	3.400	0	0	01	0	49.500	
87	CC 7531056	ROJAS CORREA FREDNEY RODRIGO	828.116		X														0			16	16	16	16	COLFONDOS-23100	441.662	70.700	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	441.662	55.300	COMFENALC QUINDIO-CCF43	441.662	17.700	441.662	30.800	0,06960	441.662	8.900	13.300	0	0	01	0	196.700	
88	CC 1007605648	ROMAN MONTOYA MICHAEL ALEJANDRO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESS062	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	
89	CC 1099709725	ROMERO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO	828.116	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-23030	496.870	79.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	496.870	62.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	496.870	19.900	496.870	34.600	0,06960	496.870	10.000	15.000	0	0	01	0	221.200	
90	CC 18602794	ROMERO ROJAS LEONEL	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION-23020	828.116	132.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	828.116	103.600	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
91	CC 1097724124	SALDARRIAGA SALDARRIAGA DANIEL	828.116	X															0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	303.643	48.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	303.643	12.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	303.643	12.200	303.643	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	94.200	
92	CC 1096806762	SALGADO ESTRADA CESAR AUGUSTO	828.116		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-23030	193.228	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	193.228	24.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	193.228	7.800	193.228	13.500	0,06960	193.228	3.900	5.800	0	0	01	0	86.200	
93	CC 94192369	SANCHEZ DUQUE MARIO DUBAN	828.116																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	828.116	33.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	256.600	
94	CC 1099709316	SANCHEZ LANCHEROS CRISTIAN CAMILO	828.116	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	745.305	119.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	745.305	93.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	745.305	29.900	745.305	51.900	0,06960	745.305	15.000	22.400	0	0	01	0	331.700	
95	CC 1099682708	SILVA GIRALDO JESUS ANDRES	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	33.200	COMFENALC QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	256.600	

790 67

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	AUS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PNSOL	PNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Pr m
96	CC 1099709609	SOTO CANO YEISON	828.116	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-23030	110.416	17.700	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	110.416	4.500	O [illegible]LC O QUINDIO-CCF43	110.416	4.500	110.416	7.700	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	34.400	
97	CC 9802190	SOTO FRANCO JUAN CARLOS	828.116																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	33.200	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	6.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	207.600	
98	CC 7516691	SOTO POSADA LUIS FERNANDO	828.116	X															0			30	30	30	30	PROTECCION -23020	828.116	132.500	0	0	SANITAS-EPS005	828.116	33.200	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	256.600	
99	CC 14899871	SUAREZ GARZON LUIS ALBERTO	828.116	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	103.600	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	
100	CC 1099708218	TOBON DIEGO FERNANDO	828.116	X															0			17	17	17	17	COLPENSION ES-25-14	469.266	75.100	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	469.266	58.700	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	469.266	18.800	469.266	32.700	0,00960	469.266	9.400	14.100	0	0	01	0	208.800	
101	CC 1094682099	TOVAR VASQUEZ JOSE ALEXANDER	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
102	CC 1099710017	TRUJILLO NARANJO DIEGO ALEJANDRO	828.116																0			30	30	30	30	COLFONDOS-23100	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	828.116	103.600	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	
103	CC 1094035365	VALENCIA FRANCO OSCAR IVAN	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319.500	
104	CC 1099685754	VALENCIA QUINTERO HAROLD STIVEN	828.116	X															0			14	14	14	14	PORVENIR-23030	386.455	61.900	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	386.455	48.400	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	4.100	0,01044	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	149.300	
105	CC 1094885788	VAQUERO BETANCOURTH WILLIAM	828.116	X															0			17	17	17	17	PROTECCION -23020	469.266	75.100	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	469.266	58.700	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	469.266	18.800	469.266	32.700	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	145.400	
106	CC 9023472	VARGAS CARDONA JUAN CARLOS	828.116	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-23030	469.266	75.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	469.266	58.700	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	469.266	18.800	469.266	4.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	117.600	
107	CC 1094918167	VARGAS VIVAS DUBITIL YAMIL	828.116	X															0			17	17	17	17	COLFONDOS-23100	469.266	75.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS032	469.266	58.700	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	469.266	18.800	469.266	32.700	0,00960	469.266	9.400	14.100	0	0	01	0	208.800	
108	CC 1099709655	VELASQUEZ COLLAZOS CRISTIAN DAVID	828.116	X															0			28	28	28	28	PORVENIR-23030	772.909	123.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	772.909	96.700	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	772.909	31.000	772.909	53.800	0,00960	772.909	15.500	23.200	0	0	01	0	343.900	
109	CC 1096994359	VIDALES HINAO JUAN ANDRES	828.116		X														0			7	7	7	7	PROTECCION -23020	193.228	31.000	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	193.228	24.200	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	193.228	7.800	193.228	2.100	0,01044	193.228	3.900	5.800	0	0	01	0	74.800	
110	CC 1094966572	VIVAS RODAS BRAHYAN STIVEN	828.116	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-23030	469.266	75.100	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	469.266	58.700	COMFENALC O QUINDIO-CCF43	469.266	18.800	469.266	32.700	0,00960	469.266	9.400	14.100	0	0	01	0	208.800	

890

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 7516691	0	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	8	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CALLE 21 N 13 51 OFICINA 503		0		lfsotoposada@hotmail.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-09	2019-10	16639193	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.418.100	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
109 de 109	16639193	2019-10-22	Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
57.912.947	57.912.947	57.912.947	57.912.947	49.935.428

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				109	9.269.200	0	0	0	9.269.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	17	1.568.300	0	0	0	1.568.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	508.000	0	0	0	508.000
PORVENIR	230301	800224808	8	61	4.802.900	0	0	0	4.802.900
PROTECCION	230201	800229739	0	26	2.390.000	0	0	0	2.390.000
EPS(Administradoras: 9)				109	6.569.500	0	0	0	6.569.500
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	6	462.900	0	0	0	462.900
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	26	1.699.900	0	0	0	1.699.900
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	23	1.306.100	0	0	0	1.306.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	10	254.800	0	0	0	254.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	22	1.425.100	0	0	0	1.425.100
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	4	228.100	0	0	0	228.100
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	55.300	0	0	0	55.300
Gran Total					14.701.400	0	0	0	14.701.400

690

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	157.600	0		0	157.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	14	979.700	0		0	979.700
ARP(Administradoras: 1)				109	2.749.500	0	0	0	2.749.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	109	2.749.500	0	0	0	2.749.500
CCF(Administradoras: 1)				109	2.323.600	0	0	0	2.323.600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	109	2.323.600	0	0	0	2.323.600
SENA(Administradoras: 1)				97	1.003.700	0	0	0	1.003.700
SENA	PASENA	899999034	1	97	1.003.700	0	0	0	1.003.700
ICBF(Administradoras: 1)				97	1.502.600	0	0	0	1.502.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	97	1.502.600	0	0	0	1.502.600
Gran Total					23.418.100	0	0	0	23.418.100

SIN PAGAR

070

ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA
MINFRA-MN-IN-15-FR-14 PIJAO-GÉNOVA

UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No: 15 | PERIODO MES: OCTUBRE de 2018 | VALOR BASICO ACTA: $ 1,134,101,897.08

CONTRATO DE OBRA No:	0496 - 2018	PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2018
OBJETO:	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION	FECHA DE INICIACION:	9 de agosto de 2018
CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	FECHA DE REANUDACION:	
SECTOR:	PUNTO : GUACAS Y GENOVA - GUACAS	VALOR INICIAL (incluido IVA):	$ 5,476,236,921.23
RUTA:		VALOR ACUMULADO:	$ 5,476,236,921.23
TRAMO:	PUNTO : GENOVA	ANTICIPO CONCEDIDO:	$
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	825 de 2018	INTERVENTOR:	CONFEIA S.A.S

PLAZO ACUMULADO (MESES):	15.00		
FECHA DE SUSPENSION:			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	7 de noviembre de 2018		
VALOR ADICIONALES:	0		
AMORTIZACION ANTICIPO:			

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVE: INGENIERO HERNAN BARRETO AGUDELO

I. AVANCE FISICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado		Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
0496 - 2018	15.00		07/11/2018	$ 5,476,236,921.23	$ 5,476,236,921.23

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2018	$ 5,476,236,921.23
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
825	11.00	7 DE JULIO DE 2018	$18,320,310.00	$18,320,310.00
825-02-2018 DE 2018	15.00	7 DE NOVIEMBRE DE 2018	$10,342,629.00	$28,662,939.00

	Inversion Programada (P)		INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	E/P	Costos de Interventoría (I)	C/B	I/C
En el mes:	$21,161,362.00		$ 1,134,101,897.08	0.00	$ 1,134,101,897.08	182.80%	$ 56,560,463.00	100.00%	5.25%
Acumulado:	$ 4,614,710,312.68		$ 4,620,253,329.08	0.00	$ 4,620,253,329.08	165.32%	$ 653,801,234.00	100.00%	13.54%

	E/V		Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año
Contratista:	89.11%		14.97	99.79%	0.03	$ 589,985,162.23	0	-	$ 589,985,162.23
Interventor:	90.18%		14.97	139.05%	0.03	$ 24,561,705.00	0	-	$ 24,561,705.00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (incluido IVA)
V: Valor acumulado del contrato (incluido IVA)


*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	43,222,529.42
GESTION PREDIAL	0.00
GESTION SOCIAL	0.00
GESTION AMBIENTAL	0.00
OTRO CONCEPTO DE INVERSION	
VALOR TOTAL	43,222,529.42

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

CARACTERISTICAS TECNICAS

Seccion	Metros
Cunetas	3.6
Calzadas	7
Bermas	0
Sub-base	0.15
Base	0
Carpeta	0.15
Cunetas	1.4

Observaciones: Son placa huellas



CARACTERISTICAS TECNICAS

Seccion	Metros
Cunetas	2.7
Calzadas	6.1
Bermas	0
Sub-base	0.15
Base	0
Carpeta	0.15
Cunetas	1.4

Observaciones: Son placa huellas



CONVENCIONES: Programado | Ejecutado

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

INFORME 7/4

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GDP)	UNIDAD	01-02	01-03	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	Programado (m-mes)	Ejecutado (m-mes)	Programado Acumulado a (Mes	Ejecutado Acumulado (EA) (m)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA En el mes Programado	En el mes Ejecutado	(millones de pesos) Acumulado Programado	Acumulado Ejecutado
ALISTAMIENTO DE VIAS	ML									0.00	0.00	363.42	363.41	100.00%	$0	0	$1,720	1,720
PLACA HUELLAS	ML									115.90	171.91	1,334.89	1,462.00	109.52%	$107,078	158,726	$1,233,391	1,351,790
BLOCANTARILLAS	UNID									1.39	2.73	14.64	15.50	102.46%	$41,311	82,950	$444,268	487,429
MUROS DE CONTENCION	UNID									8.67	3.75	48.85	54.90	112.39%	$101,794	60,671	$818,736	880,300
ITEMS NO PREVISTOS	ML									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	$0	0	$0	0
															$330,183	302,347	$2,597,986	2,304,220
															$621,101	194,953	$4,674,212	4,426,210

NOTAS:
1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se cuente gráficamente con la columna "Avance Físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma:
Nombre: FEDERICO OSCAR JARAMILLO ZULUAGA
Director de Obra
Matrícula No. 25202170369 CND

Firma:
Nombre:
Matrícula No. 01103-2018 CPNAA

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

072

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME AVANCE FISICO-FINANCIERO

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	

UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO — ACTA No: 15 — PERIODO MES: OCTUBRE DE 2019 — VALOR BASICO ACTA: $ 1,134,101,697.00

CONTRATO DE OBRA No: DIRE - 2016
OBJETO: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
SECTOR: PUNTO CHURCAL Y GENOVA CHURCAL
RUTA: PUNTO GENOVA
TRAMO:
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 625 de 2016 — INTERVENTOR: CORPINA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2016
FECHA DE INICIACION: 3 de agosto de 2016
FECHA DE REANUDACION:
VALOR INICIAL incluido IVA: $ 5,415,236,921.29
VALOR ACUMULADO: $ 5,415,236,921.29
ANTICIPO CONCEDIDO: $

PLAZO ACUMULADO (MES): 15.00
FECHA DE SUSPENSION:
FECHA DE VENCIMIENTO: 7 de noviembre de 2019
VALOR ADICIONALES: $
AMORTIZACION ANTICIPO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTER: INGENIERO HERNAN BARRETO AGUDELO

I. AVANCE FISICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
DIRE - 2016	15.00	03/11/2019	$ 5,415,236,921.29	$ 5,415,236,921.29

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2016	$ 5,415,236,921
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
625	11	1 de julio de 2019	$ 519,020,743.00	$ 595,992,916.00
625-02-2016 DE 2016	15	1 DE NOVIEMBRE DE 2019	$ 166,342,629.00	$ 618,362,930.00

	Inversión Programada (P)	INVERSION EJECUTADA OBRA (incluido IVA)			EIP	Costos de Interventoría (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 1,134,101,697.00	$ 1,134,101,697.00	0.00	$ 1,134,101,697.00	0.00%	$ 69,969,990.00	100.00%	5.29%
Acumulado:	$ 4,829,253,529.00	$ 4,829,253,529.00	0.00	$ 4,829,253,529.00	0.00%	$ 653,467,704.00	100.00%	13.54%

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses
Contratista:	80.11%	14.57	90.19%	0.03	$ 960,967,592.23	0		$ 969,065,162.23
Interventor:	90.38%	14.57	90.19%	0.03	$ 24,967,705.00	0		$ 24,967,705.00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (incluido IVA)
V: Valor acumulado del contrato (incluido IVA)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sección	Metros
Corona	7.0
Cuneta	0
Berma	0
Sub Base	0.15
Base	0
Carpeta	0.15
Cuneta	1.4

Observaciones: Sin placa huella

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sección	Metros
Corona	7.0
Cuneta	0
Berma	0
Sub Base	0.15
Base	0
Carpeta	0.15
Cuneta	1.4

Observaciones: Sin placa huella

"OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	60,222,526.40
GESTION PREDIAL	0.00
GESTION SOCIAL	0.00
GESTION AMBIENTAL	0.00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0.00
VALOR TOTAL	60,222,526.40

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

CONVENCIONES — Programado — Ejecutado

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	UNIDAD	0.0 - 0.2	0.2 - 0.4	0.4 - 0.6	0.6 - 0.8	0.8 - 1.0	1.0 - 1.2	1.2 - 1.4	1.4 - 1.6	Programado (no mes)	Ejecutado (mes)	Programado Acumulado a (PA)	Ejecutado Acumulado (EA) (m)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos) En el mes Programado	En el mes Ejecutado	Acumulado Programado	Acumulado Ejecutado
ALISTAMIENTO DE VIAS	ML									19.68	0.00	892.46	960.00	93.24%	$4.06	$-	$4,225	$787
PLACA HUELLAS	ML									152.15	416.35	1,127.66	1,168.00	TOM 12%	155,459.39	427,747	$1,147,351	$1,541,274
ALCANTARILLAS	UND									1.04	0.67	10.36	9.00	90.71%	31,469.00	20,157	$313,471	294,407
MUROS DE CONTENCION	UND									5.13	1.83	30.30	27.55	91.59%	423,865.94	96,746	$811,181	294,509
ITEMS NO PREVISTOS	ML									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	$0	0
															290,414.42	544,650.58	2,976,227.51	2,123,902.60

NOTAS:
1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada mes mes" o "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa

Firma
Nombre: FEDDIN OSCAR JAVIER ZAMBRANO BRETHO
Director de Obra
Matrícula No. 252021-20689 QND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Firma
Nombre:
Cargo:
Matrícula No.:

073

ANEXO 9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 DE 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 8 de agosto de 2018

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2018

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5,419,238,921.23

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 99,034,808.83

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 99,034,808.83

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 541,923,892.00	25/01/2018	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	31/12/2021
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 1,625,771,676.00	Vigencia 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte del Instituto.	
Calidad de Estudios y Diseños	30%Estudios	$ 29,710,443.65	Vigencia 5 años contados a partr de la fecha de suscripción del acta de aprobación definitiva de la complementación de ajustes a estudios y diseños.	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2039272-3

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	7%	$ 390,621,000.00	25/01/2018	31/12/2018
Otros		NA	Día	Día

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0533641-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

ANEXO 10. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018 — CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 — INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
Mediante el oficio QER18C01151 del 13 septiembre de 2018, radicado en INVÍAS con el número 79570 el 18 de septiembre de 2018, la FNC manifiesta que renuncia al anticipo consagrado en la cláusula OCTAVA DEL CONTRATO No 498 de 2018, que se aprobó mediante la MODIFICACIÓN No UNO (1)contrato 498 de 2018 el 28 de noviembre de 2018 (CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el CONTRATO 498 DE 2018, en sentido de suprimir la CLAUSULA OCTA, referente al anticipo
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
TOTAL		NA	NA	NA	NA	NA	

.AS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoria.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso especifico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoria para su inversión.

(Firma)
(Nombre): JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ ARENAS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula No.:76228-178190 VLL

(Firma)
(Nombre) ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 2520266675 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

077

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO No. NA MES: OCTUBRE INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO [ ] (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No.498 DE 2018

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ DE _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ BANCO _____ SUCURSAL _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ %

VALOR DEL ANTICIPO: $ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

Mediante el oficio QER18C01151 del 13 septiembre de 2018, radicado en INVÍAS con el número 79570 el 18 de septiembre de 2018, la FNC manifiesta que renuncia al anticipo consagrado en la cláusula OCTAVA DEL CONTRATO No 498 de 2018, que se aprobó mediante la MODIFICACIÓN No UNO (1)contrato 498 de 2018 el 28 de noviembre de 2018 (CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el CONTRATO 498 DE 2018, en sentido de suprimir la CLAUSULA OCTAVA, referente al anticipo

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): NA
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: NA
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS N° NA FECHA NA VALOR NA
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES:

Firma
(Nombre): JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ ARENAS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula No.: 76228-178190 VLL


Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o Delegado
Director Interventoria
Matrícula No.: 2520256675 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

078

ANEXO 11. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

MINFRA-MN-IN-6-FR-2 PIJAO-GÉNOVA

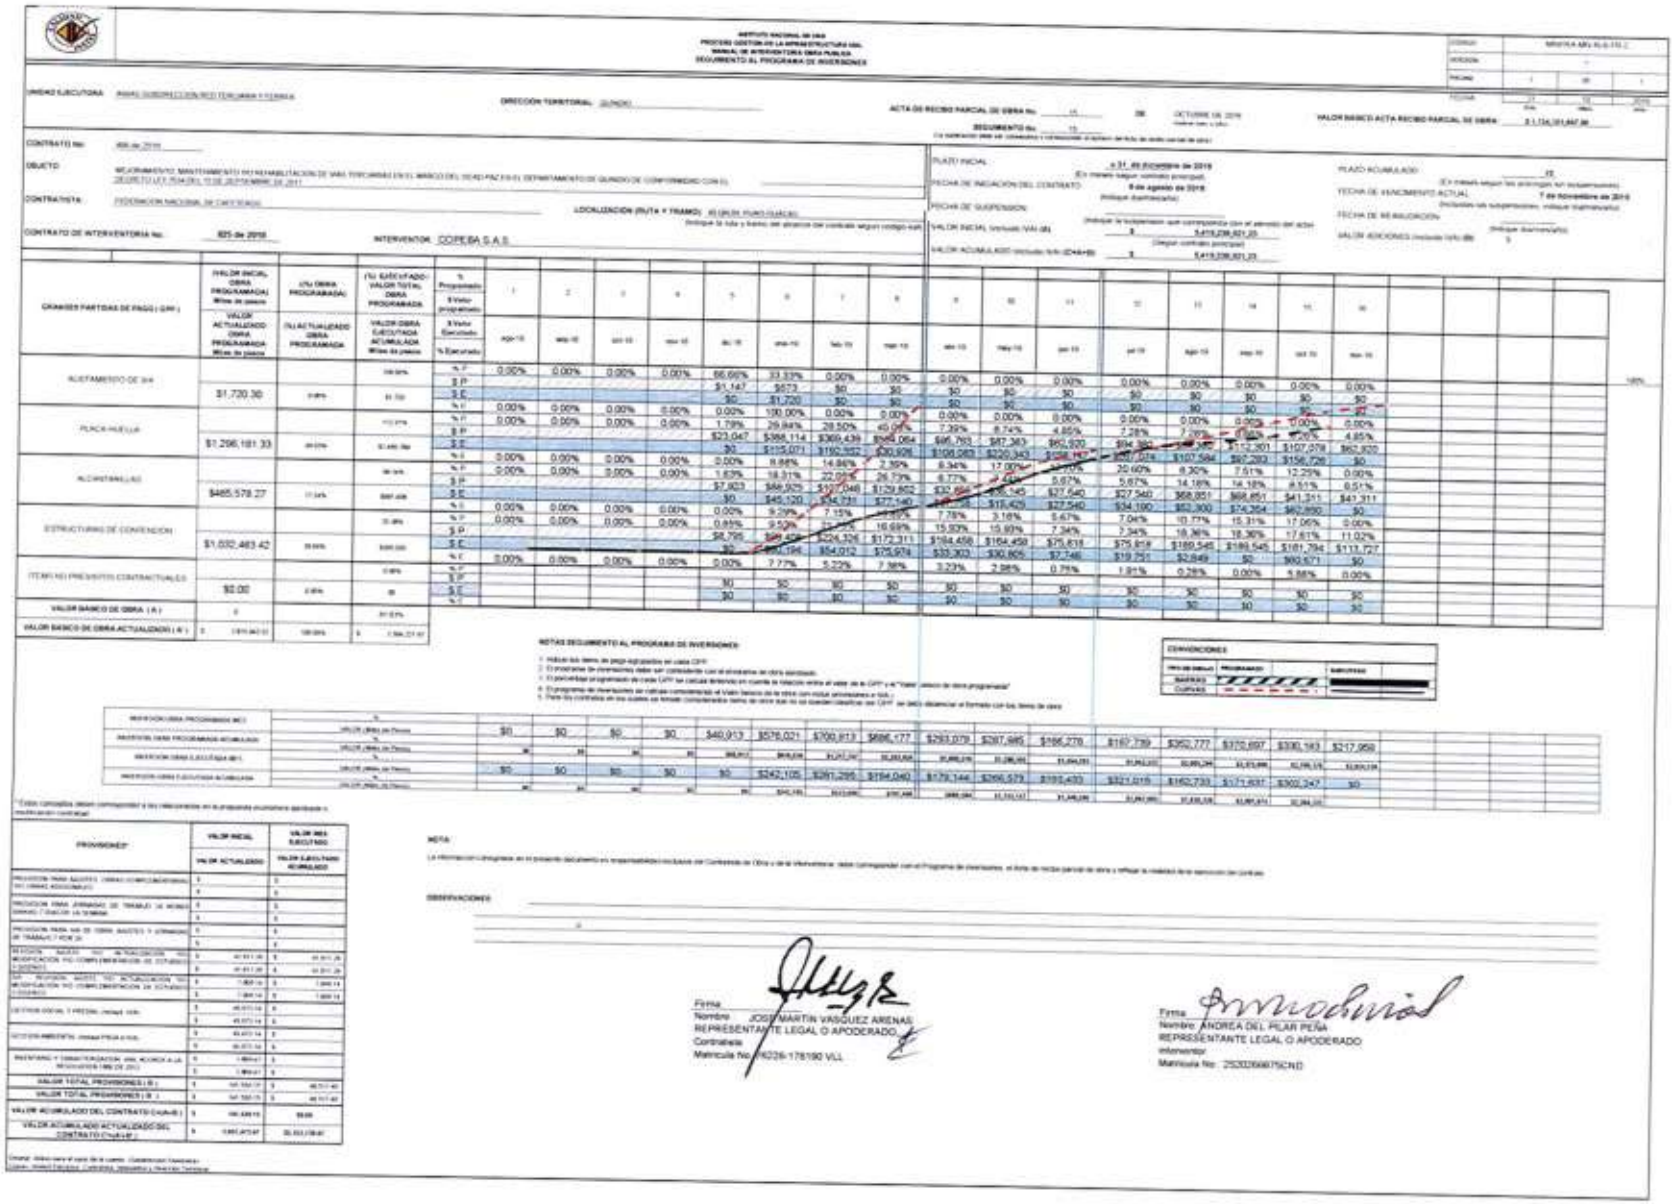

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. DE OCTUBRE DE 2019
SEGUIMIENTO No.
VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No.
OBJETO:
CONTRATISTA:
LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTOR: COPESA S.A.S.

PLAZO INICIAL: a 31 de Diciembre de 2019
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 9 de agosto de 2018
FECHA DE SUSPENSION:
VALOR INICIAL (incluido IVA) ($): $ 5,415,236,921.23
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) ($=A+B): $ 5,415,236,921.23
PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de Noviembre de 2019
FECHA DE REANUDACION:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($):

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA(Miles de pesos)	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO/ VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Valor Ejecutado / $ Valor Ejecutado / $ E	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19
AJUSTAMIENTO DE SUB	$1,720.30			% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.66%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P					$1,147	$573	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E					$0	$1,720	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PUNCH HUELLA	$1,296,181.33			% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.79%	29.84%	28.50%	40.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P					$23,047	$388,114	$369,439	$846,064	$96,763	$87,363	$60,920	$94,382	$94,382	$94,382	$112,301	$107,078
				$ E					$0	$115,071	$192,352	$30,926	$106,083	$220,343	$208,140	$97,078	$107,594	$62,273	$156,729	$62,920
ALCANTARILLAS	$485,578.27			% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.66%	14.84%	2.39%	8.34%	17.00%	16.06%	7.51%	8.30%	7.51%	12.25%	0.00%
				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.63%	18.31%	22.96%	26.73%	6.77%	5.67%	5.67%	5.67%	14.18%	14.18%	8.51%	0.51%
				$ P					$7,903	$88,975	$111,046	$129,802	$32,866	$27,540	$27,540	$27,540	$68,851	$68,851	$41,311	$41,311
				$ E					$0	$45,120	$34,731	$27,140	$36,238	$15,425	$27,540	$34,190	$52,300	$74,264	$62,950	$0
ESTRUCTURAS DE CONTENCION	$1,032,483.42			% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.29%	7.15%	5.22%	7.78%	3.18%	5.67%	7.04%	10.77%	15.31%	17.05%	0.00%
				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.85%	9.52%	11.93%	16.68%	15.93%	15.93%	7.34%	7.34%	18.36%	18.36%	17.61%	11.02%
				$ P					$8,795	$98,456	$124,326	$172,311	$164,456	$164,456	$75,818	$75,818	$189,545	$189,545	$181,794	$113,727
				$ E					$0	$40,194	$54,012	$75,974	$33,303	$30,905	$7,746	$19,751	$2,849	$0	$60,671	$0
ITEMS NO PRESUPUESTO CONTRACTUALES	$0.00			% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.77%	5.22%	7.36%	3.23%	2.96%	0.75%	1.91%	0.28%	0.00%	5.88%	0.00%
				% P																
				$ P					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$			% E																
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$			$																

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago ejecutados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el cronograma de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula dividiendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada"
4. El programa de inversiones se ratifica consistente el Valor básico de la obra con notas aclaratorias si hub. ;
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar las GPP se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

CONVENCIONES

PROGRAMADO		EJECUTADO	
BARRAS			
CURVAS			

INVERSIONES PROGRAMADAS MES	%																			
INVERSIONES OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR ($Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$40,913	$576,031	$700,913	$886,177	$293,079	$287,985	$166,276	$167,739	$352,777	$370,697	$330,193	$217,959			
INVERSIONES OBRA EJECUTADA MES	%																			
INVERSIONES OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR ($Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$242,105	$261,265	$784,040	$179,144	$266,579	$193,470	$321,015	$162,733	$171,837	$302,347	$0			
	%																			

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR OBRA EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES (OBRAS COMPLEMENTARIAS, NO OBRAS ADICIONALES)	$	$
	$	$
PROVISION OBRA JORNADAS DE TRABAJO (3 MESES)	$	$
	$	$
PROVISION PARA SUB DE OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO (POR 2)	$	$
	$	$
REVISION AJUSTES POR ACTUALIZACION MODIFICACION POR COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47,911.26	$ 47,911.26
	$ 47,911.26	$ 47,911.26
REVISION AJUSTES POR ACTUALIZACION MODIFICACION POR COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,869.14	$ 1,869.14
	$ 1,869.14	$ 1,869.14
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 49,672.14	$
	$ 49,672.14	$
GESTION AMBIENTAL (Incluye PSGA e IVA)	$ 49,672.14	$
	$ 49,672.14	$
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1995 DE 2017	$ 1,869.47	$
	$ 1,869.47	$
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 147,760.75	$ 49,781.40
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 147,760.75	$ 49,781.40
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (=A+B)	$ 185,426.15	$0.00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (=A+B')	$ 1,885,473.47	$ 35,553,139.87

Firma:
Nombre: JOSE MARTIN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No. 08226-178190 VLL

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No: 25202366875CND

080

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MINFRA-MN-INVI-FT-2
VERSION	1
FECHA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FLUVIAL — DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No: 15 DE OCTUBRE DE 2019 — SEGUIMIENTO No: 15 — VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,134,101,697.06

CONTRATO No: 456 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS — LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): ARGELIA- CENDEA (CUACAS)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 825 de 2018 — INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

PLAZO INICIAL: 4.77 de diciembre de 2018 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 9 de agosto de 2018 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL incluido IVA (A): $ 6,419,259,821.23 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO incluido IVA (C=A+B): $ 6,419,259,821.23

PLAZO ACUMULADO: 15 (En meses según las prórrogas en suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACION: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES incluido IVA (B): $ 0

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO (VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 ago-18	2 sep-18	3 oct-18	4 nov-18	5 dic-18	6 ene-19	7 feb-19	8 mar-19	9 abr-19	10 may-19	11 jun-19	12 jul-19	13 ago-19	14 sep-19	15 oct-19	16 nov-19
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19
ALISTAMIENTO DE VIA				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	103.92%	0.00%	0.00%	8.61%	10.76%	0.91%	1.15%	3.44%	3.44%	2.20%	0.78%
	$4,277.74	0.07%	$2,787	$ P					$0	$4,445	$0	$0	$368	$460	$39	$49	$147	$147	$94	$33
				$ E					$0	$0	$0	$2,604	$473	$710	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PLACA HUELLA				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.86%	11.07%	16.60%	0.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,282,567.09	20.23%	$1,163,338	$ P					$0	$7,912	$85,399	$107,740	$227,452	$378,087	$90,144	$90,144	$135,216	$225,361	$156,489	$135,216
				$ E					$0	$42,226	$34,895	$72,599	$64,430	$97,005	$149,012	$200,487	$171,699	$97,283	$158,726	$0
ALCANTARILLAS				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.29%	2.72%	5.65%	5.02%	13.03%	12.48%	15.63%	13.99%	7.59%	12.38%	0.00%
	$332,393.22	14.17%	$288,864	$ P					$0	$0	$36,621	$75,[illegible]	$57,038	$71,267	$12,587	$12,588	$31,489	$31,489	$31,489	$18,882
				$ E					$0	$9,096	$60,960	$[illegible]	$79,102	$0	$0	$17,994	$6,919	$14,204	$62,800	$0
ESTRUCTURAS DE CONTENCION				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.72%	18.31%	4.29%	23.80%	0.00%	0.00%	5.32%	2.59%	22.37%	24.93%	0.00%
	$703,141.65	30.29%	$635,761	$ P					$0	$0	$128,450	$34,011	$15,939	$15,939	$77,900	$77,899	$103,866	$103,866	$103,866	$91,961
				$ E					$0	$35,985	$[illegible],293	$61,194	$7,171	$25,364	$37,877	$6,955	$19,392	$0	$60,671	$0
ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUALES				% P																
	$0.00	0.00%	$0	$ P					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$			% T																
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 2,322,339.64	100.00%	$ 1,888,639.57																	

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de el GPP y el "Valor básico de obra programada"
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir protesores e IVA)
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar en GPP, se debe incorporar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DATOS	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%																			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$12,357	$243,998	$214,878	$300,737	$466,783	$180,670	$180,681	$270,099	$360,843	$290,918	$248,113			
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%																			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$12,357	$256,355	$471,233	$771,970	$1,238,753	$1,419,423	$1,600,104	$1,870,203	$2,231,046	$2,521,964	$2,770,077			
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%																			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$67,269	$149,618	$193,855	$151,176	$193,080	$197,668	$225,136	$196,710	$171,637	$302,247	$0			
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$67,269	$216,887	$410,742	$561,918	$755,998	$953,666	$1,178,802	$1,375,512	$1,547,149	$1,849,396	$1,849,396			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES ORDINARIOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES (1)	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO DE HORAS EXTRAS Y TURNOS DE LA SEMANA	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA MAYOR OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO Y OTROS (2)	$ -	$ -
	$ -	$ -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41,617.25	$ 41,617.25
	$ 41,617.25	$ 41,617.25
GAS - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7,999.19	$ 7,999.19
	$ 7,999.19	$ 7,999.19
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye GAL)	$ 40,013.74	$ -
	$ 40,013.74	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PMGA e IVA)	$ 40,013.74	$ -
	$ 40,013.74	$ -
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1382 DE 2017	$ 1,999.87	$ -
	$ 1,999.87	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 141,656.15	$ 49,617.43
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ 141,656.15	$ 49,617.43
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C=A+B)	$ 141,656.15	$0.00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C'=A'+B')	$ 2,463,995.64	$1,918,256.97

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: JOSE MARTIN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No. 73228-178190 VLL

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No. 2520269675CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. Copia(s) con el seguimiento
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

081

ANEXO 12. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

MINFRA-MN-IN-6-FR-1 PIJAO-GÉNOVA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
P... DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

DIA	MES	AÑO
31	12	2019

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS-Subdirección Red Terciaria y Ferrea — QUINDIO

PROGRAMA DE INVERSIONES [ ]

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3

CONTRATO No. 406 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL DCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO-LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 40 QN 09_PIJAO-GUACAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 525 de 2019

INTERVENTOR: COPESA S.A.S.

PLAZO INICIAL: a 31 de diciembre de 2019

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 30/08/2018

FECHA DE SUSPENSION: 0 (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) ($): $ 6,419,239,921.23 (Origen valores iniciales)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 6,419,239,921.23

PLAZO ACUMULADO: 16.00 meses (Si existen varias de prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACT.: 07/11/2019 (Incluidas las suspensiones, indique cuantas)

FECHA DE ACTUALIZACION: (Fecha terminado)

VALOR ADICIONES (incluido ...): $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Diciembre, 2018	Enero, 2019	Febrero, 2019	Marzo, 2019	Abril, 2019	Mayo, 2019	Junio, 2019	Julio, 2019	Agosto, 2019	Septiembre, 2019	Octubre, 2019	Noviembre, 2019
Conformacion calzada existente	$1,720.30	0.06%	$1,720	% P	99.99%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$1,147	$573	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$1,720	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Placa huellas - cunetas	$0.00	0.00%	$0	% E	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
	$1,296,181.33	46.03%	$1,455,789	% P	1.78%	29.94%	28.50%	45.06%	7.39%	6.74%	4.85%	7.28%	7.28%	8.66%	8.28%	4.65%
				$ P	$23,047	$388,114	$369,439	$584,064	$95,763	$87,383	$62,900	$94,380	$94,380	$112,301	$107,078	$62,900
				$ E	$0	$1,115,071	$182,552	$30,926	$108,083	$220,349	$188,147	$267,074	$267,074	$267,074	$267,074	$267,074
Alcantarillas	$485,576.27	17.24%	$491,403	% E	0.00%	8.86%	14.86%	2.39%	8.34%	17.00%						
				% P	1.63%	18.31%	22.05%	36.73%	6.77%	7.44%	5.67%	5.67%	14.18%	14.18%	8.51%	8.51%
				$ P	$7,923	$88,925	$107,048	$178,402	$32,859	$36,135	$27,540	$27,540	$68,851	$68,851	$41,311	$41,311
				$ E	$0	$45,120	$34,731	$77,140	$32,758	$15,429	$27,540	$34,190	$52,380	$274,304	$287,800	
Estructuras de contencion	$1,032,463.42	36.66%	$385,305	% E	0.00%	9.29%	7.15%	15.89%	7.78%	3.48%						
				% P	0.85%	9.53%	21.27%	16.69%	15.93%	15.93%	7.34%	7.34%	18.36%	18.36%	17.01%	11.02%
				$ P	$8,795	$98,408	$224,328	$172,311	$164,458	$164,458	$75,819	$75,819	$189,545	$189,545	$181,794	$113,727
				$ E	$0	$50,194	$54,012	$75,974	$41,303	$30,805	$7,740	$19,751	$7,740	$0	$180,671	
Items no previstos	$0.00	0.00%	$0	% E	0.00%	2.77%	5.23%	7.49%	3.23%	2.98%						
				% P												
				$ P												
				$ E												
VALOR BASICO DE OBRA (A)	0		0.00%	% E												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	2,815,943.32	100%	2,364,221.67													
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%			% P	1.45%	20.46%	24.89%	31.47%	10.41%	10.23%	5.90%	7.02%	12.53%	13.16%	11.72%	7.74%
	VALOR (Miles de Pesos)			$ P	$40,913	$578,021	$700,813	$886,177	$293,079	$287,985	$166,278	$197,739	$352,777	$370,697	$330,183	$217,958
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			% P	1.45%	21.91%	46.80%	78.27%	35.53%	45.76%	51.66%	54.84%	67.37%	80.53%	92.26%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)			$ P	40,913	616,934	1,317,747	2,203,924	$1,000,519	$1,288,505	$1,454,783	$1,544,329	$1,897,106	2,267,803	2,597,986	2,815,943
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%			% E	0.00%	8.60%	9.99%	6.54%	6.36%	9.47%	6.87%	11.40%	5.78%	6.10%	10.73%	
	VALOR (Miles de Pesos)			$ E	$0	$242,105	$281,295	$184,040	$179,144	$266,573	$193,433	$321,015	$162,733	$171,637	$302,247	$0
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			% EA	0.00%	8.60%	18.59%	25.12%	31.48%	40.95%	47.82%	59.22%	5.78%	65.32%	16.51%	
	VALOR (Miles de Pesos)			$ E	$0	$242,105	$523,400	$707,440	$886,584	$1,153,157	$1,346,590	$1,667,605	$1,830,338	$2,001,974	$2,304,222	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificación contractual

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0 / $0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$0 / $0
PROVISION PARA N/A DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$0 / $0
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41,811.28 / $41,811.28
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7,906.14 / $7,906
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 45,073.14 / $45,073
GESTION AMBIENTAL (Incluye PMGA e IVA)	$45,073.14 / $45,073
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 3960 DE 2011	$8,823.53
IVA INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 3960 DE 2011	$ 1,676.47
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$151,353.68
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$0.00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$2,967,297.0

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTAS:
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada"
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSE MARTIN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No. 76228-178190 VLL

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No. 2...0256675 CND

Vo.Bo. Firma
Nombre: ALVARO POLANIA RIVERA
Gestor Tecnico de Proyecto
Matricula No. 63202-26140 QND

Revisó Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matricula No. 63202-13454 QND

Firma
Nombre: ALFONSO MESA PATIÑO
Director Territorial
Matricula No. 63202-09691 QND

Firma
Nombre: RICARDO A. CORREDOR PARRA
Jefe unidad Ejecutora
Matricula No. 01106-9831

Original: Archivo de Gestion Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

83

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1	DE	1
31	10	2019

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS-Subdirección Red Terciaria y Ferrea — QUINDIO

PROGRAMA DE INVERSIONES ( )
REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9

CONTRATO No: 498 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL UCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS — LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 40 GRUPO CENOVA GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 626 de 2018 — INTERVENTOR: COPESA S.A.S

PLAZO INICIAL: a 31 de diciembre de 2018
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 de agosto de 2018
FECHA DE SUSPENSION:
VALOR INICIAL (incluido IVA) ($): $ 5,419,239,821.23
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) ($): $ 5,419,239,821.23

PLAZO ACUMULADO: 15.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACT.: 7 de noviembre de 2019
FECHA DE TERMINACION:

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA (Miles de pesos) / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA (Miles de pesos)	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA (Miles de pesos)	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	8 Diciembre, 2018	9 Enero, 2019	10 Febrero, 2019	11 Marzo, 2019	12 Abril, 2019	14 Mayo, 2019	15 Junio, 2019	16 Julio, 2019	17 Agosto, 2019	18 Septiembre, 2019	19 Octubre, 2019	20 Noviembre, 2019
Conformacion calzada existente	$4,277.74	0.16%	68.53%	% P	0.00%	103.82%	0.00%	0.00%	8.61%	10.78%	0.91%	1.15%	3.44%	3.44%	3.44%	1.24%
			$2,931	$ P	$0	$4,445	$0	$0	$368	$462	$39	$49	$147	$147	$147	$53
			68.53%	% E	$0	$0	$0	$2,604	$473	$710	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Placa huellas - cunetas	$1,280,567.06	55.23%	$1,113,527	% P	0.00%	0.00%	0.00%	60.86%	11.07%	16.60%						
			86.97%	$ P	0.00%	0.62%	6.66%	8.40%	17.73%	29.56%	7.03%	7.03%	10.54%	17.57%	17.57%	10.54%
				$ P	$0	$7,912	$85,396	$107,740	$227,452	$379,067	$90,144	$90,144	$135,216	$225,361	$225,361	$135,216
				$ E	$0	$42,226	$34,866	$72,599	$64,430	$167,006	$49,744	$200,467	$121,666	$200,000	$462,747	
Alcantarillas	$332,353.22	14.31%	$274,298	% P	0.00%	2.75%	2.75%	5.66%	5.66%	13.03%						
			82.53%	$ P	0.00%	0.00%	11.02%	22.06%	17.19%	25.45%	3.79%	3.79%	9.47%	9.47%	9.47%	5.68%
				$ P	$0	$0	$36,621	$73,127	$57,139	$84,588	$12,587	$12,586	$31,469	$31,469	$31,469	$18,882
				$ E	$0	$9,056	$60,860	$57,452	$79,102	$0	$0	$17,694	$0	$0	$0	
Estructuras de contención	$703,141.85	30.28%	$245,788	% P	0.00%	2.72%	18.31%	34.05%	23.92%	0.00%						
			34.95%	$ P	0.00%	0.00%	17.34%	34.68%	2.20%	2.27%	11.08%	11.08%	14.77%	14.77%	14.77%	13.06%
				$ P	$0	$0	$121,950	$34,011	$15,939	$15,939	$77,900	$77,899	$103,866	$103,866	$103,866	$91,991
				$ E	$0	$35,985	$54,076	$61,194	$7,171	$25,364	$37,977	$8,955	$16,790	$700	$24,700	
Items no previstos		0.00%	$0	% P	0.00%	5.12%	8.70%	8.70%	1.02%	3.61%						
			0.00%	% E												
VALOR BASICO DE OBRA (A)	0		72.51%													
VALOR BASICO ACTUALIZADO (A')	2,332,548.86	100.00%	1,697,364.24													

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES/ $MILLS	%	0.00%	0.53%	10.51%	9.25%	12.95%	20.10%	7.78%	7.78%	11.66%	15.54%	12.53%	10.60%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$12,357	$243,966	$214,578	$300,797	$466,780	$180,670	$180,681	$270,699	$360,843	$290,918	$246,113
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $MILLS	%	0.00%	0.53%	11.04%	20.29%	31.51%	51.61%	59.39%	49.68%	61.34%	76.88%	89.40%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$12,357	$256,325	$471,203	$731,739	$1,198,523	$1,379,193	$1,153,767	$1,424,466	$1,785,309	$2,076,227	$2,322,340
INVERSION OBRA EJECUTADA MES/ $MILLS	%	0.00%	3.76%	6.45%	8.35%	6.51%	8.31%	8.52%	9.69%	8.47%	10.44%	20.95%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$87,269	$149,818	$193,855	$151,178	$193,080	$197,888	$225,136	$196,710	$242,451	$486,510	$0
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $MILLS	%	0.00%	3.76%	10.21%	18.56%	25.07%	33.38%	41.90%	51.60%	60.07%	70.51%	91.46%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$87,269	$237,087	$430,942	$582,118	$775,198	$973,086	$1,198,222	$1,394,933	$1,637,384	$2,123,894	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0
	$0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$0
	$0
PROVISION PARA Ítem DE OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 DIAS/ 24	$0
	$0
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41,611
IVA - REVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$7,906
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$37,172
GESTION AMBIENTAL (Incluye FINCA e IVA)	$37,172
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1360 DE 2013	$ 4,823.53
IVA INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1360 DE 2013	$ 916.47
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$129,602
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$129,602**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$2,451,942**
VALOR CONTRATO 498 DE 2018	**5,419,739**

Original: Archivo de control Contratista
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.)
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Firma
Nombre: JOSE MARTIN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula No. 76[illegible] 78190 VLL

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PIÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No. 52039887[illegible]

Firma
Nombre: RICARDO A. CORREDOR PARRA
Director Unidad Ejecutora
Matrícula No. 01106-0831

Revisó: Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula No. 63202-13454 GND

Firma
Nombre: ALFONSO MEZA LATINO
Director Territorial
Matrícula No. 63202-09691 GND

Vo.Bo. Firma
Nombre: ALVARO POLANIA RIVERA
Gestor Tecnico de Proyecto
Matrícula No. 63202-26140 GND

084

ANEXO 13. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

MINFRA-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 29 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No 71
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA SAS.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Fabian Enrique Sierra M.	Ing. Aux Frente General	F.N.C
Wilmer A. Jordan	Ing. Residente Pijao	FN.C.
Edisson Palacios Cano	Residente Interventoria	COPEBA SAS
Oscar Jaime Toro	Ing. Director	F.N.C.
Johanna Pardo	Ing. Aux Pijao	F.N.C
Pablo Alejandro Granados	Ing Residente General	F.N.C.
Hugo Cardona Cat.	Ing. Aux Interv.	Copeba SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Informe de avance y estado de la obra a la dirección territorial

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hace lectura del acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Presentación sobre avance de obra y cumplimiento del plan de contingencia o reprogramación de obras

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	2	DE	3

FECHA: 29 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Presentación y verificación de cumplimiento con la reprogramación de obra: El contratista hace presentación del avance de obra y expone el atraso que se presenta en el frente Bélgica - Guacas y se expone el cumplimiento de la programación en el frente Pitao - Guacas, donde el faltante es la construcción de los disipadores de las obras K9+280, K7+380, K8+670 y K9+095, se aclara que los disipadores para las tres primeras obras mencionadas ya se encuentran en ejecución y se proyecta su terminación esta semana; también se tiene pendiente las reparaciones a la escuela Juan XXIII donde el contratista guardó materiales, reparaciones como son: losas de la cancha deportiva, columnas del portón de entrada al predio y pintura de los muros, lo cual indica la dirección territorial que es necesario que se entregue dichas reparaciones antes del 07 de noviembre y que sean realizadas por el contratista.

El frente que presenta retraso en la construcción de placa huella y que preocupa que su entrega no logre a darse dentro del plazo a 07 de noviembre es el frente Bélgica - Guacas, donde está pendiente la construcción de 100 mts de placa huella en el sector venecia y 55 mts de placa huella en el sector Castellanos, para lo cual se acepta que el contratista pueda adelantar su rendimiento colocando concreto simple a cambio de concreto ciclopeo o piedra pegada, a fin de que sea entregada la obra dentro del plazo otorgado a 07 de noviembre de 2019

Respecto a la construcción de alcantarillas, ya se tiene instalada la tubería en las que faltaban por intervenir y se estaa haciendo, entre ellas la del K19+913 que tiene permiso de ocupación de cauce; el contratista manifiesta que sí dará terminación a la construcción de alcantarillas, a 07 de noviembre según el plazo.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	3	DE	3.

FECHA: 29 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Terminación de obras	07-Nov-2019	FNC.
Arreglo de detalles		FNC.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Fabian Enrique Sierra Morales	
Wilmen A. Jordan M.	Wilmen A. Jordan
Jose Martin Cabrales A	
Oscar Javier Zorro	
Oswaldo Mauricio Parra	
Pablo Alejandro Granada Valencia.	
Hugo Eurdoro Castro	
Edisson Palacios Cure	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 23 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 70
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Pablo Alejandro Granada	Ing Residente Cámara.	F.N.C.
Wilmer A Jaramillo	ING. RESIDENTE PIJAO	F.N.C
JAVIER ZORRILLO	DIRECTOR OBRA	FNC
Johanna Parra	Auxiliar Ingeniería	FNC.
Edisson Palacios Cano	Residente Interventoría	COPEBA SAS
Hugo Cardona Cortés	Ing Auxiliar I.T.	COPEBA SAS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación de compromisos
seguimiento y control a la ejecución de la obra y a la reprogramación o plan de contingencia

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta anterior # 69

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A. Verificación de compromisos
B. Verificación de la programación de obra (plan contingencias)
C. Temas Varios

089

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A. Verificación de compromisos

- Construcción de la alcantarilla del K19+913: No se ha dado cumplimiento por parte del contratista. La interventoría le restera dar cumplimiento con dicha obra para la cual se tramitó el permiso de ocupación de cauce, antes que venza el plazo. Contratista manifiesta que lo hará la próxima semana
- Respecto a la caracterización vial, el contratista manifiesta que ya se realizó para el tramo Pijao – Guacas
- El contratista manifiesta que la proxima semana dará inicio a la elaboración de planos record

B. Verificación de la programación de obra (plan contingencia)

– Sector Pijao–Guacas

Está pendiente y en ejecución la construcción de disipadores para las obras en K9+280, K7+380 y K8+670; la construcción del disipador del K9+280 está por terminarse. Tambien se está dando cumplimiento con las reparaciones de la escuela Juan XXIII, esta semana quedará fundida la placa para la cancha deportiva.

La interventoría recomienda dar cumplimiento y hacer revisión por parte del contratista, a la actividad de aseo y limpieza la próxima semana.

– Sector Génova – Guacas

En esta semana se estará dando terminación al tercer tramo de placa huella comprendido entre K18+159 y K18+720 con el cual se completa la placa huella continua de 1100 mts, quedando pendiente aproximadamente una longitud de 200 m de concreto ciclopeo (piedra pegada) por terminar.

El contratista manifiesta que se continúa trabajando la fundición de la piedra pegada faltante en la placa huella del sector el cerro, y que el dia lunes 28 de octubre comenzará con la construcción de la placa huella del Sector Venecia (K22+232 – K22+332)

La interventoría le manifestó al contratista que no dio cumplimiento a la reprogramación de obra que se hizo para el sector Génova – Guacas y que para la presente semana debía terminarse en su totalidad la construcción de placa huella que estan pendientes de iniciar y construir los tramos de

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	3	DE	4

FECHA	23 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

placa huella del sector Vinecia (160 mts) entre el K22+232 al K22+332 y la placa huella del sector Castellana (55 mts) entre el K23+755 y K23+810, para los cuales le resta el tiempo comprendido entre el 28 de octubre y el 07 de noviembre del presente. Por otra parte le hace falta al contratista la construcción de las alcantarillas del K19+913, K22+252 y K19+682

Temas varios:

- El contratista manifiesta que el ingeniero residente de obra del proyecto que hace intervención al puente Tamboriales, le informó que dicho puente presento un asentamiento en una de sus esquinas en una magnitud de 1cm por lo que se debe tener cuidado con el paso de los vehículos que transportan material a la obra de la ENC
- Es socializada la construcción de alcantarilla en el K19+220 ya que es un sitio que permanece con agua represada y afecta la banca de la vía
- La supervisión del proyecto solicitó realizar el próximo comité de obra en las instalaciones de la dirección territorial del INVIAS el proximo martes 29 de octubre a las 3:00 pm
- La interventoría recuerda al contratista del compromiso que tiene con la comunidad de retirar el material deslizado sobre la vía en el K6+890 y que corresponde al que sobrepasa del muro de contención existente y que reduce el ancho de la vía.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 23 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Construcción de alcantarilla con Permiso ocupación cauce KM9+913	29-10-2019	FNC

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 29 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Pablo Alejandro Granada Valencia	
Wilmer Antonio Jordan M	
[illegible]	
[illegible]	
Edisson Peñaloza Ruiz	
Hugo Cordon Castro	

Original: Informe mensual de interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 17 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 69
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 **DE** 2018

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Fabian E. Sierra M	Ing Aux Genova	FNC
Claudia Lorena Zuluaga	Residente Social	F.N.C
William A. Juagran	Residente Rjao	FNC
JAVIER ZORRO	DIRECTOR OBRA	FNC
Jacqueline Rojas Toro	Residente Social	F.N.C.
Pablo Alejandro Granada V.	Residente Génova	F.N.C.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación de compromisos
Verificación al cumplimiento de la reprogramación de obra mediante recorrido a la vía

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta anterior #68

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A. Verificacion de compromisos
B. Recorrido a obra para verificación del cumplimiento con la reprogramación de obra (Plan contingencia)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A Verificación de compromisos:
- Dar inicio a la caracterización vial: el contratista manifiesta que ya se dio inicio y se está realizando en el sector Pijao - Cuicas

B Recorrido por la obra para verificación del cumplimiento de la reprogramación de obra:
- Sector Pijao Cuicas

Se hace recorrido por la vía del proyecto, contando con la presencia del secretario de planeación municipal de Pijao y con integrantes del comité de participación ciudadana, quienes hacen el acompañamiento en el sector Pijao - Alto de Cuicas; Se hace observación a las obras de muros y placas huellas, los integrantes del comité de participación ciudadana expresan su preocupación por el estado de la vía en la parte alta (KMs 14 y 15) pues por las fuertes lluvias el material ha sido arrastrado por la corriente de aguas superficiales y les preocupa que la vía quede en tan mal estado luego de las buenas obras construidas, también expresan su preocupación por haber quedado un solo tubo en la obra del K8+670 donde según ellos en temporada invernal para bastante agua y material de arrastre. Al comité de participación ciudadana se le manifiesta que respecto a la inquietud de la obra del K8+670, esta obedece a un diseño el cual cuenta con sus estudios de hidráulica, y respecto al estado en que quedará la vía en los KMs 14 y 15, el proyecto no contempla intervención o mejoramiento de la superficie de rodadura, para retirar material o adicionar otro que pueda dejarse compactación.

De la revisión de obras se observa que de la placa huella del K6+749 al K6+899 faltan 3m de cuneta tanto por izquierda como por derecha, esto al finalizar el tramo entre el K6+846 y K6+899. En lo demás ya se encuentra terminada

Falta la construcción de disipadores para las obras del K4+280, K7+380 y K8+670; hacen falta también las reparaciones en la escuela Juan XXIII. Y las alcantarillas falta por construir el descole en el K7+280

El contratista se encuentra trabajando para terminar los anteriores faltantes del tramo Pijao - Cuicas en el plazo de ejecución estipulado

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	4

FECHA: 17 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Sector Genova - Guaccas

- Placa Huella entre K23+755 y K23+870 : hoy comienza a presentar atraso en su construcción pues no se ha dado inicio.
- Placa Huella entre K22+232 y K22+332 : hoy debería dar su terminación con la construcción de bordillo para esta obra y no se ha dado inicio.
- Placa Huella entre K18+159 y K18+720 : presenta un atraso de 24 m en la construcción de huellas y cunetas reforzadas, pero en construcción de concreto ciclopeo (piedra pegada) se incrementa el atraso a 180 ml, igualmente para bordillos.

El contratista manifiesta que en adelante se trabajará todos los días y se incrementará el personal para recuperar las cantidades atrasadas.

En cuanto a construcción de alcantarillas no se ha dado cumplimiento con la programación, se mantiene en atraso la construcción en los sitios K19+913 y K22+252

La interventoría solicita y reitera al contratista ejecutar la construcción de la alcantarilla del K19+913 para la cual se tiene el permiso de ocupación de cauce, en el próximo comité se espera que se esté dando cumplimiento.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 17 (Día) / 10 (Mes) / 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
construcción de alcantarilla del K 14+913	24-10-2019	ENC

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Fabian Enrique Sierra Morales	
Claudia Lorena Zuluaga Parra	
Oliver A. Duncan	
[illegible]	
Pablo Alejandro Granada Valencia	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 10 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 68
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Willer A. Jordan M.	ING. Residente Piloto	F.N.C.
Claudia Lorena Zuluaga P.	Residente Social	F.N.C.
Jacqueline Saavedra	Residente Social	F.N.C.
Javier Zorro	Director Obra	FNC
Pablo Alejandro Granada V.	Ing Residente Geotecnia	F.N.C.
Adriana Enrique Sierra M.	Ing Pilar Geotecnia	F.N.C.
Hugo Cardona Cortes	Ing Auxiliar Int.	Copeba SAS
Mario Edilma Zapata	SST	F.N.C.
Jhonny Palmera Perez	Ing. Auxiliar	F.N.C.
Edisson Palacios Soto	Residente Interventoria	COPEBA SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificacion de compromisos
Seguimiento al plan de contingencia o reprogramacion de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta anterior # 67

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A. Verificacion de compromisos
B. Seguimiento a la reprogramacion
C. Temas Varios

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A. Verificación de compromisos

- Entrega de aportes a seguridad social de agosto: el contratista manifiesta que ya se han enviado por correo electrónico y que sin embargo revisará para verificar que se haya enviado completa la información
- Ejecutar obras complementarias de la reprogramación de obra: en la presente semana se ha dado inicio a la ejecución de las obras complimentarias planteadas en la reprogramación.
- Publicación en el invias del ajuste del pago: ya se dio cumplimiento
- Presupuesto de inversión social: se dio cumplimiento

B. Seguimiento a la reprogramación de obra o plan de contingencia

* Sector Pijao - Buenos Aires
  - Placa huella sector partida para el sumidero K6+799 al K6+899: se ha dado cumplimiento con lo programado exceptuando la construcción de bordillo que no se ha iniciado, el contratista manifiesta que la próxima semana colocará formaleta necesaria para nivelarse en dicha ejecución y que se puede tener en cuenta que se tiene adelantada la construcción de huellas reforzadas, que ya estan en su totalidad.
  - Obras complementarias: se inician reparaciones en la escuela Juan XXIII, se está construyendo canal de descarga para la cuneta del K3+299, se está haciendo la conección entre el descole y el disipador existente para la alcantarilla del K2+770. No se ha dado inicio con la obra complementaria de empalme entre el muro de contención construido en el K9+280 con el gavión existente.
  - Construcción de alcantarillas
    - Se terminó la construcción de la alcantarilla del K5+823
    - Se está construyendo la alcantarilla del K9+095
    - No se ha dado inicio a la construcción de descole del K7+280

* Sector Edicue - Buenos Aires
  - Placa huella entre K18+759 y K18+720: presenta un atraso de 31 m respecto a lo programado
  - Placa huella entre K22+232 al K22+332 sector venecia: presenta atraso en la construcción de 69 m

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	3	DE	4

	FECHA	10 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Construcción de alcantarillas

Se mantiene el atraso con la construcción de la alcantarilla del K22+252

Se suma el atraso en la construcción de la alcantarilla del K19+913

C. Temas varios

- La interventoria reitera al contratista, hacer el aporte de la certificación de uso del agua.
- Se reitera al contratista ejecutar lo antes posible la construcción de obras que cuentan con permiso de ocupación de cauce y que se encuentran en atraso respecto a la programación, como es el caso de la alcantarilla del K19+913
- Se reitera al contratista realizar la caracterización vial.

099

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MNFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 10 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Dar inicio con la caracterización vial	Próxima semana	FNC

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Wilmer A Jordan M	Wilmer A Jordan
María Edilma Zapata Muñoz	María E Zapata
Claudia Lorena Zuluaga P.	
Jacobo Perez Paz	
Johanna Patricia Pardo	
JAVIER ZORRO	
Pablo Alejandro Granada Valencia	
Jobran Enrique Guerra Morales	
Hugo Cardona Cotes	
Edisson Palacios Ruiz	

Original: Informe mensual de interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 5	

FECHA: 03 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 67
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 **DE** 2018

INTERVENTOR: COPEBA SAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jacqueline Paquezano	Pos dute Social	F. N. C.
Wilmer A. Jordan M	Residente Pilas	F. N. C.
María E Zapata M	SST	F.N.C
Claudia Lorena Zuluaga P.	Residente Social	F.N.C
Johanna Palmera Pardo C.	Ing. Auxiliar	F.N.C
JAVIER ZORRO CASTRO	DIRECTOR	FNC
Pablo Alejandro Casanova	Ing. Residente Geren	FNC.
Mary Carey L	Prof Social	Copeba SAS
Hugo Cadena Castaño	Ing Auxi Inter.	Copeba SAS.
Edisson Palacios Ruiz	Residente Interventoria	COPEBA SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control a la ejecucion del proyecto
Verificacion de compromisos
Cumplimiento del plan de contingencia o reprogramacion de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hace lectura del acta anterior # 66

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A Verificacion de compromisos
B Cumplimiento de la reprogramacion de obra o plan de contingencia
C Temas Varios

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A. Verificación de compromisos

- Entrega del permiso de ocupación de cauce, fue enviado por correo electrónico por parte del contratista.
- Entrega de aportes a seguridad social del personal de obra del mes de agosto, no ha sido aportado por el contratista; se solicita aportarlo lo mas pronto.

B. Cumplimiento de la reprogramación de obra o plan de contingencia:

Sector Pijao - Guaicas

- Placa Huella K6+749 - K6+849:
respecto a la programación presenta un atraso en la construcción de 28 ml de bordillo superior izquierdo y 28m de bordillo superior derecho; por lo demás si se cumplió con lo programado
- Placa Huella K10+220 - K10+500
Se dió cumplimiento con lo programado
- Placa Huella K12+275 - K12+691:
Se tiene atraso en la construcción del canal de descarga para cuneta (9m) pero ya se tiene adelantada la construcción de toda la longitud de bordillo que estaba programada para finalizar el 29 de octubre
- K12+691 - K12+841 Placa Huella : ya se dio cumplimiento con lo programado
- Placa Huella del K12+841 al K13+077 : Tiene pendiente la construcción del canal de descarga para cuneta (9m)
- Obras Complementarias:
No se ha dado cumplimiento con la programación; a la fecha no se han iniciado reparaciones en la Escuela Juan XXIII, no se ha construido canal de descarga de la cuneta del K3+294, no se ha conectado el descole de la alcantarilla del K2+770 con el disipador existente y no se ha hecho empalme del muro construido en el K4+280 con el gavión existente
- Construcción de Alcantarillas:
En atraso construcción de Encole y Descole en el K4+095
En atraso construcción de Encole y Descole en el K5+823
En atraso construcción de Descole del K7+280
El contratista se compromete a dar inicio a la construcción de las anteriores obras la próxima semana

La interventoria recomienda al contratista ponerse al día en la programación de las obras complementarias faltantes, en especial dar inicio con las reparaciones en la escuela Juan XXIII.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Sector Génova - Guacas

- Placa Huella entre K17+620 - K18+002 : terminada
- Placa Huella entre K18+002 - K18+159 . Terminada
- Placa Huella entre K18+159 - K18+720 : Presenta un atraso en construcción de concreto ciclopeo (piedra pegada) de 87 m, presenta atraso en construcción de bordillo de 50m (25 por izquierda y 25 por derecha) y presenta un atraso de 48m de huellas y cunetas reforzadas. Por lo anterior se nota una reducción significativa del atraso en la construcción de esta placa huella.
- Construcción de alcantarillas

Se mantiene en atraso la construcción de la alcantarilla del K22+252.

C. Temas Varios

- La interventoría solicita al contratista aportar la certificación del uso del agua
- Se solicita al contratista dar prioridad y ejecutar lo mas pronto posible, las obras que cuentan con el permiso de ocupación de cauce
- Se solicita al contratista aportar certificado vigente de trabajo en alturas del personal que se requiere
- Se solicita al contratista practicas ambientales
- El contratista manifiesta que dará inicio a la construcción de la placa huella del sector veneciа (Génova - Guacas) el día 12 de octubre
- El contratista manifiesta que la próxima semana se instalará tubería de las alcantarillas faltantes
- El contratista manifiesta que dispone de todos los materiales y formaleta para terminar de construir placa huella con bordillos en el tramo Génova - Guacas y que también ingresaran 3 oficiales de construcción para recuperar el atraso que se tiene en concreto ciclopeo (piedra pegada) en el Sector Génova - Guacas
- El área Socio - Ambiental se ha reunido conjuntamente para dar inicio al proceso de cierre con su respectiva documentación
- La información del programa de atención a la comunidad se entregara en forma física y digital
- La interventoría social sugiere dar cierre a las actas de vecindad, a medida que se van terminando las obras

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	5

FECHA	03 (Día)	10 (Mes)	2014 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- La interventoría social solicita agilizar la adquisición de las actas de Territorialidad del personal.
- Se sugiere ir corrigiendo PAE y Salvo de proveedores
- La interventoría le pregunta a la FNC como va la contratación del profesional para realizar la Caracterización social Manifiesta que ya está contratada y necesita el contacto con el Supervisor de la interventoría, para que se coordine de acuerdo como desarrolle el proyecto.
- La interventoría solicita los presupuestos y los ofrecimientos a realizar por la parte social. La FNC que esta semana se harían los presupuestos respectivos para ser aprobados e iniciar los diseños.
- La actualización del PAGA se radicó en INVIAS esta semana.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	5

FECHA 03 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
• Entrega de aportes a seguridad social de agosto	inmediato	FNC - contratista.
• Ejecutar obras complementarias de la reprogramación de obra (Plan Contingencia)	Próxima Semana	FNC - contratista
• Radicación en INVIAS ajuste del PAEA	Antes de la Próxima Reunión	CORESA SAS.
- Presupuesto de Inversión Social	Próxima Reunión.	FNC - Contratista.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 10 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Ezequiel Roque Toro	
Wilmer A. Jaramillo M	
María Edilma Zapata Muñoz	
Claudia Lorena Zuluaga Parra	
Johanna Patricia Pardo C.	
JAVIER ZORRO CASIPO	
Pablo Alejandro Granada	
Nury Jeorgia Lopez	
Hugo Caicedo Castaño	
Edinson Palacios Cano	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUÍNDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Nury Garcia López	Prof Social Int.	Operar SAS.
Claudia Lorena Zuluaga P.	Residente Social	CAFE
Jacqueline Ramírez Toro	Residente Social	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento a los proyectos - PAGA de la gestión social

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Desarrollo de los programas de la gestión social.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	3

FECHA	2 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Proyecto 1 de atención a la comunidad: La interventoría solicita realizar el cierre de los PQRS con los debidos soportes. Ir enviando las cartas de agradecimiento a los lugares donde se ubicaron los PSI y realizar el desmonte con el registro fotográfico.
- Proyecto 2. de información y divulgación: La interventoría solicita la programación de la reunión de inicio; la presentación y volantes para revisión oportuna, entrega al INVIAS, tener en cuenta los gastos y logística para realizar el respectivo trámite para el pago.
- Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos: la interventoría solicita ir remando actas de veracidad en los puntos donde las intervenciones de obra con maquinaria pesado hayan terminado e ir realizando cierre de actas de compromiso.
- Proyecto 5 Cultura vial y participación ciudadana se debe programar los cierres con la comunidad que participo en los talleres y comités de participación ciudadana
- Proyecto 6 contratación de mano de obra la interventoría solicita para el cierre, las cartas de temporalidad del personal de obra.
- Proyecto 7 Proyectos productivos: se debe hacer el ajuste al documento PAGA, para realizar la inversión de obras con participación comunitaria. Con la debida propuesta
- Plan de inversión social: la interventoría solicita realizar los ajustes e incluir las obras con participación para determinar el rubro social

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3
		FECHA	2 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega de la actualización PMA	3/10/2019	Contratista
Entrega Plan de Inversión	4/10/2019	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Claudia Lorena Zuluaga Parra	
Jacqueline Ramirez Toro	
Nury Garcia Lopez	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 14. INFORMES SEMANALES

MINFRA-MN-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **INFORME SEMANAL**	CODIGO:			
		VERSION:			
		PAGINA:	1	DE:	1
		FECHA:	25 (Día)	10 (Mes)	2.019 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	TRAMO Y/O SECTOR(S):	TRAMO 1: PIJAO - GUACAS TRAMO 2: GUACAS - GENOVA		
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	QUINDIO	SEMANA No.: 64 (Numeración consecutiva) del	20/10/2019 al 26/10/2019
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	ING. HERNAN BARRETO AGUDELO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	ING ALVARO POLANÍA RIVERA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534			FECHA DE INICIO:	09-ago-18
KM A MEJORAR:	KM A REHABILITAR	KM A CONSTRUIR:	No. PUENTES:	OTROS:	32 obras transversales, 9 muros y 2656 m de placa huella

PIJAO - GUACAS		**GENOVA - GUACAS**	
KM PLACA HUELLA:	1.400 KM	KM PLACA HUELLA:	1.255 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS :	13 ALCANTARILLAS	ALCANTARILLAS :	12 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN:	4 MUROS DE CONTENCION	MUROS DE CONTENCION:	5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA			INTERVENTOR:	COFERA LTDA.		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	8498 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 5.419.236.921,23	CONTRATO No.	0825 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 518.805.316,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31-DIC-2019	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE -201	ADICIONES:	$ 160.362.620,00
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019	VALOR ACUMULADO:	$ 5.419.236.921,23	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 07 -NOV-2019	VALOR ACUMULADO:	$ 679.362.936,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.236.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	5.138.293.347,26
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	4.845.335.921,61
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	4.975.150.824,31
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		96,84%
% PROGRAMADO		94,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestion predial, social, ambiental y otras)	$	99.034.666,84
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	5.075.185.533,15
		98,77%

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 530.475.360,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

8. AVANCE FISICO

NOTA: A partir del 07 de Julio de 2019 se realiza prórroga del contrato hasta el 07 de noviembre de 2019 y el 26 de Julio el acta de modificación 2, donde incesan los ítems no previstos y se modifican cantidades de acuerdo con el Volumne XV Resumen Final Ejecutivo de los ajustes de estudios y diseños y se rabjá la reprogramación correspondiente

TRAMO 1: PUAO - GUACAS (K 00+000 AL K 17+850)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(ES):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00%		100,00%
PLAZA HUELLAS (M)	1.442,00		1.442,00
MUROS DE CONTENCION (ML)	54,90		54,90
ALCANTARILLAS (M)	15,00		15,00
ACEY PAVIMENTO VIA (M)	5.964,51		5.964,51
CUNETAS (M)	650,98		650,98
PASA	0,00%		0,00
SOCIAL	0,00%		0,00
CARACTERIZACION VIA	0,00%		0,00%

Los consultos para determinar el avance fisico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1		TOTAL
Retroexcavador 1	1		1
Vibro compactador	0		0
Carrotanque de agua de 10.000 litros	0		0
Volquetas de 7 M3	3		3
Mezcladores de concreto de mínimo 2,0 bultos	2		2
Vibradores de concreto	2		2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y	0		0
Cortadoras manual vibratorio (Rana)	1		1
Motoniveladora	0		0
Mezcladora adicional de 1/2 saco	0		0
Planta eléctrica	1		1
Campero	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUAO -GUACAS(KM00+)(K17,850)

AJUSTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	94722,4	5956	29823,86
PLACA HUELLA				
SUB BASE GRANULAR CLASE B	M3	1029,59	435	1029,59
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO RESTRINGIDAS	HA	0,62	0	0,62
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	8101,1	0	7686,16
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1270,52	220	1270,52
ACERO DE REFUERZO FY 420MPA	Kg	69402,6	265,16	69402,6
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1145,75096	2,26	1130,69
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	173,39	0	162,93
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	1694	0	914,05
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	439,6	0	139,39
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC ATAQUE DIAMETRO: 150mm	ML	484	0	332,3
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1176,77	29,54	1216,72
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	132	6,5	132
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	271,23	0	46
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	218,56	6,56	121,2
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	15790,52	594,14	14499,04
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	574,55	46,8	526
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	37,19	0	37,19
CONCRETO RESISTENCIA 17 MPA (E)	M3	11,315	0,46	11,01
RELLENO CON ARENA	M3	30,06	1,56	30,06
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	60	0	60

TRAMO Y/O SECTOR 1:

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	165,04	0,00	43,46
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	480,13	0,00	380,37
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1 M	ML	24,00	0,00	24,00
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,00 M EN CONCRETO	ML	24,00	0,00	24,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	131,35	0,00	112,93
CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	M3	9,35	0,00	7,59
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	Kg	13.225,59	0,00	10.088,00
Tubería Perforada en PVC de 3"	ML	39,10	0,00	30,72
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	794,75	0,00	533,36
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	226,00	0,00	88,29
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	188,92	0,00	188,92
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	293,60	0,00	183,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) CICLOPEO	M3	18,44	0,00	18,44
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC ATAQUE DIAMETRO: 150mm	ML	226,49	0,00	147,85
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO NOTARIAL	und	50,00	0,00	46,00
LIMPIEZA DE DERRAME TRANSVERSALES	M3	636,00	0,00	636,00
DEMOLICION DE CAMPAMENTO	M3			

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+650 AL K 25+600)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			100,00%
PLACA HUELLAS (M):		1.168,47	1.168,47
MUROS DE CONTENCION (ML):		27,75	27,75
ALCANTARILLAS (M):		9,00	9,00
ALISTAMIENTO VIA (ML):		3.572,00	3.572,00
OTROS (M):		576,00	576,00
TAPA			
SOCIAL			
CARACTERIZACION VIA			0,00%
			0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (k17.650-k25.40)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		0	0
Vibro compactador		0	0
Carrotanque de agua de 10.000 litros		0	0
Volquetas de 7 M3		4	4
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos		4	4
Vibradores de concreto		2	2
Compresor de 125 pies3 o superior, con martillo de rotación y		0	0
Compactadores manual vibratorio (canguro)		1	1
Planta electrica		1	1
Camioneta		1	1
		9	0

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K17+650 AL K 25+600)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	20.126,00	0,00	18.611,00
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	962,36	0,00	871,91
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,60	0,00	0,54
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6.620,70	0,00	6.515,70
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1.016,55	0,00	915,00
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	59.268,44	5.904,30	58.700,00
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1.055,00	45,00	1.003,00
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PEDRA PEGADA	M3	186,92	22,68	186,00
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	4.161,50	0,00	4.153,80
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	713,40	0,00	713,40
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4780DE DIAMETRO 150mm	ML	1.189,00	0,00	1.181,40
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	615,16	63,62	518,99
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC "B"	ML	91	13,00	99,66
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	73,2	0,00	12,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	109,7	0,00	88,58
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	11116,59	297,43	9.892,87
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	335,79	38,74	296,12
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SAJO AGUA	M3	39,31	0,00	26,22
CONCRETO RESISTENCIA 17 MPA (E)	M3	9,28	0,56	8,24
RELLENO CON ARENA	M3	27,61	2,47	22,26
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	99	12,00	77,00

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+650 AL K 25+600)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SAJO AGUA	M3	10,72	0,00	9,79
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	169,43	0,00	147,62
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1 M	ML	9,50	0,00	9,50
CAMISA TEMPORERTE DE DIAMETRO SUPERIOR 1,00 M, EN CONCRETO	ML	9,50	0,00	9,50
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	52,89	0,00	44,68
CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	M3	5,12	0,00	4,67
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	6.992,79	0,00	5.356,36
Tuberia Perforada en PVC de 3"	ML	12,15	0,00	12,35
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	124,78	24,85	124,78
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	14,26	4,26	29,19
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	92,83	0,00	92,83
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	68,25	0,00	57,66
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) CICLOPEO	M3	1,66	0,00	1,66
TUBERIA DE PLASTICO TPC CORRUGADA NORMA NTC 4780DE DIAMETRO 150mm	ML	35,65	8,10	35,65
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSITORIALES	UND	30,00	3,00	15,00
REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	471,19	0,00	236,40

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO		
		VERSION	1	
		PAGINA	1 DE 1	

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: AGREGADOS EXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ___ / LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___

UBICACION: Kilometro 4 de la via Barregán-Génova — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ / LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 29) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE, EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019, un funcionario de la CRQ realizó visita de campo para verificar las fuentes de agoue que también ocupación del cauce y el día 19 de septiembre de 2019 el ingeniero Zorro en el Comité de obra comunicó que la CRQ había dado el permiso de vertimiento

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional SST

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALUOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO, NO HAY ADQUISICIÓN DE

GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	61	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	21	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SEDES COMITE DE CAFETEROS PUJO Y GENOVA	
OTROS:			

OBSERVACION: Se han traladado los baños portátiles a la placa huella de La Maizena K10+220 al k10+500 y la placa huella del k18+159 al k18+728 . Se ha establecido el presupuesto social con participación comunitarie para las escuelas Juan XXIII de Puente Tabla (tramo Pijao-Guacas) y Río Rojo (tramo Génova-Guacas)

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el comité semanal de obra en WebEx

La interventoría mediante oficio ADM-FNC-826-2019-241 de fecha 23 de octubre de 2019, Conexión formato MINFRA-MN-N-0-FR-1 programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones del tramo génova-guacas periodo de julio de 2019.

La interventoría mediante oficio FNC-825-2019-181 de fecha 21 de octubre de 2019, cancelación vial y elaboración de planos récord.

La interventoría mediante oficio FNC-825-2019-187 de fecha 24 de octubre de 2019, orden y adecuación a obras terminadas.

Tramo Pijao - Guacas

Se continuaron obras de reparación de la escuela Juan XXII (Puente Tabla) la inversión social. Y arreglos por uso como campamento.

Se sigue en construccion el disipador alcantarilla k4+260

Se construye disipador en la placa huella de Puente Tabla k3+165 al 3+457 (k3+299)

Se construyen muros de muro de la alcantarilla k9+750 de la la placa huella El Sinaloa k9+743 al k9+843

Se construye placa piso del cabezal de descarga de la alcantarilla k5+649 (PH El Sinaloa)

Se construye placa piso del cabezal de descarga de la alcantarilla k12+550 (PH Los Chorros)

Se construye pocata y muro cabezote de la alcantarilla k14+560

Se instala tubo de la alcantarilla k0+220

Se realiza el proyecto de Escuelas Vecinas en la escuela 7 de agosto de La Maizena

Sobre la construcción de las alcantarillas: Tiene construidas completas k2+770, k5+623, k9+750, k10+158, k10+260, k10+660, k10+600, k11+960, k11+633, k12+756, k12+609, k13+066, k13+770,k15+588 y k16+665. Se tiene construida las pocetas del k7+280 y del k7+389 y del k9+670. Pocata y Muro cabezal de la alcantarilla k4+695, instalado la tubería de la alcantarilla k9+220. Falta terminar la construccion

Sobre los muros de contención: Se encuentran construidos los localizados en el k2+770 (muro1)completo), k4+260 (muro2) (completo), k7+389 (muro 3 completo, estribos 1, 2 y 3), k9+670 (muro 4 completo)

Sobre las placas huellas: Puente Tabla (k3+165 al k3+457), esta construida en su totalidad. La Laguna (k12+841 al 13+071) esta construida en su totalidad, la del Jardín (k12+651 al k12+841) está construida en su totalidad, la de Los Chorros (k12+275 al K 12+560), falta escuelas (2 cunetas disipadores), la de Silvio (k11+629 al k11+535), ya se terminó. De La Maizena k10+220 al k10+500, esta terminda, la del Sinaloa k9+743 al k9+843, falta terminar el ingreso derecho a la alcantarilla k5+643

NOTA:El estado del tiempo fue: lunes domingo (20 de octubre), 2 horas de lluvias, lunes (21 de octubre) 6 horas de lluvias, martes (22 de octubre) 3 horas de lluvia, miercoles (23 de octubre) 2 hora de lluvia, jueves (24 de octubre) 4 horas de lluvias, viernes (25 de octubre), sabado y sabado (26 de octubre) bien

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA (JUNIO de 2019): El compromiso de la semana era la construccion den la placa huella El Sinaloa (k6+743 al k6+843): 525 ml de placa huella incluida cunetas, vigasy bordillos inferiores. Otro compromiso era terminar todas las obras en la placa huella del k13+651 al k12+841 (canal de desague de cunetas k12+651 (se cumplió) y cunetas adicional k13+790) (se ejecutó); terminar las obras de la placa huella de La Laguna (k12+841 al k13+071) (ya se terminó). Las alcantarillas del k4+260 apenas se inició con la construcción del disipador, de la alcantarilla k7+280, solo se ha construido la poceta (incumplió), de la alcantarilla del k7+389 (falta disipador) (incumplió). Se adsentó y terminaron las obras en concreto de la alcantarilla k12+650. Se inició con la construcción de las obras de concreto de la alcantarilla k4+695. Se ha instalando la tuberia en la alcantarilla k14+560 (que reemplaza las obras a realizarse en el k6+350). Se han adelantado las obras de construcción de la placa huella El Sinaloa, faltando solo el ingreso de las cuentas a la alcantarilla k5+645 y parte de los bordillos superiores. En general el contratista esta cumpliendo con la construcción de las placas huellas cuyas obras de concreto estan por terminarse en la 1 semana de noviembre y la va hacer antes), está cumpliendo con los bordillos y e incumpliendo con las alcantarillas. Esta cumpliendo con las cuestrillas de placas huellas y alcantarillas. Con los equipos se está cumpliendo. Esta semana hubo cumplimiento en la inversión semanal de 580 millones programados se invirtieron $143 millones . Sobre el acumulado programado de $2.750 millones se lleva ejecutada $2.748 millones, está por debajo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CODIGO		
		VERSIÓN		
		PAGINA		DE

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION DIARIA (05 de septiembre de 2018): De la placa huella El Sinabrito K6+749 al k6+849: se han ejecutado las obras, faltando e ingresos de las cunetas a la alcantarilla k6+849. De la placa huella de La Malzena (k10+220 al k10+500), quedó terminada; en la placa huella de Los Chorros solo falta cunetas disipadoras y cuneta de descole; en la placa huella del Jardín (k12+661 al k12+841), ya está terminada; la placa huella La Laguna ya se terminó. De las alcantarillas de inicio la construccion de k4+095 (que se debió terminar el 27 de septiembre), solo falta el disipador. Falta construir obras de concreto alcantarillas k14+580, disipador k7+380, disipador k8+670, terminar disipador alcantarilla k4+280. Se cumplió en gran parte con la programacion diaria; se adelantaron obras como bordillosde la placa huella de La Malzena k10+220 al k10+500, no programadas (k14+680 (en construccion) y k11+490 (Ya construida))

Tramo Guacas - Gamova

Se inicia la construcción de filtro del muro 2 k19+163, falta llenar.

Se continúa con la construcción de bordillos y piedra pegada huella del K18+159 al K18+720.

Se continua con la construcción de la placa huella del k19+159 al k18+720, con la unión de los dos frentes de trabajo.

Se continúa la construcción de obras de concreto de la alcantarilla k19+964 (muro1)

Se instala tuberías de la alcantarilla k19+413 (muro 3).

Se realiza el proyecto de Escuelas Verdes en las escuelas El Recreo y Río Roto

Sobre la construcción de las alcantarillas se encuentran construidas: K17+675, k17+706,17+738, k17+818 , k17+866, k18+023, k18+105, k18+292,k18+360, k18+714. De la alcantarilla k19+964, falta terminar el disipador. Falta construir las obras de concreto de la alcantarillas del k19+413, k19+682 y k22+252.

Sobre las muros de contencion se encuentran terminados los del K 19+360 (muro 5), K19+964 (muro 1) y K22+321 (muro 4), y el muro 3 (k19+413) Falta bordillo. El muro 2 K 19+163, se termina su construcción, faltando el lleno.

Sobre la placas huellas se ha construido la placa huella entre 17+620 al 18+002. Se terminó obras de concreto entre el k18+002 al k18+159 Se han construido en la placa huella del k17+159 al k17+720, faltandis solo 11.50 ml de obras de concreto . La placas huella de Venecia se ha construido filtros, se ha conformado y construido la subbase. Sobre la placa huella Castellarios, se ha conformado la subrasante y

NOTA:El estado del tiempo fue: lunes (21 de octubre) 5 horas de lluvias, martes (22 de octubre) 2 horas de lluvia, miercoles (23 de octubre) 2 hora de lluvia, jueves (24 de octubre) 4 horas de lluvias, viernes (25 de octubre), seco y sabado (26 de octubre) seco

PLAN DE CONTINGENCIA (JUNIO): El compromiso era realizar la construccion del cabezal de descarga alcantarilla k19+682 (no se ejecuto), la construcción de obras en concreto de muro 2 (k19+163) (se cumplio). Ademas de eso se debia construir parte de las obras atrasadas: terminar la placa huella k18+159 al k18+720 (no se hizo, faltan 70 para completar 1120 ml de la placa huella El Recreo), terminar 100 ml de la placa huella de de Venecia (no se hizo) y 50 ml de placa huella Castellarios (no se hizo), obras de concreto de la alcantarilla k22+252 (no se hizo), alcantarillas k19+964 (no se ha terminado), obras de concreto alcantarilla k19+682 (no s ehizo) y alcantarilla del k19+413 (no se hizo). De piedra pegada de la placa huella k18+159 al K18+720, falta por ejecutar de los 350 ml. Con el equipo si se cumplió. Sobre la inversion semanal programada de $77 millones se ejecutaron $100 millones. Sobre la inversion ejecutada semanal acumulada de $2.340 millones esta por por encima de la programada de $2.089

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DIARIA (06 de septiembre de 2018): De la placa huella placa huella El Recreo tramo 3 (k18+159 al k18+720), se ejecutaron en la semana 77 ml de bordillos de los 300 ml programados, 84 ml de cintas centrales y cunetas de las 90,00 ml programadas, 33,00 m de piedra pegada de las 72,00 programadas, se construyó el vastago del muro 2 k19+163 (se cumplió), no se construyeron las obras de concreto de la alcantarilla k19+413, K22+050, disipador de la alcantarilla k18+964. En conclusión de la placa El Recreo tramo 3 (k18+159 al k18+720) faltan 70 ml de cintas centrales y cunetas de las 40 programadas hasta el 25 de octubre, faltan todas las obras de concreto de las placas huellas Venecia (K22+232 al K22+332) programadas hasta el 26 de octubre y Castellarios (k23+750 al 23+810) (programadas 26de octubre). En la placa huella El Recreo tramo 3 k18+159 al k18+720 faltan de los 350 m de piedra pegada de los 143 ml programados al 02 de noviembre y faltan de bordillos 720 ml de los 272 programados al 26 de octubre. Se está cumpliendo con la construcción del muro 2 k19+163, se está incumpliendo con terminar las obras de concreto y alcantarilla del muro 1 k19+964, que deberia estar terminados a la fecha y con la construcción de la alcantarilla (poceta y muro cabezal) del muro 3 (k19+413), K22+252 (Venecia) y k19+682 . Se ste cumpleindocon los llenos a lado y lado de los bordillos d ela splacas huellas y con la limpieza general de la obra.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao - Guacas

Terminación de la construcción de la placa huella El Sinabrito (k6+749 al k6+849)

Terminación de construcción placa huella k17+076 AL K12+680 con la construcción de cunetas disipadoras

Terminación de obras de concreto de la alcantarilla k4+095 (disipador)

Construcción disipador de alcantarilla k8+670 (muro4) y de k7+380 (muro3)

Terminación de disipador alcantarilla k4+280

Paredes del cabezal de descarga k7+280. Construcción de obras de concreto de la alcantarilla 5+220

Armijos de la escuela Juan Xxiii

Inversión social escuela Juan Xxiii

Tramo Guacas - Gámova

Iniciar con la inversion social con participacion comunitaria

Terminar de obras en concreto de la placa huella K18+159 al K18+720

Continuar construccion de piedra pegada (120 ml) y bordillos (200 ml) de la placa huella El Recreo tramo 3 k18+159 al k18+720

Iniciar la construcción de obras de concreto de la alcantarilla muro 3 k19+413

Continuar con la limpieza de las placas huellas y llenos laterales

Terminar con las obras de concreto de la alcantarilla k19+964

Iniciar obras de concreto de la alcantarilla k19+ 682

Iniciar la construcción de obras de concreto de alcantarilla K22+252

Iniciar con las obras de concreto de la placa huella Veencia k22+332 al K22+232

Hacer lleno del muro 2 k19+163

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRASO DE LAS OBRAS: En el tramo Pijao-Guacas se presentaron lluvias los dias domingo (28 de octubre), 2 horas, lunes (21 de octubre) 8 horas , martes (22 de octubre) 3 horas , miercoles (23 de octubre) 2 heras, jueves (24 de octubre) 4 horas. En el tramos Gamova-Guacas se presentaron lluvias lunes (21 de octubre) 5 horas, martes (22 de octubre) 2 horas, miercoles (23 de octubre) 2 horas, y el jueves (24 de octubre) 4 horas.

RUTA No. 40DN05

NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA

K 0 + 000 PIJAO — K 17+950 GUACAS — K 25 + 400 GENOVA

El siguiente gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Pijao, placa huella El Sinabrito k6+749 al k6+849 Ingreso a alcantarilla k6+849



Pijao, Construccion disipador alcantarilla k4+280



Gámova, Construcción placa Huella El Recreo tramo 3 K19+159 al K18+720

NOTA:

EL DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Verificar proyecto de ampliación de plazo

Firmar el acta de modificación de obra No 1

Terminar la proyecto de entrega de obras

Iniciar el balance de cantidades finales de obra ejecutadas

Cumplir con la reprogramación de las obras de acuerdo con el programa (vigiy actualizado)

Continuar con el cumplimiento del Plan de Trabajo (vigiy para la culminación total de las obras por parte de trabajo (seguimiento diario)

Se notificará al contratista o INVIAS el incumplimiento presentado al programa de inversión y plan de contingencia de subcriterio inicio del proceso del incumplimiento del contrato de obra y se reportará a INVIAS

INTERVENTORIA

NOMBRE

No. MAT

FIRMA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO			
VERSIÓN			
PAGINA	1	DE	1

FECHA: 19 (DIA) / 10 (MES) / 2.019 (AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(ES): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS
TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 63 (Numeración consecutiva) del 14/10/2019 al 19/10/2019

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANÍA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 32 obras transversales, 8 muros y 2658 m de placa huella

PIJAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1.403 KM
ALCANTARILLAS : 19 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1.255 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS : 13 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 0496 - 2018 — VALOR INICIAL: $ 5.419.238.821,23
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC-2018 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 — VALOR ACUMULADO: $ 5.419.238.821,23

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: COPESA LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 0926 - 2018 — VALOR INICIAL: $ 618.020.310,00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE -201 — ADICIONES: $ 160.342.629,00
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 07 NOV 2019 — VALOR ACUMULADO: $ 678.362.939,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.238.821		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 5.136.283.247,36
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 4.992.348.930,93
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4.952.233.189,17
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 94,43%
% PROGRAMADO: 91,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 99.034.809,84
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 4.951.267.979,01
96,36%

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 530.475.360,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

NOTA: A partir del 07 de julio de 2018 se realizó prórroga del contrato hasta el 07 de noviembre de 2019 y el 09 de julio el acta de modificación 2, donde ingresan los ítems no previstos y se modifican cantidades de acuerdo con el Volumne XIV Resumen Final Ejecutivo de los ajustes de estudios y diseños y se realizó la reprogramación correspondiente

115

TRAMO 1: PUJAO - GUACAS (K 00+000 AL K 17+050)

ACUMULADO PROYECTO			
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00%		100,00%
PLACA HUELLAS (M)	1.420,68		1.420,68
MUROS DE CONTENCION (ML)	64,90		64,90
ALCANTARILLAS (M)	14,00		14,00
ALISTAMIENTO VIA (M)	4.773,41		4.773,41
OTROS (M)	660,68		660,68
PASA	0,00%		0,00
SOCIAL	0,00%		0,00
CARACTERIZACION VIA	0,00%		0,00%

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1		TOTAL
Retrocargador 1	1		1
Vibro compactador	0		0
Carrotanque de agua de 10.000 litros	0		0
Volquetas de 7 m3	3		3
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	2		2
Vibradores de concreto	2		2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y	0		0
Compactadores manual vibratorio (Rana)	1		1
Motoniveladora	0		0
Mezcladora adicional de 1/2 saco	0		0
Planta eléctrica	1		1
Campero	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUJAO -GUACAS(KM00-K17,050)

TRAMO Y/O SECTOR 1:

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	64722,4	8200	25867,06
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1029,59	160,44	1010,04
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,62	0,06	0,73
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	8101,1	0	7686,10
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1270,52	113,46	1088,3
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	69432,6	1407,91	69928,79
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1148,75000	14,25	1385,01
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	173,36	0	190,24
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	1694	175	262,5
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	438,6	30	45
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	484	50	75
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1176,77	63,32	1037,89
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	132	6,5	136,5
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	271,23	0	127,71
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	210,55	7,44	96,89
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	19760,52	810,51	13991,9
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	574,68	14,37	481,6
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	37,18	0	37,92
CONCRETO RESISTENCIA 17 MPA (E.)	M3	11,315	0,72	8,88
RELLLENO CON ARENA	M3	30,06	0	28,7
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	90	0	94

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	166,04	0,00	385,58
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	460,13	0,00	209,00
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1 M	ML	24,00	0,00	24,00
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,00 M EN CONCRETO	ML	24,00	0,00	5,09
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	131,06	0,00	106,58
CONCRETO RESISTENCIA 17 5MPA (E.)	M3	9,36	0,00	20,73
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	13.220,99	0,00	12.498,45
Tubería Reforzada en PVC de 2"	ML	39,10	0,00	10,25
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	794,76	0,00	1.332,66
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	226,00	0,00	230,08
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	198,92	0,00	0,00
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	283,05	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) (CICLOPEO)	M3	18,44	0,00	0,50
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	238,40	0,00	54,90
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	50,00	0,00	48,00
REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	938,00	0,00	600,50


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO			
VERSION			
PAGINA		DE	

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			100,00%
PLACA HUELLAS (M)		1.117,93	1.117,93
MUROS DE CONTENCION (ML)		27,75	27,75
ALCANTARILLAS (M)		9,00	9,00
ALISTAMIENTO VIA (ML)		3.572,00	3.572,00
OTROS (M)		678,00	678,00
PAGA			
SOCIAL			
CARACTERIZACION VIA			0,00%
			0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (K17.050-425,40)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		0	0
Vibro compactador		0	0
Carrotanque de agua de 10.000 litros		0	0
Volquetes de 7 m3		4	4
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos		4	4
Vibradores de concreto		2	2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotacion y		0	0
Compactadores manual vibratorio (canguro)		1	1
Planta electrica		1	1
Cargadora		1	1
		0	0

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K17+050 AL K 25+400)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	20.125,00	7.306,00	18.611,00
PLACA HUELLA				
SUBLBASE GRANULAR CLASE B	M3	982,96	54,81	928,82
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,90	0,01	0,37
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	9.825,70	341,00	6.581,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1.016,55	6,66	1.187,46
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	59.266,44	1.894,37	57.405,28
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1.050,00	62,59	823,71
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M2	199,82	17,93	191,74
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	4.161,50	108,50	679,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	713,40	19,60	531,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	1.189,00	31,00	1.270,00
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	618,54	24,83	633,06
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	91	6,50	80,00
SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	73,2	0,00	73,40
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	129,7	2,57	98,29
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	11115,58	489,06	7.767,07
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	338,73	21,72	224,43
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	26,22	0,00	26,79
CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	M3	9,24	0,18	2,73
RELLENO CON ARENA	M3	92,82	1,28	15,37
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	66	0,00	66,00

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	10,72	0,00	194,52
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	169,42	0,00	77,29
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1 M	ML	9,00	0,00	9,50
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,00 M, EN CONCRETO	ML	9,00	0,00	3,90
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	52,98	3,20	45,75
CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	M3	5,12	0,18	7,27
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	8.950,78	927,95	5.822,10
Tuberia Perforada en PVC de 3"	ML	13,15	2,50	10,10
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	124,78	0,00	3.697,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	14,26	0,00	559,70
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	92,83	0,00	0,00
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	66,25	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) (CICLOPEO)	M3	1,68	0,00	0,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	36,65	0,00	36,56
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINARIO	UND	30,00	0,00	16,00
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSITORIALES				
REMOCION DE DERRUMBES	M3	471,19	0,00	676,00

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: AGREGADOS EXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___

UBICACION: Kilometro 4 de la via Barragán-Génova — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 23) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE, EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, un funcionario de la CRQ realizo visita de campo para verificar las fuentes de aguas que tendrán ocupación del cauce y el día 10 de septiembre de 2018 el ingeniero Zorro en el Comité de obra comunicó que la CRQ había dado el permisos de vertimiento

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional SST

OBSERVACIONES:

117

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO		
		VERSIÓN		
		PAGINA	1 DE 1	

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALUOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO. NO HAY ADQUISICIÓN DE

GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	84	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	18
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	76	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SEDES COMITÉ DE CAFETEROS PUJAO Y GENOVA	
OTROS:			

OBSERVACION: Se han tralado los baños portátiles a la placa huella de La Maizena K10+220 al k10+500 y la placa huella del k18+159 al k18+720 . Se ha establecido el presupuesto social con participación comunitaria para las escuelas Juan XXIII de Puente Tabla (tramo Pijao-Guacas) y Río Rojo (tramo Génova-Guacas)

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó el comité semanal de obra, en INVIAS

La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-179, de fecha 15 de octubre de 2018, Remisorio para el oficio SOC-FNC-825-2018-018 DEL Especialista Social de la interventoría, revisión y aprobación del plan de inversión social-propuesta de obras con participación comunitaria, para ejecución inmediata.

La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-180, de fecha 16 de octubre de 2018, Remisorio para el oficio INVIAS-825-2018-012-AM del Especialista Ambiental de la interventoría. Documentos para cierre del balance ambiental al final del contrato.

La interventoría mediante oficio ADM-FNC-825-2018-047, de fecha 18 de octubre de 2018, corrección actas de recibo parcial de obra de la No 8 a la No.13 con cero decimales.

Tramo Pijao - Guacas

Se ha iniciado las obras de reparación de la escuela Juan XXII (Puente Tabla) la inversión social. Y arreglos por uso como campamento

Se construye disipador alcantarilla k4+280

Se construye cunea descole de la placa huella El Jardín k12+651 al 12+841

Se construye poceta y muro cabezote de la alcantarilla k4+095

Se continúa con la construcción de la placa huella El Sinabrio k 6+748 al k 6+648 con la construccion de sobreanchos y parte de los bordillos

Sobre la construcción de las alcantarillas: Tiene construida completas k2+770, k5+625, k8+790, k10+150, k10+350, k10+660, K10+800, k11+980, k11+833, k12+756, k12+920, k13+000, k13+710 y k18+998. Se tiene construida las pocetas del k4+095, k7+280 ,del k7+360 y del k8+670. Muro cabezal de la alcantarilla k4+096. Falta terminar la construccion del disipador de la alcantarilla K4+280 (muro2), e iniciar la

Sobre los muros de contención: Se encuentran construidos los localizados en el k2+770 (muro1)(completo), K4+280 (muro2) (completo), k7+360 (muro 3 completo, módulos 1, 2 y 3), k8+670 (muro 4 completo)

Sobre las placas huellas: Puente Tabla (k3+169 al k3+457), esta construida en su totalidad, La Laguna (k12+841 al 13+071) esta construida en su totalidad, la del Jardín (k12+651 al k12+841) esta construida en su totalidad; la de Los Charros (k12+275 al K 12+580), falta descoles (2 cunetas disipadores); la de Silvio (k11+929 al k11+938), ya se termino. De La Maizena k10+220 al k10+500, esta terminda,la del Sinabrio k6+748 al k6+648, la faltante de los bordillos superiores.

NOTA:El estado del tiempo fue: lluvias domingo (13 de octubre), 3 horas de lluvias, lunes (14 de octubre) 2 horas de lluvias, martes (15 de octubre) 4 horas de lluvia, miercoles (16 de octubre) 1 hora de lluvia, jueves (17 de octubre) 2 horas de lluvias, viernes (18 de octubre), 2 horas de lluvias y sábado (12 de octubre) 81 hora de lluvia

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA (JUNIO de 2018): El compromiso de la semana era la construcción den la placa huella El Sinabrio (k6+748 al k6+648): 525 ml de placa huella incluida cunetas, vigasy bordillos inferiores. Otro compromiso era terminar todas las obras en la placa huella del k12+651 al k12+841 (canal de desague de cuneta k12+651 (se cumplió) y cuneta adicional k12+780)(se ejecuto); terminar las obras de la placa huella de La Laguna (k12+841 al k13+071) (ya se termino). Las alcantarillas del K4+280 apenas se inicio con la construccion del disipador, de la alcantarilla k7+280, solo se ha construido la poceta (incumplio), de la alcantarilla del k7+360 (falta disipador) (incumplio). Se adelanto y terminaron las obras en concreto de la alcantarilla k13+000. Se inicio con la construcción de las obras de concreto de la alcantarilla k4+095. Se ha instalando la tuberia en la alcantarilla k14+680 (que reemplazo las obras a realizarse en el k8+350). Se han adelantado las obras de construcción de la placa huella El Sinabrio, faltando solo el ingreso de las cuentas a la alcantarilla k6+649 y parte de los bordillos superiores. En general el contratista este cumpliendo con la construcción de las placas huellas cuyas obras de concreto estan por terminarse en la 1 semana de noviembre y lo va hacer antes), está cumpliendo con los bordillos y e incumpliendo con las alcantarillas. Esta cumpliendo con las cuadrillas de placas huellas y alcantarillas. Con los equipos se está cumpliendo. Esta semana hubo cumplimiento en la inversión semanal de $80 millones programados se invirtieron $103 millones . Sobre el acumulado programado de $2.869 millones se lleva ejecutado $2.634 millones, está por debajo.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION DIARIA (09 de septiembre de 2018): De la placa huella El Sinabrio K6+748 al k6+649: se han ejecutado las obras, faltando e ingreso de las cunetas a la alcantarilla k6+649. De la placa huella de La Maizena (k10+220 al k10+500), quedó terminada; en la placa huella de Los Charros solo falta cunetas disipadores y cuneta de descole; en la placa huella del Jardín (k12+561 al k12+841), ya esta terminada; la placa huella La Laguna ya se termino. De las alcantarillas de inicio la construcción de k4+095 (que se debió terminar el 27 de septiembre); solo falta el disipador. Falta construir obras de concreto alcantarillas k14+680, disipador k7+360, disipador k8+670, terminar disipador alcantarilla k4+280. Se cumplió en gran parte con la programacion diaria; se adelantaron obras conolos bordillosde la placa huella de La Maizena k10+220 al k10+500, no programados (k14+680 (en construcción) y k11+680 (Ya construido).

Tramo Guacas - Genova

Se termina la construcción en concreto del muro 2 k19+163, falta llevo

Se termina continua con la construcción de bordillos y piedra pegada huella del K18+159 al k18+720.

Se continua con la construcción de la placa huella del k18+159 al k18+720, con dos frentes de trabajo

Se inicia la construcción d sobres de concreto de la alcantarilla k18+964 (muro1)

Se instala tubería de la alcantarilla k19+682

Se termina la construcción de la subbase de la placa huella Venecia K22+232 al k22+332

Se termina con la construcción de los filtros de la placa huella Venecia (k22+232 al k22+332)

Se hace la conformación y subbase de la placa huella Castellanos K23+795 al k23+810

Sobre la construcción de las alcantarillas se encuentran construidas: K17+676, k17+700,17+736, k17+818 , k17+995, k18+023, k18+105, k18+282,k18+360, k18+714. De la alcantarilla k18+964, falta el disipador. Falta construir las obras de concreto de la alcantarilla del k19+682 y k22+252. Faltan todas la obras d ela alcantarilla k19+413 (muro 3)

Sobre los muros de contención se encuentran terminados los del K 18+360 (muro 5); K18+964 (muro 1) y K22+321 (muro 4); y el muro 3 (k19+413) (falta bordillo). El muro 2 K 19+163, se termina su construcción, faltando el tiero.

Sobre la placas huelles se ha construido la placa huella entre 17+620 al 18+002. Se terminó obras de concreto entre el k18+002 al k18+180.Se han construido en la placa huella del k17+159 al k17+720, faltando solo 70 ml de obras de concreto . La placas huella de Venecia se ha construido filtros, se ha conformado y construido la subbase, sobre la palca huella Castellanos, se ha conformado la subrasante y la

NOTA:El estado del tiempo fue: lluvias domingo (13 de octubre), 3 horas de lluvias, lunes (14 de octubre) 2 horas de lluvias, martes (15 de octubre) 4 horas de lluvia, miercoles (16 de octubre) 1 hora de lluvia, jueves (17 de octubre) 2 horas de lluvias, viernes (18 de octubre), 2 horas de lluvias y sábado (12 de octubre) 81 hora de lluvia

PLAN DE CONTINGENCIA (JUNIO): El compromiso era realizar la construcción del cabezal de descarga alcantarilla k19+682 (no se ejecutó), la construcción de obras en concreto de muro 2 (k19+163) (se cumplió). Además de eso se debía construir parte de las obras atrasadas: terminar la placa huella k18+159 al k18+720 (no se hizo, faltan 70 para completar 1100 ml de la placa huella El Recreo), terminar 100 ml de la placa huella de de Venecia (no se hizo) y 95 ml de placa huella Castellanos (no se hizo), obras de concreto de la alcantarilla k22+252 (no se hizo), alcantarillas k18+964 (no se he terminado), obras de concreto alcantarilla k19+682 (no s ehizo) y alcantarilla del k19+413 (no se hizo). De piedra pegada de la placa huella k18+159 al K18+720, falta por ejecutar de los 360 ml. Con el equipo si se cumplió. Sobre la inversión semanal programada de $77 millones se ejecutaron $112 millones. Sobre la inversion ejecutada semanal acumulada de $2.231 millones esta por por encima de la programada de $2012

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CODIGO	MINFRA-MN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DIARIA (09 de septiembre de 2019): De la placa huella placa huella El Recreo tramo 3 (k18+159 al k19+720), se ejecutaron en la semana 77 ml de bordillos de los 300 ml programados, 54 ml de cintas centrales y cunetas de las 96,00 ml programadas, 33,60 m de piedra pegada de las 72,00 programadas, se construyó el vástago del muro 2 k19+163 (se cumplió), no se construyeron las obras de concreto de la alcantarilla k19+413, k22+250, disipador de la alcantarilla k18+964. En conclusión de la placa El Recreo tramo 3 (k18+159 al k18+720) faltan 70 ml de cintas centrales y cunetas de las 40 programadas hasta el 25 de octubre, faltan todas las obras de concreto de las placas huellas Venecia (k22+232 al k23+332) (programada hasta el 25 de octubre y Castellanos (k23+750 al 23+810) (programadael 26de octubre). En la placa huella El Recreo tramo 3 k18+159 al k18+720 faltan de los 350 m de piedra pegada de los 143 ml programados el 02 de noviembre y faltan de bordillos 720 ml de los 272 programados el 26 de octubre. Se está cumpliendo con la construcción del muro 2 k19+163, se está incumpliendo con terminar las obras de concreto y alcantarilla del muro 1 k18+964, que deberia estar terminados a la fecha y con la construcción de la alcantarilla (poceta y muro cabezal) del muro 3 (k18+413), K22+252 (Venecia) y k19+682. De ste cumpleindocon los flenos a lado y lado de los bordillos d ala splacas huellas y con la limpieza general de la obra.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao - Guacas

Terminacion de la construccion de las obras de concreto de la placa huella El Sinabrio (k6+749 al k6+849) (bordillos y cunetas de acceso a la alcantarilla k6+849

Terminacionde construccion placa huella k12+276 AL K12+680 con la construccion de cunetas disipadores y rastra en concreto de obras de alcantarilla

Terminacion de obras de concreto de la alcantarilla k4+280

Construcción disipador de alcantarilla k8+470 (muro4) y de k7+380 (muro5)

Terminacion de disipador alcantarilla k4+280

Paredes del cabezal de descarga k7+280. Construccion de obras de concreto de la alcantarilla 14+580

Arreglos de la escuela Juan XXIII

Inversion social escuela Juan XXIII

Tramo Guacas - Génova

Iniciar con la inversion social con participacion comunitaria

Terminar de obras en concreto de la placa huella K18+159 al K18+720

Continuar construccion de piedra pegada (120 ml) y bordillos (200 ml) de la placa huella El Recreo tramo 3 k18+159 al k18+720

Instalacion de tuberia de la alcantarilla muro 3 k19+413

Continuar con la limpieza de las placas huellas y lienros laterales

Terminar con las obras de concreto de la alcantarilla k19+964

Iniciar obras de concreto de la alcantarilla k19+ 682

Iniciar la construcción de obras de concreto de alcantarilla k22+252

Iniciar con las obras de concreto de la placa huella Veencia k22+232 al k22+332

Hacer lleno del muro 2 k19+163.

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRASO DE LAS OBRAS: En el tramo Pijao-Guacas se presentaron lluvias el dia domingo 06 de octubre 3 horas y martes con 3 horas.. En el tramo Génova-Guacas se presentaron lluvias el dia domingo 06 de octubre 3 horas y martes con 3 horas

RUTA No. 4202N08 NOTA: CORDILLERA DEPARTAMENTAL DE LA VIA

k 0 + 000 PUAO k 17+050 GUACAS k 25 + 400 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Pijao, Construccion alcantarilla placa huella El Sinabrio k6+749 al k6+849



Pijao, Construccion cuneta descole placahuella El Jardin k18+651 al k12+641



Génova, Construcción placa huella El Recreo tramo 3 K18+159 al k19+720

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Elaborar solicita de entrega de obras

Elaboración del acta de modificacion de obra No 2

Cumplir con la reprogramación de las obras de acuerdo con el programa diario establecido

Continuar con el control del Plan de trabajo diario para la conclusión total de las obras por puntos de trabajo (seguimiento diario)

Se notificara al contratista e INVIAC el incumplimiento presentado el programa de inversion y plan de contingencia. Se solicitara el inicio del proceso del incumplimiento del contrato de obra y se reportara a INVIAC

R DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIME EDUARDO CASTILLO DAZA

No. MAT: 81702-2175

Impreso - Copia Controlada

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSION	
FECHA	

FECHA: 12 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(ES): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS; TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No: 62 (Numeración consecutiva) del 07/10/2019 al 12/10/2019

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANIA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534

KM A MEJORAR: — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: 32 obras transversales, 9 muros y 2656 m de placa huella — FECHA DE INICIO: 08-ago-19

PIJAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1.303 KM
ALCANTARILLAS: 15 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 9 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1.293 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS: 13 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 9 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 2498 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2019
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR INICIAL: $ 5.419.236.921,23
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 5.419.236.921,23

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTOR: CORPEA LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 0630 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE -2021
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 07 NOV 2019
VALOR INICIAL: $ 318.830.310,00
ADICIONES: $ 160.543.629,00
VALOR ACUMULADO: $ 479.362.939,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.236.921			
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.139.269.247,24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.524.389.740,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4.944.596.672,41
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	90,39%
% PROGRAMADO	88,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 39.034.809,84
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.743.631.361,25 92,33%

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI | NO (X)
MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del tramite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 530.475.360,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI | NO (X)
MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del tramite)


III. AVANCE FISICO

NOTA: A partir del 07 de luio de 2019 se realizo prorroga del contrato hasta el 07 de noviembre de 2019 y el 09 de julio el acta de modificacion 2, donde incresan los items no previstos y se modifican cantidades de acuerdo con el Volumen XIV Resumen Final Ejecutivo de los ajustes de estudios y diseños y se reliza la reconsideración correspondiente.

TRAMO 1: PIJAO - GUACAS (K 00+000 AL K 17+650)

TRAMO Y/O SECTOR(ES):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00%		100,00%
PLACA HUELLAS (M):	1.303,59		1.303,59
MUROS DE CONTENCION (ML):	54,30		54,30
ALCANTARILLAS (M):	54,00		54,00
AJUSTAMIENTO VIA (M):	3.133,41		3.133,41
OTROS (M):	640,58		640,58
PASO:	0,00%		0,00
SOCIAL:	0,00%		0,00
CARACTERIZACION VIA:	0,00%		3,00%

Los indicadores para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(ES):	1		TOTAL
Retrocargador 1	1		1
Otro compactador	0		0
Carrotanque de agua de 10.000 litros	0		0
Volquetas de 7 m3	1		1
Mezcladoras de concreto de mínimo 2.0 bultos	1		1
Vibradores de concreto	2		2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y	0		0
Compactadores manual vibratorio (Rana)	1		1
Motoniveladora	1		1
Mezcladora adicional de 1/2 saco	0		0
Planta eléctrica	1		1
Campero	1		1

120

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PAGINA			

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUAC -GUACAS(K000-K17,930)

TRAMO Y/O SECTOR 1:


ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA (EXISTENTE)	M2	64722,4	0	10647,26
PLACA HUELLA				
10 B-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1029,59	69,44	949,6
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO ROCOSAS	HA	0,62	0,00	0,62
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	8101,1	0	7686,16
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1270,62	13,48	974,84
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	69402,6	2087,58	67020,88
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1145,75056	36,83	1109
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	173,38	0	172
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	1694	0	87,5
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	439,6	0	15
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4780(E DIAMETRO 100mm	ML	494	0	35
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1176,77	49,19	974,57
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 24"	ML	132	0,5	130
10 B-BASE GRANULAR CLASE B	M3	271,23	0	127,71
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	218,55	9,27	89,45
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	19760,52	4096,19	13081,39
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	574,68	91,3	467,53
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	37,19	0	37
CONCRETO RESISTENCIA 17 MPA (E)	M3	11,315	0,54	8,16
RELLENO CON ARENA	M3	30,06	1,37	28,7
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	90	0	84

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	199,04	0,00	162,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	480,13	0,00	209,08
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITO, DE DIAMETRO 1 M	ML	24,00	0,00	24,00
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,22 M EN CONCRETO	ML	24,00	0,00	5,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	131,88	0,00	106,56
CONCRETO RESISTENCIA 17 MPA (E)	M3	9,36	0,00	9,00
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	13.220,99	0,00	12.406,46
Tuberia Perforada en PVC de 3"	ML	39,10	0,00	19,25
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	794,76	0,00	750,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	226,00	0,00	220,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	198,92	0,00	0,00
10B - BASE GRANULAR CLASE B	M3	293,65	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) (CICLOPEO)	M3	18,64	0,00	0,50
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4780(E DIAMETRO 100mm	ML	236,40	0,00	94,90
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	50,00	0,00	46,00
REMOCION DE DERRUMBES	M3	636,00	0,00	606,50

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+930 AL K 23+480)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(ES):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			100,00%
PLACA HUELLAS (M)		1.010,00	1.010,00
MUROS DE CONTENCION (ML)		27,75	27,75
ALCANTARILLAS (M)		9,00	9,00
ALISTAMIENTO VIA (ML)		650,00	650,00
OTROS (M)		578,00	578,00
PASA			
SOBRE			
CARACTERIZACION VIA			
			0,00%
			0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(ES):		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		0	0
Vibro compactador		0	0
Carrotanque de agua de 10.000 litros		0	0
Volquetas de 7 m3		4	4
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos		4	4
Vibradores de concreto		2	2
Compresor de 125 pie3 a superior, con martillo de rotación y		0	0
Compactadores (manual vibratorio (canguro)		1	1
Planta electrica		1	1
Cargotodo		1	1
		9	9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (K17.650-K25.400)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBÓ TODOS LOS VOLUMENES DE CRI ESTIMADOS Y EJECUTADOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K17+650 AL K 25+400)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	26.125,00	7.300,00	11.306,00
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	962,90	0,00	917,00
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,60	0,00	0,35
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	9.625,70	0,00	5.979,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1.018,00	11,60	1.010,00
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	59.258,44	3.669,39	57.506,91
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D)	M3	1.055,00	10,21	768,74
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	196,92	8,59	164,47
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	4.161,50	133,00	595,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	713,40	22,80	316,60
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704/08 DIAMETRO 150mm	ML	1.189,00	38,00	1.150,00
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	615,18	17,84	681,03
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	97	6,50	73,50
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	74,7	0,00	73,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	109,7	0,52	91,66
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	11118,16	2.591,23	9.410,18
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	224,79	21,20	202,19
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	26,27	0,00	26,00
CONCRETO RESISTENCIA 17 MPA (C)	M3	9,73	0,12	2,49
RELLENO CON ARENA	M3	22,63	1,29	14,09
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	65	0,00	60,00

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+650 AL K 25+400)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	10,72	0,00	10,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	169,42	0,00	77,28
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ML	9,50	0,00	9,50
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,00 M, EN CONCRETO	ML	9,50	0,00	3,90
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	52,86	4,79	42,53
CONCRETO RESISTENCIA 17 SMPA (C)	M3	9,12	0,00	7,09
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	6.950,78	442,53	4.894,15
Tubería Perforada en PVC de 3"	ML	13,15	0,00	7,50
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	124,78	0,00	120,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	14,26	0,00	14,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	92,63	0,00	0,00
SUB- BASE GRANULAR CLASE B	M3	68,25	0,00	8,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) (CICLOPEO)	M3	1,68	0,00	0,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704/08 DIAMETRO 150mm	ML	38,95	0,00	38,35
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO ROTEMPO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	UND	30,00	0,00	18,00
REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	471,19	0,00	456,00

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: AGREGADOS EXITO

PERMISO MINERO: SI X NO ___
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___

UBICACION: Kilometro 4 de la via Barranquilla-Genova

PERMISO MINERO: SI ___ NO ___
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 23) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE, EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019, un funcionario de la CRQ realizó visita de campo para verificar las fuentes de agua que tendrán ocupación del cauce y el día 19 de septiembre de 2019 el Ingeniero Zorro en el Comité de obra comunicó que la CRQ había dado el permiso de verbalmente

P.A.S.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional SST

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALUOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO, NO HAY ADQUISICIÓN DE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO			
VERSION			
PAGINA	1	DE	1

GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 102
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 36
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 16
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: SEDES COMITE DE CAFETEROS PUENTE Y GENOVA

OBSERVACION: Se han trasladado los baños portátiles a la placa huella de La Maizena K10+220 al k10+500 y la placa huella del k13+150 al k19+729 . Se ha establecido el presupuesto social con participación comunitaria para las escuelas Juan XXIII de Puente Tabla (tramo Pijao-Guacas) y Río Rojo (tramo Génova-Guacas)

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

De ingreso al cuarto semanal de obra en INVIAS

La interventoria mediante oficio PNC-005-2019-178 de fecha 11 de octubre de 2019, Refiriendo entrega de planillas de seguridad social del mes de septiembre de 2019 y resultados de laboratorio

Tramo Pijao - Guacas

Se ha iniciado las obras de reparación de la escuela Juan XXII (Puente Tabla) la inversión social.

Se construye dispador alcantarilla k2+779

Se reparan placas de concreto y cuneta descole de placa huella La Laguna k12+841 alk13+071

Se terminan las obras de concreto de la alcantarilla k5+823

Se inicia la construcción de obras de concreto de la alcantarilla k4+095

Se termina la construcción de obras de concreto de la placa huella La Maizena K10+220 al k10+500

Se continua con la construcción de la placa huella El Sinabrio k k+749 al k k+949

Sobre la construcción de las alcantarillas: Tiene construida completas k3+770, k5+823, k8+750, k15+168, k10+080, k10+600, K10+800, k11+060, k11+533, k12+756, k12+830, k13+000, k13+770 y k16+668. Se tiene construida las zanjas del k7+280 ,del k7+360 y del k5+670. Tienen instalada la tuberia de las alcantarillas del k4+095. Falta dispador de la alcantarilla KA+280 (murol2), k7+360 (murol3) y k8+670

Sobre los muros de contención: Se encuentran construidos los localizados en el k2+770 (muro1incompleto), K4+280 (muro2) (completo), k7+380 (muro 3 completo, modulos 1, 2 y 3), k8+670 (muro 4 ,completo).

Sobre las placas huellas: Puente Tabla (k3+159 al k3+447), esta construida en su totalidad. La Laguna (k12+841 al 13+071) esta construida en su totalidad, la del Jardin (k12+651 al k12+841) falta cunetas adicionales; la de Los Chorros (k12+276 al K 12+580), falta descoles (2 cunetas dispadoras y realice de alcantarillas); la de Silvia (k11+629 al k11+838), ya se termino. De La Maizena k10+220 al k10+690, está terminada, la del Sinabrio k6+749 al k6+949, falta construir los cabezales,box , acceso a las alcantarillas y las bordillos superiores.

NOTA:El estado del tiempo fue: lluvias domingo (6 de octubre), 3 horas de lluvias, lunes (7 de octubre) dia seco, martes (8 de octubre) 3 horas de lluvia, miercoles (09 de octubre), jueves (10 de octubre), viernes (11 deoctubre) y sabado (12 de octubre) fueron dias secos

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA (JUNIO de 2019): El compromiso de la semana era construir 25 ml de placas de concreto, cunetas y piedra pegada de la placa huella El Sinabrio (k6+749al k6+949) (ya se hizo) y la construccion de la alcantarilla k12+820 (ya se realizó). Otro compromiso era terminar todas las obras en la placa huella del k12+651 al k12+841 (canal de descague de cuneta k12+651) y cuneta adicional k12+780) (no se ejecutó), terminar las obras de la placa huella de La Laguna (k12+841 al k13+071) (ya se terminó); las alcantarillas del k2+770 (ya se jecutó) y K4+290 no se han construido los dispadores (incumplió); de la alcantarilla k7+280, solo se ha construido la pecata (incumplió), de la alcantarilla del k7+360 (falta dispador) (incumplió), se construyeron las obras de concreto k5+750 (cumplió). Se adelantó y terminaron las obras en concreto de la alcantarilla k13+000. Se inició con la construcción de las obras de concreto de la alcantarilla k4+095 y se terminaron con las del k5+823. Se ha instalando la tuberia en la alcantarilla k14+580 , que reemplazó las obras a realizarse en el k8+350). En general el consultoria esta cumpliendo con la construcción de las placas huellas (adelantó la construcción de la placa huella El Sinabrio , cuyas obras en concreto estaban para los 2 semana de octubre), está cumpliendo con las bordillos y e incumpliendo con las alcantarillas. Este cumplimento con las cuadrillas de placas huellas y alcantarillas. Con los equipos se está cumpliendo. Este semana hubo cumplimiento en la inversión semanal de $80 millones programados se invirtieron $101 millones . Sobre el acumulado programado de $2.560 millones se lleva ejecutado $2.531 millones, está por debajo.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION DIARIA (09 de septiembre de 2019): De la placa huella El Sinabrio K6+749 al k6+949; se han ejecutado todas las obras, faltando sobreanchos e ingresos de las cuentas a las alcantarillas. De la placa huella de La Maizena (k10+220 al k10+500), quedo terminada; en la placa huella de Los Chorros solo falta cunetas dispadoras y cuneta de descole, en la placa huella del Jardin (k12+651 al k12+841): falta el canal de descarga de cunetas; la placa huella La Laguna ya se terminó, De las alcantarillas de terminaron las del k2+770 y k5+823, que estaban atrasadas, se adelantaron obras de las alcantarillas k12+820 y K13+000 . Se cumplió en gran parte con la programacion diaria; se adelantaron obras como alcantarillas en sitios no programados (k14+580 con construccion) y k11+690 (Ya construida).

Tramo Génova - Guacas

Se continua con la construcción del muro 2 (k19+163, corria construcción de la cimentación e instalación de acero de refuerzo)

Se termina la construcción de hormitos de la placa huella del K18+002 al k18+159

Se continua con la construcción de la placa huella del k18+159 al k18+700, con dos frentes de trabajo

Se continua con la construcción de piedra pegada en la placa huella El Rancho tramo 3 k18+159 al k18+720

Se continua corte construcción de los filtros de la placa huella Valencia (k22+232 al k22+352)

Sobre la construcción de las alcantarillas se encuentran completamente construidas: K17+670, k17+700,17+730, k17+818 ,k17+885, k18+023, k18+105, k18+282,k18+360, k18+714. Falta construir las obras de concreto de la alcantarilla del k23+252 y del k18+663 (mural1).

Sobre los muros de contención se encuentran terminados los del K 18+282 (muro 5), K18+664 (muro 1) y k22+327 (muro 6), y el muro 3 (k19+413) (falta bordillo). El muro 2 K 19+163, se continua con su construccion con instalación del acero de refuerzo y la construcción de la cimentación

Sobre la placas huellas se ha construido la placa huella entre 17+620 al 18+002. Se termino obras de concreto entre el k18+002 al k18+159.Se han construido en la placa huella del k17+159 al k17+720 458 ml de obras de concreto

NOTA:El estado del tiempo fue: lluvias domingo (6 de octubre), 3 horas de lluvias, lunes (7 de octubre) dia seco, martes (8 de octubre) 3 horas de lluvia, miercoles (09 de octubre), jueves (10 de octubre), viernes (11 deoctubre) y sabado (12 de octubre) fueron dias secos

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

PLAN DE CONTINGENCIA (JUNIO): El compromiso era realizar la construcción de la poceta k19+682 (no se ejcuto), la construcción de muro 2 (k19+163) (se cumplio). Además de eso se debia construir parte de las obras atrasadas: terminar los bordillos de la placa huella del k18+802 al k19+159 (se hizo), terminar la placa huella k18+103 al k18+720 (no se hizo, faltan 103 ml mas 21 ml para completar 1100 ml de la placa huella El Recreo), 100 ml de la placa huella de de Venecia (no se hizo) y 55 ml de placa huella Castellanos (no se hizo), construcción cabezal de la alcantarilla k18+360 (se hizo), obras de concreto de la alcantarilla K22+252 (no se hizo), alcantarillas k18+964 (no se hizo) y k15+413 (no se hizo), se terminaron las obras en concreto y la pledre pegada; on la placa huella K18+159 al K18+720, solo se han ejecutado 458 ml de los 561 a construir en cinta central y cunetas. En conclusión se abrió otra frente de trabajo para las placas huellas , el rendimiento no mejorado y no superaron la meta de 100 ml (ase ejecutaron 72,00 ml). Con el equipo si se cumplio. Sobre la inversión semanal programada de $?5 millones se ejecutaron $?17 millones. Sobre la inversion ejecutada semanal acumulada de $2.126 millones esta por por encima de la programada de $1.934

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DIARIA (05 de septiembre de 2019): De la placa huella placa huella El Recreo tramo 3 (k18+159 al k18+720), se ejecutaron en la semana 214 ml de bordillos de los 300 ml programados, 72 ml de cintas centrales y cunetas de las 96,00 ml programadas , 50,4 ml de piedra pegada de las 72,00 programadas , se construyó la cimentación del muro 2 k19+163 (se cumplió), no se construyeron las obras de concreto de la alcantarilla k18+413. En conclusion de la placa El Recreo tramo 3 (k18+159 al k18+720) faltan 103 ml de cintas centrales, cunetas de las 88 programadas hasta el 25 de octubre, falta 87ml de los 579 programados hasta el 25 de octubre, faltan 245 ml de piedra pegada de los 215 ml programados al 02 de noviembre. Sobre la placa huella de Venecia (k22+232 al k22+332), queda faltando todas las obras de concreto programadas hasta la fecha de 80,00 ml. Sobre la placa huella Castellanos (K23+765 al 23+810), se programó su construcción a partir del 17 de octubre. Se está cumpliendo con la construcción del muro 2 k19+163, se está incumpliendo con terminar las obras de concreto y alcantarilla del muro 1 k18+964, que deberia estar terminados a la fecha y con la construcción de la alcantarilla (poceta y muro cabezal) del muro 3 (k19+413) y K22+252 (Venecia)

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao - Guacas

Terminación de la construccion de las obras de concreto de la placa huella El Sinabrio (k5+743 al k5+840)
Terminacionde construcción placa huella k12+270 AL K12+680 y k12 +651 ak12+841 con la construcción de cunetas diagonales
Continuación de obras de concreto de la alcantarilla k5+096
Construccion disipador de alcantarilla k5+670 (murod) y de k7+380 (murod)

Paredes del cabezal de descarga k7+259- Construcción de obras de concreto de la alcantarilla 1a=560
Arreglos de la escuela Juan XXII

Tramo Guacas - Genova

Ejecutar 80 ml de obras en concreto de la placa huella K19+159 al K19+720
Instalacion de tuberia de la alcantarilla muro 3 k19+413
Continuar con la construccion de la piedra pegada de la placa huella k18+159 al k19+720
Vaciar con las obras de concreto de la alcantarilla k19+964
Terminar construccion de filtro en la placa huella Venecia k22+232 al k22+332
Vaciar la construccion de obras de concreto de alcantarilla k22+252
Vaciar con las obras de concreto de la placa huella Venecia k22+232 al k22+332
Continuación construccion del muro 2 k19+163

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRASO DE LAS OBRAS: En el tramo Pijao-Guacas se presentaron lluvias el dia domingo 06 de octubre 3 horas y martes con 3 horas . En el tramo Genova-Guacas se presentaron lluvias el dia domingo 06 de octubre 3 horas y martes con 3 horas

RUTA No. 4SGN04 NOTA: COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA VÍA

k 0 + 000 PIJAO — k 17+650 GUACAS — k 25 + 400 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO



Pijao, Construccion alcantarilla k3+020

FOTO 2



Pijao, Construccion placahuella El Sinabrio k5+743 al k5+840



Génova, Construcción placa huella El Recreo tramo 3 K18+159 al k18+720, cabezal alcantarilla k19+388


NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Elaborar un Plan de Contingencia (Ver Nota 1)
Exigir con la reprogramación de las obras, de acuerdo con el programa diario establecido
Continuar con el control del Plan de trabajo diario para la ejecución total de las obras por cuatro de trabajo (seguimiento diario)
Se notificará al contratista o Interventor el incumplimiento presentado, el programa de inversión y plan de contingencia. Se mantiene el inicio del proceso del incumplimiento del contrato de obra y se reportara a ANSWER

FIRMA DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ANDRES DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
No. MAT: 76302078-1742

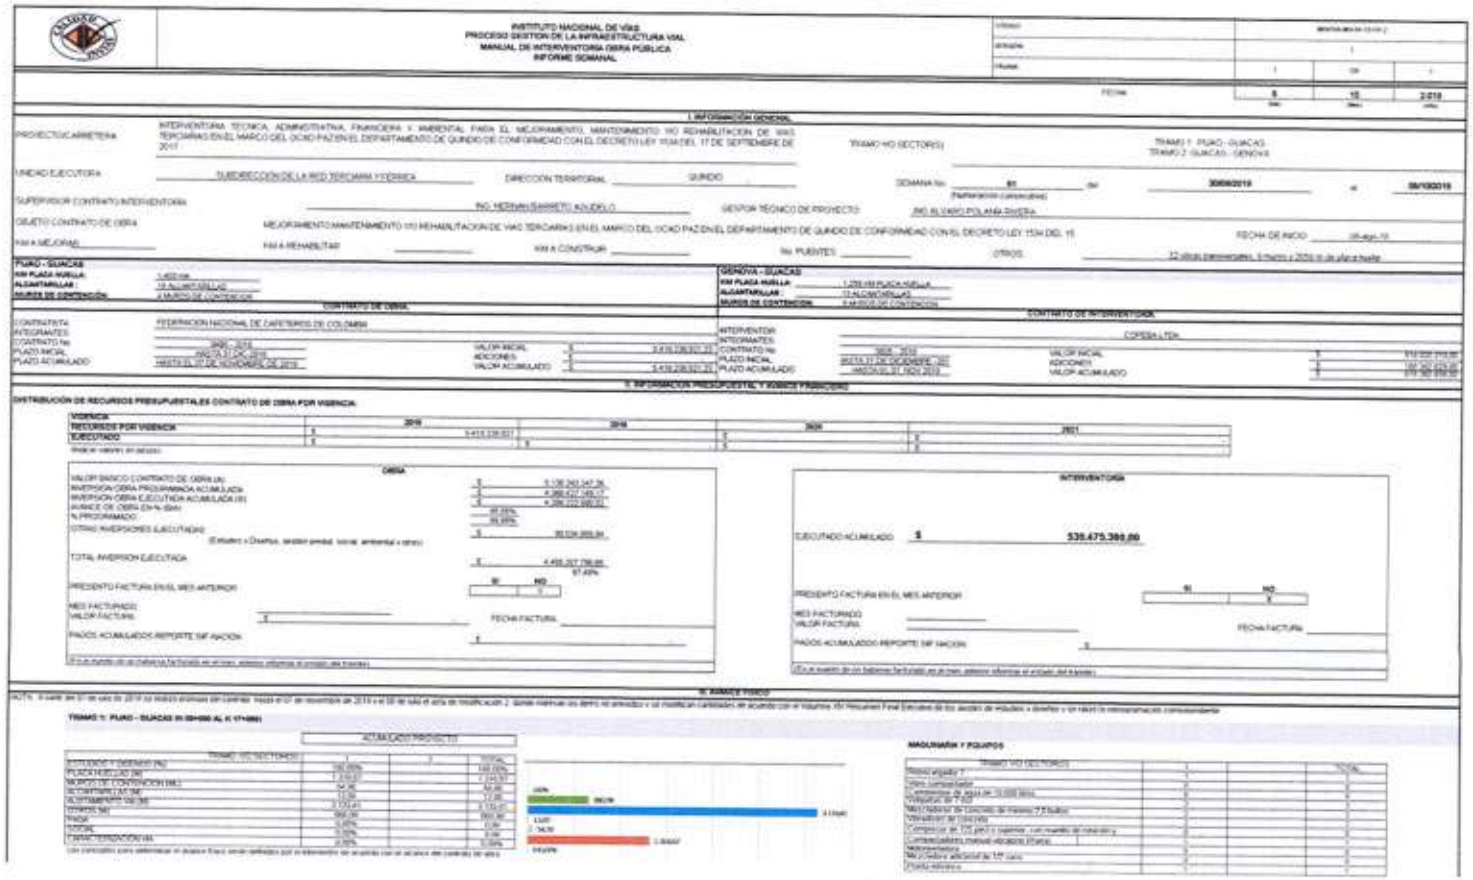

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCHO PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PUAO - GUACAS. TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FLUVIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No: 91 (Reiniciación Contractual) del 30/09/2019 al 06/10/2019

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. EL DARIO POLANIA OVIEDO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCHO PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15

FECHA DE INICIO: 09-ago-19

Km A MEJORAR: Km A REHABILITAR: Km A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 12 obras transversales, 5 muros y 2076 ml de placa huella

PUAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1.400 KM
ALCANTARILLAS: 19 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1.700 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS: 13 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 3458 - 2019
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2019
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR INICIAL: $ 3.416.236.521,33
ADICIONES: $
VALOR ACUMULADO: $ 3.416.236.521,33

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR:
INTEGRANTES: CONSULTOR
CONTRATO No: 3458 - 2019
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2019
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 NOV 2019
VALOR INICIAL: $ 516.000.000,00
ADICIONES: $ 160.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 676.000.000,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2019	2018	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.416.236.521		$	$
EJECUTADO	$	$	$	$

(Valor en valores sin decimales)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 3.138.240.347,36
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 4.368.427.149,17
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4.268.222.988,80
AVANCE DE OBRA (B/A %): 97,69%
% PROGRAMADO: 99,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 80.034.999,84
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)
TOTAL INVERSION EJECUTADA: $ 4.468.257.788,64 97,69%

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $

(En el evento de un balance fav/desfav en el mes, explicar informe el origen del balance)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 535.475.399,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $

(En el evento de un balance fav/desfav en el mes, explicar informe el origen del balance)

III. AVANCE FISICO

NOTA: El plazo del 31 de julio de 2019 se redacta el otrosí del contrato hasta el 31 de noviembre de 2019 y se da de baja el acta de modificación 2. Somos motivo por demás no entendido y se modifican cantidades de acuerdo con el requisito 10) Recuperar Final Ejecutado de los ajustes de volúmenes + diseños + un nuevo la reprogramación correspondiente

TRAMO 1: PUAO - GUACAS (K 0+000 AL K 17+000)


ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TRAMO / SECTOR(ES)	1	2	TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS (M3)	100,00%		100,00%
PLACA HUELLA (M)	1.700,00		1.700,00
MUROS DE CONTENCION (ML)	54,00		54,00
ALCANTARILLAS (M)	12,00		12,00
ALCANTARILLAS (U)	2.700,00		2.700,00
OBRAS (M)	600,00		600,00
OBRAS	0,00%		0,00
TOTAL	0,00%		0,00
CARACTERIZACION (A)	0,00%		0,00%

(Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por la interventoría en acuerdo con el avance del contrato de obra)

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(ES)				TOTAL
Motoniveladora 1	1			1
Volteo compactador	1			1
Compresores de aire de 12.000 lb/m2	1			1
Vibrador de 4 HP	1			1
Mini Retroexcavadora de Llantas 1,2 Bultos	1			1
Vibrador de concreto	1			1
Compactador de 175 pies o superior - con martillo de rotación y	1			1
Compactadores manual vibratorio (Rana)	1			1
Motoniveladora	1			1
Mini Retro o adicional de 1/4 cubo	1			1
Planta eléctrica	1			1

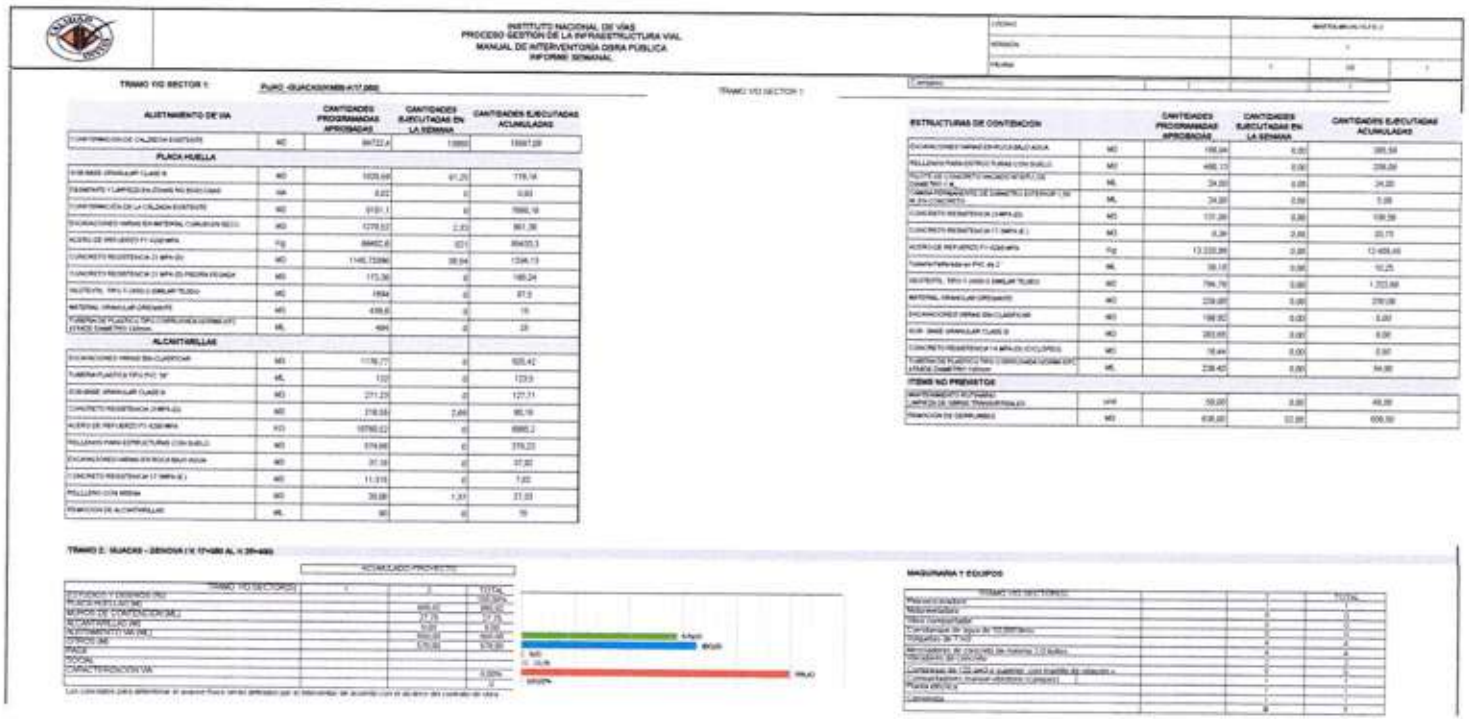

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

TRAMO VIO SECTOR 1

ALISTAMIENTO DE VIA

		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	84722,4	1999,2	19997,28
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1639,68	61,25	779,14
ESCARIFICACION Y LIMPIEZA EN ZONAS NO EXISTENTES	HA	8,02	0	0,00
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	9151,1	0	7999,18
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL CUALQUIER NATU	M3	1278,52	2,31	861,38
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	Kg	89452,8	63,1	89433,3
CONCRETO REGISTENCIA 21 MPA (S)	M3	1146,7339	38,64	1336,73
CONCRETO REGISTENCIA 21 MPA (S) PIEDRA ECUAJA	M3	173,36	0	185,24
RELLENO, TIPO II USO O SIMILAR TECNICO	M3	1684	0	87,5
MATERIAL VRANULAR (PEDRAPIE)	M3	4356,6	0	15
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA SOBRE EXT ETANDE DIAMETRO 12pulgadas	ML	484	0	28
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1178,77	0	925,42
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	132	0	123,5
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	271,23	0	127,71
CONCRETO REGISTENCIA 21MPA (S)	M3	218,53	2,64	95,19
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	10760,52	0	6980,2
RELLENO PARA ESTRUCTURA CON SUELO	M3	574,66	0	378,23
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SIN VOLADURA	M3	31,39	0	37,82
CONCRETO REGISTENCIA 17 MPA (E)	M3	11,315	0	7,82
RELLENO CON MEZCLA	M3	39,68	1,31	21,03
PROTECCION DE ALCANTARILLAS	ML	90	0	70

TRAMO 2: HUACAS - SEDIVOA (K 17+000 AL K 29+000)

TRAMO VIO SECTOR(ES)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			100,00%
PLIEGO PRECIO GLOBAL		0,00	0,00%
MEDIOS DE CONTENCION (ML)		27,75	27,75
ALCANTARILLAS (M)		0,00	0,00
ALISTAMIENTO VIA (KM)		0,00	0,00
OTROS (M)		576,66	576,66
VIAJES			
SOCIAL			
CAPACITACION VIA			0,00%
			0


Los coeficientes para determinar el aporte Local serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

ESTRUCTURAS DE CONTENCION

		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADO
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SIN VOLADURA	M3	198,64	0,00	385,54
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	466,13	0,00	239,64
FILETE DE CONCRETO VACIADO MONOLITICO CON MEZCLA DE CONCRETO	ML	24,00	0,00	24,00
CANALETA PERIMETRAL DE DIRECTRIZ EXTERIOR (SIN REVESTIMIENTO	ML	24,00	0,00	5,00
CONCRETO REGISTENCIA (3 MPA (E)	M3	131,28	0,00	109,58
CONCRETO REGISTENCIA (17 MPA (E)	M3	8,24	2,64	20,75
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	Kg	13.233,84	0,00	12.409,45
TUBERIA PERFORADA en PVC de 2	ML	99,10	0,00	92,25
RELLENO, TIPO II USO O SIMILAR TECNICO	M3	784,76	0,00	1.203,68
MATERIAL VRANULAR (PEDRAPIE)	M3	239,68	0,00	239,68
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	198,92	0,00	0,00
SUB- BASE GRANULAR CLASE B	M3	283,68	0,00	0,00
CONCRETO REGISTENCIA 14 MPA (S) (CICLOPEO)	M3	18,44	0,00	0,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA SOBRE EXT ETANDE DIAMETRO 12pulgadas	ML	238,42	0,00	84,68
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO ROUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	UNI	50,00	0,00	48,00
DEMOLICION DE GEMELARIO	M3	636,00	12,00	606,00

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO VIO SECTOR(ES)				TOTAL
Retroexcavadora			1	1
Motoniveladora			1	1
Pipa compactadora			0	0
Carrotanque de agua de 10.000 litros			1	1
Compactor de 7 ton			1	1
Mezcladores de concreto de volumen 2,0 bultos			1	1
Vibradores de concreto			1	1
Camionetas de 1.500 a 3 cuerpos con cuarto de vibrador o compactador, manual vibrador, Compactor			1	1
Planta eléctrica			1	1
Generador			1	1
			0	0

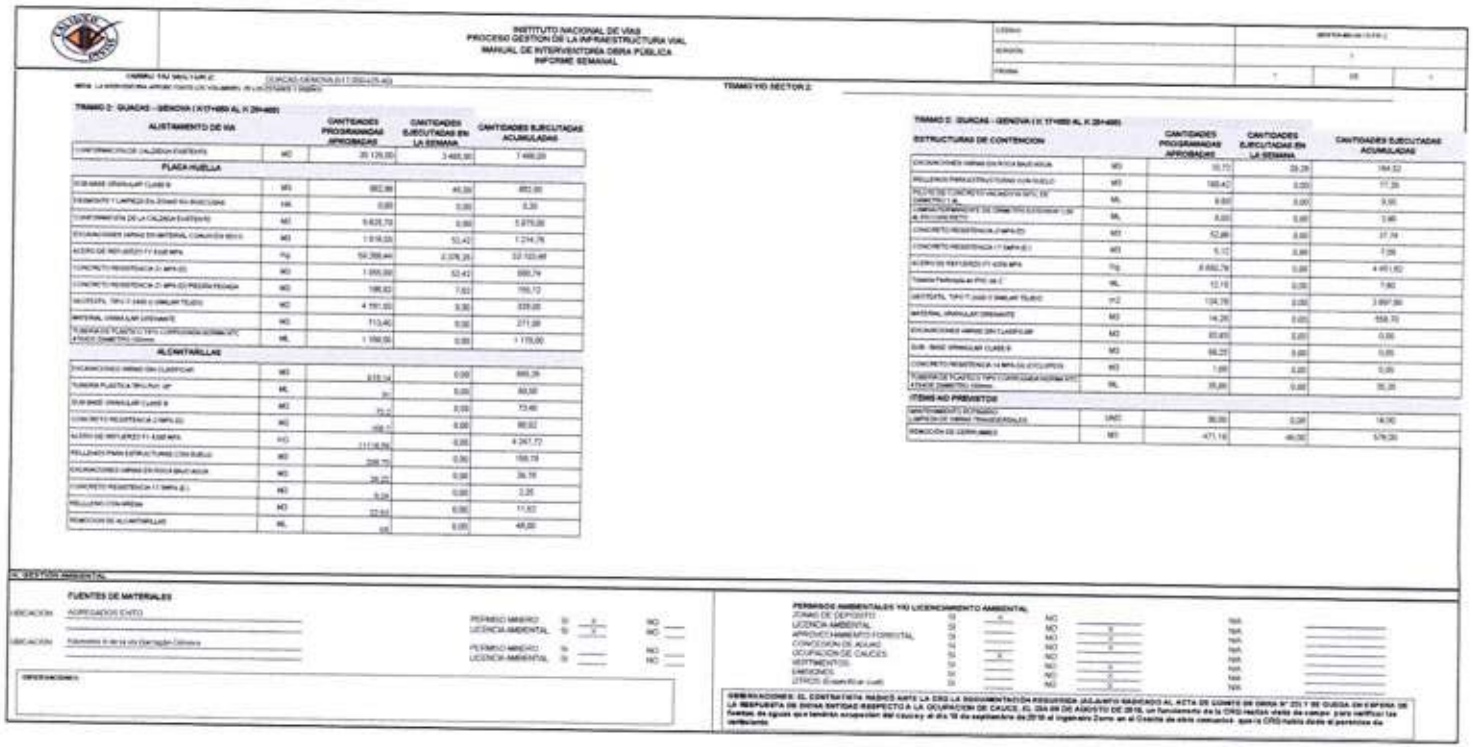

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

TRAMO 2 - GUACAS - GENOVA (K 0+680 AL K 29+480)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	MO	20.125,00	3.465,00	7.466,20
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	882,88	44,00	882,00
DESBROCE Y LIMPIEZA En ZONAS No INVECIVAS	HA	0,00	0,00	0,30
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	9.625,70	0,00	5.875,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1.918,00	53,42	1.214,76
ACERO DE REFUERZO FY 5100 MPA	Kg	54.356,44	2.378,20	32.123,48
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (3)	M3	1.955,00	52,42	980,74
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (3) PEGA PEDRA	M3	196,82	7,63	150,12
MUROS EN TIPO 7 (440 X 0MM) (M TUBO)	M2	4.781,00	0,00	539,00
MATERIAL GRANULAR (RECEBO)	M3	713,40	0,00	271,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA SUPERLITE ATAHOE DIAMETRO 150mm	ML	1.166,00	0,00	1.170,00
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	835,34	0,00	695,39
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 18"	ML	80	0,00	80,00
SUB BASE GRANULAR CLASE B	M3	73,2	0,00	73,40
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (3)	M3	108,1	0,00	80,02
ACERO DE REFUERZO FY 5100 MPA	KG	11136,56	0,00	9.247,72
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	208,70	0,00	168,78
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SIN AGUA	M3	36,25	0,00	36,19
CONCRETO RESISTENCIA 17 MPA (2.)	M3	5,24	0,00	3,20
RELLENO CON ARENA	M3	22,53	0,00	11,62
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	0,0	0,00	48,00

TRAMO 2 - GUACAS - GENOVA (K 17+680 AL K 29+480)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SIN AGUA	M3	10,72	39,28	184,52
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	180,42	0,00	77,28
ACERO DE REFUERZO FY 420,00 MPA	Kg	8.892,78	0,00	4.481,82
CONCRETO RESISTENCIA 17 MPA (2.)	M3	5,12	0,00	7,09
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (3)	M3	52,66	0,00	37,74
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (3) PEGA PEDRA	M3	7,63	0,00	7,63
MUROS EN TIPO 7 (440 X 0MM) (M TUBO)	M2	134,78	0,00	3.997,99
MATERIAL GRANULAR (RECEBO)	M3	14,20	0,00	558,70
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	83,40	0,00	0,00
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	66,25	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (3) (CUNETA)	M3	1,69	0,00	0,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA SUPERLITE ATAHOE DIAMETRO 150mm	ML	35,00	0,00	35,00
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO ROTONDAS	UNID	36,00	0,00	14,00
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	M1	471,16	46,00	576,00
REMOCION DE CERRAMIENTO	M1			

IX. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: AGREGADOS EXITO
UBICACION: Fabricados in situ en la vía Guacas-Génova


PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	X	N/A	
CONCESION DE AGUAS	SI		NO	X	N/A	
OCUPACION DE CAUCES	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES	SI		NO	X	N/A	
OTROS: (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA JUNTO RADICADO AL ACTA DE CORTE DE OBRA N° 23 Y DE GUACA (en el sentido de LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACIÓN DE CAUCE. EL 29A 09 DE AGOSTO DE 2018, un funcionario de la CRQ realizó visita de campo para verificar las fuentes de agua que serán/son ocupadas del cauce y el día 10 de septiembre de 2018 el ingeniero Zorro en el Cesión de esta consultor, que la CRQ había dado el permiso de ocupación.

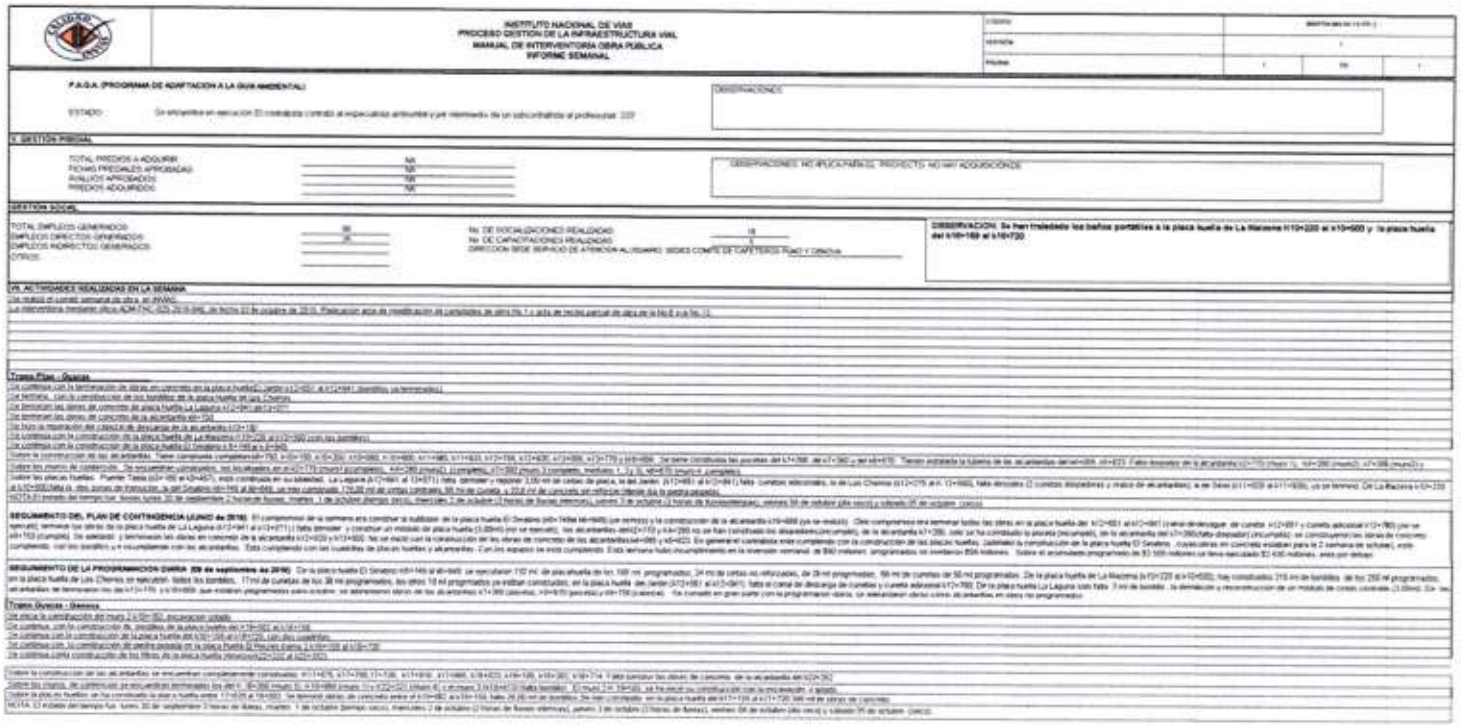

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

F.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin antecedentes en ejecución El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional [illegible]

OBSERVACIONES:

II. GESTION PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: NA
PREDIOS PRECIALES APROBADAS: NA
AVALUOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO, NO HAY ADQUISICIONES

GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 30
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 30
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 18
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCION SEDE SEÑALIZ DE ATENCION AL USUARIO: SEDES COMITE DE CAFETEROS Rad Y DIRECTIVA

OBSERVACION: Se han trasladado los baños portátiles a la placa huella de La Mazorca K10+220 al K10+500 y la placa huella del k10+180 al k10+720

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó el comité semanal de obra y el PARC
La interventoría mediante oficio ADM-FNC-025-76-19-SAE, de fecha 27 de octubre de 2019, Realizacion acta de modificacion de cantidades de obra No. 1 y acta de recibo parcial de obra de la No.6 a la No. 12

Tramo Piar - Guacas

Se continua con la terminación de obras en concreto en la placa huella(El Jardin k12+600 al K12+841 (bandillos ya terminados))
Se termina con la construccion de los bordillos de la placa huella de Las Chamas
Se terminan las obras de concreto de placa huella La Laguna K12+941 al K13+071
Se terminan las obras de concreto de la alcantarilla k9+154
Se hizo la reparación del cajacal de descarga de la alcantarilla k13+180
Se continua con la construcción de la placa huella de La Mazorca K10+220 al k10+500 con los bordillos
Se continua con la construcción de la placa huella El Tendalero k 8+140 al k 8+340
Sobre la construccion de las alcantarillas Tales construidas completamente k9+752 k10+100 k10+660, K11+480, k11+620, k12+154, k12+430, k12+556, k12+779 y k15+604 Se tiene construidos los pocetas del k7+300 del k7+340 y del k8+670. Tienen instalada la tubería de las alcantarillas del k9+604, k9+623. Falta depositar en la alcantarilla k11+770 (Hasta 1), k9+280 (Hasta2), k7+398 (Hasta3) y
Sobre los muros de contención: Se encuentran construidos los siguientes en el k7+770 (muro1 completo), k8+280 (muro2) (completo), k7+392 (muro 3 completo, mediano 1, 2 y 3), k8+670 (muro 4 completo)
Sobre las placas huellas: Planter Tasa (k9+600 al k9+657), esta construida en su totalidad. La Laguna (k12+941 al 13+071) falta demoler y reponer 3.00 ml de cabeo de placa, la del Jardin (k12+683 al k12+841) falta cunetas adicionales, la de Las Chamas (k12+575 al k. 13+660), falta descalce (2 cuneta disipadores y 1 rodeo de alcantarillas), a la Tasa (k11+639 al k11+839), ya se termino. De La Mazorca k10+220 a k10+500(falta 01 dias zonas de transporte, ya que Octubre (k9+749 al k9+849), se han comprado 1'324,00 ml del compo Limitrofe, 59.7% de Cuneta y 22.6 ml de cunveta, se refiere se tiene que terminar dia la siguiente semana.
NOTA:El inicio del tiempo fue lunes lunes 30 de septiembre 2 horas de lluvias, martes 1 de octubre (tiempo seco), miercoles 2 de octubre (2 horas de lluvias vespertinas), jueves 3 de octubre (dia seco) y viernes 04 de octubre (dia seco) y sabado 05 de octubre (seco).

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA (LUNES de 2019): El compromiso de la semana era construir la subbase de la placa huella El Tendalero (k8+749al k8+849) (se termino) y la construccion de la alcantarilla k10+660 (ya se realizó). Este compromiso era terminar todas las obras en la placa huella del K12+600 al k12+941 (cunetas descargue de cunetas K12+691 y cuneta adicional k12+780) (por se ejecutó), terminar los obras de la placa huella de La Laguna (k12+941 al k13+071) (falta demoler y construir un modulo de placa huella (3.00ml) por se ejecutó), las alcantarillas del(K7+710 y k4+290) no se han construido los diques(no cumplen), de la alcantarilla k7+398, solo se ha construido la poceta (incumplio), de la alcantarilla del k7+390(falta disipador) (incumplio), se construyeron las obras de concreto k9+153 (cumplio). De soldado y terminación las obras en concreto de la alcantarilla k12+600 y k13+600. No se inicio con la construcción de las obras de concreto de las alcantarillas(k4+080 y k5+422). En general el contratista este cumpliendo con la construcción de las placas huellas, (salvedad la construcción de la placa huella El Tendalero , (capacitadas en concreto estaban para la 2 semana de octubre), este cumpliendo con los bordillos y e incumpliendo con las alcantarillas. Esta cumpliendo con las cuentillas de placas huellas y alcantarillas. Con los equipos se esta cumpliendo. Esta semana hubo incumplimiento en la inversión semanal de $Mil millones programados no invertieron $5mi millones. Sobre el acumulado programado de $3.500 millones se tiene ejecutado $2.436 millones, esta por debajo.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION DIARIA (09 de septiembre de 2019): En la placa huella El Tendalero k8+749 al k8+849, se ejecutaron 732 ml. de placahuella de los 169 ml. programados, 24 ml de cortes no reforzados, de 28 ml programados, 66 ml de cunetas de 56 ml programados. De la placa huella de La Mazorca (k10+220 al k10+500), hay construidos 215 ml de bordillo de los 250 ml programados, en la placa huella de Las Chamas se ejecutaron todos los bordillos, 17 ml de cunetas de los 36 ml programados, los otros 19 ml programados ya estan construidos, en la placa huella del Jardin (k12+683 al k12+841), falta el canal de descarga de cunetas y cuneta adicional k12+780. De la placa huella La Laguna solo falta 7 ml de bordillo , la demolición y reconstrucción de un modulo de cortes construido (3.00ml). En las alcantarillas de terminaron los del k11+170, y k10+660, que estaban programados como ejecutar, se adicionaron obras de los de alcantarillas k7+398 (pocetas), k9+670 (pocetas) y k9+738 (cabezas). No cumplió en gran parte con la programación diaria, se adicionaron dentro otros de alcantarillas en obra no programados

Tramo Guacas - Oiamora

Se inicia la construcción del muro 2 k10+302, excavacion ordada
Se continua con la construcción de bordillos de la placa huella del k13+022 al k13+100
Se continua con la construcción de la placa huella del k10+220 al k10+720, con dos cuadrillas
Se continua con la construcción de pedrip protegido en la placa huella El Mirador (cuneta 2) k10+100 al k10+720
Se continua (2PH) construcción de los filtros de la placa huella (descarga) k11+220 al k11+370

Sobre la construccion de las alcantarillas, se esta cumpliendo completamente construidas: k11+476, k11+760, 11+726, k11+810, k11+985, k10+423, k9+126, k10+302, k10+714. Falta construir las obras de concreto de la alcantarilla k12+362
Sobre los muros, de cumplieron con el encuentro terminados los del K. 10+760 (muro 1), k.10+980 (muro 2), k.12+240 (Muro 4), k.11+muro 3 (k13+472 (falta bordillo), El muro 2 K.10+302, se ha iniciado su construcción con la excavación y apique.
Sobre la placa huellas: se ha construido la placa huella entre k11+970 al 12+302. Se demuele obras de concreto entre el k12+982 al k10+154, falta 28.00 ml de bordillos. De las construidas en la placa huella del k11+100 al k11+720, falta mil de obras de concreto.
NOTA: El inicio del tiempo fue lunes 30 de septiembre 2 horas de lluvias, martes 1 de octubre (tiempo seco), miercoles 2 de octubre (2 horas de lluvias vespertinas), jueves 3 de octubre (3 horas de lluvias), viernes 04 de octubre (dia seco) y sabado 05 de octubre (seco).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
FECHA	1	08	11

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA (JUNIO) El compromiso era realizar la construcción del empalme de la alcantarilla k19+413 (muro 3) (no se ejecutó), la instalación de la tubería de la alcantarilla k19+652(no se cumplió) e iniciar la construcción de muro 2 (k19+183) (se cumplió), faltemas de esto se debía corregir parte de las obras abscisadas terminar los bordillos de la placa huella del k18+927 al k18+155 (no hizo), 210 ml de placa huella k18+155 al k18+725 (no se hizo), 100 ml de placa huella de de Valencia (no se hizo), y 50 ml de placa huella Castellanos (no se hizo), construcción calzada de la alcantarilla k19+960 (no se hizo), obras de concreto de la alcantarilla k21+252 (no se hizo), instalacion de sobre alcantarillas k19+994 y k19+413 (no se hizo). De esto solo se ejecutó 20 ml pared y preparó en la placa huella k19+158 al k18+720, en la placa huella de k18+652 al k18+100, se terminaron las obras en concreto y la pared pegada, en la placa huella K19+155 al K18+725, solo se han ejecutado 360 ml de los 567 a construir en cuneta central y cunetas. En conclusión aunque se abrió otro frente de trabajo para las placas huellas, el rendimiento ha mejorado y superamos la meta de 150 ml pero ejecutamos 153.00ml). Con el empate si se cumplió. Sobre la inversión semana programada de $77 millones, se ejecutaron $66 millones. Sobre la inversión ejecutada vertiendo acumulada de $1.870 millones está por por encima de la programada de $1.667

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN (Junio (30 de septiembre de 2016) Placa huella (Empalme muro 1 (k17+620 al k19+652) se terminaron todas las obras programadas a faltantes, un marco el cual del las alcantarillas y se inicio el ítems a todo de los bordillos, en la placa huella (Empalme muro 2 (k19+652 al k19+183), se terminaron las obras de concreto faltantes, de la placa huella (Empalme muro 3 empalme k19+164 al k19+294 de la placa huella se encuentra completo faltando los bordillos, del tramo k19+397 al k19+725, se construyeron las placas, cunetas, del k19+381 al k19+478 mas el tramo (95 ml placa en CONCRETO y bordillos) y el tramo k19+606 al k19+668 (63,00 ml) 150 ml de los 150 ml programados, de la placa huella Valencia k22+233 al k22+333 , no han terminado los filtros, ya las obras en concreto de la alcantarilla del localizada, el muro 1 no se fundio nada sobre el costo de rellino, el muro 2 estaria estar trabajando sobre la conveniencia incluir en esta y sobre la instalacion de tuberia y cancelacion obras de concreto (cuneta, bordillos), has llevamos en la construcción de las alcantarillas k19+252, k19+994, k19+413.

UNI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao - Quindío
Continuación de la construcción de un pozo de concreto de la placa huella 30 (empalme) (k9+794 al k9+840).
Continuación de construcción placa huella k17+725 al k17+620 con la construcción de cunetas revestidas
Construcción de las placas de cunetas actividades k17+620 y reconstrucción de placas (cunetas) k17+667 al k17+994
Construcción Alcantarillas de alcantarilla k9+470 (muro1) y de k7+350 (muro2)

Pavimento del viaducto de Vina pico k7+350. Construcción de obras de maniobra 24/080 - 31/071
Continuación de la construcción de obras de concreto en la placa huella La Manzana K19+725 al k19+500, en haremos los marcos y continuación de la construcción de los bordillos

Tramo Dovizia - Guayabo
Continuación de la construcción con bordillos de la placa huella entre el k18+652 al k18+152
Concretar 90 ml de pilas en concreto de la placa huella k18+155 al k18+710
Instalación de tubería de la alcantarilla del muro 1 k18+396 (muro 3 k19+413 y k18+652
Continuar con la construcción de la pared pegada de la placa huella k18+155 al k18+725
Construcción Lateral del 15+500
Terminar construcción con del filtro en la placa huella Valencia k22+333 al k22+333
Iniciar la construcción de obras de concreto de alcantarilla k22+252
Iniciar con las obras de concreto de la placa huella valencia k22+233 al k22+333
Continuación construcción con del muro 2 (k19+183)

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRASO DE LAS OBRAS En el tramo Pijao-Quindío se presentaron lluvias lunes 30 de septiembre 3 horas, miercoles 2 de octubre (2 horas de lluvias ellevadas), jueves 3 de octubre (3 horas). Se presentaron lluvias lunes 30 de septiembre (7 horas, (miercoles 2 de octubre (2 horas de lluvias intensas), jueves 3 de octubre (3 horas)

RUTA AL PROYECTO: [illegible]

LC = 1500 PIJAO — K 17+650 QUINDIO — K 20 + 400 GENOVA

REPRO FOTOGRAFICO



Pijao. Construccion placahuella El Diviseto k9+794 al k9+840



Pijao. Construccion placahuella El Diviseto k9+794 al k9+840



Genova, Construccion placa huella El Naranjo tramo 3 k19+396 al k19+725

NOTA

EL DESCRIBA LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA:

Culminación del actividades en obra No 2
Cumplir con la reprogramación de las obras de acuerdo con programa mayo- noviembre
Continuar con el cumplir del Plan de trabajo (para para no concluirlo fase de las obras por parte) (Empalme muro)
Se realizara el cumplimiento y revisión de los requerimientos ambientales, programa de inversión y plan de contingencia, se solicitara el inicio del proceso del empalmamiento del contrato de obra y se organizara y revisara

FIRMA INTERVENTORIA

NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
No. UNIT: CONSULTA CSD

ANEXO 15. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: OCTUBRE **CONTRATO No.** 0825 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

INTERVENTORÍA: COPEBA S.A.S. **SECTOR:** PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	ESTACIÓN TOPCOM - GTS-255 KB 4182 Y NIVEL DE PRECISIÓN TOPCOM - AT-B2 SERIES 1985	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A
CAMPERO DE MAS DE 2000 CC	MONTERO PLACA CVH 677 MODELO 2008	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A
MOTOCICLETA	YAMAHA PLACA CFH33C MODELO 2012	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A
LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	CONCRESERVICIOS ARMENIA	I	I	I	I	I		I	I	A	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I
OFICINA (dotacion de sillas, mesas, computadores, impresora)	PIJAO, CALLE 14 5-26 APTO 4	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografia, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehiculos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: TODO EQUIPOS SA. CERTIFICADO No 0065. Estacion Total marco TOPCON. Y No 0088 . Nivel TOPCON (SE ANEXA)

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 63202-13454 QND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

COPEBALTDA
Nit [illegible]

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBALTDA
Nit [illegible]

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: MITSUBISHI MONTERO | MODELO: 2008 | PLACA: CVH-677

INSPECCIONÓ: EDISSON PALACIOS | FECHA: 30-09-2014 / 05-10-2014

KILOMETRAJE INICIAL: 721-790 | KILOMETRAJE FINAL: 727 646

ÍTEM	DETALLE	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES DE TRABAJO	Faroles (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Stops	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Luces de tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Defensa delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Defensa trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Antena	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)		X		X		X		X	✓		✓				
	Panorámico delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico trasero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Placas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Sillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Revisión y cambio de aceite de caja	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Líquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Nivel de plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
OTROS	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Rines	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Suspensión trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

132

COPEBALTDA
Nit 805011320-9

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBALTDA
Nit 805011320-9

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: Mitsubishi Montero | MODELO: 2006 | PLACA: CYH 677

INSPECCIONÓ: Edison Valdes | FECHA: 7-10-19 al 12-10-19.

KILOMETRAJE INICIAL: 121.646 | KILOMETRAJE FINAL: 122.043

ÍTEM	DETALLE	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Stops	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Luces de tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Defensa delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Defensa trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Antena	✓		✓		✓		✓		✓						
	Plumillas (limpiadores de panorámico)		X		X		X		X	✓		✓				
	Panorámico delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico trasero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Placas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Sillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Revisión y cambio de aceite de caja	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Líquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Nivel de plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
OTROS	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Rines	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Suspensión trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse DIARIAMENTE y CUMPLIR TODOS los ítems.

Nota: De existir novedad el preoperacional

COPEBA LTDA
Nit 830112249

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBA LTDA
Nit 830112249

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: Mitsubishi Montero | MODELO: 2006 | PLACA: CXH 677

INSPECCIONÓ: Joaquin Lerma | FECHA: 15-10-19 al 19-10-19

KILOMETRAJE INICIAL: 122.043 | KILOMETRAJE FINAL: 122.320

ÍTEM	DETALLE	LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SÁBADO C	SÁBADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC	OBSERVACIONES
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales			✓		✓		✓		✓		✓				
	Stops			✓		✓		✓		✓		✓				
	Luces de tablero			✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia			✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Defensa delantera			✓		✓		✓		✓		✓				
	Defensa trasera			✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores			✓		✓		✓		✓		✓				
	Antena			✓		✓		✓		✓		✓				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico delantero			✓		✓		✓		✓		✓				fisura Panoramico lado derecho
	Panorámico trasero			✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas delanteras			✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras			✓		✓		✓		✓		✓				
	Placas			✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos			✓		✓		✓		✓		✓				
	Sillas			✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturones de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓				Sin contacto en regular estado
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado			✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador			✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito			✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros			✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros				X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor			✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado			✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido			✓		✓		✓		✓		✓				
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor			✓		✓		✓		✓		✓				
	Revisión y cambio de aceite de caja			✓		✓		✓		✓		✓				
	Liquido de frenos			✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador			✓		✓		✓		✓		✓				
	Nivel de plumillas			✓		✓		✓		✓		✓				
	Otros			✓		✓		✓		✓		✓				
OTROS	Llantas			✓		✓		✓		✓		✓				
	Llanta de repuesto			✓		✓		✓		✓		✓				
	Rines			✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera			✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit anti derrame				X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera			✓		✓		✓		✓		✓				
	Suspensión trasera			✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos			✓		✓		✓		✓		✓				

NOTA IMPORTANTE: [illegible] OBLIGATORIAMENTE [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COPERALTIDA
Nit 800311224

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPERALTIDA
Nit 800311224

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: Mitsubishi | MODELO: 2008 | PLACA: CUH 677

INSPECCIONÓ: Jose Joaquin Moreno Valencia | FECHA: 21-10-19 - 26-10-19

KILOMETRAJE INICIAL: 122 320 | KILOMETRAJE FINAL: 122 812

ÍTEM	DETALLE	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Stops	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Luces de tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Defensa delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Defensa trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Antena	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Panoramico delantero lado derecho
	Panorámico trasero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Placas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Sillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Silla copiloto en regular estado
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido	✓		✓		✓		✓								
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor															
	Revisión y cambio de aceite de caja	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Líquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Nivel de plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
OTROS	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				- Guarda barro delantero, lado izquierdo en mal estado. - marco Panamirico lado izquierdo mal estado
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Rines	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera	✓		✓		✓		✓								
	Suspensión trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

NOTA IMPORTANTE: [illegible] | C: Cumple | NC: No cumple | Vo.Bo. Firma en día en el parqueo [illegible]

135

COPEBALTDA
Nit 805011224-4

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBALTDA
Nit 805011224-4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: Mitsubishi | MODELO: 2008 | PLACA: CVH 677

INSPECCIONÓ: Jose Joaquin Noreña | FECHA: 26-10-19 al 02-11-19

KILOMETRAJE INICIAL: 122812 | KILOMETRAJE FINAL: 123443

ÍTEM	DETALLE	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Stops	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Luces de tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Defensa delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Defensa trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Antena	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				- Visor Panoramico delantero. todo Sobrenombre derecho
	Panorámico trasero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Placas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Sillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				- Silla co-piloto en regular estado
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X					
	Ventilador refrigerante de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Revisión y cambio de aceite de caja	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Líquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Nivel de plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
OTROS	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Guarda Barro delantero lado izquierdo en mal estado (Accidente)
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Rines	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				- Marco Panoramico delantero lado clero en mal estado (Accidente)
	Suspensión trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

NOTA IMPORTANTE: [illegible] | C: Cumple | NC: No cumple

Verifico: [illegible]

136

ANEXO 16. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MNFRA.MN.IN.15.FR.8		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

FECHA: 5 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 825 DE 2018 — INTERVENTOR: COPEBA LTDA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2019 — CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: PUAO-GUACAS Y GENOVA-GUACAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	1116	005-2402-0603-2018-130101-0002	A83000	Nación	Contrato principal 825 de 2018	$ -
2019	1019	005-2402-0603-2018-130101-0001	A83000	Nación	Contrato principal 825 de 2018	$ 518,020,310.00
2019	7919	005-2402-0603-2018-130101-0001	A83000	Nación	Contrato 825-02-2018 DE 2019	$ 160,342,629.00
				TOTAL		$ 678,362,939.00

No. COMPR RUBRO No. _____ RECURSO No. _____

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 678,362,939.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1019 De 11/01/2019	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 518,020,310.00		$ 678,362,939.00		REG No. 1019 de 2019-01-11
1	ago-18	$ 13,705,358.00	$ 2,604,018.00	$ 16,309,376.00	0	0	$ 501,710,934.00	$ 16,309,376.00	$ 662,053,563.00		
2	sep-18	$ 25,702,003.00	$ 4,883,381.00	$ 30,585,384.00	0	0	$ 471,125,550.00	$ 46,894,760.00	$ 631,468,179.00		
3	oct-18	$ 30,945,815.00	$ 5,879,705.00	$ 36,825,520.00	0	0	$ 434,300,030.00	$ 83,720,280.00	$ 594,642,659.00		
4	nov-18	$ 25,812,624.00	$ 4,904,399.00	$ 30,717,023.00	0	0	$ 403,583,007.00	$ 114,437,303.00	$ 563,925,636.00		
5	dic-19	$ 26,807,518.00	$ 5,093,428.00	$ 31,900,946.00	0	0	$ 371,682,061.00	$ 146,338,249.00	$ 532,024,690.00		
6	ene-19	$ 30,338,379.00	$ 5,764,292.00	$ 36,102,671.00	0	0	$ 335,579,390.00	$ 182,440,920.00	$ 495,922,019.00		
7	feb-19	$ 35,060,618.00	$ 6,665,317.00	$ 41,745,935.00	0	0	$ 293,833,455.00	$ 224,186,855.00	$ 454,176,084.00		
8	mar-19	$ 40,835,210.00	$ 7,758,690.00	$ 48,593,900.00	0	0	$ 245,239,555.00	$ 272,780,755.00	$ 405,582,184.00		
9	abr-19	$ 42,712,164.00	$ 8,115,311.00	$ 50,827,475.00	0	0	$ 194,412,080.00	$ 323,608,230.00	$ 354,754,709.00		
10	may-19	$ 42,803,633.00	$ 8,132,690.00	$ 50,936,323.00	0	0	$ 143,475,757.00	$ 374,544,553.00	$ 303,818,386.00		
11	jun-19	$ 44,589,081.00	$ 8,471,925.00	$ 53,061,006.00	0	0	$ 90,414,751.00	$ 427,605,559.00	$ 250,757,380.00		
12	jul-19	$ 43,702,334.00	$ 8,303,443.00	$ 52,005,777.00	0	0	$ 38,408,974.00	$ 479,611,336.00	$ 198,751,603.00		
	ADICIONAL No. 1						$ 160,342,629.00				REG No. 7919 de 2019-01-10
13	ago-19	$ 46,256,464.00	$ 8,788,728.00	$ 55,045,192.00	0	0	$ 143,706,411.00	$ 534,656,528.00	$ 143,706,411.00		
14	sep-19	$ 49,726,761.00	$ 9,448,085.00	$ 59,174,846.00	0	0	$ 84,531,565.00	$ 593,831,374.00	$ 84,531,565.00		
15	oct-19	$ 50,394,840.00	$ 9,575,020.00	$ 59,969,860.00	0	0	$ 24,561,705.00	$ 653,801,234.00	$ 24,561,705.00		
	TOTALES	$ 540,412,602.00	$ 104,388,432.00	$ 653,801,234.00	$ -	$ -	$ 24,561,705.00	$ 653,801,234.00	$ 24,561,705.00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes

Firma
Nombre: Andrea Del Pilar Peña Sanchez
Director de Interventoría
Matrícula No: 25202-66675CND

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No: 6302-13454 QND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copia: Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA PARA PAGO

MES DEL INFORME: OCTUBRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA			X	X	X																										
JABIB ENRIQUE CARILLO DAZA	DIRECTOR INTERVENTORÍA										X	X	X																			
EDISSON PALACIOS GUIO	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	X	X	X
JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA	SECRETARIA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
NURY GARCIA LOPEZ	TRABAJADORA SOCIAL	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
JOHN OSWALDO CANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL																		X	X												
JOSE JOAQUIN NOREÑA VALENCIA	CONDUCTOR																	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X		
JONH MAYRON HINESTROZA	CADENERO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
BRIGIDA HEDI MORALES SOLANO	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
CHRISTIAN JAVIER GUTIERREZ G.	CADENERO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
HUGO CARDONA CASTAÑO	AUXILIAR INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
LUIS ABDENAGO TORRES VARGAS	INSPECTOR	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 63202-13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

140

ANEXO 18. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MINFRA-MN-IN-15-FR-13

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 5 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 825 de 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO-GUACAS Y GENOVA-GUACAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	Andrea Del Pilar Peña Sanchez	52,253,696	Director de Interventoria	$ 1,472,400.00	$ 1,472,400.00	$ 102,500.00	$ 58,900.00	$ 235,600.00	$ 58,900.00	$ -	$ -
2	Edisson Montherland Palacio Guio	7,167,367	Residente de Interventoria	$ 3,100,000.00	$ 3,100,000.00	$ 215,800.00	$ 124,000.00	$ 496,000.00	$ 124,000.00	$ -	$ -
3	Hugo Cardona Castaño	4,522,755	Ingeniero Auxiliar Interventoría	$ 2,435,000.00	$ 2,435,000.00	$ 169,500.00	$ 97,400.00	$ 389,600.00	$ 97,400.00	$ -	$ -
4	Nury Jazmin Garcia López	52,880,586	Profesional Gestión Social	$ 828,116.00	$ 828,116.00	$ 57,700.00	$ 33,200.00	$ 132,500.00	$ 33,200.00	$ -	$ -
5	John Oswaldo Cano Garcia	79,858,440	Especialista Ambiental	$ 1,065,000.00	$ 828,116.00	$ 57,700.00	$ 33,200.00	$ 132,500.00	$ -	$ -	$ -
6	Giovanni Sierra Oliveros	7,174,391	Profesional SIG	$ 3,706,500.00	$ 1,853,250.00	$ 129,000.00	$ 74,200.00	$ 296,800.00	$ 74,200.00		
7	Luis Abnegado Torres Vargas	4,118,715	Inspector de Obra	$ 1,800,300.00	$ 1,800,300.00	$ 125,400.00	$ 72,100.00	$ 288,100.00	$ 72,100.00	$ -	$ -
8	Brigida Hedi Morales Solano	7,548,791	Topografo	$ 1,820,241.00	$ 849,446.00	$ 59,200.00	$ 34,000.00	$ 136,000.00	$ 34,000.00	$ -	$ -
9	Christian Javier Gutierrez Gutierrez	1,105,671,099	Cadenero	$ 869,500.00	$ 869,500.00	$ 60,600.00	$ 34,800.00	$ 139,200.00	$ 34,800.00		
10	Johana Rocio Ardila Ariza	24,969,802	Secretaria	$ 869,500.00	$ 869,500.00	$ 60,600.00	$ 34,800.00	$ 139,200.00	$ 34,800.00	$ -	$ -
11	Jhon Mayron Hinestroza Valencia	1,099,709,891	Cadenero	$ 869,500.00	$ 869,500.00	$ 60,600.00	$ 34,800.00	$ 139,200.00	$ 34,800.00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 18,836,057.00		$ 1,098,600.00	$ 631,400.00	$ 2,524,500.00	$ 598,200.00	$ -	$ -

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoria efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: Andrea Del Pilar Peña Sanchez
Director de Interventoria
Matricula No.: 25202-66675 CND

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula No.: 63202-13454 QND

† Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial

142

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLID

Fecha creación n. ...: 2019-10-29, 09:25:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTE **Numéro Planilla:** 8928678500

Periodo Cotización: octubre de 2019 **Periodo Servicio:** octubre de 2019 **Referencia pago (PIN):** 8924103900

PAGADO 29/10/2019 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN OSWALDO CANO GARCIA		
Documento	CC79858440	**Dirección**	CL 17 8ESTE 04 TO 3 APTO 205
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8946688
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MOSQUERA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Dias PEN	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 79858440	JOHN OSWALDO CANO GARCIA	03	00																		0	30	30	0	0	(25)(501) PORVENIR	$ 828,116	$ 132,500	(EPS025) EPS SANITAS	$ 828,116	$ 103,600	0.000	$ 0	$ 0	(MN+CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236,100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 828,116	$ 828,116	$ 0	$ 0	$ 132,500	$ 103,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236,100	$ 0	$ 236,100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ANEXO 19. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

PLAZO INICIAL: 31-dic-18

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07-nov-19
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 518,020,310.00

VALOR ACUMULADO: $ 518,020,310.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. HERNÁN BARRETO AGUDELO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 51,802,031	30 5 2018	LIQUIDACION
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 87,063,650	30 5 2018	LIQUIDACION
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103,604,062	30 5 2018	31 12 2021
Calidad del servicio	30%	$ 155,406,093	CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 107493

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso Nº 3 del 09-07-2018
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX- CESCE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 67,836,294	8	8	2018		LIQUIDACION DEL CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 135,672,588	8	8	2018		7	11	2022
Calidad del servicio	30%	$ 203,508,882	Vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad en el contrato objeto de interventoria						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 107493

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso N° 9 del 16-07-2019
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX- CESCE

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: ACTA 27 DIC DE 2018 APROBACIÓN PÓLIZA modificación- CONTRATO DE INTERVENTORÍA 825 DE 2018

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:
El contratista mediante el oficio No ADM-INV-825-2018-023 radicado el día 10 de septiembre de 2018, renuncia al anticipo

Hasta julio 31 de 2018, se han producido los siguientes endosos(No 2, No 3, No 4, No 5, No 7 y No 9) con las correspondientes aprobaciones, menos el número 2. Se anexan

Firma
Nombre: JABIB ENRIQUE CARRILLO DAZA
Director de Interventoría
Matricula No.: 01103-0710

Firma
Nombre: HERNÁN BARRETO AGUDELO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 63202-13454 (QND)

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 20. SEGUIMIENTO INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

MINFRA-MN-IN-3-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNAN BARRETO AGUDELO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: Mediante el oficio No ADM-INV-825-2018-023 del 10 de septiembre de 2018, la interventoria renuncia al anticipo, radicado ante INVÍAS el dia 10 de septiembre de 2018 mediante el número 77060
Se aprobó mediante MODIFICACIÓN No UNO (1) al contrato principal 825 de 2018, con fecha del 07 de diciembre de 2018, se aprobó " CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el contrato No 825 de 2018, se suprime la CLAUSULA SÉPTIMA, referente al ANTICIPO
(Indicar la justificación cuando se trata de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
TOTAL							100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso especifico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 2520266675 CND

(Firma)
HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del contrato de Interventori
Matricula No.: 63202-13454(QUINDIO)

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

148

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA REDTERCIARIA Y FÉRREA DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO [v] (Marque X si corresponde) INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO [ ] (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 825 DE 2018

CUENTA BANCARIA No.: NA BANCO NA SUCURSAL NA

ANTICIPO OTORGADO: NA %

VALOR DEL ANTICIPO: NA (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNAN BARRETO AGUDELO

Mediante el oficio No ADM-INV-825-2018-023 del 10 de septiembre de 2018, la interventoria renuncia al anticipo, radicado ante INVÍAS el dia 10 de septiembre de 2018 mediante el número 77060

Se aprobó mediante MODIFICACIÓN No UNO (1) al contrato principal 825 de 2018, con fecha del 07 de diciembre de 2018, se aprobó " CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el contrato No 825 de 2018, se suprime la CLAUSULA SÉPTIMA, referente al ANTICIPO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Indicar el número del item según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de interventoria Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): NA (Según certificación de Entidad bancaria)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - NA (Según certificación de Entidad bancaria)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No NA FECHA NA VALOR $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-3)

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No.: 2520266675 CND

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del contrato de Interventoria
Matricula No. 63202-13454(QUINDIO)

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 21. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Interventor : COPEBA S.A.S

Contrato de Interventoria : 0825 - 2018

Objeto : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Contratista : FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Contrato de Obra : 0498 - 2018

CONSECUTIVO	DIRIGIDO POR	DIRIGIDO A	FECHA ENVIADO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO OCTUBRE	OBSERVACIONES
ADM-INV-825-2018-222	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA BOGOTA	23/09/2019	02/10/2019-83072	RELACIÓN OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-224	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA BOGOTA	30/09/2019	02/10/2019-83074	RELACIÓN OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-235	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS QUINDIO	30/09/2019	02/10/2019-83481	CORRECCIÓN ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.5 (Diciembre)	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-236	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS QUINDIO	30/09/2019	02/10/2019-83487	CORRECCIÓN ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.6 (Enero)	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-046	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	02/09/2019	03/10/2019-E1904150	RADICACIÓN ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA N.1 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE LA No.6 A LA No.13	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-237	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO-SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	04/10/2019	04/10/2019-84689	ACTUALIZACIÓN PAGA VERSION 6	COPEBA S.A.S.
SRT 42107	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	04/10/2019	10/10/2019	SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PAGOS APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA. INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.5, RADICADO 72938-03/09/2019	INVIAS BOGOTA
ADM-INV-825-2018-238	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA - SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	07/10/2019	08/10/2019-85646	RELACION OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE COTUBRE DE 2019	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-239	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS TERRITORIAL QUINDIO	07/10/52019	07/10/2019-85290	ENTREGA DE INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.13 Agosto 2019	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-242	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA - SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	15/10/2019	15/10/2019-87694	RELACION OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019	COPEBA S.A.S.
FNC-825-2018-179	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO-DIRECTOR OBRA	15/10/2019	15/10/2019-E1904335	REMISORIO PARA EL OFICIO SOC-FNC-825-2018-018 DEL ESPECILISTA SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA	COPEBA S.A.S.
SRT 42966	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	10/10/2019	15/10/2019	APROBADA HOJA DE VIDA DIRECTOR INTERVENTORÍA JABIB ENRRIQUE CARILLO DAZA	COPEBA SAS
SRT 42821	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	09/10/2019	15/10/2019	SOLICITUD DE VERIFICACION DE PAGOS APORTES LEGALES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PEERSONAL DE INTERVENTORÍA Y OTROS, INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.6 JUNIO-48956 19/06/2019	COPEBA SAS
ADM-INV-825-2018-243	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORIA	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO-SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	15/10/2019	15/10/2019-87775	ENTREGA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	COPEBA SAS
SRT 42841	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRCETOR INTERVENTORIA	09/10/2019	16/10/2019	SOLICITUD VERIFICACION PAGOS APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA Y OTROS EN ONFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.7, radicado 75323 CON FECHA 09/09/2019	INVIAS BOGOTA
ADM-INV-825-2018-240	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS TERRITORIAL QUINDIO	09/10/2019	11/10/2019-86896	CORRECCION ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.7	COPEBA SAS
DT-QUI 43573	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	15/10/2019	16/10/2019	DEVOLUCIÓN INFORME Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA DEL MES DE AGOSTO, PARA QUE CONTINUE SU TRAMITE	INVIAS
DT-QUI 42872	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	09/10/2009	16/10/2019	DEVOLUCION DOCUMENTOS - ENTRADA No.83487 CON FECHA 02/10/2019	INVIAS
DT-QUI 42873	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	09/10/2019	16/10/2019	DEVOLUCION DOCUMENTOS - ENTRADA No.83481 CON FECHA 02/10/2019	INVIAS
DT-QUI 43550	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	15/10/2019	16/10/2019	DEVOLUCION DOCUMENTOS - ENTRADA No.86896 CON FECHA 11/10/2019	INVIAS
SMA 43102	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO-SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	10/10/2019	17/10/2019	PAGA V 6 -QUE LA INTERVENTORÍA SE PRONUNCIE EXPLICITAMENTE SOBRE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN O NO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS ENTREGADOS	INVIAS BOG
SRT 43643	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA - SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORIA	16/10/2019	18/10/2019	OBSERVACIONES INFORME Y ACTA DE COSTOS No.8	INVIAS BOG
SRT 43613	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA - SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORIA	16/10/2019	18/10/2019	OBSERVACIONES INFORME Y ACTA DE COSTOS No.9	INVIAS BOG
FNC-825-2018-180	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORIA	OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO-DIRECTOR OBRA	17/10/2019	18/10/2019-E1904414	REMISORIO PARA EL OFICIO INVIAS-825-2018-012-AM DEL ESPECILISTA AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA.DOCUMENTOS PARA CIERRE DEL BALANCE AMBIENTAL AL FINAL DEL CONTRATO	COPEBA SAS

ADM-INV-825-2018-047	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-REPRESENTANTE LEGAL COPEBA	OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO-DIRECTOR OBRA	15/10/2019	18/10/2019-E1904415	CORRECCION ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE LA No.6 A LA No.13 CON CERO DECIMALES	COPEBA SAS
ADM-INV-825-2018-247	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDRO PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	21/10/2019	21/10/2019-89704	RELACION OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019	COPEBA SAS
FNC-825-2018-181	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO -DIRECTOR OBRA	21/10/2019	21/10/2019-E1904434	CARACTERIZACIÓN VIAL Y ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD	COPEBA SAS
ADM-INV-825-2018-241	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS TERRITORIAL QUINDIO	09/10/2019	21/10/2019-89699	CORRECCIÓN FORMATO MINFRA-MN-IN-6-FR-1 PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL TRMO GENOVA-GUACAS PERIODO DE JULIO 2019	COPEBA SAS
SRT 44256	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA - SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	21/10/2019	23/10/2019	SOLICITUD VERIFICACION PAGOS APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA Y OTROS EN ONFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.10, radicado 75335 CON FECHA 09/09/2019	INVIAS BOGOTA
SRT 44249	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA - SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	21/10/2019	23/10/2019	SOLICITUD VERIFICACION PAGOS APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA Y OTROS EN ONFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.11, radicado 75338 CON FECHA 09/09/2020	INVIAS BOGOTA
SRT 44262	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA - SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	21/10/2019	23/10/2019	SOLICITUD VERIFICACION PAGOS APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA Y OTROS EN ONFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.12, radicado 77279 CON FECHA 13/09/2020	INVIAS BOGOTA
QDE19C01567	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	25/10/2019	25/10/2019	ENTREGA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	COMITE
FNC-825-2018-182	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	22/10/2019	24/10/2019-25/10/2019	ORDEN Y ADECUACIÓN A OBRAS TERMINADAS	COEPBA SAS
ADM-INV-825-218-250	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA - SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	28/10/2019	30/10/2019-92479	RELACION DE OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 21 DE 26 DE OCTUBRE DE 2019	COPEBA SAS
FORMATO MSOAMB-MN-IN-1-FR-2	CLAUDIA LORENA ZULUAGA - SOCIAL GÉNOVA	JHON CANO-ESPCILISTA AMBIENTAL INTERVENTORÍA	30/10/2019	30/10/2019	PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	COMITÉ
QDE19C01603	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	29/10/2019	31/10/2019	INTACION REUNION CIERRE DE PROYECTO	COMITÉ
ADM-INV-825-2018-254	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	30/10/2019	31/10/2019	ACTA DE MODIFICACIONES DE INTERVENTORÍA No.3	COPABA SAS
ADM-INV-825-2018-255	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	31/10/2019	31/10/2019-93066	ATENCION OFICIO SIT 42821 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL Y ACTAS DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.6 CORRESPÓNDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2019	COPEBA SAS
ADM-INV-825-2018-256	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	31/10/2019	31/10/2019-93069	ATENCION OFICIO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL Y ACTAS DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.7 CORRESPÓNDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2019	COPEBA SAS
ADM-INV-825-2018-257	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	31/10/2019	31/10/2019-93073	ATENCION OFICIO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL Y ACTAS DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.8 CORRESPÓNDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2019	COPEBA SAS
ADM-INV-825-2018-258	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	31/10/2019	31/10/2019-93075	ATENCION OFICIO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL Y ACTAS DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.9 CORRESPÓNDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2019	COPEBA SAS
ADM-INV-825-2018-259	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	31/10/2019	31/10/2019-93078	ATENCION OFICIO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL Y ACTAS DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.10 CORRESPÓNDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2019	COPEBA SAS
ADM-INV-825-2018-260	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	31/10/2019	31/10/2019-93080	ATENCION OFICIO OBSERVACIONES INFORME MENSUAL Y ACTAS DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.11 CORRESPÓNDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2020	COPEBA SAS
FNC-825-2018-183	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO -DIRECTOR OBRA	30/10/2019	31/10/219-E1904634	REMISORIO PARA EL OFICIO SOC-FNC-825-2018-022 DEL ESPECIALISTA SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA.APROBACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTO PAGA V6	COPEBA SAS
FNC-825-2018-184	JABIB ENRRIQUE CARRILLO DAZA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO -DIRECTOR OBRA	30/10/2019	31/10/2019-E1904635	ENTREGA PRE-ACTAS MENSUALES DE INVERSIÓN SOCIAL	COPEBA SAS

ANEXO 22. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION VIAS TERCIARIAS–QUINDIO
ANEXO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.15



Pijao, Placa huella terminada K12+400



Génova, Excavación filtro placa huella K22+340



Pijao, Recuperación cancha I E Juan XXIII K3+280



Génova, Piedra pegada K18+360



Pijao, Fundición Huellas K6+755



Génova, Fundición huellas y cunetas reforzadas K22+260

ANEXO 23. INFORMES ESPECIALISTAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
COPEBA LTDA – CONTRATO INTERVENTORIA 825 DE 2018	
INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°15	
Periodo: 08 Octubre - 07 Noviembre 2019	
Localización proyecto: Municipio de Píjao (Quindío).	Fecha elaboración: noviembre 08 de 2019.

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Realizar recorrido de obra en el área de influencia directa para la ejecución del contrato 498 de 2018 **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.".**
- Revisar en campo las áreas sensibles y las más vulnerables desde el punto de vista ambiental.
- Verificar in situ manejo y disposición de escombros, estado de drenajes y fuentes de agua, estado de campamentos y fuentes de materiales para la ejecución de la obra.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el desarrollo del presente contrato en materia ambiental.
- Verificar en campo las necesidades mínimas que debe cumplir el PAGA para su implementación durante la ejecución del presente contrato.

Principales Actividades realizadas por el Contratista e Interventoría:

- La interventoría realiza aprobación del documento PAGA Versión 4 presentado por el contratista para su implementación durante la ejecución del contrato y posterior cierre finalizadas las obras correspondientes al alcance de esta obra.

- Se realiza actualización del documento PAGA dando alcance a las observaciones realizadas por el INVIAS a través de la Subdirección de Medio Ambiente.

- Se realiza visita de campo los días 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2019 para revisar el estado de actividades de obra, haciendo recorrido para el tramo de Píjao y Génova respectivamente. Del mismo modo, para participar en la implementación del programa de "Escuelas verdes" para los dos municipios.

- Se realiza comité socio ambiental en conjunto entre contratista e interventoría para revisar los hallazgos encontrados en obra y que deben ser ajustados de acuerdo con lo establecido dentro del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA.

- Se solicita al contratista presentar los insumos para la presentación de los informes trimestrales que hacen parte de los compromisos adquiridos por el contratista e interventoría, durante la ejecución del presente contrato.

- El contratista radica los informes mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019, los cuales se encuentran aprobados por la interventoría.

- Con respecto al permiso de Ocupación de Cauce, el contratista manifiesta que la Autoridad Ambiental realizó la visita técnica al contrato el día 05 de agosto de 2019; quedando atentos al concepto técnico y posterior elaboración del Acto administrativo por parte del departamento jurídico de la CRQ; lo anterior. La Federación en el comité informa que el Acto Administrativo ya fue expedido por la CRQ, la interventoría está atenta a las obligaciones del contratista con el objeto de no dejar pasivos ambientales existentes una vez finalizado el contrato de obra.

- **Seguridad y Salud y Trabajo:**

Se solicita al contratista presentar la siguiente documentación para verificación por parte de la interventoría:

  - Exámenes de ingreso del personal en obra.
  - Pago de seguridad social desde el momento del ingreso a laborar y certificación del trabajador que se encuentra cotizando en riesgo cinco ante la ARL.
  - Indicar cuál es el personal que realiza trabajos en altura, presentando el curso que lo acredita para el desarrollo de esta actividad con su correspondiente vigencia.
  - Se solicita que el inspector de Seguridad se encuentre inspeccionando los frentes de trabajo periódicamente, revisando y aprobando los análisis de trabajo seguro.

- **Ambiental:**

  - **Solicitud predio para disposición de material de excavación y/o derrumbes:**

    El contratista manifiesta que después de analizar el estado del contrato y según a las abscisas donde se va a realizar intervención para ejecución de obra no es

viable tomar el predio "La Laguna" como punto para disposición para material de excavación por las distancias a recorrer dentro del tramo en ejecución y al estado actual de la vía.

Por lo anterior, se cancela esta solicitud, quedando únicamente el ZODME Machangara aprobado para la disposición de material de excavación.

- **Requerimientos legales:**

- **Permiso de Ocupación de Cauce:** La Autoridad Ambiental realizó la visita técnica al contrato el día 05 de agosto de 2019; quedando atentos al concepto técnico y posterior elaboración del Acto administrativo por parte del departamento jurídico de la CRQ.

  La interventoría aclara, que no se puede iniciar la construcción de las obras transversales hasta no contar con la expedición del permiso que avale su ejecución.

  El contratista informa en comité realizado el día 19 de agosto que el Acto Administrativo ya fue expedido por la CRQ.

- **Agua para uso industrial:** Presentar la certificación donde la Empresa de Servicios Públicos del Quindío autoriza a la federación la compra de agua en bloque antes de tratamiento, para la ejecución de las obras objeto del presente contrato.

  La Federación manifiesta que por temas administrativos al interior de la empresa de servicios públicos no fue posible realizar la gestión para obtener la certificación de venta de agua en boque para uso industrial para el presente contrato; sin embargo, se comprometieron a continuar con la gestión para legalizar el tema de la compra de agua para la ejecución de las obras que hacen parte del presente contrato. La interventoría reitera esta solicitud, para que sea entregada de forma inmediata.

- **Permiso de tala de árboles por riesgo de caída en temporada de lluvias:** La interventoría reitera al contratista presentar un informe de la gestión realizada ante la Secretaría de Agricultura del municipio de Génova (Quindío), haciendo acompañamiento al propietario de la finca ubicada en inmediaciones del PR 17+600 solicitando autorización para la tala de los árboles que se encuentran en riesgo de caída por los portes que tienen y por encontrarse ubicados en zonas de derrumbe y suelos saturados.

  La Federación presenta el informe de tala de los árboles que se encontraban en riesgo de caída y por ser actividades de emergencia, la Unidad de Gestión del

Riesgo del Municipio de Génova autorizo al dueño de la finca para realizar sus respectivos cortes y aprovechamiento por encontrarse dentro de su propiedad.

Además de lo anterior, se realiza un nuevo trámite ante la oficina de Gestión del riesgo del municipio de Génova para la tala de otro árbol ubicado en el PR 17 aproximadamente y que por fenómenos de reptación se desprendió quedando sujetado del árbol del frente, presentando un estado inminente de riesgo para los usuarios de la vía y comunidad que habita en los alrededores.

La visita se realizó por parte de los funcionarios de Gestión del riesgo la ultima semana de julio, donde se autorizó su correspondiente tala, teniendo en cuenta las condiciones presentadas. Esta autorización se presenta a nombre directo del propietario del predio, quién hace uso exclusivo de la madera aprovechada para fines domésticos exclusivamente.

- **Biodiversidad:**

- **Escuelas verdes:** De acuerdo con el apéndice ambiental del contrato, el contratista debe implementar el Programa de "Escuelas Verdes" la interventoría solicitó la presentación del Plan de Implementación para este programa para la escuela del municipio de Píjao como para la de Génova, haciendo la claridad que los recursos invertidos, hacen parte de la administración del contrato.

  La Federación manifiesta, estar realizando los contactos con la gobernación del Quindío para involucrar los niños en capacitaciones de sensibilización para el cuidado, ahorro y preservación del recurso hídrico; del mismo modo, se van a realizar actividades de siembra con los niños de las escuelas con el objeto de enseñarles a conservar los recursos naturales.

  A corte del presente informe, La Federación de Cafeteros en convenio con la Gobernación del Quindío iniciaron los talleres de conservación del recurso hídrico, quedando pendiente la siembra de los árboles en las entidades educativas.

- **Residuos sólidos:**

- **Brigada de orden y aseo**: La interventoría solicita la implementación de la brigada ambiental para el contrato, con el objeto de limpiar los frentes de obra que se encuentran finalizando obras, ya que se encuentran desechos de cajas de puntillas, madera que pone en riesgo la integridad física de los trabajadores por tener puntillas en sus extremos, entre otros.

  El contratista ha venido realizando las jornadas de limpieza en los frentes de obra, sin embargo, se solicita aislar y señalizar los materiales de construcción

ubicados en los frentes de obra, para minimizar el riesgo de accidentes con los usuarios de la vía.

- **Residuos peligrosos y/o especiales**: Se solicita presentar certificación de entrega de las bolsas de cemento que están quedando como residuos especiales como consecuencia de la ejecución de las obras de concreto.

  La Federación informa que está terminando el proceso de vinculación de la empresa Emdepsa quién va a ser la encargada de retirar las bolsas de cemento para disposición final, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos en materia ambiental para ejecutar esta actividad.

  La primera entrega de bolsas de cemento se realizó el día 03 de septiembre de 2019.

  La Federación entregó certificación expedida por la Asociación de volquetas, donde conste que las volquetas que envía al frente de obra cumplen con los documentos y mantenimientos preventivos y/o correctivos al día. Afiliaciones de seguridad social y pagos a la ARL conforme lo estipula la Ley para esa actividad.

➢ **Informes:**

- **Trimestral:** La interventoría solicita al contratista el diligenciamiento del formato del informe trimestral ambiental que se debe presentar en conjunto entre contratista e interventoría, para radicación ante la Subdirección de Medio Ambiente.

- **De Avance mensual:** Presentar informes de avance mensual, adjuntando soportes de cumplimiento que sirvan como herramienta para compilar el informe trimestral ambiental.

  La Federación envía los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019 para revisión por parte de la interventoría.

  La interventoría aprueba los informes mensuales presentados por el contratista, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019.

➢ **PAGA:**

Se radicó la actualización del PAGA para la ejecución del contrato. Complementando la información solicitada por el INVIAS mediante oficio SMA 18593 del 08 de mayo de 2019, incluyendo el permiso de Ocupación de Cauce y el certificado de agua para uso industrial.

- Se realiza comité ambiental el día 19 de septiembre de 2019 donde se realizan recomendaciones por parte de la interventoría, incluyendo temas ambientales de acuerdo con las condiciones físicas de terreno y el microclima presentado en el área de influencia directa del contrato.

Descripción de actividades del periodo:

Dentro del recorrido de obra se observó lo siguiente:

Se realiza recorrido de obra entre contratista, interventoría. Para verificar las actividades constructivas ejecutadas durante del contrato.

Se está realizando el acopio de bolsas de cemento para ser entregadas al gestor para disposición final.

	
Foto 1. Almacenamiento temporal de bolsas de cemento para disposición final.	Foto 2. Almacenamiento temporal de bolsas de cemento para disposición final.

Placa huella construida con cunetas y disipadores para el manejo de aguas de escorrentía.

	
Foto 3. Cunetas a ambos costados de la placa huella.	Foto 4. Disipador de energía para control de aguas lluvia para evitar socavamiento aguas abajo.

Almacenamiento de bolsas de cemento en bolsas plásticas para evitar daños por procesos meteorológicos, dentro del campamento provisional e instalación de baño móvil para los trabajadores que se encuentran en el frente de obra.



Foto 5. Almacenamiento temporal de bolsas de cemento en bolsas plásticas.



Foto 6. Instalación de baño móvil en frente de obra.

Implementación programa de "Escuelas verdes" municipio de Génova.



Foto 7. Charla realizada por los asesores de la Federación en el proceso de siembra e importancia del cuidado de los árboles.



Foto 8. Charla realizada por los asesores de la Federación en el proceso de siembra e importancia del cuidado de los árboles.



Foto 9. Explicación de las especies de árboles a sembrar en el entorno de la escuela.



Foto 10. Grupo de padres y alumnos que participaron en la siembra de los árboles.



Foto 11. Padres de familia realizando actividades de siembra.



Foto 12. Alumnos realizando actividades de siembra.



Foto 13. Explicación de las especies de árboles a sembrar en el entorno de la escuela



Foto 14. Explicación de las especies de árboles a sembrar en el entorno de la escuela.

	
Foto 15. Participación de los niños en el proceso de siembra de los árboles en el entorno de la escuela.	Foto 16. Participación de los niños en el proceso de siembra de los árboles en el entorno de la escuela.

CONCLUSIONES

- *PAGA.* La interventoría expide oficio INVIAS-825-2018 –008-AM con fecha 14 de febrero 2019, donde se aprueba el PAGA presentado por la Federación en su versión 4 para ser implementado durante la ejecución del presente contrato y posterior cierre una vez finalizadas las obras de construcción.

  Se radicó la actualización del PAGA para la ejecución del contrato. Complementando la información solicitada por el INVIAS mediante oficio SMA 18593 del 08 de mayo de 2019, incluyendo el permiso de Ocupación de Cauce y el certificado de agua para uso industrial.

- ***Permisos ambientales.*** El contratista informa a la interventoría sobre el trámite del permiso de Ocupación de Cauce, manifiestan haber realizado la radicación el día 21 de diciembre de 2018 ante la Corporación para dar inicio formal a la solicitud de este acto administrativo.

  La Corporación respondió a la Federación el día 4 de marzo de 2009, Donde solicitó adjuntar información en cuanto a los diseños para las obras que requieren Ocupación de Cauce, la Federación se encuentra compilando la información requerida por la CRQ Para su posterior radicación y continuación del trámite de presentarse acto administrativo.

  El contratista se compromete mediante comité socioambiental, a realizar la radicación de la información faltante para el día 04 de julio de 2019.

  La interventoría aclara que no se puede iniciar la construcción de las obras transversales que requieren Ocupación de Cauce, hasta no contar con el debido permiso emitido por la autoridad Ambiental.

  A corte del presente informe el Acto administrativo del permiso de Ocupación de Cauce se encuentra en el Departamento Jurídico de la CRQ, la interventoría está a la espera de la expedición del permiso, con el objeto de evidenciar la necesidad de iniciar actividades de compensación como consecuencia del otorgamiento del presente permiso.

  El 18 de septiembre de 2019 bajo resolución 2179 la CRQ expide el Acto Administrativo de Ocupación de Cauce.

  El permiso no solicita ningún tipo de compensación por el otorgamiento del Acto Administrativo.

El agua para uso industrial se compra a la Empresa de Servicios Públicos del municipio. La interventoría se encuentra atenta a la entrega del convenio realizado entre la Empresa de Servicios Públicos y la Federación para el suministro de agua para uso industrial.

- ***Transporte de Material.*** La Federación dio inicio al traslado de material pétreo a los frentes de obra para construcción de muros, filtros y obras transversales.

  Realizó el mantenimiento al sector denominado como "el verdal" punto crítico para el paso vehicular de las volquetas que transportan material pétreo para la ejecución de las obras.

- ***ZODMES.*** La Federación ya identifico un punto para disposición de material sobrante y/o escombros que se encuentra ubicado en el municipio e Quimbaya (Quindío) el cual cuenta con el permiso de la Alcaldía de Quimbaya y concepto de favorabilidad por parte de la Autoridad Ambiental para este uso.

- ***Manual de interventoría:*** La interventoría ha venido reiterando en los distintos comités socioambientales a entrega de los insumos para la elaboración de los informes trimestrales ambientales.

  A la fecha no se ha radicado ningún informe trimestral donde se evidencie la implementación del PAGA.

RECOMENDACIONES

- ***PAGA.*** Realizar inducción al personal de obra tanto administrativo como operativo sobre la implementación del PAGA durante la ejecución de las obras. Con el objeto de controlar y mitigar impactos que se puedan generar al ambiente y al entorno desde los componentes ambiental y social.

  Contar con un profesional ambiental al 100% dentro del contrato de obra que este pendiente de la implementación del PAGA y cree conciencia ambiental sobre los directos responsables de la ejecución de la obra, tanto en la parte administrativa como operativa del contrato.

  Crear la Brigada de orden aseo y limpieza para mantener organizado el frente de obra.

- ***Permisos ambientales.*** Hacer gestión ante la CRQ para dinamizar el proceso de obtención del permiso de Ocupación de Cauce; lo anterior, para poder ejecutar las

obras que requieren de legalización ante la Autoridad Ambiental del Departamento y conocer las posibles medidas compensatorias solicitadas por la Corporación ya que se deben ejecutar antes del plazo de terminación del presente contrato.

Una vez, finalizadas las obras que hacen parte del permiso se debe solicitar el cierre ya archivo del expediente del permiso de Ocupación de Cauce.

- ***Transporte de Material.*** La interventoría recomienda analizar puntos de acopio temporal de materiales de construcción debido a las condiciones del terreno y luego realizar trasiego de materiales en vehículos más pequeños que faciliten el acceso a los frentes de obra.

- ***ZODMES***. Verificar posibles puntos de disposición de material de excavación que se puedan legalizar para la ejecución del presente contrato.

  Realizar un buen manejo del material de excavación generado para evitar daños en los proyectos productivos que tienen las fincas que se encuentran en ambos costados de la vía, como son el café y el plátano.

- ***Manual de interventoría:*** Se recomienda al contratista entregar en la Brevedad posible los informes trimestrales para revisión y aprobación por parte de la interventoría; del mismo modo, se solicita se realice la entrega del cierre al balance ambiental del contrato para proceder a la expedición del paz y salvo de interventoría y posterior cierre al componente ambiental del presente contrato.

Ing. John Oswaldo Cano
Especialista Ambiental
Copeba Ltda.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA

INFORME DE LA GESTIÓN SOCIAL - FASE CONSTRUCTIVA

CONTRATO 0825 DE 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

COPEBA LTDA

INFORME DE OCTUBRE DE 2019

REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES

Fecha –Etapa	Elaboró
1 al 31 de octubre de 2019	
Versión 0	
Cargo	Profesional Social – Interventoría
Descripción	Elaboración del documento para revisión inicial

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. ETAPA PRELIMINAR 6
3.1 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 7
3.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 16
3.3 PROYECTO DEL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS 34
3.4 PROYECTO DE CULTURA VÍAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA38
3.5 PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 46
3.6 PROYECTOS PRODUCTIVOS 50
3.7 PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL 51
4 CONCLUSIONES 54

TABLAS

Tabla 1 Aprobaciones de documentos 6
Tabla 2 *Revisión al Documento Paga* 6
Tabla 3 Desarrollo de la Gestión Social en informes 7
Tabla 4 *Ubicación Punto SAU y Puntos Satélites de Información* 7
Tabla 5 Desarrollo de la Gestión Social SAU – PSI 9
Tabla 6 Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas – Pijao 9
Tabla 7 Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas – Génova 13
Tabla 8 Indicadores de Gestión 15
Tabla 9 *Control y Verificación por la Interventoría* 16
Tabla 10 Trazabilidad de las reuniones de inicio 17
Tabla 11 Consolidado de reuniones de Pijao 17
Tabla 12 Consolidado de reuniones de Génova 21
Tabla 13 Distribución de Piezas Comunicativas – Pijao 23
Tabla 14 Distribución de Piezas – Génova 27
Tabla 15 Desarrollo de la Gestión Social Información y Divulgación 30
Tabla 16 *Indicadores de Gestión* 32
Tabla 17 *Indicadores de Gestión* 32
Tabla 18 *Control y Verificación por la Interventoría* 33
Tabla 19 Entrega de copias de actas de vecindad 34
Tabla 20 Relación de Comunicados de actas de vecindad 34
Tabla 21 Actas de compromiso Pijao 34
Tabla 22 Actas de compromiso Génova 36
Tabla 23 Desarrollo de la Gestión Social Manejo de Predios y Servicios Públicos 37
Tabla 24 Indicadores de Gestión 37
Tabla 25 *Control y Verificación por la Interventoría* 37
Tabla 26 Talleres de Cultura Vial 38
Tabla 27 Comités de Participación Comunitaria 40
Tabla 28 Desarrollo de la Gestión Social Cultura Vial y Participación Comunitaria 44
Tabla 29 *Indicadores de Gestión* 45
Tabla 30 *Control y Verificación por la Interventoría* 45
Tabla 31 Contratación de la Mano de Obra 46
Tabla 32 Capacitación - Inducción 47
Tabla 33 Desarrollo de la Gestión Social Contratación de MONCL 49
Tabla 34 Indicadores de Gestión 49
Tabla 35 *Control y Verificación por la Interventoría* 49
Tabla 36 Proceso del Patrimonio Arqueológico y Cultural 51
Tabla 37 Desarrollo de la Gestión Social Patrimonio Arqueológico y Cultural 52
Tabla 38 Control y Verificación por la Interventoría 53

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de vías -INVIAS y COPEBA LTDA, interesados en involucrar la participación ciudadana en su proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Pijao y Génova en el Departamento de Quindío. Y permitiendo interactuar y participar activamente durante sus diferentes fases en el desarrollo del proyecto mejorando las condiciones físicas de los espacios que se encuentran en riesgo para la movilidad.

Así mismo, con la ejecución de acciones conjuntas, articuladas y sostenibles, se contribuye a complementar el desarrollo rural y urbano, buscando mejorar la relación existente entre las personas y su territorio estimulando la consolidación de una cultura, permitiendo a las comunidades reconocerse como actores de cambio social y gestores de su propio desarrollo, bajo condiciones de dignidad y garantía de sus derechos ciudadanos relacionados con el bienestar colectivo. Es por esto que por medio de este proyecto, se lograra establecer condiciones favorables a futuro y a su vez pueda mejorar la movilidad propiciando mayor accesibilidad, conectividad, alternativas comerciales y económicas para los municipios.

Por lo tanto, en el cumplimiento de las acciones y en brindar la información del seguimiento y acompañamiento social, se realiza el informe de consolidación y verificación de las acciones de efectuadas por el contratista y supervisada por la interventoría social del CONTRATO 0825 DE 2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Dado cumplimiento de las actividades del "Apéndice E Obligaciones de Gestión Social" enmarcada dentro de las disposiciones de los Pliegos de Condiciones y los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría, describiendo en forma concisa todos los aspectos relevantes del contrato, evidenciando el estado de evaluación del Contratista FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA se realiza este informe.

NJGL-Nury García López - Profesional Social. - Email: interventoriasocial0825@gmail.com

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Acompañamiento y verificación de las actividades desarrolladas, propuestas y ejecutadas por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, mediante el Comité de Cafeteros del Quindío, respondiendo a criterios de calidad, eficiencia y oportunidad con resultados, proporcionando la información pertinente en el manejo de los impactos sociales en la ejecución del presente proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la gestión realizada por el cumplimiento del proyecto de atención a la comunidad en el Punto SAU y atenciones ciudadanas, durante el desarrollo del contrato de los municipios de Pijao y Génova.

- Verificar la gestión ejecutada por el contratista frente al cumplimento del proyecto de información y divulgación durante las diferentes fases de ejecución, durante el desarrollo del contrato.

- Verificar el desarrollo del proyecto del manejo de la Infraestructura a predios y servicios públicos en el acompañamiento a las actividades técnicas, durante el levantamiento de las actas de vecindad de inicio, elaboración de los registros fotográficos, fílmicos de las vías y las actas de compromiso con la comunidad en el desarrollo del contrato.

- Verificar las acciones para el proyecto de recuperación al derecho de vía.

- Verificar la gestión por el contratista frente al desarrollo de proyecto de Cultura vial y la participación ciudadana durante el desarrollo del contrato.

- Verificar la gestión en la recepción y del proyecto de Contratación de la Mano de Obra No Calificada Local y población vulnerable en los municipios de Pijao y Génova

- Acompañar según concepto del ICANH las acciones a efectuar de posibles hallazgos arqueológicos.

3. ETAPA PRELIMINAR

El documento PAGA, tuvo observaciones emitidas por parte del INVIAS, mediante el comunicado SMA 18593 emitido el 8 de mayo y recibido el 15 de mayo de 2019.

Tabla 1 ***Aprobaciones de documentos***

Fecha	Observaciones	Aprobación/ revisión
25 de septiembre de 2018	Plantillas y aprobación de formatos	QER18CO1219
2 de octubre de 2018	Aprobación formatos y plantillas	Correo electrónico
8 de mayo de 2019	Actualización del documento PAGA	SMA 18593
10 de octubre de 2019	Actualización del documento PAGA	SMA 43102

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 2 ***Revisión al Documento Paga***

Fecha	Versión	Observaciones	Aprobación/ revisión
10 de septiembre de 2018	0	SOC.FNC-825-2018-001	Revisión
2 de octubre de 2018	1	QER18C01239	Revisión
11 de octubre de 2018	1	Mesa de trabajo	Revisión y ajustes
24 de octubre de 2018	2	QER18C01397	Revisión
1 de noviembre de 2018	3	SOC-FNC-825-2018-002	Aprobación del Capítulo de Gestión Social Paga V3 (Pendiente ajuste presupuesto)
11 de febrero de 2019	4	ADM-INV-825-2018-101	Aprobación interventoría y radicación al INVIAS
8 de mayo de 2019	1	SMA 18593	Observaciones del documento PAGA por parte de la SMA

6 de junio de 2019	2	SMA 25760	Actualización al documento PAGA – con ajuste de las observaciones emitidas por la SMA.
2 de octubre de 2019	6	SMA 41447	Actualización del PAGA
4 de octubre de 2019	V6	SMA 84689	Actualización del PAGA- V6

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 3 *Desarrollo de la Gestión Social en informes*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentan atrasos.	El contratista aporto los insumos necesarios para la elaboración del informe correspondiente al mes de octubre de 2019.	Se revisaron y firmaron los soportes.

Elaborado COPEBA LTDA

3.1 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

- **Punto SAU**

  La interventoría verificó que para el mes de octubre de 2019, se presentó atención en las oficinas de los puntos SAU, que se encuentran en los Municipios de Pijao y Génova, se continúa con la permanencia y actualización de los Puntos Satélites de Información con sus respectivos buzones:

1. Pijao – Fonda los Chorros
2. Génova - Casa lote el Mirador en la vía alto de Guascas Génova

Tabla 4 *Ubicación Punto SAU y Puntos Satélites de Información*

Municipio de Pijao	
Punto SAU	**Ubicación**
Punto SAU- Oficina del Comité de Cafeteros- implementación del punto SAU móvil	Carrera 5 N 11 – 36 Piso 2 **Horario de atención** Miércoles: 2:00 pm a 5:00 pm Jueves: 8:00 a.m. a 12 m Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m

	 Desmonte de valla 6 de noviembre de 2019
Puntos Satélites - Fonda la Chorros	**PSI Comité de Cafeteros Pijao**
Se desmonta el 15 de octubre de 2019	Desmonte del Punto Sátelite de Información 6 de noviembre de 2019
Municipio de Génova	
Punto SAU	**Ubicación**
Punto SAU- Oficina del Comité de Cafeteros- implementación del punto SAU móvil	Calle 26 N 12 – 23 Piso 2 **Horario de atención** Miércoles: 2:00 pm a 5:30 pm Jueves: 2:00 p.m. a 5:30 pm Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 m
Desmonte 7 de noviembre de 2019	
Punto Satélite- Casa Lote el Mirador en la vía alto de Guascas Génova	
30 de octubre de 2019 se desmonto	

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 5 Desarrollo de la Gestión Social SAU – PSI

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se han cerrado la totalidad de las PQRS que se encuentran abiertas,por lo tanto el contratista continua presentado incumplimientos.	En la reunión de finalización se dio atención a las PQRS	El contratista informa que dio inicio al desmonte de las PSI en el sector de Pijao

Tabla 6 *Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas* – Pijao

No	Tipología	Fecha	Peticionario	Ubicación	Observación	Estado
1	Solicitud (traslado por competencia de la Secretaría de Aguas e Infraestructura Rad. 28513)	26 de noviembre de 2018 27 de diciembre de 2018	Arley Arias	Finca el Jardín de los Cerezos, Vereda la Maicena	Revisar algunos PR de obras transversales y su diseño constructivo	**Abierta** Visita el 29 de diciembre de 2018.
2	Reclamación	22 de enero de 2019	Hugo Hernán Murcia	Calle 13 # 3 -11	Adecuar el espacio y delimitar la zona de acopio de materiales de la zona de juegos y de permanencia de los niños.	**Cerrada** (28/01/2019) Se adecuo el espacio y por parte de la Alcaldía municipal se autorizó el uso del servicio de energía.

3	Queja	5 de febrero de 2019 |	Marco Álvarez	Correo electrónico	Inconformidad por el cierre total de vía puente tabla	**Cerrada** (8 de febrero de 2019 – respuesta correo electrónico) Se aclaró que por las intervenciones a realizar solo se podía realizar adecuaciones para el paso peatonal y las alternativas de transporte.
4	Solicitud	8 de abril de 2019	María Inés Mejía Gómez	Carrera 5 # 13- 42 finca Baltimore	Afectaciones a los cafetales y compensación por los daños causados por la obra	**Cerrada** El 6 de septiembre de 2019 la señora María Inés Mejía, firmo a satisfacción del ciudadano.
5	Queja	29 de mayo de 2019	José Miguel Ramírez	Calle 5 M2 – 2	Pago de salario – celador del K 13+000 por $1.400.000	**Abierta** Fue cancelada, falta paz y salvo por el trabajador para hacer su respectivo cierre.
6	Queja	29 de mayo de 2019	Orlando Meza	Calle 13 # 7 -18	Pago por concepto de transportes	**Abierta** Fue cancelada,

					$1.000.000	falta paz y salvo por el peticionario para hacer su respectivo cierre.
7	Solicitud	12 de julio de 2019	Juan Pino Sánchez	Armenia	Requerimiento de información del K 12+370 continuación de las obras	**Cerrada** Se estableció comunicación telefónica al 3167966737. Para dar la aclaración respecto a los alcances de la obra.
8	Solicitud	12 de julio de 2019	Jesús Aurelio Jiménez	Vereda Topacia	Oportunidad laboral como cadenero	**Cerrada** Se establece comunicación telefónica al 3112436371. No se requiere el personal por culminación de las obras.
9	Solicitud	18 de julio de 2019	Silvio Cortez	Finca el Vergel	Alcantarilla que colapso por paso de volquetas.	**Cerrada** Se dio aprobación de los recursos por parte del INVIAS. Se está ejecutando la obra.

10	Solicitud	19 de julio de 2019	Julián Alberto Mahecha	Finca la Estrella – Vereda Puente Tabla	Planilla de pagos a la seguridad social	**Cerrada** Se hace entrega de las planillas al peticionario
11	Solicitud	1 de agosto de 2019	Lilian Lorena Franco	Escuela la Laguna	Solicitud de información alcantarilla K14 + 580	**Cerrada** La alcantarilla en el K14 + 580 se construyó por priorización de la estabilización de las obras
12	Solicitud	20 de septiembre de 2019	Aguirre Yepez	Finca la Cascada y comunidad la Maizena	Transporte y trasbordo por cierres de las partidas del Sinabrio	**Cerrada** 21 de septiembre de 2019

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 7 Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas – Génova

N°	Tipología	Fecha	Peticionario	Ubicación	Observación	Estado
1	Queja	28 de febrero de 2019	Alber Toro	Finca el Jazmín	Daños en columna de concreto de acceso a la finca, parqueadero, cerco y pintura en el zócalo de la vivienda. Visita el 29 de julio de 2019 se verifica el estado de los daños con el compromiso de repararlos una vez se terminen las labores. El 30 de septiembre de 2019 la puerta y la columna se repararon por parte del contratista	**Abierta** El 8 de marzo de 2019 nuevamente realiza petición estableciendo compromiso de reparación de los dos de su predio.
2	Petición	22 de marzo de 2019	Jhonatan David Montenegro	Barrio la Isla	Pago de liquidación $270.324	**Cerrada** Julio 16 de 2019
3	Queja	12 de marzo de 2019	Andréi Alexis Hortua	Barrio el porvenir	desvinculación laboral	**Cerrada** Se contacta al señor Andrei Hortua quien luego de expresar su inconformidad acepta el

						cierre de la PQRS.
4	Queja	22 de marzo de 2019	Jhonatan Montenegro	Barrio la Isla	desvinculación laboral	**Cerrada** Septiembre de 2019
5	Solicitud	23 de abril de 2019	Leonardo Ruiz	Vereda el Recreo	Arreglo de suiche, afectación a esquina del cuarto donde se corta el acero. El 31 de julio de 2019 se verifica, sin embargo como continúan los trabajos se restablecerá el daño al terminar dicha labor.	**Abierta**
6	Solicitud	10 de mayo de 2019	Personería – Héctor Fabio Londoño Téllez	Tramo Génova	Solicitud de información por la afectación física del puente Tamborales (Pendiente trámite al DNP)	**Cerrada** El 5, 6 y 23 de agosto de 2019 se radicaron oficios al consejo municipal, personería y planeación.
7	Queja	14 de mayo de 2019	Trabajadores de la obra	Tramo Génova	Incumplimiento al pago de salarios El 30 de julio de 2019 se confirma con los trabajadores el pago de los	**Cerrada** Se aportan los paz y salvos en el mes de octubre para hacer el respectivo

					salarios. a los que continúan sus trabajos con la FNC	trámite.
8	Queja	2 de septiembre de 2019	Gladys Arango Patiño	Finca la Siberia	Arreglo de columna y puerta principal	**Cerrada** 30 de septiembre de 2019
9	Reclamación	30 de septiembre de 2019	Benjamín Campuzano	Tramo Génova	Realizar limpieza y material de la finca la Laguna 1 Rollo de alambre de Pua por afectación a la cerca	**Abierta**

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 8 Indicadores de Gestión

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de manifestaciones abiertas en el mes Pijao = Número de manifestaciones presentadas en en Pijao =	3/12*100% =25%

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de manifestaciones abiertas en el mes en Génova= Número de manifestaciones presentadas en el mes en Génova =	3/9*100% =33%

Tabla 9 ***Control y Verificación por la Interventoría***

Control	Etapa	Verificación
Se verificaron las actividades adelantadas por el contratista del cumplimiento contractual.	Etapa Preliminar	4 y 5 de diciembre de 2018
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa Preliminar	Mes de diciembre de 2018.
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	22 y 23 de enero de 2019
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	27,28 y 29 de marzo de 2019
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	23, 24 y 25 de abril de 2019
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	22, 23 y 24 de mayo de 2019
Verificación de documentos y actividades, actualización de PSI	Etapa constructiva	17,18,19,20 y 21 de junio de 2019
Verificación de documentos y actividades, actualización de PSI	Etapa constructiva	8 y 9 de julio de 2019
Verificación de documentos y actividades, actualización de PSI	Etapa constructiva	8 y 9 de agosto de 2019
Verificación de documentos y actividades, actualización de PSI	Etapa constructiva	septiembre de 2019
Verificación de documentos y actividades, actualización de PSI	Etapa constructiva	octubre de 2019

3.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

La interventoría verifica el cumplimiento del proyecto en los municipios de Pijao y Génova en la implementación de las estrategias contractuales de información y divulgación, el contratista programó para el 2 de noviembre de 2019

Tabla 10 Trazabilidad de las reuniones de inicio

Fecha	Actividad
24 de octubre de 2018	Correo electrónico de la interventoría de los requerimientos para la reunión de inicio
3 de noviembre de 2018	Respuesta a correo electrónico del 24 de octubre de 2018 – reunión de inicio, adjunto cuña radial, invitación entidades y volante de convocatoria.
4 de noviembre de 2018	Presentación de inicio por parte del contratista.
6 de noviembre de 2018	Comunicado del contratista, respecto a las observaciones emitidas para la reunión de inicio
6 de noviembre de 2018	Respuesta ADM-FNC-825-2018-016 Observaciones a la revisión de actividades de las reuniones de inicio.
6 de noviembre de 2018	Entrega de documentos corregidos, invitación a entidades, cuña radial, volantes de Pijao.
Reunión de finalización	
29 y 30 de octubre de 2019	Se revisó y aprobó volantes y cartas a entidades para los tramos de Pijao y Génova contando con la debida aprobación.
31 y 1 de octubre de 2019	Se revisó la presentación y conto con la aprobación por parte de la interventoría.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 11 Consolidado de reuniones de Pijao

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
1	Inicio Etapa preliminar	Reunión de inicio	Quindío/ Pijao	10 de noviembre de 2018	106	10	Desarrollada en el comité de cafeteros del municipio de Pijao
2	Reunión extraordinaria	Solicitud ubicación PSI y el buzón	Quindío/ Pijao	14 de noviembre de 2018	2	1	Finca Los Chorros (propietaria Ruby Palechor)

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
3	Reunión extraordinaria	Socialización de los cierres viales	Quindío/ Pijao	11 de enero de 2019	2	1	Gerente de Empresa de Transporte de Pijao, (Juan Carlos Cañon) COOTRANSPIBU
4	Reunión extraordinaria	Establecer alternativas que mitiguen el impacto de la movilidad en los cierres programados del 11 al 13 de febrero 2019	Quindío/ Pijao	09 de febrero de 2019	1	3	Alternativas de movilidad
5	Reunión extraordinaria	Socialización concejo municipal	Quindío/ Pijao	15 de febrero de 2019	11	2	Citación al concejo municipal, para presentar avances de la obra.
6	Reunión extraordinaria	Socialización de la construcción de la caja de inspección	Quindío/ Pijao	30 de abril de 2019	1	1	Propietaria de la finca Baltimore por la afectación considerable de los cafetales, no

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
							permite que la obra ingrese a su propiedad privada.
7	Reunión extraordinaria	Reunión avance de la obra	Quindío/ Pijao	5 de julio de 2019	9	2	Padres de familia del centro educativo Juan XXIII y residentes del sector y socialización del cierre de la vía.
8	Reunión extraordinaria	Reunión de avance de la obra	Quindío/ Pijao	5 de julio de 2019	5	2	Padres de familia del centro educativo la Maizena y residentes del sector y socialización del cierre de la vía.
9	Reunión extraordinaria	Reunión con la empresa Cootraspibu	Quindío/ Pijao	16 de julio de 2019	1	2	Cierres emitidos en los volantes # 14 y # 15 para establecer estrategias por el impacto de la movilidad.

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
10	Reunión extraordinaria	Reunión con la empresa Cootraspibu	Quindío/ Pijao	1 de agosto de 2019	2	4	Alternativas de movilidad para el sector de la Maizena por cierre de vía.
11	Reunión extraordinaria	Reunión con el Departamento Nacional de Planeación	Quindío/ Pijao	8 de agosto de 2019	20	14	Escuela 7 de agosto de 2019 , Ejercicio de control social
12	Reunión extraordinaria	Reunión Gerencia de Coontranspibu	Quindío/ Pijao	10 de septiembre de 2019	1	1	Información del cierre total vial en el sector del Sinabrio
13	Reunión extraordinaria	Reunión contrasportador	Quindío/ Pijao	24 de septiembre de 2019	1	2	Acuerdo de los trasportadores para el transbordo
14	Reunión de finalización	Reunión de finalización de contrato	Quindío/ Pijao	2 de octubre de 2019	37	7	Ejecución de compromisos de finalización de contrato





Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 12 Consolidado de reuniones de Génova

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
1	Inicio Etapa preliminar	Reunión de inicio	Quindío/ Génova	10 de noviembre de 2018	36	16	Efectuada en el comité de cafeteros del municipio de Génova
2	Reunión extraordinaria	Socialización concejo municipal	Quindío/ Génova	12 de febrero de 2019	21	3	Citación al concejo municipal, para presentar avances de la obra.
3	Reunión extraordinaria	Socialización de la construcción de alcantarilla dentro del predio Baltimore	Quindío/ Génova	30 de abril de 2019	1	1	Solicitud de permiso para la adecuación de la alcantarilla dentro del predio Baltimore.
4	Reunión extraordinaria	Cierre de vía	Quindío/ Génova	23 de noviembre de 2019	2	1	Alternativas cierre de vía
5	Reunión extraordinaria	Negociación de trasbordos	Quindío/ Génova	24 de noviembre de 2019	3	1	Negociación del trasbordo de la comunidad

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
6	Reunión de finalización	Reunión de finalización de contrato	Quindío/ Génova	2 de octubre de 2019	40	2	Ejecución de compromisos de finalización de contrato

Elaborado COPEBA LTDA

Divulgación:

Para el municipio de Pijao, se revisó y aprobó las siguientes piezas informativas:

- Volante N° 20: el 7 de octubre de 2019, cierre total de la vía en el Km 14+580, entrada la escuela la Laguna a partir del 9 hasta el 10 de octubre 2019.

- Volante N° 21: el 16 de octubre de 2019, cierre total de la vía en el Km 3+800 y 500 metros después de la escuela Juan XXIII, sector puente tabla a partir del 18 de octubre de 2019.

Para el municipio de Génova se revisó la siguiente pieza informativa:

- Volante N° 11: el 22 de octubre de 2019, sector entrada Finca La Laguna K19+413, se va instalar tubería, los días 24 y 25 de Octubre de 2019.
- Sector Venecia K22+231, se va hacer 100 metros de placa huella y 2 alcantarillas, a partir del 28 de Octubre hasta el 7 de Noviembre de 2019.
- Sector Recreo bajo Finca El Provenir K23+755, se va hacer 55 metros de placa huella, desde el 28 de Octubre hasta el 7 de Noviembre de 2019.

- Volante N° 12: el 22 de octubre de 2019, invitación de la reunión de finalización y cartas de invitación a entidades municipales.

NJGL-Nury García López - Profesional Social. - Email: interventoriasocial0825@gmail.com

Tabla 13 Distribución de Piezas Comunicativas – Pijao

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
Etapa Preliminar 1 al 31 de octubre de 2018					
1	**Comunicado 01** Levantamiento de actas de vecindad	Quindío/ Pijao	9 de octubre de 2018	39	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Pijao.
2	**Comunicado 02** Invitación a reuniones de inicio	Quindío/ Pijao	6 de noviembre de 2018	55	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Pijao.
3	**Invitación a entidades municipales de Pijao**	Quindío/ Pijao	6 de noviembre de 2018	15	INVIAS, Gobernación del Quindío, Alcaldía Local, Secretaría Gobierno, Secretaría Departamental, enlace municipal de víctimas, concejo municipal, Personería, Parroquia.
4	**Comunicado 03** Cierre vial	Quindío/ Pijao	28 de diciembre de 2018	46	Se distribuyó en el AID y las empresas de transporte
5	**Comunicado 04** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	09 de enero de 2019	42	Distribución en el AID y las empresas de transporte

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
6	**Comunicado 05** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	25 de enero de 2019	61	Divulgación y distribución al AID, padres de familia y las empresas de transporte
7	**Comunicado 06** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	8 de febrero de 2019	64	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte.
8	**Comunicado 07** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	15 de febrero de 2019	38	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
9	**Comunicado 08** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	2 de marzo de 2019	25	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
10	**Comunicado 09** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	9 de marzo de 2019	33	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte cierre desde el 12 de marzo al 12 de mayo de 2019

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
11	**Comunicado 10** Cierre restringido de la vial	Quindío/ Pijao	17 de abril de 2019	10	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte cierre desde el 12 de marzo al 12 de mayo de 2019
12	**Comunicado 11** Cierre restringido de la vial	Quindío/ Pijao	30 de abril de 2019	36	Personería, planeación distribución al AID, empresas de transporte, concejo municipal.
13	**Comunicado 12** Cierre restringido de la vial	Quindío/ Pijao	8 al 10 de mayo de 2019	46	Personería, planeación distribución al AID, empresas de transporte, policía, cuerpo de bomberos
14	**Comunicado 13** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	17 de mayo de 2019	75	Personería, planeación distribución al AID, empresas de transporte, policía, cuerpo de bomberos, oficina de la gestión del riesgo,
Periodo del 1 al 31 de julio de 2019					
15	**Comunicado 14** Continuación cierre de vía	Quindío/ Pijao	5 de julio de 2019	25	Divulgación y distribución al AID y empresas de transporte
16	**Comunicado 15** Cierre de vía	Quindío/ Pijao	11de julio de 2019	17	Divulgación y distribución al AID y empresas de transporte

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
17	**Comunicado 16** Cierre de vía	Quindío/ Pijao	26 de julio de 2019	40	Divulgación y distribución al AID y empresas de transporte
Periodo del 1 al 31 de agosto de 2019					
18	**Comunicado 17** Cierre total de la vía	Quindío/ Pijao	28 de agosto de 2019	41	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte, planeación , personería
Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2019					
19	**Comunicado 18** Cierre total de la vía	Quindío/ Pijao	04 de septiembre de 2019	30	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte, planeación, personería
20	**Comunicado 19** Cierre total de la vía	Quindío/ Pijao	12 de septiembre de 2019	44	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte, centros educativos, planeación, personería
Periodo del 1 al 31 de octubre de 2019					
21	**Comunicado 20** Cierre total de la vía	Quindío/ Pijao	7 de octubre de 2019	35	Empresas de transporte, administradora planeación, personería y whatsapp con el AID
22	**Comunicado 21** Cierre total de la vía	Quindío/ Pijao	16 de octubre de 2019	45	Empresas de transporte, administradora planeación, personería y whatsapp con el AID

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
23	**Comunicado 22** Reunión de cierre	Quindío/ Pijao	29 de octubre de 2019	84	Empresas de transporte, administradora planeación, personería y whatsapp con el AID
24	**Cartas a entidades**	Quindío/ Pijao	29 de octubre de 2019	15	COOTRASPIBU; asuntos de gobierno; personería; interventoría; Alcaldía Municipal Pijao; enlace víctimas; planeación; parroquia; Concejo; territorial INVIAS; Bomberos; defensa civil; cruz roja; Comando de Policía; Hospital Santa Ana.

Tabla 14 Distribución de Piezas – Génova

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
Etapa Preliminar 1 al 31 de octubre de 2018					
1	**Comunicado 01** Levantamiento de actas de vecindad	Quindío/ Génova	12 de octubre de 2018	11	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Génova

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
2	**Invitación a entidades municipales de Génova**	Quindío/ Génova	6 de noviembre de 2018	15	Invitaciones a las entidades: Alcaldía Local, Secretaría Gobierno y desarrollo social, planeación, enlace municipal de víctimas, concejo municipal, Personería, Bomberos, Hospital San Vicente de Paul, Comando de policía, Instituciones educativas, Parroquia, defensa civil, trasportadores.
3	**Comunicado 02** Invitación a reuniones de inicio	Quindío/ Génova	6 y 8 de noviembre de 2018	75	Se distribuyeron en el Área de Influencia Directa
4	**Cuña radial**	Quindío/ Génova	6 al 10 de noviembre de 2018	30	Se emitieron 30 cuñas radiales en la emisora manantial 93.1 f.m en los siguientes horarios: 8 a.m, hasta las 6 pm cada hora.
5	**Comunicado 03** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	18,19,20,25 y 26 de febrero de 2019	26	Volantes y actas de socialización del cierre

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
6	**Comunicado 04** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	21 y 22 de marzo de 2019	24	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
7	**Comunicado 05** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	30 de marzo de 2019	37	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
8	**Comunicado 06** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	23 de abril de 2019	35	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
9	**Comunicado 07** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	4 de mayo de 2019	21	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
10	**Comunicado 08** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	10 de mayo de 2019	14	Divulgación y distribución al AID y empresas de transporte
Periodo del 1 al 31 de julio de 2019					
11	**Comunicado 9** Cierre total de la vía	Quindío/ Génova	16 de julio de 2019	27	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte y centros educativos.
Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2019					

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
12	**Comunicado 10** Cierre total de la vía	Quindío/ Génova	04 septiembre de 2019	21	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte y centros.
Periodo del 1 al 31 de octubre de 2019					
13	**Comunicado 11** Cierre total de la vía	Quindío/ Génova	22 de octubre de 2019	50	Divulgación y distribución al AID
14	**Comunicado 12** Reunión de finalización	Quindío/ Génova	29 de octubre de 2019	65	Divulgación y distribución al AID, personería, veeduría y emisora
15	**Cartas a entidades**	Quindío/ Génova	1 de noviembre de 2019	14	Instituciones educativas, parroquia San José; Hospital San Vicente de Paul; personería, cuerpo de Bomberos; defensa civil; comando de policía; Cootragen;Concejo Municipal; planeación; Alcalde Municipal; enlace de víctimas.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 15 Desarrollo de la Gestión Social Información y Divulgación

Atrasos	Adelantos	Eventualidades

No se presentaron	Tramo de Pijao, se distribuyó para los cierres viales en las zonas de intervención se distribuyeron los volantes N° 20,21 y el volante N° 22 de reunión de finalización aprobados por la interventoría Municipio de Génova se realizó la distribución del volante N° 11 cierre de vía y volante 12 reunión de finalización.	No se presentaron

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 16 ***Indicadores de Gestión***

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de reuniones desarrolladas en el mes en Pijao / Número de reuniones programadas en el mes Pijao =	1/1*100% =100%
Productividad	Total de comunicados distribuidos en el periodo en Pijao = / Total de comunicados propuestos para el periodo en Pijao	164/164*100%=100%

Tabla 17 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de reuniones desarrolladas en el mes en Génova / Número de reuniones programadas en el mes en Génova =	1/1*100% =100%
Productividad	Total de comunicados distribuidos en el periodo en Génova / Total de comunicados propuestos para el periodo en Génova	129/129 *100%=0%

Tabla 18 ***Control y Verificación por la Interventoría***

Control	Etapa	Verificación
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 3 cierre de la vía	Etapa Preliminar e inicio de obra	Diciembre de 2018
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 4 y 5 del cierre total de la vía	Etapa constructiva	Enero de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 6,y 7 del cierre total de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 3 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 8 y 9 del cierre total de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 4 y 5 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Marzo de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 10 y 11 del cierre de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 6 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Abril de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 12 y 13 del cierre de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 7 y 8 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Mayo de 2019
No se registraron actividades para el mes de junio de 2019		
Se verificó planillas de distribución de entrega de los volantes N° 14, 15 y 16 del cierre de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 9 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Julio de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de los volantes N° 17 del cierre de la vía para el municipio de Pijao	Etapa constructiva	Agosto
Se verificó planillas de distribución de entrega de los volantes N° 18 y 19 del cierre de la vía para el municipio de Pijao	Etapa constructiva	Septiembre
Se verificó planillas de distribución de entrega de los volantes N° 20,21y 22 del cierre de la vía y reunión de finalización.	Etapa constructiva	Octubre

3.3 PROYECTO DEL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS

Para el mes de octubre de 2019 no se adelantaron actividades para este proyecto:

Tabla 19 Entrega de copias de actas de vecindad

Fecha	Municipio	Total
1 de febrero de 2019	Pijao	4
febrero de 2019	Génova	17
Julio de 2019	Pijao	10

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 20 Relación de Comunicados de actas de vecindad

Fecha	Comunicado	Actividad
2 de octubre de 2018	QER18C01248	Inicio a la elaboración de actas de vecindad iniciales del 4 de octubre al 3 de noviembre de 2018
9 de octubre de 2018	QDS18C01288	Inicio a la elaboración de actas de vecindad iniciales a partir del 9 de octubre de 2018 desde el k 0 hasta el k 24.9
9 de enero de 2019	SOC-FNC-825-2018-004	Observaciones de actas de vecindad.
26 de enero de 2019	SOC-FNC-825-2018-006	Aprobación actas de vecindad del municipio de Pijao
Se entregaron en original a la profesional social de Génova		Aprobación actas de vecindad del municipio de Génova

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 21 Actas de compromiso Pijao

N°	Fecha	Municipio	Delegado/Ubicación	Actividad
1	16 de noviembre de 2018	Quindío/ Pijao	Luz Albeniz Ortiz Prieto / Escuela Juan XXIII	Permiso de acopio de materiales
2	16 de	Quindío/	Arley Arias Zuleta/Finca	Permiso de acopio de

	noviembre de 2018	Pijao	Los Cerezos	materiales
3	16 de noviembre de 2018	Quindío/ Pijao	José Orego Espinoza/ Finca el Pacifico – Vereda la Maicena	Permiso de acopio de materiales
4	16 de enero de 2019	Quindío/ Pijao	Dubian Alberto Henao/ Lote inicio de la obra finca la Laguna	Permiso de acopio de materiales
5	8 de febrero de 2019	Quindío/ Pijao	Florentino Collazos Rodríguez/ acopio de materiales en la escuela la Maizena	Permiso de acopio de maquinaria y materiales
6	16 de febrero de 2019	Quindío/ Pijao	Familia Gil – propietarios de las fincas el tabor, el pacífico, el encanto	Permiso para verificación de estudios técnicos en revisión de talud del margen IZ para la viabilidad de ampliación de la vía.
7	7 de marzo de 2019	Quindío/ Pijao	Dubián Alberto Henao Henao	Autorización para el tránsito vehicular de automotores por la vía interna de la finca la laguna
8	7 de marzo de 2019	Quindío/ Pijao	Dubián Alberto Henao Henao	Permiso para utilizar la bodega ubicada frente de la casa principal de la finca la laguna
9	3 de junio de 2019	Quindío/ Pijao	Hugo Hernán Murcia	Restablecimiento de daños por acopio de materiales.
10	22 de julio de 2019	Quindío/ Pijao	Ernesto Gómez	Autorización de intervención de los escoles dentro de la finca Baltimore Km 7+380
11	28 de agosto de 2019	Quindío/ Pijao	Luz Albeniz	Entrega de dos tejas del salón en la Institución Educativa Juan XXIII

12	17 de septiembre de 2019	Quindío/ Pijao	María Inés Mejía de Gómez	Permiso de acopio de material finca el Recuerdo
13	18 de septiembre de 2019	Quindío/ Pijao	Gustavo Orozco Toro	Permiso de acopio de material finca Buenos Aires

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 22 Actas de compromiso Génova

N°	Fecha	Municipio	Delegado/Ubicación	Actividad
1	23 de noviembre de 2018	Quindío/ Génova	Amanda Moncada García / Casa Lote el Mirador	Solicitud de ubicación del PSI y buzón de sugerencias
2	6 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca el Jazmín	Autorización de acopio de materiales
3	9 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca La Elda	
4	9 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Vereda el Recreo PR 18+169 al PR 18 + 510	
5	22 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca las Delicias – Vereda el Recreo	Espacio de corte y figurado de acero y cuarto de disposición del material
6	3 de julio de 2019	Quindío/ Génova	Finca el Jazmín	Acopio de materiales y herramientas
7	30 de julio de 2019	Quindío/ Génova	Finca la Siberia	Aprovechamiento forestal
8	9 de septiembre de 2019	Quindío/ Génova	Finca el Jazmín	Arreglo de pintura de fachada, cerco y patio al interior de la finca el Jazmín

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 23 ***Desarrollo de la Gestión Social Manejo de Predios y Servicios Públicos***

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se ha dado inicio a las actividades de cierre de las actas de vecindad, de compromiso y entorno.	No se presentan	Nuevamente se recomienda por parte de la interventoría iniciar los cierres de las actas de compromiso para la finalización del contrato.

Tabla 24 Indicadores de Gestión

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de actas propuestas = Total de actas levantadas y revisadas =	33/33*100% =100%
Productividad	Total de actas de entorno propuestas = Total de actas levantadas de entorno =	2/2* 100% = 100%

Tabla 25 ***Control y Verificación por la Interventoría***

Control	Etapa	Verificación
Se verificó actas de vecindad levantadas, donde se realizaron observaciones para su diligenciamiento y entrega	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
Para el mes de noviembre no se presenta ninguna novedad		
Se revisó las actas de vecindad levantadas, con observaciones para su aprobación	Etapa Preliminar e inicio de obra	3 al 5 de diciembre de 2018
Se aprobó las actas de vecindad y entorno de los municipios de Pijao y Génova	Etapa Preliminar e inicio de obra	Enero de 2019
Se verificaron planillas de entrega de copias de actas de vecindad a la comunidad del área de intervención directa	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificaron actas de compromiso en el área de intervención directa	Etapa constructiva	Marzo de 2019

Para el mes de abril 2019 no se presenta ninguna novedad		
Para el mes de mayo 2019 no se presenta ninguna novedad		
Para el mes de junio 2019 no se presenta ninguna novedad		
Se verifico planillas de control de entrega de las copias de actas de vecindad	Etapa constructiva	Julio de 2019
Se verificaron las actas de compromiso para iniciar con el respectivo cierre de los compromisos pactados con la comunidad	Etapa constructiva	Agosto de 2019
Verificación de actas de compromiso de acopio de material	Etapa constructiva	Septiembre de 2019

3.4 PROYECTO DE CULTURA VÍAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Comité de participación

Se reportan actividades para este proyecto durante el mes de septiembre de 2019, como se relacionan a continuación:

Tabla 26 Talleres de Cultura Vial

N°	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha	N°. Asistentes	Observaciones
1	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	31 de enero de 2019	10	Se realizó charla informativa en el centro docente Juan XXIII – se entregó folleto
2	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	6 de febrero de 2019	7	Se realizó charla informativa en el Centro Educativo Juan XXIII, al rector y padres de familia

N°	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha	N°. Asistentes	Observaciones
3	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	6 de febrero de 2019	9	Se realizó charla informativa al concejo municipal en recorrido que adelantaban en obra.
4	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	30 de mayo de 2019	14	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo Juan XXIII
5	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	30 de mayo de 2019	11	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo escuela 7 de agosto
6	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	30 de mayo de 2019	14	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo Juan XXIII
7	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	19 de julio de 2019	17	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo Juan XXIII
8	Taller de Cultura vial	Quindío/ Génova	31 de julio de 2019	16	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo escuela el Recreo
9	Taller de Cultura vial	Quindío/ Génova	6 de agosto de 2019	8	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo escuela de Rio Rojo

N°	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha	N°. Asistentes	Observaciones
10	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	13 de agosto de 2019	12	Talle de Cero Derroche
11	Taller de Cultura vial	Quindío/ Génova	27 de septiembre de 2019	22	Centro Educativo José Antonio Galán y Escuela el Recreo

Tabla 27 Comités de Participación Comunitaria

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
1	Reunión de inicio	Conformación del comité de participación ciudadana	Quindío / Pijao	10 de noviembre de 2018	5	0	Comunidad y representante de la empresa de trasportes
2	Reunión de inicio	Conformación del comité de participación ciudadana	Quindío / Génova	10 de noviembre de 2018	1	3	Participó el personero, planeación y defensa civil y un integrante de la comunidad.
No se presentaron actividades en el mes de diciembre de 2018							
3	Primera	Avances de	Quindío	24 de	7	3	Representa

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
	reunión comité de participación ciudadana	la obra y cierres viales	/ Pijao	enero de 2019			ntes de la comunidad, Alcaldía Municipal, Transportadores, colegio.
4	Primera reunión comité de participación ciudadana	Avances y recorrido de obra	Quindío / Génova	19 de febrero de 2019	3	1	Participaron los integrantes del comité en compañía del área social y técnica
5	Segunda reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Pijao	26 de marzo de 2019	2	3	Representantes de la comunidad y Transportadores
6	Segunda reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Génova	20 de marzo de 2019	4	4	Representantes de la comunidad, Alcaldía Municipal, personería.

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
7	Tercera reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Pijao	30 de abril de 2019	3	3	Representantes de la comunidad y Transportadores
8	Tercera reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Génova	24 de abril de 2019	3	4	Representantes de la comunidad, Alcaldía Municipal, personería.
9	Cuarta reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Génova	29 de mayo de 2019	1	3	Se presentaron los avances correspondientes al puente Tamborales
10	cuarta reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Pijao	10 de julio de 2019	2	5	Planeación y gestión del riesgo donde se les solicito la verificación de los predios de

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
							los centros educativos.
11	Quinta reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales, recorrido de obra puente Tamborales	Quindío / Génova	12 de julio de 2019	4	3	Se verificó por parte del C.P.C los aspectos sociales, ambientales y técnicos.
12	Sexta reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Génova	30 de agosto de 2019	2	3	Se verifican actividades C.P.C y recomendaciones para la adaptación de las alcantarillas
13	Quinta reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Pijao	14 de agosto de 2019	2	5	Sexta reunión comité de participación
14	Sexta reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Pijao	20 de septiembre de 2019	5	4	Desarrollo del comiré de participación comunitaria
1	Séptima	Avances de	Quindío	30 de	2	4	Se verifican

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
5	reunión comité de participación	la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	/ Génova	septiembre de 2019			actividades C.P.C
16	Octava reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Pijao	17 de octubre de 2019	4	6	Desarrollo del comité de participación comunitaria
							

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 28 Desarrollo de la Gestión Social Cultura Vial y Participación Comunitaria

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentaron	Se desarrolló reunión con los comités de participación ciudadana en Pijao y Génova.	No se presentaron

Tabla 29 ***Indicadores de Gestión***

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de talleres propuestas en Pijao = / Total de talleres ejecutados en Pijao =	0/0*100% =0%
Productividad	Reuniones de Comité de participación Comunitaria convocados en Pijao = / Reuniones de Comité de participación Comunitaria efectuados en Pijao	1/1*100% =100%

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de talleres propuestas en Génova = / Total de talleres ejecutados en Génova =	2/2*100% =100%
Productividad	Reuniones de Comité de participación Comunitaria convocados en Génova = / Reuniones de Comité de participación Comunitaria efectuados en Génova	1/1*100% =100%

Tabla 30 ***Control y Verificación por la Interventoría***

Control	Etapa	Verificación
Se verificó la metodología de talleres para las instituciones educativas	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
Se verificó la conformación del comité de participación comunitaria	Etapa Preliminar	10 de noviembre de 2018
Se acordó no realizar actividades en este proyecto por temporada vacacional.	Etapa Preliminar	3, 4 y 5 de diciembre de 2018
Se verificó la charla informativa al centro docente Juan XXIII y el primer comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	Enero de 2019
El contratista informo las actividades informativas adelantadas en campo	Etapa Constructiva	Febrero de 2019

Se verificó la segunda reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	Marzo de 2019
Se verificó y acompaño a la tercera reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	24 y 30 abril de 2019
Se verificó la cuarta reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	23 y 24 de mayo de 2019
No se presentaron actividades en este proyecto	Etapa Constructiva	17 al 21 de junio de 2019
Se verificó, lista de asistencia y reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	8 y 9 de julio de 2019
Se verificó, lista de asistencia y reunión del comité de participación comunitaria y la ejecución de los talleres en los centros educativos.	Etapa Constructiva	8 y 9 de agosto de 2019
Se verificó, lista de asistencia y reunión del comité de participación comunitaria y la ejecución de los talleres en los centros educativos.	Etapa Constructiva	septiembre de 2019
Se verificó, lista de asistencia y reunión del comité de participación comunitaria y la ejecución de los talleres en los centros educativos.	Etapa Constructiva	octubre de 2019

3.5 PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

El contratista reporto actividades para el periodo del mes de octubre de 2019, como se relaciona a continuación:

Tabla 31 ***Contratación de la Mano de Obra***

Municipio	Total de trabajadores	Mano de Obra Calificada	Mano de Obra No Calificada
Periodo del 1 al 31 de enero de 2019			
Pijao	54	29	25

Génova	12	6	6
Periodo del 1 al 28 de febrero de 2019			
Pijao	69	34	35
Génova	27	11	16
Periodo del 1 al 31 de marzo de 2019			
Pijao	44	20	24
Génova	30	14	16
Periodo del 1 al 30 de abril de 2019			
Pijao	35	10	25
Génova	28	10	18
Periodo del 1 al 31 de mayo de 2019			
Pijao	27	10	17
Génova	18	9	9
Periodo del 1 al 30 de junio de 2019			
Pijao	No reporta		
Génova	No reporta		
Periodo del 1 al 30 de julio de 2019			
Pijao	48	5	43
Génova	27	11	16
Periodo del 1 al 31 de agosto de 2019			
Pijao	36	12	24
Génova	44	8	36
Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2019			
Pijao	39	9	30
Génova	60	17	43
Periodo del 1 al 31 de octubre de 2019			
Pijao	21	5	16
Génova	El contratista no reporta la información		

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 32 *Capacitación - Inducción*

Fecha/ tramo	Tema	Asistentes
Periodo del 1 al 31 de enero de 2019		
31 de enero de 2019/ Pijao	PAGA – ubicación del punto	28 trabajadores

	SAU y PSI	
Periodo del 1 al 28 de febrero de 2019		
No se reportan actividades para este periodo en ninguno de los municipios		
Periodo del 1 al 31 de marzo de 2019		
7 de marzo de 2019/ Pijao	Socialización PAGA	21 trabajadores
12 de marzo de 2019/Génova	Socialización PAGA	18 trabajadores
Periodo del 1 al 30 de abril de 2019		
No se reportan actividades para este periodo en ninguno de los municipios		
Periodo del 1 al 31 de mayo de 2019 – verificación del personal		
		
Periodo del 1 al 30 de junio de 2019 – no reporto actividades		
Periodo del 1 al 31 de julio de 2019		
17 de julio de 2019	Área social y consumo de SPA	18 trabajadores
22 de agosto de 2019	Aclaraciones al personal retirado de la obra.	25 trabajadores
5 de septiembre de 2019	Áreas técnico, ambiental y social	17 trabajadores
25 de septiembre de 2019	Derechos de los trabajadores	18 trabajadores
13 de septiembre de 2019	Taller – Presentación de hoja de vida	25 trabajadores
01 de octubre de 2019	Cierre con los trabajadores de obra	20 trabajadores

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 33 Desarrollo de la Gestión Social Contratación de MONCL

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentan	Se realizó capacitación al personal de los temas generales de la obra	Se recomendó al contratista el trámite de las cartas de territorialidad del personal del área local.

Tabla 34 Indicadores de Gestión

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de trabajadores de vinculados de MONCL en Pijao = Número de trabajadores de MONC en Pijao=	16/16*100% =100%
Productividad	Total de inducciones realizadas en Pijao / Total de inducciones programadas en Pijao	0/0*100% =0%
Productividad	Total de capacitaciones realizadas en Pijao / Total de capacitaciones programadas en Pijao	0/0*100% =100%

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de trabajadores de vinculados de MONCL en Génova = Número de trabajadores de MONC en Pijao=	0/0*100% =0%
Productividad	Total de inducciones realizadas en Génova / Total de inducciones programadas en Génova	0/0*100% =0%
Productividad	Total de capacitaciones realizadas en Génova / Total de capacitaciones programadas en Génova	1/1*100% =100%

Tabla 35 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó la recepción de las hojas de vida. Se verificó formato para la recolección y sistematización de la información referente al proceso de contratación de la Mano de Obra No calificada Local.	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018

Se verificó atención a los ciudadanos e información para la recepción de hojas de vida, limitando el plazo de convocatoria	Etapa Preliminar	3,4,y 5 de diciembre de 2018
Se verificó la asistencia en relación con la capacitación e inducción al personal	Etapa constructiva	Enero de 2019
Se verificó formato para la recolección y sistematización de la información de la recepción de hojas de vida de la Mano de Obra No calificada Local.	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificó la asistencia a la capacitación al personal	Etapa constructiva	Marzo 2019
El contratista reporta la verificación del personal en los frentes de obra	Etapa constructiva	Mayo 2019
Para el mes de junio no se efectuaron actividades para el periodo	Etapa constructiva	Junio 2019
Para el mes de julio se verifican planillas de asistencia del personal con inducción y capacitación	Etapa constructiva	Julio 2019
Para el mes de agosto se verifican planillas de asistencia del personal a capacitación	Etapa constructiva	Agosto 2019
Para el mes de septiembre se verifican planillas de asistencia del personal a capacitación	Etapa constructiva	Septiembre 2019
Para el mes de octubre se verifican planillas de asistencia del personal a capacitación en Génova	Etapa constructiva	octubre 2019

3.6 PROYECTOS PRODUCTIVOS

Se realizó la actualización al PAGA V6, donde la interventoría aprobó las obras con ´participación ciudadana para su implementación

Fecha	Documento	Aprobación
10 de octubre de 2019	PAGA V6	SMA 43102
28 de octubre de 2019	Proyecto de obras con participación	SOC-FNC-825-2018-019

3.7 PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

Para el periodo correspondiente no se reportaron actividades en este proyecto.

Tabla 36 Proceso del Patrimonio Arqueológico y Cultural

Fecha	Solicitud	Consecutivo	Observaciones
4 de septiembre de 2018	Solicitud de certificación del estado de patrimonio arqueológico para el proyecto	ADM-INV-825-2018-019	Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH
4 de septiembre de 2018	Solicitud de certificación población indígena, minorías y ROM para el proyecto	ADM-INV-825-2018-020	Ministerio del interior
10 de septiembre de 2018	Respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud ADM-INV-825-2018-020	OFI18-35688-DAI-2200	En las bases de datos del Ministerio del interior no hay presencia de comunidades indígenas y Kumpañy
17 de septiembre de 2018	Solicitud de pronunciamiento del patrimonio Arqueológico y procedimientos	ICANH 18 de septiembre 499	Comité de Cafeteros del Quindío
25 septiembre de 2018	Ratifican respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud ADM-INV-825-2018-020	OFI18-38209-DAI-2200	No hay identificación ni registro de comunidades indígenas y Kumpañy (Gitanos)
30 de octubre de	Respuesta del ICANH enviada mediante	ICANH – 130 5445 N°	Implementación del Programa de Arqueología Preventiva y el

2018	correo electrónico.	Recibido 4669	Plan de Manejo Arqueológico (aclaración)
27 de noviembre de 2018	Respuesta del ICANH, luego de la aclaración del tipo de obra.	ICANH – 130 6001 N° Recibido 4991	Certificación de la No implementación de las investigaciones de campo, sin embargo, de encontrar hallazgos se debe informar a la entidad de forma inmediata.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 37 Desarrollo de la Gestión Social Patrimonio Arqueológico y Cultural

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
N/A	No se reporta	Se recibió respuesta del ICANH, emitiendo el concepto de la No implementación del Plan de Manejo Arqueológico.

Tabla 38 Control y Verificación por la Interventoría

Control	Etapa	Verificación
Se verificó las comunicaciones conjuntas enviadas para el ICANH La interventoría entrego respuesta al contratista por parte del Ministerio del Interior.	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
La interventoría entrego respuesta al contratista del ICANH para la implementación del Programa de Arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Arqueológico	Etapa Preliminar	30 de octubre de 2018
El contratista entrego el oficio del de la NO implementación del Plan de Manejo Arqueológico por parte del ICANH.	Etapa Preliminar	4 de diciembre de 2018
Se socializó en los proyectos del PAGA procedimiento en caso de encontrar hallazgos arqueológicos	Etapa Constructiva	Marzo de 2019

4 CONCLUSIONES

- La interventoría verifica las actividades adelantadas en el cumplimiento de los proyectos establecidos en el PAGA, los insumos se aportan por el contratista para la elaboración del informe.

- Proyecto de atención a la comunidad, se adelantan los cierres paulatinamente.

- Proyecto de información, se efectuaron las reuniones de socialización.

- Proyecto de manejo de infraestructura, se recomienda nuevamente al contratista ir haciendo los respectivos cierres de las actas de vecindad y las actas de compromiso.

- Proyectos productivos- obras con participación comunitaria, se desarrollan actividades de reparaciones locativas en las instituciones educativas.

- Se realizó mesa de trabajo para dar las recomendaciones respectivas para la entrega del informe final y el proceso de liquidación del contrato, así mismo, con las recomendaciones dadas por la supervisión de área social.

NJGL-Nury García López - Profesional Social. - Email: interventoriasocial0825@gmail.com

ANEXO 24. LIBRO DE OBRA.

30-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Sisa, 1 Maestro General, 5 oficiales, 2 Hierros, 34 Ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de enlace, Compac Wilker, 3 Vibradores, Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de placa de cuneta entre el K6+821 y el K6+845, ambos costados. Armado de hierro entre el K6+812 y el K6+821. Ambos costados.
Se termina fundida de pocete en obra del K7+380 (M. T.)
Se termina fundida de Cabezote Descole en obra del K8+750 (D)
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K10+385 y el K10+421 (M. D.). Fundida de bordillo.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+340 y el K12+331 (D)
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K12+320 y el K12+340 (M. T.). Fompieza de placa huella.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (3 horas).

Wilmer A. Jurado
Ing. Residente

Respecto al dia: lluvia.

01-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, 1 Maestro General, 7 oficiales, 2 Hierros, 1 operador, 2 conductores.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de enlace, Compac Wilker, 3 Vibradores, 2 vibradores de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Fundida de placa Huella y sobrecamino entre el K6+794 y el K6+812, dos Carriles pesados.
Desarmado de formaleta en obra del K7+380 (M. T.).
Desarmado de formaleta en Cabezote del K8+750 (M.D.).
Fundida de placa de cuneta entre el K10+369 y el K10+385 (M. D.).
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+320 y el K12+340 (M. T.). Armado de formaleta para bordillo entre el K12+310 y el K12+340 (M. D.). Se Continua fompiega de vid.
Estado del Tiempo: Dia Seco

02-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, 5 oficiales, 1 Hierro, 25 Ayudantes, 1 operador, 2 conductores.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de enlace, Compac

Willis, 3 Mezcladores, 2 Vibradores de Concreto, Herramien
ta menor.
Actividades: Armado de formaleta para placa huella
entre el K64763 y el K64799. Fundida de módulos
Centrales entre el K64794 y el K64818. Fundida de
placa de cuneta entre el K64806 y el K64821 (M.D.).
Fundida de bordillo de cuneta entre el K104369 y el
K104385 (M.D.). Fundida de bordillo entre el K104362 y
el K104366 (M.I.). Fundida de placa de cuneta en
acceso a obra.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K124310 y el
K124340 (M.D.). Armado de formaleta para bordillo
entre el K124295 y el K124320 (M.I.).
Fundida de bordillo de cuneta entre el K134091 y el
K134086 (M.I.).
Desarmado de formaleta en obra del K134790 (.
Jornada nocturna (2 horas).

W. Hugo A. Durán
Ing Residente.

obra Transversa
la margen de
Estado del tie
Inspector Interve

-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, Sepúlid
2 Henevo, 27 Ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retro cargador, Camioneta de estacas, Compero Willis
3 Mezcladores, 2 Vibradores, de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Armado de formaleta para placa huella,
instalación y amarre de hierro. Fundida de placa de
cuneta entre el K64790 y el K64806 (M.D.).
Armado y amarre de hierro para aletas de cuneta en
obra del K84750 (M.I.). Se inicia armado de formaleta.
Se inicia (armado) reparación de obra del K104150 (Descole).
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el
K104295 y el K104369 (M.D.).
Fundida de bordillo de cuneta entre el K124295 y el K124295
(M.I.). Armado de formaleta para bordillo de cuneta
entre el K124295 y el K124310 (M.D.).
Fundida de bordillo de cuneta antes y después de la

09-10-2019: Personal e
2 Henevo, 29 A
Equipo: Retro
3 Mezcladores,
Actividades: Fu
K64766 y el
K64799.
Fundida de a
Fundida de Bor
Armado de for
Fundida de bo
Fundida de bo
Estado del tiem
Inspector Interve

05-10-2019: Personal e
28 Ayudantes,
Equipo: Retroca
3 Mezcladores, 2
Actividades: Pos
Fundida de plá
Fundida de Sord
Fundida de bor
Estado del tiem
Inspector Interve

07-10-2019: Personal
6 oficiales, 24
Equipo: Retro
3 Mezcladores,

224

[redacted]

obra transversal del K13+000 (M.D.) y después de la obra por la margen izquierda.
Estado del tiempo: lluvia moderada: (3 horas).

Inspector de Interventoría.

WILMER A. JARAMA
ING. RESIDENTE

09-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, 5 oficiales, 2 Hermanos, 29 Ayudantes, 2 operador, 2 Conductores,
Equipo: Retrocargador, Camioneta de enlace, Compac Willy, 3 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Fundida de placa huella reforzada entre el K64+766 y el K64+787. Fundida de placa de transición en el K64+849.
Fundida de dados de anclaje en obra del K64+750 (M.I.)
Fundida de Bordillo de cuneta entre el K104+295 y el K104+369 (M.D.)
Armado de formaleta para bordillo entre el K104+268 y el K104+295 (M.D.)
Fundida de bordillo de cuneta entre el K124+295 y el K124+380 (M.D.).
Fundida de bordillo de cuneta entre el K124+917 y el K124+929 (M.I.).
Estado del tiempo: Día seco.

Inspector de Interventoría

WILMER A. JARAMA
ING. RESIDENTE

05-10-2019: Personal en obra: Maestro General, 5 oficiales, 2 Hermanos, 28 Ayudantes, 2 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de enlace, Compac Willy, 3 Mezcladoras, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Desarmado de formaleta de placa huella.
Fundida de placa de cuneta entre el K64+817 y el K64+894 (M.I.).
Fundida de bordillo de cuneta entre el K104+268 y el K104+295 (M.D.).
Fundida de bordillo de cuneta en acceso Finca K124+550.
Estado del tiempo: lluvia moderada (2 horas).

Inspector de Interventoría

WILMER A. JARAMA
ING. RESIDENTE

07-10-2019: Personal en obra: Profesional Siso, Maestro General, 6 oficiales, 2 Hermanos, 20 Ayudantes, 2 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de enlace, Compac Willy, 3 Mezcladoras, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.

225

Actividades: Replanteo de excavación y conformación para poceta y cabezal de descole en obra del K57+800.
Armado de formaleta para placa huella K6+752.
Corte y figurado de hierro para placa huella y bordillo de cuneta.
Fundida de placa de transición en placa huella (inicio) en el K10+220.
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K10+240 y el K10+288 (M.D.).
Corte y demolición de muro para entrada de cuneta en obra del K13+000 (lado Contador).
Estado del Tiempo: Lluvia en la noche anterior (3 horas).
Día Seco.

Wilmer A. Jiménez
ING. RESIDENTE

Inspector Interventoría.

8-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, 7 oficiales, 2 Hereros, 21 ayudantes, 1 operador, 2 conductores.
Equipo: Retroexcavadora, Camioneta de estacas, Campero Nissan, 3 Mezcladoras, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Armado y amarre de hierro para poceta en obra del K57+800. Se funde Solado y placa Piso, se inicia armado de hierro para cabezote en descole.
Fundida placa huella 2 Cunetas de poceta entre el K6+752 y el K6+761. Fundida de 7 módulos de cuneta central entre el K6+761 y el K6+782. Se funde placa de cuneta entre el K6+761 y el K6+782 (M.D.).
Se termina armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K10+223 y el K10+240 (M.D.). Se funde bordillo de cuneta entre el K10+245 y el K10+259 (M.D.).
Fundida de placa de Transición en el K10+500.
Demolición de placa de cuneta en el K12+841, por haberse fracturado.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (2 horas).

Wilmer A. Jiménez
ING. RESIDENTE

Inspector Interventoría.

09-10-2019: Personal e
General, 8 ofic
Equipo: Retro
3 Mezcladoras,
Actividades: Cu
en obra del
se termina a
K57+800 (M.D.).
formaleta pa
Fundida de 7
Se funde So
el K6+782.
Conformación
el K12+860
formaleta
Excavación
Estado del T

Inspector Interv

10-10-2019: Personal
2 Hereros, 26 a
Equipo: Re
3 Mezcladoras,
Actividades:
del K2+770
Se termina
y se inicia
Se funde be
y el K6+776
vía al Sene
vio al Sen
Conformaci
cunetas e
Se instala
en el K14+

09-10-2019: Personal en obra: Ing Residente, Profesional SISO, Maestro General, 8 oficiales, 2 Hereros, 28 ayudantes, 1 operador, 2 conductores, Equipo: Retrocargador, Camioneta de enlace, Campero Willis, 3 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Conformación de terreno para explanar descapote en obra del Km 1+770 (M.I.). Figurado y armado de hierro. Se termina armado de hierro para cabezote descole obra del Km 1+800 (M.D.). Se funde Solado y plan Piso. Armado de formaleta para pocetas. Se inicia fundida.
Fundido de plan de Transición en obra huella del Km 1+719.
Se funde sobreancho de plan huella entre el Km 1+773 (M.I.) y el Km 1+782.
Conformación de terreno para descoles de cunetas en el Km 1+860 y en el Km 1+600 (M.D.). Desarmado de formaleta de bordillos de acceso a obras.
Excavación para obra transversal en el Km 1+580.
Estado del tiempo: Día Seco.

Inspector Misionera.

Wilmer A. Jaramillo.
ING Residente.

10-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro general, 1 oficiales, 2 Hereros, 26 Ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de enlace, Campero Willis, 3 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto, Herramientas menor.
Actividades: Armado de formaleta para descapote en obra del Km 1+770 (M.I.).
Se termina fundida de poceta en obra del Km 1+800 (M.I.) y se inicia Fundida de cabezote descole.
Se funde los módulos de cinta Central entre el Km 1+752 y el Km 1+761. Fundida de Sobreancho para acceso a vía al Santuario. Se inicia fundida plan de Transición vio al Santuario.
Conformación de terreno para canales de desagüe de cunetas en el Km 1+600 (M.I.) y en el Km 1+860 (M.D.).
Se instala tubo P.V.C. de 36" en obra transversal en el Km 1+580.

Estado del tiempo: Dia Seco.

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE

Inspector Interventoria.

11-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Siso, Maestro General, 9 oficiales, 2 Hereros, 28 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.

Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, compactador Wilson, 3 Alcoladores, 2 vibradores de Concreto, Herramienta Menor.

Actividades: Fundida de disipador en obra del K21+720 (M.I) Se funde cabezote descole en obra del K57+800 (M.D). Se termina fundida de placa de transición en salida de alcantarillo. Se continua armado de formaleta para bordillo de cuneta, Corte y figurado de hierro. Fundida de placa para canal descole de cuneta en el K124+860 (M.D.).

Estado del tiempo: Dia Seco.

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE

Inspector Interventoria.

12-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Siso, Maestro General, 5 oficiales, 2 Hereros, 21 ayudantes, 2 Conductores.

Equipo: Camioneta de estacas, compactador Wilson, 3 Alcoladores, 2 vibradores de Concreto, Herramienta Menor.

Actividades: Se inicia fundida de placa de cuneta entre el K67+954 y el K67+813 (M.D). Tambien se inicia fundida de Sobreancho.

Se funde placa para canal de descole en el K124+860 (M.D).

Estado del tiempo: Dia Seco.

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE

Inspector Interventoria.

15-10-2019: Personal en obra: Ing. Director de obra, Residente, Profesional Social, Profesional Siso, Maestro General, 6 oficiales, 2 Hereros, 21 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.

Equipo: Re
Cladores, 2 v
Actividades
en obra d
Armado hie
llo en el
para desco
Armado de
de cuneta
Traslado de
K14+580.
Estado del
Inspector Inte

16-10-2019: Personal
General, 6
1 Conduc
Equipo: Re
2 Vibrador
Actividades
Excavación
y armado
Fundida d
Tramo de p
Fundida d
el K124+86
Se termina
Tente en
Se hace fe
huella del
Estado del
Inspector Inte

17-10-2019: Person
Profesio

[redacted]

Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Armado de hierro y formaleta para poceta en obra del K4+095 (M.I.). Excavación para Muro (M.D.) Armado hierro y amarre para placa de cuneta y bordillo en el Tramo del "Sinabrio". Excavación y conformación para descole de Cuneta en obra del K6+849.
Armado de formaleta para muro de canal de descole de cuneta en el K12+860 (M.D.).
Traslado de materiales para obra del K4+095 y el K14+580. Se inicia limpieza y recolección de sobrantes.
Estado del tiempo: Lluvia intensa (3 horas).

Wilmen A. Jordan
Inspector Interventoría
ING. RESIDENTE

16-10-2019: Personal en obra: Ing. Director de obra, Residente, Maestro General, 6 oficiales, 2 Veneros, 21 Ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 3 Mezcladoras, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Fundida de poceta en obra del K4+095 (M.I.). Excavación y Perfilado para muro en obra, figurado y armado de hierro, obra K4+095 (M.D.).
Fundida de Sobre-ancho y bordillo de cuneta en Tramo de placa huella de "El Sinabrio".
Fundida de muro de Canal de descole de cuneta en el K12+860 (M.D.).
Se termina levantamiento de placa de concreto existente en la cancha de basketball de la escuela Puente-Tello.
Se hace levantamiento topográfico del Tramo de placa huella del Sector "La Maizena, por parte Interventoría.
Estado del tiempo: Lluvia intensa: (2 horas), Moderada (2 horas).

Wilmen A. Jordan
Inspector Interventoría.
ING. RESIDENTE.

17-10-2019: Personal en obra: Ings, Director, Residente, Profesional Social, 6 oficiales, 2 Veneros,

21 agendador, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas,
3 Mezcladores, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades. Armado de formaleta para Pases de
escalones en sendero de acceso a la escuela "Puente Tabla".
Fundida de Placa de disipador en obra del K3+289 (M.D.).
Fundida de Zapata para Muro en obra del K4+095 (M.D.).
Armado de formaleta y acero de refuerzo para dis-
sipador en obra del K4+680 (M.D.).
Fundida de placa de cuneta faltante en el Tramo "El
Sinabrio" (M.I.). Fundida de bordillo de cuneta.
Fundida de bordillo de Canal de descole de cuneta
en el K12+600 (M.D.).
Se inicia levantamiento Topográfico del Tramo de
Placa huella "La Joyona", Terminado Por Parte de
Interventoría.
Estado del tiempo: Lluvia Moderada, (4 horas).

Wilmer A. Jordan
ING PRESIDENTE

Inspector Interventoría.

18-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, 6 oficiales,
2 Herreros, 21 agendadores, 1 operador, 1 Conductor,
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 4 Mezcladores,
2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades. Fundida de escalones en sendero de acceso a
la escuela "Puente Tabla"
Armado y amarre de hierro para Vástago de muro descole
en obra del K4+095 (M.D.), Fundida de vástago.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K6+752 y el K6+800
Fundida de bordillo de cuneta entre el K6+752 y el K6+850
Replanteo y armado de hierro y amarre, para muro de
descole de cuneta en obra del K12+550 (M.D.).
Levantamiento Topográfico en los Tramos de Placa huella
de "los Chenes y "El Yodon", Por parte Interventoría.
Estado del Tiempo: Lluvia Intensa (2 horas).

Wilmer A. Jordan
ING. Residente

Inspector Interventoría.

19-10-2019: Personal
36 agendad
Equipo: Ret
2 Vibradores
Actividades.
deportiva e
para dise
Fundida de
Fundida de
en obra de
Estado del
Inspector Inte

21-10-2019: Personal
10 agendad
Equipo:
de Concreto
Actividades
para Pas
Tabla".
Armado de
cuneta e
Replanteo
y descole
de mater
Estado del
Inspector In

22-10-2019: Personal
14 agendad
Equipo: 1
2 Vibradores
Actividad
del K3+2
Conform

19-10-2019. Personal en obra: Ing. Residente, 4 oficiales, 2 Hemeros, 26 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
equipo: Retrocargador, Camioneta de enlace, 3 Mezcladoras, 2 Vibradores de concreto, Herramienta menor.
Actividades: Extendido de Subbase para piso de cancha deportiva en escuela "Puente Tabla". Fundida de Placa para disipador en obra del K3+299 (M.D.).
Fundida de Placa de piso en obra del K6+819 (M.I.).
Fundida de Placa piso y muro de descole de cuneta en obra del K12+550 (M.D.).
Estado del tiempo: lluvia moderada (2 horas).

Wilmer A. Jurban
ING. RESIDENTE
Inspector Interventoria.

21-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional SISO, 3 oficiales, 10 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, 3 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: extendido, nivelado y Compactado de Subbase para piso de cancha deportiva en (el) escuela "Puente-Tabla".
Armado de hierro y formaleta para muro descole de cuneta en obra del K6+819 (M.D.).
Replanteo y limpieza de excavaciones para cuneta y descole de obra Transversal en el K14+580. Traslado de materiales a esta obra.
Estado del tiempo: lluvia intensa (5 horas).

Wilmer A. Jurban
ING. RESIDENTE
Inspector Interventoria

22-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional SISO, 3 oficiales, 14 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de enlace, 3 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades. Fundida de muro de disipador en obra del K3+299 (M.D.).
Conformación, replanteo, armado de formaleta y

armado de hierro para disipador en obra del Km 1+280 (Izq.
extracción y limpieza de material para filtro en desco
le de cuneta en obra del Km 6+849 (M.D.).
Se inicia excavación para obra transversal en el
Km 9+220.
Fundida de Solados y placa para Piso de
poceta y cabezote de descole en obra del Km 14+580 (M.D.
Estado del Tiempo: Lluvia moderada (7 horas).

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE

Inspector de Obra.

23-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Sr. SO,
3 oficiales, 7 Hierros, 16 ayudantes, 4 operador, 1 Conductor.
Equipos: Retrocargador, Camioneta de estacas, 3 Mezcladoras,
2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Se inicia armado y amarre de acero de
refuerzo para placa en contorno de la cancha depor-
tiva de la "Escuela Puente Tablas".
Se termina armado y amarre de hierro y armado
de formaleta para disipador en obra del Km 1+280 (Izq.
Reconstrucción de filtro en descole de cuneta en obra
del Km 6+849 (M.D.). Se inicia armado de acero para
placa de cuneta descole a obra.
Armado y amarre de acero de refuerzo para obra
en el Km 14+580. Armado de formaleta para poceta
y Cabezote de descole.
Estado del Tiempo: Lluvia moderada (2 horas).

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE.

Inspector de Obra

24-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Sr. SO,
5 oficiales, 7 Hierros, 16 ayudantes, 4 operador,
1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 3 Mezcladoras
2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Se continua armado de acero para
placa de Concreto en la cancha deportiva de la

Escuela P
Fundida d
Se funde
Km 6+849, a
Se funde
Km 14+580
Continu
obra del
Estado d

Inspector de

25-10-2019: Person
3 Oficiale
Equipos:
2 Vibradore
Actividad
de Conc
"Puente
Armado d
descole de
Instalacio
en obra
Pleno S
Desarrol
Estado de

Inspector

26-10-2019: Perso
3 oficial
Equipos:
dores, 2 V
Actividad
deportiva
Se inicio
dor en

Escuela "Puente Tabla".
Fundida de disipador en obra del K4+280 (M.D.).
Se funde desole de placa de cuneta en obra del K6+849, ambos Costados.
Se funde pared y cabezote desole de obra en el K14+580.
Continua excavación para obra Transversal en obra del K9+220.
Estado del Tiempo: Lluvia Intensa (3 horas).

Inspector Interventoría

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE

25-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Siso, 3 Oficiales, 1 Herrero, 12 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor, Equipo: Retroexcavador, Camioneta de estacas, 3 Vibradores de Concreto, Herramienta menor, Planta Electrica. Actividades: Armado y amarre de acero para placa de Concreto de la cancha deportiva de la escuela "Puente Tabla". Armado de formaleta. Armado de formaleta para bordillo de cuneta en desole de obra en el K6+849. Se funde bordillo. Instalación de Cama de arena para Tubo de 36" en obra del K9+220. Se Instala Tubo y se realiza llenos Sobre el mismo. Desarmado de formaleta en obra del K14+580. Estado del Tiempo: Dia Seco.

Inspector Interventoría

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE.

26-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Siso, 3 Oficiales, 1 Herrero, 11 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor. Equipo: Retroexcavador, Camioneta de estacas, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor. Actividades: Fundida de placa de Concreto en Cancha deportiva de la Escuela "Puente Tabla". Se inicia conformación y replanteo para Disipador en obra del K7+380 (M.D.). Corte y fijación

de acero de refuerzo.
Estado del Tiempo: Lluvia Moderada: (3 horas).

Wilmen A. Jordan
ING. RESIDENTE.

Inspector de Interventoria

28-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, 3 oficiales, 16 Ayudantes, 1 operador, 1 conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: se termina fundida de placa de concreto para cancha deportiva en la escuela "Puente Tabla". Armado de formaleta para muros de discipado en obra del K47+280 (Col. D.J.). Fundida de uno de los muros. Excavación para vigas en discipador de obra del K47+380(Izq.) Se inicia armado de acero de refuerzo para discipador.
Estado del Tiempo: Dia Seco.

Wilmen A. Jordan
ING. RESIDENTE.

Inspector de Interventoria

29-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, 3 oficiales, 15 ayudantes, 1 Conductor.
Equipo: Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Adecuación y conformación de piso para cuneta de desagüe de placa de cancha deportiva en la escuela "Puente Tabla.
Se Termina armado, amarre de hierro y armado de formaleta para discipador en obra del K47+380 (Izq.).
Estado del Tiempo: Dia Seco.

Wilmen A. Jordan
ING. RESIDENTE.

Inspector de Interventoria.

30-10-2019. Personal en obra: Ing. Residente, 3 oficiales, 13 Ayudantes, 1 operador, 1 Conductor, Comisión de Topografía
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 3 Mezcladoras, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor, Equipo de Topografía.
Actividades: Fundida de muro en discipador, de obra

en el K4
Fundida a
Replanteo
y Cobertu
Estado del
Inspector In

31-10-2019: Person
y Conduce
Equipo: C
de Concre
Actividad
Cobertu de
Fundida a
Fundida d
obra tram
Estado del
Inspector In

01-11-2019: Person
y operador
Equipo: C
dores, 2 V
Herramie
Actividad
discipador
placa "P
Armado d
obra del
Nota: Se
fico en l
por ponte
Estado del
Inspector In

PIJAO

en el K77+280 (el. D.).
Fundida de placa piso para disipador en obra del K77+280.
Replanteo y mejoramiento de excavaciones para zapata y cabezote de obra transversal en el K77+220, armado de hierro.
Estado del tiempo: Lluvia moderada (3 horas).

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE.

Inspector: Wilmer Tordoya

31-10-2018: Personal en obra: Ing. Residente, 2 oficiales, 15 Ayudantes, 1 Conductor, Comisión de topografía.
Equipo: Camioneta de apoyo, 3 Excavadoras, 2 Cargadores de Concreto, Equipo de Topografía, Herramienta menor.
Actividades: Replanteo y mejoramiento de excavación para cabezote de descole en obra del K77+280 (M.D.).
Fundida de muros de disipador en obra del K77+280 (M.D.).
Fundida de placa para piso de zapata y cabezote en obra transversal del K77+220.
Estado del tiempo: Seco.

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE

Inspector: Wilmer Tordoya

01-11-2018: Personal en obra: Ing. Residente, 2 oficiales, 15 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor, Comisión de topografía.
Equipo: Retroexcavadora, Camioneta de apoyo, 3 Excavadoras, 2 cargadores de concreto, Equipo de topografía, Herramienta menor.
Actividades: Replanteo y mejoramiento de piso para disipador en obra del K77+280 (M.D.). Fundida de placa piso.
Armada de formaleta para cabezote descole en obra del K77+220 (M.D.). Se funde cabezote.
Nota: Se le solicita realizar el levantamiento topográfico en los sectores de la "Alcapena" y "Los Chorros" por parte del Contratista.
Estado del tiempo: Lluvia moderada (2 horas).

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE

Inspector: Wilmer Tordoya.

GÉNOVA

Equipo: Retro cargador, 1 Mezcladora, 2 vibrado. de Concreto, Compactador manual (sultana), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K181+190 y el K181+160 (m.D).
Fundida de Concreto e instalación de Piedra Pegada K181+258, Cinta Central y Extender.
Fundida de plana huella, emtor reforzador entre el K181+460 y el K181+476.
Fundida de plana huella, emtor reforzador entre el K181+529 y el K181+541
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (2 horas).
Inspector Interventoría.

-09-2019: Nota: Lluvia intensa el dia anterior (29 Domingo) (3 horas).
Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 8 oficiales, 2 Herreros, 32 Ayudantes, 1 Conductor, 1 Operador.
Equipo: Retro cargador, Volqueta, 1 Mezcladora, 2 vibradores de Concreto, Compactador manual (Sultano), Herramienta Menor.
Actividades: Limpieza de obras y via.
Retiro de materiales, y agua de cajones para piedra Pegada entre el K181+258 y el K181+278.
Armado y anclaje de hierro para sobrecancho y Placa de cuneta entre el K181+430 y el K181+460.
Excavación para viga riostra y placa de cuneta entre el K181+541 y el K181+571. armado y anclaje de acero para plana huella y placa de cuneta entre el K181+571 y el K181+171.
Corte y figurado de hierro para viga riostra, plana huella, placa de cuneta y bordillo.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa: (1 hora).
Inspector Interventoría.

-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional social, Profesional Siso, Maestro General, 8 Oficiales, 2 Herreros, 33 Ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Continua libro de obra Parte 2, Página 3.

Viene de libro parte 1, de obra, página 100.
Equipo: Retroexcavador, Volqueta, 4 Mezcladoras, 2 Vibradores de Concreto, Compactador manual (saltarín), Herramienta menor.
Actividades: se continúa limpieza de obra y Placa huella, Fundida de bordillo de concreto entre el K18+110 y el K18+140 (M.D.).
Fundida de concreto e instalación de piedra Pegada entre el K18+105 y el K18+115, Cinta Central y laterales.
Fundida de concreto e instalación de Piedra Pegada entre el K18+258 y el K18+270, Cinta Central y laterales,
Fundida de Sobreancho y Placa de concreto entre el K18+930 y el K18+960, ambos costados.
Fundida de placa huella, cinta reforzada entre el K18+541 y el K18+571. se continúa Corte y figurado de hierro para viga riostra, y bordillo de concreto.
NOTA: Se realizó en la mañana del día reunión de participación ciudadana en la sede del Comité de cafeteros de Génova.
Estado del tiempo: Día Seco.

Respecto Interventoría

Ing Residente.

2-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, Profesional Social, 6 oficiales, 1 Ayudante, 1 operador, 2 conductores.
Equipo: Retroexcavador, Volqueta, 4 Mezcladoras, camioneta de obra, 2 vibradores de Concreto, Compactador Manual (saltarín).
Herramienta menor.
Actividades: se funde bordillo de concreto entre el K18+095 y el K18+105 (M.I.). Armado de formaleta para el bordillo de concreto entre el K18+107 y el K18+127 (M.I.).
Fundida de concreto e instalación de piedra Pegada, cinta Central y laterales.
Fundida de Sobreancho entre el K18+920 y el K18+960 (M.D.).
Fundida de concreto.
Fundida de placa huella y cinta reforzada entre el K18+541 y el K18+568, y Placa de concreto. ambos costados
Continúa Corte y figurado de hierro para placa

huella y plaza de cuneta.
Estado del tiempo: Lluvia intensa (3 horas).

Inspector de Fiscalización

Ing. Residente

-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 6 oficiales, 7 Hombres, 30 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores, Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de enlace, 4 Niveladores, 2 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K18+107 y el K18+127 (Der. I.).
Fundida de sobrecimiento de plaza huella entre el K18+420 y el K18+470 (Der. I.).
Fundida de plaza de cuneta.
Excavación para viga riostra y plaza de cuneta.
Excavación para drenaje #2.
Estado del Tiempo: Lluvia moderada: (2 horas)

Inspector de Fiscalización

Ing. Residente

-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 6 oficiales, 7 Hombres, 30 Ayudantes, 1 operador, 2 Conductores, Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de enlace, 4 Niveladores, 2 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K18+127 y el K18+160 (Der. I.). Continúa armado de formaleta.
Fundida de Concreto (y) e instalación de Piedra Pegada al K18+279, Cinta Central y laterales.
Fundida de sobrecimiento de plaza huella en el K18+170 (Der. I.). Fundida de plaza de cuneta descole a obra.
Fundida Solado para drenaje #2.
Se termina instalación de Geotextil, Tubo de Drenaje, y material filtrante en filtro entre el K22+219 y el K22+236 y (Der. y Izq.). Estado del Tiempo: Día Seco.

Inspector de Fiscalización

Ing. Residente.

05-10-2019: Personal e
y Hombres, 30
Equipo: Ret
4 Niveladores,
(Saltarin), H
Actividades:
cuneta y
Fundida de pl
Fundida de a
Corte y fragu
cuneta.
Excavación
Estado del Tie

Inspector de Fiscaliz

06-10-2019. Personal en obr
maestro general, 1 ho
Equipo utilizado:
menor.
Actividades realiza
como K18+105 y
(piedra pegada) e
Excavación para
K18+505. Excav
K18+580.
Estado del tiemp
lluvia moderada e

Residente Interventori

07-10-2019 Personal en obr
general, 6 oficiales,
Equipo utilizado: 4
menor, Retro carga
Actividades reali
plaza huella entre

[redacted]

5-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 6 oficiales, 1 Herrero, 30 Ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 1 Mezcladoras, 2 Vibradores de Concreto, Compactador manual. (Saltarin), y Herramienta menor.
Actividades: Desarmado de formaleta de bordillo de cuneta y se continua armado.
Fundida de placa de cuneta entre el K18+420 y el K18+476(D).
Fundida de Concreto y e instalación de Piedra Pegada.
Corte y figurado de hierro para muro #2, armado y amarre.
Excavación para Vigas riostras y placa de cuneta.
Estado del Tiempo: Lluvia moderada: (2 horas).

Respecto Interventoria.

Ing. Residente.

6-10-2019. Personal en obra: Ingeniero Auxiliar, Ingeniero residente (del subcontratista), maestro general, 1 herrero, 6 oficiales y 21 ayudantes
Equipo utilizado: 2 mezcladoras para concreto, 1 vibrador para concreto, herramienta menor.
Actividades realizadas: Fundición de bordillo entre los sitios referenciados como K18+705 y K18+159, por izquierda. Fundición de concreto ciclopeo (piedra pegada) entre los sitios referenciados K18+256 y K18+282.
Excavación para vigas y bordillo entre los sitios referenciados como K18+963 y K18+505. Excavación para vigas entre los sitios referenciado K18+599 y K18+580.
Estado del tiempo: en la mañana seco, en la tarde se presentó lluvia moderada entre la 1:00pm y las 2:00pm.

Residente Interventoria

Ing Residente.

7-10-2019 Personal en obra: Ingeniero auxiliar, ingeniero residente (subcontratista), maestro general, 6 oficiales, 1 herrero y 38 ayudantes
Equipo utilizado: 2 mezcladoras para concreto, 3 vibradores para concreto, herramienta menor, Retro cargador, volqueta, camioneta de estacas, compactador manual.
Actividades realizadas: Instalación de formaleta y colocación de acero para placa huella entre el K18+963 y el K18+505. Fundición de bordillo entre el

K18+709 y K18+759, por derecha. Fundición de concreto ciclopeo (piedra pegada) entre K18+282 y K18+299. Instalación de formaleta y colocación de aceros ammados, entre K18+599 y K18+580. Filtro 12 K22+294 - K22+282 (12m)
Estado del tiempo: lluvia fuerte entre 3pm y 5pm.

Residente Interventoría

Ing Residente

08-10-2019. Personal en obra: Ingeniero auxiliar, ingeniero residente (subcontratista), maestro general, 6 oficiales, 1 tenero y 9 ayudantes
Equipo utilizado: 9 mezcladoras para concreto, 3 vibradores para concreto herramienta menor, retrocargador, volqueta, camioneta de estacas, compactador manual
Actividades realizadas:
Construcción de filtro por izquierda, entre K22+229 y K22+299 (excavación, colocación de geotextil, tubería y lleno con material granular) 20m.
Colocación y armada de aceros para dentellón y zarpa del muro #2
Fundición de bordillo entre K18+159 y K18+200, por izquierda
Fundición de bordillo entre K18+159 y K18+230 por derecha.
Fundición de concreto ciclopeo (piedra pegada) entre K18+294 y K18+30
Fundición de huella y cuneta reforzada, por izquierda, entre K18+560 y K18+600.
Fundición de huellas y cunetas reforzadas entre el K18+963 y el K18+980
Estado del tiempo: lluvia intensa (3 horas)

Residente Interventoría

Ing Residente

9-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente (subcontratista), Maestro General, 6 oficiales, 1 Tenero, 39 Ayudantes y operadores, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 9 Mezcladoras, 3 Vibradores de Concreto, Compactador Manual (Saltarin), Herramienta Menor.
Actividades: Armada de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+200 y el K18+240 (der.) y entre el K18+230 y el K18+255 (der.).
Fundida de Concreto e instalación de piedra pegada entre el K18+305 y el K18+314, Cuneta Central y laterales.

Excavación entre el (illegible)
Excavación (illegible)
K18+667 (illegible)
por Dere(illegible)
Estado del (illegible)
Interventoría

10-10-2019: Personal (illegible), (illegible), 1 Tenero, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: 7 Mezcladoras, 3 Vibradores de Concreto, Compactador manual (illegible)
Actividades: Armada de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+200 y el K18+240 (der.) y entre el K18+230 y el K18+255 (der.).
Fundida de Concreto e instalación de piedra pegada entre el K18+305 y el K18+314, Cuneta Central y laterales.
Fundida a la altura del K18+480 y Fundida K18+600 y K18+620
Excavación del K18+(illegible)
Estado del (illegible)
Interventoría

11-10-2019: Personal (subcontratista), 6 oficiales, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: 9 Mezcladoras, 3 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta Menor.
Actividades: Armada de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+200 y el K18+240 (der.) y entre el K18+230 y el K18+255 (der.).
Fundida de Concreto e instalación de piedra pegada entre el K18+305 y el K18+314, Cuneta Central y laterales.
Fundida a la altura del K18+480 y Fundida K18+600 y K18+620
Excavación del K18+(illegible)
Estado del (illegible)
Interventoría

[redacted]

excavación para viga riostra y anclado de formaleta entre el K184+480 y el K184+505.
excavación para viga riostras e instalación de formaleta para placa huella, entre el K184+600 y el K184+617 por Izquierda y entre el K184+480 y el K184+520 por Derecha.
Estado del Tiempo: Día Seco.
Inspector Interventoría.

Ing Residente.

-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente (subcontratista), Maestro General, 6 oficiales, 7 Hierros, 12 Ayudantes, 7 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de citaciones, 1 Excavadora, 3 Vibradores de Concreto, Compactador manual (saltarín), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K184+200 y el K184+240 (M.I.) y entre el K184+230 y el K184+255 (M.D.).
Fundida de Concreto Ciclopeo (Piedra Pegada), entre el K184+314 y el K184+323, Cinta central y laterales.
Fundida de placa huella, Cinta retenedor entre el K184+480 y el K184+505.
Fundida de placa huella cinta retenedor entre el K184+600 y el K617 (M.I.) y entre el K184+480 y el K184+520 (M.D.).
Excavación para tubo de alcantarilla en obra del K184+969.
Estado del Tiempo: Lluvia Moderada (2 horas)
Inspector Interventoría.

Ing Residente

-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente (subcontratista), Maestro General, Profesional Soso, 6 oficiales, 7 Hierros, 41 Ayudantes, 7 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de citaciones, 1 Excavadora, 3 Vibradores de concreto, Compactador manual

(Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+240 y el K18+281 (M.I.) y entre el K18+255 y el K18+281 (M.D.).
Fundida de Concreto Ciclopeo (Piedra Pegada), entre el K18+323 y el K18+333, Cinta Central y Exterior.
Fundida de Sobrecuneta entre el K18+476 y el K18+497 (M.I.) y entre el K18+476 y el K18+491 (M.D.).
Excavación para Viga cabezal y armado de formaleta para placa huella entre el K18+520 y el K18+617.
Instalación de cama de arena y Tubo P.V.C. de 36" en obra del K18+964. Conformación y Llenado.
Estado del tiempo: Dia Seco

Inspector Interventoría

Ing. Residente

9-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente (Sabado-Todo el dia), Maestro General, 6 oficiales, 7 Meneros, 3 capataces, 7 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de cabina, 4 Vibradores, 3 (Compactadores) vibradores de Concreto, Compactador manual (saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K18+240 y el K18+281 (M.I.) y entre el K18+255 y el K18+281 (M.D.)
Limpieza y retiro de material sobrante de excavación para fundida de Concreto Ciclopeo (Piedra Pegada.
Fundidad de placa de cuneta entre el K18+476 y el K18+497 (M.I.). y entre el K18+476 y el K18+497. (M.D.).
Fundida de placa huella entre el K18+520 y el K18+617, Cintas reforzadas. Fundida de placa de cuneta entre el K18+568 y el K18+587 (M.D.).
Estado del tiempo: Lluvia Moderada (3 horas)

Inspector Interventoría

Ing. Residente

8-10-2019: Personal en obra: Maestro General, 5 oficiales, 7 Meneros, 7 ayu

dantes, 1 Co
Equipo: C
de Concret
Actividade
Concreto
Estado del
Inspector Int

14-10-2019: Personal
tes, 1 Con
Equipo: C
Concreto,
Actividad
(Domingo),
Pegadas
Estado de
Inspector D

15-10-2019: Perso
vista), Mae
y Conduc
Equipo: 1
Oficiales
manual (
Actividad
de Cunet
Fundida
entre el
Fundida
excavacio
el K18+61
entre el
Estado del
Inspector Int

dantes, 1 Conductor.
Equipo: Camioneta de estacas, 3 Mezcladoras, 3 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta. Fundida de Concreto y Piedra Pegada. Se funde placa huella.
Estado del Tiempo: Dia Seco.

Inspector Interventoria.

4-10-2019: Personal en obra: 1 Maestro General, 5 oficiales, 26 ayudantes, 1 Conductor.
Equipo: Camioneta de estacas, 3 Mezcladoras, 3 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Se continua como el dia anterior (Domingo), Fundida de bordillo de cuneta, Piedra Pegada y Placa huella y cuneta.
Estado del Tiempo: Lluvia moderada (1 hora)

Inspector Interventoria

5-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente (Subcontratista), 1 Maestro General, 5 oficiales, 1 Hornero, 33 ayudantes, 1 Conductor, 1 Operador.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Mezcladoras, 3 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K184783 y el K184323 (M.I.). Fundida de Concreto e instalación de piedra Pegada entre el K184333 y el K184340, Cinta Central y laterales. Fundida de placa de cuneta entre el K184497 y el K184505, excavacion para viga riostral y placa de cuneta entre el K184617 y el K184639. Fundida de placa de cuneta entre el K184582 y el K184617 (M.D.).
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (4 horas).

Inspector Interventoria

5-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente (subcontratista) Maestro General, 5 oficiales, 1 Hemero, 3 ayudantes, 2 conductores y 1 operador.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 1 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin). Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K18+283 y el K18+373 (M.I.).
Fundida de Concreto e instalación de piedra Pegada, cinta Central y lateral, entre el K18+310 y el K18+317.
Fundida de placa huella entre el K18+617 y el K18+637.
Se inicia armado de hierro para Vástago de muro 72 en el K18+163 (M.D.).
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (3 horas).

7-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente (subcontratista), Maestro General, 5 oficiales, 1 Hemero, 33 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Vibradores, 3 Vibradores de Concreto, Compactador manual (saltarin). Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+283 y el K18+323 (M.D.).
Fundida de concreto e instalación de piedra Pegada entre el K18+347 y el K18+354, Cinta Central y lateral.
Excavación para viga riostra y placa de cuneta entre el K18+637 y el K18+663.
Se continua armado de hierro y armado de formaleta para Vástago de muro 72 en el K19+163 (M.D.).
Excavación para filtro entre el K18+767 y el K18+781
Estado del Tiempo: Lluvia moderada (2 horas).

8-10-2019: Personal en Obra: Ing. Auxiliar, Ing Residente (subcontratista), Maestro General, 5 oficial, 1 Hemero, 34 ayudantes, 2 Conductores, 1 operador, Profesional SISO.

Equipo: R
dadores, 3 v
Herramien
Actividad
K18+283 y
Fundida de
el K18+3
Fundida
Se termin
72 en el
excavaci
se instala
el K22+
Estado del
Inspector de

19-10-2019: Personal
Maestro G
2 Conduc
Equipo:
1 Vibrador
(Saltarin),
Actividad
ya entre
Fundida
entre el
Fundida
K18+663,
Fundida
Se instala
en obra
Estado del
Inspector

20-10-2019: Personal

Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Mezcladoras, 3 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K184+283 y el K184+323 (M.D.).
Fundida de Concreto e Instalación de Piedra Pegada entre el K184+354 y el K184+361, Cinta Central y laterales.
Fundida de Placa huella entre el K184+637 y el K184+663 (I
Se termina armado de hierro y formaleta para muro 72 en el K194+163 (M.D.).
Excavación para alcantarilla en el K194+680
Se instala materiales para afirmado entre el K227+262 y el K227+278 (M.I.).
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (2 horas).

Inspector de Interventoria

-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente (Subcontratista), Maestro General, 5 oficiales, 4 Fierreros, 35 ayudantes, 2 Conductores, 1 Operador.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Mezcladoras, 3 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K184+323 y el K184+360
Fundida de Concreto e Instalación de Piedra Pegada entre el K184+361 y el K184+370, Cinta Central y laterales.
Fundida de Placa de cuneta entre el K184+617 y el K184+663, costados Derecho e Izquierdo.
Fundida de Vastago de Muro 72 en el K194+163 (M.D.).
Se instala Cama de arena para Tubo P.V.C. de 36" en obra del K194+680. Se realiza Afirmado
Estado del Tiempo: Lluvia moderada (3 horas).

Inspector de Interventoria

-10-2019: Personal en Obra: Ing. Auxiliar, Maestro General,

4 oficiales, 17 ayudantes, 1 Conductor.
Equipo: Camioneta de estacas, 3 Mezcladoras, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo entre el K18+362 y el K18+400. Fundida de bordillo de cuneta entre el K18+823 y el K18+360 (M.D. e Izq.).
Excavación para viga riostras y placa de cuneta Fundida de Concreto e instalación de Piedra Pegada entre el K18+370 y el K18+379, Cinta Central y Peatonales.
Estado del Tiempo: Lluvia moderada: (2 horas)

Inspector Interventoría

21-, -2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente (subcontratista), Maestro general, Ing. Residente Contratista, Profesional SISO, 5 oficiales, 4 Horero, 40 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 4 Mezcladoras, 2 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K18+362 y el K18+400 (M.D.), Se continua armado de formaleta, Corte y doblado de hierro para placa huella y viga riostras.
Continua excavación para viga riostras y placa de cuneta entre el K18+914 y el K18+730. Armado y amarre de hierro.
Desmontado de formaleta en sitio K18+763 (M.D.).
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (3 horas, moderada (5 horas).

Inspector Interventoría

2-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente, Maestro General, Profesional SISO, 6 oficiales, 1 Herrero, 35 Ayudantes, 2 operados, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 4 Mezcladoreo, 2 Vibradores de Concreto, Compactador manual (saltarin).

Herramie
Actividad
entre el
Fundida de
entre el
Fundida
Replanteo
del K18+9
para po
Replanteo
en alcan
Estado del

Inspector I

23-10-2019: Personal
Maestro Ge
Equipo: R
2 Vibrador
Herramien
Actividad
Fundida
entre el
Fundida
K18+966
Armado
entre el
Fundida
K18+830,
Excavaci
K18+964
Corte y
Estado de

Inspector I

21-10-2019: Perso

Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K184+460 y el K184+450. Se funde bordillo.
Fundida de (p) concreto e instalación de piedra pegada entre el K184+370 y el K184+390, cinta central y laterales.
Fundida de placa huella entre el K184+760 y el K184+730.
Replanteo y conformación para disipador en obra del K184+964 (M.D.). Armado de acero y formaleta para poceta. (M.I.).
Replanteo de excavación para poceta y cabezote descole en alcantarilla del K194+68C.
Estado del tiempo: lluvia intensa (3 horas).
Inspector interventoría.

23-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente (subcontratista), Maestro General, 5 oficiales, 3 ayudantes, 1 operador, y Contratista.
Equipo: Retroexcavador, camioneta de estacas, 1 Motosoldadora, 2 vibradores de concreto, Compactador manual (saltarín), Herramienta menor.
Actividades: Limpieza de placa huella construida.
Fundida de concreto e instalación de piedra pegada, entre el K184+390 y el K184+416, cinta central y laterales.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K184+450 y el K184+466 (M.I.) y entre el K184+476 y el K184+486 (M.I.).
Armado de formaleta al K184+505, por la derecha (1 pegue) y entre el K184+450 y el K184+490 (M.D.).
Fundida de placa de cuneta entre el K184+900 y el K184+830, en ambos costados.
Excavación para cajeson de disipador en obra del K184+964 (M.D.). Se instala acero de refuerzo.
Corte y figurado de hierro para placa huella.
Estado del tiempo: lluvia moderada (2 horas).
Inspector interventoría

24-10-2019: Personal en obra: Ings. Director, Residente, Auxiliar,

Profesionales, social, SISO, Maestro General, 6 oficiales, 1 Herrero, 39 ayudantes, 1 operador, 2 conductores.
Equipo: Retroalimentador, Volqueta, Camioneta de estacas, 1 Vibradores, 2 vibradores de Concreto, Compactador manual (saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Barrido y limpieza de placa huella construida. Fundida de Concreto e instalación de piedra pegada entre el K184916 y el K184925, Cinta Central y laterales. Fundida del bordillo de cuneta entre el K181486 y el K184505 (M.I.). y entre el K184450 y el K184490 (M.D.). Armado de formaleta (Continuación). excavación para vigas riostras y placa de cuneta entre el K184682 y el K184700. Armado de (de) formaleta para poceta en obra del K184964(I). Replanteo y conformación de piso para disipador de obra del K184964 (del.D.). Se inicia armado de hierro. Continúa Replanteo de excavación para cabezote y poceta de obra del K184688. Continúa Corte y figurado de hierro para placa huella, vigas y obras transversales. NOTA: Hubo Presencia en obra personal especializado en ambiental por parte del Comité de cafeteros y el Ingeniero Yonh Cano especialista ambiental por parte de interventoría. Estado del tiempo: Lluvia intensa (4 horas).

Inspector Interventoría

5-10-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Auxiliar, Profesional SISO, Maestro General, 6 oficiales, 1 Herrero, 35 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 2 Vibradores de Concreto, Compactador manual (saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Continúa barrido y limpieza de obra Construida. Fundida de Concreto e instalación de piedra Pegada

entre el K
Fundida
K184505 (
Fundida
cinta rep
Fundida
Fundida
(M.D.). Se
Excavación
K184463 (I
Incuneta
Estaple de

Inspector In

26-10-2019: Personal
Siso, Re
1 operador
Equipo:
1 Retroalim
Saltarin
Actividade
Fundida
entre el
Continú
Cuneta
Se fundi
K184700,
Se termin
en obra
Se Cont.
tubos P.L
Estado del

Inspector

28-10-2019: NOTA:

entre el K184+20 y el K184+45, Carta Central y laterales.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K184+490 y el K184+505 (M.D.). Se continúa armado de formaleta.
Fundida de placa huella entre el K184+682 y el K184+700 Cintas reforzadas.
Fundida de Pretil de cierre en obra del K184+964 (M.I.).
Fundida de Caissons para disipador en obra del K184+964 (M.D.). Se funde Tambien Solado.
Excavación para doble tubería en obra Transversal del K194+463 (M.D). Se inicia demolición de muro para instalar Tubo P.V.C. de 36".
Estado del Tiempo: Dia Seco.

Inspector Interventoria

5-10-2019: Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, Profesional Siso, Maestro General, 6 oficiales, 4 Heneros, 35 ayudantes, 1 Operador, 2 Conductor.
Equipo: Retroexcavador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Vibradores, 2 Vibradores de Concreto, Compactador Manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Retiro y limpieza de placa huella contruida. Fundida de Concreto e instalación de Piedra pegada entre el K184+45 y el K184+460, Carta Central y laterales. Continúa armado de formaleta para bordillo de Cuneta.
Se funde placa de cuneta entre el K184+682 y el K184+700, costados derecho e izquierdo.
Se termina armado y armar de hierro para disipador en obra del K184+964 (M.D.).
Se continúa demolición de muro para instalar tubo P.V.C. de 36" en obra transversal del K194+463.
Estado del Tiempo: Lluvia Moderada (2 horas)

Inspector Interventoria

6-10-2019: NOTA: En el dia anterior (Domingo 27, se presentó

Hubo intenso en las horas de la tarde durante 3 horas.
Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, Profesional Social, Maestro General, 5 oficiales, 7 Peones, 2 Ayudantes y operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, camioneta de oficina, 4 Vibradores de Concreto, Compactador manual (saltarin), Planta eléctrica, Herramienta menor.
Actividades: Continúa limpieza de obra Construida.
Retiro de materiales y agua de cajones para pedia pegada.
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+600 y el K18+520, ambos costados.
Replanteo y conformación de piso para último metro de placa entre el K18+730 y el K18+712.
Armado y amarre de hierro de refuerzo para muro de disipador en obra del K18+964 (Der.).
Se inicia excavación para viga riostra en tramo de placa huella del Sector "Venecia".
NOTA: No se ejecutó ninguna actividad de fundida de Concreto.
Estado del Tiempo: Dia Seco.

Inspector Interventoria.

de Tubos y
Continua
amare de
Estado del
Inspector Interv.

30-10-2019: Personal
Maestro Ger
3 Conductore
Equipo: Ret
4 Vibradore
(saltarin), T
Actividades
Se Continu
Fundida de
se realiza ex
en el K19+
Fundida de
en obra de
Se Continu
para pla
Se ejecu de
Transversa
Estado del
Inspector I

-10-2019: Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, Maestro General, 5 Oficiales, 7 Peones, 3 Ayudantes, 2 operadores Conductores,
Equipo: 2 Retrocargadores, Volqueta, camioneta de oficina, 4 Vibradores de Concreto, Compactador manual (saltarin), Planta eléctrica, Herramienta menor
Actividades: Continua para dilatación de bordillo, limpieza de obra Construida.
Selección y labado de Piedra. Fundida de Concreto e instalación de Piedra Pegada. Fundida de bordillo de Cuneta. Armado de formaleta para disipador en obra del K18+964 (Der.).
Se Continua Demolición de muro instalación

31-10-2019: Personal
Profesional S
Conductor, 2 oper
Equipo: 2 R
4 Vibradores
(saltarin), Pla
Actividades:
Fundida de
Fundida de

de Tubo P.V.C. de 36", en obra del K19+163.
Continúa excavación para Viga riostra y armado y amarre de hierro para placa huella en Sector "Venecia".
Estado del Tiempo: Día Seco.

Inspector Interventoría.

-10-2019: Personal en obra: Ing. Director de obra, Auxiliar, Maestro General, 4 oficiales, y Hermes, 35 ayudantes, y operador, 3 Conductores,
Equipo: Retroexcavadora, Volqueta, 2 Camioneta de estacas, 4 Vibradores, 2 Vibradores de Concreto, Compactador manual (saltarín), Planta eléctrica, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de Piedra Pegada (Instalación).
Se Continúa Corte para dilatación de Bordillo de cuneta.
Fundida de Bordillo de cuneta. Armado de formaleta.
Se realiza excavación para caissons para Viga de obra en el K19+113 (M.D.).
Fundida de solados para pantalla y cabezote descole en obra del K19+688.
Se Continúa armado, amarre de hierro, y formaleta para placa huella en el Sector "Venecia".
Se funde solado para Cabezote descole en obra Transversal del K22+265 (M.I.).
Estado del Tiempo: Lluvia moderada (2 horas).

Inspector Interventoría.

-10-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Ing. Residente (Contratista), Profesional Social, Maestro General, 4 oficiales, y Hermes, 10 ayudantes, 2 operadores, 2 Conductores.
Equipo: 2 Retroexcavadoras, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Vibradores, 2 vibradores de Concreto, Compactador manual (saltarín), Planta eléctrica, Herramienta menor,
Actividades: se Continúa Corte para dilatación de bordillo.
Fundida de Concreto e instalación de Piedra Pegada.
Fundida de Bordillo de cuneta y se Continúa armado de
