SERVICIOS DE INGENIERIA
Y
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
INGEVAL S.A.S.

INFORME TECNICO No. 1.

Contrato de Interventoría No:
4600010852 de 2020

Objeto:
"Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de las vías a cargo del departamento de Antioquia en la subregión oriente, del Departamento de Antioquia".



Contrato de obra No:
4600010855 de 2020

Objeto:
"Conservación, mantenimiento y rehabilitación de las vías a cargo del departamento de Antioquia en la subregión oriente".

OCTUBRE 2020

INFORME TECNICO N° 1

Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de las vías a cargo del departamento de Antioquia en la subregión Oriente, del departamento de Antioquia.

INGEVAL S.A.S
Calle 38 N° 32 – 41 Edificio Parque Santander -
E-mail: info@ingevalsas.com.co
Villavicencio - Meta

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº. 4600010852 de 2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
.

CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

CONTRATO DE OBRA Nº. 4600010855 DE 2020

OBJETO:

"Conservación, mantenimiento y rehabilitación de las vías a cargo del Departamento de Antioquia en la subregión oriente".

VERSIÓN N° 01

PERIODO: OCTUBRE 2020

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	RECIBIDO POR:
Yasshir Said Yaya Garzón	**William Valencia Campos**	**Andres Mauricio Rodriguez Collazos**
Residente de Interventoría 01	**Director de Interventoría**	**Supervisor Contrato SIF**

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5
2.1 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR. 5
2.2 LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO. 6
2.3 LISTADO DE VIAS A INTERVENIR. 7
2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO. 8
3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA. 11
3.1 Información general del contrato de obra. 11
3.2 Información general del contrato de Interventoria. 12
4. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 14
4.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA 14
4.2 DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES (ANEXO 5). 17
4.3 RELACION DE ACTAS DE PAGOS PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR. 19
4.4 Control de presupuesto e inversión programado vs. ejecutado. 20
4.5 Control de programación y recursos. 20
4.6 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. 21
4.7 Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones. 22
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA. 23
5.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO. 23
5.2. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: 23
5.3 REVISIÓN TÉCNICA AL AVANCE DE OBRA 24
5.4 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS. 25
5.5 ACTAS DE REUNION. 27
5.6 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 28
5.7 Control correspondencia recibida 28
5.8 Control correspondencia enviada 32
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 34
7. Anexos 37

1. INTRODUCCIÓN.

Mediante licitación pública Nro. LICITACION PUBLICA 10698, la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física (SIF). Adjudicó el contrato N°4600010855 al CONSORCIO VÍAS SCS ORIENTE conformada por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. – CONSINBE S.A.S. 50% - CONSTRUCCIONES SERTOR S.A.S. 50%, cuyo objeto es "Conservación, mantenimiento y rehabilitación de las vías a cargo del Departamento de Antioquia en la subregión oriente". por un valor inicial de $7.109.219.278, AIU incluido y con un plazo de seis (6) meses sin sobrepasar el 11 de diciembre de 2020, contados a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio de actividades.

De igual manera, y con el objeto de garantizar el cumplimiento al contrato y de garantizar la calidad de las obras, la misma entidad adjudico a SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S el contrato N°4600010852 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" por un valor de $759.892.845, incluyendo IVA y CON UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1.77, con un plazo de seis (6) meses sin sobrepasar el 11 de diciembre de 2020, contados a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio de actividades.

El presente informe está dividido en los siguientes capítulos:

GENERALIDADES DEL PROYECTO. Antecedentes y características técnicas del proyecto, así como localización, vías, redes y espacio público a intervenir.

CONTRATOS: De construcción CONTRATO No. 4600010855 y de Interventoría CONTRATO N°4600010852, características principales: objeto, suscripción del mismo, plazo y valor, presupuestos original y actualizado.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA que contribuyan directa o indirectamente con el avance físico del proyecto; y ACTIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS POR LA INTEVENTORÍA respecto al seguimiento y control de cada uno de las actividades realizadas por el contratista.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

En el Departamento de Antioquia existe una problemática constante de orden vial, como se explica más adelante, que requiere de soluciones óptimas y de acciones inmediatas, que permitan dar continuidad a la prestación del servicio de todos los usuarios de las vías de las diferentes subregiones del Departamento. Esto ha hecho que la transitabilidad entre las subregiones se reduzca considerablemente, produciendo deterioro del entorno, aumento en gastos de mantenimiento vehicular y tiempos de desplazamiento más largos por esto se ha presentado deterioro de las vías de la subregión Oriente del Departamento de Antioquia.

Así mismo en los últimos años se ha presentado un acelerado incremento de la población por la migración o retorno de familias hacia la zona, de igual manera esta subregión cuenta con diversos atractivos turísticos que llegan a ser considerados hasta el 80% de ingresos de estos municipios, de igual manera esta zona es considerada una despensa agrícola no sólo para Medellín sino para el Departamento de Antioquia y parte de Colombia, debido a lo anterior se aumenta en forma considerable el uso de las vías por parte de los vehículos que hacen uso de ellas.

2.1 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR.

Ante el proceso de deterioro de las vías de la subregión Oriente, del Departamento de Antioquia, entre los cuales se encuentran pérdidas de banca por efecto de socavación, presencia de baches en la rodadura, existencia de broches sin pavimentar, necesidad de obras de drenaje y estructuras adecuadas que conduzcan las aguas y eviten que ésta transite por la vía, señalización insuficiente, pérdida de visibilidad por efecto de vegetación, afectación de puentes, entre otras, además por la necesidad propia de realizar mantenimientos periódicos y rutinarios a las vías del departamento, se debe realizar, la conservación, rehabilitación y mantenimiento a las vías del Oriente para preservar en óptimas condiciones el estado de las mismas, más aun considerando que de los 994,68 km que tiene dicha subregión, en total 47 vías, el 65% de ellas se encuentran en afirmado, lo que requiere de mantenimientos más continuos con el fin de garantizar la transitabilidad de las vías, 35% de vías pavimentados también presentan un alto deterioro del pavimento, bien sea porque cumplieron con su vida útil o porque algunos tramos de vía presentan afectaciones de tipo geológico, donde ocurren reptaciones y movimientos en masa regionales, que impiden una solución definitiva, requiriendo mitigaciones periódicas en dichos sitios.

La conservación, rehabilitación y mantenimiento constituye una serie de actividades que se ejecutan a lo largo de las vías en busca de preservar todos los elementos de la infraestructura vial, con la mínima cantidad de alteraciones o daños y en lo posible


buscando conservar las condiciones que tenía después de la construcción con el fin de garantizar transitabilidad fluida y segura para los usuarios.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO.



Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_antioque%C3%B1o

Ilustración 1. Ubicación geográfica general de la vía a intervenir Oriente Antioqueño

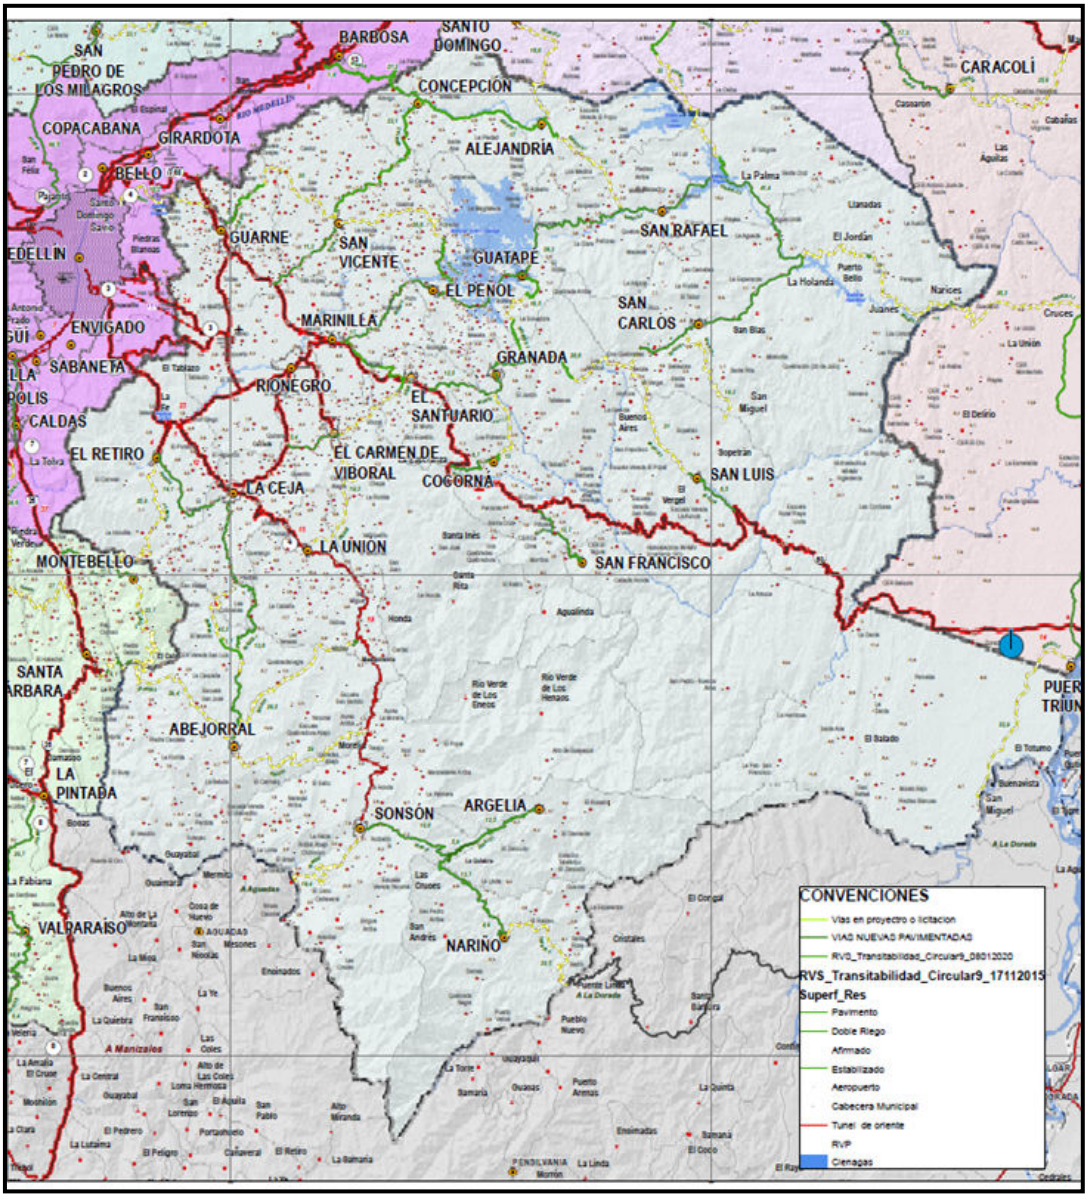

Recuperado de Gobernación de Antioquia

Ilustración 2. Ubicación geográfica general del corredor a intervenir

2.3 LISTADO DE VIAS A INTERVENIR.

Código	Nombre_vía	Subregión_Operativa	Total (km)_Odómetro	Pavimentado (km)_Odómetro	No_Pavimentado (km)_Odómetro
05002VT176	Abejorral - Pantanillo - El Oro	ORIENTE	**36.7**	0.0	36.7
05002VT178	Pantanillo - Guayabal	ORIENTE	**5.8**	0.0	5.8
05002VT250	Altavista - Chagualal	ORIENTE	**7.5**	0.0	7.5
05002VT61	Abejorral - Granadillo	ORIENTE	**7.8**	0.0	7.8
05313VT17	La Quiebra - Santa Ana	ORIENTE	**11.3**	0.0	11.1
05376VT27	La Ceja - San Rafael	ORIENTE	**10.8**	6.6	4.2
05483VT98	Puente Linda - Puerto Venus	ORIENTE	**13.1**	0.0	13.1
05649VT20	Juanes (Peñol Grande) - Alto de Samaná	ORIENTE	**13.1**	0.0	13.1
05652VT04	Autopista - Aquitania	ORIENTE	**32.4**	4.6	27.8
05697VT219	Autopista - Morro	ORIENTE	**6.0**	1.0	5.0
25AN03-1	La Granja (Montebello) - El Retiro	ORIENTE	**25.6**	0.0	25.6
56AN04	La Ceja - El Retiro	ORIENTE	**13.1**	13.1	0.0
56AN05	La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral	ORIENTE	**42.9**	42.9	0.0
56AN05-1	Ramal al Guaico	ORIENTE	**15.8**	0.5	15.3
56AN05-2	Abejorral - El Cairo - La Elvira (Cruce ruta 25)	ORIENTE	**35.5**	3.8	31.7
56AN06	La Unión - El Carmen de Viboral	ORIENTE	**19.3**	0.0	19.3
56AN07	La Frontera (Ruta 56) - Mesopotamia - Abejorral	ORIENTE	**27.6**	1.3	26.3
56AN08	Morelia (Ruta 56) - Abejorral	ORIENTE	**29.0**	0.0	29.0
56AN09	Sonsón - Las Margaritas - Puente San Rafael	ORIENTE	**19.4**	0.0	19.4
56AN10	Sonsón - La Quiebra - Nariño	ORIENTE	**33.4**	32.0	1.4
56AN10-1	La Quiebra - Argelia	ORIENTE	**18.4**	18.4	0.0
56AN10-2	Nariño - Puente Linda	ORIENTE	**20.5**	0.8	19.7
6004A	Santo Domingo Savio - Piedras Blancas - Guarne (Cruce Ruta 60)	ORIENTE	**16.2**	0.0	16.2
60AN12	Guarne - Yolombal - San Vicente	ORIENTE	**25.0**	10.0	15.0
60AN14	Crucero (Cruce Ruta 60) - San Vicente	ORIENTE	**11.3**	11.3	0.0
60AN14-1	San Vicente - El Peñol	ORIENTE	**26.8**	8.5	18.3
60AN15	Marinilla - El Peñol	ORIENTE	**17.0**	17.0	0.0
60AN15-1	Marinilla - El Santuario - Carmen de Viboral - Canadá (No incluye tramos urbanos del Santuario y Carmen de Viboral)	ORIENTE	**28.6**	19.1	9.5
60AN15-2	El Peñol - Guatapé - El Bizcocho - San Rafael (No incluye tramo urbano de Guatapé)	ORIENTE	**37.6**	37.6	0.0
60AN15-2-1	La Aurora - Sonadora - Guatape	ORIENTE	**16.5**	10.0	6.5
60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	ORIENTE	**41.4**	41.4	0.0
60AN16	Autopista - El Ramal - Granada	ORIENTE	**12.5**	12.5	0.0
60AN16-1	Granada - El Chocó - San Carlos	ORIENTE	**39.8**	29.8	10.0
60AN17	Autopista - Cocorná	ORIENTE	**6.7**	6.7	0.0
60AN17-1	Cocorná - El Ramal (Granada)	ORIENTE	**13.0**	1.2	11.8
60AN18	La Piñuela - San Francisco	ORIENTE	**12.7**	12.7	0.0
60AN19	Autopista - San Luís	ORIENTE	**6.5**	6.5	0.0
60AN19-1	San Carlos - Partidas a San Miguel - Los Planes	ORIENTE	**19.3**	0.0	19.3
60AN19-2	San Luís - El Chocó	ORIENTE	**21.0**	0.7	20.3
60AN20-1-1	Cruces - Narices	ORIENTE	**32.9**	5.0	27.9
60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	ORIENTE	**31.9**	1.4	30.5
62AN19	Barbosa - Concepción	ORIENTE	**23.0**	22.3	0.7
62AN19-1	Concepción - Alejandría	ORIENTE	**17.0**	17.0	0.0
62AN19-2	Concepción - San Vicente	ORIENTE	**23.1**	21.9	1.9
62AN22-1-1	San Roque - San Lorenzo - La Palma	ORIENTE	**33.0**	13.4	19.6
62AN22-2	Santo Domingo - Termales - Alejandría	ORIENTE	**18.8**	1.0	17.8
62AN22-2-1	Alejandría - El Bizcocho (San Rafael)	ORIENTE	**18.0**	3.3	14.7
		TOTAL KM	**994.5**		

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

La finalidad del Contrato es proteger de manera oportuna la infraestructura de la red vial en el Departamento de Antioquia, específicamente la que abarca la subregión Oriente. Garantizando con ello la transitabilidad segura para vehículos y peatones,

o restableciéndola en el menor tiempo posible, en caso de que su afectación sea grave que genere suspensión del servicio de tránsito.

Para el logro de este objetivo será necesario adelantar, entre otras, las siguientes actividades:

- Remoción de derrumbes
- Rocería
- Limpieza de obras de drenaje
- Conformación de banca.
- Colocación y compactación de afirmado
- Adecuación y Conformación de Zonas de Depósito
- Rehabilitación y mantenimiento de rasantes
- Señalización horizontal y vertical.
- Bacheos y parcheos
- Suministro e instalación de pavimento
- Construcción de obras de drenaje y sub-drenaje
- Construcción de obras hidráulicas
- Construcción de estructuras de concreto reforzado con y sin cimentaciones profundas
- Construcción y reconstrucción de cunetas
- Construcción de gaviones
- Rehabilitación y mantenimiento de pontones y puentes
- Demarcación horizontal y vertical
- Construcción de obras requeridas para estabilización de taludes o adecuación de zonas de depósito (trinchos, rondas de coronación, filtros, disipadores, drenes horizontales, revegetalización de taludes etc.)
- Georreferenciación
- Diseños, ajustes a estudios, licencias y permisos

La anterior descripción corresponde a las obras generales, el presupuesto establece el alcance real de las obras, de acuerdo con lo determinado por la entidad.

a. Ítems de pago:

- Capítulo 1 – Preliminares
- Capítulo 2 - Demoliciones, corte y retiros
- Capítulo 3 – Cerramientos
- Capítulo 4 - Movimiento de tierras
  - o Subcapítulo 4.1 – Excavaciones
  - o Subcapítulo 4.2 – Llenos
  - o Subcapítulo 4.3 - Conformación del terreno

• Capítulo 5 - Afirmados, bases y sub bases

- Subcapítulo 5.1 - Estructura de pavimento
- Subcapítulo 5.2 - Suelos y bases estabilizadas

• Capítulo 6 - Concreto, morteros
- Subcapítulo 6.1 - Concretos para subestructuras
- Subcapítulo 6.2 - Concretos para estructuras

• Capítulo 7 - Pavimentos y neoprenos
• Capítulo 8 - Obras de drenajes, subdrenaje y protección
• Capítulo 10 - Aceros de refuerzo
• Capítulo 11 - Elementos metálicos y anclajes
• Capítulo 12 - Señalización y pinturas
• Capítulo 13 - Transporte de material
• Capítulo 15 - Manejo de especies vegetales
• Capítulo 18 – Varios

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

3.1 Información general del contrato de obra.

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		4600010855 de 2020	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		11/09/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				29/09/2020	
OBJETO: CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION ORIENTE.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		**CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE** INTEGRANTES: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. – CONSINBE S.A.S. 50% - CONSTRUCCIONES SERTOR S.A.S. 50%	
		NIT		901.398.120-2	
VALOR [$]:		INICIAL:		SIETE MIL CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. ($ 7.109.219.278,00)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		SIETE MIL CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. ($ 7.109.219.278,00) CON VALOR DE AIU DE 30,11%	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				SETECIENTOS DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M.L. ($ 702.045.908) CORRESPONDIENTE AL 15% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO.	
PLAZO:		INICIAL		SEIS (06) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 11 de diciembre de 2020.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				29/09/2020	11/12/2020
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A

	NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500051720
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	18/08/2020
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		LICITACION PUBLICA 10698

3.2 Información general del contrato de Interventoria.

CONTRATO CONVENIO	X☐	NÚMERO:		4600010852 de 2020	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		03/09/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				29/09/2020	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Infraestructura Física.	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S.	
		NIT		822.044.859-1	
VALOR [$]:		INICIAL:		**SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($759.892.845) CON UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1.77**	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	
		VALOR TOTAL:		**SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($759.892.845) CON UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1.77**	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				$ 0 (0%)	
PLAZO:		INICIAL		Seis (6) meses sin superar el 11 de diciembre de 2020	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				29/09/2020	11/12/20
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	
			No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	N/A	

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500051716 y 4500051717
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	25/08/2020
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		10827

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCION DE CRONOGRAMA INTERVENTORÍA (AL 31 DE OCTUBRE DE 2020)		13.25%
% DE EJECUCION DE RECURSOS INTERVENTORÍA (AL 31 DE OCTUBRE DE 2020)		13.25%

4. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA

4.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA

ACTIVIDADES PUNTUALES SEMANA N2:

Vía 60AN15. Marinilla - El Peñol. Se realiza recorrido de diagnóstico (05-Oct-20) en la vía para identificar puntos críticos y el estado de la capa de rodadura del pavimento.

Vía 60AN15-2-2. San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos. Vía 60AN15. Marinilla - El Peñol. Se realiza recorrido de diagnóstico (07-Oct-20) en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir.

Vía 56AN05. La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral. Se realizo recorrido (07-Oct-20), en acompañamiento con la Supervisión de la Gobernación, el Contratista y la Interventoría. Identificando los puntos de críticos a intervenir, referente a rocería, restructuración Víal y direccionamiento de las aguas.

Vía 60AN16. Autopista - El Ramal - Granada. Vía 60AN15-2-1. La Aurora - Sonadora - Guatape. Se realiza recorrido de diagnóstico (08-Oct-20) en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir.

Vía 60AN20-1-1-1. Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda. Vía 60AN16-1. Granada - El Chocó - San Carlos. Se realiza recorrido de diagnóstico (09-Oct-20) en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir.

Se recibe una segunda versión de programa de obra, el cual tampoco se ajusta a los sectores a intervenir, se presenta una distribución en el tiempo iniciando el 01 de octubre involucrando una actividad inicial no contractual, tampoco tiene en cuenta la priorización de tramos entregada por la Gobernación de Antioquia.

Se entrega el Protocolo de Bioseguridad y constancia de entrega a la ARL, anexan certificado donde indica que la aprobación de este depende del levantamiento del periodo de cuarentena.

ACTIVIDADES PUNTUALES SEMANA N3:

Vía 56AN05. La Ceja - Abejorral. Se inicia el mantenimiento manual rocería y limpieza de cunetas. Una vez el contratista entregue los certificados de disposición de materiales y registros que evidencien la implementación de protocolos de Bioseguridad y EPPs, serán avaladas las cantidades ejecutadas.

Vía 60AN15. Marinilla - El Peñol. Se inicia el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas. Una vez el contratista entregue los certificados de disposicion de materiales y registros que evidencien la implementación de protocolos de Bioseguridad y EPPs, serán avaladas las cantidades ejecutadas.

Vía 60AN15-2-2. San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos. Se inicia el mantenimiento manual rocería y limpieza de cunetas. Una vez el contratista entregue los certificados de disposición de materiales y registros que evidencien la implementación de protocolos de Bioseguridad y EPPs, serán avaladas las cantidades ejecutadas.

Vía 60AN15 Marinilla - El Peñol. Se inicia la demarcación de pavimentos para intervención del Contratista.

Vía 60AN14-1. San Vicente - El Peñol. Km7+800. Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir, en acompañamiento del Contratista y la Supervisión de la Gobernación. I.E.R. Palmira.

El 20 de octubre se hizo visita con el especialista en Geotecnia, Ing. Gonzalo Hincapié especialista en geotecnia, en los puntos críticos de la vía Guatape – San Rafael km16+400,

Se recibe una nueva versión del SGSST y el sábado 24 de octubre se realiza una reunión virtual tratando de dar luces para lo que se viene solicitando.

El 21 de octubre se realizó comité en la gobernación de Antioquia en compañía de el Ingeniero Julián Parra, Oscar David y Andrés Rodríguez, representantes de la Gobernación, Omar Oquendo representante de la interventoría y Huberto Serna representante del contratista,

El presente informe se evalúa de acuerdo con la segunda versión de programa entregado por el Contratista, el cual como se indicó en el informe anterior, tenia errores, pero se adoptan los valores programados en el mismo. Se anexan a este informe el flujo de caja del programa versión 2 entregado.

El 22 de octubre se hizo visita con el especialista del contratista a la escuela de San Vicente del Peñol y a la aleta del puente El Ramal- Guaico Vía la Ceja Abejorral. Igualmente, los parches donde se propone ejecutar adoquín en diferentes partes de la dicha vía, lo anterior a partir del especialista del Contratista, quien pasará un informe la semana del 26 al 31 de octubre, para dar la solución a dichos sitios.

El 24 de octubre, se realizó reunión virtual, en acompañamiento con el contratista, la interventoría y la supervisión, donde se acordó lo siguiente:

En el km0+900 Vía Autopista- Granada se intervendrá el punto critico con costales en suelo cemento y guadua, solución propuesta por el contratista y avalada por la supervisión ingeniero Mauricio Rodríguez, por lo tanto la interventoría revisara la posible solución y el contratista será responsable de la construcción y estabilidad de dicha solución, además se definió que la cantidad de afirmado a colocar en la Vía Narices – Juanes – El Jordán será de 5000 m3 de afirmado, procedentes de la cantera Positos, y se colocaran en toda la vía conformada y entre el tramo Juanes – El Jordán se instalara afirmado en los huecos mas profundos habilitando el corredor.

ACTIVIDADES PUNTUALES SEMANA N4:

Vía 56AN05. La Ceja - Abejorral. Continua el mantenimiento manual rocería y limpieza de cunetas.

Vía 60AN16. Autopista - El Ramal - Granada. Se inicia el mantenimiento manual rocería y limpieza de cunetas. Se atiende el hundimiento de la Vía por medio de un relleno que busca restituir parcialmente el paso.

Vía 60AN15. Marinilla - El Peñol. Continua el mantenimiento manual rocería y limpieza de cunetas. Se procede con el marcado de la Vía en los sectores a intervenir el asfalto de acuerdo con las patologías presentadas en la Vía. El 23 de octubre Se realiza recorrido en compañía del contratista, interventoría y supervisión por parte de la Gobernación para verificar puntos a intervenir con fresado de pavimento y parcheo.

Vía 60AN15-2-2. San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos. Continua el mantenimiento manual rocería y limpieza de cunetas.

Vía 60AN15-2-1. La Aurora - Sonadora - Guatape. Inicia el mantenimiento manual rocería y limpieza de cunetas.

El 26 de octubre se inicia recorrido con alojamiento en el recorrido, para llegar a la Vía Las Cruces - Juanes para ser intervenida de acuerdo con instrucciones de la Supervisión en una longitud de 32 km. Con un presupuesto aproximado de $400MM en Narices - Cruces, y $400MM en Narices-Juanes.

El 28 de octubre se realiza la Reunión de Socialización para Inicio del Proyecto en el Municipio de El Peñol.

Se hace visita con el contratista, Supervisor y un Diputado de la Gobernación a Santo Domingo Savio para definir la construcción de un muro de contención con las características de diseño de la Gobernación.

ACTIVIDADES PUNTUALES SEMANA N5:

Vía 60AN18. La Piñuela - San Francisco. Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 6+000 al km 12+700.

Vía 56AN10. Sonson - La Quiebra - Nariño. Durante la presente semana inicia la actividad de rocería, limpieza de obras y cunetas del k31+500 al k33+400.

Vía 60AN19-2 San Luís - El Chocó. Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto.

Vía 60AN16. Autopista - El Ramal - Granada. Se continua el mantenimiento manual rocería y limpieza de cunetas. Inicia la construcción de muro en costales de suelo cemento en el k0+900.

Vía 60AN15. Marinilla - El Peñol. Continua el mantenimiento manual rocería y limpieza de cunetas. Inicio de actividades de fresado e instalación de pavimento k0+000. Fresado, instalación de mezcla asfáltica parcheo km0+000 margen derecha y K0+800.

Vía 60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordán - La Holanda. Durante la presente semana se inicia la conformación de la calzada y mejoramiento de esta con motoniveladora del km 0+000 al km 7+000.

Vía 60AN15-2-2. San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos. Continua el mantenimiento manual rocería y limpieza de cunetas. Continua remoción de derrumbes entre los km 19+300 al km 31+500.

Vía 60AN15-2-1. La Aurora - Sonadora - Guatape. Continua la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 6+000 al km 11+500.

4.2 DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES (ANEXO 5).

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Item	Actividad	Un	Cant	Valor ($)
	CAPITULO 2 - DEMOLICIONES, CORTE Y RETIROS			
2.3	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros.	m3	34,04	5.222.457
	CAPITULO 4 - MOVIMIENTO DE TIERRAS			
	SUBCAPITULO 4.1 – EXCAVACIONES			

4.1.8	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	18,00	403.362
4.1.57	Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los materiales.	m3	7.211,50	38.192.104
	SUBCAPITULO 4.2 – LLENOS			
4.2.4	Lleno manual para estructuras con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación	m3	66,00	3.830.772
	SUBCAPITULO 4.3 - CONFORMACION DEL TERRENO			
4.3.2	Conformación de la calzada con motoniveladora. Incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	19.040,00	26.446.560
4.3.6	Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo a las dimensiones, alineamientos y pendientes de la vía.	m2	18.200,00	29.647.800
	CAPITULO 5 - AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES			
	SUBCAPITULO 5.1 - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			
5.1.1	Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	314,00	16.899.166
5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.362,50	175.495.950
	CAPITULO 6 - CONCRETO, MORTEROS			
	SUBCAPITULO 6.1 - CONCRETOS PARA SUBESTRUCTURAS			
6.1.19	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	32,40	925.052
	CAPITULO 7 - PAVIMENTOS Y NEOPRENOS			
7.1.6	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para Bacheos, que cumpla con el Artículo 450-13. Incluye marcación de la zona fallada, suministro y riego de emulsión asfáltica para el ligado de paredes demarcadas y de la base granular, limpieza de la superficie y demarcación, compactación de la mezcla y todo el sistema constructivo necesario para cumplir a satisfacción esta actividad (como cortes y protección de elementos entre otros). No incluye cargue y transporte de escombros provenientes del corte que se pagará en su respectivo ítem, al igual que la Subabase y base granular para bacheo que se pagaran en el item correspondiente	m3	34,04	40.187.284
	CAPITULO 8 - OBRAS DE DRENAJES, SUBDRENAJE Y PROYECCIÓN			
8.2	Limpieza mecánica de cunetas	m3	1.100,00	31.838.400
8.3	Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	un	476,00	43.190.336
8.4	Limpieza de cunetas en concreto, incluye acarreo interno	ml	100.759,00	116.175.127
8.50	Rondas de Coronación en sacos de polipropileno (suelo cemento 5:1, 60Cm *70cm)	ml	714,00	25.340.574
	CAPITULO 13 - TRANSPORTE DE MATERIAL			
13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	39.410,09	58.563.388

13.3	Transporte de material proveniente de derrumbes. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m	m3-km	211.564,05	242.029.273
	CAPITULO 15 - MANEJO DE ESPECIES VEGETALES			
15.8	Rocería. Incluye cargue, trasporte y disposición adecuada de material resultante	Ha	43,15	33.073.785
	CAPITULO 18 - VARIOS			
18.1	Obreros por Administración. Incluye factor prestacional.	jor	23,00	1.768.102
	SUBTOTAL OBRAS			**$889.229.492**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (Incluye IVA)				**0**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)				**0**
GEOREFERENCIACION (Incluye IVA)				**0**
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA)		***Estimado***		**0**
PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA - PAPSO (Incluye IVA)		-		**0**
PORCENTAJE EJECUTADO				**12,51%**

4.3 RELACION DE ACTAS DE PAGOS PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 7.109.219.278	$ 0	$ 0	$ 7.109.219.278
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 7.109.219.278	$ 0	$ 0	$ 7.109.219.278
4. Anticipos	$ 738.995.893	$ 0	$ 0	$ 738.995.893
5. Recursos pagados / desembolsados Acta No. 1	$ 889.229.492	$ 0	$ 0	$ 889.229.492
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 1.628.225.385	$ 0	$ 0	$ 1.628.225.385
7. Recursos ejecutados	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8. Recursos no ejecutados	$ 5.480.993.893	$ 0	$ 0	$ 5.480.993.893


CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO/ DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	11/09/2020	$7.109.219.278		N/A		$7.109.219.278
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No.1 / Anticipo	08/11/2020		$ 738.995.893	N/A	$ 738.995.893	N/A
Pago No.2 / Acta 01	13/11/2020		$ 889.229.492	$ 102.516.658	$ 815.128.715	$6.191.524.445
TOTALES		$7.109.219.278	$ 1.628.225.385	$ 102.516.658	$ 815.128.715	$6.191.524.445


4.4 Control de presupuesto e inversión programado vs. ejecutado.


			Del 13 a 19 de octubre de 2020	Del 20 a 26 de octubre de 2020	Del 27 de octubre al 01 de noviembre de 2020	Del 02 al 08 de noviembre de 2020
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
MENSUAL PROGRAMADA	$ -	$ -	$ 36,456,604	$ 251,750,949	$ 249,341,737	$ 322,542,144
ACUMULADA PROGRAMADA	$ -	$ -	$ 36,456,604	$ 288,207,554	$ 537,549,291	$ 860,091,434
MENSUAL EJECUTADA	$ -	$ -	$ -	$ 81,718,744	$ 438,221,491	$ 369,289,257
ACUMULADA EJECUTADA	$ -	$ -	$ -	$ 81,718,744	$ 519,940,235	$ 889,229,492

			Del 13 a 19 de octubre de 2020	Del 20 a 26 de octubre de 2020	Del 27 de octubre al 01 de noviembre de 2020	Del 02 al 08 de noviembre de 2020
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
% PROGRAMADO	0.00%	0.00%	0.53%	4.18%	7.80%	12.48%
% EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	1.19%	7.54%	12.90%

4.5 Control de programación y recursos.

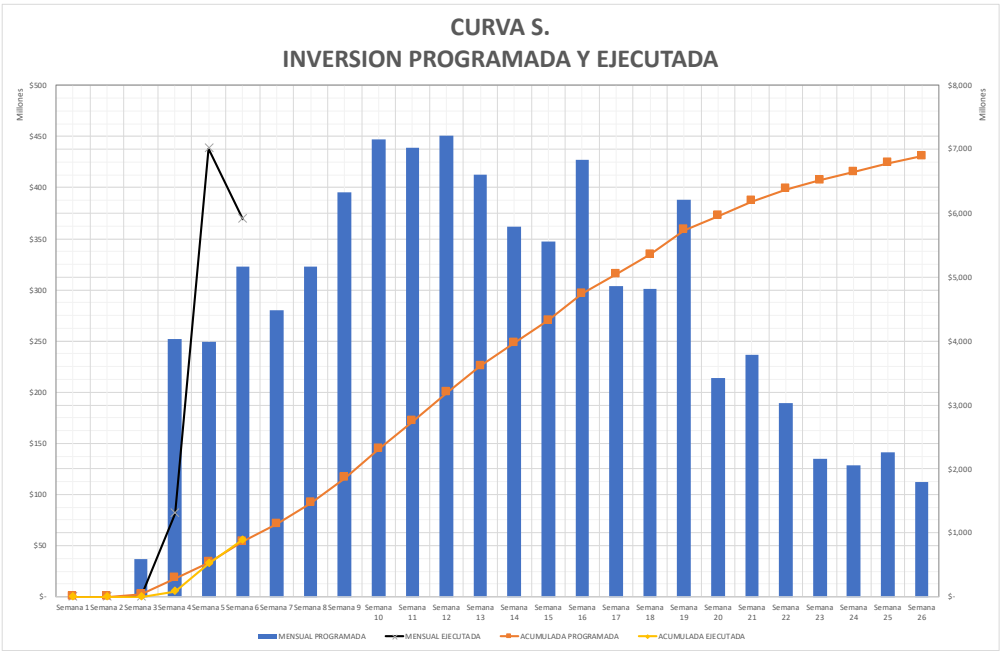

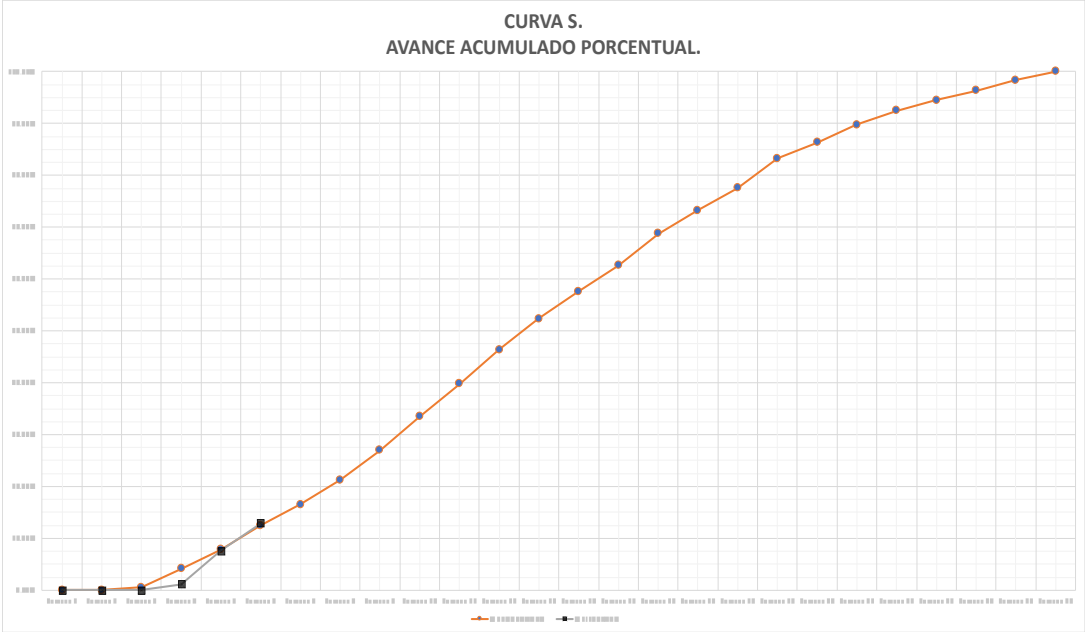

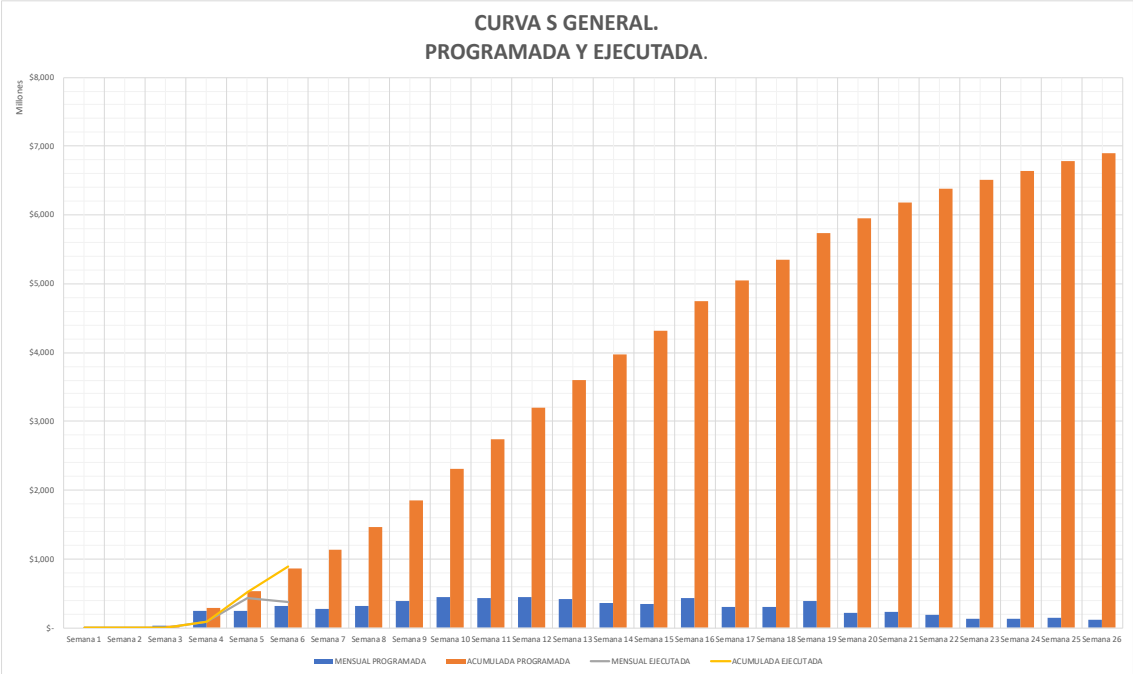

4.6 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4.7 Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones.

A la fecha, la última modificación a cantidades de obra legalizada fue realizada en el acta de obra #1 y actualizada inmediatamente en el acta parcial de cobro de obra #1 radicada por el Contratista, por tanto, se presenta el modificatorio del acta en el Anexo 5.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA.

5.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

El contrato de Interventoría ha mantenido constancia en la ejecución de sus labores físicas y financieras, donde, se ha estado ejecutando el acta de cobro No. 1 correspondiente al periodo del 29/09/2020 hasta el 31/10/2020. Se presenta un avance en las labores de acompañamiento y supervisión adecuada de las actividades ejecutadas por el Contratista.

Igualmente, se realiza control de calidad en las siguientes áreas, control de topografía, control aplicació n de Normas y Especificaciones técnicas vigentes, verificación de los requisitos mínimos exigidos contractualmente para el personal del contratista, aprobación o rechazo de los diferentes materiales utilizados en obra, verificación del cumplimiento de las normas de seguridad industrial y manejo Ambiental.

5.2. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

En cumplimiento al Contrato No. 4600010852, la Interventoría ejecutó las actividades acordes con el desarrollo de la obra, entre las cuales se destacan:

Supervisar y verificar la ejecución del contrato de obra, a fin de garantizar a la Secretaria de Infraestructura Física (SIF) el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y financieros, contables, jurídicos y ambientales de tal forma que se cumpla con la finalidad del contrato.

Realizar recorridos técnicos a fin de detectar y priorizar necesidades en las vías que enmarcan el objeto del contrato.

Supervisión y revisión de todas las actividades de construcción y mantenimiento con el fin de garantizar la calidad en la ejecución de la obra.

Acompañamiento en la socialización de las obras con las comunidades en las zonas de intervención.

Controlar diariamente las obras ejecutadas, en los diferentes frentes de trabajo a fin de verificar las cantidades de obra ejecutadas en cada periodo, para determinar los avances de obra y autorizar las actas de pago, según los términos que se estipulan en el respectivo contrato de obra.

Participación de los profesionales de Interventoría en las reuniones que se han llevado a cabo con el fin de aclarar asuntos técnicos del proyecto.

Colaboración en la gestión ante las respectivas entidades públicas o privadas en el trámite que se requiera para el normal desarrollo y ejecución de la obra.

Realizar reuniones periódicas, con una frecuencia periódica con la Supervisión de Infraestructura Física.

Verificación del cumplimiento del contratista con relación a las obligaciones en el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscal que corresponda.

Verificar el cumplimiento Ambiental con relación a todos los puntos que están realizando actividades y estar alerta y hacer seguimiento a los trámites que se realicen antes de abrir un nuevo frente, los cuales deben estar acorde con el cumplimiento Ambiental según normas

Elaboración de informes requeridos contractualmente y otros solicitados por la Supervisión.

Elaborar el libro de Bitácora diaria

5.3 REVISIÓN TÉCNICA AL AVANCE DE OBRA

Topografía realiza revisión de anchos de la vía, conformación general de la calzada y resultado final de la vía.

Se verifica correctamente la documentación de maquinaria y personal de la empresa obreros y administrativos.

Revisión de documentos presentados por parte del Contratista.

Se reciben y revisan las hojas de vida de Contratista de Obra, siendo aprobadas por la Interventoría.

Se lleva acabo las mediciones de cantidades de obra ejecutadas para conciliación final y se realiza el acta de obra # 1.

Se solicita al Contratista que presente documentación a Interventoría que evidencie el cumplimiento normativo y operativo de equipos y maquinaria.

Se recibe una primera version de programa de obra, el cual no se ajusta a los sectores a intervenir, se presenta una distribucion en el tiempo iniciando el 01 de octubre, sin tener en cuenta la priorizacion de tramos entregada por la Gobernacion de Antioquia. Adicionalmente, erroneamente se programan actividades que evaluadas en este periodo, ya arrojarian inclumplimento. Posteriormente, el Contratista solicita plazo para el 30 de octubre de 2020 para entregar la informacion acorde a los terminos de los pliegos de condiciones, lo cual no se cumple y la Interventoria tiene que elaborar el documento necesario para el seguimiento.

El Plan de Manejo de Transito, se aprueba para presentación ante los Entes Municipales en segunda versión, cuando el Contratista atiende las observaciones/recomendaciones de la Interventoria.

5.4 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS.

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
29-09-2020	Se realiza el recorrido inicial para identificación de puntos de atención contractuales.
03-10-2020	Se realizo recorrido en la vía autopista Medellín Bogotá- vereda Aquitania, conjuntamente por Contratista, Interventoría y el Geólogo Jesús Zapata por parte de la SIFA, en el PR+31 se evidencia una perdida total de banca, erosión laminar del talud superior e inferior y en la parte inferior del talud se evidencia el paso de una quebrada del sector, la cual está ayudando al desconfinamiento del sector, según recomendación del geólogo se debe realizar una obra hidráulica (disipador de energía de 1.5 m). 05652VT04 Autopista - Aquitania km 31+500.
05-10-2020	Vía 60AN15. Marinilla - El Peñol. Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y el estado de la capa de rodadura del pavimento.
06-10-2020	Se realiza un encuentro presencial para desarrollar encuadre e inicio con el equipo social de interventoría, Contratista y Gobernación de Antioquia.
07-10-2020	Vía 60AN15-2-2. San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos. Vía 60AN15. Marinilla - El Peñol. Se realiza recorrido de diagnóstico para identificar puntos críticos y obras a intervenir. Vía 56AN05. La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral. Se realizo recorrido), en acompañamiento con la Supervisión de la Gobernación, el Contratista y la Interventoría. Identificando los puntos de críticos a intervenir, referente a rocería, restructuración Vial y direccionamiento de las aguas.
07-10-2020	Se tiene un encuentro virtual con la Supervisión Social de la Gobernación de Antioquia y el área de comunicaciones de la Gobernación, en la cual se establecieron los objetivos que se deben cumplir y se expusieron las expectativas de la Gobernación respecto al Área Social de interventoría y se recepciona el manual de imagen para la elaboración de las piezas de comunicación.
08-10-2020	Vía 60AN16. Autopista - El Ramal - Granada. Vía 60AN15-2-1. La Aurora - Sonadora - Guatape. Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir.

09-10-2020	Vía 60AN20-1-1-1. Narices - Juanes - El Jordán - La Holanda. Vía 60AN16-1. Granada - El Chocó - San Carlos. Se realiza recorrido de diagnóstico para identificar puntos críticos y obras a intervenir.
14/10/2020	Reunión presencial entre el equipo social de la Gobernación de Antioquia-Interventoría-Contratista, para definir los lineamientos de la estrategia de Información y participación con los grupos de interés asociados al proyecto.
16/10/2020	Reunión en la Institución Educativa Palmira en la Vía San Vicente - El Peñol, con asistencia de la Gobernación de Antioquia, DAPARD, Secretaria de Educación Departamental, Alcaldía del Peñol, Interventoría y Contratista, con el fin de abordar problemática en dicha escuela, debido a posibles riesgos o incidentes naturales.
20/10/2020	Se hizo visita con el especialista en Geotecnia, Ing.Gonzalo Hincapié especialista en geotecnia, en los puntos críticos de la vía Guatatape – San Rafael km16+400, donde se encuentra un muro fallado y al km25+800 donde se presenta hundimiento en vía al parecer por fallas geológicas y existe un muro construido en mantenimientos anteriores el cual presenta fracturas. El especialista conceptúa que se debe hacer un levantamiento topográfico en ambos puntos, para luego pasar un informe diagnosticando la intervención a seguir. Por lo tanto, la interventoría ordena hacer el respectivo levantamiento topográfico a través del topógrafo de la interventoría. A realizarse en la siguiente semana.
21/10/2020	Se recibe una nueva versión del SGSST y el se realiza una reunión virtual tratado de dar luces para lo que se viene solicitando.
22/10/2020	Se hizo visita con el especialista del contratista a la escuela de San Vicente del Peñol y a la aleta del puente El Ramal- Guaico Vía la Ceja Abejorral. Igualmente, los parches donde se va ejecutar adoquín en diferentes partes de la dicha vía, donde el especialista pasara un informe la semana del 26 al 31 de octubre, para dar la solución a dichos sitios.
24/10/2020	El 24 de octubre, se realizó reunión virtual, en acompañamiento con el contratista, la interventoría y la supervisión, donde se acordó lo siguiente: En el km0+900 Vía Autopista- Granada se intervendrá el punto critico con costales en suelo cemento y guadua, solución propuesta por el contratista y avalada por la supervisión ingeniero Mauricio Rodríguez, por lo tanto la interventoría revisara la posible solución y el contratista será responsable de la construcción y estabilidad de dicha solución, además se definió que la cantidad de afirmado a colocar en la Vía Narices – Juanes – El Jordán será de 6000 m3 de afirmado, procedentes de la cantera Positos, y se colocaran en toda la vía conformada y entre el tramo Juanes – El Jordán se instalara afirmado en los huecos mas profundos habilitando el corredor
24/10/2020	Recorrido rocería Vía Marinilla-Peñol y acompañamiento a marcación de Parcheo vía Marinilla – Peñol, desde el área ambiental.
26/20/2020	Se realiza recorrido, para llegar a la Vía Las Cruces - Juanes para ser intervenida de acuerdo con instrucciones de la Supervisión en una longitud de 32 km. Con un presupuesto aproximado de $400MM en Narices - Cruces, y $400MM en Narices-Juanes.
28/10/2020	Se realiza Reunión de Socialización de Inicio del Proyecto en el Municipio de El Peñol.

29/10/2020	Se hace visita con el contratista y Supervisor a Santo Domingo Savio para definir la construcción de un muro de contención con las características de diseño de cartillas de la Gobernación.

5.5 ACTAS DE REUNION.

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
25-09-2020	Reunión de inicio entre Gobernación, Contratista e Interventoría, donde se definen los lineamientos generales de las áreas y se imparten directrices a cumplir en la ejecución del Contrato.
13-10-2020	Comité de Obra entre Interventoría y Contratista, donde se presenta el equipo de personal de proyecto y se coordinan las actividades a iniciar. Temas tratados: Iniciación de actividades, programa de obra y documentación SST, Ambiental y Bioseguridad. Se hace un llamado de atención a la información que se recibe por parte del área ambiental y SST del Contratista.
15-10-2020	Comité de Obra. Temas tratados: Iniciación de actividades y varios. Asiste: Gobernación de Antioquia, Contratista de Obra, Interventoría. Se priorizan y se entregan oficialmente los puntos de atención inmediata y prioritaria al Contratista.
21-10-2020	Se realizó comité en la gobernación de Antioquia en compañía de el Ingeniero Julián Parra, Oscar David y Andrés Rodríguez, representantes de la Gobernación, Omar Oquendo representante de la interventoría y Huberto Serna representante del contratista, donde se trataron los siguientes temas: Obras que se están ejecutando en la actualidad y en qué estado están. Se aclaro que se estaban interviniendo 5 frentes de rocería los cuales son Marinilla – Peñol, La Ceja – Abejorral, San Carlos – San Rafael, Autopista – Granada, Aurora – Sonadora, La piñuela – San Francisco. Se esta haciendo la demarcación de las zonas de fallo en la vía Marinilla – Peñol, para evaluar la cantidad y proceder con la ejecución del parcheo y fresado. Obras para empezar: Mantenimiento la Narices – Juanes – Jordán – La Holanda, donde el contratista se comprometió a empezar al día siguiente 22 de octubre, llevando la maquinaria al sitio de la obra. El contratista se comprometió a iniciar las obras en Autopista – Aquitania el día 26 de octubre, con un disipador con geomembrana de acuerdo con las instrucciones que dará el ingeniero de suelos de la Gobernación Jesús Zapata. Igualmente se debe evaluar la forma de dar paso provisional a carros livianos urgentemente. Mitigación del km0+900 Autopista – Granada. El contratista solicita entregar el programa contractual de obra en las condiciones requeridas para un correcto seguimiento de la curva S, desarrollándolo a partir de la matriz de prioridad entregada por la Gobernación incluida en el documento base elaborado por la interventoría (se anexa a este informe el documento entregado por la Interventoría como base). Se le concede plazo para el viernes 30 de octubre.

5.6 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1.Recursos iniciales comprometidos	$ 759.892.845	$ 0	$ 0	$ 759.892.845
2.Adicion 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3.TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 759.892.845	$ 0	$ 0	$ 759.892.845
4.Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados/desembolsados	$ 100.691.470	$ 0	$ 0	$ 100.691.470
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 100.691.470	$ 0	$ 0	$ 100.691.470
7.Recursos ejecutados	$ 100.691.470	$ 0	$ 0	$ 100.691.470
8.Recursos no ejecutados	$ 659.201.375	$ 0	$ 0	$ 659.201.375

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	03/09/2020	$ 759.892.845				$ 759.892.845
Adición 1	N/A					
Anticipo	N/A					
Pago No.1 / Desembolso	20/11/2020		$ 100.691.470		$ 100.691.470	$ 659.201.375
TOTALES		$ 759.892.845	$ 100.691.470		$ 100.691.470	$ 659.201.375

5.7 Control correspondencia recibida

N° RADICADO	FECHA	DESTINATARIO		REMITENTE			ASUNTO	N° FOLIOS	CLASE
AAAAMMDD N.R	DD/MM/ AAAA	NOMBRE	RAZON SOCIAL	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD			
CVSCS-001-202	17/09/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Respuesta a su solicitud de información del contrato.	1	OFICIO
	23/09/20	CLAUDIA TRUJILLO	INGEVAL SAS	ANDRES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	Goobernacion Antioquia	Aprobacion hojas de vida del personal de interventoria	9	OFICIO
CVSCS-002-202	25/09/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Entrega hojas de vida personal y documentos de maquinaria para aprobacion	2 y un rar	OFICIO
CVSCS-003-202	25/09/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Solicitud revision y aprobaion Contrato de Fideicomiso	26	OFICIO
CVSCS-005-2020	25/09/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Solicitud revision y aprobacion Plan de Inversión del Anticipo.	2	OFICIO
CVSCS-006-2021	29/09/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Entrega de APU´S ajustados.	100	OFICIO

CVSCS-007-2020	29/09/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Envió hoja de vida – Ingeniero Residente II	39	OFICIO
20200929	29/09/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ANDRES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	Goobernacion Antioquia	tramitar el formato adjunto como requisito para la implementación de los protocolos de bioseguridad de los contratos.	1	OFICIO
CVSCS-008-2020	30/09/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Entrega hv del geotecnista	23	OFICIO
CVSCS-009-2020	30/09/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Alcance al comunicado CVSCS-005-2020 – Plan de inversión del Anticipo	2	OFICIO
20201001	1/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Revision Certificacion - Tecnico de obra Wilman Muñoz	1	OFICIO
CVSCS-0010-2020	1/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Actualización de Pólizas.	7	OFICIO
CVSCS-0012-2021	1/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Plan de manejo SST, PMT y Protocolo de Bioseguridad.	1+3 anexos	OFICIO
correo 01/10/2020	1/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Entrega APU en excell	1 excell	Excell
CVSCS-0012-2021	1/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Entrega de la programacion en project	1+ project	OFICIO
correo 01/10/2020	1/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Entrega Plan de inversion del anticipo	1	Excell
CVSCS-0013-2021	1/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Entrega calculo AIU	3	OFICIO
CVSCS-0014-2022	2/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	DOCUMENTOS AFILIACION DE OBRA	40	OFICIO
	2/10/20	Jesús María Zapata Zapata	Profesional Universitario	Ing. Julián D Parra Valencia	Director de Desarrollo Físico		Deslizamiento en talud inferior que compromete la banca en el km 30+750. Vía: Autopista - Aquitania km 30+750 Sector El Yalí zona suburbana del corregimiento Aquitania	5	INFORME
N/A	2/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	informe de seguimiento para su revision y firma para poder dar tramite al cobro del anticipo.	4	INFORME
N/A	5/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	informe de seguimiento para su revision y firma para poder dar tramite al cobro del anticipo.	4	INFORME
N/A	4/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Vías a intervenir con los convenios de mantenimientos manuales con los municipios de Oriente.	Excell	Excell
CORREO	4/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ltorres@consinbe.com	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Por medio de la presente me permito enviar diligenciado el formato de seguimiento del contrato No. 1 para realizar el tramite del cobro de anticipo para su revision y aprobacion.	word	CORREO

CORREO	4/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ltorres@consinbe.com	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Vías a intervenir con los convenios de mantenimientos manuales con los municipios de Oriente.	Excell	CORREO
CORREO	4/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ANDRES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	Goobernacion Antioquia	Remito el acta de inicio según el asunto para su firma por parte de la interventoría y el ingeniero Torres.	Excell	CORREO
CORREO	5/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ANDRES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	Goobernacion Antioquia	Se requiere de manera prioritaria para el contrato de mantenimiento, un registro fotográfico, fotos tomadas desde el mismo punto y sentido, de los frentes que se vayan abriendo, por lo cual, envío el formato adjunto, para diligenciamiento	Excell	CORREO
CORREO	6/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ANDRES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	Goobernacion Antioquia	Remito el acta según el asunto para su firma por parte de la interventoría y el ingeniero Torres.	Excell	CORREO
CORREO	6/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ltorres@consinbe.com	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Entrega de PMA Y PMT Corregidos	1 Folio + 2 archivos	CORREO
CORREO	6/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ANDRES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	Goobernacion Antioquia	Remitimos ejemplo de presentación de protocolo de bioseguridad al comite de Covid de la gobernación para su implementación.	Po	CORREO
CORREO	6/10/20	ANDRES RODRIGUEZ	Goobernacion Antioquia	ltorres@consinbe.com	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Solicitud documentos a la gobernacion para contrato de fiducia	1	CORREO
CORREO	7/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ltorres@consinbe.com	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Envío lista de vías de la Subregión Oriente las cuales están a cargo del Departamento de Antioquia	EXCELL	CORREO
CORREO	7/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ltorres@consinbe.com	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Mediante el presente correo nos permitimos solicitar que la correspondencia y envío de documentos del contrato de obra No. 4600010855 "Conservación, mantenimiento y rehabilitación de las vías a cargo del departamento de Antioquia en la subregion oriente", se realice a partir de la fecha al correo electrónico cvialscsoriente@gmail.com con copia al correo ltorres@consinbe.com.	CORREO	CORREO
CORREO	9/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ANDRES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	Goobernacion Antioquia	Requerimos con carácter urgente la revisión y aprobación del anticipo del contrato de obra, acorde a las diferentes actividades a atender acorde a las necesidades de obra y la aprobación del plan de bioseguridad.	CORREO	CORREO

CORREO	9/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ltorres@consinbe.com	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Documentos plan de inversion del anticipo	CORREO	CORREO
CVSCS-020-202	9/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ltorres@consinbe.com	Representante Legal	Consorcio Vial SCS Oriente	Solicitud respuesta u observaciones al PMA y Protocolo	IFUCUI	CORREO
CORREO	11/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	ANDRES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	Goobernacion Antioquia	Remito matriz de priorización en Excel para que por favor sea elaborada acorde a la matriz de inversión por vías que le fue remitida al inicio del contrato, ahora se requiere que se pase a este formato en Excel, para el próximo 14 de octubre (sin fotos por ahora), y que sea remitida a la supervisión. De igual manera le solicito nos sea remitidos los contratos de todo el personal de la interventoría y las afiliaciones correspondientes a la seguridad social, dado que ya se cuenta con acta de inicio	CORREO	CORREO
CORREO	13/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	jas.consinbe@gmail.com		Consorcio Vial SCS Oriente	Adjunto programación de obra del proyecto	CORREO	CORREO
CORREO	14/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	umser58@hotmail.com	Director de obra	Consorcio Vial SCS Oriente	Matriz de peligros	CORREO	CORREO
CORREO	14/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	vialorientesst@gmail.com	SST OBRA	Consorcio Vial SCS Oriente	seguimiento realizado a la ARL AXA COLPATRIA para revisión y/o aprobación del protocolo de BIOSEGURIDAD	CORREO	CORREO
CORREO	14/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	umser58@hotmail.com	PMA	Consorcio Vial SCS Oriente	Anexamos PMA con las observaciones corregidas. Algunas de estas están referidas a los Anexos y programas del contrato según los lineamientos de la Gobernación de Antioquia.	CORREO	CORREO
CVSCS-019-2020	14/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	vialorientesst@gmail.com	SST OBRA	Consorcio Vial SCS Oriente	Estamos entregando las correcciones y observaciones al PMSST y del PBS,	CORREO	CORREO
CORREO	15/10/20	ruben.arroyo@antioquia.gov.co	Goobernacion Antioquia	ANDRES RODRIGUEZ	SUPERVISOR	Goobernacion Antioquia	Rendimientos financieros del contrato	CORREO	CORREO
CVSCS-022-2021	16/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	cvialscsoriente@gmail.com	Director de obra	Consorcio Vial SCS Oriente	Cambio de riesgo Personal rocería.	OFICIO	CORREO
CVSCS-023-2021	16/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	cvialscsoriente@gmail.com	Director de obra	Consorcio Vial SCS Oriente	Aprobacion protocolo de bioseguridad por parte de la ARL	OFICIO	CORREO
CVSCS-023-2024	16/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	cvialscsoriente@gmail.com	Director de obra	Consorcio Vial SCS Oriente	Remitimos las afiliaciones a la caja de compensación del personal de rocería del subcontratista Juan Esteban Arcila.	OFICIO	CORREO
CVSCS-020-2025	17/10/20	ING.WILLIAM VALENCIA	INGEVAL SAS	cvialscsoriente@gmail.com	Director de obra	Consorcio Vial SCS Oriente	Visita punto crítico en Km 1+900, vereda Palmarcito en la vía Autopista - El Ramal – Granada (60AN16).	OFICIO	CORREO

5.8 Control correspondencia enviada

CUI	FECHA	CODIGO (C.I -38-007-19)	DESTINATARIO			ASUNTO	RECIBIO
			ENTIDAD	CARGO	NOMBRE		
1	8/09/20	**C.I-40- 4600010852-2020-001**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Solicitud documentacion inicial	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co
2	15/09/20	**C.I-40- 4600010852-2020-002**	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	R/L	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Solicitud documentacion inicial	ltorres@consinbe.com
3	28/09/20	**C.I-40- 4600010852-2020-003**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Entrega acta de inicio revisada y aprobada	ltorres@consinbe.com
4	30/09/20	**C.I-40- 4600010852-2020-004**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Aprobación contrato fidecomiso.	ltorres@consinbe.com Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co
5	28/09/20	**C.I-40- 4600010852-2020-005**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Verificación Hojas de Vida profesionales y técnicos Contrato de Obra.	ltorres@consinbe.com Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co
6	2/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-006**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	DIRECTOR DE OBRA	HUMBERTO SERNA RAMIREZ	Observaciones al Plan De Manejo De Transito (PMT) en obra.	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co
7	2/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-007**	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	DIRECTOR DE OBRA	HUMBERTO SERNA RAMIREZ	Observaciones al SGSST Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	ltorres@consinbe.com
8	2/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-008**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Verificación Hojas de Vida profesionales y técnicos Contrato de Obra.	ltorres@consinbe.com
9	7/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-009**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Aprobacion hoja de vida del geotecnista	ltorres@consinbe.com Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co
10	8/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-010**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Entrega de protocolo de bioseguridad.	ltorres@consinbe.com Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co
11	8/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-011**	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	DIRECTOR DE OBRA	HUMBERTO SERNA RAMIREZ	Observaciones PMA	ltorres@consinbe.com Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co
12	9/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-012**	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	R/L	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Entrega Plan de Inversion de Anticipo e Informe Seguimiento para Anticipo aprobados .	ltorres@consinbe.com Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co
13	9/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-013**	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	R/L	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	Entrega del PMT y revisados y corregidos.	ltorres@consinbe.com Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co
14	9/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-014**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Entrega de Plan de Callidad	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co
15	17/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-015**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Revision deSST PARA CORRECCIONES	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co
16	17/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-016**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Entrega revision de protocplo de bioseguridada para correcciones	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co
17	26/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-017**	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	Representante Legal	Atn. Dr. LUIS CARLOS TORRES	Observaciones al PMA	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co
18	27/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-018**	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	Representante Legal	Atn. Dr. LUIS CARLOS TORRES	Revision deSST PARA CORRECCIONES	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co
19	30/10/20	**C.I-40- 4600010852-2020-019**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Verificación Hojas de Vida Residente Tecnico 02.	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co

20	3/11/20	**C.I-40- 4600010852-2020-020**	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	Representante Legal	Atn. Dr. LUIS CARLOS TORRES	Notificación de incumplimiento en procedimiento social acordado.	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co
21	3/09/20	**C.I-40- 4600010852-2020-021**	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	Representante Legal	Atn. Dr. LUIS CARLOS TORRES	APROBACIOM PMA	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co
22	3/11/20	**C.I-40- 4600010852-2020-022**	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	Representante Legal	Atn. Dr. LUIS CARLOS TORRES	Aprobacion canteras del proyecto	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co
23	9/11/20	**C.I-40- 4600010852-2020-023**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SUPERVISOR	ANDRÉS RODRÍGUEZ	Aprobacion Plan de Manejo Ambiental.	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co
24	9/11/20	**C.I-40- 4600010852-2020-024**	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	Supervisora Ambiental	ING. DIANA URIBE	Entrega de informe ambiental 01.	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co
25	9/11/20	**C.I-40- 4600010852-2020-025**	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	Representante Legal	Atn. Dr. LUIS CARLOS TORRES	Abstencion de repsuesta	Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co gestiondocumental@antioquia.gov.co

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las siguientes son las conclusiones y recomendaciones del informe mensual para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2020:

- El inicio de actividades por parte del contratista se dio en actividades cómo roceria, atencion de derrumbes, mantenimientos mecánicos, conformación de calzada y parcheos.

- Ha sido muy lenta la entrega de documentación y por ende ingreso de equipos y personal a los distintos frentes de obra. Pese a esto, el avance en el primer mes de ejecución fue acorde a lo programado con un ligero nivel de ejecución por encima del programa general.

- Esta pendiente la entrega del programa de obra, en las condciones necesarias para un adecuado seguimiento del programa.

Para el area ambiental, se concluye:

- Se dio inicio a la actividad de rocería, sin embargo se evidenció que no se ha retirado de manera oportuna el material vegetal aledaños a los frentes de obra.
- Se le solicitó a la residente ambiental la entrega oportuna de puntos ecológicos y respectivos rótulos para identificación a todos los frentes de obra.
- El contratista debe iniciar los trámites de permisos ambientales a los que dé lugar.
- El contratista no hizo entrega de los certificados de materiales de construcción por las canteras que cuentan con los permisos ambientales y mineros para la explotación de estos.
- Se recomienda realizar constantes capacitaciones ambientales en los frentes de obra para evitar algún tipo de inconveniente ambiental.
- Se debe seguir ejecutando limpieza y aseo en los frentes de trabajo después de terminada la jornada diaria, con el fin de que no se generen impactos negativos.
- Enviar a la interventoría los documentos de la maquinaria y los vehículos antes que estos ingresen a la obra para que puedan ser evaluados y aprobados previamente al ingreso.
- Dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones establecidas en el pliego de condiciones del contrato de obra y actas de comité realizadas.
- El contratista debe tener presente que a todo el personal que ingrese al proyecto debe hacérsele inducción ambiental y capacitación respectiva al cronograma de capacitaciones.

- Se debe tener en cuenta entregar todos los soportes y anexos necesarios para la elaboración de los informes mensuales en el tiempo requerido.
- El contratista no ha hecho entrega de informes semanales requeridos en el oficio C.I 40-4600010852-2020-015.

En el componente SST se presentan:

- Se le solicita al contratista implementar el Sistema de Gestión y seguridad en el trabajo, dando cumplimiento a la Resolución 0312/2019.
- Se le solicitó el acta de conformación de brigada de emergencia. Dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones establecidas en el pliego de condiciones del contrato de obra.
- Se debe tener en cuenta entregar todos los soportes y anexos necesarios para la elaboración de los informes mensuales en el tiempo requerido.
- Realizar de forma oportuna y funcional las inspecciones y preoperacionales de campo que se requieren para la identificación de peligros y riesgos, tanto en equipos maquinas, herramientas y personas.
- Tener actualizado los indicadores de gestión según los ausentismos en el periodo ya sea por EL; AT, EG.
- La interventoría solicita la conformación de la brigada de emergencia.
- La interventoría solicita de manera oportuno la entrega de permiso de trabajo.
- Se le solicita al contratista, anexar las inspecciones – lista de chequeos - preoperacionales del kit de emergencia (botiquines, extintores, camilla), instalaciones de oficinas, herramientas manuales.
- Se le solicita al contratista, establecer una meta porcentual de accidentalidad prevista, como punto de referencia para evaluar y comparar su efectividad SG-SST.
- Interventoria solicita ejecutar a la cabalidad el plan de trabajo SST o cronograma de actividad SST en conformidad a lo aprobado.
- Se le recuerda al contratista, que siempre se debe trabajar en beneficio del bienestar, y de la seguridad integral de los trabajadores

En el area social se puede concluir:

- El relacionamiento con los grupos de interés ha sido de gran importancia para viabilizar la actividad técnica y potenciar los impactos positivos del proyecto. En este sentido, las actividades de socialización y participación con las comunidades y autoridades territoriales, ha permitido cumplir con el cronograma de las obras y generar impactos positivos como la contratación de mano de obra local y la dinamización de la economía.
- La implementación del mecanismo de quejas y reclamos ha permitido garantizar espacios de interacción directa con las comunidades, las

comunidades han manifestado que este tipo de estrategias brindan tranquilidad frente a los posibles impactos que se puedan presentar durante las etapas del proyecto.

- Por último, se resalta que el trabajado articulado entre la Gobernación de Antioquia, el contratista y la interventoría ha posibilitado llevar a cabo el objetivo conjunto del proyecto.

7. Anexos

Anexo 1. Informes semanales Interventoria. Semana N1 a N6.
Anexo 2. Acta de Obra No. 01.
Anexo 3. Acta de Mayores y Menores cantidades No. 01.
Anexo 4. Actas de reunión durante este periodo.
Anexo 5. Bitácora.
Anexo 6. Seguridad social y aportes del personal del Contratista.
Anexo 7. Seguridad social y aportes del personal de Interventoría.

ANEXO 1.

Informes semanales Interventoria. Semana N1 a N6.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

CONTRATO No: 4600010852 de 2020 **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE

FECHA: 4 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 1 Del: 29/09/20 Al: 4/10/20

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6

Nombre de los Supervisores: ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO

VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN OPERATIVA ORIENTE

LONGITUD KM: 994.5

EJECUCIÓN DE OBRA A 04 DE OCTUBRE DE 2020

Los valores se remiten al costo total del contrato (Incluye el AU DEL 30.11%).

OBRA PROGRAMADA	**Programa de Obra por definir.**		**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA**		
	PROGRAMADA	**EJECUTADA**		**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**BALANCE OBRA (+ o -)**
Obra Financiera %	0.00%	0.00%	OBRA EJECUTADA ACUMULADA %	0.00%	0.00%	0.00%
Valor de la Obra programada:	$ -	$ -	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ -	$ -	$ -
Valor de interventoría	$ -	$ 25,536,639.00	Valor interventoría.	$ 25,536,639.00	Ejecución física a la fecha Atrasada %	0.00%
			Ejecución física programada	0.00%		0.00%

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	Interventor:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S.
Contrato N°:	4600010855 de 2020	Contrato N°:	4600010852 de 2020
Valor total con adiciones:	$7,109,219,278.00	Valor total con adiciones:	$759,892,845.00
Plazo total con Prórrogas:	6 Meses	Plazo total con Prórrogas:	6 Meses
Fecha de Inicio	29/09/20	Fecha de Inicio:	29/09/20
Fecha de terminación:	28/03/21	Fecha de terminación	28/03/21

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
Buldócer	0
Retroexcavadora de Orugas	0
Motoniveladora	0
Retro cargador de Llantas	0
Tanque irrigador de agua	0
Vibro compactador 10 Ton	0
Clasificadora de Materiales	0
Mezcladora de concreto de 1 M3	0
Volquetas de 14 m3	0
Vehículos transporte de personal	0
Equipos de topografía	0
Carro taller	0
Camión turbo	0
Camioneta	4
Mini cargador	0
	4

PERSONAL OBRA		**PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA**		**PERSONAL INTERVENTORIA**	
Director de Obra	1	Operadores de Maquinaria	0	Ing. Director de interventoría	1
Ingeniero Residente de Obra	2	Conductores Volquetas, NPR y camionetas	0	Ing. Residente de Interventoría	2
Tecnólogo civil	2	Obreros(Oficiales-Ayudantes)	0	Ing. Residente SST	1
Ingeniero Ambiental	1	Controladoras Vehiculares	0	Profesional Ambiental	1
Especialista en Geotecnia Vial / Pavimentos	1	Topografía	0	Secretaria	1
Tecnólogo SST (siso)	1	Soldador.	0	Tecnólogo SST (siso)	0
Residente social	1	Apuntadores	0	Profesional Social	1
		Mecánico	0	Auxiliar administrativa	0
		Oficios varios	0	Tecnólogo Topógrafo	0
		Cuadrilla de pavimento	0	Cadeneros	0
		Cadeneros	0	Tecnólogo construcciones	3
		Encargado de obra	0	Abogado gestión predial	0
		Ingeniero forestal	0	Conductores	0
		Auxiliar forestal.	0		
		Abogado predial	0		
		Ingeniero Predial.	0		
PERSONAL DE LA ZONA	**9**	**LABORANDO**	**0**	**TOTAL INTERVENTORIA**	**10**

INFORMACION TECNICA

Se realiza el recorrido inicial para identificacion de puntos de atención contractuales (29/09/20). Ve anexo fotográfico.

Se reciben y revisan las hojas de vida de Contratista de Obra, siendo aprobadas por esta Interventoría.

Se recibe y se aprueba el Plan de inverison del Anticipo (versión corregida).

Se realizo recorrido en la vía autopista Medellín Bogota- vereda Aquitania, conjuntamente por Contratista, Interventoría y el Geólogo Jesús Zapata por parte de la SIFA, en el PR+31 se evidencia una perdida total de banca, erosion laminal del talud superior e inferior y en la parte inferior del talud se evidencia el paso de una quebrada del sector, la cual está ayudando al desconfinamiento del sector, según recomendación del geólogo se debe realizar una obra hidráulica (disipador de energía de 1.5 m). 05652VT04 Autopista - Aquitania km 31+500.

INFORMACION AMBIENTAL

PMA	Se recibe versión inicial del PMA, se contesta sin ser validada por falta de cumplimiento de los componentes contractuales necesarios.

INFORMACION SST

PMT	Se recibe versión inicial del PMT, se responde solicitando atender aspectos faltantes.
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	No se recibe documentacion por parte del Contratista al respecto.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Se recibe versión inicial del documento, se responde siin aceptación por no contener el minimo de los requisitos de Ley.

El contratista aun no comienza la ejecución de actividades y está conmpletando la documentacion preliminar para el inicio del contrato.

DIRECTOR INTERVENTORIA	ING. WILLIAM VALENCIA CAMPOS
RESIDENTE INTERVENTORIA	ING. YASSHIR SAID YAYA GARZON

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**CONTRATO No: 4600010852 DE 2020**	
	OBJETO:	**OBETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE.**

FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO: Del 29 de Septiembre al 4 de octubre de 2020		
10/03/20			
	Se realizo recorrido en la vía autopista Medellín Bogota- vereda aquitania, se realiza recorrido conjuntamente por contratista, interventoría y el geólogo Jesús zapata por parte de la SIFA, en el PR 31 se evidencia una perdida total de banca, erocion laminal del talud superior e inferior y en la parte inferior del talud se evidencia el paso de una quebrada del sector, la cual está afectado al desconfinamiento del sector, según recomendación del geólogo se debe realizar una obra hidráulica (disipador de energía de 1.5 m).		
	05652VT04 Autopista - Aquitania km 31+500	05652VT04 Autopista - Aquitania km 31+500	05652VT04 Autopista - Aquitania km 31+500
30/09/20			
	Recorrido reconocimiento en compañía de la Supervisión del Departamento, Interventoría y Contratista, en la vía El Peñol-Guatape- el Bizcocho San Rafael, identificando los puntos críticos y las obras a intervenir.		
	60AN15-2 El Peñol - Guatape - El Bizcocho - San Rafael Colapso muro de contensión km15+200 margen derecha.	60AN15-2 El Peñol - Guatape - El Bizcocho - San Rafael, Perdida de la banca km21+800 margen derecha, revisar diseño establecido para ejecutar.	60AN15-2 El Peñol - Guatape - El Bizcocho - San , Perdida de la banca km 22+500 diseño cartilla.
30/09/20			
	Recorrido reconocimiento en compañía de la Supervisión del Departamento, Interventoría y Contratista, en la vía Alejandria - El Bizcocho, identificando los puntos críticos y las obras a intervenir.		
	62AN22-2-1 Alejandria - El Bizcocho, Construcción de cunetas margen izquierda km0+150	62AN22-2-1 Alejandria - El Bizcocho, Reposición de aleta izquierda y muro en gaviones revestido km2+000	62AN22-2-1 Alejandria - El Bizcocho, perdida del talud margen derecha de la estructura de la via, realizar muro en gaviones revestido km2+000

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

CONTRATO No: 4600010852 de 2020 **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE

FECHA: 11 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana:	2	Del:	5/10/20	Al:	11/10/20
Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato:			13		
Nombre de los Supervisores:	ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS				

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	**LONGITUD KM: 994.5**
VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN OPERATIVA ORIENTE	

EJECUCIÓN DE OBRA A 11 DE OCTUBRE DE 2020

Los valores se remiten al costo total del contrato (Incluye el AU DEL 30.11%).

OBRA PROGRAMADA	**Programa de Obra por definir.**		**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA**		
	PROGRAMADA	**EJECUTADA**		**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**BALANCE OBRA (+ o -)**
Obra Financiera %	0.00%	0.00%	OBRA EJECUTADA ACUMULADA %	0.00%	0.00%	0.00%
Valor de la Obra programada:	$ -	$ -	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ -	$ -	$ -
Valor de interventoría	$ -	$ 25,880,389.00	Valor interventoría.	$ 51,417,028.00	Ejecución física a la	0.00%
			Ejecución física programada	0.00%	fecha Atrasada %	0.00%

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	Interventor:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S.
Contrato N°:	4600010855 de 2020	Contrato N°:	4600010852 de 2020
Valor total con adiciones:	$7,109,219,278.00	Valor total con adiciones:	$759,892,845.00
Plazo total con Prórrogas:	6 Meses	Plazo total con Prórrogas:	6 Meses
Fecha de Inicio	29/09/20	Fecha de Inicio:	29/09/20
Fecha de terminación:	28/03/21	Fecha de terminación	28/03/21

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
Buldócer	0
Retroexcavadora de Orugas	0
Motoniveladora	0
Retro cargador de Llantas	0
Tanque irrigador de agua	0
Vibro compactador 10 Ton	0
Clasificadora de Materiales	0
Mezcladora de concreto de 1 M3	0
Volquetas de 14 m3	0
Vehículos transporte de personal	0
Equipos de topografía	0
Carro taller	0
Camión turbo	0
Camioneta	4
Mini cargador	0
	4

PERSONAL OBRA		**PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA**		**PERSONAL INTERVENTORIA**	
Director de Obra	1	Operadores de Maquinaria	0	Ing. Director de interventoría	1
Ingeniero Residente de Obra	2	Conductores Volquetas, NPR y camionetas	0	Ing. Residente de Interventoría	2
Tecnólogo civil	2	Obreros(Oficiales-Ayudantes)	0	Ing. Residente SST	1
Ingeniero Ambiental	1	Controladoras Vehiculares	0	Profesional Ambiental	1
Especialista en Geotecnia Vial / Pavimentos	1	Topografía	0	Secretaria	1
Tecnólogo SST (siso)	1	Soldador.	0	Tecnólogo SST (siso)	0
Residente social	1	Apuntadores	0	Profesional Social	1
		Mecánico	0	Auxiliar administrativa	0
		Oficios varios	0	Tecnólogo Topógrafo	0
		Cuadrilla de pavimento	0	Cadeneros	0
		Cadeneros	0	Tecnólogo construcciones	3
		Encargado de obra	0	Abogado gestión predial	0
		Ingeniero forestal	0	Conductores	0
		Auxiliar forestal.	0		
		Abogado predial	0		
		Ingeniero Predial.	0		
PERSONAL DE LA ZONA	**9**	**LABORANDO**	**0**	**TOTAL INTERVENTORIA**	**10**

INFORMACION TECNICA

Se recibe la primera version de programa de obra, el cual no se ajusta a los sectores a intervenir, se presenta una distribucion en el tiempo iniciando el 01 de octubre, sin tener en cuenta la priorizacion de tramos entregada por la Gobernacion de Antioquia. Adicionalmente, erroneamente se programan actividades que evaluadas en este periodo, ya arrojarian inclumplimento.

Se entrega para cobro del anticipo, el Informe de Seguimiento debidamente firmado.

Se entrega el Protocolo de Bioseguridad de la Interventoría.

Se recibe versión del PMA y del PMT. El primer documento aún no incluye lo solicitado por Interventoría. El PMT se aprueba para radicacion ante los Entes de Transito.

Via 60AN15. Marinilla - El Peñol. Se realiza recorrido de diagnóstico (05-Oct-20) en la vía para identificar puntos críticos y el estado de la capa de rodadura del pavimento.

Via 60AN15-2-2. San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos. Via 60AN16-1. Granada - El Chocó - San Carlos. Se realiza recorrido de diagnóstico (06-Oct-20) en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir.

Via 60AN15-2-2. San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos. Via 60AN15. Marinilla - El Peñol. Se realiza recorrido de diagnóstico (07-Oct-20) en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir.

Via 56AN05. La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral. Se realizo recorrido (07-Oct-20), en acompañamiento con la Supervisión de la Gobernación, el Contratista y la Interventoria. Identificando los puntos de críticos a intervenir, referente a roceria, restructuración vial y direccionamiento de las aguas.

Via 60AN16. Autopista - El Ramal - Granada. Via 60AN15-2-1. La Aurora - Sonadora - Guatape. Se realiza recorrido de diagnóstico (08-Oct-20) en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir.

Via 60AN20-1-1-1. Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda. Via 60AN16-1. Granada - El Chocó - San Carlos. Se realiza recorrido de diagnóstico (09-Oct-20) en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir.

INFORMACION SOCIAL

Se realiza un encuentro presencial para desarrollar encuadre e inicio con el equipo de interventoría, Contratista y Gobernación de Antioquia.
Se tiene un encuentro virtual con la Supervisión Social de la Gobernación de Antioquia, en la cual se establecieron los objetivos que se deben cumplir y se expusieron las expectativas de la Gobernación respecto al Área Social de interventoría.
Se sostiene un encuentro virtual con el área de comunicaciones de la Gobernación de Antioquia y se recepcionó manual de imagen para la elaboración de las piezas de comunicación.
Se mantiene asesoría continúa y orientación al area social del contratista respecto a la estrategia de información y participación con grupos interés.

INFORMACION AMBIENTAL

Por parte de la Gobernación se reciben los lineamientos ambientales para el proyecto.
Se recibe segunda versión del PMA y se procede a revisarlo.

PMT	Se recibe segunda versión inicial PMT, aprobandose para radicacación en los Entes de Transito de los municipios con influencia.
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	No se recibe documentacion por parte del Contratista al respecto.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	La información recibda NO es acorde con el proyecto y a lo reglamentado por la Ley Vigente.

El contratista aun no comienza la ejecución de actividades y continua con la entrega de la documentacion preliminar para el inicio del contrato.

Es muy deficiente (o nulo) el contenido de los documentos entregados en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

DIRECTOR INTERVENTORIA	ING. WILLIAM VALENCIA CAMPOS
RESIDENTE INTERVENTORIA	ING. YASSHIR SAID YAYA GARZON


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No: 4600010852 DE 2020	
OBJETO:	OBETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE.

FECHA — **REGISTRO FOTOGRAFICO**

PERIODO: Del 5 al 11 de octubre de 2020

5/10/20








Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y el estado de la capa de rodadura del pavimento.

60AN15 Marinilla - El Peñol KM 3+800	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 13+800	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 2+100

7/10/20



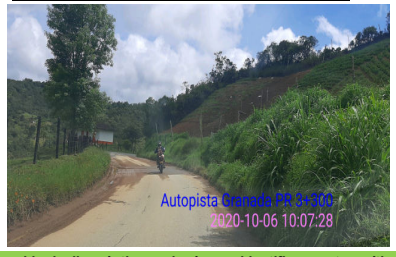



Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN16 Autopista - El Ramal - Granada KM 3+300	60AN16 Autopista - El Ramal - Granada KM 0+700

6/10/20







Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

6/10/20







Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir

60AN16-1 Granada - El Chocó - San Carlos KM 3+100	60AN16-1 Granada - El Chocó - San Carlos KM 6+100	60AN16-1 Granada - El Chocó - San Carlos KM 6+300

7/10/20







Se realizo recorrido La Ceja - Abejorral, en acompañamiento con la Supervisión de la Gobernación, el Contratista y la Interventoria. Identificando los puntos de críticos a intervenir, referente a roceria, restructuración vial y direccionamiento de las aguas

56AN05 La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral, restauración vial, consultar diseño Adoquín para tráfico pesado km9+700, km10+000, km10+100, km10+700, km13+200.	56AN05 La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral, perdida de la Aleta margen izquierda del puente Rio Piedras Blancas y colapso de la estructuta de la via en el km11+900.	56AN05 La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral, pedida de la banca de la via margen derecha muro con diseño existente km21+800.

8/10/20







Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir

60AN16 Autopista - El Ramal - Granada KM 5+900, Socavación de la via por vertimientos del predio aledaño, solictra visita CORNARE y reparcheo	60AN16 Autopista - El Ramal - Granada KM 5+500, Evaluación de intervención con un muro (cartilla o diseño).	60AN16 Autopista - El Ramal - Granada KM 0+900, Recuperar la sección de la via.

8/10/20







Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir, socavación de la estructura del pavimento (base) en los costados por escorrentía, adecuar la entrada y salida de los muros pantalla para contriol de aguas.

60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape	60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape	60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km2+200 realizar cuneta margen izquierda en diirección a la alcantarilla existente, y realizar muro en gaviones margen izquierda

9/10/20







Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir

60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda, Recubrimiento de muro en gaviones y ampliación del mismo de 3x3.

9/10/20







Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir

60AN16-1 Granada - El Chocó - San Carlos KM 24+400	60AN16-1 Granada - El Chocó - San Carlos KM 24+400	60AN16-1 Granada - El Chocó - San Carlos KM 24+400

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

CONTRATO No: 4600010852 de 2020 **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE

FECHA: 18 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 3 Del: 12/10/20 Al: 18/10/20

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 20

Nombre de los Supervisores: ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO

VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN OPERATIVA ORIENTE

LONGITUD KM: 994.5

EJECUCIÓN DE OBRA A 11 DE OCTUBRE DE 2020

Los valores se remiten al costo total del contrato (Incluye el AU DEL 30.11%).

OBRA PROGRAMADA	**Programa de Obra por definir.**		**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA**		
	PROGRAMADA	**EJECUTADA**		**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**BALANCE OBRA (+ o -)**
Obra Financiera %	0.00%	0.00%	OBRA EJECUTADA ACUMULADA %	0.00%	0.00%	0.00%
Valor de la Obra programada:	$ -	$ -	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ -	$ -	$ -
Valor de interventoría	$ -	$ 26,648,930.00	Valor interventoría.	$ 78,065,958.00	Ejecución física a la fecha Atrasada %	0.00%
			Ejecución física programada	0.00%		0.00%

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	Interventor:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S.
Contrato N°:	4600010855 de 2020	Contrato N°:	4600010852 de 2020
Valor total con adiciones:	$7,109,219,278.00	Valor total con adiciones:	$759,892,845.00
Plazo total con Prórrogas:	6 Meses	Plazo total con Prórrogas:	6 Meses
Fecha de Inicio	29/09/20	Fecha de Inicio:	29/09/20
Fecha de terminación:	28/03/21	Fecha de terminación	28/03/21

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
Buldócer	0
Retroexcavadora de Orugas	0
Motoniveladora	0
Retro cargador de Llantas	0
Tanque irrigador de agua	0
Vibro compactador 10 Ton	0
Clasificadora de Materiales	0
Mezcladora de concreto de 1 M3	0
Volquetas de 14 m3	0
Vehículos transporte de personal	0
Equipos de topografía	0
Carro taller	0
Camión turbo	1
Camioneta	4
Mini cargador	0
	5

PERSONAL OBRA		**PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA**		**PERSONAL INTERVENTORIA**	
Director de Obra	1	Operadores de Maquinaria	0	Ing. Director de interventoría	1
Ingeniero Residente de Obra	2	Conductores Volquetas, NPR y camionetas	0	Ing. Residente de Interventoría	2
Tecnólogo civil	2	Obreros(Oficiales-Ayudantes)	12	Ing. Residente SST	1
Ingeniero Ambiental	1	Controladoras Vehiculares	0	Profesional Ambiental	1
Especialista en Geotecnia Vial / Pavimentos	1	Topografía	0	Secretaria	1
Tecnólogo SST (siso)	1	Soldador.	0	Tecnólogo SST (siso)	0
Residente social	1	Apuntadores	0	Profesional Social	1
		Mecánico	0	Auxiliar administrativa	0
		Oficios varios	0	Tecnólogo Topógrafo	0
		Cuadrilla de pavimento	0	Cadeneros	0
		Cadeneros	0	Tecnólogo construcciones	3
		Encargado de obra	0	Abogado gestión predial	0
		Ingeniero forestal	0	Conductores	0
		Auxiliar forestal.	0		
		Abogado predial	0		
		Ingeniero Predial.	0		
PERSONAL DE LA ZONA	**9**	**LABORANDO**	**12**	**TOTAL INTERVENTORIA**	**10**

INFORMACION TECNICA

Se recibe una segunda version de programa de obra, el cual tampoco se ajusta a los sectores a intervenir, se presenta una distribucion en el tiempo iniciando el 01 de octubre involucrando una actividad inicial no contractual, tampoco tiene en cuenta la priorizacion de tramos entregada por la Gobernacion de Antioquia.

Se recibe una nueva versión del SGSST, la cual NO se acepta por estar claramente presentada con errores básicos como estar direccionados a Riesgo I, II y III.

Se entrega el Protocolo de Bioseguridad y constancia de entrega a la ARL, anexan certificado donde indica que la aprobación del mismo depende del levantamiento del periodo de cuarentena.

Se recibe segunda versión del PMA y presenta un contenido mucho mas centrado al proyecto, se valida parcialmente, quedando por complementar dentro del plazo contractualmente establecido.

Se realiza Comite de Obra en las instalaciones del Contratista en Marinilla el 13-Oct-20. Temas tratados: Iniciacion de actividades, programa de obra y documentación SST, Ambiental y Bioseguridad.

Se realiza Comite de Obra en la ciudad de Medellin el 15-Oct-20. Temas tratados: Iniciacion de actividades y varios. Asiste: Gobernación de Antioquia, Contratista de Obra, Interventoría.

Via 56AN05. La Ceja - Abejorral. Se inicia el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas. Una vez el contratista entregue los certificados de disposicion de materiales y registros que evidencien la implementacion de protocolos de Bioseguridad y EPPs, serán avaladas las cantidades ejecutadas.

Via 60AN15. Marinilla - El Peñol. Se inicia el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas. Una vez el contratista entregue los certificados de disposicion de materiales y registros que evidencien la implementacion de protocolos de Bioseguridad y EPPs, serán avaladas las cantidades ejecutadas.

Via 60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos. Se inicia el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas. Una vez el contratista entregue los certificados de disposicion de materiales y registros que evidencien la implementacion de protocolos de Bioseguridad y EPPs, serán avaladas las cantidades ejecutadas.

Via 60AN15 Marinilla - El Peñol. Se inicia la demarcacion de pavimentos para intervención del Contratista.

Via 60AN14-1. San Vicente - El Peñol. Km7+800. Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir, en acompañamiento del Contratista y la Supervisión de la Gobernación. I.E.R. Palmira.

INFORMACION SOCIAL

Reunión presencial entre el equipo social de la Gobernación de Antioquia-Interventoría-Contratista, para definir los lineamientos de la estrategia de Información y participación con los grupos de interés asociados al proyecto.
Comunicación con Gobernación de Antioquia para establecer punto de ubicación de la Valla de Obra.
Comunicación con Alcaldía de El Peñol para establecer permisos para ubicación de una valla informativa.

INFORMACION AMBIENTAL

Reunión en la Institución Educativa Palmira en la via San Vicente - El Peñol, con asistencia de Gobernación de Antioquia, DAPARD, Secretaria de educación Departamental, Alcaldía del Peñol, Interventoría y Contratista, con el fin de abordar problemática en dicha escuela, debido a posibles riesgos o incidentes naturales.
Solicitud al contratista de entrega de documentación de disposición de material de roceria, sin atención hasta el momento.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Se recibe documento al respecto, que se observa para que complementación, aun NO se puede dar como aceptado el documento.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Se recibe documento y se develve por no contener lo indicado en el Contrato y la Ley Vigente.

El contratista continua con la entrega de la documentacion preliminar para el inicio del contrato.

Pese a reiteradas solicitudes, no se tiene la evidencia escrita de implementacion de Protocolos y Procedimientos de Seguridad Industrial en obra.

Sigue siendo muy deficiente (o nulo) el contenido de los documentos entregados en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

Se continua a la espera de la entrega de los permisos relacionados con la disposición de productos ambientales de las actividades que inician.

No se ha recibido información relacionada con las actividades de mantenimiento mecanico que deben ser iniciadas en la semana 4.

DIRECTOR INTERVENTORIA	ING. WILLIAM VALENCIA CAMPOS
RESIDENTE INTERVENTORIA	ING. YASSHIR SAID YAYA GARZON



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No: 4600010852 DE 2020

OBJETO: OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE.

FECHA | **REGISTRO FOTOGRAFICO**

PERIODO: Del 12 al 18 de octubre de 2020

FECHA			
14/10/20			
	Mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas		
15/10/20	56AN05 La Ceja - Abejorral PR 6+100 	56AN05 La Ceja - Abejorral PR 6+200 	56AN05 La Ceja - Abejorral PR 6+100 
	Mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas		
15/10/20	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 1+600 	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 1+600 	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 1+950 
	Mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas		
16/10/20	56AN05 La Ceja - Abejorral PR6+800 	56AN05 La Ceja - Abejorral PR9+100 	56AN05 La Ceja - Abejorral PR7+000 
	Demarcacion de pavimento		
16/10/20	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 1+600 	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 1+400 	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 0+650 
	Mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas		
	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

16/10/20



Mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas

56AN05 La Ceja - Abejorral PR8+000

16/10/20







Se realiza recorrido de diagnóstico en la vía para identificar puntos críticos y obras a intervenir, en acompañamiento del contratista y la supervisión de la Gobernqación

60AN14-1 San Vicente - El peñol km7+800 se envidencia perdida de la berma margen izquierda, debido a la creciente de la quebrada por el incremento de las lluvias y la reducida capacidad hidraulica de la alcantarilla, se solicita estudio hidráulico	60AN14-1 San Vicente - El peñol km7+800	60AN14-1 San Vicente - El peñol km7+800

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

CONTRATO No: 4600010852 de 2020 **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE

FECHA: 18 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana:	4	Del:	19/10/20	Al:	25/10/20
Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato:			27		
Nombre de los Supervisores:			ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS		

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	**LONGITUD KM: 994.5**
VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN OPERATIVA ORIENTE	

EJECUCIÓN DE OBRA A 25 DE OCTUBRE DE 2020

Los valores se remiten al costo total del contrato (Incluye el AU DEL 30.11%).

OBRA PROGRAMADA	**Programa de Obra por definir.**	
	PROGRAMADA	**EJECUTADA**
Obra Financiera %	1.61%	1.15%
Valor de la Obra programada:	$ 114,700,955	$ 81,718,744.00
Valor de interventoría	$ 29,226,647.88	$ 31,504,130.21

VALOR EJECUTADO ACUMULADO		**EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA**		
		EJECUTADO	**PROGRAMADO**	**BALANCE OBRA (+ o -)**
OBRA EJECUTADA ACUMULADA %		1.15%	0.00%	1.15%
Obra ejecutada acumulada a la fecha		$ 81,718,744	$ 114,700,955	$ (32,982,211)
Valor interventoría.		$ 109,570,088.21	Ejecución física a la fecha Atrasada %	-0.46%
Ejecución física programada		1.61%		0.00%

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	Interventor:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S.
Contrato N°:	4600010855 de 2020	Contrato N°:	4600010852 de 2020
Valor total con adiciones:	$7,109,219,278.00	Valor total con adiciones:	$759,892,845.00
Plazo total con Prórrogas:	6 Meses	Plazo total con Prórrogas:	6 Meses
Fecha de Inicio	29/09/20	Fecha de Inicio:	29/09/20
Fecha de terminación:	28/03/21	Fecha de terminación	28/03/21

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
Buldócer	0
Retroexcavadora de Orugas	0
Motoniveladora	1
Retro cargador de Llantas	0
Tanque irrigador de agua	0
Vibro compactador 10 Ton	0
Clasificadora de Materiales	0
Mezcladora de concreto de 1 M3	0
Volquetas de 14 m3	8
Vehículos transporte de personal	0
Equipos de topografía	0
Carro taller	0
Camión turbo	1
Camioneta	4
Mini cargador	0
	14

PERSONAL OBRA		**PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA**		**PERSONAL INTERVENTORIA**	
Director de Obra	1	Operadores de Maquinaria	1	Ing. Director de interventoría	1
Ingeniero Residente de Obra	2	Conductores Volquetas, NPR y camionetas	10	Ing. Residente de Interventoría	2
Tecnólogo civil	2	Obreros(Oficiales-Ayudantes)	12	Ing. Residente SST	1
Ingeniero Ambiental	1	Controladoras Vehiculares	0	Profesional Ambiental	1
Especialista en Geotecnia Vial / Pavimentos	1	Topografía	0	Secretaria	1
Tecnólogo SST (siso)	1	Soldador.	0	Tecnólogo SST (siso)	0
Residente social	1	Apuntadores	1	Profesional Social	1
		Mecánico	0	Auxiliar administrativa	0
		Oficios varios	1	Tecnólogo Topógrafo	1
		Cuadrilla de pavimento	0	Cadeneros	2
		Cadeneros	0	Tecnólogo construcciones	3
		Encargado de obra	0	Abogado gestión predial	0
		Ingeniero forestal	0	Conductores	0
		Auxiliar forestal.	0		
		Abogado predial	0		
		Ingeniero Predial.	0		
PERSONAL DE LA ZONA	**9**	**LABORANDO**	**25**	**TOTAL INTERVENTORIA**	**13**

INFORMACION TECNICA

El 20 de octubre se hizo visita con el especialista en Geotecnia, Ing.Gonzalo Hincapié especialista en geotecnia, en los puntos críticos de la vía Guatatape – San Rafael km16+400, donde se encuentra un muro fallado y al km25+800 donde se presenta hundimiento en vía al parecer por fallas geológicas y existe un muro construido en mantenimientos anteriores el cual presenta fracturas. El especialista conceptúa que se debe hacer un levantamiento topográfico en ambos puntos, para luego pasar un informe diagnosticando la intervención a seguir. Por lo tanto, la interventoría ordena hacer el respectivo levantamiento topográfico a través del topógrafo de la interventoría. A realizarse en la siguiente semana.

Se recibe una nueva versión del SGSST y el sabado se realiza una reunion virtual tratado de dar luces para lo que se viene solicitando.

El 21 de octubre se realizó comité en la gobernación de Antioquia en compañía de el Ingeniero Julián Parra, Oscar David y Andrés Rodríguez, representantes de la Gobernación, Omar Oquendo representante de la interventoría y Huberto Serna representante del contratista, donde se trataron los siguientes temas:
a. Obras que se están ejecutando en la actualidad y en qué estado están:
Se aclaro que se estaban interviniendo 5 frentes de roceria los cuales son Marinilla – Peñol, La Ceja – Abejorral, San Carlos – San Rafael, Autopista – Granada, Aurora – Sonadora, La piñuela – San Francisco. Se esta haciendo la demarcación de las zonas de fallo en la vía Marinilla – Peñol, para evaluar la cantidad y proceder con la ejecución del parcheo y fresado.
b. Obras para empezar:
Mantenimiento la Narices – Juanes – Jordán – La Holanda, donde el contratista se comprometió a empezar al día siguiente 22 de octubre, llevando la maquinaria al sitio de la obra.
El contratista se comprometió a iniciar las obras en Autopista – Aquitania el día 26 de octubre, con un disipador con geomembrana de acuerdo a las instrucciones que dará el ingeniero de suelos de la Gobernación Jesús Zapata. Igualmente se debe evaluar la forma de dar paso provisional a carros livianos urgentemente.
Mitigación del km0+900 Autopista – Granada
El contratista solicita entregar el programa contractual de obra en las condiciones requeridas para un correcto seguimiento de la curva S, desarrollandolo a partir de la matriz de prioridad entregada por la Gobernación incluida en el documento base elaborado por la interventoria (se anexa a este informe el documento entregado por la Interventoria como base). Se le concede plazo para el viernes 30 de octubre.

El presente informe se evalua de acuerdo a la segunda versión de programa entregado por el Contratista, el cual como se indicó en el informe anterior, tenia errores, pero se adoptan los valores programados en el mismo. Se anexan a este informe el flujo de caja del programa version 2 entregado.

El 22 de octubre se hizo visita con el especialista del contratista a la escuela de San Vicente del Peñol y a la aleta del puente El Ramal- Guaico Vía la Ceja Abejorral. Igualmente los parches donde se va ejecutar adoquín en diferentes partes de la dicha vía, donde el especialista pasara un informe la semana del 26 al 31 de octubre, para dar la solución a dichos sitios

El 24 de octubre, se realizó reunión virtual, en acompañamiento con el contratista, la interventoría y la supervisión, donde se acordó lo siguiente:
En el km0+900 Vía Autopista- Granada se intervendrá el punto critico con costales en suelo cemento y guadua, solución propuesta por el contratista y avalada por la supervisión ingeniero Mauricio Rodríguez, por lo tanto la interventoría revisara la posible solución y el contratista será responsable de la construcción y estabilidad de dicha solución, además se definió que la cantidad de afirmado a colocar en la Vía Narices – Juanes – El Jordán será de 5000 m3 de afirmado, procedentes de la cantera Positos, y se colocaran en toda la vía conformada y entre el tramo Juanes – El Jordán se instalara afirmado en los huecos mas profundos habilitando el corredor

Via 56AN05. La Ceja - Abejorral. Continua el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas.

Via 60AN16. Autopista - El Ramal - Granada. Se inicia el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas. Se atiende el hundimiento de la via por medio de un relleno que busca restituir parcialmente el paso.

Via 60AN15. Marinilla - El Peñol. Continua el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas. Se procede con el marcado de la via en los sectores a intervenir el asfalto de acuerdo a las patologias presentadas en la via. El 23 de octubre Se realiza recorrido en compañía del contratista, interventoria y supervisión por parte de la Gobernación para verificar puntos a intervenir con fresado de pavimento y parcheo.

Via 60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos. Continua el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas.

Via 60AN15-2-1. La Aurora - Sonadora - Guatape. Inicia el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas.

INFORMACION SOCIAL

Se solicitud a supervisión social información para el avance en las interacciones comunitarias. Se realiza la aprobación de cuñas radiales para difusión de proyecto en Granada- Antioquia. Se envio a contratista modelos para piezas comunicacionales. Se realiza la aprobación de piezas comunicacionales para Socialización y difusión de Obra.Se recibe la versión 2 Plan de Gestión Social. Se hace recorrido con personal de Alcaldía del Peñol para el establecimiento de punto para ubicación de Valla. Se hace la recepción, corrección y aprobación de cuñas Radiales Se aprueba la entrega de invitación para socialización de Inicio de Obra. Se realiza el informe a supervisión acontecimiento caída de Banca, Aquitania. Solicitud de permiso para establecimiento de valla el Peñol.

INFORMACION AMBIENTAL

Recorrido roceria via Marinilla-Peñol. Verificación cumplimiento ambiental, acompañamiento a marcación de Parcheo vía Marinilla - Peñol,. Se avanza en la revisión de información canteras y revisión del plan de manejo ambiental.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Se recibe nuevo documento. En revision.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Se recibe nuevo documento. En revision.

El contratista continua con la entrega de la documentacion preliminar para el inicio del contrato.

Pese a reiteradas solicitudes, no se tiene la evidencia escrita de implementacion de Protocolos y Procedimientos de Seguridad Industrial en obra.

Se continua a la espera de la entrega de los permisos relacionados con la disposición de productos ambientales de las actividades que inician.

Se espera que el Contratista cumpla con los compromisos adquiridos en cuanto al inicio de actividades y entrega de documentación.

DIRECTOR INTERVENTORIA	ING. WILLIAM VALENCIA CAMPOS
RESIDENTE INTERVENTORIA	ING. YASSHIR SAID YAYA GARZON

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO No: 4600010852 DE 2020

OBJETO: **OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE.**

FECHA

REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO: Del 19 de septiembre al 25 de octubre 2020

19/10/20







Marcación de pavimento crítico sobre la via Marinilla - El Peñol, baches, piel de cocodrico, parches, hundimiento, ahuellamiento, fisuras en bloque, entre otros; en acompañamiento del contratista de km2+400 al km4+200

60AN15 Marinilla - El Peñol KM2+800	60AN15 Marinilla - El Peñol KM3+040	60AN15 Marinilla - El Peñol KM3+095

19/10/20







Control de roceria y limpieza de cunetas via Marinilla -El Peñoldel km3+900 roceria y km3+200 limpieza

60AN15 Marinilla - El Peñol KM3+800	60AN15 Marinilla - El Peñol KM3+800	60AN15 Marinilla - El Peñol KM3+800

19/10/20







control de roceria y limpieza de cunetas via Autopista - Granada km0+000 al km0+300 roceria y Descapote k0+900

60AN16 Autopista - Granada km0+900	60AN16 Autopista - Granada km0+900	60AN16 Autopista - Granada km0+900

20/10/20







Marcación de pavimento crítico sobre la via Marinilla - El Peñol, baches, piel de cocodrico, parches, hundimiento, ahuellamiento, fisuras en bloque, entre otros; en acompañamiento del contratista de km4+200 al km6+400

60AN15 Marinilla - El Peñol KM 4+600	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 4+900	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 5+400

20/10/20







Control de roceria y limpieza de cunetas via Marinilla -El Peñoldel km4+400 roceria y km3+850 limpieza

60AN15 Marinilla - El Peñol KM 3+200	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 3+200	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 3+200

20/10/20








Control de roceria, limpieza de cunetas y estabilización de la banca con material proveniente de excavación via Autopista-Granada

21/10/20

60AN16 Autopista - Granada km0+220



60AN16 Autopista - Granada km0+900



60AN16 Autopista - Granada km0+900



Marcación de pavimento crítico sobre la via Marinilla - El Peñol, baches, piel de cocodrico, parches, hundimiento, ahuellamiento, fisuras en bloque, entre otros; en acompañamiento del contratista de km6+400 al km10+550

21/10/20


60AN15 Marinilla - El Peñol KM 6+400



60AN15 Marinilla - El Peñol KM 10+300



60AN15 Marinilla - El Peñol KM 9+600

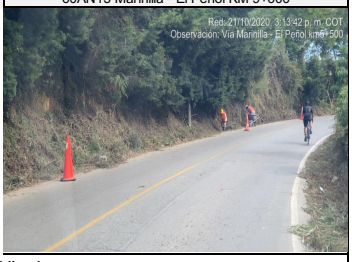

Control de roceria y limpieza de cunetas via Marinilla -El Peñoldel km5+500 roceria y km4+500 limpieza

22/10/20

60AN15 Marinilla - El Peñol KM 4+400



60AN15 Marinilla - El Peñol KM 5+500



60AN15 Marinilla - El Peñol KM 5+500



Marcación de pavimento crítico sobre la via Marinilla - El Peñol, baches, piel de cocodrico, parches, hundimiento, ahuellamiento, fisuras en bloque, entre otros; en acompañamiento del contratista de km6+400 al km10+550

22/10/20

60AN15 Marinilla - El Peñol KM 11+080



60AN15 Marinilla - El Peñol KM 11+500



60AN15 Marinilla - El Peñol KM 15+900




Control de roceria y limpieza de cunetas via Marinilla -El Peñoldel km6+000 roceria y km5+500 limpieza

	CONTRATO No: 4600010852 DE 2020
OBJETO:	OBETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE.

REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO: Del 19 de octubre al 25 de octubre 2020

22/10/20

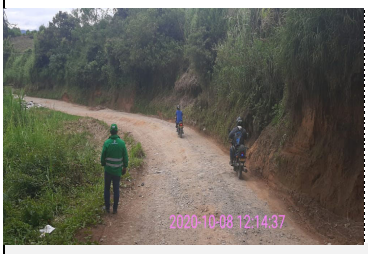






Durante la presente semana se realiza la recuperación de la calzada con material de afirmado en el km 0+900.

60AN16 Autopista - El Ramal - Granada	60AN16 Autopista - El Ramal - Granada	60AN16 Autopista - El Ramal - Granada

22/01/20

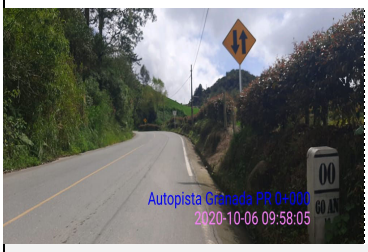





Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 0+000 al km 2+500.

60AN16 Autopista - El Ramal - Granada	60AN16 Autopista - El Ramal - Granada	60AN16 Autopista - El Ramal - Granada

22/10/20







Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 0+000 al km 2+500.

60AN16 Autopista - El Ramal - Granada KM 5+900	60AN16 Autopista - El Ramal - Granada KM 5+500	60AN16 Autopista - El Ramal - Granada KM 0+900

24/10/20







Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 2+000 al km 6+000.

60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km	60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km	60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km

24/10/20







Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 2+000 al km 6+000.

60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km	60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km	60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km

22/10/20








Durante la presente semana inicia la limpieza mecánica de cunetas entre los km 21+800 al km 23+700.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

23/10/20

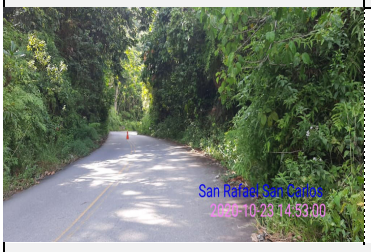





Durante la presente semana inicia la limpieza mecánica de cunetas entre los km 21+800 al km 23+700.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

21/10/20







Durante la presente semana continua remoción de derrumbes entre los km 19+500 al km 31+500.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

24/10/20







Durante la presente semana continua remoción de derrumbes entre los km 19+500 al km 31+500.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

21/10/20








Durante la presente semana continua: Rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto del km 35+500 al km 41+500.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

23/10/20








Durante la presente semana continua: Rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto del km 35+500 al km 41+500.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

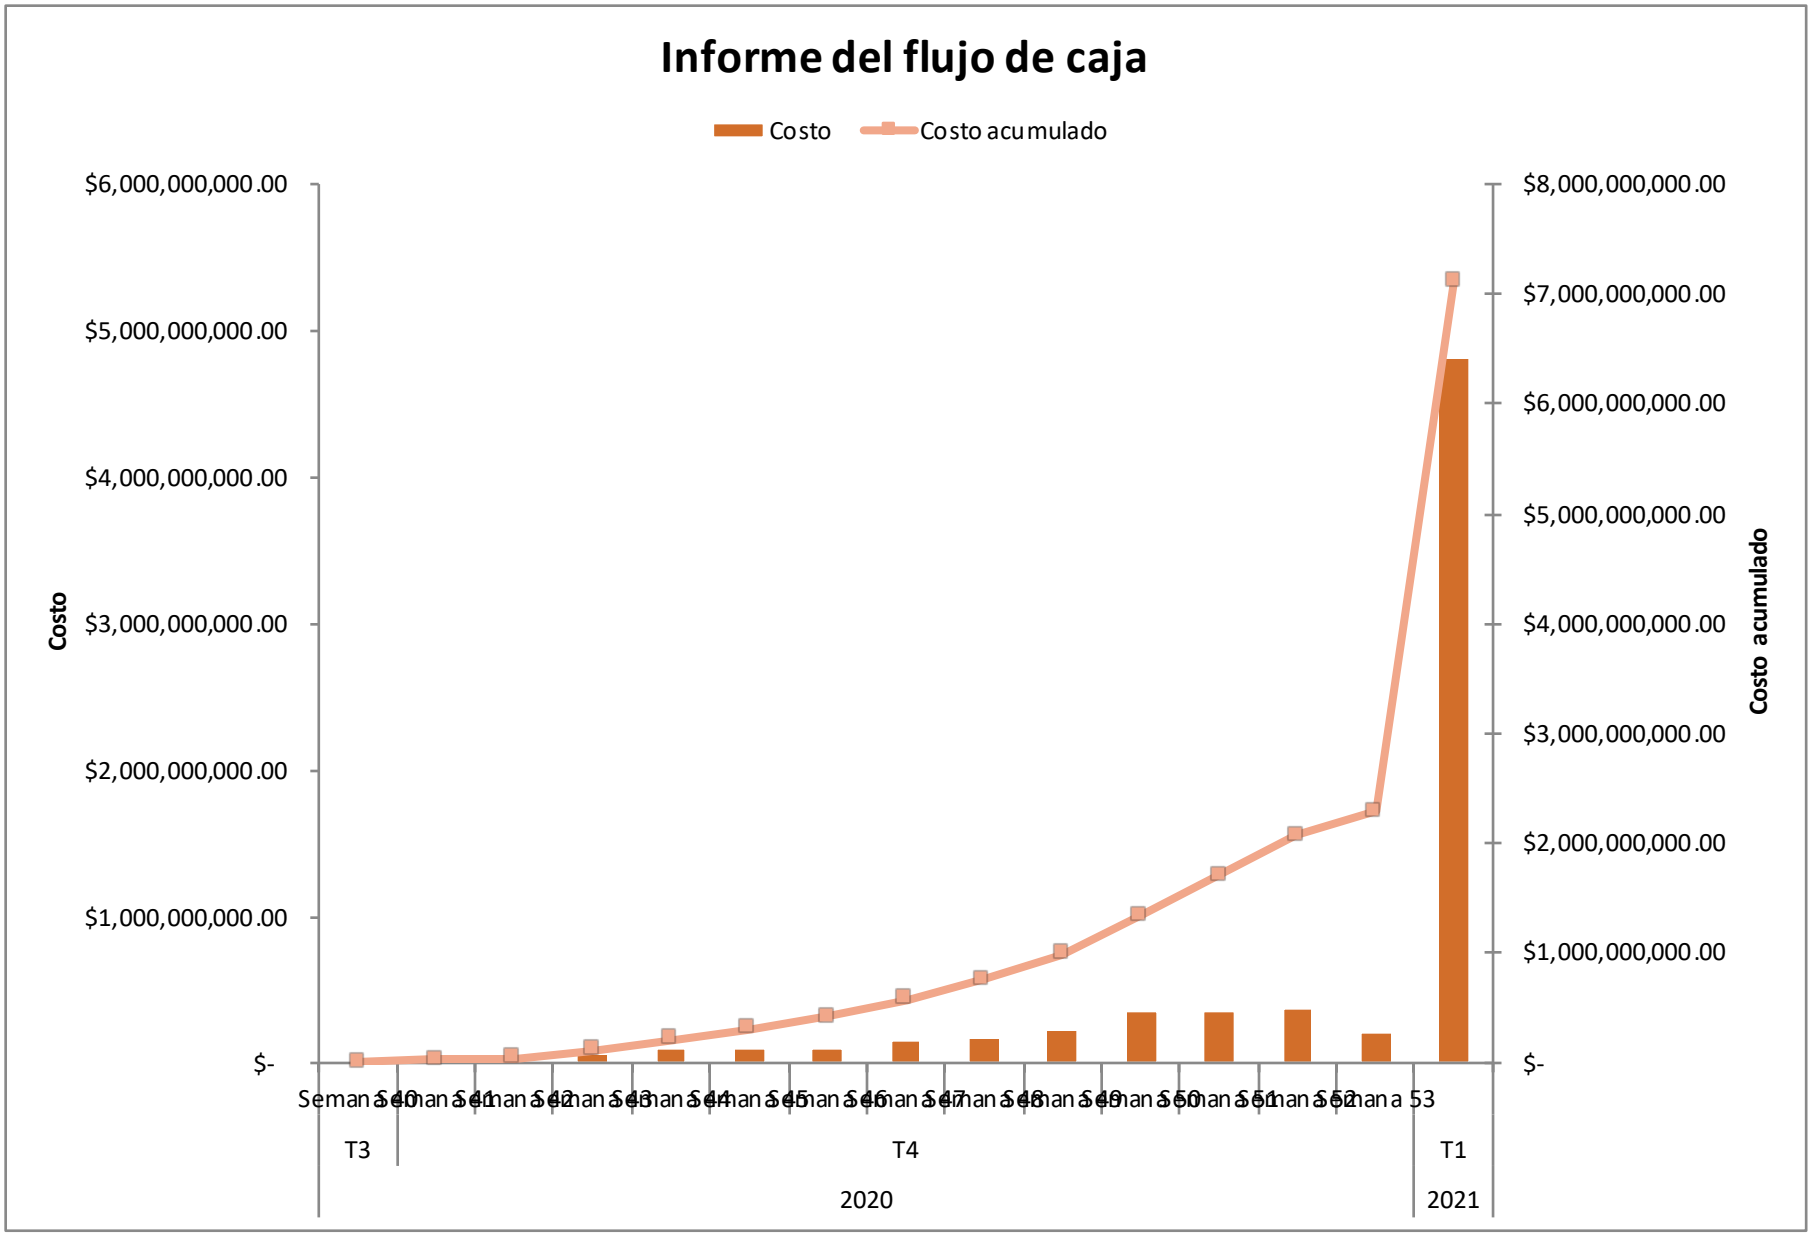
Informe del flujo de caja
Costo
Costo acumulado
$6,000,000,000.00
$5,000,000,000.00
$4,000,000,000.00
$3,000,000,000.00
$2,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$-
$8,000,000,000.00
$7,000,000,000.00
$6,000,000,000.00
$5,000,000,000.00
$4,000,000,000.00
$3,000,000,000.00
$2,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$-
Costo
Costo acumulado
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 53
T3
T4
T1
2020
2021

Tareas	Todos

			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 40	$ 9,624,233.27	$ 9,624,233.27
	Total T3		$ 9,624,233.27	$ 9,624,233.27
	T4	Semana 41	$ 16,842,408.22	$ 26,466,641.50
		Semana 42	$ 16,842,408.22	$ 43,309,049.72
		Semana 43	$ 71,391,904.95	$ 114,700,954.69
		Semana 44	$ 98,724,350.15	$ 213,425,304.86
		Semana 45	$ 101,298,862.57	$ 314,724,167.44
		Semana 46	$ 101,298,862.57	$ 416,023,030.02
		Semana 47	$ 161,481,724.47	$ 577,504,754.49
		Semana 48	$ 178,925,347.90	$ 756,430,102.38
		Semana 49	$ 235,430,085.15	$ 991,860,187.54
		Semana 50	$ 350,156,733.63	$ 1,342,016,921.18
		Semana 51	$ 361,557,607.29	$ 1,703,574,528.49
		Semana 52	$ 370,499,576.76	$ 2,074,074,105.26
		Semana 53	$ 213,835,889.37	$ 2,287,909,994.67
	Total T4		$ 2,278,285,761.25	$ 2,287,909,994.67
Total 2020			$ 2,287,909,994.52	$ 2,287,909,994.67
2021	T1		$ 4,821,309,283.04	$ 7,109,219,278.00
Total 2021			$ 4,821,309,283.04	$ 7,109,219,278.00
Total general			$ 7,109,219,277.56	$ 7,109,219,278.00

	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA				MES No 01					MES No 02				MES No 03					MES No 04				MES I	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍESICA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20
PRIORIDAD	Código	Nombre_vía	Cod. Presupuesto	Subregión Operativa	PE	Del 29 de septiembre al 05 de octubre de 2020	Del 06 a 12 de octubre de 2020	Del 13 a 19 de octubre de 2020	Del 20 a 26 de octubre de 2020	Del 27 de octubre al 01 de noviembre	Del 02 al 08 de noviembre de 2020	Del 09 al 15 de noviembre de 2020	Del 16 al 22 de noviembre de 2021	Del 23 al 29 de noviembre de 2020	Del 30 de noviembre a 06 de diciembre de	Del 07 al 13 de diciembre de 2021	Del 14 al 20 de diciembre de 2020	Del 21 al 27 de diciembre de 2020	Del 28 de diciembre a 03 de enero de	Del 04 al 10 de enero de 2021	Del 11 al 17 de enero de 2021	Del 18 al 24 de enero de 2021	Del 25 al 31 de enero de 2021	Del 01 al 07 de febrero de 2021	Del 08 al 14 de febrero de 2021
2	25AN03-1	La Granja (Montebello) - El Retiro		ORIENTE																				
		• Rocería			P						20.00%	20.00%	#######	#######	20.00%									
					E																			
		• Limpieza cunetas			P							20.00%	#######	#######	20.00%	#######								
					E																			
		• Limpieza obras hidráulicas			P								#######	#######	20.00%	#######	#######							
					E																			
2	56AN04	La Ceja - El Retiro		ORIENTE																				
		• Rocería			P						20.00%	20.00%	#######	#######	20.00%									
					E																			
		• Limpieza cunetas			P							20.00%	#######	#######	20.00%	#######								
					E																			
		• Limpieza obras hidráulicas			P								#######	#######	20.00%	#######	#######							
					E																			
1	56AN05	La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral		ORIENTE	###																			
		• Rocería			P						20.00%	20.00%	#######	#######	20.00%									
					E																			
		• Limpieza cunetas			P						20.00%	20.00%	#######	#######	20.00%									
					E																			
		• Limpieza obras hidráulicas			P							20.00%	#######	#######	20.00%	#######								
					E																			
		• Construcción estructura de contención 21+800			P					15.00%	15.00%	20.00%	#######	#######	20.00%									
					E																			
		• Construcción estructura de contención otros tramos			P						15.00%	15.00%	#######	#######	20.00%	#######								
					E																			
		• Demarcacion Vial			P										30.00%	#######	#######							
					E																			
		• Atencion asfalto en mal estado			P					15.00%	15.00%	20.00%	#######	#######	20.00%									
					E																			
3	56AN05-2	Abejorral - El Cairo - La Elvira (Cruce ruta 25)		ORIENTE	###																			
		• Rocería			P						20.00%	20.00%	#######	#######	20.00%									
					E																			
		• Limpieza cunetas			P						20.00%	20.00%	#######	#######	20.00%									
					E																			
		• Limpieza obras hidráulicas			P							20.00%	#######	#######	20.00%	#######								
					E																			
2	56AN06	La Union - El Carmen de Viboral		ORIENTE	###																			
		• Rocería			P						20.00%	20.00%	#######	#######	20.00%									
					E																			
		• Limpieza cunetas			P						20.00%	20.00%	#######	#######	20.00%									
					E																			
		• Limpieza obras hidráulicas			P							20.00%	#######	#######	20.00%	#######								
					E																			
3	56AN10	Sonsón - La Quiebra - Nariño		ORIENTE	###																			
		• Rocería			P							20.00%	#######	#######	20.00%	#######								

				E																			
	• Limpieza cunetas			P								20.00%	######	######	20.00%	######							
				E																			
	• Limpieza obras hidráulicas			P								20.00%	######	######	20.00%	######							
				E																			
1	56AN10-1	La Quiebra - Argelia		ORIENTE	###																		
	• Rocería			P							20.00%	20.00%	######	######	20.00%								
				E																			
	• Limpieza cunetas			P							20.00%	20.00%	######	######	20.00%								
				E																			
	• Limpieza obras hidráulicas			P								20.00%	######	######	20.00%	######							
				E																			
	• Construcción estructura de contención varios tramos			P							15.00%	15.00%	######	######	15.00%	######	######						
				E																			
	• Atencion asfalto en mal estado			P						15.00%	15.00%	20.00%	######	######	20.00%								
				E																			
3	60AN12	Guarne - Yolombal - San Vicente		ORIENTE	###																		
	• Rocería			P							20.00%	20.00%	######	######	20.00%								
				E																			
	• Limpieza cunetas			P							20.00%	20.00%	######	######	20.00%								
				E																			
	• Limpieza obras hidráulicas			P								20.00%	######	######	20.00%	######							
				E																			
2	60AN14	Crucero (Cruce Ruta 60) - San Vicente		ORIENTE																			
	• Rocería			P							20.00%	20.00%	######	######	20.00%								
				E																			
	• Limpieza cunetas			P							20.00%	20.00%	######	######	20.00%								
				E																			
	• Limpieza obras hidráulicas			P								20.00%	######	######	20.00%	######							
				E																			
2	60AN14-1	San Vicente - El Peñol		ORIENTE	###																		
	• Rocería			P						20.00%	20.00%	20.00%	######	######									
				E																			
	• Limpieza cunetas			P							20.00%	20.00%	######	######	20.00%								
				E																			
	• Limpieza obras hidráulicas			P							20.00%	20.00%	######	######	20.00%								
				E																			
	• Construcción estructura de contención K7+600			P						20.00%	20.00%	20.00%	######	######									
				E																			
1	60AN15	Marinilla - El Peñol		ORIENTE	###																		
	• Rocería			P				15.00%	######	20.00%	20.00%	20.00%	######										
				E																			
	• Limpieza cunetas			P				15.00%	######	20.00%	20.00%	20.00%	######										
				E																			
	• Limpieza obras hidráulicas			P				15.00%	######	20.00%	20.00%	20.00%	######										
				E																			
	• Construcción estructura de contención varios tramos			P						15.00%	15.00%	20.00%	######	######	10.00%								
				E																			
	• Demarcacion Vial			P										######	60.00%								
				E																			
	• Atencion asfalto en mal estado			P					######	15.00%	20.00%	20.00%	######	######									

				E																			
	• Remoción Derrumbes mayores en rocas a largo de la vía			P					15.00%	15.00%	20.00%	######	######	10.00%									
				E																			
3	60AN15-1	Marinilla - El Santuario - Carmen de Viboral - Canadá		ORIENTE	###																		
	• Rocería			P					20.00%	20.00%	20.00%	######	######										
				E																			
	• Limpieza cunetas			P						20.00%	20.00%	######	######	20.00%									
				E																			
	• Limpieza obras hidráulicas			P						20.00%	20.00%	######	######	20.00%									
				E																			
2	60AN15-2	El Peñol - Guatapé - El Bizcocho - San Rafael		ORIENTE	###																		
	• Rocería			P					20.00%	20.00%	20.00%	######	######	10.00%	######								
				E																			
	• Limpieza cunetas			P					20.00%	20.00%	20.00%	######	######	10.00%	######								
				E																			
	• Limpieza obras hidráulicas			P					20.00%	20.00%	20.00%	######	######	10.00%	######								
				E																			
	• Construcción estructura de contención varios tramos			P					15.00%	15.00%	20.00%	######	######	10.00%									
				E																			
	• Demarcacion Vial			P										40.00%	######	######							
				E																			
	• Atencion asfalto en mal estado			P					20.00%	20.00%	20.00%	######	######	10.00%									
				E																			
	• Remoción Derrumbes mayores en rocas a largo de la vía			P						15.00%	15.00%	######	######	20.00%	######	######							
				E																			
x	60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos		ORIENTE	###																		
1	60AN16	Autopista - El Ramal - Granada		ORIENTE	###																		
	• Rocería			P						20.00%	20.00%	######	######	10.00%	######								
				E																			
	• Limpieza cunetas			P						20.00%	20.00%	######	######	10.00%	######								
				E																			
	• Limpieza obras hidráulicas			P						20.00%	20.00%	######	######	10.00%	######								
				E																			
	• Construcción estructura de contención varios tramos			P						15.00%	15.00%	######	######	10.00%	######	######							
				E																			
x	60AN16-1	Granada - El Chocó - San Carlos		ORIENTE	###																		
3	60AN17	Autopista - Cocorná		ORIENTE	###																		
	• Rocería			P								######	######	10.00%	######	######	######	######	######				
				E																			
	• Limpieza cunetas			P								######	######	10.00%	######	######	######	######	######				
				E																			
	• Limpieza obras hidráulicas			P								######	######	10.00%	######	######	######	######	######				
				E																			
1	60AN18	La Piñuela - San Francisco		ORIENTE	###																		
	• Rocería			P								######	######	10.00%	######	######	######	######	######	######	######		
				E																			
	• Limpieza cunetas			P								######	######	10.00%	######	######	######	######	######	######	######		
				E																			

		• Limpieza obras hidráulicas			P									######	######	10.00%	######	######	######	######	######	######	######			
					E																					
		• Construcción estructura de contención varios tramos			P									######	######	10.00%	######	######	######	######	######	######	######			
					E																					
		• Atencion asfalto en mal estado			P											20.00%	######	######	######	######						
					E																					
2	60AN19	Autopista - San Luís		ORIENTE	###																					
		• Rocería			P								10.00%	######	######	10.00%	######	######	######	######	######	######				
					E																					
		• Limpieza cunetas			P								10.00%	######	######	10.00%	######	######	######	######	######	######				
					E																					
		• Limpieza obras hidráulicas			P								10.00%	######	######	10.00%	######	######	######	######	######	######				
					E																					
		• Construcción estructura de contención punto critico			P								10.00%	######	######	10.00%	######	######	######	######	######	######				
					E																					
		Sin Obras Priorizadas																								
2	62AN19	Barbosa - Concepción		ORIENTE	###																					
		• Rocería			P										######	10.00%	######	######	######	######	######	######	######	######		
					E																					
		• Limpieza cunetas			P										######	10.00%	######	######	######	######	######	######	######	######		
					E																					
		• Limpieza obras hidráulicas			P										######	10.00%	######	######	######	######	######	######	######	######		
					E																					
1	62AN19-2	Concepción - San Vicente		ORIENTE	###																					
		• Construcción obras hidraulicas			P											10.00%	######	######	######	######	######	######	######	######	######	
					E																					
		• Construcción cunetas			P											10.00%	######	######	######	######	######	######	######	######	######	
					E																					
		Sin Obras Priorizadas																								
3	62AN22-2	Santo Domingo - Termales - Alejandría		ORIENTE	###																					
		• Rocería			P										######	10.00%	######	######	######	######	######	######	######	######		
					E																					
		• Limpieza cunetas			P										######	10.00%	######	######	######	######	######	######	######	######		
					E																					
		• Limpieza obras hidráulicas			P										######	10.00%	######	######	######	######	######	######	######	######		
					E																					
x	62AN19-1	Concepción - Alejandría		ORIENTE																						
x	05002VT176	Abejorral - Pantanillo - El Oro		ORIENTE																						
x	05002VT178	Pantanillo - Guayabal		ORIENTE																						
x	05002VT250	Altavista - Chagualal		ORIENTE																						
x	05002VT61	Abejorral - Granadillo		ORIENTE																						
x	05313VT17	La Quiebra - Santa Ana		ORIENTE																						
x	05376VT27	La Ceja - San Rafael		ORIENTE																						
x	05483VT98	Puente Linda - Puerto Venus		ORIENTE																						

| | | |

				E																					
	• Construcción cunetas			P																######	######	######	######	######	10.00%
				E																					
	• Atencion asfalto en mal estado			P														######	######	######	######	######			
				E																					
x	60AN17-1	Cocorná - El Ramal (Granada)		ORIENTE																					
x	60AN19-1	San Carlos - Partidas a San Miguel - Los Planes		ORIENTE																					
x	60AN19-2	San Luís - El Chocó		ORIENTE																					
x	60AN20-1-1	Cruces - Narices		ORIENTE																					
1	60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda		ORIENTE																					
	• Rocería			P																		######	######	######	10.00%
				E																					
	• Limpieza cunetas			P																		######	######	######	10.00%
				E																					
	• Limpieza obras hidráulicas			P																		######	######	######	10.00%
				E																					
	• Construcción estructura de contención			P									######	######	10.00%	######	######	######	######	######	######	######			
				E																					
	• Mantenimiento mecánico			P																######	######	######	######	######	10.00%
				E																					
	• Atencion asfalto en mal estado			P														######	######	######	######	######			
				E																					
1	62AN22-1-1	San Roque - San Lorenzo - La Palma		ORIENTE																					
	• Construcción estructura de contención			P																######	######	######	######	######	10.00%
				E																					
	• Mantenimiento mecánico			P																		######	######	######	10.00%
				E																					
1	62AN22-2-1	Alejandría - El Bizcocho (San Rafael)		ORIENTE																					
	• Rocería			P																		######	######	######	10.00%
				E																					
	• Limpieza cunetas			P																		######	######	######	10.00%
				E																					
	• Limpieza obras hidráulicas			P																		######	######	######	10.00%
				E																					
	• Construcción estructura de contención			P						10.00%	10.00%	######	######	10.00%	######	######	######	######	######	######					
				E																					
	• Mantenimiento mecánico			P																######	######	######	######	######	10.00%
				E																					
	• Atencion asfalto en mal estado			P														######	######	######	######	######			
				E																					

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

CONTRATO No: 4600010852 de 2020 **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 4 Del: 26/10/20 Al: 1/11/20

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 34

Nombre de los Supervisores: ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO

VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN OPERATIVA ORIENTE

LONGITUD KM: 994.5

EJECUCIÓN DE OBRA AI 01 DE NOVIEMBRE DE 2020

Los valores se remiten al costo total del contrato (Incluye el AU DEL 30.11%).

OBRA PROGRAMADA	**Programa de Obra por definir.**		**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA**		
	PROGRAMADA	**EJECUTADA**		**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**BALANCE OBRA (+ o -)**
Obra Financiera %	3.00%	6.16%	OBRA EJECUTADA ACUMULADA %	6.16%	0.00%	6.16%
Valor de la Obra programada:	$ 213,425,305	$ 438,221,491.06	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 519,940,235	$ 213,425,305	$ 306,514,930
Valor de interventoría	$ 29,226,647.88	$ 26,973,899.00	Valor interventoría.	$ 136,543,987.21	Ejecución física a la fecha Atrasada %	3.16%
			Ejecución física programada	3.00%		0.00%

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	Interventor:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S.
Contrato N°:	4600010855 de 2020	Contrato N°:	4600010852 de 2020
Valor total con adiciones:	$7,109,219,278.00	Valor total con adiciones:	$759,892,845.00
Plazo total con Prórrogas:	6 Meses	Plazo total con Prórrogas:	6 Meses
Fecha de Inicio	29/09/20	Fecha de Inicio:	29/09/20
Fecha de terminación:	28/03/21	Fecha de terminación	28/03/21

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
Buldócer	0
Retroexcavadora de Orugas	0
Motoniveladora	1
Retro cargador de Llantas	1
Tanque irrigador de agua	1
Vibro compactador 10 Ton	1
Cimpresor Neumartco	1
Mezcladora de concreto de 1 M3	0
Volquetas de 14 m3	13
Vehículos transporte de personal	0
Equipos de topografía	0
Carro taller	0
Camión turbo	1
Camioneta	4
Mini cargador	1
	24

PERSONAL OBRA		**PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA**		**PERSONAL INTERVENTORIA**	
Director de Obra	1	Operadores de Maquinaria	6	Ing. Director de interventoría	1
Ingeniero Residente de Obra	2	Conductores Volquetas, NPR y camionetas	10	Ing. Residente de Interventoría	2
Tecnólogo civil	2	Obreros(Oficiales-Ayudantes)	14	Ing. Residente SST	1
Ingeniero Ambiental	1	Controladoras Vehiculares	0	Profesional Ambiental	1
Especialista en Geotecnia Vial / Pavimentos	1	Topografía	0	Secretaria	1
Tecnólogo SST (siso)	1	Soldador.	0	Tecnólogo SST (siso)	0
Residente social	1	Apuntadores	1	Profesional Social	1
		Mecánico	0	Auxiliar administrativa	0
		Oficios varios	1	Tecnólogo Topógrafo	1
		Cuadrilla de pavimento	1	Cadeneros	2
		Cadeneros	0	Tecnólogo construcciones	3
		Encargado de obra	0	Abogado gestión predial	0
		Ingeniero forestal	0	Conductores	0
		Auxiliar forestal.	0		
		Abogado predial	0		
		Ingeniero Predial.	0		
PERSONAL DE LA ZONA	**9**	**LABORANDO**	**33**	**TOTAL INTERVENTORIA**	**13**

INFORMACION TECNICA

El 26 de octubre se inicia recorrido con alojamiento en el recorrido, para llegar a la via Las Cruces - Juanes para ser intervenida de acuerdo a instrucciones de la Supervisión en una longitud de 32 km. Con un presupuesto aproximado de $400MM en Narices - Cruces, y $400MM en Narices-Juanes.

El 28 de Octubre se realiza la Reunion de Inicio del Proyecto en el Municipio de El Peñol.

Se hace visita con el contratista, Supervisor y un Diputado de la Gobernacion a Santo Domingo Savio para definir la contruccion de un muro de contecion con las caracteristicas de diseño de la Gobernacion

No se cumple el compromiso del contratista para entregar el programa contractual de obra en las condiciones requeridas para un correcto seguimiento de la curva S, desarrollandolo a partir de la matriz de prioridad entregada por la Gobernación incluida en el documento base elaborado por la interventoria (se anexa a este informe el documento entregado por la Interventoria como base). Se le concedió plazo para el viernes 30 de octubre. Se oficiara para iniciar el procedimieto de incumplimiento tanto por la falta en la entrega del programa, como en los compromisos de obra que no se cumplieron.

El presente informe se evalua de acuerdo a la segunda versión de programa entregado por el Contratista, el cual como se indicó en el informe anterior, tenia errores, pero se adoptan los valores programados en el mismo. Se anexan a este informe el flujo de caja del programa version 2 entregado. Presenta un avance respecto al programa, reiterando que no corresponde al definio contractualmente.

Via 60AN18. La Piñuela - San Francisco. Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 6+000 al km 12+700.

Via 56AN10. Sonsón - La Quiebra - Nariño. Durante la presente semana inicia la actividad de roceria, limpieza de obras y cunetas del k31+500 al k33+400.

Via 60AN16. Autopista - El Ramal - Granada. Durante la presente semana se realiza la recuperación de la calzada con material de afirmado en el km 0+900. Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 0+000 al km 2+500. Atencion puntos críticos km5+400 y km5+500 margen izquierda.

Via 60AN19-2 San Luís - El Chocó. Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto.

Via 60AN16. Autopista - El Ramal - Granada. Se continua el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas.Inicia la construcción de muro en costales de suelo cemento en el k0+900.

Via 60AN15. Marinilla - El Peñol. Continua el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas. Inicio de actividades de fresado e instalación de pavimento k0+000. Fresado, instalación de mezcla asfática parcheo km0+000 margen derecha y K0+800.

Via 60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda. Durante la presente semana se inicia la conformación de la calzada y mejoramiento de la misma con motoniveladora del km 0+000 al km 7+000.

Via 60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos. Continua el mantenimiento manual roceria y limpieza de cunetas. Continua remoción de derrumbes entre los km 19+300 al km 31+500.

Via 60AN15-2-1. La Aurora - Sonadora - Guatape. Continua la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 6+000 al km 11+500.

INFORMACION SOCIAL

Se realiza la reunion de inicio de obra en el Municipio de El Peñol.
Se presenta un incumplimiento a los compromisos para la instalacion de la valla informativa del proyecto.
Revision, remisión y aprobación del diseño de valla informativa proyecto
Se entrega al contratista formatos y planillas actas de vecindad y protocolos previos.
Se entrega comunicación a emisora Granada estereo, verificación cuñas radiales sobre información del Proyecto.
Se hace la revisión al Plan de Gestión Social (versión 2), devolución para correcciones a contratista.

INFORMACION AMBIENTAL

Se hace el requerimiento a la residente ambiental del contratista de la ubicación de puntos ecológicos y sus rótulos. Se realiza la verificación de botadero en San Carlos. Se realiza verificación de orden y aseo en frentes de obra. Se hace un requerimiento al contratista para la recolección de material proveniente de rocería en los frentes de Marinilla – El Peñol y Autopista – Granada. Se hace acompañamiento en la actividad de parcheo

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Se aprecia el incumplimento reiterativo y aparente desconocimiento de norma del encargado en el Contratista.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Se aprecia el incumplimento reiterativo y aparente desconocimiento de norma del encargado en el Contratista.

Pese a reiteradas solicitudes, no se tiene la evidencia escrita de implementacion de Protocolos y Procedimientos de Seguridad Industrial en obra.

Se continua a la espera de la entrega de los permisos relacionados con la disposición de productos ambientales de las actividades que inician.

El Contratista cumpla con los compromisos adquiridos en cuanto al inicio de actividades y entrega de documentación, se procede a cuantificar e inicar procesos para aplicaciomn de multas por incumplimiento.

DIRECTOR INTERVENTORIA	ING. WILLIAM VALENCIA CAMPOS
RESIDENTE INTERVENTORIA	ING. YASSHIR SAID YAYA GARZON

	CONTRATO No: 4600010852 DE 2020
OBJETO:	OBETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE.

REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO: Del 26 de octubre al 01 de noviembre 2020







Inicio de actividades de fresado e instalación de pavimento en la vía Marinilla Peñol k0+000

60AN15 Marinilla - Peñol



60AN15 Marinilla - Peñol



60AN15 Marinilla - Peñol



Inicia la construcción de muro en costales de suelo cemento en el k0+900

60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



60AN16 Autopista - El Ramal - Granada




Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 6+000 al km 12+700.

60AN18 Piñuela San Francisco KM 7+800



60AN18 Piñuela San Francisco KM 7+800



60AN18 Piñuela San Francisco KM 7+400



60AN18 Piñuela San Francisco KM 9+200



60AN18 Piñuela San Francisco KM 9+200



60AN18 Piñuela San Francisco KM 8+600



60AN18 Piñuela San Francisco KM 8+600



60AN18 Piñuela San Francisco KM 7+700



60AN18 Piñuela San Francisco KM 7+700



60AN18 Piñuela San Francisco KM 10+800



60AN18 Piñuela San Francisco KM 10+900



60AN18 Piñuela San Francisco KM 11+200



60AN18 Piñuela San Francisco KM 11+200



60AN18 Piñuela San Francisco KM 11+300



60AN18 Piñuela San Francisco KM 11+300



Durante la presente semana inicia la actividad de roceria, limpieza de obras y cunetas del k31+500 al k33+400

56AN10 Sonson - La Quiebra - Nariño

56AN10 Sonson - La Quiebra - Nariño

56AN10 Sonson - La Quiebra - Nariño

	CONTRATO No: 4600010852 DE 2020
OBJETO:	OBETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE.

REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO: Del 26 de octubre al 01 de noviembre 2020








Durante la presente semana se realiza la recuperación de la calzada con material de afirmado en el km 0+900.

60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 0+000 al km 2+500.

60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 16+000 al km 21+000

60AN19-2 San Luís - El Chocó



60AN19-2 San Luís - El Chocó



60AN19-2 San Luís - El Chocó



Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 6+000 al km 11+500.

60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km



60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km



60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km



Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 6+000 al km 11+500.

60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km



60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km



60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape km



Durante la presente semana inicia la limpieza mecánica de cunetas entre los km 21+800 al km 23+700.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



Durante la presente semana continua remoción de derrumbes entre los km 19+300 al km 31+500.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



Durante la presente semana continua remoción de derrumbes entre los km 19+300 al km 31+500.


60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos




60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



Durante la presente semana continua: Rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto del km 30+800 al km 41+500.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



Durante la presente semana se inicia la conformación de la calzada y mejoramiento de la misma con motoniveladora del km 0+000 al km 7+000.

60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda



60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda



60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda



Durante la presente semana se inicia la conformación de la calzada y mejoramiento de la misma con motoniveladora del km 0+000 al km 7+000.

60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda

60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda

60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO No: 4600010852 DE 2020

OBJETO: OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE.

REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO: Del 26 de octubre al 01 de noviembre 2020

FECHA			
26/10/20			
	Roceria Auotpista - Granada puntos críticos km5+400 y km5+500 margen izquierda.		
	60AN16 Autopista - Granada km0+900	60AN16 Autopista - Granada km0+900	60AN16 Autopista - Granada km0+900
27/10/20			
	Control y acompañamiento de las Actas de Vecindad a la comunidad de Marinilla - El Peñol		
	60AN15 Marinilla - El Peñol KM3+800	60AN15 Marinilla - El Peñol KM3+800	60AN15 Marinilla - El Peñol KM3+800
28/10/20			
	Fresado, instalación de mezcla asfática parcheo km0+000 margen derecha via Marinilla - El Peñol		
	60AN16 Autopista - Granada km0+900	60AN16 Autopista - Granada km0+900	60AN16 Autopista - Granada km0+900
28/10/20			
	Control de adecuada instalación de mezcla acfáltica via Marinilla - El Peñol		
	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 4+600	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 4+900	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 5+400
29/10/20			
	Fresado, instalación de mezcla asfatica parcheo km0+800 margen izquierda via Marinilla - El Peñol		
	60AN15 Marinilla - El Peñol KM0+800	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 0+800	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 0+600
29/10/20			
	Control de roceria, limpieza de cunetas y instalación de pavimento parcheo via Marinilla - EL peñol		
	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 10+0000	60AN15 Marinilla - El Peñol KM0+800	60AN15 Marinilla - El Peñol KM0+800
29/10/20			
	Roceria, limpieza de cunetas y mitigación de caiga de banca via Autopista - Granada		
	60AN16 Autopista - Granada km0+900	60AN16 Autopista - Granada km4+600	60AN16 Autopista - Granada km3+600

30/10/20			
	Fresado, instalación de mezcla asfática parcheo km0+800 margen izquierda via Marinilla - El Peñol		
	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 4+400	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 5+500	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 5+500
30/10/20			
	Marcación de pavimento crítico sobre la via Marinilla - El Peñol, baches, piel de cocodrico, parches, hundimiento, ahuellamiento, fisuras en bloque, entre otros; en acompañamiento del contratista de km6+400 al		
	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 11+080	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 11+500	60AN15 Marinilla - El Peñol KM 15+900

Se deben insertar tantas hojas como sea necesario para realizar un registro detallado de las intervenciones realizadas.

ANEXO 2.

Acta de Obra No. 01.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020		CONTRATO ADICIONAL	0	CONTRATISTA	**ACTA DE OBRA N° 01**
OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE		VR. CONTRATO ADICIONAL	0	**CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE**	
				INTERVENTOR:	**ACTA No.** **01**
VR INICIAL	$ 7.109.219.278,00	VALOR TOTAL	$ 7.109.219.278,00	**INGEVAL S.A.S.**	**FECHA DE CORTE:** **31/10/2020**
PLAZO INICIAL:	6 Meses				**PERIODO: 29/09/2020 - 31/10/2020**

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MODIFICACIONES**					**O B R A E J E C U T A D A**				**OBRA POR EJECUTAR**	
						PARA ACTA 01			**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**PRESENTE ACTA No. 01**		**ACUMULADA**			
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant**	**Precio Unitario ($)**	**Valor Total ($)**	**+ -**	**Cant**	**Valor Total ($)**	**Cant**	**Valor Total ($)**	**Cantidad**	**Valor ($)**	**Cantidad**	**Valor ($)**	**Cantidad**	**Valor Total ($)**
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES															
1,1	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisición.	día	15,00	800.967	$12.014.505				15,00	12.014.505		0	0,00	0	15,00	$12.014.505
	TOTAL CAPITULO 1				**$12.014.505**											
	CAPITULO 2 - DEMOLICIONES, CORTE Y RETIROS															
2.3	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros.	m3	450,00	153.410	$69.034.500				450,00	69.034.500	34,04	5.222.457	34,04	5.222.457	416,00	$63.818.560
2.5	Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. Incluye cemento demoledor, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye cargue, transporte y disposición final del material.	m3	85,00	425.188	$36.140.980				85,00	36.140.980		0	0,00	0	85,00	$36.140.980
2.7	Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe, cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	25,00	82.328	$2.058.200				25,00	2.058.200		0	0,00	0	25,00	$2.058.200
2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	30,00	136.533	$4.095.990				30,00	4.095.990		0	0,00	0	30,00	$4.095.990
2.23	Fresado de pavimento asfáltico en cualquier espesor. Incluye transporte, botada y disposición final del material.	m3	10,00	41.320	$413.200				10,00	413.200		0	0,00	0	10,00	$413.200
	TOTAL CAPITULO 2				**111.742.870,00**											
	CAPITULO 3 - CERRAMIENTOS															
3.6	Suministro, transporte e instalación de cerco en alambre de púas con alambre galvanizado de 2 hilos calibre 12.5, con estacón de madera inmunizado de 4" separados 3 metros y tres (3) hilos horizontales de alambre. Incluye impermeabilización de tramo en contacto directo con el suelo a 2 manos	ml	20,00	$25.353	$507.060				20,00	507.060		0	0,00	0	20,00	$507.060
	TOTAL CAPITULO 3				**$507.060**											
	CAPITULO 4 - MOVIMIENTO DE TIERRAS															
	SUBCAPITULO 4.1 - EXCAVACIONES															
4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y prestamos. Incluye botada y disposición final de los materiales.	m3	1.540,00	$19.929	$30.690.660				1.540,00	30.690.660		0	0,00	0	1.540,00	$30.690.660
4.1.6	Excavación sin clasificar de la explanación, canales y prestamos. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	650,00	$21.774	$14.153.100				650,00	14.153.100		0	0,00	0	650,00	$14.153.100
4.1.7	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.540,00	$35.138	$54.112.520				1.540,00	54.112.520		0	0,00	0	1.540,00	$54.112.520
4.1.8	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.350,00	$22.409	$30.252.150				1.350,00	30.252.150	18,00	403.362	18,00	403.362	1.332,00	$29.848.788
4.1.9	Excavaciones para estructuras varias en material común bajo agua, incluye entibado, motobomba. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	30,00	$53.451	$1.603.530				30,00	1.603.530		0	0,00	0	30,00	$1.603.530
4.1.20	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa . Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	160,00	$434.669	$69.547.040				160,00	69.547.040		0	0,00	0	160,00	$69.547.040
4.1.21	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	160,00	$469.122	$75.059.520				160,00	75.059.520		0	0,00	0	160,00	$75.059.520
4.1.22	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. lincluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	160,00	$497.789	$79.646.240				160,00	79.646.240		0	0,00	0	160,00	$79.646.240
4.1.23	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	160,00	$536.156	$85.784.960				160,00	85.784.960		0	0,00	0	160,00	$85.784.960

4.1.24	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 8-10 m, diámetro interno1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	120,00	$566.302	$67.956.240				120,00	67.956.240		0	0,00	0	120,00	$67.956.240
4.1.25	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 10-12 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 pa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	120,00	$597.393	$71.687.160				120,00	71.687.160		0	0,00	0	120,00	$71.687.160
4.1.26	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 12-15 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 21 mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	40,00	$661.237	$26.449.480				40,00	26.449.480		0	0,00	0	40,00	$26.449.480
4.1.27	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	11,00	$403.728	$4.441.008				11,00	4.441.008		0	0,00	0	11,00	$4.441.008
4.1.28	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	11,00	$420.061	$4.620.671				11,00	4.620.671		0	0,00	0	11,00	$4.620.671
4.1.29	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	11,00	$481.620	$5.297.820				11,00	5.297.820		0	0,00	0	11,00	$5.297.820
4.1.30	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	11,00	$502.139	$5.523.529				11,00	5.523.529		0	0,00	0	11,00	$5.523.529
4.1.31	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 8-10 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	11,00	$522.657	$5.749.227				11,00	5.749.227		0	0,00	0	11,00	$5.749.227
4.1.56	Descapote a maquina del terreno natural. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m2	1.500,00	$23.020	$34.530.000				1.500,00	34.530.000		0	0,00	0	1.500,00	$34.530.000
4.1.57	Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los materiales.	m3	25.500,00	$5.296	$135.048.000				25.500,00	135.048.000	7.211,50	38.192.104	7.211,50	38.192.104	18.289,00	$96.858.544
4.1.58	Voladura roca con explosivo. Incluye desembombe, transporte y disposición final de los materiales.	pulg	350,00	$16.794	$5.877.900				350,00	5.877.900		0	0,00	0	350,00	$5.877.900
	SUBCAPITULO 4.2 - LLENOS															
4.2.1	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	2.855,00	$10.347	$29.540.685				2.855,00	29.540.685		0	0,00	0	2.855,00	$29.540.685
4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	775,00	$17.976	$13.931.400				775,00	13.931.400		0	0,00	0	775,00	$13.931.400
4.2.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado	m3	150,00	$31.027	$4.654.050				150,00	4.654.050		0	0,00	0	150,00	$4.654.050
4.2.4	Lleno manual para estructuras con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación	m3	1.250,00	$58.042	$72.552.500				1.250,00	72.552.500	66,00	3.830.772	66,00	3.830.772	1.184,00	$68.721.728
4.2.6	Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo item.	m3	325,00	$116.132	$37.742.900				325,00	37.742.900		0	0,00	0	325,00	$37.742.900
4.2.8	Pedraplen compacto. Incluye suministro de material, transporte, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	20,00	$87.838	$1.756.760				20,00	1.756.760		0	0,00	0	20,00	$1.756.760
4.2.9	Pedraplen compacto. Incluye suministro de material, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye transporte del material	m2	30,00	$79.804	$2.394.120				30,00	2.394.120		0	0,00	0	30,00	$2.394.120
	SUBCAPITULO 4.3 - CONFORMACION DEL TERRENO															
4.3.2	Conformación de la calzada con motoniveladora. Incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	115.600,00	$1.389	$160.568.400				115.600,00	160.568.400	19.040,00	26.446.560	19.040,00	26.446.560	96.560,00	$134.121.840
4.3.5	Adecuación zonas de depósito y disposición final de material sobrante. Incluye descapote, conformación y compactación.	m2	12.600,00	$5.383	$67.825.800				12.600,00	67.825.800		0	0,00	0	12.600,00	$67.825.800
4.3.6	Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo a las dimensiones, alineamientos y pendientes de la vía.	m2	2.350,00	$1.629	$3.828.150	+	30000,00		32.350,00	52.698.150	18.200,00	29.647.800	18.200,00	29.647.800	14.150,00	$23.050.350
	TOTAL CAPITULO 4				**$ 1.202.825.520,00**											
	CAPITULO 5 - AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES															
	SUBCAPITULO 5.1 - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO															
5.1.1	Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	3.050	$53.819	$164.147.950				3.050,00	164.147.950	314,00	16.899.166	314,00	16.899.166	2.736,00	$147.248.784

5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	750	$74.284	$55.713.000	+	3500,00		4.250,00	315.707.000	2.362,50	175.495.950	2.362,50	175.495.950	1.888,00	$140.248.192
5.1.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	85	$115.525	$9.819.625				85,00	9.819.625		0	0,00	0	85,00	$9.819.625
5.1.6	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	120	$104.432	$12.531.840				120,00	12.531.840		0	0,00	0	120,00	$12.531.840
	SUBCAPITULO 5.2 - SUELOS Y BASES ESTABILIZADAS															
5.2.7	Instalación de base existente reciclada con adición de base granular y cemento, E = 30cm (10 cm de Mezcla asfáltica recuperada, 20 cm Base granular existente)	m2	10.200	$62.653	$639.060.600	-	-10085,05		115,00	7.205.095		0	0,00	0	115,00	$7.205.095
5.2.8	Instalación de base existente reciclada con adición de base granular y cemento, E = 30cm (7 cm de Mezcla asfáltica recuperada, 20 cm Base granular existente y 3 cm de Base granular nueva)	m2	20	65.845	$1.316.900				20,00	1.316.900		0	0,00	0	20,00	$1.316.900
	TOTAL CAPITULO 5				**$ 882.589.915,00**											
	CAPITULO 6 - CONCRETO, MORTEROS															
	SUBCAPITULO 6.1 - CONCRETOS PARA SUBESTRUCTURAS															
6.1.1	Pila en concreto Clase D (21 MPa) fundido en sitio, D=1.20 m, sin anillo	ml	210	765.830	$160.824.300				210,00	160.824.300		0	0,00	0	210,00	$160.824.300
6.1.3	Pila en concreto Clase D (21 MPa) fundido en sitio, D=1.30 m, sin anillo	ml	65	889.514	$57.818.410				65,00	57.818.410		0	0,00	0	65,00	$57.818.410
6.1.19	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	26	28.551	$742.326	+	150,00		176,00	5.024.976	32,40	925.052	32,40	925.052	144,00	$4.111.344
6.1.25	Concreto Clase D (21 MPa). Llave de confinamiento para pavimento en adoquín de 0,15 x 0,40 m	ml	5	43.803	$219.015				5,00	219.015		0	0,00	0	5,00	$219.015
	SUBCAPITULO 6.2 - CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS															
6.2.2	Concreto Clase G (Ciclópeo con concreto clase F - 14 MPa)	m3	7	453.037	$3.171.259				7,00	3.171.259		0	0,00	0	7,00	$3.171.259
6.2.3	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios.	m3	15	558.533	$8.377.995				15,00	8.377.995		0	0,00	0	15,00	$8.377.995
6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	5	622.751	$3.113.755				5,00	3.113.755		0	0,00	0	5,00	$3.113.755
6.2.5	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	180	687.810	$123.805.800				180,00	123.805.800		0	0,00	0	180,00	$123.805.800
6.2.6	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas colectoras de aguas lluvias desarrollo 1.00 m e: 0.10 m. La malla electrosoldada se pagará en su respectivo item.	ml	5	93.647	$468.235				5,00	468.235		0	0,00	0	5,00	$468.235
6.2.8	Concreto Clase D (21MPa) - Box Coulvert. Losa Inferior	m3	6	802.679	$4.816.074				6,00	4.816.074		0	0,00	0	6,00	$4.816.074
6.2.9	Concreto Clase D (21 MPa). Box Coulvert - Losa superior y muros laterales	m3	14	862.847	$12.079.858				14,00	12.079.858		0	0,00	0	14,00	$12.079.858
6.2.10	Concreto Clase D (21 MPa). Muros, disipadores, aletas y estribos.	m3	12	867.927	$10.415.124				12,00	10.415.124		0	0,00	0	12,00	$10.415.124
6.2.27	Concreto Clase C (28 MPa). Dado de anclaje de 1.0 x 1.0 x 0.35. Incluye Suministro, transporte y colocación. El refuerzo se pagara en su ítem respectivo.	m3	2	827.169	$1.654.338				2,00	1.654.338		0	0,00	0	2,00	$1.654.338
6.2.31	Concreto Clase C (28 MPa). Estribos y vigas cabezales. Incluye suministro, transporte, colocación, formaleta, obra falsa para puentes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	12	923.010	$11.076.120				12,00	11.076.120		0	0,00	0	12,00	$11.076.120
6.2.32	Concreto clase C (28 MPa). Tablero, losa de de fondo y bordillo. Incluye suministro, transporte, colocación, formaleta, obra falsa para puentes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	7	977.073	$6.839.511				7,00	6.839.511		0	0,00	0	7,00	$6.839.511
6.2.33	Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su construcción. El acero se paga en su ítem correspondiente.	m3	2	1.113.545	$2.227.090				2,00	2.227.090		0	0,00	0	2,00	$2.227.090
6.2.42	Suministro y aplicación de adhesivo epóxico para garantizar el puente de adherencia entre concreto fresco y concreto endurecido. Incluye limpieza de superficie de concreto, no incluye anclajes.	m2	50	57.956	$2.897.800				50,00	2.897.800		0	0,00	0	50,00	$2.897.800
	TOTAL CAPITULO 6				**$ 410.547.010,00**											
	CAPITULO 7 - PAVIMENTOS Y NEOPRENOS															
7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque	m2	10.200	3.710	$37.842.000				10.200,00	37.842.000	-	0	0,00	0	10.200,00	$37.842.000
7.1.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.	m3	1.020	968.028	$987.388.560				1.020,00	987.388.560		0	0,00	0	1.020,00	$987.388.560

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCSORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
18.1	jor	Obreros por Administración. Incluye factor prestacional.

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN.	LARGO	ANCHO o Seccion	ALTO	N° ELEMENTOS	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	28-10-20	41+300	41+300	Ejecucion en ambas margenes	Jor				7	7.00
			41+500	41+500						7	7.00
									SUB-TOTAL		**14.00**
56AN05	La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral	28-10-20	07+100	07+160	margen Izq.	Jor				2	2.00
			07+500	07+500	Margen Der.					3	3.00
									SUB-TOTAL		**5.00**
60AN18	La Piñuela - San Francisco	28-10-20	11+300	11+500	Margen Der.	Jor				4	4.00
									SUB-TOTAL		**4.00**
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**23.00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

7.1.6	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para Bacheos, que cumpla con el Artículo 450-13. Incluye marcación de la zona fallada, suministro y riego de emulsión asfáltica para el ligado de paredes demarcadas y de la base granular, limpieza de la superficie y demarcación, compactación de la mezcla y todo el sistema constructivo necesario para cumplir a satisfacción esta actividad (como cortes y protección de elementos entre otros). No incluye cargue y transporte de escombros provenientes del corte que se pagará en su respectivo ítem, al igual que la Subabase y base granular para bacheo que se pagaran en el ítem correspondiente	m3	9	1.180.504	$10.624.536	+	100,00		109,00	128.674.936	34,04	40.187.284	34,04	40.187.284	75,00	$88.537.800
7.1.10	Sello de grietas en pavimento asfáltico con ruteo	ml	2.500	4.930	$12.325.000				2.500,00	12.325.000		0	0,00	0	2.500,00	$12.325.000
	TOTAL CAPITULO 7				**$ 1.048.180.096,00**											
	CAPITULO 8 - OBRAS DE DRENAJES, SUBDRENAJE Y PROYECCIÓN															
8.2	Limpieza mecánica de cunetas	m3	1.250	28.944	$36.180.000	+	2.000,00		3.250,00	94.068.000	1.100,00	31.838.400	1.100,00	31.838.400	2.150,00	$62.229.600
8.3	Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	un	2.050	90.736	$186.008.800				2.050,00	186.008.800	476,00	43.190.336	476,00	43.190.336	1.574,00	$142.818.464
8.4	Limpieza de cunetas en concreto, incluye acarreo interno	ml	185.000	1.153	$213.305.000				185.000,00	213.305.000	100.759,00	116.175.127	100.759,00	116.175.127	84.241,00	$97.129.873
8.8	Suministro, transporte e instalación de Geodrén circular. Incluye tubería de drenaje HDPE de 4". No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	ml	1.193	70.578	$84.199.554				1.193,00	84.199.554		0	0,00	0	1.193,00	$84.199.554
8.9	Suministro, transporte e Instalción de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	1.150	9.487	$10.910.050				1.150,00	10.910.050		0	0,00	0	1.150,00	$10.910.050
8.11	Suministro, transporte e instalación de Geotextil T 2100 o similar	m2	450	8.480	$3.816.000				450,00	3.816.000		0	0,00	0	450,00	$3.816.000
8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	10	748.632	$7.486.320				10,00	7.486.320		0	0,00	0	10,00	$7.486.320
8.21	Tubería de concreto reforzado 900 mm, hecho en obra-280 kg/cm2	ml	12	450.144	$5.401.728				12,00	5.401.728		0	0,00	0	12,00	$5.401.728
8.27	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado	ml	18	1.448.535	$26.073.630				18,00	26.073.630		0	0,00	0	18,00	$26.073.630
8.31	Suministro, transporte y colocación de tubería de 4", perforada para drenaje y filtros	ml	85	36.787	$3.126.895				85,00	3.126.895		0	0,00	0	85,00	$3.126.895
8.33	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC - S de 3" para pases de muro	ml	80	24.559	$1.964.720				80,00	1.964.720		0	0,00	0	80,00	$1.964.720
8.35	Suministro, transporte y construcción de Gaviones, incluye transporte material	m3	5	226.462	$1.132.310				5,00	1.132.310		0	0,00	0	5,00	$1.132.310
8.36	Reparación de gavión, reutilizando piedra existente	m3	10	150.006	$1.500.060				10,00	1.500.060		0	0,00	0	10,00	$1.500.060
8.39	Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Brachiaria decumbens, para sembrar en sitios hasta 2.000 mts de altura snm	m2	558	21.439	$11.962.962				558,00	11.962.962		0	0,00	0	558,00	$11.962.962
8.40	Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Reygrass pasares, para sembrar en sitios con alturas mayores de 2.000 mts de altura snm	m2	2.600	18.366	$47.751.600				2.600,00	47.751.600		0	0,00	0	2.600,00	$47.751.600
8.41	Revegetalización de zonas planas y/o zonas de deposito con estolones de pasto de la zona.	m2	350	7.692	$2.692.200				350,00	2.692.200		0	0,00	0	350,00	$2.692.200
8.42	Revegetalización de zonas planas y/o zonas de deposito con semillas certificada de gramineas.	m2	1.250	9.217	$11.521.250				1.250,00	11.521.250		0	0,00	0	1.250,00	$11.521.250
8.44	Bolsacretos, concreto clase E	m3	3	554.789	$1.664.367				3,00	1.664.367		0	0,00	0	3,00	$1.664.367
8.47	Construcción de Trinchos en madera	ml	1	35.056	$35.056				1,00	35.056		0	0,00	0	1,00	$35.056
8.48	Rondas de Coronación Trapezoidal en Geomembrana (incluye Excavación)	ml	1	68.403	$68.403				1,00	68.403		0	0,00	0	1,00	$68.403
8.50	Rondas de Coronación en sacos de polipropileno (suelo cemento 5:1, 60Cm *70cm)	ml	35	35.491	$1.242.185	+	800,00		835,00	29.634.985	714,00	25.340.574	714,00	25.340.574	121,00	$4.294.411
8.52	Sellado de Grietas con material de Limo y Cal (Grieta máxima de 15 cm de ancho * 60 cm de profundidad)	ml	35	9.372	$328.020				35,00	328.020		0	0,00	0	35,00	$328.020
	TOTAL CAPITULO 8				**$ 658.371.110,00**											
10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	55.000	5.617	$308.935.000				55.000,00	308.935.000		0	0,00	0	55.000,00	$308.935.000
	TOTAL CAPITULO 10				**$ 308.935.000,00**											
	CAPITULO 11 - ELEMENTOS METÁLICOS Y ANCLAJES				$0											
11.1	Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente.	ml	350	200.903	$70.316.050				350,00	70.316.050		0	0,00	0	350,00	$70.316.050

11.11	Barandas metálicas tipo pingüino en tubería de 4", Acero A-500 Grado C - Limpieza (Sand Blasting) grado metal casi blanco, perfil de rugosidad de 1,5 a 2 mils, anticorrosivo epoxipoliamida espesor mínimo de 3 mils, acabado de uretano de espesor mínimo de 3 mils. Incluye platinas de asiento y de anclaje.	ml	150	535.508	$80.326.200				150,00	80.326.200		0	0,00	0	150,00	$80.326.200
	TOTAL CAPITULO 11				$150.642.250												
	CAPITULO 12 - SEÑALIZACIÓN Y PINTURAS				$0												
12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	ml	152.300	2.293	$349.223.900				152.300,00	349.223.900		0	0,00	0	152.300,00	$349.223.900
12.2	Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. lincluye texto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	120	55.271	$6.632.520				120,00	6.632.520		0	0,00	0	120,00	$6.632.520
12.5	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8".	un	98	330.861	$32.424.378				98,00	32.424.378		0	0,00	0	98,00	$32.424.378
	TOTAL CAPITULO 12				**$ 388.280.798,00**												
	CAPITULO 13 - TRANSPORTE DE MATERIAL				$0												
13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	564.957	1.486	$839.526.102				564.957,00	839.526.102	39.410,09	58.563.388	39.410,09	58.563.388	525.547,00	$780.962.842
13.3	Transporte de material proveniente de derrumbes. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m	m3-km	315.000	1.144	$360.360.000	+	99.980,468		414.980,47	474.737.655	211.564,05	242.029.273	211.564,05	242.029.273	203.416,00	$232.707.904
13.5	Transporte de material ente 100 m y 1000 m. Incluye cargue del material. Medido suelto para distancias que superen el acarreo libre (100 m).	m3	2.200	4.461	$9.814.200				2.200,00	9.814.200		0	0,00	0	2.200,00	$9.814.200
	TOTAL CAPITULO 13				**$ 1.209.700.302,00**												
	CAPITULO 15 - MANEJO DE ESPECIES VEGETALES																
15.1	Suministro, transporte y siembra de árbol h<=1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas, transporte y todo lo necesario para la correcta siembra.	un	45	63.961	$2.878.245				45,00	2.878.245		0	0,00	0	45,00	$2.878.245
15.8	Rocería. Incluye cargue, trasporte y disposición adecuada de material resultante	Ha	642	766.484	$492.082.728				642,00	492.082.728	43,15	33.073.785	43,15	33.073.785	599,00	$459.123.916
15.11	Tala, cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 5.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, transporte y disposición del material resultante.	un	12	228.940	$2.747.280				12,00	2.747.280		0	0,00	0	12,00	$2.747.280
	TOTAL CAPITULO 15				**$ 497.708.253,00**												
	CAPITULO 18 - VARIOS																
18.1	Obreros por Administración. Incluye factor prestacional.	jor	150	76.874	$11.531.100				150,00	11.531.100	23,00	1.768.102	23,00	1.768.102	127,00	$9.762.998
	TOTAL GRUPO 18				**$ 11.531.100,00**												
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 6.893.575.789,00**												
															-		
COSTO TOTAL										**$6.893.575.789**		**$889.229.492**		**889.229.492**		**$6.004.568.795**
COSTO BÁSICO					**$5.298.267.458**					**$5.298.267.458**		**683.444.387**		**683.444.387**		**$4.614.994.078**
ADMINISTRACION				23,11%	**$1.224.429.609**					**$1.224.429.609**		**157.943.998**		**157.943.998**		**$1.066.525.131**
IMPREVISTOS				2,00%	**$105.965.349**					**$105.965.349**		**13.668.888**		**13.668.888**		**$92.299.882**
UTILIDAD				5,00%	**$264.913.373**					**$264.913.373**		**34.172.219**		**34.172.219**		**$230.749.704**
VALOR CON AIU					**$6.893.575.789**					**$6.893.575.789**		**889.229.492**		**889.229.492**		**6.004.346.297**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (Incluye IVA)					**$33.192.440**					**$33.192.440**		**0**		**0**		**33.192.440**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)					**$39.968.314**					**$39.968.314**		**0**		**0**		**39.968.314**
GEOREFERENCIACION (Incluye IVA)					**$3.706.740**					**$3.706.740**		**0**		**0**		**3.706.740**
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA)	***Estimado***				**$ 41.444.706**					**$ 41.444.706**		**0**		**0**		**41.444.706**
PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA -					**$ 97.331.289**					**$ 97.331.289**		**0**		**0**		**97.331.289**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO CON IVA					**$7.109.219.278**					**$7.109.219.278**							**$6.219.989.786**
	TOTAL ACTA											**$889.229.492**		**$889.229.492**			**$7.109.219.278**
	PORCENTAJE EJECUTADO											**12,51%**					
	TOTAL ACTA No. 01											**$889.229.492**					
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO SALDO ANTICIPO: (15%)											**$102.516.658**					**102.516.658,00**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:											**$786.712.834**					
	CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO																
	TOTAL ACTAS DEL CONTRATO																**$889.229.492**
	PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO																**12,51%**
	SALDO POR EJECUTAR																**$6.219.989.786**
	ANTICIPO INICIAL (15%)																**$ 738.995.693**
	ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO																**$ 102.516.658**
	ANTICIPO POR AMORTIZAR																**$ 636.479.035**

Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervienen:

LUIS CARLOS TORRES V
Rep. Legal Contratista
CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

WILLIAM VALENCIA C.
Director Interventoria
INGEVAL

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
2.3	m³	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros







CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN.	LARGO	ANCHO o Seccion	ALTO	N° ELEMENTOS	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN15	Marinilla - El Peñol	29-10-20	0+000	0+016	Margen derecha	m³	16.4	4.77	0.10	1.00	7.82
					Margen izquierda	m³	9.1	4.2	0.100	1.00	3.82
			0+026	0+35	Margen derecha	m³	8.35	5.7	0.10	1.00	4.76
					Margen derecha	m³	7.95	3	0.10	1.00	2.39
					Margen izquierda	m³	2.2	1.16	0.10	1.00	0.26
					Margen izquierda	m³	12.86	2.68	0.10	1.00	3.45
			0+600	0+610	Margen izquierda	m³	3.4	1.05	0.10	1.00	0.36
					Margen izquierda	m³	3.4	3.85	0.10	1.00	1.31
					Margen izquierda	m³	2.95	1.9	0.10	1.00	0.56
			0+615	0+621	Margen izquierda	m³	6	2	0.10	1.00	1.20
			0+790	0+795	Margen izquierda	m³	5	3.35	0.10	1.00	1.68
			0+800	0+820	Margen izquierda	m³	17.2	3.75	0.10	1.00	6.45
									SUB-TOTAL		34.04
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		34.04

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCSORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
4.1.8	m³	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.





0

Roceria Auotpista - Granada puntos críticos km5+400 y km5+500 margen izquierda.

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN.	LARGO	ANCHO o Seccion	ALTO	Nº ELEMENTOS	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN16-1	Autopista - El Ramal - Granada	28-10-20	Km 0+900		En punto critico, lateral derecho	m³	36	1.00	0.50	1	18.00
									SUB-TOTAL		**18.00**
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**18.00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
4.1.57	m3	Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los materiales.







Durante la presente semana continua remoción de derrumbes entre los km 19+300 al km 31+500.

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN	Placa	N° viajes	Dist.(Km)	Vol	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	16-10-20	km20+100.0	km31+100.0	Calzada completa	m³	LLJ 878	4		8.00	32.00
		16-10-20	km20+100.0	km31+100.0		m³	HAA 315	4		7.50	30.00
		16-10-20	km20+100.0	km31+100.0		m³	PBB 078	4		8.00	32.00
		19-10-20	km20+100.0	km31+100.0		m³	NEA 154	4		10.00	40.00
		19-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	4		8.00	32.00
		19-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	PBB 078	4		8.00	32.00
		19-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	HAA 315	4		7.50	30.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	5		8.00	40.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	HAA 315	5		7.50	37.50
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	PBB 078	5		8.00	40.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	NEA 154	5		10.00	50.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TKA 676	5		8.00	40.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	RIE 913	4		8.00	32.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	XFL 473	4		8.00	32.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TBD 437	4		8.00	32.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	NEA 154	6		10.00	60.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	HAA 315	6		7.50	45.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	RIE 913	6		8.00	48.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	5		8.00	40.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	XFL 473	5		8.00	40.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TBD 437	5		8.00	40.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TMZ 082	5		15.00	75.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TKA 676	5		8.00	40.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	PBB 078	4		8.00	32.00
		23-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TMZ 082	7		15.00	105.00
		23-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	7		8.00	56.00
		23-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	PBB 078	7		8.00	56.00
		23-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	NEA 154	7		10.00	70.00
		23-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	HAA 315	7		7.50	52.50
		23-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	RIE 913	7		8.00	56.00
		23-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	TKA 676	6		8.00	48.00
		23-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	XFL 473	6		8.00	48.00
		23-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	TBD 437	6		8.00	48.00
		24-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	6		8.00	48.00
		24-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	XFL 473	6		8.00	48.00
		24-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	TBD 437	6		8.00	48.00
		24-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	NEA 154	6		10.00	60.00

		24-10-20	km19+700.0	km31+100.0		m³	HAA 315	5		7.50	37.50
		24-10-20	km19+700.0	km31+100.0		m³	RIE 913	5		8.00	40.00
		24-10-20	km19+600.0	km31+100.0		m³	TMZ 082	5		15.00	75.00
		24-10-20	km19+600.0	km31+100.0		m³	TKA 676	5		8.00	40.00
		24-10-20	km19+600.0	km31+100.0		m³	PBB 078	5		8.00	40.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TMZ 082	6		15.00	90.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	6		8.00	48.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	PBB 078	6		8.00	48.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	HAA 315	6		7.50	45.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TKA 676	5		8.00	40.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	RIE 913	5		8.00	40.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	NEA 154	5		10.00	50.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	6		8.00	48.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	HAA 315	6		7.50	45.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	NEA 154	6		10.00	60.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	PBB 078	6		8.00	48.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TKA 676	6		8.00	48.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	RIE 913	5		8.00	40.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TMZ 082	5		15.00	75.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TBD 437	5		8.00	40.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	XFL 473	5		8.00	40.00
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	HAA 315	6		7.50	45.00
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	NEA 154	6		10.00	60.00
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	PBB 078	6		8.00	48.00
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TBD 437	6		15.00	90.00
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	RIE 913	5		8.00	40.00
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	XFL 473	5		8.00	40.00
		28-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	NEA 154	4		10.00	40.00
		28-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	PBB 078	4		8.00	32.00
		28-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	HAA 315	4		7.50	30.00
		28-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TBD 437	4		15.00	60.00
									SUB-TOTAL		**3,217.50**
										TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**3,217.50**

FIRMA INTERVENTORÍA







Durante la presente semana continua remoción de derrumbes entre los km 19+300 al km 31+500.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos | 60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos | 60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos







Durante la presente semana continua remoción de derrumbes entre los km 19+500 al km 31+500.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos | 60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos | 60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PREACTA DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD POR ITEM DE VOLUMEN

UNIDOS

PROYECTO:	**CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SUBREGIÓN ORIENTE.**		
LOCALIZACIÓN:	**San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos 60AN15-2-2**		
MES:	**OCTUBRE DE 2020**		
FECHA DE ELABORACION:	**16/10/20 A 29/10/2020**		
ITEM:	**4.1.57**	**Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los materiales.**	**UNIDAD:** **M3**

Fecha	N° ORDEN	Abs Inicial	Abs Final	PLACA	N° viajes	ACARREO KM	Volumen (m^3)	Vol Acumulado (m3)
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	LLJ 878	3		8	24.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	HAA 315	2		7.50	15.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	PBB 078	3		8	24.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	NEA 154	7		10	70.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	105.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TBD 437	7		8	56.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TKA 676	7		8	56.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	XFL 473	7		8	56.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	LLJ 878	6		8	48.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	HAA 315	6		7.50	45.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	PBB 078	7		8	56.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	NEA 154	7		10	70.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	105.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TBD 437	7		8	56.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TKA 676	7		8	56.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	XFL 473	7		8	56.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	LLJ 878	6		8	48.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	PBB 078	5		8	40.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	NEA 154	6		10	60.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	6		15	90.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TBD 437	6		8	48.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TKA 676	6		8	48.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	XFL 473	6		8	48.00
19-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	NEA 154	3		10.00	30.00
19-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	LLJ 878	2		8	16.00
19-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	PBB 078	2		8	16.00
19-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	HAA 315	3		8	22.50
19-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	105.00
19-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TBD 437	7		8	56.00
19-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TKA 676	7		8	56.00
19-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	XFL 473	7		8	56.00
20-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	NEA 154	7		10.00	70.00
20-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	LLJ 878	6		8	48.00
20-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	PBB 078	5		8	40.00
20-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	HAA 315	7		8	52.50
20-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	105.00
20-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TBD 437	7		8	56.00
20-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TKA 676	7		8	56.00
20-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	XFL 473	6		8	48.00
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	LLJ 878	2		8	16.00
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	HAA 315	2		7.50	15.00
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	PBB 078	2		8	16.00
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	NEA 154	1		10	10.00
21-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	105.00
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	TKA 676	2		8	16.00
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	RIE 913	2		8	16.00
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	XFL 473	3		8	24.00
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	TBD 437	3		8	24.00
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	NEA 154	1		10	10.00
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	HAA 315	1		7.50	7.50
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	RIE 913	1		8	8.00
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	LLJ 878	1		8	8.00
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	XFL 473	2		8	16.00
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	TBD 437	2		8	16.00
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	TMZ 082	2		15	30.00
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	TKA 676	1		8	8.00
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	PBB 078	3		8	24.00
24-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	LLJ 878	1		8	8.00
24-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	XFL 473	1		8	8.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PREACTA DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD POR ITEM DE VOLUMEN

UNIDOS

PROYECTO:	**CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SUBREGIÓN ORIENTE.**		
LOCALIZACIÓN:	**San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos 60AN15-2-2**		
MES:	**OCTUBRE DE 2020**		
FECHA DE ELABORACION:	**16/10/20 A 29/10/2020**		
ITEM:	**4.1.57**	**Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los materiales.**	**UNIDAD:** **M3**

Fecha	N° ORDEN	Abs Inicial	Abs Final	PLACA	N° viajes	ACARREO KM	Volumen (m^3)	Vol Acumulado (m3)
24-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	TBD 437	1		8	8.00
24-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	NEA 154	1		10	10.00
24-oct.-2020		km19+700.0	km31+100.0	HAA 315	1		7.50	7.50
24-oct.-2020		km19+700.0	km31+100.0	RIE 913	2		8	16.00
24-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TMZ 082	2		15	30.00
24-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TKA 676	1		8	8.00
24-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	PBB 078	2		8	16.00
25-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TMZ 082	1		15	15.00
25-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	XFL 473	7		8	56.00
25-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	TBD 437	7		8	56.00
25-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	LLJ 878	1		8	8.00
25-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TKA 676	2		8	16.00
25-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	RIE 913	2		8	16.00
25-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	NEA 154	2		10	20.00
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	LLJ 878	1		8	8.00
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	NEA 154	2		10	20.00
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	PBB 078	1		8	8.00
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TKA 676	1		8	8.00
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	RIE 913	2		8	16.00
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TMZ 082	2		15	30.00
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	XFL 473	1		8	8.00
27-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	HAA 315	1		7.50	7.50
27-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	LLJ 878	6		8	48.00
27-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TMZ 082	6		15	90.00
27-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TKA 676	6		8	48.00
27-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	NEA 154	1		10	10.00
27-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TBD 437	1		15	15.00
27-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	RIE 913	2		8	16.00
27-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	XFL 473	1		8	8.00
28-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	NEA 154	3		10	30.00
28-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	PBB 078	2		8.00	16.00
28-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	HAA 315	2		7.50	15.00
28-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TBD 437	3		15	45.00
28-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	LLJ 878	6		8	48.00
28-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	XFL 473	6		8	48.00
28-oct.-2020		km19+700.0	km31+100.0	RIE 913	6		8	48.00
28-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	105.00
28-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TKA 676	6		8	48.00
29-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	NEA 154	6		10	60.00
29-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	PBB 078	5		8.00	40.00
29-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	HAA 315	5		7.50	37.50
29-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TBD 437	6		15	90.00
29-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	LLJ 878	5		8	40.00
29-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	XFL 473	5		8	40.00
29-oct.-2020		km19+700.0	km31+100.0	RIE 913	4		8	32.00
29-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TMZ 082	6		15	90.00
29-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TKA 676	5		8	40.00
						Total m3		**3,994.00**

(*) Si aplica

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCSORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
4.2.4	m3	Lleno manual para estructuras con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación







Durante la presente semana se realiza la recuperación de la calzada con material de afirmado en el km 0+900.

60AN16 Autopista - El Ramal - Granada | 60AN16 Autopista - El Ramal - Granada | 60AN16 Autopista - El Ramal - Granada

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN.	LARGO	ANCHO o Seccion	ALTO	N° ELEMENTOS	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN16-1	Autopista - El Ramal - Granada	28-10-20	Km 0+900		En punto critico, lateral derecho	m³	20	2.2	1.500	1	66.00
									SUB-TOTAL		**66.00**
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**66.00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
4.3.2	m²	Conformación de la calzada con motoniveladora. Incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.







Durante la presente semana se inicia la conformación de la calzada y mejoramiento de la misma con motoniveladora del km 0+000 al km 7+000.

60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda | 60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda | 60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN	Placa	N° viajes	Dist.(Km)	Vol	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	28-10-20	00+000	12+000	Calzada completa	m²	3500	5.2			18,200.00
									SUB-TOTAL		18,200.00
60AN16	Autopista - El Ramal - Granada	29-10-20	Km 0+900		Punto critico	m²	70	12			840.00
									SUB-TOTAL		840.00
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						19,040.00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda



60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda



CONTROL CANTIDADES DE OBRA


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
4.3.6	m²	Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo a las dimensiones, alineamientos y pendientes de la vía.







Durante la presente semana se inicia la conformación de la calzada y mejoramiento de la misma con motoniveladora del km 0+000 al km 7+000.

60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda | 60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda | 60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN	Placa	N° viajes	Dist.(Km)	Vol	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	28-10-20	00+000	12+000	Calzada completa	m²	3500	5.2			18,200.00
									SUB-TOTAL		18,200.00
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		18,200.00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
5.1.1	m³	Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.



60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



Inicia la construcción de muro en costales de suelo cemento en el k0+900

60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



60AN16 Autopista - El Ramal - Granada

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN	Placa	N° viajes	Dist.(Km)	Vol	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN16	Autopista - El Ramal - Granada	29-10-20	Km 0+900		Punto critico	m³		6		8.00	48.00
								8		15.00	120.00
									SUB-TOTAL		168.00
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						168.00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
5.1.1	m³	Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.



60AN16 Autopista - Granada km0+900



60AN16 Autopista - Granada km5+600



60AN16 Autopista - Granada km0+900

Roceria Auotpista - Granada puntos críticos km5+600 y km0+900

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN	Placa	N° viajes	Dist.(Km)	Vol	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN16	Autopista - El Ramal - Granada	29-10-20	Km 1+500		Punto critico	m³		7		8.00	56.00
								6		15.00	90.00
									SUB-TOTAL		**146.00**
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**146.00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCSORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
5.1.2	m³	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.



Durante la presente semana se inicia la conformación de la calzada y mejoramiento de la misma con motoniveladora del km 0+000 al km 7+000.

60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda



60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda



60AN20-1-1-1 Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN	Placa	N° viajes	Dist.(Km)	Vol	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	28-10-20	00+000	12+000	Calzada completa	m³	1000	5	0.150	1.00	750.00
									SUB-TOTAL		750.00
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		750.00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PREACTA DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD POR ITEM DE VOLUMEN

UNIDOS

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**		
LOCALIZACIÓN:	**Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda 60AN20-1-1-1**		
MES:	**OCTUBRE DE 2020**		
FECHA DE ELABORACION:	**30/10/2020 A 31/10/2020**		
ITEM:	**5.1.2** — **Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.**	**UNIDAD:**	**M3**

Fecha	CIV o Segmento (*)	Abs Inicial	Abs Final	Calzada / Margen	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Volumen (m^3)	Vol Acumulado (m3)
30-oct.-2020		km00+000.0	km12+000.0	c	1200.00	5.00	0.15	900.00	900.00
31-oct.-2020		km00+000.0	km12+000.0	c	950.00	5.00	0.15	712.50	712.50
							Total m3		**1,612.50**

(*) Si aplica

FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m
6.1.19	m²	

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN.	LARGO	ANCHO o Seccion	ALTO	N° ELEMENTOS	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN16-1	Autopista - El Ramal - Granada	28-10-20	Km 0+900		En punto critico, lateral derecho	m²	36	0.9			32.40
									SUB-TOTAL		32.40
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		32.40

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
7.1.6	m³	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para Bacheos, que cumpla con el Artículo 450-13. Incluye marcación de la zona fallada, suministro y riego de emulsión asfáltica para el ligado de paredes demarcadas y de la base granular, limpieza de la superficie y demarcación, compactación de la mezcla y todo el sistema constructivo necesario para cumplir a satisfacción esta actividad (como cortes y protección de elementos entre otros). No incluye cargue y transporte de escombros provenientes del corte que se pagará en su respectivo ítem, al igual que la Subabase y base granular para bacheo que se pagaran en el item correspondiente



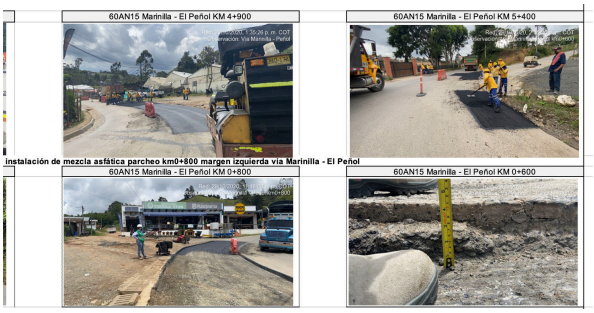

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN.	LARGO	ANCHO o Seccion	ALTO	N° ELEMENTOS	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN15	Marinilla - El Peñol	29-10-20	0+000	0+016	Margen derecha	m³	16.4	4.77	0.10	1.00	7.82
					Margen izquierda	m³	9.1	4.2	0.100	1.00	3.82
			0+026	0+35	Margen derecha	m³	8.35	5.7	0.10	1.00	4.76
					Margen derecha	m³	7.95	3	0.10	1.00	2.39
					Margen izquierda	m³	2.2	1.16	0.10	1.00	0.26
					Margen izquierda	m³	12.86	2.68	0.10	1.00	3.45
			0+600	0+610	Margen izquierda	m³	3.4	1.05	0.10	1.00	0.36
					Margen izquierda	m³	3.4	3.85	0.10	1.00	1.31
					Margen izquierda	m³	2.95	1.9	0.10	1.00	0.56
			0+615	0+621	Margen izquierda	m³	6	2	0.10	1.00	1.20
			0+790	0+795	Margen izquierda	m³	5	3.35	0.10	1.00	1.68
			0+800	0+820	Margen izquierda	m³	17.2	3.75	0.10	1.00	6.45
									SUB-TOTAL		**34.04**
								TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			**34.04**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA


OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
8.2	m³	Limpieza mecánica de cunetas







CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN	Placa	N° viajes	Dist.(Km)	Vol	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	28-10-20	21+800	25+800	margen L.I.	m³	2500	1.1	0.400	1.00	1,100.00
									SUB-TOTAL		1,100.00
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		1,100.00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCSORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
8.3	un	Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.







Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 6+000 al km 11+500.

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN.	LARGO	ANCHO o Seccion	ALTO	Nº ELEMENTOS	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	28-10-20	21+800	41+800	Ejecucion en ambas margenes	Un				80	80
									SUB-TOTAL		80.00
60AN15-2-1	La Aurora - Sonadora - Guatape	28-10-20	2+000	14+500	Ejecucion en ambas margenes	Un				100	100
									SUB-TOTAL		100.00
60AN19-2	San Luís - El Chocó	28-10-20	6+000	21+000	Ejecucion en ambas margenes	Un				100	100
									SUB-TOTAL		100.00
56AN05	La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral	28-10-20	32+500	42+900	Ejecucion en ambas margenes	Un				85	85
									SUB-TOTAL		85.00
60AN15	Marinilla - El Peñol	28-10-20	1+530	17+000	Ejecucion en ambas margenes	Un				42	42
									SUB-TOTAL		42.00
60AN16	Autopista - El Ramal - Granada	28-10-20	0+000	6+500	Ejecucion en ambas margenes	Un				30	30
									SUB-TOTAL		30.00
56AN05	La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral	28-10-20	06+400	10+400	En ambas margenes	Un				14	14
									SUB-TOTAL		14.00
60AN18	La Piñuela - San Francisco	28-10-20	05+800	10+400	En ambas margenes	Un				25	25
									SUB-TOTAL		25.00
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		476.00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCSORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA


OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
8.4	ml	Limpieza de cunetas en concreto, incluye acarreo interno





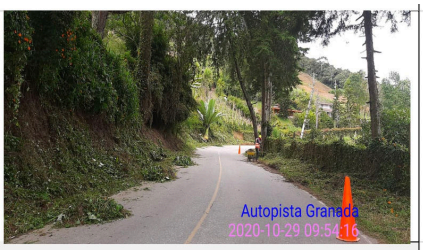

Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 0+000 al km 2+500.

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN.	LARGO	ANCHO o Seccion	ALTO	Nº ELEMENTOS	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	28-10-20	21+800	41+800	Ejecucion en ambas margenes	ml	17,000.0			2	16,000
									SUB-TOTAL		**16,000.00**
60AN15-2-1	La Aurora - Sonadora - Guatape	28-10-20	2+000	14+500	Ejecucion en ambas margenes	ml	13,000.0			2	26,000
									SUB-TOTAL		**26,000.00**
56AN05	La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral	28-10-20	35+100	42+900	Ejecucion en ambas margenes	ml	12,800.0			2	25,600
									SUB-TOTAL		**25,600.00**
60AN15	Marinilla - El Peñol	28-10-20			Ejecucion en L.D.	ml	7,024.8			1	7,024.8
					Ejecucion en L.I.	ml	6,734.2			1	6,734.2
									SUB-TOTAL		**13,759.00**
60AN16	Autopista - El Ramal - Granada	28-10-20			Ejecucion en L.D.	ml	3,000			1	3,000
					Ejecucion en L.I.	ml	3,000			1	3,000
									SUB-TOTAL		**6,000.00**
56AN05	La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral	28-10-20	06+400	10+400	En ambas margenes	ml	1,900			2	3,800
									SUB-TOTAL		**3,800.00**
60AN18	La Piñuela - San Francisco	28-10-20	05+800	10+400	En ambas margenes	ml	4,800			2	9,600
									SUB-TOTAL		**9,600.00**
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**100,759.00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA



60AN18 Piñuela San Francisco KM 11+200



60AN18 Piñuela San Francisco KM 11+300



60AN18 Piñuela San Francisco KM 11+300

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
8.50	ml	Rondas de Coronación en sacos de polipropileno (suelo cemento 5:1, 60Cm *70cm)



60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



Inicia la construcción de muro en costales de suelo cemento en el k0+900

60AN16 Autopista - El Ramal - Granada



60AN16 Autopista - El Ramal - Granada

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN.	LARGO	ANCHO o Seccion	ALTO	N° ELEMENTOS	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN16-1	Autopista - El Ramal - Granada	28-10-20	Km 0+900		En punto critico, lateral derecho	ml	36	0.7	0.15	14	714.00
									SUB-TOTAL		714.00
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		714.00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCSORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
13.1	m³/km	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN	Placa	N° viajes	Dist.(Km)	Vol	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	28-10-20	00+000	12+000	Calzada completa	m³/km			7.000	750.00	5,250.00
									SUB-TOTAL		**5,250.00**
60AN15	Marinilla - El Peñol	29-10-20	0+000	0+820	Zona localizada	m³/km			55	34.04	1,872.34
									SUB-TOTAL		**1,872.34**
60AN16	Autopista - El Ramal - Granada	29-10-20	Km 0+900		Punto critico	m³/km			168.000	58.00	9,744.00
									SUB-TOTAL		**9,744.00**
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**16,866.34**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	PREACTA DE OBRA DESCRIPCIÓN CANTIDAD POR ITEM DE VOLUMEN EN SITIO	SUELTO MEDIDO	UNIDOS

PROYECTO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SUBREGIÓN ORIENTE.

LOCALIZACIÓN: Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda 60AN20-1-1-1

MES: OCTUBRE DE 2020

FECHA DE 29/10/20

ITEM: 13.1 — Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

UNIDAD: m^3 - km

Fecha	CIV o Segmento (*)	Abs Inicial	Abs Final	M3	Distancia (KM) Promedio	Vol Acumulado (m3 - km)
30-oct.-2020		km08+200.0	km09+400.0	900	8.20	7380.00
31-oct.-2020		km08+200.0	km09+400.0	713	9.50	6768.75
					Total m^3-km	14,148.75



FIRMA INTERVENTORIA



FIRMA CONTRATISTA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	
13.1	m³/km	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN	Placa	N° viajes	Dist.(Km)	Vol	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN16	Autopista - El Ramal - Granada	29-10-20	Km 1+500		Punto critico	m³/km			146.000	57.50	8,395.00
									SUB-TOTAL		8,395.00
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		8,395.00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PREACTA DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD POR ITEM DE VOLUMEN

UNIDOS

PROYECTO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SUBREGIÓN ORIENTE.

LOCALIZACIÓN: San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos 60AN15-2-2

MES: OCTUBRE DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 29/10/20

ITEM: 13.3 Transporte de material proveniente de derrumbes. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir

UNIDAD: m3 - km

Fecha	N° ORDEN	Abs Inicial	Abs Final	PLACA	N° viajes	ACARREO KM	Volumen (m^3)	Vol Acumulado (m3 - km)
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	LLJ 878	3		8	696.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	HAA 315	2		7.50	435.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	PBB 078	3		8	696.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	NEA 154	7		10	2,030.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	3,045.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TBD 437	7		8	1,624.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TKA 676	7		8	1,624.00
16-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	XFL 473	7		8	1,624.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	LLJ 878	6		8	1,392.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	HAA 315	6		7.50	1,305.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	PBB 078	7		8	1,624.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	NEA 154	7		10	2,030.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	3,045.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TBD 437	7		8	1,624.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TKA 676	7		8	1,624.00
17-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	XFL 473	7		8	1,624.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	LLJ 878	6		8	1,392.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	PBB 078	5		8	1,160.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	NEA 154	6		10	1,740.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	6		15	2,610.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TBD 437	6		8	1,392.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TKA 676	6		8	1,392.00
18-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	XFL 473	6		8	1,392.00
19-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	NEA 154	3		10.00	870.00
19-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	LLJ 878	2		8	467.20
19-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	PBB 078	2		8	467.20
19-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	HAA 315	3		8	657.00
19-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	3,045.00
19-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TBD 437	7		8	1,624.00
19-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TKA 676	7		8	1,624.00
19-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	XFL 473	7		8	1,624.00
20-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	NEA 154	7		10.00	2,030.00
20-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	LLJ 878	6		8	1,401.60
20-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	PBB 078	5		8	1,168.00
20-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	HAA 315	7		8	1,533.00
20-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	3,045.00
20-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TBD 437	7		8	1,624.00
20-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TKA 676	7		8	1,624.00
20-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	XFL 473	6		8	1,392.00
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	LLJ 878	2		8	467.20
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	HAA 315	2		7.50	438.00
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	PBB 078	2		8	467.20
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	NEA 154	1		10	292.00
21-oct.-2020		km20+100.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	3,045.00
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	TKA 676	2		8	467.20
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	RIE 913	2		8	467.20
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	XFL 473	3		8	700.80
21-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	TBD 437	3		8	700.80
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	NEA 154	1		10	292.00
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	HAA 315	1		7.50	219.00
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	RIE 913	1		8	233.60
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	LLJ 878	1		8	233.60
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	XFL 473	2		8	467.20
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	TBD 437	2		8	467.20
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	TMZ 082	2		15	876.00
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	TKA 676	1		8	233.60
22-oct.-2020		km19+900.0	km31+100.0	PBB 078	3		8	700.80
24-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	LLJ 878	1		8	234.40

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	PREACTA DE OBRA DESCRIPCIÓN CANTIDAD POR ITEM DE VOLUMEN	UNIDOS

PROYECTO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SUBREGIÓN ORIENTE.

LOCALIZACIÓN: San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos 60AN15-2-2

MES: OCTUBRE DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 29/10/20

ITEM: 13.3 Transporte de material proveniente de derrumbes. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir

UNIDAD: m3 - km

Fecha	N° ORDEN	Abs Inicial	Abs Final	PLACA	N° viajes	ACARREO KM	Volumen (m^3)	Vol Acumulado (m3 - km)
24-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	XFL 473	1		8	234.40
24-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	TBD 437	1		8	234.40
24-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	NEA 154	1		10	293.00
24-oct.-2020		km19+700.0	km31+100.0	HAA 315	1		7.50	220.50
24-oct.-2020		km19+700.0	km31+100.0	RIE 913	2		8	470.40
24-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TMZ 082	2		15	885.00
24-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TKA 676	1		8	236.00
24-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	PBB 078	2		8	472.00
25-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TMZ 082	1		15	447.00
25-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	XFL 473	7		8	1,640.80
25-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	TBD 437	7		8	1,640.80
25-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	LLJ 878	1		8	238.40
25-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TKA 676	2		8	476.80
25-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	RIE 913	2		8	476.80
25-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	NEA 154	2		10	596.00
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	LLJ 878	1		8	238.40
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	NEA 154	2		10	596.00
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	PBB 078	1		8	238.40
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TKA 676	1		8	238.40
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	RIE 913	2		8	476.80
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TMZ 082	2		15	894.00
26-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	XFL 473	1		8	238.40
27-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	HAA 315	1		7.50	223.50
27-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	LLJ 878	6		8	1,406.40
27-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TMZ 082	6		15	2,655.00
27-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TKA 676	6		8	1,416.00
27-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	NEA 154	1		10	298.00
27-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TBD 437	1		15	447.00
27-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	RIE 913	2		8	476.80
27-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	XFL 473	1		8	238.40
28-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	NEA 154	3		10	894.00
28-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	PBB 078	2		8.00	476.80
28-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	HAA 315	2		7.50	447.00
28-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TBD 437	3		15	1,341.00
28-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	LLJ 878	6		8	1,406.40
28-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	XFL 473	6		8	1,406.40
28-oct.-2020		km19+700.0	km31+100.0	RIE 913	6		8	1,411.20
28-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TMZ 082	7		15	3,097.50
28-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TKA 676	6		8	1,416.00
29-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	NEA 154	6		10	1,788.00
29-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	PBB 078	5		8.00	1,192.00
29-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	HAA 315	5		7.50	1,117.50
29-oct.-2020		km19+300.0	km31+100.0	TBD 437	6		15	2,682.00
29-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	LLJ 878	5		8	1,172.00
29-oct.-2020		km19+800.0	km31+100.0	XFL 473	5		8	1,172.00
29-oct.-2020		km19+700.0	km31+100.0	RIE 913	4		8	940.80
29-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TMZ 082	6		15	2,655.00
29-oct.-2020		km19+600.0	km31+100.0	TKA 676	5		8	1,180.00
						Total m3		**116,758.20**

(*) Si aplica

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCSORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	Transporte de material proveniente de derrumbes. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m
13.3	m³/km	



60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



Durante la presente semana continua remoción de derrumbes entre los km 19+500 al km 31+500.

60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos



60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN	Placa	N° viajes	Dist.(Km)	Vol	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN20-1-1-1	Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda	16-10-20	km20+100.0	km31+100.0	Distancia del deposito al km 41+800 de la via, es de 7+300	m³	LLJ 878	4	29.00	8.00	928.00
		16-10-20	km20+100.0	km31+100.0		m³	HAA 315	4	29.00	7.50	870.00
		16-10-20	km20+100.0	km31+100.0		m³	PBB 078	4	29.00	8.00	928.00
		19-10-20	km20+100.0	km31+100.0		m³	NEA 154	4	29.00	10.00	1,160.00
		19-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	4	29.00	8.00	934.40
		19-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	PBB 078	4	29.00	8.00	934.40
		19-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	HAA 315	4	29.00	7.50	876.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	5	29.00	8.00	1,168.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	HAA 315	5	29.00	7.50	1,095.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	PBB 078	5	29.00	8.00	1,168.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	NEA 154	5	29.00	10.00	1,460.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TKA 676	5	29.00	8.00	1,168.00
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	RIE 913	4	29.00	8.00	934.40
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	XFL 473	4	29.00	8.00	934.40
		21-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TBD 437	4	29.00	8.00	934.40
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	NEA 154	6	29.00	10.00	1,752.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	HAA 315	6	29.00	7.50	1,314.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	RIE 913	6	29.00	8.00	1,401.60
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	5	29.00	8.00	1,168.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	XFL 473	5	29.00	8.00	1,168.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TBD 437	5	29.00	8.00	1,168.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TMZ 082	5	29.00	15.00	2,190.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TKA 676	5	29.00	8.00	1,168.00
		22-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	PBB 078	4	29.00	8.00	934.40
		23-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	TMZ 082	7	29.00	15.00	3,066.00
		23-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	7	29.00	8.00	1,635.20
		23-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	PBB 078	7	29.00	8.00	1,635.20
		23-10-20	km19+900.0	km31+100.0		m³	NEA 154	7	29.00	10.00	2,044.00
		23-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	HAA 315	7	29.00	7.50	1,538.25
		23-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	RIE 913	7	29.00	8.00	1,640.80
		23-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	TKA 676	6	29.00	8.00	1,406.40
		23-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	XFL 473	6	29.00	8.00	1,406.40
		23-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	TBD 437	6	29.00	8.00	1,406.40

		24-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	6	29.00	8.00	1,406.40
		24-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	XFL 473	6	29.00	8.00	1,406.40
		24-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	TBD 437	6	29.00	8.00	1,406.40
		24-10-20	km19+800.0	km31+100.0		m³	NEA 154	6	29.00	10.00	1,758.00
		24-10-20	km19+700.0	km31+100.0		m³	HAA 315	5	29.00	7.50	1,102.50
		24-10-20	km19+700.0	km31+100.0		m³	RIE 913	5	29.00	8.00	1,176.00
		24-10-20	km19+600.0	km31+100.0		m³	TMZ 082	5	29.00	15.00	2,212.50
		24-10-20	km19+600.0	km31+100.0		m³	TKA 676	5	29.00	8.00	1,180.00
		24-10-20	km19+600.0	km31+100.0		m³	PBB 078	5	29.00	8.00	1,180.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TMZ 082	6	29.00	15.00	2,682.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	6	29.00	8.00	1,430.40
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	PBB 078	6	29.00	8.00	1,430.40
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	HAA 315	6	29.00	7.50	1,341.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TKA 676	5	29.00	8.00	1,192.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	RIE 913	5	29.00	8.00	1,192.00
		25-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	NEA 154	5	29.00	10.00	1,490.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	LLJ 878	6	29.00	8.00	1,430.40
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	HAA 315	6	29.00	7.50	1,341.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	NEA 154	6	29.00	10.00	1,788.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	PBB 078	6	29.00	8.00	1,430.40
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TKA 676	6	29.00	8.00	1,430.40
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	RIE 913	5	29.00	8.00	1,192.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TMZ 082	5	29.00	15.00	2,235.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TBD 437	5	29.00	8.00	1,192.00
		26-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	XFL 473	5	29.00	8.00	1,192.00
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	HAA 315	6	29.00	7.50	1,341.00
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	NEA 154	6	29.00	10.00	1,788.00
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	PBB 078	6	29.00	8.00	1,430.40
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TBD 437	6	29.00	15.00	2,682.00
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	RIE 913	5	29.00	8.00	1,192.00
		27-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	XFL 473	5	29.00	8.00	1,192.00
		28-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	NEA 154	4	29.00	10.00	1,192.00
		28-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	PBB 078	4	29.00	8.00	953.60
		28-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	HAA 315	4	29.00	7.50	894.00
		28-10-20	km19+300.0	km31+100.0		m³	TBD 437	4	29.00	15.00	1,788.00
									SUB-TOTAL		**94,805.85**
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**94,805.85**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS

CONSORCIO VIAL SCSORIENTE

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020

Item No	Unidad	Rocería. Incluye cargue, trasporte y disposición adecuada de material resultante
15.8	Ha	







Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 16+000 al km 21+000

CODIGO	VIA	FECHA	ABSCISA		DETALLE	UN.	LARGO	ANCHO o Seccion	ALTO	N° ELEMENTOS	TOTAL
			Km Inicial	Km Final							
60AN15-2-2	San Rafael - La Palma - La Holanda - San Carlos	28-10-20	21+800	41+800	Ejecucion en ambas margenes	Ha	17,000	5		10,000	8.500
									SUB-TOTAL		8.500
60AN15-2-1	La Aurora - Sonadora - Guatape	28-10-20	2+000	14+500	Ejecucion en ambas margenes	Ha	13,000	5		10,000	6.500
									SUB-TOTAL		6.500
60AN19-2	San Luís - El Chocó	28-10-20	6+000	21+000	Ejecucion en ambas margenes	Ha	12,000	5		10,000	6.000
									SUB-TOTAL		6.000
56AN05	La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral	28-10-20	30+100	42+900	Ejecucion en ambas margenes	Ha	12,800	5		10,000	6.400
									SUB-TOTAL		6.400
60AN15	Marinilla - El Peñol	28-10-20	1+600	12+000	Ejecucion en ambas margenes	Ha	15,000	5		10,000	7.500
									SUB-TOTAL		7.500
60AN16	Autopista - El Ramal - Granada	28-10-20	0+000	5+600	Ejecucion en ambas margenes	Ha	6,500	5		10,000	3.250
									SUB-TOTAL		3.250
56AN05	La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral	28-10-20	06+400	10+400	En ambas margenes	Ha	4,000	5		10,000	2.000
									SUB-TOTAL		2.000
60AN18	La Piñuela - San Francisco	28-10-20	05+800	10+400	En ambas margenes	Ha	6,000	5		10,000	3.000
									SUB-TOTAL		3.000
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		43.150

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA







Durante la presente semana inicia la rocería, Limpieza de obras transversales, Limpieza de cunetas en concreto entre los km 6+000 al km 12+700.

ANEXO 3.

Acta de Mayores y Menores cantidades No. 01.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020		CONTRATO ADICIONAL No.	0
OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE		VR. CONTRATO ADICIONAL	0
VR INICIAL	$7,109,219,278	VALOR TOTAL	7,109,219,278
PLAZO INICIAL:	6 Meses		
CONTRATISTA		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 01	
CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE			
INTERVENTOR:		ACTA No.	01 MyM
INGEVAL S.A.S.		FECHA DE ACTA:	20/10/20

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES				
						ACTA DE MAYORES Y MENORES # 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	+ -	Cant	Valor Total ($)	Cant	Valor Total ($)
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES									
1,1	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisición.	día	15.00	800,967	$12,014,505				15.00	12,014,505
	TOTAL CAPITULO 1				**$12,014,505**					
	CAPITULO 2 - DEMOLICIONES, CORTE Y RETIROS									
2.3	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros	m3	450.00	153,410	$69,034,500				450.00	69,034,500
2.5	Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. Incluye cemento demoledor,	m3	85.00	425,188	$36,140,980				85.00	36,140,980
2.7	Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe, cargue, transporte y disposición de	m3	25.00	82,328	$2,058,200				25.00	2,058,200
2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	30.00	136,533	$4,095,990				30.00	4,095,990
2.23	Fresado de pavimento asfáltico en cualquier espesor. Incluye transporte, botada y disposición final del material.	m3	10.00	41,320	$413,200				10.00	413,200
	TOTAL CAPITULO 2				**111,742,870.00**					
	CAPITULO 3 - CERRAMIENTOS									
3.6	Suministro, transporte e instalación de cerco en alambre de púas con alambre galvanizado de 2 hilos calibre 12.5, con	ml	20.00	$25,353	$507,060				20.00	507,060
	TOTAL CAPITULO 3				**$507,060**					
	CAPITULO 4 - MOVIMIENTO DE TIERRAS									
	SUBCAPITULO 4.1 - EXCAVACIONES									
4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y prestamos. Incluye botada y disposición final de los materiales.	m3	1,540.00	$19,929	$30,690,660				1,540.00	30,690,660
4.1.6	Excavación sin clasificar de la explanación, canales y prestamos. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	650.00	$21,774	$14,153,100				650.00	14,153,100
4.1.7	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1,540.00	$35,138	$54,112,520				1,540.00	54,112,520
4.1.8	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1,350.00	$22,409	$30,252,150				1,350.00	30,252,150
4.1.9	Excavaciones para estructuras varias en material común bajo agua, incluye entibado, motobomba. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	30.00	$53,451	$1,603,530				30.00	1,603,530
4.1.20	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa . Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	160.00	$434,669	$69,547,040				160.00	69,547,040
4.1.21	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	160.00	$469,122	$75,059,520				160.00	75,059,520
4.1.22	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y	ml	160.00	$497,789	$79,646,240				160.00	79,646,240
4.1.23	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y	ml	160.00	$536,156	$85,784,960				160.00	85,784,960
4.1.24	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 8-10 m, diámetro interno1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	120.00	$566,302	$67,956,240				120.00	67,956,240
4.1.25	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 10-12 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 pa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	120.00	$597,393	$71,687,160				120.00	71,687,160
4.1.26	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 12-15 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 21 mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	40.00	$661,237	$26,449,480				40.00	26,449,480
4.1.27	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	11.00	$403,728	$4,441,008				11.00	4,441,008
4.1.28	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y	ml	11.00	$420,061	$4,620,671				11.00	4,620,671
4.1.29	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y	ml	11.00	$481,620	$5,297,820				11.00	5,297,820
4.1.30	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	11.00	$502,139	$5,523,529				11.00	5,523,529
4.1.31	Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 8-10 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	ml	11.00	$522,657	$5,749,227				11.00	5,749,227
4.1.56	Descapote a maquina del terreno natural. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m2	1,500.00	$23,020	$34,530,000				1,500.00	34,530,000

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020		CONTRATO ADICIONAL No.	0
OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE		VR. CONTRATO ADICIONAL	0
VR INICIAL	$7,109,219,278	VALOR TOTAL	7,109,219,278
PLAZO INICIAL:	6 Meses		
CONTRATISTA		**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 01**	
CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE			
INTERVENTOR:		**ACTA No.**	**01 MyM**
INGEVAL S.A.S.		**FECHA DE ACTA:**	**20/10/20**

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MODIFICACIONES**				
						ACTA DE MAYORES Y MENORES # 01			**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant**	**Precio Unitario ($)**	**Valor Total ($)**	**+ -**	**Cant**	**Valor Total ($)**	**Cant**	**Valor Total ($)**
4.1.57	Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los materiales.	m3	25,500.00	$5,296	$135,048,000				25,500.00	135,048,000
4.1.58	Voladura roca con explosivo. Incluye desembombe, transporte y disposición final de los materiales.	pulg	350.00	$16,794	$5,877,900				350.00	5,877,900
	SUBCAPITULO 4.2 - LLENOS									
4.2.1	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	2,855.00	$10,347	$29,540,685				2,855.00	29,540,685
4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	775.00	$17,976	$13,931,400				775.00	13,931,400
4.2.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado	m3	150.00	$31,027	$4,654,050				150.00	4,654,050
4.2.4	Lleno manual para estructuras con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación	m3	1,250.00	$58,042	$72,552,500				1,250.00	72,552,500
4.2.6	Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo ítem.	m3	325.00	$116,132	$37,742,900				325.00	37,742,900
4.2.8	Pedraplen compacto. Incluye suministro de material, transporte, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	20.00	$87,838	$1,756,760				20.00	1,756,760
4.2.9	Pedraplen compacto. Incluye suministro de material, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye transporte del material	m2	30.00	$79,804	$2,394,120				30.00	2,394,120
	SUBCAPITULO 4.3 - CONFORMACION DEL TERRENO									
4.3.2	Conformación de la calzada con motoniveladora. Incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	115,600.00	$1,389	$160,568,400				115,600.00	160,568,400
4.3.5	Adecuación zonas de depósito y disposición final de material sobrante. Incluye descapote, conformación y compactación.	m2	12,600.00	$5,383	$67,825,800				12,600.00	67,825,800
4.3.6	Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo a las dimensiones, alineamientos y pendientes de la vía.	m2	2,350.00	$1,629	$3,828,150	+	30000.00		32,350.00	52,698,150
	TOTAL CAPITULO 4				**$ 1,202,825,520.00**					
	CAPITULO 5 - AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES									
	SUBCAPITULO 5.1 - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
5.1.1	Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	3,050	$53,819	$164,147,950				3,050.00	164,147,950
5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	750	$74,284	$55,713,000	+	3500.00		4,250.00	315,707,000
5.1.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	85	$115,525	$9,819,625				85.00	9,819,625
5.1.6	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	120	$104,432	$12,531,840				120.00	12,531,840
	SUBCAPITULO 5.2 - SUELOS Y BASES ESTABILIZADAS									
5.2.7	Instalación de base existente reciclada con adición de base granular y cemento, E = 30cm (10 cm de Mezcla asfáltica	m2	10,200	$62,653	$639,060,600	-	-10085.05		115.00	7,205,095
5.2.8	Instalación de base existente reciclada con adición de base granular y cemento, E = 30cm (7 cm de Mezcla asfáltica	m2	20	65,845	$1,316,900				20.00	1,316,900
	TOTAL CAPITULO 5				**$ 882,589,915.00**					
	CAPITULO 6 - CONCRETO, MORTEROS									
	SUBCAPITULO 6.1 - CONCRETOS PARA SUBESTRUCTURAS									
6.1.1	Pila en concreto Clase D (21 MPa) fundido en sitio, D=1.20 m, sin anillo	ml	210	765,830	$160,824,300				210.00	160,824,300
6.1.3	Pila en concreto Clase D (21 MPa) fundido en sitio, D=1.30 m, sin anillo	ml	65	889,514	$57,818,410				65.00	57,818,410
6.1.19	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	26	28,551	$742,326	+	150.00		176.00	5,024,976
6.1.25	Concreto Clase D (21 MPa). Llave de confinamiento para pavimento en adoquín de 0,15 x 0,40 m	ml	5	43,803	$219,015				5.00	219,015

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020		CONTRATO ADICIONAL No.	0
OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE		VR. CONTRATO ADICIONAL	0
VR INICIAL	$7,109,219,278	VALOR TOTAL	7,109,219,278
PLAZO INICIAL:	6 Meses		
CONTRATISTA		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 01	
CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE			
INTERVENTOR:		ACTA No.	01 MyM
INGEVAL S.A.S.		FECHA DE ACTA:	20/10/20

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES				
						ACTA DE MAYORES Y MENORES # 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	+ -	Cant	Valor Total ($)	Cant	Valor Total ($)
	SUBCAPITULO 6.2 - CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS									
6.2.2	Concreto Clase G (Ciclópeo con concreto clase F - 14 MPa)	m3	7	453,037	$3,171,259				7.00	3,171,259
6.2.3	Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios.	m3	15	558,533	$8,377,995				15.00	8,377,995
6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	5	622,751	$3,113,755				5.00	3,113,755
6.2.5	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	180	687,810	$123,805,800				180.00	123,805,800
6.2.6	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas colectoras de aguas lluvias desarrollo 1.00 m e: 0.10 m. La malla electrosoldada se pagará	ml	5	93,647	$468,235				5.00	468,235
6.2.8	Concreto Clase D (21MPa) - Box Coulvert. Losa Inferior	m3	6	802,679	$4,816,074				6.00	4,816,074
6.2.9	Concreto Clase D (21 MPa). Box Coulvert - Losa superior y muros laterales	m3	14	862,847	$12,079,858				14.00	12,079,858
6.2.10	Concreto Clase D (21 MPa). Muros, disipadores, aletas y estribos.	m3	12	867,927	$10,415,124				12.00	10,415,124
6.2.27	Concreto Clase C (28 MPa). Dado de anclaje de 1.0 x 1.0 x 0.35. Incluye Suministro, transporte y colocación. El refuerzo se	m3	2	827,169	$1,654,338				2.00	1,654,338
6.2.31	Concreto Clase C (28 MPa). Estribos y vigas cabezales. Incluye suministro, transporte, colocación, formaleta, obra falsa para	m3	12	923,010	$11,076,120				12.00	11,076,120
6.2.32	Concreto clase C (28 MPa). Tablero, losa de de fondo y bordillo. Incluye suministro, transporte, colocación, formaleta, obra falsa	m3	7	977,073	$6,839,511				7.00	6,839,511
6.2.33	Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra y	m3	2	1,113,545	$2,227,090				2.00	2,227,090
6.2.42	Suministro y aplicación de adhesivo epóxico para garantizar el puente de adherencia entre concreto fresco y concreto	m2	50	57,956	$2,897,800				50.00	2,897,800
	TOTAL CAPITULO 6				$ 410,547,010.00					
	CAPITULO 7 - PAVIMENTOS Y NEOPRENOS									
7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para	m2	10,200	3,710	$37,842,000				10,200.00	37,842,000
7.1.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma	m3	1,020	968,028	$987,388,560				1,020.00	987,388,560
7.1.6	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para Bacheos, que cumpla con el Artículo 450-	m3	9	1,180,504	$10,624,536	+	100.00		109.00	128,674,936
7.1.10	Sello de grietas en pavimento asfáltico con ruteo	ml	2,500	4,930	$12,325,000				2,500.00	12,325,000
	TOTAL CAPITULO 7				**$ 1,048,180,096.00**					
	CAPITULO 8 - OBRAS DE DRENAJES, SUBDRENAJE Y PROYECCIÓN									
8.2	Limpieza mecánica de cunetas	m3	1,250	28,944	$36,180,000	+	2,000.00		3,250.00	94,068,000
8.3	Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás	un	2,050	90,736	$186,008,800				2,050.00	186,008,800
8.4	Limpieza de cunetas en concreto, incluye acarreo interno	ml	185,000	1,153	$213,305,000				185,000.00	213,305,000
8.8	Suministro, transporte e instalación de Geodrén circular. Incluye tubería de drenaje HDPE de 4". No incluye excavación y llenos,	ml	1,193	70,578	$84,199,554				1,193.00	84,199,554
8.9	Suministro, transporte e Instalción de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por	m2	1,150	9,487	$10,910,050				1,150.00	10,910,050
8.11	Suministro, transporte e instalación de Geotextil T 2100 o similar	m2	450	8,480	$3,816,000				450.00	3,816,000
8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	10	748,632	$7,486,320				10.00	7,486,320
8.21	Tubería de concreto reforzado 900 mm, hecho en obra-280 kg/cm2	ml	12	450,144	$5,401,728				12.00	5,401,728
8.27	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado	ml	18	1,448,535	$26,073,630				18.00	26,073,630

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020		CONTRATO ADICIONAL No.	0
OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE		VR. CONTRATO ADICIONAL	0
VR INICIAL	$7,109,219,278	VALOR TOTAL	7,109,219,278
PLAZO INICIAL:	6 Meses		
CONTRATISTA		**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 01**	
CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE			
INTERVENTOR:		**ACTA No.**	**01 MyM**
INGEVAL S.A.S.		**FECHA DE ACTA:**	**20/10/20**

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MODIFICACIONES**				
						ACTA DE MAYORES Y MENORES # 01			**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant**	**Precio Unitario ($)**	**Valor Total ($)**	**+ -**	**Cant**	**Valor Total ($)**	**Cant**	**Valor Total ($)**
8.31	Suministro, transporte y colocación de tubería de 4", perforada para drenaje y filtros	ml	85	36,787	$3,126,895				85.00	3,126,895
8.33	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC - S de 3" para pases de muro	ml	80	24,559	$1,964,720				80.00	1,964,720
8.35	Suministro, transporte y construcción de Gaviones, incluye transporte material	m3	5	226,462	$1,132,310				5.00	1,132,310
8.36	Reparación de gavión, reutilizando piedra existente	m3	10	150,006	$1,500,060				10.00	1,500,060
8.39	Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Brachiaria decumbens, para sembrar en sitios hasta 2.000 mts	m2	558	21,439	$11,962,962				558.00	11,962,962
8.40	Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Reygrass pasares, para sembrar en sitios con alturas mayores	m2	2,600	18,366	$47,751,600				2,600.00	47,751,600
8.41	Revegetalización de zonas planas y/o zonas de deposito con estolones de pasto de la zona.	m2	350	7,692	$2,692,200				350.00	2,692,200
8.42	Revegetalización de zonas planas y/o zonas de deposito con semillas certificada de gramineas.	m2	1,250	9,217	$11,521,250				1,250.00	11,521,250
8.44	Bolsacretos, concreto clase E	m3	3	554,789	$1,664,367				3.00	1,664,367
8.47	Construcción de Trinchos en madera	ml	1	35,056	$35,056				1.00	35,056
8.48	Rondas de Coronación Trapezoidal en Geomembrana (incluye Excavación)	ml	1	68,403	$68,403				1.00	68,403
8.50	Rondas de Coronación en sacos de polipropileno (suelo cemento 5:1, 60Cm *70cm)	ml	35	35,491	$1,242,185	+	800.00	28,392,800	835.00	29,634,985
8.52	Sellado de Grietas con material de Limo y Cal (Grieta máxima de 15 cm de ancho * 60 cm de profundidad)	ml	35	9,372	$328,020				35.00	328,020
	TOTAL CAPITULO 8				**$ 658,371,110.00**					
10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	55,000	5,617	$308,935,000				55,000.00	308,935,000
	TOTAL CAPITULO 10				**$ 308,935,000.00**					
	CAPITULO 11 - ELEMENTOS METÁLICOS Y ANCLAJES				$0					
11.1	Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente.	ml	350	200,903	$70,316,050				350.00	70,316,050
11.11	Barandas metálicas tipo pingüino en tubería de 4", Acero A-500 Grado C - Limpieza (Sand Blasting) grado metal casi blanco,	ml	150	535,508	$80,326,200				150.00	80,326,200
	TOTAL CAPITULO 11				$150,642,250					
	CAPITULO 12 - SEÑALIZACIÓN Y PINTURAS				$0					
12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de	ml	152,300	2,293	$349,223,900				152,300.00	349,223,900
12.2	Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para resaltos, zonas	m2	120	55,271	$6,632,520				120.00	6,632,520
12.5	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI,	un	98	330,861	$32,424,378				98.00	32,424,378
	TOTAL CAPITULO 12				**$ 388,280,798.00**					
	CAPITULO 13 - TRANSPORTE DE MATERIAL				$0					
13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	564,957	1,486	$839,526,102				564,957.00	839,526,102
13.3	Transporte de material proveniente de derrumbes. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m	m3-km	315,000	1,144	$360,360,000	+	99,980.468		414,980.47	474,737,655
13.5	Transporte de material ente 100 m y 1000 m. Incluye cargue del material. Medido suelto para distancias que superen el acarreo libre (100 m).	m3	2,200	4,461	$9,814,200				2,200.00	9,814,200
	TOTAL CAPITULO 13				**$ 1,209,700,302.00**					
	CAPITULO 15 - MANEJO DE ESPECIES VEGETALES									
15.1	Suministro, transporte y siembra de árbol h<=1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas,	un	45	63,961	$2,878,245				45.00	2,878,245

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDOS
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO No. 4600001085 DE 2020		CONTRATO ADICIONAL No.	0
OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN ORIENTE		VR. CONTRATO ADICIONAL	0
VR INICIAL	$7,109,219,278	VALOR TOTAL	7,109,219,278
PLAZO INICIAL:	6 Meses		
CONTRATISTA		**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 01**	
CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE			
INTERVENTOR:		**ACTA No.**	**01 MyM**
INGEVAL S.A.S.		**FECHA DE ACTA:**	**20/10/20**

					CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		**MODIFICACIONES**			
							ACTA DE MAYORES Y MENORES # 01		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant**	**Precio Unitario ($)**	**Valor Total ($)**	**+ -**	**Cant**	**Valor Total ($)**	**Cant**	**Valor Total ($)**
15.8	Rocería. Incluye cargue, trasporte y disposición adecuada de material resultante	Ha	642	766,484	$492,082,728				642.00	492,082,728
15.11	Tala, cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 5.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro	un	12	228,940	$2,747,280				12.00	2,747,280
	TOTAL CAPITULO 15				**$ 497,708,253.00**					
	CAPITULO 18 - VARIOS									
18.1	Obreros por Administración. Incluye factor prestacional.	jor	150	76,874	$11,531,100				150.00	11,531,100
	TOTAL GRUPO 18				**$ 11,531,100.00**					
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 6,893,575,789.00**					
COSTO TOTAL										**$6,893,575,789**
COSTO BÁSICO					**$5,298,267,458**					**$5,298,267,458**
ADMINISTRACION				23.11%	**$1,224,429,609**					**$1,224,429,609**
IMPREVISTOS				2.00%	**$105,965,349**					**$105,965,349**
UTILIDAD				5.00%	**$264,913,373**					**$264,913,373**
VALOR CON AIU					**$6,893,575,789**					**$6,893,575,789**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (Incluye IVA)					**$33,192,440**					**$33,192,440**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)					**$39,968,314**					**$39,968,314**
GEOREFERENCIACION (Incluye IVA)					**$3,706,740**					**$3,706,740**
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA)		***Estimado***			**$ 41,444,706**					**$41,444,706**
PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA - PAPSO (Incluye IVA)					**$ 97,331,289**					**$97,331,289**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO CON IVA					**$7,109,219,278**					**$7,109,219,278**

Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervienen:

LUIS CARLOS TORRES V
Rep. Legal Contratista
CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

WILLIAM VALENCIA C.
Director Interventoria
INGEVAL

ANEXO 4.

Actas de reunión durante este periodo.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión**: 02 **Fecha de aprobación: 25/06/2018**

Tipo de reunión: COMITÉ DE OBRA - REUNION	**Fecha de reunión: 15-OCT-20**
Organismo, Dependencia o Proceso:	**Fecha de elaboración: 15-OCT-20**
Asistentes, Organismo: Luis Carlos Torres. Contratista de Obra. Representante Legal. Gabriel Andrés Mauricio Mesa. Gobernación de Antioquia. Ingeniero de apoyo. Omar Oquendo. Contratista de Obra. Residente de Interventoría. William Valencia. Interventoría de Obra. Director de Interventoría. Yasshir Yaya. Interventoría de Obra. Residente de Interventoría. Francisco Herrera. Contratista de Obra. Ingeniero Residente. Humberto Serna. Contratista de Obra. Director de Obra. Andrés Rodríguez. Gobernación de Antioquia. Supervisor del Contrato.	**Ausentes, Organismo:**

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

1. Lectura del acta anterior. NO APLICA.

2. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso

3. Temas tratados.

   A. PRESENTACION GENERAL DEL PROYECTO. A cargo del Supervisor del Contrato.
   B. PRIORIZACION DE ACTIVIDADES.

   Rocería y limpieza de cunetas y estructuras de drenaje: Necesidad de iniciar actividades inmediatamente.
   La rocería inició en corredor Marinilla – Penol – Guatape – San Carlos y La Ceja – Abejorral.
   Se solicita que se inicien frentes adicionales en:
   Autopista – Granada.
   La Piñuela – San Francisco.
   La Aurora – Sonadero.
   Autopista – San Luis.
   Autopista – Cocorná.
   Autopista – San Francisco.
   El Retiro – La Ceja.
   Abejorral - El Cairo – La Elvira
   Pantanillo – Guayabal
   Altavista – Chagualal
   Abejorral – Granadillo
   La Frontera (Ruta 56) - Mesopotamia – Abejorral
   Morelia (Ruta 56) - Abejorral
   Sonsón - La Quiebra - Nariño
   La Quiebra – Argelia
   Sonsón - Las Margaritas - Puente San Rafael

   Mantenimientos mecánicos: Se deben iniciar actividades inmediatas y se priorizan los siguientes frentes:
   Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda. Se inicia el 21 de octubre. Compromiso Contratista de Obra.
   Alejandría - El Bizcocho (San Rafael).
   San Roque - San Lorenzo - La Palma

Pavimentación vial: Se deben iniciar atención inmediata.
Marinilla - El Peñol. Inicio inmediato
Barbosa – Concepción. 150 ml
Sonson - Nariño: 200 ml.
Autopista – Granada – San Carlos:
La Ceja – Abejorral: Varios frentes.

Derrumbes: Inicio y atención inmediata.

Concretos en estructuras de contención:
Cunetas:
- La Aurora - Sonadora - Guatape
- San Vicente - Concepción
- Barbosa – Concepción

Muros:
- Autopista – Granada
- Ramal – San Carlos
- La Quiebra - Argelia
- Guatape - San Rafael
- El Bizcocho.

4. Proposiciones y varios

5. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
	Inicio de rocería en frentes priorizados en esta acta	Contratista	21-Oct-20	Atención en frentes de rocería inmediata.
	Mantenimientos mecánicos: Frente: Narices - Juanes - El Jordán - La Holanda	Contratista	21-Oct-20	Inicio de esta actividad en frente priorizado.
	Pavimentación vial	Contratista / Interventoría	17-Oct-20	Entrega de zonas de intervención de pavimento.
	Pavimentación vial Derrumbes Cunetas Muros	Contratista	18-Oct-20	Inicio de actividades serán informados por el Contratista en el transcurso de esta semana (13-oct a 18-Oct).

Firma de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

YASSHIR SAID YAYA GARZON

Nombre de quien elabora

Nombre de quien revisa y aprueba

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN** **No 02.**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión**: 01 **Fecha de aprobación: 11/03/2014**

Tipo de Reunión: **comité de obra**	
Organismo, Dependencia o Proceso: INFRAQESTRUCTURA FISICA	**Fecha de Elaboración:** **21 de octubre del 2020** **9am a 11am**
Asistentes, Organismo: **Julián Parra- Director SIF** **Oscar David-Auxiliar SIF** **Andrés Mauricio Rodríguez C.- Coordinador** **Humberto Serna – Director de obra** **Omar Oquendo L.- Ing Residente Interv.**	**Ausentes, Organismo:**

Temas a tratar: Estado de las actividades iniciadas y próximas a iniciar

INFORME DE ACTIVIDADES

En reunión realizada en la Secretaria de infraestructura de la Gobernación de Antioquia el dia 21 octubre donde se trataron los siguientes los siguientes temas.

Estado actual de las obras iniciadas, se enumeraron las rocerías en las diferentes vías como son:
Marinilla – Peñol
San Carlos – San Rafael
La Ceja – Abejorral
Autopista –Granada
La Piñuela –San Francisco

Igualmente se realizaba la mitigación en Autopista –Granada en el km 0+900, en costales de suelo cemento y colocación de afirmado y también se avanzaba en la localización de los parches para ser pavimentados lo mismo que los sitios donde se fresara para hacer la respectiva valoración.se hace la aclaración que es algo provisional donde se coloca una hilera de costales en suelo – cemente para dar luego adicionar afirmado y dar transito provisional mientras se piensa en una solución.

El contratista se comprometió a lo siguiente:

1- Llevar la maquinaria para dar comienzo en las obras de conformación de la vía Narices – Juanes el día viernes 23 de octubre
2- Llevar un especialista para dar la solución en la intervención de la aleta del puente sobre la via Abejorral – El Guaco, y propuesta para la colocación de pintos donde se colocara adoquín, igualmente en el sitio de la escuela en la vía El Peñol – San Vicente y también los sitios donde se colocara adoquín en la vía Granada – San Carlos.
3- Se daría comienzo en los siguientes frentes el próximo lunes 26 de octubre:

   Las obras en Aquitania,.
   Obras en la Aurora Sonadora, cunetas,.
   Mantenimiento de la conformación en la via Narices – Juanes., se comenzó.

   El contratista solicita se le ayuden con los trámites en la entrega del anticipo.

   El ingeniero Humberto propone que en la mitigación del km0+900 de la via autopista – Granada, se construya un muro en costales con suelo cemento, al respecto queda esta propuesta para resolver, pero inicialmente nadie se pronuncia.

   El Director hace la petición de comenzar cuanto antes las obras de Aquitania y dar paso provisional para los carros livianos, esto de manera urgente, y el Ingeniero Humberto recalca que para ese próximo lunes tendrá el personal en dicho sitio.
4- Entrega de información para seguimiento contractual (Curva S – Programa de obra) en los términos previstos en los pliegos de licitaciones.

   Se da por terminado este comité a las 11am.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado

Elaborada por:
OMAR OQUENDO

Revisada y Aprobada por:

ANEXO 5.

Bitácora.

29 de Septiembre de 2020: Se hace acta de inicio del contrato de obra, firmandose el acta por las partes.

INGENIERO INTERVENTOR

30 de Septiembre de 2020 (miercoles): Se hace recorrido conjuntamente la interventoria, contratista y supervisor de la Gobernacion en la via. Maximilla – Peñol, Peñol – Guatapé – San Rafael y Alejandria – El Bizcocho, donde se ubicaron los diferentes sitios intervenir, los cuales se plasmaron en un acta.
acta que será entregada al contratista para que programe todas las actividades enumeradas en dicho recorrido.
Este dia se hizo reunión en la Alcaldia de San Rafael con el Alcalde, Secretario de Planeación y las partes involucradas en el recorrido donde se explico el alcance de las obras a intervenir.

Octubre 1 de 2020 (Jueves). Se hace trabajo de oficina.

Octubre 2 de 2020 (viernes) Se continua con trabajos de logistica, coordinando con el contratista diferentes actividades.

Octubre 3 de 2020 (Sabado). Se hace visita a Aguitania para atender una emergencia producto del invierno conjuntamente con el especialista de la Gobernación Ingo Jesús Zapata, contratista, interventoria

Escaneado con CamScanner

vía, y un representante de San Francisco, donde se concertó por parte del especialista dar manejo de las aguas infiltradas y acometer una solución la cual será definido mas adelante. El manejo de las aguas es canalizando por medio de disipadores, revegetalizar el talud para darle estabilidad y conformar la vía para dar transito vehicular.

Octubre 4 de 2020 (Domingo) No se Labora

Octubre 5 de 2020 (Lunes) Se hace un recorrido preliminar en la vía Marinilla-Peñol, para ubicar los sitios donde se harán los parcheos y hacer un avalúo de estos parches

Octubre 6 de 2020 (Martes), se hace trabajo de oficina en acondicionamiento y coordinando con el contratista el Pmit, Pma.

Octubre 7 de 2020 (Miercoles) Se continua con los trabajos de oficina y además se hace recorrido en la vía La Cejo-Abejorral, conjunta/te el Supervisor de la Gobernación, el contratista y la interventoria donde se ubicaron los sitios a intervenir en ésta vía los cuales consistieron en la instalación de adoquin en los broches de la vía, donde presentan fallas geologicas los cuales estan sin pavimentar cuyos broches son 7 ptos y se identificó el sitio del puente en la

Escaneado con CamScanner

vía El Guaico donde se debe reparar una Aleta la cual presenta desprendimiento del concreto por lo tanto se le solicitó al contratista llevar un especialista para que presente solución en estos puntos o sea tratamiento en la Aleta y diseño en la estructura del adoquín a colocar.

Octubre 8 de 2020 (Jueves), se hace recorrido en la vía Autopista – Granada, S.C. donde se ubicaron los sitios a intervenir, los cuales se plasmaran en un acta de recorrido de obra, y además se hizo reunión en la Alcaldía del Municipio de Granada donde se trató el tema de la Intervención en dicha vía, ésta reunión fué conjunta/te con el Señor Alcalde del Municipio. Igual/te se visitó la vía La Aurora – Sonadora – Guatape, también para ubicar sitios a intervenir.

Octubre 9 de 2020 (viernes), se hace recorrido en la vía Granada – San Carlos para ubicar la construcción de un muro en km 24+400 y luego continuamos hacia la vía La Holanda – Juanes – Narices, donde se identificó la vía a intervenir, conformandola con motoniveladora y agregando material de afirmado de la cantera Poeito, además la construcción de 2 transversales nuevas y recubrimiento de un muro en Gaviones

Norma

Escaneado con CamScanner

Octubre 10 de 2020 (Sabado) No se Laboró

Octubre 11 de 2020 (Domingo) No se Laboró

Octubre 12 de 2020 (Lunes) Se hace identificación de algunos parches de pavimento.

Octubre 13 de 2020 (Martes) se continua con la identificación de los parches para ser reparados en la vía Manrilla - Peñol demarcandolos con pintura.
Dia muy soleado
y se trabaja en esta Labor conjuntamente con el contratista.

Octubre 14/2020 (Miercoles). se continua con la demarcación de los parches del pavimento. En éste dia dia se inicia la actividad de roceria en la vía Manrilla - Peñol, con una cuadrilla de 7 personas y otra cuadrilla en la vía La Ceja - Abejoral.
dia soleado
El equipo es Guadaña y herramienta menor además un carro para evacuar el material sobrante.

Octubre 15/2020 (Jueves). se continua en la identificación de los parches de pavimento para ser reparados.
Se continua con las Labores de roceria en las

Norma

Escaneado con CamScanner

vías Manzanilla – Peñol, La Ceja – Alejandría, y además empezaron en la vía de San Carlos – San Rafael día Soleado

Octubre 16/2020 (viernes) Se continua con las actividades de rocería, limpieza de cunetas, limpieza de obras en las vías anteriormente enunciadas.
En éste día se hace visita a la escuela La Palmira situada en el K 7+800 en la vía EL Peñol – San Vicente, conjunta/te con EL Dapar, Representantes de la Alcaldía, el contratista, La interventoria la Supervición, para conceptuar solución a las aguas que perjudican la estabilidad de la Escuela.
En éste día tambien se hace demarcación de pavimento en la vía Manzanilla – Peñol
Día Soleado

Octubre 17/2020 (Sabado), en éste día se continua hasta medio con las actividades de Rocería
Día Soleado

Octubre 18/2020 (Domingo) NO se Labora

Octubre 19/2020 (Lunes). se continua con la demarcación de PVTO en la vía Manzanilla – Peñol se continua con las actividades de Rocería, Manzanilla – peñol, Autopista Granada, y el descapote del K0+900

Norma

Escaneado con CamScanner

en ésta misma vía, para intervenir este pto crítico.
Día Soleado.
Se utiliza una retro en el descapote.
El personal es en rocería cuadrillas de 8 personas por frente

Octubre 20/2020. Se continua con la demarcación de los parches en pavimento en la vía Manzanilla – Peñol.
Se continua con las actividades de Rocería en las vías anteriormente mencionadas.
Se termina el descapote en el Km 0+900 de la vía Autopista – Granada y se le agrega material de afirmado.
Se utiliza una retro.
Día Soleado.

Octubre 21/2020 (miercoles) se continua con la actividad en demarcación de PVTO, rocería en las vías anteriormente mencionadas, además se comienza a evacuar derrumbes en la vía San Carlos – San Rafael. Se continua interviniendo el K0+900 con La retro mitigando este paso de los vehículos.
Día Soleado

Octubre 22/2020 (Jueves), se continua con la actividad de demarcación de los parches de PVTO, labor que se termina éste día.

Escaneado con CamScanner

Se continua con las Labores de roceria, limpieza de cunetas y obra transversales en las vias anteriormencionadas, y se termina la actividad de intervencion en el Km 0+900 de la via Autopista - Granada.
Dia soleado
Se continua con la remocion de derrumbes en la via San Carlos - San Rafael.

Octubre 23/2020 (viernes), se continua con las actividades de roceria en las vias anteriormencionadas, salvo que se reactiva la roceria en la via La Ceja - Abgorral, la cual estaba suspendida por falta de personal.
Se continua con la actividad de remocion de derrumbes en la via San Carlos - San Rafael

Octubre 24/2020 (sabado), se labora hasta el medio dia en la actividad de roceria y se hace remocion de derrumbes.
dia soleado.

octubre 25/2020 (Domingo) No se Labora

Octubre 26/2020 (Lunes), se continua con las actividades de roceria en las vias Marinilla-Penol, San Carlos - San Rafael, Autopista - Granada, Aurora - Sonadora, La Ceja - Abgorral, La piñuela San Francisco.
Se continua con la remocion de derrumbes.
Dia Soleado

Norma

Escaneado con CamScanner

Octubre 27/2020 (Martes), Se inicia conformación de la vía Naricés Juanes con motoniveladora, rodillo, recto, y 3 volquetas colocando afirmado de la cantera Pocitos.
Se continua con las actividades de rocería en las vías antes mencionadas.
Se inicia excavación en el Km 0+900 Autopista - Granada, para construir un muro en costale con suelo cemento, diseño presentado por el contratista (Humberto Serna) y avalado por el supervisor y el Ingo Luis Torres, diseño que es para mitigar este sitio.
día soleado

Octubre 28/2020 (miercoles), Se continua con las actividades de rocería, limpieza de cunetas y obras.
Se continuo con la conformación con motoniveladora en la vía Naricés - Juanes, colocando afirmado.
Se continuo con la remoción de derrumbes y limpieza mecanica de cunetas.
Se continua con la construcción del muro en costales con suelo - cemento
Se inicia la rocería en la vía - San Luis - Choeó.
Se inicia el fresado y colocación de pavimento en la vía Manzanilla - Peñol.
El personal es 8 personal por cuadrilla en los frentes de rocería.
La maquinaria utilizada es en la conformación
1 motoniveladora
1 vibro
1 recto
3 volquetas

Norma

Escaneado con CamScanner

En la fresada de PVTO:
1 fresadora
1 rodillo
4 volquetas
El personal en este frente es de 12 personas.
Incluyendo un encargado.
Dia Soleado.

Octubre 29/2020 (Jueves), Se continua con las Labores de rocería en las vías anteriormente mencionadas.
Se continua con la conformación de la vía Naíes- Juanes.
Se continua continua con la construcción del muro en Costales con Suelo- Cemento
Se continua con el fresado y colocación de pavimento.
El equipo es el utilizado en el dia anterior dia Soleado.

Octubre 30/2020 (Viernes). Se continua con las actividades de rocería en las vías mencionada anteriormente.
Se continua con la conformación de la vía Naíes- Juanes.
Se continua con la construcción del muro en costales con Suelo - Cemento.
Se continua con el fresado de PVTO, y colocando la mezcla Asfaltica.
El equipo es el mismo que se viene utilizando en los dias anteriores
Dia con LLuvia en horas de la tarde.

Norma

Escaneado con CamScanner

Octubre 31/2020 (sábado). Se labora hasta las 2 PM en todas las actividades a excepto en los parcheos que no laboran en el día de hoy.
día soleado

Noviembre 1/2020 (Domingo) No se labora
Noviembre 2/2020 (Lunes) Festivo
Noviembre 3/2020 (Martes), Se continua con la construcción del muro en costales en suelo-cemento, muro que va tomando relevancia en altura, esto en el Km0+900 Autopista-Granada, por lo tanto, se anota nuevamente que es un muro de mitigación y por las caracteristicas es absolutamente responsabilad del contratista, quien fué el que lo propuso y lo garantizó, por esta razón fué que se le permitio construirlo.
Se continua con las labores de roceria en los vias: Harinilla-Peñol, San Carlos-San Rafael, Autopista-Granada, Auro-Sonadora-San Luis-Choco, la Ceja Abejorral. con el mismo personal.
Se localiza un sitio para construir un muro en el K5+400 Autopista-Granada, por diseño de la Cartilla de la Gobernación, muro que tiene una Longitud de 24 mts.
Se continua con la actividad de Fresado y colocación de Pavimento.
El equipo es en el Frente del Pavimento
1 Frisadora
1 Rodillo
3 volquetas
1 cuadrilla de 7 personas
En la roceria hay 8 personas por cuadrilla
día soleado todo el dia.

Escaneado con CamScanner

ANEXO 6.

Seguridad social y aportes del personal del Contratista.

CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE

Bogotá D.C, 09 noviembree de 2020

Señores:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Ciudad

Ref.: **Contrato de Obra No. 4600010855 "Conservación, mantenimiento y rehabilitación de las vías a cargo del departamento de Antioquia en la subregión oriente**

Respetados señores:

El Suscrito(a) **LUIS CARLOS TORRES VERGARA** identificado(a) con la C.C. 72.001.440, certifico que la empresa, **CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE** identificada con el NIT 901.398.120-2, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y salarios correspondientes al ultimo mes.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente

LUIS CARLOS TORRES
Representante Legal
Consorcio Vial SCS Oriente

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.001.440
TORRES VERGARA
APELLIDOS
LUIS CARLOS
NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1977
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

20-JUN-1996 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00138297-M-0072001440-20061218 0008351227H 1 1630025237

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901398120	2	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAL SCS	CARRERA 49B 104A-17	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3002698	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	779749829	9411286834	E	2020/10/06	2020/10/23	BANCOLOMBIA	17	$1,083,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	70120811	SERNA RAMIREZ HUMBERTO ANIBAL	X																	25-14	15	$3,500,000	$560,000	EPS016	15	$3,500,000	$140,000	CCF04	15	$3,500,000	$140,000	14-4	15	$3,500,000	$243,600	15	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(1)**																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$243,600		$0	$0		$1,083,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901398120	2	CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAL SCS	CARRERA 49B 104A-17	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3002698	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	779749829	9411286834	E	2020/10/06	2020/10/23	BANCOLOMBIA	17	$1,083,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,600	$0	$0	$243,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$243,600	$0	$0	$243,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$140,000	$0	$0	$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$0	$0	$140,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$140,000	$0	$0	$140,000
TOTAL				1	$1,083,600	$0	$0	$1,083,600

SANTANDERGÓMEZ
S.C.P. S.A.S
NIT. 900.612.657-1

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

MICHELLE SARAY MUÑOZ RODRIGUEZ identificado con C.C. No 1.045.728.879 de Barranquilla, y con Tarjeta Profesional No. 237445-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal (designada por SANTANDER GÓMEZ S.C.P. S.A.S) de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S – CONSINBE S.A.S identificada con NIT 890.108.661-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 9 días del mes de noviembre de 2020.

MICHELLE SARAY MUÑOZ RODRIGUEZ
Tarjeta Profesional No. 237445-T
Revisor Fiscal – CONSINBE S.A.S
Designada
SANTANDER GOMEZ S.C.P. S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



237445-T

MICHELLE SARAY
MUÑOZ RODRIGUEZ
C.C. 1045728879
RES. INSCRIPCION 147 DEL 16/02/2018
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

243475 262329

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 6 A F C 3 5 0 A D F F C 7 1 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MICHELLE SARAY MUÑOZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045728879 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 237445-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Cra. 24 No. 81-11 Soledad
Tels.: 3289438-3289442-3289444-3928444
Colombia


SERTOR

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

SERGIO JOSÉ TORRES REATIGA identificado con C.C. 3.707.869 de Barranquilla en mi condición de Representante Legal de CONSTRUCCIONES SERTOR S.A.S identificada con NIT 901.148.384-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 9 días del mes de noviembre de 2020.



SERGIO JOSÉ TORRES REATIGA
C.C. 3.707.869 de Barranquilla
Rep. Legal - CONSTRUCCIONES SERTOR S.A.S


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 3.707.869
TORRES REATIGA
APELLIDOS
SERGIO JOSE
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1939
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
31-OCT-1961 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-0300100-00941605-M-0003707869-20171002
0057646664A 1
9910160633

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890108661	3	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CRA 24 N 81-11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3249574	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	764020180	9411388415	E	2020/10/15	2020/10/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$20,550,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANQUILLA (2 Afiliados)																							$2,109,806	$337,600			$2,109,806	$84,400			$2,109,806	$84,400			$2,109,806	$147,000		$0	$0		$653,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																							$2,109,806	$337,600			$2,109,806	$84,400			$2,109,806	$84,400			$2,109,806	$147,000		$0	$0		$653,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																							$2,109,806	$337,600			$2,109,806	$84,400			$2,109,806	$84,400			$2,109,806	$147,000		$0	$0		$653,400
1	CC	72180149	CASSIANI CAÑATE RAFAEL									X									230201	30	$909,806	$145,600	EPS016	30	$909,806	$36,400	CCF07	30	$909,806	$36,400	14-4	30	$909,806	$63,400	30	$0	$0	Si	$281,800
2	CC	78704082	MACEA ALGARIN LUPERCIO DEL CRISTO																		230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF07	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (18 Afiliados)																							$18,553,758	$2,969,100			$20,309,364	$962,600			$18,553,758	$743,000			$20,309,364	$1,414,000		$0	$0		$6,088,700
Centro de Trabajo: AREA ADMINISTRATIVA (18 Afiliados)																							$18,553,758	$2,969,100			$20,309,364	$962,600			$18,553,758	$743,000			$20,309,364	$1,414,000		$0	$0		$6,088,700
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (18 Afiliados)																							$18,553,758	$2,969,100			$20,309,364	$962,600			$18,553,758	$743,000			$20,309,364	$1,414,000		$0	$0		$6,088,700
3	CC	32782347	ANAYA POLO YEIDY ENRIQUETA																			0	$0	$0	ESSC07	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-4	30	$877,803	$61,100	0	$0	$0	No	$170,900
4	CC	32696854	BOLAÑO DUNCAN MARIBEL DEL SOCORRO																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF07	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
5	CC	1140867990	CORTINAS PEINADO WENDY PAOLA																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
6	CC	1143357696	FERNANDEZ TELLES ROBERTO ANTONIO	X																	230301	8	$773,334	$123,800	EPS037	8	$773,334	$31,000	CCF07	8	$773,334	$31,000	14-4	8	$773,334	$53,900	8	$0	$0	Si	$239,700
7	CC	1129582707	FREYLE VANEGAS ALFREDO RAFAEL																		231001	30	$1,120,000	$179,200	CCFC55	30	$1,120,000	$44,800	CCF07	30	$1,120,000	$44,800	14-4	30	$1,120,000	$78,000	30	$0	$0	Si	$346,800
8	CC	1140840131	HERNANDEZ MORALES VICTOR HUGO																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF07	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0	Si	$650,200
9	CC	1143166065	LEAL ROA JOSE ALFREDO																			0	$0	$0	EPS002	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-4	30	$877,803	$61,100	0	$0	$0	No	$170,900
10	CC	72173437	LLANOS DELGADO JESUS ELIECER																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
11	CC	85153480	MARTINEZ CABARCAS RICARDO JOSE																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
12	CC	22640627	OROZCO OVIEDO SINDY LUZ																		230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF07	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
13	CC	1042449863	POLO CHARRIS LINDA ROSA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF07	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
14	CC	36711084	QUINTANA SANCHEZ ERLEIDIS																		230201	30	$1,590,000	$254,400	EPS042	30	$1,590,000	$63,600	CCF07	30	$1,590,000	$63,600	14-4	30	$1,590,000	$110,700	30	$0	$0	Si	$492,300
15	CC	1045717143	RAMIREZ MENDOZA DUNIS MIGUEL																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
16	CC	8800326	ROSANIA VARGAS JOSE NEPTALI																		230301	30	$1,348,000	$215,700	EPS037	30	$1,348,000	$54,000	CCF07	30	$1,348,000	$54,000	14-4	30	$1,348,000	$93,900	30	$0	$0	Si	$417,600
17	CC	72177223	SUAREZ PARADA BALMIRO																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
18	CC	1042442788	TAMARA VALDELAMAR MARIA PATRICIA																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
19	CC	72001440	TORRES VERGARA LUIS CARLOS																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
20	CC	1043116830	VILORIA CABALLERO CINDY PAOLA																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FINCA TEPEYA (3 Afiliados)																								$2,633,409	$421,500			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$183,300		$0	$0		$816,000
Centro de Trabajo: FINCA TEPEYA (3 Afiliados)																								$2,633,409	$421,500			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$183,300		$0	$0		$816,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																								$2,633,409	$421,500			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$183,300		$0	$0		$816,000
21	CC	73237927	ACEVEDO CHAMORRO RAMIRO																			230201	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
22	CC	1043006387	GARCIA ACEVEDO CARLOS ANDRES																			230201	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
23	CC	9115798	GARCIA GALIZ ELIAS RAMON																			25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TALLER - ALMACEN (14 Afiliados)																								$14,433,011	$2,309,900			$14,433,011	$578,100			$14,433,011	$578,100			$14,433,011	$1,005,000		$0	$0		$4,471,100
Centro de Trabajo: TALLER - ALMACEN (14 Afiliados)																								$14,433,011	$2,309,900			$14,433,011	$578,100			$14,433,011	$578,100			$14,433,011	$1,005,000		$0	$0		$4,471,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)																								$14,433,011	$2,309,900			$14,433,011	$578,100			$14,433,011	$578,100			$14,433,011	$1,005,000		$0	$0		$4,471,100
24	CC	16766006	ABELLA ACOSTA LUIS ALFREDO																			230301	30	$1,011,000	$161,800	EPS002	30	$1,011,000	$40,500	CCF07	30	$1,011,000	$40,500	14-4	30	$1,011,000	$70,400	30	$0	$0	Si	$313,200
25	CC	8740009	ARTETA CHARRIS RAMIRO ANTONIO																			230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF07	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
26	CC	72176388	DE LOS REYES DOMINGUEZ ANTONIO JOSE																			25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
27	CC	72279344	ESCORCIA ARGUMEDO MOISES	X																		230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS010	30	$1,100,000	$44,000	CCF07	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$76,600	30	$0	$0	Si	$340,600
28	CC	1129521873	ESTRADA VERGARA ZELDER									X										231001	30	$1,150,417	$184,100	EPS037	30	$1,150,417	$46,100	CCF07	30	$1,150,417	$46,100	14-4	30	$1,150,417	$80,100	30	$0	$0	Si	$356,400
29	CC	1007117675	HERRERA ZUÑIGA WILLIAM JOSE																			230201	30	$877,803	$140,500	ESSC24	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
30	CC	1143121417	MEDINA MARTINEZ ARMEL ALBERTO									X										230201	30	$916,406	$146,700	EPS005	30	$916,406	$36,700	CCF07	30	$916,406	$36,700	14-4	30	$916,406	$63,800	30	$0	$0	Si	$283,900
31	CC	1045702809	NIÑO ECHEVERRIA KEYNER MANUEL																			231001	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
32	CC	1048273288	PACHECO ROJAS RUBEN MANUEL																			230201	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
33	CC	73266817	PALACIN LLERENA PEDRO MANUEL																			230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
34	CC	72156268	PRINS RODRIGUEZ ROBERTO ANTONIO									X										25-14	30	$1,464,166	$234,300	EPS002	30	$1,464,166	$58,600	CCF07	30	$1,464,166	$58,600	14-4	30	$1,464,166	$102,000	30	$0	$0	Si	$453,500
35	CC	8694256	VARGAS CHIQUILLO MODESTO RAFAEL									X										230201	30	$1,051,968	$168,400	EPS010	30	$1,051,968	$42,100	CCF07	30	$1,051,968	$42,100	14-4	30	$1,051,968	$73,300	30	$0	$0	Si	$325,900
36	CC	72169374	VASQUEZ TORRES LUIS EVERTO																			25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF07	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
37	CC	1044802086	VILLANUEVA MANOTAS ANDRES FELIPE									X										230201	30	$950,039	$152,100	EPS037	30	$950,039	$38,100	CCF07	30	$950,039	$38,100	14-4	30	$950,039	$66,200	30	$0	$0	Si	$294,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MAQUINARIA Y EQUIPO (24 Afiliados)																								$27,510,531	$4,402,600			$27,510,531	$1,101,500			$27,510,531	$1,101,500			$27,510,531	$1,915,700		$0	$0		$8,521,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890108661	3	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CRA 24 N 81-11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3249574	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	764020180	9411388415	E	2020/10/15	2020/10/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$20,550,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				59	$10,440,700	$0	$0	$10,440,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$644,300	$0	$0	$644,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$2,440,200	$0	$0	$2,440,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$3,850,200	$0	$0	$3,850,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$3,506,000	$0	$0	$3,506,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$4,665,000	$0	$0	$4,665,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	61	$4,665,000	$0	$0	$4,665,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$2,612,600	$0	$0	$2,612,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	59	$2,612,600	$0	$0	$2,612,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				61	$2,832,200	$0	$0	$2,832,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$129,600	$0	$0	$129,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$72,100	$0	$0	$72,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$63,600	$0	$0	$63,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	$707,600	$0	$0	$707,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$37,300	$0	$0	$37,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$49,600	$0	$0	$49,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$311,800	$0	$0	$311,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$459,600	$0	$0	$459,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$809,900	$0	$0	$809,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$155,900	$0	$0	$155,900
TOTAL				**61**	**$20,550,500**	**$0**	**$0**	**$20,550,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901148384	8	CONSTRUCCIONES SERTOR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA SERTOR	CRA 24 81 11	SOLEDAD-ATLANTICO	3928444	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	763975860	9411400770	E	2020/10/21	2020/10/06	BANCOLOMBIA	0	$1,839,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	72019010	DE LA CRUZ ARIZA ANTONIO RAFAEL																		231001	30	$877,803	$140,500	CCFC55	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
2	CC	72007598	DE LAS SALAS GUERRA RONALD ALBERTO																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
3	CC	8602095	MORENO GUERRERO YESID																		25-14	30	$1,550,000	$248,000	EPS010	30	$1,550,000	$62,000	CCF07	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0	Si	$479,900
4	CC	1068576050	PEREZ VELASQUEZ OMAR ENRIQUE																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
5	CC	77186321	RODRIGUEZ MAESTRE CARLOS ALBERTO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS041	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
6	CC	3771957	SUAREZ CANTILLO JOSE RAFAEL																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF07	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
Total	**Afiliados(6)**																						$5,939,015	$950,500			$5,939,015	$238,000			$5,939,015	$238,000			$5,939,015	$413,400		$0	$0		$1,839,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901148384	8	CONSTRUCCIONES SERTOR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA SERTOR	CRA 24 81 11	SOLEDAD-ATLANTICO	3928444	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	763975860	9411400770	E	2020/10/21	2020/10/06	BANCOLOMBIA	0	$1,839,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$950,500	$0	$0	$950,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$248,000	$0	$0	$248,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$421,500	$0	$0	$421,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$413,400	$0	$0	$413,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$413,400	$0	$0	$413,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$238,000	$0	$0	$238,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	$238,000	$0	$0	$238,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$238,000	$0	$0	$238,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$132,400	$0	$0	$132,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				**6**	**$1,839,900**	**$0**	**$0**	**$1,839,900**

ANEXO 7. Seguridad social y aportes del personal de Interventoría.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	805359100	9412860680	E	2020/11/17	2020/11/20	BANCOLOMBIA	3	$13,691,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRO (10 Afiliados)																								$23,609,409	$3,882,700			$23,609,409	$1,836,000			$23,609,409	$944,700			$23,609,409	$1,401,900		$10,486,000	$524,400		$8,589,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																								$3,755,606	$601,000			$3,755,606	$150,400			$3,755,606	$150,400			$3,755,606	$19,800		$0	$0		$921,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																								$3,755,606	$601,000			$3,755,606	$150,400			$3,755,606	$150,400			$3,755,606	$19,800		$0	$0		$921,600
1	CC	52844470	SALDAÑA NAZLY																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
2	CC	40440483	TENORIO LILIANA																			230301	30	$877,803	$140,500	CCFC55	30	$877,803	$35,200	CCF34	30	$877,803	$35,200	14-7	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,500
3	CC	40442830	TRUJILLO CLAUDIA																			230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
4	CC	1122653003	VERGARA DANIELA																			230301	30	$877,803	$140,500	EPSC34	30	$877,803	$35,200	CCF34	30	$877,803	$35,200	14-7	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,500
Centro de Trabajo: TECNICA (6 Afiliados)																								$19,853,803	$3,281,700			$19,853,803	$1,685,600			$19,853,803	$794,300			$19,853,803	$1,382,100		$10,486,000	$524,400		$7,668,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																								$19,853,803	$3,281,700			$19,853,803	$1,685,600			$19,853,803	$794,300			$19,853,803	$1,382,100		$10,486,000	$524,400		$7,668,100
5	CC	97472134	ALVAREZ ANDRES																			25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS044	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
6	CC	52017892	BARRENECHE MARIA																			25-14	30	$1,090,000	$174,400	EPS044	30	$1,090,000	$43,600	CCF34	30	$1,090,000	$43,600	14-7	30	$1,090,000	$75,900	30	$0	$0	Si	$337,500
7	CC	98353169	CABRERA FREDY																			230201	30	$3,200,000	$512,000	ESSC18	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
8	CC	1121823796	TORO DIANA																			230201	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF34	30	$877,803	$35,200	14-7	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
9	CC	1121924542	VALENCIA JOSE																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
10	CC	79366850	VALENCIA WILLIAM																			230301	30	$10,486,000	$1,782,800	EPS005	30	$10,486,000	$1,310,800	CCF34	30	$10,486,000	$419,500	14-7	30	$10,486,000	$729,900	30	$10,486,000	$524,400	No	$4,767,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																								$16,473,336	$2,636,000			$16,473,336	$659,200			$16,473,336	$659,200			$16,473,336	$1,147,000		$0	$0		$5,101,400
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																								$16,473,336	$2,636,000			$16,473,336	$659,200			$16,473,336	$659,200			$16,473,336	$1,147,000		$0	$0		$5,101,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																								$16,473,336	$2,636,000			$16,473,336	$659,200			$16,473,336	$659,200			$16,473,336	$1,147,000		$0	$0		$5,101,400
11	CC	1036937445	AGUDELO ANA	X																		230201	26	$2,600,000	$416,000	EPS010	26	$2,600,000	$104,000	CCF03	26	$2,600,000	$104,000	14-7	26	$2,600,000	$181,000	26	$0	$0	Si	$805,000
12	CC	43991071	CASTAÑO MARIA	X																		230201	25	$2,083,334	$333,400	EPS010	25	$2,083,334	$83,400	CCF03	25	$2,083,334	$83,400	14-7	25	$2,083,334	$145,100	25	$0	$0	Si	$645,300
13	CC	70082925	OQUENDO OMAR	X																		25-14	26	$3,033,334	$485,400	EPS010	26	$3,033,334	$121,400	CCF03	26	$3,033,334	$121,400	14-7	26	$3,033,334	$211,200	26	$0	$0	Si	$939,400
14	CC	1035911714	OSPINA ANDRES	X																		230301	25	$1,583,334	$253,400	EPS044	25	$1,583,334	$63,400	CCF03	25	$1,583,334	$63,400	14-7	25	$1,583,334	$110,300	25	$0	$0	Si	$490,500
15	CC	1094243735	ROJAS EDGAR	X																		230301	28	$1,773,334	$283,800	EPS044	28	$1,773,334	$71,000	CCF03	28	$1,773,334	$71,000	14-7	28	$1,773,334	$123,500	28	$0	$0	Si	$549,300
16	CC	1121927350	TORO ANDREA																			230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF03	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
17	CC	79627151	YAYA YASSHIR																			231001	30	$3,500,000	$560,000	EPS016	30	$3,500,000	$140,000	CCF03	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(17)**																							$40,082,745	$6,518,700			$40,082,745	$2,495,200			$40,082,745	$1,603,900			$40,082,745	$2,548,900		$10,486,000	$524,400		$13,691,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	805359100	9412860680	E	2020/11/17	2020/11/20	BANCOLOMBIA	3	$13,691,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$6,518,700	$0	$0	$6,518,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,171,800	$0	$0	$1,171,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,921,000	$0	$0	$2,921,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,865,900	$0	$0	$1,865,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,548,900	$0	$0	$2,548,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	17	$2,548,900	$0	$0	$2,548,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$1,603,900	$0	$0	$1,603,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$944,700	$0	$0	$944,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	$659,200	$0	$0	$659,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				17	$2,495,200	$0	$0	$2,495,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$140,000	$0	$0	$140,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$128,000	$0	$0	$128,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$308,800	$0	$0	$308,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$116,000	$0	$0	$116,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	$301,200	$0	$0	$301,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,430,800	$0	$0	$1,430,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$314,600	$0	$0	$314,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$314,600	$0	$0	$314,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$209,800	$0	$0	$209,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$209,800	$0	$0	$209,800
TOTAL				**17**	**$13,691,100**	**$0**	**$0**	**$13,691,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	778121816	9411762860	E	2020/10/15	2020/10/22	BANCOLOMBIA	7	$6,570,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRO (10 Afiliados)																								$21,369,409	$3,501,900			$21,369,409	$855,100			$21,369,409	$855,100			$21,369,409	$1,246,000		$0	$0		$6,458,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																								$3,755,606	$601,000			$3,755,606	$150,400			$3,755,606	$150,400			$3,755,606	$19,800		$0	$0		$921,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																								$3,755,606	$601,000			$3,755,606	$150,400			$3,755,606	$150,400			$3,755,606	$19,800		$0	$0		$921,600
1	CC	52844470	SALDAÑA NAZLY																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
2	CC	40440483	TENORIO LILIANA																			230301	30	$877,803	$140,500	CCFC55	30	$877,803	$35,200	CCF34	30	$877,803	$35,200	14-7	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,500
3	CC	40442830	TRUJILLO CLAUDIA																			230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
4	CC	1122653003	VERGARA DANIELA																			230301	30	$877,803	$140,500	EPSC34	30	$877,803	$35,200	CCF34	30	$877,803	$35,200	14-7	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,500
Centro de Trabajo: TECNICA (6 Afiliados)																								$17,613,803	$2,900,900			$17,613,803	$704,700			$17,613,803	$704,700			$17,613,803	$1,226,200		$0	$0		$5,536,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																								$17,613,803	$2,900,900			$17,613,803	$704,700			$17,613,803	$704,700			$17,613,803	$1,226,200		$0	$0		$5,536,500
5	CC	97472134	ALVAREZ ANDRES																			25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS044	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
6	CC	52017892	BARRENECHE MARIA																			25-14	30	$1,090,000	$174,400	EPS044	30	$1,090,000	$43,600	CCF34	30	$1,090,000	$43,600	14-7	30	$1,090,000	$75,900	30	$0	$0	Si	$337,500
7	CC	98353169	CABRERA FREDY																			230201	30	$3,200,000	$512,000	ESSC18	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
8	CC	1121823796	TORO DIANA	X																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF34	30	$877,803	$35,200	14-7	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
9	CC	1121924542	VALENCIA JOSE																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
10	CC	79366850	VALENCIA WILLIAM																			230301	30	$8,246,000	$1,402,000	EPS005	30	$8,246,000	$329,900	CCF34	30	$8,246,000	$329,900	14-7	30	$8,246,000	$574,000	30	$0	$0	Si	$2,635,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																								$360,001	$57,700			$360,001	$14,500			$360,001	$14,500			$360,001	$25,200		$0	$0		$111,900
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																								$360,001	$57,700			$360,001	$14,500			$360,001	$14,500			$360,001	$25,200		$0	$0		$111,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																								$360,001	$57,700			$360,001	$14,500			$360,001	$14,500			$360,001	$25,200		$0	$0		$111,900
11	CC	1121927350	TORO ANDREA	X																		230201	2	$126,667	$20,300	EPS017	2	$126,667	$5,100	CCF03	2	$126,667	$5,100	14-7	2	$126,667	$8,900	2	$0	$0	Si	$39,400
12	CC	79627151	YAYA YASSHIR	X																		231001	2	$233,334	$37,400	EPS016	2	$233,334	$9,400	CCF03	2	$233,334	$9,400	14-7	2	$233,334	$16,300	2	$0	$0	Si	$72,500
Total	**Afiliados(12)**																							$21,729,410	$3,559,600			$21,729,410	$869,600			$21,729,410	$869,600			$21,729,410	$1,271,200		$0	$0		$6,570,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	778121816	9411762860	E	2020/10/15	2020/10/22	BANCOLOMBIA	7	$6,570,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$3,559,600	$0	$0	$3,559,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$37,400	$0	$0	$37,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$686,400	$0	$0	$686,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,003,000	$0	$0	$2,003,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$832,800	$0	$0	$832,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,271,200	$0	$0	$1,271,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$1,271,200	$0	$0	$1,271,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$869,600	$0	$0	$869,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$855,100	$0	$0	$855,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$14,500	$0	$0	$14,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$869,600	$0	$0	$869,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$128,000	$0	$0	$128,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$45,100	$0	$0	$45,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$166,800	$0	$0	$166,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$449,900	$0	$0	$449,900
TOTAL				**12**	**$6,570,000**	**$0**	**$0**	**$6,570,000**
