SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 15/02/2021	INSTITUCION: S068. IED LA MERCED SEDE A	LOCALIDAD:	PUENTE ARANDA
FECHA DE TERMINACION: 21/02/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1631	DIRECCION: CL 13 # 42 A - 51	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.	Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	$ 14.841.061,76

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

4428

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 15/02/2021	INSTITUCION: S069. IED MARIA CANO SEDE A	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 19/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1859	DIRECCION: TV 5Q 48H 05 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.	Se realiza visita diagnóstico al Colegio Maria Cano Sede A - ubicado en la Cra. 12G #22 B - 51 Sur, identificando que la Institución cuenta con dos accesos, pisos en concreto y baldosas. La Institución no se encuentra señalizada ni demarcada en exteriores e interiores. Cuenta con jornada única.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	$ 8.228.921,92

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 15/02/2021	INSTITUCION: S070. IED FERNANDO GONZALES OCHOA SEDE A	LOCALIDAD:	USME
FECHA DE TERMINACION: 19/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 510	DIRECCION: KR 4 D ESTE # 89 - 55 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.	Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion, se observa que las superficies son en tableta y concreto.


ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0.1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0.1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO

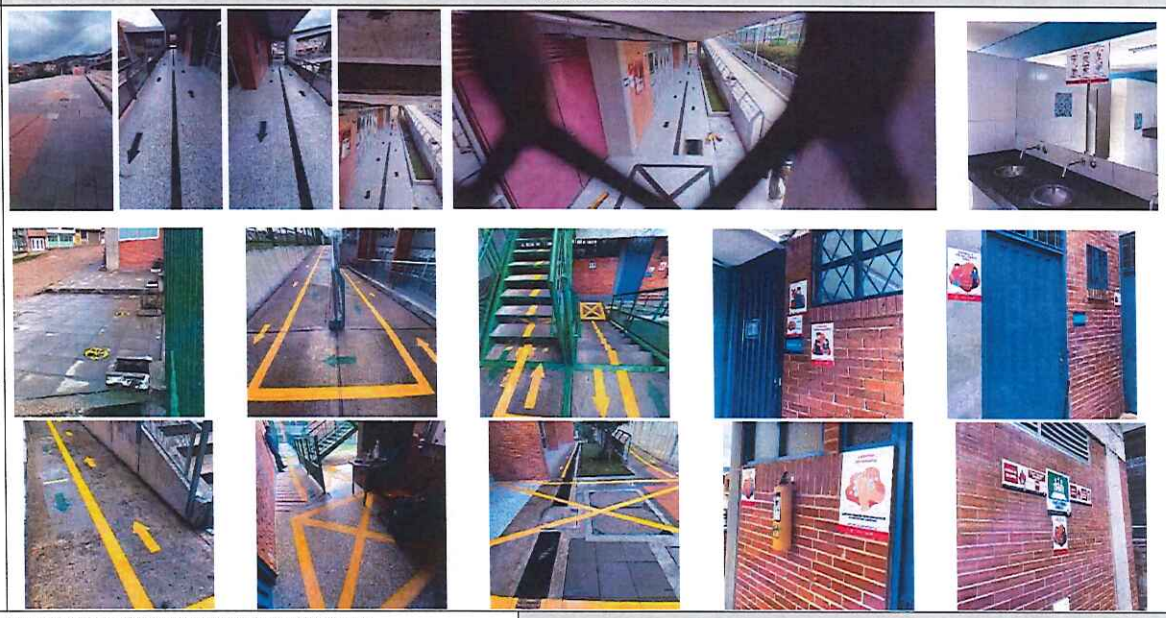

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un período menor a 15 días calendario. Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidaaas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	$ 8.612.485,00

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elabora: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 17/02/2021	INSTITUCION: S071. IED PALERMO SEDE A	LOCALIDAD:	TEUSAQUILLO
FECHA DE TERMINACION: 20/02/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	DIRECCION: KR 23 # 49 - 37	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 6.375.164,00

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 15/02/2021	INSTITUCION: S072. IED AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE A	LOCALIDAD:	LOS MARTIRES
FECHA DE TERMINACION: 19/02/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1411	DIRECCION:	KR 19 # 11 - 17	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	ZONAS DE CIRCULACIÓN				

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este cuenta con una señalizacion la cual no cumple con la requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) se eencuentran deterioradas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.805.856,00

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing, Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 17/02/2021	INSTITUCION: S072. IED LA AMISTAD SEDE A	LOCALIDAD:	LOS MARTIRES
FECHA DE TERMINACION: 21/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 853	DIRECCION: KR 78 # 35 - 30 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, en donde se evidencia que este no cuenta con la demarcacion establecida por la secretaria de educacion distrital, la institucion posee dos porterias que cumplen con la funcion de entrada y salida, tambien en una primera inspeccion se confirma que este cuenta con doble jornada escolar, piso con enchape de tableta, y acceso en concreto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 6.159.426,00

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoría
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing, Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 15/02/2021	INSTITUCION: S076. IED MILLAN RESTREPO SEDE A	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 17/02/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1846	DIRECCION:	CL 40 SUR # 23 - 25	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid 19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita diagnóstico al Colegio Distrital Milan Restrepo - Sede A ubicado en la Calle 40 sur # 23 - 25 identificando los siguientes aspectos: EL colegio no cuenta con señalización ni demarcanción, tiene tres accesos peatoles, dos accesos vehiculares, es de jornada mañana, tarde y noche. El piso es en baldosa, granito y concreto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 enlas ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.975.189,76

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingenería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 17/02/2021	INSTITUCION: S077. IED MILLAN RESTREPO SEDE B	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 18/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1821	DIRECCION: CL 41 SUR # 26 - 20	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnostico al Colegio Restrepo Millan Isabel II Inglaterra - Sede B ubicado en la Calle 41 Sur # 26 - 44 identificando los siguientes aspectos: La institución educativa se encuentra sin señalización ni demarcación, tiene (2) dos porterias peatonales, es jornada mañana y tarde, el piso es de concreto, baldosa y asfalto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia. de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 enlas ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.383.146,20

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing, Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 18/02/2021	INSTITUCION: S078. IED MILLAN RESTREPO SEDE C	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 21/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1814	DIRECCION: AV CARACAS # 38 - 02 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada, se observa concreto en exteriores y granito y tableta en interiores.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicacion de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0.1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 enlas ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.

REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.412.842,48

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing, Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 15/02/2021	INSTITUCION: S080. IED QUIROGA ALIANZA SEDE A	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 21/02/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1841	DIRECCION:	KR 23 # 35 - 20 SUR	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al Colegio Quiroga Alianza ubicado en la Carrera 23 # 35 - 20 Sur, identificando los siguientes aspectos: la Institución Educativa no cuenta con señalización ni demarcación interior o exterior, el piso es de baldoza y concreto. Es jornada unica y cuenta con un acceso peatonal.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura.de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.


Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 enlas ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO

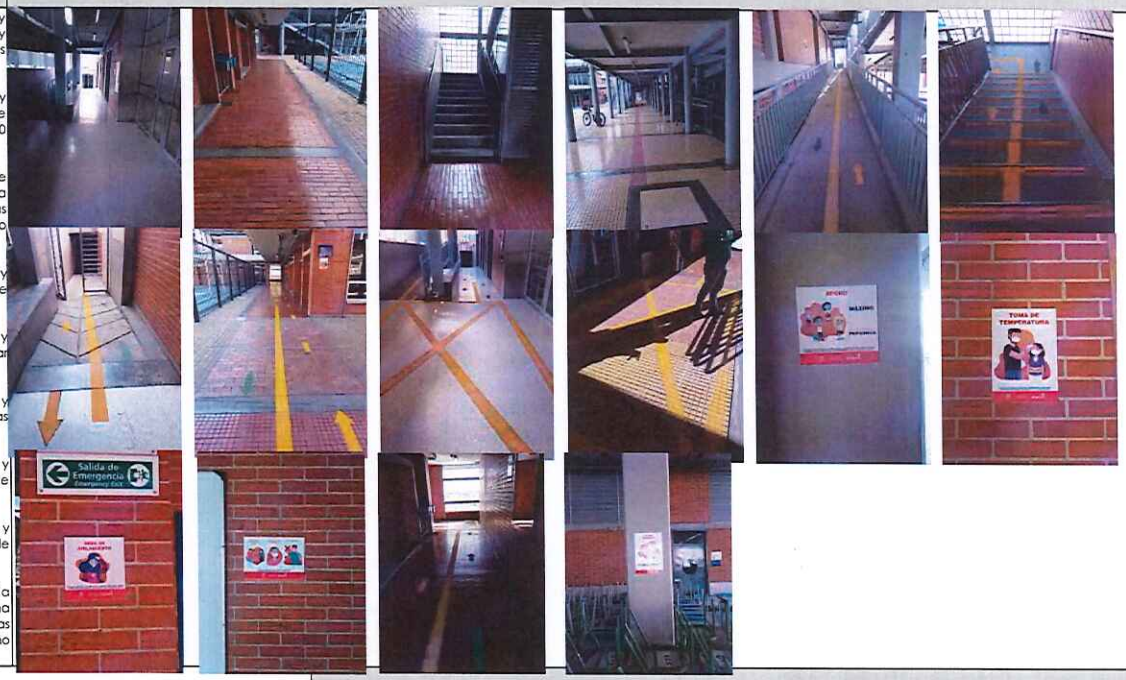

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 10.800.412,48

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 19/02/2021 / FECHA DE TERMINACION: 21/02/2021	INSTITUCION: S084. IED JUANA ESCOBAR SEDE A	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
CODIGO PLANTA FISICA No. 435	DIRECCION: KR 15A ESTE 57A 16 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico al colegio, en donde se evidencia una demarcacion exitente, se efectua la inspeccion visual de esta para determinar si cuenta con el distanciamiento de acuerdo a las recomendaciones de la SED

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura.de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 entas ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución
Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario.
Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.544.495,72

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

4437

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 19/02/2021	INSTITUCION: S085. IED BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: 21/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1912	DIRECCION: Calle 55 Sur # 69 B - 61 Sur	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico en la IED Confederación Brisas del Diamante - Sede A ubicada en la Calle 55 Sur # 69 b - 61. La Institución cuenta con dos accesos, pisos en ladrillo y concreto. La institución no cuenta con señalización y demarcación interior ni exterior.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 enlas ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contratadas. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoria se realizo solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.904.081,00

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 18/02/2021	INSTITUCION: S087. IED LA CANDELARIA SEDE A	LOCALIDAD:	LA CANDELARIA
FECHA DE TERMINACION: 19/02/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1703	DIRECCION:	KR 2 # 14 - 90 -- CL 12 C # 1 A - 24	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, en donde se evidencia que este no cuenta con la demarcacion establecida por la secretaria de educacion distrital, la institucion posee dos porterias que cumplen con la funcion de entrada y salida, tambien en una primera inspeccion se confirma que este cuenta con doble jornada escolar, piso con enchape de tableta, y acceso en concreto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.


Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 entas ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO

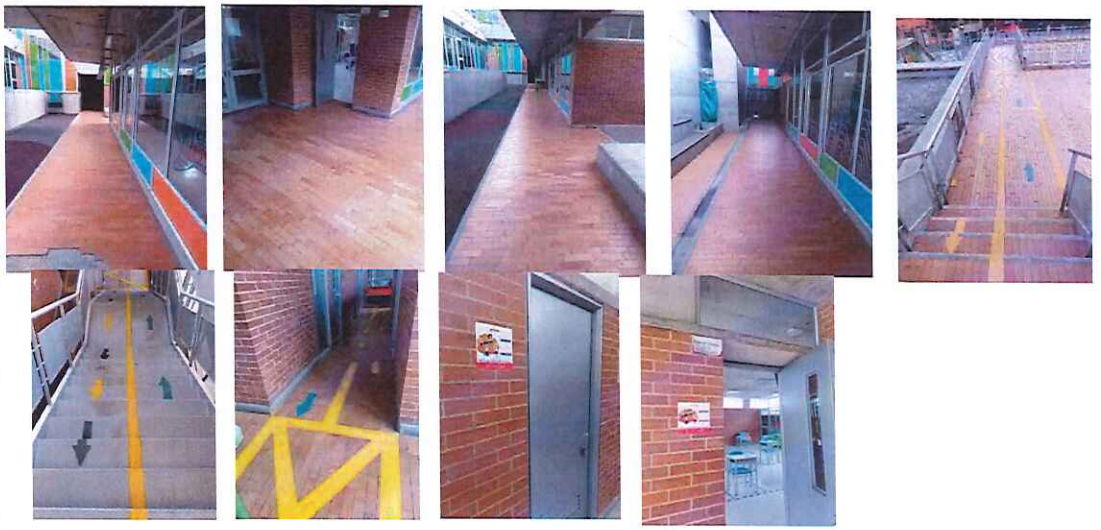

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.701.997,68

JUAN RINCON - Residente de interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

4439

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 17/02/2021	INSTITUCION: S089. IED BRAVO PAEZ SEDE A	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 20/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1805	DIRECCION: CL 37 SUR # 23 - 51	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, en donde se evidencia que este no cuenta con la demarcacion establecida por la secretaria de educacion distrital, la institucion posee dos porterias que cumplen con la funcion de entrada y salida, tambien en una primera inspeccion se confirma que este cuenta con doble jornada escolar, piso con enchape de tableta, y acceso en concreto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura.de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 entas ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml)

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 4.261.713,84

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 43 (FEBRERO 15 - FEBRERO 21)		
FECHA DE INICIO: 18/02/2021	INSTITUCION: S093. IED MARRUECOS MOLINOS SEDE A	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 21/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1833	DIRECCION: CL 49 D BIS SUR # 5 X - 02	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, en donde se evidencia que este no cuenta con la demarcacion establecida por la secretaria de educacion distrital, la institucion posee dos porterias que cumplen con la funcion de entrada y salida, tambien en una primera inspeccion se confirma que este cuenta con doble jornada escolar, piso con enchape de tableta, y acceso en concreto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 enlas ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO










OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.761.665,52

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No AC2R-SED-115-2020

Bogotá D.C. Febrero 25 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**
Asunto: INFORME SEMANAL

Por medio de la presente AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.AS, hace entrega del Informe correspondiente a la semana 44.1, según lo establece el contrato.

Sin otro motivo y agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71º no 52º-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP

SEMANA 44.1 (Febrero 22 - Febrero 22)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baños	02/10/2020	EN EJECUCION
2	133. IED MARIA CANO	Cubierta	22/10/2020	EN EJECUCION
3	136. IED MONTEBELLO	Estructural	22/10/2020	EN EJECUCION
4	150. BODEGA ROSA ZARATE	Cubierta	16/11/2020	EN EJECUCION
5	161. IED FERNANDO MAZUERA	Estructural - Fachada	18/12/2020	22/02/2021
6	162. DIRECCION LOCAL DE SUBA	Cubierta	10/02/2021	EN EJECUCION
7	163. IED GUILLERMO CANO ISAZA	Estructural	02/02/2021	22/02/2021
8	164. IED JOSE FELIX RESTREPO	Estructural	30/01/2021	EN EJECUCION
9	165. IED ALEMANIA UNIFICADA - LAS MALVINAS	Estructural	10/02/2021	22/02/2021
OBSERVACIONES:				

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.1 (Febrero 22 - Febrero 22)		
FECHA DE INICIO: 02/10/2020	INSTITUCION: 117. LOTE FONTANA GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1168	DIRECCION:	Cra.106 B No.151C-92	TIPO DE EMERGENCIA:	BAÑO EN SECO	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del dia, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal). INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		
Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.		

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solcitado, asi como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA **$ 75.340,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.1 (Febrero 22 - Febrero 22)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	INSTITUCION: 133. IED MARIA CANO		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1859	DIRECCION: Transversal 5U #48J-30 sur	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: COMEDOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta sobre el hall principal y circulaciones presenta fallas en su impermeabilización evidenciada por humedades en su cara inferior generando filtración de aguas lluvias a este espacio y por ende el contacto de estas con el acabado de piso generando encharcamientos y la posibilidad de que cualquier persona sea de aseo, vigilancia, alumnos o docentes se resbalen y sufran lesiones.

REGISTRO FOTOGRAFICO







ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y trabajos de impermeabilizacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 402.110,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.1 (Febrero 22 - Febrero 22)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	INSTITUCION: 136. IED MONTEBELLO		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	408	DIRECCION:	Calle 26 sur No.1A-44 este	TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

REGISTRO FOTOGRAFICO







ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL EN ESTRUCTURA

ESMALTE S/ LAMINA LINEAL EN ESTRUCTURA

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA **$ 4.252.417,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 44.1 (Febrero 22 - Febrero 22)**		
FECHA DE INICIO: 16/11/2020	**INSTITUCION:** 150. BODEGA ROSA ZARATE		**LOCALIDAD:** FONTIBON
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1416	**DIRECCION:**	Carrera 25A No. 8-45	**TIPO DE EMERGENCIA:**	CUBIERTA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	BODEGA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La cubierta de la bodega de la Secretaria de Educación denominada "Rosa Zarate" presenta filtraciones equipos de computo, papeleria y archivo de la Entidad en cuanto a documentos de la SED y colegios.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON EL DESMONTE DEL CIELO RASO EN OFICINAS

INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN PVC

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.428.309,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.1 (Febrero 22 - Febrero 22)		
FECHA DE INICIO: 18/12/2020	INSTITUCION: 161. IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: 22/02/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	715	DIRECCION:	Diagonal 66 Sur No.80C-20	TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	FACHADAS INTERIORES

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presento la caída subida de un tramo de fachaleta instalada, generando riesgo a la integridad de la comunidad educativa si continua este fenómeno.

REGISTRO FOTOGRAFICO








ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOPLAST FACHADA

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial de obra civil para trabajo en alturas. Asi mismo el personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA $ 287.272,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.1 (Febrero 22 - Febrero 22)		
FECHA DE INICIO: 10/02/2021	INSTITUCION: 162. DIRECCION LOCAL DE SUBA		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No.	DIRECCION:	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CAPILLA

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	  

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHON DE MADERA 18 CM x 4 CM x 3 M
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE PARA MADERA
ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES TECNICAS:	De acuerdo al concepto generado por la Secretaria de Educacion, se le sugiere al contratista realizar la mitigacion de la emergencia con el retiro del enchape o acabado de piso para verificar el estado de la placa original. Realizar nivelacion y construccion de una placa nueva en concreto con la instalacion de aligerado, asi como realizar confinamiento de la misma con un sistema de viguetas intermedias para finalmente instalar como acabado del piso, tableta pulida en granito. Arreglo de guardaescoba. Realizar afinado y desnivel de la placa superior con su respectiva aplicacion de emulsion y manto asfaltico. Resane y pintura de cielo raso bajo placa y pintura de fachada afectada. Retiro de cubierta en teja transparente en mal estado y suministro e instalacion de unidades de teja nuevas en toda el area afectada. Aseo Final de areas intervenidas	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA $ 4.981.693,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.1 (Febrero 22 - Febrero 22)		
FECHA DE INICIO: 02/02/2021	INSTITUCION: 163. IED GUILLERMO CANO ISAZA		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: 22/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1959	DIRECCION: Calle 62 BIS Sur No 16C 49 IN 3	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL - CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLO - PEATONALES

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Las directivas del IED Guillermo Cano Isaza sede A hacen llegar a la Entidad informe emitido por el Arq. Cristian Gaviria Ruiz de fecha 30 de octubre del año en curso, en el cual se emite concepto respecto a:
- Afectaciones en cubierta y placa de entrepiso en área de circulación que conecta 02 Bloques de aulas ejecutados en epocas diferentes.
- Deficiencias en el sistema de drenaje de aguas lluvias.
- Presencia de humedades y afectación en la cara inferior de la placa de entrepiso.
- Desprendimiento de acabado a lo largo de la junta constructiva.
- Afectaciones en el acabado de piso por la acción de asentamientos diferenciales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

RESANES GENERALES

VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS

ESMALTE S/ LAMINA LINEAL

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	De acuerdo al concepto generado por la Secretaria de Educacion, se le sugiere al contratista realizar la mitigacion de la emergencia con el retiro del enchape o acabado de piso para verificar el estado de la placa original. Realizar nivelacion y construccion de una placa nueva en concreto con la instalacion de aligerado, asi como realizar confinamiento de la misma con un sistema de viguetas intermedias para finalmente instalar como acabado del piso, tableta pulida en granito. Arreglo de guardaescoba. Realizar afinado y desnivel de la placa superior con su respectiva aplicacion de emulsion y manto asfaltico. Resane y pintura de cielo raso bajo placa y pintura de fachada afectada. Retiro de cubierta en teja transparente en mal estado y suministro e instalacion de unidades de teja nuevas en toda el area afectada. Aseo Final de areas intervenidas

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.439.696,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.1 (Febrero 22 - Febrero 22)		
FECHA DE INICIO: 30/01/2021	INSTITUCION: 164. IED JOSE FELIX RESTREPO SEDE D		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	474	DIRECCION:	Calle 17A sur #4-40	TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	AULAS - SEDE D

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se Declaró la amenaza de ruina por parte de la Alcaldía Local de San Cristobal de la edificación ubicada en la Calle 17A Sur No. 4-40 Chip AAA0001DOFT Barrio Velódromo de la Localidad de San Cristóbal y, en consecuencia, ordenar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO la demolición total de la edificación allí existente.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	El contratista de obra debera realizar inicialmente proteccion y cerramiento para aislar la construccion y el area a intervenir. Realizar demolicion de toda la estructura (desmonte de cubierta, demolicion de muros, columnas, muros y placas). Desmonte de carpinteria metalica. Retiro y disposicion de residuos y escombros generados por la actividad y finalmente dejar cerramiento rigido.

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.066.040,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.1 (Febrero 22 - Febrero 22)		
FECHA DE INICIO: 10/02/2021	INSTITUCION: 165. ALEMANIA UNIFICADA - LAS MALVINAS		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: 22/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 454	DIRECCION: Diag. 41sur #2A-17	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: LOTE

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se Declaró la amenaza de ruina de la edificación ubicada en la Diagonal 41 Sur No. 2A-41 (Chip AAA0004XOSY) barrio San Martin Sur de la Localidad de San Cristóbal y, en consecuencia, ordenar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO la demolición total de la edificación allí existente.

REGISTRO FOTOGRAFICO







ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON LA DEMOLICIÓN DE LLA ESTRUCTURA EN CONCRETO (VIGAS Y PLACA) - (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES TECNICAS:	De acuerdo al concepto generado por la Secretaria de Educacion, se le sugiere al contratista realizar la mitigacion de la emergencia con el retiro del enchape o acabado de piso para verificar el estado de la placa original. Realizar nivelacion y construccion de una placa nueva en concreto con la instalacion de aligerado, asi como realizar confinamiento de la misma con un sistema de viguetas intermedias para finalmente instalar como acabado del piso, tableta pulida en granito. Arreglo de guardaescoba. Realizar afinado y desnivel de la placa superior con su respectiva aplicacion de emulsion y manto asfaltico. Resane y pintura de cielo raso bajo placa y pintura de fachada afectada. Retiro de cubierta en teja transparente en mal estado y suministro e instalacion de unidades de teja nuevas en toda el area afectada. Aseo Final de areas intervenidas

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 8.004.963,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑAINF-11-2021

Bogotá D.C. Febrero 25 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: INFORME SEMANAL.

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.AS**, hace entrega del Informe correspondiente **SEMANA 44.1 (FEBRERO 22)**, según lo establece el contrato.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanuta@yahoo.com licitacionesdatt@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 5.285.220.304,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 611.779.000,00 COP

SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE B	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MORALBA SEDE C	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUIDAD DE BOGOTA SEDE B	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS SEDE A	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE ASIS SEDE B	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESPAÑA SEDE B	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARGENTINA SEDE B	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CANDELARIA SEDE C	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIBERTADOR SEDE B	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE C	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTE BELLO SEDE B	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIBERTADOR SEDE C	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTIN	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIANA TURBAY	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
15	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICAURTE SEDE B	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
16	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
17	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
18	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
19	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORAH ARANGO	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO RESTREPO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
21	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICAURTE SEDE A	SEÑALIZACIÓN	22/02/2021	EN EJECUCIÓN
OBSERVACIONES:				

Elabora: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S055. IED CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE B		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1957	DIRECCION: DG 69 R SUR # 18 N - 06	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN
---	---	---	---

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.	Se realiza visita diagnostico al colegio IED Confederación Brisas del Diamante ubicado en la Cra 18n # 70 a Sur - 24 identificando huellas de pintura en el ingreso, por los cuales los circulos correspondientes al NP 55 se deben dejar a distancias mayores para poder separlos de las huellas existentes. La institución cuenta con pisos en concreto y ladrillo. No se observa demarcación ni señalización al interior de la institución.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	$ 1.403.129,32

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S037. IED MORALBA SEDE C		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			
CODIGO PLANTA FISICA No. 426	DIRECCION: KR 15 ESTE 46 60 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.	Se realiza la visita de diagnostico al colegio y se observa que este no cuenta con la demarcación prouesta por la secretaria de educacion para el ingreso seguro a clases, el se clasifica el piso en dos tipos una parte en concreto y otra en cerámica, cuenta con una sola puerta de ingreso, el colegio cuenta con un estado óptimo para la ejecución de la señalización.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0.1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	 

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentado por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	$ 1.188.283,64

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing, Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S041. IED CUIDAD DE BOGOTA SEDE B		LOCALIDAD: TUNJUELITO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			

CODIGO PLANTA FISICA No.	613	DIRECCION:	KR 25 # 53 B - 32 SUR	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.	Se realiza la visita de diagnostico a las intalaciones de la institucion educativa, encontrando que las superficies a intervenir son en concreto, baldosa y adoquin, tambien se evidencia que este cuenta con ua sola entrada para los estudiantes y demas personal.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA $ 3.362.940,32

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing, Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S045. IED EDUARDO SANTOS SEDE A		LOCALIDAD: LOS MARTIRES
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1412J	DIRECCION: CL 62 A SUR # 14 I - 33 ESTE	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al Colegio Distrital Eduardo Santos ubicado en la Carrera 24 # 14 - 19 identificando que la institución No cuenta con señalización ni demarcación. Se cuenta con una unica portería, jornada unica y piso de concreto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.075.608,88

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S046. IED FRANCISCO DE ASIS SEDE B		LOCALIDAD: LOS MARTIRES
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1404	DIRECCION: KR 21 # 1 H - 06	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, cuenta con tres puestas las cuales estan implementadas dos para el ingreso y una para la salida del personal estudiantil, tambien dispone de dos jornadas escolares, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra en tableta encerada, escaleras metalicas y piso en concreto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 2.876.134,16

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S051. IED ESPAÑA SEDE B		LOCALIDAD: PUENTE ARANDA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1602	DIRECCION: CL 19 C # 33 - 38	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.	En la visitsa al colegio para la realizacion del diagnostico al colegio España Sede B, se evideincia que este no cuenta con ningún tipo de demarcación, por otra parte se observa que las actividades de demarcacion se deben realizar sobre baldosa al igual que los circulos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.	

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	$ 525.674,00

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S052. IED ARGENTINA SEDE B		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1905	DIRECCION: CL 72 SUR # 47 B - 09	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada, el materia de los pisos es baldosa en su mayoria , y granito

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 502.016,64

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S053. IED CANDELARIA SEDE C	LOCALIDAD:	LA CANDELARIA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1703	DIRECCION: KR 2 # 17 - 65	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio. al igual que no hay señalización informativa. preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones de la institucion educativa, en donde se evidencia que hay obras en el bloque 2, por lo que se realiza la inspeccion al bloque 1, lo que indica que las cantidades de diagnostico seran muy diferentes a las las ejecutadas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 1.012.274,08

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S054. IED EL LIBERTADOR SEDE B	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1831	DIRECCION: CL 33 SUR # 31 - 10	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de

DIAGNOSTICO DE LA VISITA


Se realiza visita diagnóstico al colegio El Libertador - Sede A ubicado en la Calle 33 Sur # 24 b - 20, identificando los siguientes aspectos: La institución cuenta con un unico acceso peatonal, es jornada mañana y tarde. El piso es en concreto y baldosa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara. mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO












OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.994.112,76

JUAN RINCÓN - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S055. IED CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE C		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1927	DIRECCION: CL 68 J SUR # 25 N - 15	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.


DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico a la IED Confederación Brisas del Diamante - Sede C, ubicada en la Calle 70 Sur # 18 J - 02, identificando que la Institución cuenta con un unico ingreso en zona verde, por lo cual solo se podrían pintar 2 NP 55. La insitución cuenta con piso en concreto. El colegio no cuenta con señalización ni demarcación al interior del colegio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO

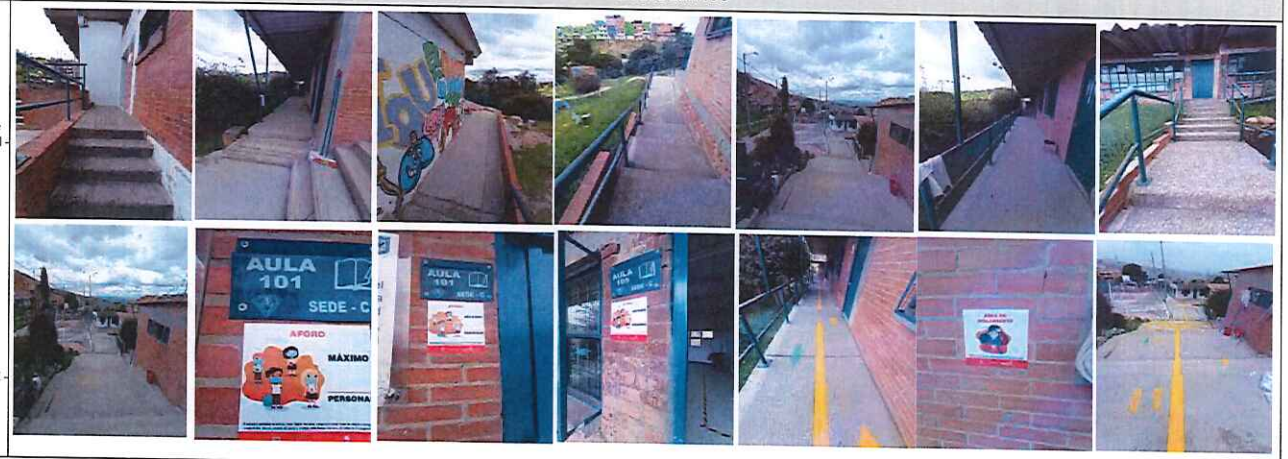

OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución
Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario
Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.403.129,32

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S059. IED MONTE BELLO SEDE B		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			
CODIGO PLANTA FISICA No. 432	DIRECCION: CL 28 SUR # 1 A - 37 ESTE	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, se evidencia que la superficie del pasillo de acceso a las aulas es en baldosa, la cuál es lisa y el acceso a la portería principal es en tableta

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 447.714,20

JUAN RINCÓN - Residente de interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing, Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44. 1 (FEBRERO 22)		
FECHA DE INICIO: 22/02/2021	INSTITUCION: S082. IED EL LIBERTADOR SEDE C		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1823	DIRECCION: KR 26 # 29 - 45 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnostico del Colegio El Libertador - Sede C ubicado en la Transversal 26 A # 29 Sur - 45, identificando los siguientes aspectos: La institución no se encuentra señalizada ni demarcada, cuenta con unico acceso peatonal, el piso es en baldosa y concreto. Durante la visita se encuentran escobros de actividades de obra civil.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO












OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 1.223.815,76

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

4466
