
PROGRAMACIÓN DE OBRA - Microsoft Project

CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES EN EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO - "INFIBAGUE"

SELECCIÓN ABREVIADA No 016 DE 2018

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración
1		**CONSTRUCCIÓN TALLER DE PODAS INFIBAGUE**			**12.86 sem.**
2		INICIO DE LA TAREA			0 sem.
3	1	**PRELIMINARES**			**1 sem**
4	1.01	Desmonte cubierta asbesto cemento	m2	103.63	1 sem
5	1.02	Cargue manual retiro y disposicion final de sobrantes hasta 16 Kms	m3	12.00	1 sem
6	2	**MUROS**			**3 sem.**
7	2.01	Muro en superboard base 9 totalmente terminado	m2	130.00	3 sem.
8	3	**PAÑETES**			**3 sem.**
9	3.01	Pañete exterior 1:3 (impermeable)	m2	51.25	1 sem
10	3.02	Pañete liso 1:4	m2	370.27	3 sem.
11	4	**CUBIERTA**			**2.25 sem.**
12	4.01	Teja thermoacustica	m2	133.87	1 sem
13	4.02	Correa laminada cal 18 (10x4) cmts sencilla	ml	165.33	1 sem

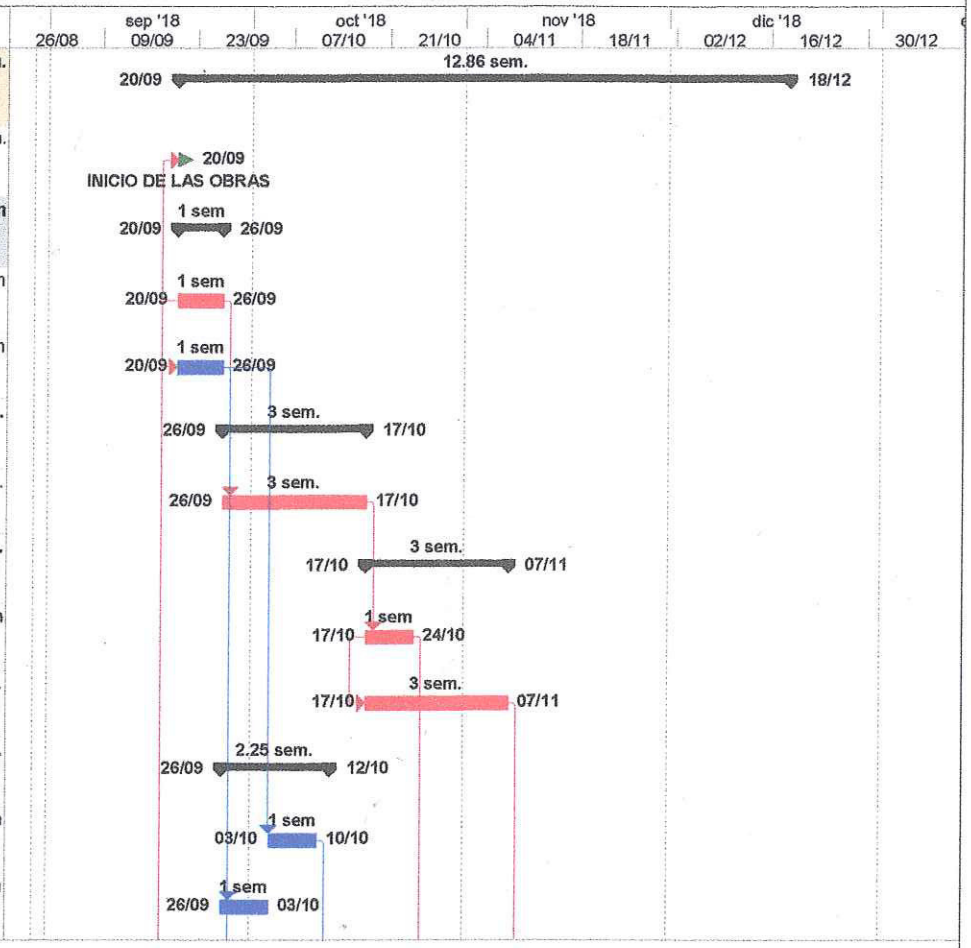

Proyecto: TALLER DE PODAS
Fecha:jue 30/08/18

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	

INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS
Proponente


DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal

PROGRAMACIÓN DE OBRA - Microsoft Project

CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES EN EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO - "INFIBAGUE"

SELECCIÓN ABREVIADA No 016 DE 2018

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración
14	4.03	Canal en lamina galvanizada cal=18 con anticorrosivo	m2	18.37	0.25 sem.
15	**7**	**PINTURA**			**7 sem.**
16	7.01	Anticorrosivo para cerchas	ml	50.75	0.25 sem.
17	7.02	Anticorrosivo para correas	ml	165.33	1 sem
18	7.03	Pintura para cerchas	ml	50.75	0.25 sem.
19	7.04	Pintura para correas	ml	165.33	1 sem
20	7.07	Vinilo tipo I en interior sobre pañete dos manos	m2	421.52	3 sem.
21	7.08	Vinilo tipo I en exterior sobre pañete dos manos	m2	42.46	0.25 sem.
22	**8**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**			**4.25 sem.**
23	8.01	Tuberia sanitaria SPVC de 4"	ml	67.43	1 sem
24	8.02	Tuberia de presion de 1/2"	ml	20.63	1 sem
25	8.03	Punto de agua fria pvc	und	6.00	1 sem
26	8.04	Llave de paso 1/2" corriente	und	1.00	0.13 sem.

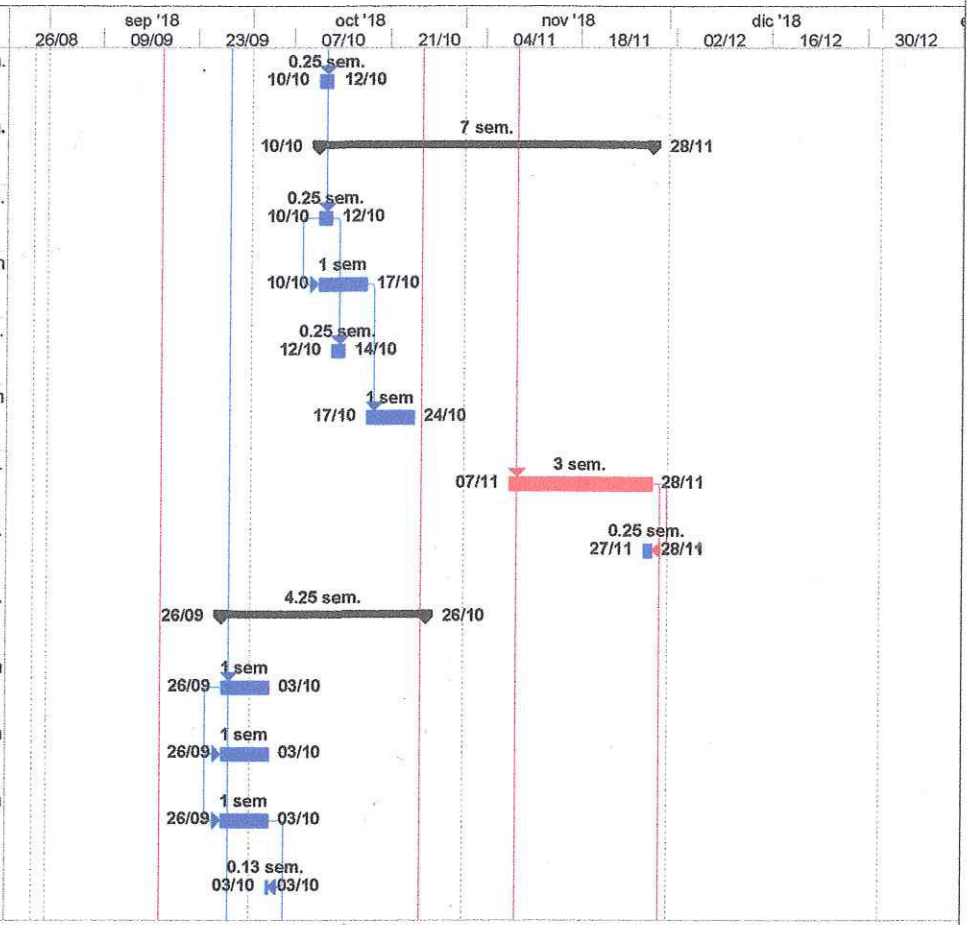

Proyecto: **TALLER DE PODAS**
Fecha:jue 30/08/18

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	

INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS
Proponente


DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal

PROGRAMACIÓN DE OBRA - Microsoft Project

CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES EN EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO - "INFIBAGUE"

SELECCIÓN ABREVIADA No 016 DE 2018

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración
27	8.05	Tapa plastica para registro 15x15	und	1.00	0.13 sem.
28	8.06	Suministro e instalacion griferia 8" tipo fenix	und	4.00	0.25 sem.
29	8.07	Ducha sencilla	und	2.00	0.13 sem.
30	8.08	Orinal pared	und	1.00	0.13 sem.
31	8.09	Aparatos sanitarios	und	2.00	0.13 sem.
32	8.10	Lavamanos acuacaer blanco	und	4.00	0.25 sem.
33	**9**	**ALCANTARILLADO**			**4.26 sem.**
34	9.01	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	48.00	0.13 sem.
35	9.02	Rotura concreto rigido	m3	8.06	2 sem.
36	9.03	Excavacion a mano de 0 a 2m en seco en material comun	m3	43.64	1 sem
37	9.04	Cargue y retiro de sobrantes hasta 8 Km a mano	ı3/com	43.64	1 sem
38	9.05	Suministro e instalacion lecho en grava para cama tuberia d=1/2 a 3/4	m3	1.92	0.13 sem.

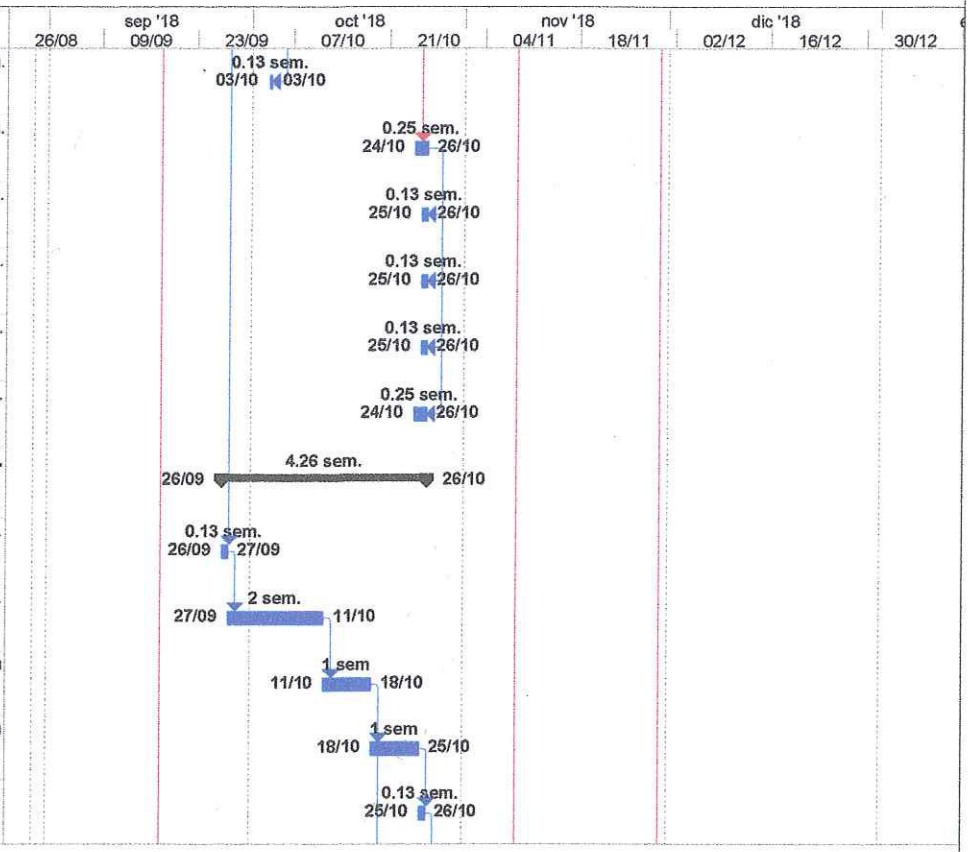

Proyecto: **TALLER DE PODAS**
Fecha:jue 30/08/18

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	

INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS
Proponente


DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal

PROGRAMACIÓN DE OBRA - Microsoft Project

CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES EN EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO - "INFIBAGUE"

SELECCIÓN ABREVIADA No 016 DE 2018

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración
39	**10**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NORMA TECNICA COLOMBIANA 3722-1 NORMA TECNICA COLOMBIANA 4764 (100% DE HERMETICIDAD)**			**3 sem.**
40	10.01	De 0 a 2 m de diametro 10 pulgadas	ml	32.00	1 sem
41	10.02	Suministro de recebo en zanja compactada cada 15 cms medio mecanico	m3/com	38.24	1 sem
42	10.03	Anden en concreto e=0,1 m (incluye alistado y nivelacion)	m2	10.00	1 sem
43	**11**	**CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION**			**3 sem.**
44	11.01	Base y cañuela en concreto de 3000 PSI e=0,3 m	und	1.00	1 sem
45	11.02	Pañete interior	ml	1.50	1 sem
46	11.03	Cilindro en ladrillo e=0,3m	ml	2.80	1 sem
47	11.04	Cono de reduccion h=0,65m	und	1.00	1 sem
48	11.05	Pasos en hierro de 3/4 con anticorrosivo c/0,4m	und	7.00	1 sem
49	11.06	Suministro e instalacion de arotapa vibrocompactadora	und	1.00	1 sem
50	11.07	Señalizacion en guadua cada 3 m en polisombra h=2m	ml	50.00	1 sem
51	11.08	Caja de Inspeccion 80*60*100 cms concreto de 2500 PSI tapa reforzada en concreto de 3000 PSI	und	3.00	1 sem

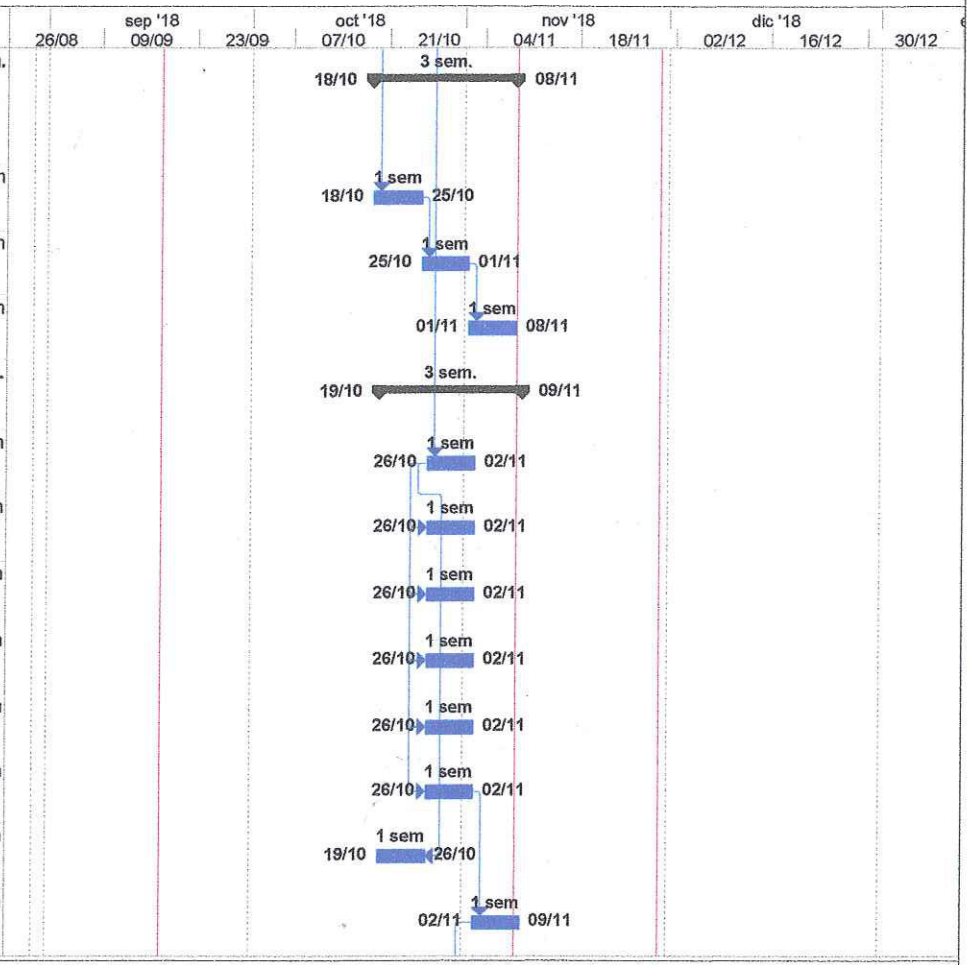

Proyecto: TALLER DE PODAS
Fecha:jue 30/08/18

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito	◆	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	⊏
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	⊐
Hito resumido	◇	Hito inactivo	◇	Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	⇩

INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS
Proponente


DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal

PROGRAMACIÓN DE OBRA - Microsoft Project

CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES EN EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO - "INFIBAGUE"

SELECCIÓN ABREVIADA No 016 DE 2018

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración
52	11.09	Camara de caida diametro de 8 pulgadas revestida en concreto, malla con vena	ml	2.20	1 sem
53	**12**	**ENCHAPES**			**3 sem.**
54	12.01	Guarda escoba en tablon	ml	77.20	2 sem.
55	12.02	Enchape pared 20x20	m2	52.00	1 sem
56	**12.02**	**PISOS**			**0.25 sem.**
57	12.03	Piso duro piso o similar	m2	18.30	0.25 sem.
58	**13**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**1 sem**
59	13.01	Punto electrico salida luminaria y/o tomacorriente	und	18.00	1 sem
60	**14**	**CARPINTERIA DE ALUMINIO**			**1 sem**
61		Puerte en aluminio tipo liviano, con adaptador y pisa vidrio plano y Marco en Aluminio 1,00x2,00 M	und	2.00	1 sem
62		Puerta en aluminio tipo liviano en perfil de 2x1, Con Adaptador y pisa vidrio Plano y Marco en Aluminio 0,80x2,00 M	und	4.00	1 sem
63	14.01	Ventana en perfil 5020 con seguro media luna y vidrio de 4 mm 0,40x0,60 M	und	8.00	1 sem
64	**15**	**OTROS**			**1.86 sem.**

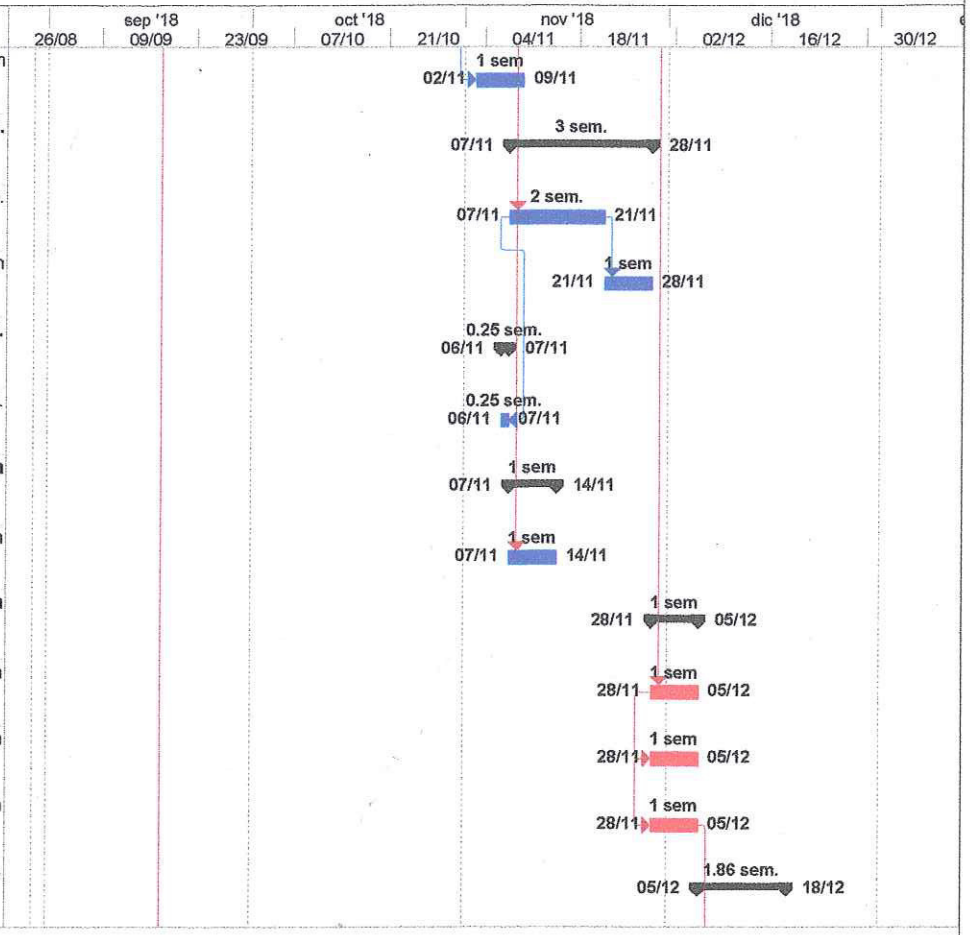

Proyecto: **TALLER DE PODAS**
Fecha:jue 30/08/18

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Hito resumido		Hito inactivo		Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	

INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS
Proponente


DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal

PROGRAMACIÓN DE OBRA - Microsoft Project

CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES EN EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO - "INFIBAGUE"

SELECCIÓN ABREVIADA No 016 DE 2018

Id	Item	Nombre de la actividad	Und.	Cant.	Duración
65	15.01	Loker 3 cuerpos 6 puertas de 1,80x90,30 estructura lamina lisa cold rolled calibre 0,20, frente puertas con manijas plasticas con punzonada y/o ventanas, porta candados y base con niveladores	und	3.00	1 sem
66	15.02	Meson en concreto de 3000 PSI y grano pulido #2	ml	2.37	1 sem
67	15.03	Silla para vestier Estructura en tubo redondo cold rolled 2", sentadero en malla cafetera, refuerzos en platina, acabados en pintura electrostatica pulverizada, medidas: 1,50x.40x.43	und	1.00	6 días
68	15.04	Estructura en tubo redondo cold silla para vestier Estructura en tubo redondo cold rolled 2", sentadero en malla cafetera , refuerzos en platina, acabados en pintura electroestatica pulverizada medidas 1,00x.40x.41	und	1.00	1 sem
69		**A.I.U.**			**12.86 sem.**
70		ADMINISTRACION	%	18%	90 días
71		IMPREVISTOS	%	2%	90 días
72		UTILIDAD	%	5%	90 días
73		**FIN DE LA TAREA**			0 días

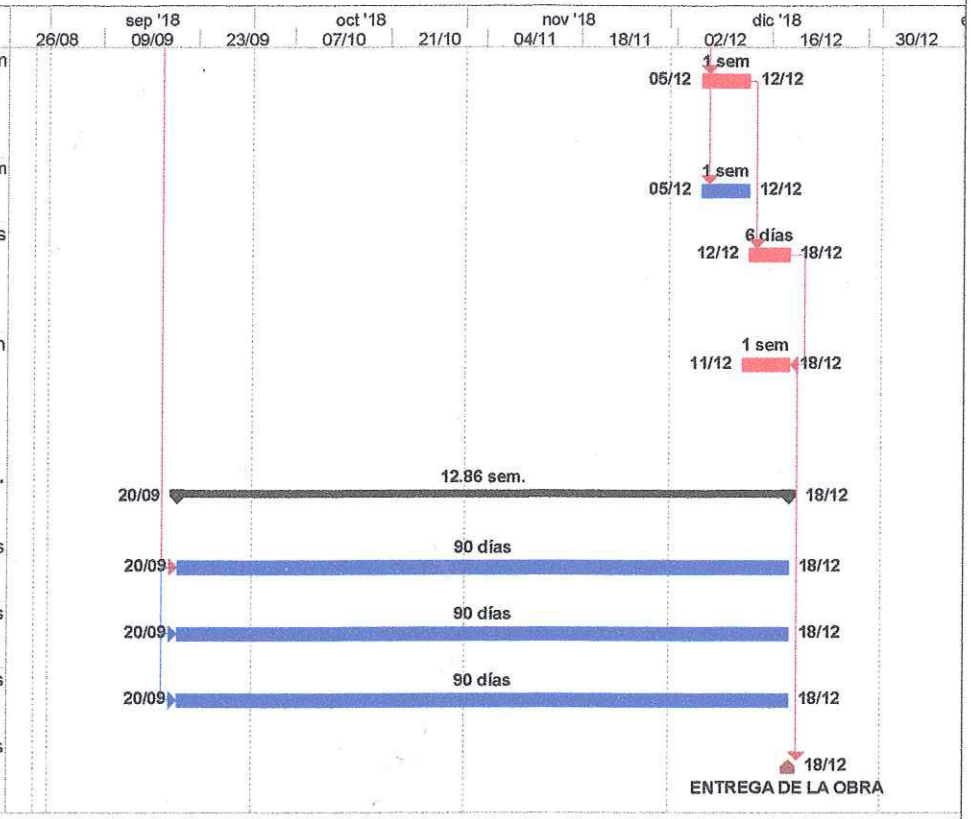

Proyecto: **TALLER DE PODAS**
Fecha:jue 30/08/18

Tarea		División		Tarea manual	
Tarea crítica		Tareas externas		Sólo duración	
Hito	◆	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntesis		Resumen manual	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	[
Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	]
Hito resumido	◇	Hito inactivo	◇	Progreso	
Progreso resumido		Resumen inactivo		Fecha límite	⇩

INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS
Proponente

DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal

PROGRAMA DE INVERSION SEMANAL

"CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INFIBAGUÉ, PARA EL ÁREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

SELECCIÓN ABREVIADA No 016 DE 2018

Item	"CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INFIBAGUÉ, PARA EL ÁREA	Duración	Inversion en $ Pesos Actividades	Porcentaje Actividades (%)	MES 1				MES 2				MES 3				
		12.8 Semanas			1° Semana	2° Semana	3° Semana	4° Semana	5° Semana	6° Semana	7° Semana	8° Semana	9° Semana	10° Semana	11° Semana	12° Semana	12.84 Semana
		90 dias			Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)
1	**PRELIMINARES**	1 sem															
1.01	Desmonte cubierta asbesto cemento	1 sem	$ 917,747.28	1.04%	$ 917,747.28												
1.02	Cargue manual retiro y disposicion final de sobrantes hasta 16 Kms	1 sem	$ 363,708.00	0.41%	$ 363,708.00												
2	**MUROS**	3 sem.															
2.01	Muro en superboard base 9 totalmente terminado	3 sem.	$ 18,200,000.00	20.60%		$ 6,066,666.67	$ 6,066,666.67	$ 6,066,666.67									
3	**PAÑETES**	3 sem.															
3.01	Pañete exterior 1:3 (impermeable)	1 sem	$ 1,230,256.25	1.39%					$ 1,230,256.25								
3.02	Pañete liso 1:4	3 sem.	$ 8,627,291.00	9.77%					$ 2,875,763.67	$ 2,875,763.67	$ 2,875,763.67						
4	**CUBIERTA**	2.25 sem.															
4.01	Teja thermoacustica	1 sem	$ 9,973,315.00	11.29%			$ 9,973,315.00										
4.02	Correa laminada cal 18 (10x4) cmts sencilla	1 sem	$ 2,859,382.35	3.24%		$ 2,859,382.35											
4.03	Canal en lamina galvanizada cal=18 con anticorrosivo	0.25 sem.	$ 1,436,956.51	1.63%			$ 1,436,956.51										
7	**PINTURA**	7 sem.															
7.01	Anticorrosivo para cerchas	0.25 sem.	$ 393,464.75	0.45%				$ 393,464.75									
7.02	Anticorrosivo para correas	1 sem	$ 1,789,035.93	2.03%				$ 1,789,035.93									
7.03	Pintura para cerchas	0.25 sem.	$ 393,464.75	0.45%				$ 393,464.75									
7.04	Pintura para correas	1 sem	$ 1,789,035.93	2.03%					$ 1,789,035.93								
7.07	Vinilo tipo I en interior sobre pañete dos manos	3 sem.	$ 3,562,265.52	4.03%								$ 3,562,265.52					
7.08	Vinilo tipo I en exterior sobre pañete dos manos	0.25 sem.	$ 357,852.68	0.41%								$ 357,852.68					
8	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	4.25 sem.															
8.01	Tuberia sanitaria SPVC de 4"	1 sem	$ 2,602,393.42	2.95%		$ 2,602,393.42											
8.02	Tuberia de presion de 1/2"	1 sem	$ 176,944.62	0.20%		$ 176,944.62											
8.03	Punto de agua fria pvc	1 sem	$ 524,406.00	0.59%		$ 524,406.00											
8.04	Llave de paso 1/2" corriente	0.13 sem.	$ 44,097.00	0.05%			$ 44,097.00										
8.05	Tapa plastica para registro 15x15	0.13 sem.	$ 8,000.00	0.01%			$ 8,000.00										
8.06	Suministro e instalacion griferia 8" tipo fenix	0.25 sem.	$ 556,924.00	0.63%								$ 556,924.00					
8.07	Ducha sencilla	0.13 sem.	$ 148,338.00	0.17%								$ 148,338.00					
8.08	Orinal pared	0.13 sem.	$ 484,647.00	0.55%								$ 484,647.00					
8.09	Aparatos sanitarios	0.13 sem.	$ 517,322.00	0.59%								$ 517,322.00					
8.10	Lavamanos acuacer blanco	0.25 sem.	$ 346,456.00	0.39%								$ 346,456.00					
9	**ALCANTARILLADO**	4.25 sem.															
9.01	Corte de pavimento rigido con cortadora	0.13 sem.	$ 860,592.00	0.97%		$ 860,592.00											
9.02	Rotura concreto rigido	2 sem.	$ 994,023.68	1.13%			$ 994,023.68										
9.03	Excavacion a mano de 0 a 2m en seco en material comun	1 sem	$ 1,217,075.96	1.38%				$ 1,217,075.96									
9.04	Cargue y retiro de sobrantes hasta 8 Km a mano	1 sem	$ 1,196,739.72	1.35%					$ 1,196,739.72								
9.05	Suministro e instalacion lecho en grava para cama tuberia d= 1/2 a 3/4	0.13 sem.	$ 193,388.16	0.22%						$ 193,388.16							
10	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NORMA TECNICA COLOMBIANA 3722-1 NORMA**	3 sem.															
10.01	De 0 a 2 m de diametro 10 pulgadas	1 sem	$ 3,335,712.00	3.78%			$ 3,335,712.00										
10.02	Suministro de recebo en zanja compactada cada 15 cms medio mecanico	1 sem	$ 2,354,933.92	2.67%				$ 2,354,933.92									

INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS
DAIRO DUEÑAS MORALES R/L

PROGRAMA DE INVERSION SEMANAL

"CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INFIBAGUÉ, PARA EL ÁREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

SELECCIÓN ABREVIADA No 016 DE 2018

Item	"CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INFIBAGUÉ, PARA EL ÁREA	Duración 12.8 Semanas / 90 días	Inversion en $ Pesos Actividades	Porcentaje Actividades (%)	MES 1				MES 2				MES 3				
					1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	7ª Semana	8ª Semana	9ª Semana	10ª Semana	11ª Semana	12ª Semana	12.84 Semana
					Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)	Pesos ($)
10.03	Anden en concreto e=0,1 m (incluye alistado y nivelacion)	1 sem	$ 767,280.00	0.87%					$ 767,280.00								
11	CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION	3 sem.															
11.01	Base y cañuela en concreto de 3000 PSI e=0,3 m	1 sem	$ 477,916.00	0.54%				$ 477,916.00									
11.02	Pañete interior	1 sem	$ 151,873.50	0.17%				$ 151,873.50									
11.03	Cilindro en ladrillo e=0,3m	1 sem	$ 1,358,966.00	1.54%				$ 1,358,966.00									
11.04	Cono de reduccion h=0,65m	1 sem	$ 434,360.00	0.49%				$ 434,360.00									
11.05	Pasos en hierro de 3/4 con anticorrosivo c/0,4m	1 sem	$ 123,501.00	0.14%				$ 123,501.00									
11.06	Suministro e instalacion de arotapa vibrocompactadora	1 sem	$ 550,357.00	0.62%				$ 550,357.00									
11.07	Señalizacion en guadua cada 3 m en polisombra h=2m	1 sem	$ 697,400.00	0.79%			$ 697,400.00										
11.08	Caja de inspeccion 80*60*100 cms concreto de 2500 PSI tapa reforzada en concreto de 3000 PSI	1 sem	$ 1,264,338.00	1.43%					$ 1,264,338.00								
11.09	Camara de caida diametro de 8 pulgadas revestida en concreto, malla con vena	1 sem	$ 445,198.60	0.50%					$ 445,198.60								
12	ENCHAPES	3 sem.															
12.01	Guarda escoba en tablon	2 sem.	$ 840,708.00	0.95%								$ 420,354.00	$ 420,354.00				
12.02	Enchape pared 20x20	1 sem	$ 3,929,796.00	4.45%										$ 3,929,796.00			
12.02	PISOS	0.25 sem.															
12.03	Piso duro piso o similar	0.25 sem.	$ 1,436,934.30	1.63%								$ 1,436,934.30					
13	INSTALACIONES ELECTRICAS	1 sem															
13.01	Punto electrico salida luminaria y/o tomacorriente	1 sem	$ 1,541,484.00	1.74%								$ 1,541,484.00					
14	CARPINTERIA DE ALUMINIO	1 sem															
	Puerta en aluminio tipo liviano, con adaptador y pisa vidrio plano y Marco en Aluminio 1.00x2.00 M	1 sem	$ 1,125,000.00	1.27%											$ 1,125,000.00		
	Puerta en aluminio tipo liviano en perfil de 2x1, Con Adaptador y pisa vidrio Plano y Marco en Aluminio	1 sem	$ 2,060,000.00	2.33%											$ 2,060,000.00		
14.01	Ventana en perfil 5020 con seguro media luna y vidrio de 4 mm 0.40x0.60 M	1 sem	$ 1,180,000.00	1.34%											$ 1,180,000.00		
15	OTROS	1.86 sem.															
15.01	Loker 3 cuerpos 6 puertas de 1.80x90.30 estructura lamina lisa cold rolled calibre 0.20, frente puertas con mirillas	1 sem	$ 1,638,279.00	1.85%											$ 1,638,279.00		
15.02	Meson en concreto de 3000 PSI y grano pulido #2	1 sem	$ 450,852.21	0.51%											$ 450,852.21		
15.03	Silla para vestier Estructura en tubo redondo cold rolled 2", sentadero en malla cafetera, refuerzos en platina, acabados en pintura electrostatica pulverizada, medidas: 1.50x.40x.43	6 dias	$ 229,034.00	0.26%												$ 114,517.00	$ 114,517.00
15.04	Estructura en tubo redondo cold silla para vestier Estructura en tubo redondo cold rolled 2", sentadero en malla cafetera , refuerzos en platina, acabados en pintura electroestatica pulverizada medidas 1,00x.40x.41	1 sem	$ 182,227.00	0.21%												$ 91,113.50	$ 91,113.50
	COSTO TOTAL OBRA		$ 88,343,274.24	100.00%													
	COSTO/SEMANA				$ 1,281,455	$ 13,092,365	$ 22,556,171	$ 15,311,615	$ 9,568,612	$ 3,089,152	$ 2,875,764	$ 9,372,578	$ 420,354	$ 3,929,796	$ 6,454,131	$ 205,631	$ 205,631
	COSTO ACUMULADO/SEMANA/SEMANA				$ 1,281,455	$ 14,373,840	$ 36,930,011	$ 52,241,627	$ 61,810,239	$ 64,879,391	$ 67,755,154	$ 77,127,732	$ 77,548,086	$ 81,477,882	$ 87,932,013	$ 88,137,644	$ 88,343,274
	PORCENTE/SEMANA				1.45%	14.82%	25.53%	17.33%	10.83%	3.47%	3.26%	10.61%	0.48%	4.45%	7.31%	0.23%	0.23%
	PORCENTAJE ACUMULADO/SEMANA/SEMANA				1.45%	16.27%	41.80%	59.13%	69.97%	73.44%	76.70%	87.30%	87.78%	92.23%	99.53%	99.77%	100.00%

INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS
DAIRO DUEÑAS MORALES R/L
