ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE SUPERVISION 01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.:	356 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO (M.R. 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA:	INTEC DE LA COSTA S.A.S NIT: **830.502.135–1**
REPRESENTANTE LEGAL	*HUGO ARMANDO CANABAL HOYOS,* **10.932.959 de Montería (Córdoba)**
SUPERVISOR:	ING. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA Secretario de Obras Públicas Municipal
APOYO SUPERVISION:	ING. MAYTTORENA BAUTE CASTILLA Profesional Universitario SOPM
APOYO SUPERVISION:	ING.CARLOS DE LA OSSA Contratista Secretaria de Obras
INTERVENTORÍA	CONSTRUCCIONES SINAÍ S.A.S. NIT. 901.036.485-2
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN CC. 73.137.195
VALOR INICIAL:	El presente contrato tiene un valor de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.871.261.640,66) AIU INCLUIDO
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
DOMICILIO:	El lugar de ejecución del Contrato será el Municipio de Valledupar. Para todos los efectos derivados de la

	celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, el domicilio contractual será la Municipio de Valledupar.
FECHA ACTA DE INICIACIÒN:	TRES (03) días del mes de MAYO del año Dos Mil Veintiuno (2021).
FECHA TERMINACIÓN:	TRES (03) días del mes de SEPTIEMBRE del año Dos Mil Veintiuno (2021)

De acuerdo con lo contemplado en la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace *parte integral del contrato de obras No. 356 de 2021, las actividades relacionadas en el acta* se ejecutan bajo las especificaciones técnicas contractuales, los documentos que se exigen para realizar el cobro del acta parcial No 01 de acuerdo a lo estipulado en el contrato y a las actividades contractuales ejecutadas a la fecha, fue entregada a satisfacción de la Interventoría externa contratada por parte del contratista de obras y remitida a la Secretaría de Obras públicas, con su informe mensual para revisión y tramite pertinente.

De acuerdo al informe mensual el cobro del acta parcial, se encuentra por un porcentaje del 36,28%, según el corte a fecha de 02 de junio de los corrientes, y con fecha de informe del 15 de junio de la presente anualidad, en el cual se encuentra descrito el desarrollo de actividades, con su respectiva pre acta, con sus documentos anexos memorias, registro fotográfico, revisión de los planes, cronograma de obras del tramo en ejecución, y así mismo certifican el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho contrato, tales como Pago de impuesto departamental, acta de compromiso para descuento de los impuestos municipales, y según planillas anexas y certificado se encuentra a paz y salvo con seguridad social y parafiscales

Tal como lo contempla el Contrato en mención se deja constancia que hizo entrega en medio físico de dichos documentos con su respectiva factura de cobro, cuyos originales reposan en la Secretaria de Obras y hacienda municipal respectivamente, por lo que se puede proceder al pago del Acta parcial 01 del periodo comprendido entre el 03 de mayo y el 02 de junio de 2021, por un valor neto a pagar de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 42/100 ($476.240.045,42) M/CTE.

Valledupar, 17 de Junio de 2021

EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA
Secretario de Obras Publicas Municipal

P/Ing. MAYTTORENA BAUTE CASTILLA
Apoyo a la Supervisión de Obras e Interventoría
Sec. de Obras Públicas Municipales

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE OBRA Nº 356-2021

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO (M.R. 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA:
INTEC DE LA COSTA SAS

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

ALCALDE MUNICIPAL:
MELLO CASTRO GONZALEZ

INTERVENTORIA CONTRATADA:
CONSTRUCCIONES SINAI SAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Valledupar-Cesar

JUNIO DE 2021

1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCIÓN:	LOP-003-2021
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA:	INTEC DE LA COSTA SAS
NIT.:	830.502.135–1
REP. LEGAL:	HUGO ARMANDO CANABAL HOYOS
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES SINAI
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO (M.R. 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El presente contrato tiene un valor de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.871.261.640,66) AIU INCLUIDO
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
ACTA DE INICIO	TRES (03) días del mes de MAYO del año Dos Mil Veintiuno (2021).
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	TRES (03) días del mes de MAYO del año Dos Mil Veintiuno (2021).

2. FORMA DE PAGO: UN ANTICIPO DEL 30% Y EL SALDO MEDIANTE ACTAS PÁRCIALES SEGÚN AVANCE DE OBRA

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTAS	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR PAGADO
VR.INICIAL	$ 1.871.261.640,66			
ANTICIPO				$391.058.727,00
ACTA 1		$ 676.914.350,60	$ 203.674.305,18	$476.240.045,42
VR. TOTAL	**$ 1.871.261.640,66**	**$ 676.914.350,60**	$391.058.727,00	

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA SOLICITADAS EN EL CONTRATO.

El contratista aporto la póliza de Seguro de Cumplimiento Nº M-100137445 y de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento Nº M-100024672, expedida por la Compañía Seguros Mundial.

Así:

INICIAL

CONTROL DE POLIZAS		COMPANIA: SEGUROS MUNDIAL.			
ITEM	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.871.261.640,66	VALOR ASEGURADO	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
1	**CUMPLIMIENTO**	**$187.126.164,10**	**M-100137445**	**00:00: Horas Del 25/03/2021**	**24:00: Horas Del 25/11/2021**
2	**BUEN MANEJO DEL ANTICIPO**	**$561.378.492,30**	**M-100137445**	**00:00: Horas Del 25/03/2021**	**24:00: Horas Del 25/11/2021**

3	PRESTACIONES SOCIALES	$374.252.328, 20	M-100137445	00:00: Horas Del 25/03/2021	24:00: Horas Del 25/07/2024
4	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$561.378.492,30	M-100137445	00:00: Horas Del 25/03/2021	24:00: Horas Del 25/07/2026
5	RESPONSABILIDAD CIVIL	$517.859.820,00	M-100024672	00:00: Horas Del 25/03/2021	24:00 Horas Del 25/07/2021

ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO

CONTROL DE POLIZAS		COMPANIA: SEGUROS MUNDIAL.			
ITEM	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.871.261.640,66	VALOR ASEGURADO	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
1	CUMPLIMIENTO	$187.126.164,10	M-100137445	00:00: Horas Del 03/05/2021	24:00: Horas Del 03/01/2022
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$561.378.492,30	M-100137445	00:00: Horas Del 03/05/2021	24:00: Horas Del 03/01/2022
3	PRESTACIONES SOCIALES	$374.252.328, 20	M-100137445	00:00: Horas Del 03/05/2021	24:00: Horas Del 02/09/2024
4	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$561.378.492,30	M-100137445	00:00: Horas Del 03/05/2021	24:00: Horas Del 02/09/2026
5	RESPONSABILIDAD CIVIL	$517.859.820,00	M-100024672	00:00: Horas Del 03/05/2021	24:00 Horas Del 02/09/2021

5. ACTAS SUSCRITAS:

Las actas que a la fecha se han suscrito mediante el presente contrato se relacionan a continuación

ACTA DE INICIO
ACTA DE COMPROMISO DE DESCUENTO DE PAGO DE IMPUESTOS
ACTA PARCIAL 01

6. ACTIDADES REALIZADAS Y PORCENTAJE DE EJECUCION A CORTE DE LA PRESENTE ACTA

En el acta adjunta la cual hace parte integral de este informe, se encuentran detalladas las actividades contratadas por capítulos con su respectivo porcentaje de ejecución de acuerdo al cronograma presentado y a lo contractualmente estipulado.

De acuerdo a lo estipulado en el contrato, el porcentaje de ejecución según la programación ajustada se presenta avance en las obras para el presente cobro parcial del 36,28%, y el mismo acumulado en su porcentaje físico en las obras, por tanto se aclara que en la presente acta se realiza amortización. La Interventoría presenta informe parcial de actividades con fecha 15 de junio de la presente anualidad y de la misma manera certifica el recibo a satisfacción de los trabajos ejecutados mediante el presente contrato.

SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

APOYO: Ing. MAYTTORENA BAUTE CASTILLA
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas Municipales
Junio 17 de 2021

Alcaldía de Valledupar

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO No.:	356 DE 2021	VR. INICIAL CONTRATO	$ 1.871.261.640,66	VR. FINAL CONTRATO	$ 1.871.261.640,66	ACTA No.:	001
		VR. ANTICIPADO	$ 561.378.492,2	MENOR VR.		FECHA:	4-jun -21
CONTRATISTA:	INTEC DE LA COSTA SAS						
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO (M.R. 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTROL DE POLIZAS				COMPAÑIA :	SEGUROS MUNDIAL
		ITEM	VALOR CONTRATO	VALOR ASEGURADO		POLIZA No.:	VIGENCIA
			$ 1.871.261.640,66				DESDE / HASTA
PLAZO:	CUATRO (4) MESES	1,0	Cumplimiento	$ 187.126.164,10		M-100024672	3 de mayo de 2021 / 3 de enero de 2022
FECHA DE INICIO:	03 DE MAYO DE 2021	2,0	Anticipo	$ 561.378.492,2		M-100024672	3 de mayo de 2021 / 3 de enero de 2022
FECHA TERMINACION:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,0	Pago Salarios, prest. sociales	$ 374.252.328,2		M-100024672	3 de mayo de 2021 / 2 de septiembre de 2024
		4,0	Estabilidad de la obra	$ 561.378.492,3		M-100024672	2 de septiembre de 2021 / 2 de septiembre de 2026
		5,0	Responsabilidad civil extracontractual	$ 517.859.820,0		M-100137445	3 de mayo de 2021 / 2 de septiembre de 2021
						INTERVENTORIA:	CONSTRUCCIONES SINAI SAS

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, a los (04) días del mes de junio del año 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, los señores: HUGO ARMANDO CANABAL, Representante Legal INTEC DE LA COSTA en calidad de contratista, el ing VICTOR LOPEZ GALVAN, Representante Legal de CONSTRUCCIONES SINAI en calidad de Interventoria del Contrato, la Ing. MAYTTORENA BAUTE CASTILLA, el Ing. CARLOS DE LA OSSA como apoyo de la supervisión del contrato, el ING. EFRAIN ALFREDOQUINTERO TERNERA, Secretario de Obras Publicas Municipal, Supervisor con el objeto de suscribir la presente ACTA No. 001 DEL CONTRATO DE OBRAS No 356 DE 2021 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO (M.R. 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL," las cuales se relacionan así:

		CONDICIONES ORIGINAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 1			ACUMULADO POR ACTAS			PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA No. 1	CANTIDAD TOTAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUTADO
I	**PRELIMINARES**															
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO EN VIAS URBANAS	M2	8095,50	$ 2.017,00	$ 16.328.615,41		$ 2.017,00	$ -	3058,50	3058,50	$ 6.169.004,38	3058,50	$ 6.169.004,38	3058,50	$ 6.169.004,38	37,78%
1.2	RETIRO SOBRANTES	M3	1603,89	$ 21.365,00	$ 34.262.869,17		$ 21.365,00	$ -	1350,82	1350,82	$ 28.860.252,80	1350,82	$ 28.860.252,80	1350,82	$ 28.860.252,80	84,23%
	SUBTOTAL				$ 50.591.484,58			$ -			$ 35.029.257,18		$ 35.029.257,18		$ 35.029.257,18	69,24%
II	**ALCANTARILLADO**															
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO EN ALCANTARILLADO	ML	730,00	$ 1.877,00	$ 1.370.210,00		$ 1.877,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.2	EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN RETIRO DE ESCOMBRO	M3	817,60	$ 27.205,00	$ 22.242.808,00		$ 27.205,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.3	CORTE CALZADA EN CONCRETO	ML	24,00	$ 6.773,00	$ 162.552,00		$ 6.773,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO E=0,15 A 0,20	M2	8,40	$ 18.956,00	$ 159.230,40		$ 18.956,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.5	RETIRO DE TUBERIA DE 0 A 12" NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	730,00	$ 5.145,00	$ 3.755.850,00		$ 5.145,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.6	RED AGUAS NEGRAS PVC 8" - 200 MM	ML	730,00	$ 65.862,00	$ 48.079.260,00		$ 65.862,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.7	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,5 M DE DIAMETRO EXTERNO MUROS DE 0,15 M DE ALTURA PROMEDIO 2,00 M CONCRETO CLASE II	UN	6,00	$ 2.486.032,00	$ 14.916.192,00		$ 2.486.032,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				$ 90.688.182,40			$ -			$ -		$ -		$ -	0,00%
III	**PAVIMENTO HIDRAULICO**															
3.1	EXCAVACION MANUAL	M3	3154,10	$ 35.202,00	$ 111.030.744,28		$ 35.202,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2	CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINA CALZADA EXISTENTE CARRETERAS	M2	8076,14	$ 582,00	$ 4.700.312,92		$ 582,00	$ -	3462,30	3462,30	$ 2.015.060,70	3462,30	$ 2.015.060,70	3462,30	$ 2.015.060,70	42,87%
3.3	SUB BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1615,23	$ 74.163,00	$ 119.790.139,68		$ 74.163,00	$ -	764,63	764,63	$ 56.707.338,41	764,63	$ 56.707.338,41	764,63	$ 56.707.338,41	47,34%
3.4	CONSTRUCCIÓN DE CALZADA EN CONCRETO PREMEZCLADO E-0,17 M; MR =600 PSI - 42 kg f/cm2 A LA FLEXIÓN, ACELERADO A TRES (3) DIAS INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y BARRA DE AMARRE DE 1/2" CORRUGADO A 1.20 METROS DE SEPARACIÓN, (INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y GANASTILLA DE SOPORTE).	M2	8076,14	$ 139.355,00	$ 1.125.450.355,51		$ 139.355,00	$ -	3443,63	3443,63	$ 479.886.601,43	3443,63	$ 479.886.601,43	3443,63	$ 479.886.601,43	42,64%
3.5	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	ML	4194,00	$ 11.799,00	$ 49.485.006,00		$ 11.799,00	$ -	1336,21	1336,21	$ 15.765.894,59	1336,21	$ 15.765.894,59	1336,21	$ 15.765.894,59	31,86%
3.6	ACERO DE REFUERZO FDR DE 60 000 PSI	KG	3290,68	$ 4.850,00	$ 15.959.784,12		$ 4.850,00	$ -	2122,40	2122,40	$ 10.293.640,00	2122,40	$ 10.293.640,00	2122,40	$ 10.293.640,00	64,50%

ACTA PARCIAL N° 1

		CONTRATO No.:	356 DE 2021			VR. INICIAL CONTRATO	$ 1.871.261.640,66	VR. FINAL CONTRATO	$ 1.871.261.640,66				ACTA No.:	001					
						VR. ANTICIPADO	$ 561.378.492,2	MENOR VR.					FECHA:	4-jun -21					
		CONTRATISTA:	INTEC DE LA COSTA SAS																	
		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO (M.R. 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR		CONTROL DE POLIZAS			COMPAÑIA :	SEGUROS MUNDIAL									
							VALOR CONTRATO	VALOR ASEGURADO		POLIZA No.:	VIGENCIA									
						ITEM	$ 1.871.261.640,66				DESDE				HASTA					
		PLAZO:	CUATRO (4) MESES			1,0	Cumplimiento	$ 187.126.164,10		M-100024672	3 de mayo de 2021				3 de enero de 2022					
		FECHA DE INICIO:	03 DE MAYO DE 2021			2,0	Anticipo	$ 561.378.492,2		M-100024672	3 de mayo de 2021				3 de enero de 2022					
		FECHA TERMINACION:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021			3,0	Pago Salarios, prest sociales	$ 374.252.328,2		M-100024672	3 de mayo de 2021				2 de septiembre de 2024					
						4,0	Estabilidad de la obra	$ 561.378.492,3		M-100024672	2 de septiembre de 2021				2 de septiembre de 2026					
						5,0	Responsabilidad civil extracontractual	$ 517.859.820,0		M-100137445	3 de mayo de 2021				2 de septiembre de 2021					
	Alcaldía de Valledupar										INTERVENTORIA:				CONSTRUCCIONES SINAI SAS					
	SUBTOTAL				$ 1.439.416.343,71			$ -			$ 864.668.836,13			$ 864.668.836,13			$ 864.668.836,13	39,59%	
IV	BORDILLOS Y ANDENES																			
4.1	EXCAVACION MANUAL	M3	175,50	$ 27.649,00	$ 4.852.476,38		$ 27.649,00	$ -	105,58	105,58	$ 2.919.163,72	105,58	$ 2.919.163,72	105,58	$ 2.919.163,72	60,16%				
4.2	BORDILLOS DE .15X.15, CONCRETO 3.000 PSI-INCL. 3.72 KG DE REFUERZO EN ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.15	ML	3656,31	$ 38.539,00	$ 140.910.451,40		$ 38.539,00	$ -	933,91	933,91	$ 35.992.034,57	933,91	$ 35.992.034,57	933,91	$ 35.992.034,57	25,54%				
4.3	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	419,40	$ 47.482,00	$ 19.913.950,80		$ 47.482,00	$ -	104,04	104,04	$ 4.940.027,28	104,04	$ 4.940.027,28	104,04	$ 4.940.027,28	24,81%				
4.4	ANDENES EXP. 0.07 MTS EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C=3.000 PSI	M2	2925,05	$ 39.763,00	$ 116.308.617,84		$ 39.763,00	$ -	799,61	799,61	$ 31.794.844,71	799,61	$ 31.794.844,71	799,61	$ 31.794.844,71	27,34%				
	SUBTOTAL				$ 281.985.496,42			$ -			$ 648.314.069,43		$ 78.646.070,29		$ 75.646.070	26,83%				
V	OBRAS COMPLEMENTARIAS.																			
5.1	TAPA Y ARO BASE EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C=3.000 PSI PARA POZO DE INSPECCIÓN. JUNTA DE INSONORIZACIÓN EN POLIETILENO.	UN	10,00	$ 446.311,00	$ 4.463.110,00		$ 446.311,00	$ -	8,00	8,00	$ 3.570.488,00	8,00	$ 3.570.488,00	8,00	$ 3.570.488,00	80,00%				
5.2	LINEA DEMARCACION DISCONTINUA PINTURA TRAFICO TIPO 1 A= 07, INCL. MANO DE OBRA.	ML	699,00	$ 2.855,00	$ 1.995.645,00		$ 2.855,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%				
5.3	MARCA VIAL PINTURA TRAFICO	M2	360,00	$ 23.114,00	$ 8.321.040,00		$ 23.114,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%				
5.4	PINTURA DEMARCACION EN BORDILLOS	ML	877,51	$ 5.362,00	$ 4.705.229,55		$ 5.362,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%				
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .60 x .60 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UN	10,00	$ 209.719,00	$ 2.097.190,00		$ 209.719,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%				
	SUBTOTAL				$ 21.582.214,55			$ -			$ 716.811.988,00		$ 3.570.488,00		$ 3.570.488,00	16,54%				
TOTAL COSTO NETO					$ 1.871.261.640,66			$ -					$ 676.914.380,60		$ 676.914.380,60	36,28%				
AMORTIZACION ANTICIPO		30,09%											$ 203.674.365,18							
TOTAL A PAGAR													$ 476.240.045,42							

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOSCON 42/100 MCTE.

HUGO ARMANDO CAMARAL
REP. LEGAL INTEC DE LA COSTA
CONTRATISTA

EFRAIN QUINTERO TERNERA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VICTOR LOPEZ GALVANI
REP. LEGAL CONSTRUCCIONES SINAI SAS
INTERVENTOR

CARLOS DE LA OSSA
SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

MAYTTORENA BAUTE CASTILLA
APOYO SUPERVISIÓN SECRETARIA DE OBRAS
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	VALLEDUPAR EN ORDEN

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE VALLEDUPAR

CERTIFICA:

Que el **Señor HUGO CANABAL HOYOS**, identificado con **C.C. No. 10.932.959,** Representante legal **INTEC DE LA COSTA SAS**, entregó a satisfacción la documentación requerida correspondiente al Contrato de Obras No. **356 DE 2021,** cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO (M.R. 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR**. fueron entregadas a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, con el fin de realizar el cobro del acta parcial 01, de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Que la Cláusula Cuarta de dicho Contrato establece los requisitos para el pago del anticipo, actas parciales y acta final.

Que el contratista aportó los documentos enunciados en el citado contrato para el pago del Acta parcial 01, del periodo comprendido del 03 de Mayo al 02 de junio de 2021, tales como copia del acta, preacta de obra, informe de interventoría con registro fotográfico, certificación y constancia sobre pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales, factura, póliza, entre otros.

El interventor del Contrato aportó a esta Secretaría certificación en la que indica que el contratista presentó a entera satisfacción de la interventoría el informe de avance y ejecución del contrato de obras No 356-2021, con fecha de 15 de junio de 2021, así mismo, se constató el pago del Impuesto Departamental, INDUPAL y Estampilla Pro Universidad, y para los Impuestos Municipales tales como Estampilla Pro anciano y Pro cultura, el contratista suscribió acta de compromiso según decreto 00310 del 28 de febrero de 2019.

Que el SUPERVISOR del contrato, previa verificación de los documentos aportados, certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato 356 de 2021, para el pago del Acta Parcial 01, del periodo comprendido entre el 03 de mayo y el 02 de junio de 2021, por un valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 22/100 ($476.240.045,42) M/CTE.

Para constancia. se firma la presente Certificación. en Valledupar, Cesar, a los Diecisiete (17) días del mes de junio de 2021.

EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA
Secretario de Obras Públicas Municipal

Revisó:	Aprobó:
ING. MAYTTORENA BAUTE CASTILLA/CARLOS DE LA OSSA **Profesionales de Apoyo**	ING. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA Secretario de Obras Públicas

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 356 de 2021

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO (MR 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATANTE: ALCALDIA DE VALLEDUPAR

CONTRATISTA: INTEC DE LA COSTA SAS.

PERIODO: 03 MAYO A 02 DE JUNIO DE 2021

INFORME TECNICO ACTA PARCIAL 1

PERIODO: Del 3 de mayo hasta 02 de junio de 2021

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO (MR 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATO DE OBRA No. 356 DE 2021

INTEC DE LA COSTA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORA No. 363 DE 2021

CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
2.1.	LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	6
2.2.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	8
3	ASPECTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL	9
3.1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	9
3.2.	ESTADO DE POLIZAS	10
3.3.	SUBCONTRATISTA	10
3.3.1.	MANO DE OBRA	10
3.4.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11
3.4.1.	MANO DE OBRA CALIFICADA	11
3.4.2.	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	11
3.5.1.	MANO DE OBRA CALIFICADA	11
3.5.2.	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	11
3.6.	MANEJO DE AMQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS EN LA OBRA	12
3.7.	MANEJO DE ANTICIPO	12
3.7.1.	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	12
4	ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN, RE-INICIO	13
4.1.	COMITÉ DE OBRA Y REUNIONES	13
4.2	CORRESPONDENCIA	14
4.2.1.	CORRESPONDENCIA ENVIADA	14
4.2.2.	CORRESPONDENCIA RECIVIDA	14
5	ASPECTO FINANCIERO	14
5.1.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	14
5.2.	AVANCE DE OBRA	16
6	CONCLUSIONES	16
7	ANEXOS	17
7.1.	ANEXO N°1.REGISTRO FOTOGRAFICO	17

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información General del contrato. **Fuente.** Contrato de Obra No. 356 de 2021. ...9
Tabla 2. Estado de pólizas. **Fuente.** Documento Pólizas. 10
Tabla 3. Subcontratista Mano de obra. 10
Tabla 6. Personal administrativo social. 11
Tabla 7. Plan de inversión del Anticipo contratista. 12
Tabla 8. Correspondencia Enviada INTEC de la costa. 14
Tabla 9. Correspondencia Recibida INTEC de la costa. 14
Tabla 11. Cantidades realizadas durante el periodo de 3 Mayo – 31 Mayo de 2021. 15

LISTA DE ILUSTRACIÓN

Ilustración 1. *Localización Valledupar (Cesar).* ***Fuente.*** *Google Maps.* 7
Ilustración 2. *Localización del Proyecto.* ***Fuente.*** *Propia.*.....8
Ilustración 3. Localización y replanteo con equipos en vía urbana. 17
Ilustración 4. Retiro de sobrantes.....17
Ilustración 5. Conformación y nivelación de terreno.....18
Ilustración 6. Sub base granular.....18
Ilustración 7. Concreto premezclado mr 43. 19
Ilustración 8. Junta de dilatación con sello elastomerico 20
Ilustración 9. Acero de refuerzo.....20
Ilustración 10. Excavación manual.....21
Ilustración 11. Bordillo de 0,15 x 015 concreto de 3000 psi. 21
Ilustración 12. Andenes exp 0,07en concreto 22

LISTA DE GRAFICOS

Grafico 1. Plan de Inversión del Anticipo Contratista. 13

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de Valledupar a través de la secretaria general inicia el proceso de contratación bajo la modalidad de licitación pública **LOP-0003-2020**, la cual mediante Resolución Municipal No.2056 del 03 de diciembre del 2020, resuelve adjudicar el contrato que tiene por objeto "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO (MR 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR". al contratista **INTEC DE LA COSTA S.A.S** representado legalmente por HUGO ARMANDO CANABAL HOYOS **CC. N° 10.932.959 por valor de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 66 CENTAVOS M/CTE ($1.871.261.640.66) INCLUIDO AIU.**

El presente documento corresponde al Informe mensual No.1 de actividades correspondiente al periodo del 03 de mayo hasta el 02 de junio de 2021; este informe contiene toda la información necesaria para que la interventoría pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones en lo relativo a la ejecución física, siendo esto una parte de las obligaciones contractuales de INTEC DE LA COSTA S.A.S. adquiridas bajo el contrato de Obra No. 356 de 2021 con el Municipio de Valledupar.

Este informe mantiene un esquema de organización de acuerdo al orden en que se tratan los temas durante los comités de seguimiento, se presenta el avance de obra, aspectos técnicos, de calidad de obra y seguridad Industrial.


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto comprende la rehabilitación y reparación de la malla vial de Valledupar, El municipio de Valledupar busca con este proyecto potenciar la funcionalidad para el tránsito vehicular por las diferentes vías de traslado hacia los diferentes puntos de la ciudad permitiendo mejorar el tiempo de traslado y las condiciones seguras de los transeúntes.

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Municipio de Valledupar, se encuentra ubicado 10° 29' de latitud Norte y 73° 15' de longitud Oeste. Limitada al Norte con los departamentos de Magdalena y la Guajira; al Sur con los municipios de San Diego, La Paz y el Paso; al Este con la Guajira y los municipios de San Diego y la Paz y por el Oeste con el Magdalena y los municipios de Bosconia y el Copey.


Ilustración 1. *Localización Valledupar (Cesar).* ***Fuente.*** *Google Maps.*

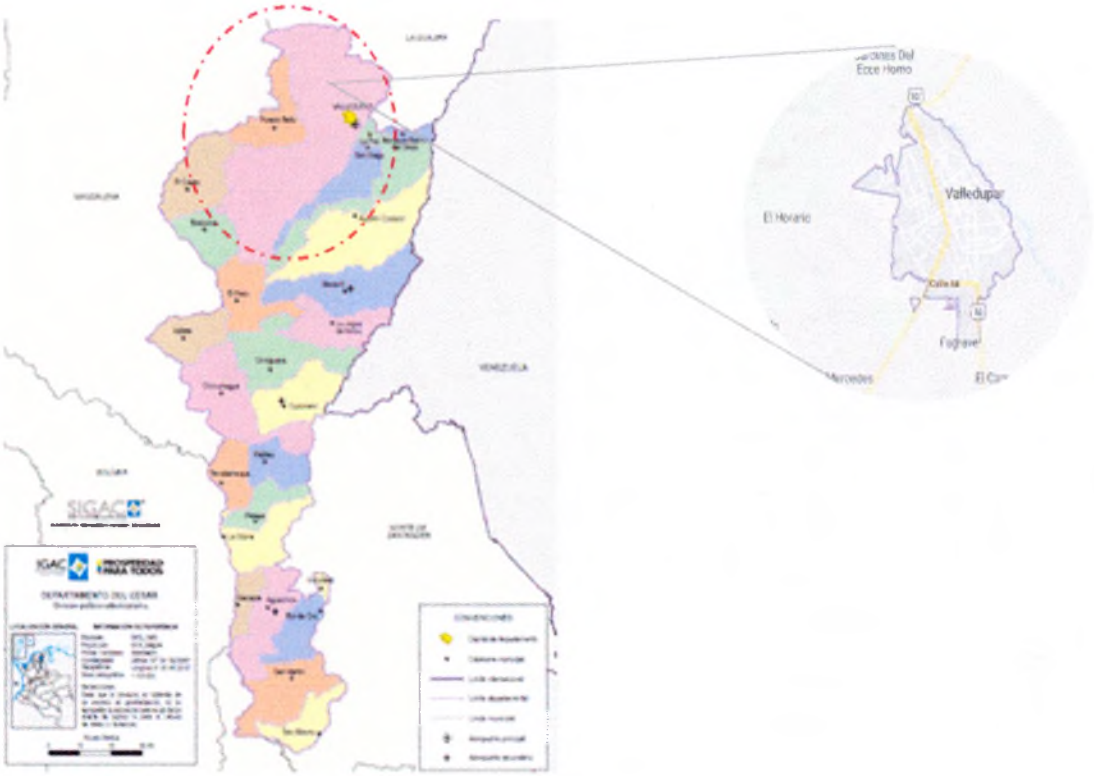

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO (MR 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Ilustración 2. *Localización del Proyecto.* ***Fuente.*** *Propia.*

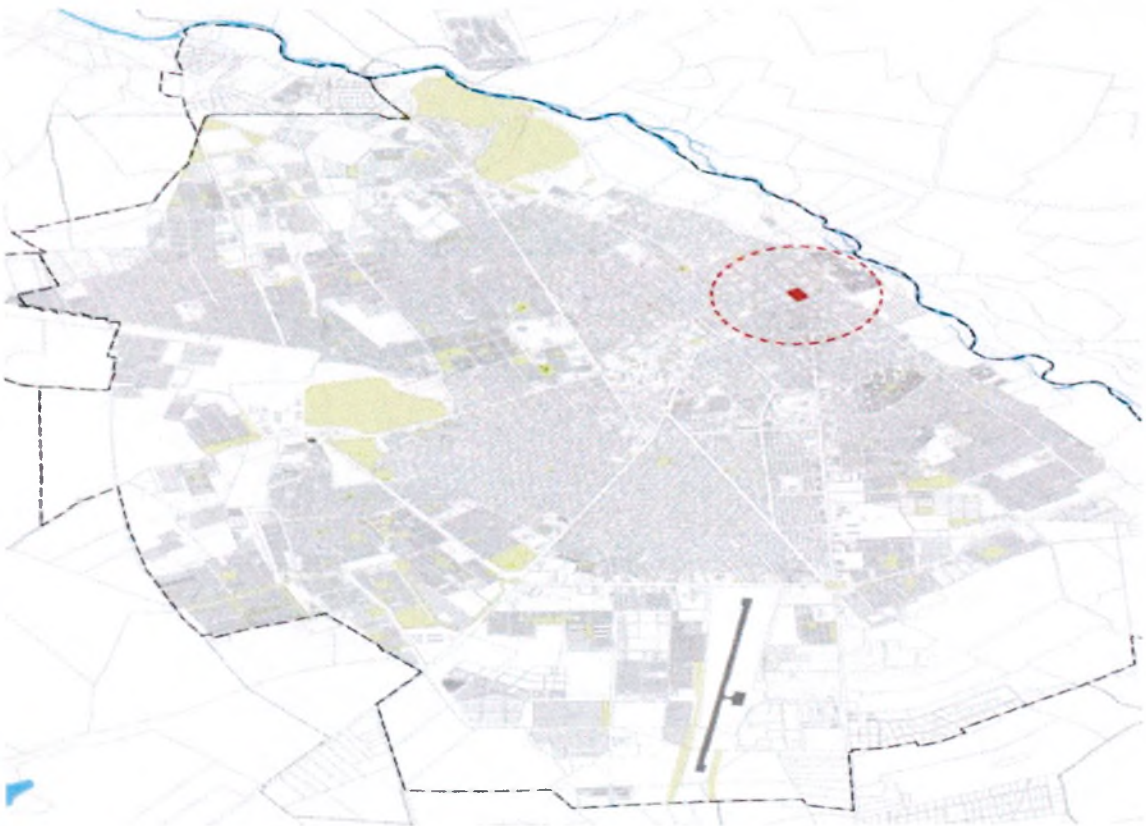

3. ASPECTO ADMINISTRATIVO Y LEGALES

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1. Información General del contrato. ***Fuente.*** *Contrato de Obra No. 356 de 2021.*

CONTRATO DE OBRA	356 DE 2021
OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO (MR 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	INTEC DE LA COSTA S.A.S.
VALOR	MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/C ($**1.871.261.640.66**) INCLUIDO AIU.
ANTICIPO	QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 19 CENTAVOS M/CTE ($561.378.492.19)
PÒLIZAS	Cumplimiento
	Buen Manejo de Anticipo
	Salario y Prestaciones. Sociales
	Estabilidad y calidad de la obra
	Responsabilidad Civil Extracontractual
DURACIÓN	04 MESES
FECHA DE INICIO	TRES (3) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACION	DOS (2) DE SEPTIEMBRE DE 2021
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S

3.2. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

Las correspondientes pólizas fueron aprobadas mediante resolución No. 1220 y 221.

Tabla 2. Estado de pólizas. ***Fuente.*** *Documento Pólizas CONFIANZA.*

CONTROL DE PÓLIZAS			COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL		
ÍTEM	AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
1	Cumplimiento del contrato	$ 187.126.164,10	M-100137445	03/05/2021	03/01/2022
2	Buen Manejo de Anticipo	$ 561.378.492,30	M-100137445	03/05/2021	03/01/2022
3	Salario, Prestaciones Sociales	$ 374.252.328,20	M-100137445	03/05/2021	02/09/2024
4	Estabilidad y calidad de la obra	$ 561.378.492,30	M-100137445	02/09/2021	02/09/2026
5	Responsabilidad Civil	$ 517.859.820	M-100024672	03/05/2021	02/09/2021

3.3. SUBCONTRATISTAS

Posteriormente se mencionarán los datos específicos del personal que se verá implicado directamente en los procesos de la obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO (MR 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.

3.3.1. MANO DE OBRA

Tabla 3. Subcontratista Mano de obra.

SUBCONTRATISTA MANO DE OBRA	
NOMBRE	NIT
CONSTRUCCIONES EAR S.A.S	79.767.964-4

3.4. PERSONAL ADMINISTRATIVO

INTEC DE LA COSTA S.A.S cuenta con personal administrativo idóneo requerido de acuerdo a los compromisos contractuales.

3.4.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

Durante este periodo del 3 de mayo al 02 de junio de 2021 para llevar a cabo cada una de las actividades programadas se necesitó del siguiente personal idóneo de mano de obra calificada.

Tabla 4. *Personal administrativo social.*

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Director de Obra	DARIO JOSE PEINADO ACOSTA	50%
Residente de Obra	ANIBAL HERRON	100%

Director de obra, Residente de obra, comisión de topografía (topógrafo y cadenero) maestro de obra, operador de Mini Cargador, conductores de doble troques y volquetas sencilla, operador de vibro compactador.

3.4.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Durante este periodo para llevar a cabo cada una de las actividades programadas se necesitó del siguiente personal idóneo de mano de obra no calificada.

Ayudantes de obra tres (3) para señalización provisional excavación mecanizada, retiro de materiales sobrantes, oficial y ayudantes para fundida de concreto (20), paleteros Cuatro (4),

3.5.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

Director de obra, Residente de obra, Inspector de Obra, comisión de topografía (topógrafo y cadenero) maestro de obra, operador mini cargador, conductores de doble troques y volquetas sencillas, operador de vibro compactador.

3.5.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudantes de obra tres (3) para mantenimiento del cerramiento provisional, demoliciones manuales, retiro de materiales sobrantes, oficial y ayudantes para figuración de hierro seis (6), oficial y ayudantes para hechura y colocación de

concretos ocho (8), oficial y ayudantes para excavaciones manuales, celador nocturno.

3.6. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS, Y EQUIPOS EN LA OBRA.

Se hizo uso de las siguientes herramientas para las actividades realizadas durante este periodo:

- Un (1) Vibrador de concreto
- Una (1) cortadora de pavimento
- Una (1) pajarita CAT 416
- Un (3) Mini cargador Caterpillar
- Herramienta menor: Tronzadora, mona, martillo demoledor, palas, picos, barra de punta y pala, carretillas, etc.

3.7. MANEJO DEL ANTICIPO

3.7.1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Por parte de la entidad contratante se le entregara al Consorcio Rehabilitación Valledupar HS un anticipo por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTESIETE PESOS CON 30 CENTAVOS M/CTE ($561.378.492.19), correspondientes al 30% del valor total del contrato N°356 de 2021. Los recursos del anticipo que otorgara la entidad contratante serán invertidos acorde al plan de inversión de anticipo aprobado por el contratante según se detalla a continuación.

Al respecto el Contratista presentó el Plan de Inversión del Anticipo, y fue aprobado con visto bueno de la Interventoría por estar acorde con los gastos del contrato.


Tabla 5. *Plan de inversión del Anticipo contratista.*

CONTRATO No. :	959 de 2020
VALOR:	$ 1.871261640.66
CONTRATISTA:	INTEC DE LA COSTA S.A.S
INTERVNTOR:	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO :	$ 561.378.492.19

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales	$ 31.284.698.18	8.00%
2	Compra de Materiales y Accesorios	$ 332.399.918.21	85.00%
3	Alquiler de maquinaria, equipos, herramientas	$ 27.374.110.91	7.00%
TOTAL		$ 391.058.727.30	100%

Grafico 1. *Plan de Inversión del Anticipo Contratista.*

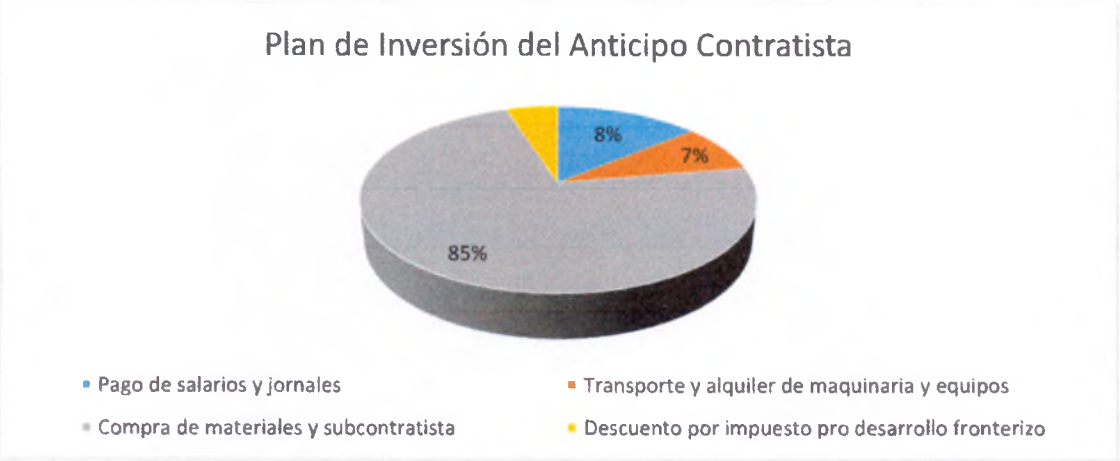

4. ACTAS DE INICIO, SUSPENCIÓN, REINICIO Y COMITÉ DE OBRAS

El día tres (03) del mes de mayo de 2021 se suscribió el Acta de Inicio del Contrató No. 356 de 2021.

Hasta la fecha no se han registrado actas de suspensión o reinicio para el Contrató No 356 de 2021.

4.1. COMITES DE OBRA Y REUNIONES

El miércoles 16 y miércoles 30 de enero de 2019 se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Valledupar el **comité de obra**, donde se trató como tema general la programación de obra, espejo de agua y fuente, empalme con proyecto de redes húmedas, reunión con proveedores.

4.2. CORRESPONDENCIA

4.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 6. Correspondencia Enviada

No. De oficio	ASUNTO	FECHA
Intec-2021-001	Radicado ante secretaria de transporte municipal de plan de manejo de tránsito para aprobación.	21-04-2021

4.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 7. Correspondencia Recibida

No. De oficio	ASUNTO	FECHA

5. ASPECTO FINANCERO

5.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Durante el periodo que comprende desde 03 de mayo de 2021 al 02 de junio de 2021, se han realizado las siguientes actividades en obra:

INTEC DE LA COSTA S.A.S	**INFORME MENSUAL No1** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E=17 CM, EN CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO (MR 4.2 Mpa) EN DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 03 A 31 DE MAYO DE 2021

I	PRELIMINARES					PRESENTE ACTA	
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO EN VIAS URBANAS	M2	8095,50	$ 2.017,00	$ 16.328.615,41	3058,50	$ 6.169.004,38
1.2	RETIRO SOBRANTES	M3	1603,69	$ 21.365,00	$ 34.262.869,17	1350,82	$ 28.860.252,80
II	ALCANTARILLADO						
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO EN ALCANTARILLADO	ML	730,00	$ 1.877,00	$ 1.370.210,00		$ -
2.2	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE ESCOMBRO	M3	817,60	$ 27.205,00	$ 22.242.808,00		$ -
2.3	CORTE CALZADA EN CONCRETO	ML	24,00	$ 6.773,00	$ 162.552,00		$ -
2.4	DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO E=0,15 A 0,20	M2	8,40	$ 18.956,00	$ 159.230,40		$ -
2.5	RETIRO DE TUBERIA DE 0 A 12" NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	730,00	$ 5.145,00	$ 3.755.850,00		$ -
2.6	RED AGUAS NEGRAS PVC 8" - 200 MM	ML	730,00	$ 65.862,00	$ 48.079.260,00		$ -
2.7	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,5 M DE DIAMETRO EXTERNO MUROS DE 0,15 M DE ALTURA PROMEDIO 2,00 M CONCRETO CLASE II	UN	6,00	$ 2.486.032,00	$ 14.916.192,00		$ -
III	PAVIMENTO HIDRAULICO						
3.1	EXCAVACION MANUAL	M3	3154,10	$ 35.202,00	$ 111.030.744,28		$ -
3.2	CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINA CALZADA EXISTENTE CARRETERAS	M2	8076,14	$ 582,00	$ 4.700.312,92	3462,30	$ 2.015.060,70
3.3	SUB BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1615,23	$ 74.163,00	$ 119.790.139,88	764,63	$ 56.707.338,41
3.4	CONSTRUCCION DE CALZADA EN CONCRETO PREMEZCLADO E-0,17 M; MR =600 PSI - 42 kg.f/cm2 A LA FLEXIÓN, ACELERADO A TRES (3) DIAS INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y BARRA DE AMARRE DE 1/2" CORRUGADO A 1.20 METROS DE SEPARACIÓN, (INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y CANASTILLA DE SOPORTE).	M2	8076,14	$ 139.355,00	$ 1.125.450.355,51	3443,63	$ 479.886.601,43
3.5	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM INCL. CORTE	ML	4194,00	$ 11.799,00	$ 49.485.006,00	1336,21	$ 15.765.894,59
3.6	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	3290,68	$ 4.850,00	$ 15.959.784,12	2122,40	$ 10.293.640,00
IV	BORDILLOS Y ANDENES						
4.1	EXCAVACION MANUAL	M3	175,50	$ 27.649,00	$ 4.852.476,38	105,58	$ 2.919.163,72
4.2	BORDILLOS DE .15X.15, CONCRETO 3.000 PSI-INCL. 3.72 KG DE REFUERZO EN ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.15	ML	3656,31	$ 38.539,00	$ 140.910.451,40	933,91	$ 35.992.034,57
4.3	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	419,40	$ 47.482,00	$ 19.913.950,80	104,04	$ 4.940.027,28
4.4	ANDENES EXP. 0.07 MTS EN CONCRETO PREMEZCLADO PC=3.000 PSI	M2	2925,05	$ 39.763,00	$ 116.308.617,84	799,61	$ 31.794.844,71
V	OBRAS COMPLEMENTARIAS.						
5.1	TAPA Y ARO BASE EN CONCRETO PREMEZCLADO PC=3.000 PSI PARA POZO DE INSPECCIÓN. JUNTA DE INSONORIZACIÓN EN POLIETILENO.	UN	10,00	$ 446.311,00	$ 4.463.110,00	8,00	$ 3.570.488,00
5.2	LINEA DEMARCACION DISCONTINUA PINTURA TRAFICO TIPO 1 A=.07, INCL. MANO DE OBRA	ML	699,00	$ 2.855,00	$ 1.995.645,00		$ -
5.3	MARCA VIAL PINTURA TRAFICO	M2	360,00	$ 23.114,00	$ 8.321.040,00		$ -
5.4	PINTURA DEMARCACION EN BORDILLOS	ML	877,51	$ 5.362,00	$ 4.705.229,55		$ -
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES DE TRANSITO DE .60 x .60 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UN	10,00	$ 209.719,00	$ 2.097.190,00		$ -
					$1.871.261.640,66		$678.914.350,60
					% EJECUTADO		36,28%

5.2. AVANCE DE OBRA

El informe financiero se realizó con base a los Costos directos más AIU, del cual se tiene que, a la fecha de corte del presente periodo, se registra un avance de obra de 36,28 % estimando un avance financiero de $ 678.914.350,60, del cual se refleja el acta parcial de obra N°1.

6. CONCLUSIONES

Las actividades realizadas durante este periodo se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones presentadas con la entidad contratante.

Hasta la fecha se tiene un total de costos de $678.914.350.60 para periodo de 03 mayo al 02 de junio de 2021. Con un avance de obra del 36.28%.
