REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

INFORME SEMANAL No. 22

29-03-2021 al 03-04-2021



Bogotá 5-04-2021


RELACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	701-2020
PLAZO INICIAL:	6 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0
VALOR INICIAL:	894.285.952.00
VALOR ADICIÓN(ES):	0
VALOR ACTUALIZADO:	$-
VALOR ANTICIPO:	0
VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	695--2020
PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0
VALOR INICIAL:	3.728.543.252,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$-
VALOR ACTUALIZADO:	$-
VALOR ANTICIPO:	$-
VALOR POR PAGAR:	$-
INTERVENTOR:	GONZALO LIÉVANO HOYOS -INPLAYCO S.A.S.


4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA
CIUDAD BOLÍVAR
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
RENUNCIAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
USAQUÉN
BARRIO O TERRITORIO: Buenavista – Cerros del norte – Urbanización santa Cecilia
No se realizaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SANTA FE
BARRIO O TERRITORIO: Laches – El consuelo
RENUNCIAS
en el transcurso de esta semana no se presentó ninguna renuncia
PQRS
NO SE PRESENTARON
SUBA
BARRIO O TERRITORIO: Bilbao segundo sector
RENUNCIAS
en el transcurso de esta semana no se presentó ninguna renuncia
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
RAFAEL URIBE URIBE


BARRIO O TERRITORIO: Las lomas – El mirador sur – Puerto rico
RENUNCIAS
en el transcurso de esta semana no se presentó ninguna renuncia
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
PAC
Se realiza atención a la comunidad en el PAC ubicado en la calle 67c sur # 18p - 51 Juan Pablo II; Los días: Martes: 8:30 am a 12:00 pm Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm Sábados: 8:30 a 12:00 pm Donde se atendieron a algunos beneficiarios para preguntar como postulasen a los subsidios y la dirección de la Secretaria de Hábitat.
HISTORIAS DE VIDA
Ø MVCB_3413 Se realiza acompañamiento al componente de comunicaciones, con el fin de desarrollar el video de Historia de vida. Durante el ejercicio se destaca el empoderamiento de la mujer que prioriza el crecimiento académico como herramienta para el logro del bienestar de ella y su familia; en consecuencia, el mejoramiento habitacional pasa a un segundo plano. Durante la entrevista la beneficiaria refiere el cambio no solo a nivel de imagen, sino sus alcances a nivel motivacional y de salud. Ø MVCB_2753 Se realiza acompañamiento al componente de comunicaciones, con el fin de desarrollar el video de Historia de vida. Durante el ejercicio se destaca la lucha por sobrevivir con los hijos en una ciudad que los recibe en su estado de víctimas del conflicto armado por desplazamiento, donde sus recursos se priorizan para la alimentación. Obtiene la casa en obra negra a través del subsidio de desplazamiento otorgado por el estado, sin adecuaciones posteriores ya que el recurso obtenido en las ventas informales les alcanza escasamente para las necesidades básicas de alimentación, vestido, educación y pago de servicios.
BARRIO O TERRITORIO
JUAN PABLO II
HISTORIAS DE VIDA
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANOMALÍAS

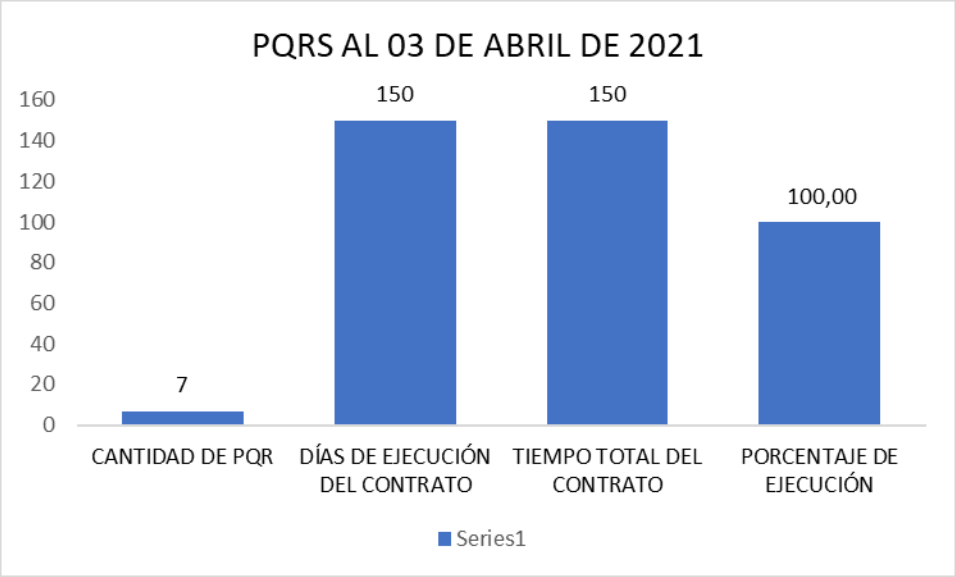

PQRS AL 03 DE ABRIL DE 2021
160
140
120
100
80
60
40
20
0
7
150
150
100,00
CANTIDAD DE PQR
DÍAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Series1


VALOR PROGRAMADO VS VALOR EJECUTADO
MVCE_2106 100% $11.748.700 $ 11.748.699,70
MVCE_1034 100% $11.825.270 $ 11.825.269,90
MVCE_0125 100% $11.665.072 $ 11.665.071,80
MVBV_0890 100% $11.067.363 $ 11.067.363,10
MVBV_0519 100% $11.300.988 $ 11.300.988,00
MVBV_0741 100% $11.302.045 $ 11.302.044,50
MV_0022 100% $11.002.040 $ 11.002.039,70
MVTB_0568 100% $10.894.440 $ 10.894.439,50
MVTB_3843 100% $11.724.350 $ 11.724.350,00
MVTB_4354 100% $11.815.773 $ 11.815.773,40
MVCA_2132 100% $11.734.923 $ 11.734.923,00
MVCA_1783 100% $11.732.660 $ 11.732.659,90
MVCA_4231 100% $11.163.140 $ 11.163.140,40
MVCA_4516 100% $11.654.328 $ 11.654.328,30
MVCA_3842 100% $11.822.747 $ 11.822.746,90
MVPR_0111 100% $11.818.868 $ 11.818.867,50
MVLO_419 100% $10.067.534 $ 10.067.533,80
MV_077IN 100% $11.752.340 $ 11.752.339,60
MV_600 100% $10.999.306 $ 10.999.306,40
MV_586 100% $11.825.446 $ 11.825.445,50
MV_356 100% $11.821.855 $ 11.821.854,70
MVCB_3326 100% $11.520.454 $ 11.520.453,90
MVCB_3336 100% $11.514.777 $ 11.514.777,10
MVCB_3332 100% $11.735.321 $ 11.735.320,70
MVCB_3315 100% $11.742.222 $ 11.742.221,70
MVCB_3323 100% $10.472.893 $ 10.472.892,70
MVCB_4766 100% $7.265.727 $ 7.265.727,40
MVCB_4768 100% $10.689.357 $ 10.689.356,80
MVCB_3151 100% $11.677.985 $ 11.677.985,10
MVCB_3148 100% $11.827.703 $ 11.827.703,40
MVCB_4806 100% $10.590.307 $ 10.590.307,00
MVCB_4790 100% $11.829.325 $ 11.829.325,30
MVCB_4792 100% $11.826.873 $ 11.826.872,60
MVCB_4799 100% $11.553.783 $ 11.553.782,50
MVCB_4796 100% $11.529.818 $ 11.529.818,10
MVCB_3145 100% $11.822.320 $ 11.822.319,80
MVCB_3144 100% $11.757.881 $ 11.757.880,70
MVCB_3043 100% $10.947.093 $ 10.947.092,80
MVCB_3039 100% $11.817.879 $ 11.817.878,50
MVCB_2373 100% $10.644.069 $ 10.644.068,80
MVCB_2377 100% $9.871.969 $ 9.871.968,70
MVCB_3052 100% $11.829.270 $ 11.829.270,20
MVCB_2358 100% $10.833.284 $ 10.833.284,30
MVCB_2359 100% $11.442.452 $ 11.442.451,60
MVCB_2360 100% $8.168.896 $ 8.168.895,50
MVCB_2347 100% $10.663.766 $ 10.663.766,00
MVCB_2346 100% $11.713.338 $ 11.713.338,30
MVCB_2270 100% $11.827.990 $ 11.827.989,80
MVCB_2275 100% $10.617.364 $ 10.617.364,30
MVCB_2221 100% $11.799.446 $ 11.799.445,60
MVCB_2238 100% $9.776.871 $ 9.776.870,90
MVCB_2234 100% $11.680.751 $ 11.680.750,70
MVCB_2284 100% $11.102.867 $ 11.102.866,80
MVCB_2288 100% $11.468.527 $ 11.468.527,40
MVCB_2287 100% $9.632.687 $ 9.632.686,90
MVCB_2350 100% $11.810.836 $ 11.810.836,20
MVCB_4818 100% $11.371.974 $ 11.371.973,70
MVCB_2337 100% $11.809.755 $ 11.809.754,50
MVCB_2292 100% $11.800.788 $ 11.800.788,20
MVCB_2297 100% $11.100.811 $ 11.100.811,10
MVCB_4881 100% $11.544.534 $ 11.544.533,80
MVCB_4860 100% $10.961.083 $ 10.961.083,30


MVCB_4863
100%
$11.743.967
$ 11.743.967,20
MVCB_4862
100%
$11.804.917
$ 11.804.912,00
MVCB_4847
100%
$11.803.646
$ 11.803.645,60
MVCB_3835
100%
$11.729.807
$ 11.729.807,40
MVCB_3813
100%
$11.601.862
$ 11.601.862,90
MVCB_3751
100%
$11.596.783
$ 11.596.782,60
MVCB_3821
100%
$11.702.733
$ 11.702.732,90
MVCB_3825
100%
$11.746.769
$ 11.746.769,10
MVCB_3869
100%
$11.475.278
$ 11.475.278,30
MVCB_3810
100%
$9.712.217
$ 9.712.216,90
MVCB_3867
100%
$11.204.835
$ 11.204.834,80
MVCB_3866
100%
$8.562.373
$ 8.562.372,60
MVCB_3865
100%
$11.680.358
$ 11.680.357,70
MVCB_3803
100%
$11.800.743
$ 11.800.742,60
MVCB_3835
100%
$11.684.560
$ 11.684.560,10
MVCB_3817
100%
$11.825.403
$ 11.825.402,50
MVCB_3858
100%
$10.758.997
$ 10.758.996,80
MVCB_3859
100%
$11.827.599
$ 11.827.598,50
MV_0979
100%
$11.716.112
$ 11.716.112,20
MV_0989
100%
$11.665.644
$ 11.665.643,50
MV_1007
100%
$11.736.926
$ 11.736.925,80
MV_2167
100%
$11.345.233
$ 11.345.233,10
MV_0833
100%
$10.532.167
$ 10.532.166,70
MV_0749
100%
$10.034.155
$ 10.034.154,70
MV_0974
100%
$11.823.164
$ 11.823.163,90
MV_0964
100%
$11.675.007
$ 11.675.007,00
MV_0963
100%
$9.791.983
$ 9.791.983,00
MV_0923
100%
$11.747.763
$ 11.747.763,20
MV_0940
100%
$11.622.062
$ 11.622.062,40
MV_0970
100%
$10.579.067
$ 10.579.067,60
MV_1048
100%
$10.728.843
$ 10.728.843,10
MV_3543
100%
$11.825.394
$ 11.825.393,80
MV_3510
100%
$9.088.554
$ 9.088.554,30
MV_3509
100%
$11.825.464
$ 11.825.464,10
MV_3507
100%
$11.823.894
$ 11.823.893,70
MV_3490
100%
$10.971.484
$ 10.971.484,10
MV_3482
100%
$11.467.837
$ 11.467.836,90
MV_3473
100%
$9.858.823
$ 9.858.823,00
MV_3463
100%
$10.954.940
$ 10.954.939,50
MV_2751
100%
$11.218.598
$ 11.218.597,60
MV_2743
100%
$11.254.172
$ 11.254.171,70
MV_2738
100%
$11.679.196
$ 11.679.195,90
MV_2715
100%
$10.514.714
$ 10.514.713,60
MV_2735
100%
$11.054.336
$ 11.054.335,80
MV_2731
100%
$11.425.874
$ 11.425.873,70
MV_2714
100%
$9.162.952
$ 9.162.951,70
MV_2726
100%
$11.795.111
$ 11.795.110,70
MV_2719
100%
$11.803.773
$ 11.803.773,80
MV_2728
100%
$11.262.132
$ 11.262.132,00
MV_2727
100%
$11.796.990
$ 11.796.989,70
MV_2724
100%
$11.806.492
$ 11.806.491,50
MV_2700
100%
$11.792.851
$ 11.792.851,20
MV_2721
100%
$11.779.588
$ 11.779.588,00
MV_2710
100%
$11.827.340
$ 11.827.340,10
MV_2717
100%
$11.123.196
$ 11.123.195,90
MV_2707
100%
$9.598.934
$ 9.598.934,00
MV_2702
100%
$9.867.133
$ 9.867.133,40
MV_2709
100%
$11.826.641
$ 11.826.641,40
MV_2710
100%
$11.821.551
$ 11.821.551,40
MV_2711
100%
$10.420.223
$ 10.420.223,80
MV_4610
100%
$10.903.004
$ 10.903.004
MV_4717
100%
$11.826.064
$ 11.826.064
MV_3857
100%
$11.826.451
$ 11.826.451
MV_3804
100%
$10.815.665
$ 10.815.665
MV_3805
100%
$11.842.364
$ 11.842.364

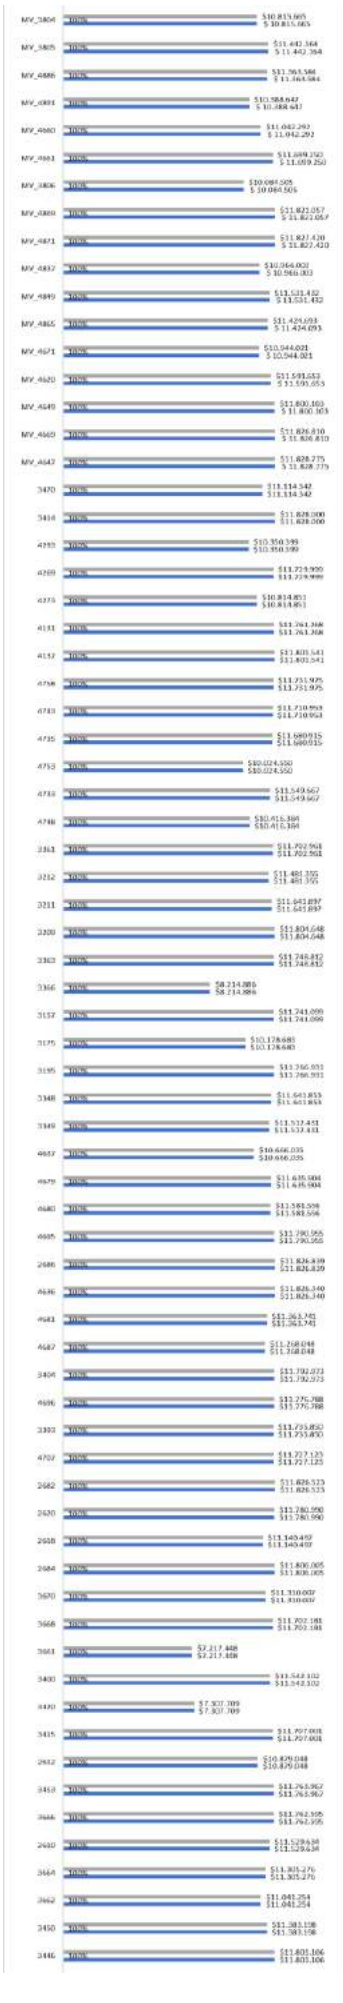
MV_3806
100%
$10.815.665
$ 10.815.665
MV_3805
100%
$11.442.364
$ 11.442.364
MV_4886
100%
$11.363.586
$ 11.363.586
MV_4884
100%
$10.588.643
$ 10.588.643
MV_4880
100%
$11.042.292
$ 11.042.292
MV_4883
100%
$11.699.250
$ 11.699.250
MV_3806
100%
$10.084.505
$ 10.084.505
MV_4869
100%
$11.821.057
$ 11.821.057
MV_4871
100%
$11.827.420
$ 11.827.420
MV_4887
100%
$10.966.003
$ 10.966.003
MV_4849
100%
$13.531.432
$ 13.531.432
MV_4865
100%
$11.424.693
$ 11.424.693
MV_4671
100%
$10.944.021
$ 10.944.021
MV_4620
100%
$11.591.653
$ 11.591.653
MV_4649
100%
$11.800.103
$ 11.800.103
MV_4669
100%
$11.826.810
$ 11.826.810
MV_4647
100%
$11.828.275
$ 11.828.275
3470
100%
$13.334.342
$ 13.334.342
3414
100%
$11.828.000
$ 11.828.000
4393
100%
$10.350.599
$ 10.350.599
4269
100%
$13.719.999
$ 13.719.999
4375
100%
$10.814.851
$ 10.814.851
4131
100%
$11.763.368
$ 11.763.368
4157
100%
$11.401.541
$ 11.401.541
4758
100%
$13.751.975
$ 13.751.975
4783
100%
$13.710.953
$ 13.710.953
4735
100%
$13.680.935
$ 13.680.935
4753
100%
$10.024.550
$ 10.024.550
4733
100%
$13.549.667
$ 13.549.667
4748
100%
$10.416.384
$ 10.416.384
3263
100%
$11.702.961
$ 11.702.961
3232
100%
$11.481.355
$ 11.481.355
3211
100%
$11.641.897
$ 11.641.897
3200
100%
$11.804.648
$ 11.804.648
3363
100%
$11.746.842
$ 11.746.842
3366
100%
$8.214.886
$ 8.214.886
5157
100%
$11.741.099
$ 11.741.099
5175
100%
$10.178.683
$ 10.178.683
3195
100%
$13.766.931
$ 13.766.931
3348
100%
$11.641.853
$ 11.641.853
3349
100%
$13.533.431
$ 13.533.431
4657
100%
$10.666.035
$ 10.666.035
4679
100%
$11.635.004
$ 11.635.004
6680
100%
$12.583.596
$ 12.583.596
6685
100%
$12.790.565
$ 12.790.565
2686
100%
$21.826.839
$ 21.826.839
4636
100%
$21.826.340
$ 21.826.340
4683
100%
$21.363.741
$ 21.363.741
4687
100%
$11.268.048
$ 11.268.048
3404
100%
$13.792.073
$ 13.792.073
4696
100%
$13.276.788
$ 13.276.788
3393
100%
$13.755.850
$ 13.755.850
4707
100%
$13.727.125
$ 13.727.125
2682
100%
$11.826.523
$ 11.826.523
2620
100%
$13.780.990
$ 13.780.990
2618
100%
$13.340.497
$ 13.340.497
2684
100%
$11.806.005
$ 11.806.005
3670
100%
$11.310.007
$ 11.310.007
3668
100%
$11.702.181
$ 11.702.181
3661
100%
$7.217.468
$ 7.217.468
3430
100%
$13.542.102
$ 13.542.102
4430
100%
$7.307.709
$ 7.307.709
3415
100%
$11.707.001
$ 11.707.001
2612
100%
$10.879.048
$ 10.879.048
3453
100%
$13.763.967
$ 13.763.967
3666
100%
$13.762.595
$ 13.762.595
2630
100%
$13.529.638
$ 13.529.638
3664
100%
$13.305.276
$ 13.305.276
3662
100%
$11.041.254
$ 11.041.254
3450
100%
$11.583.198
$ 11.583.198
3446
100%
$11.803.106
$ 11.803.106

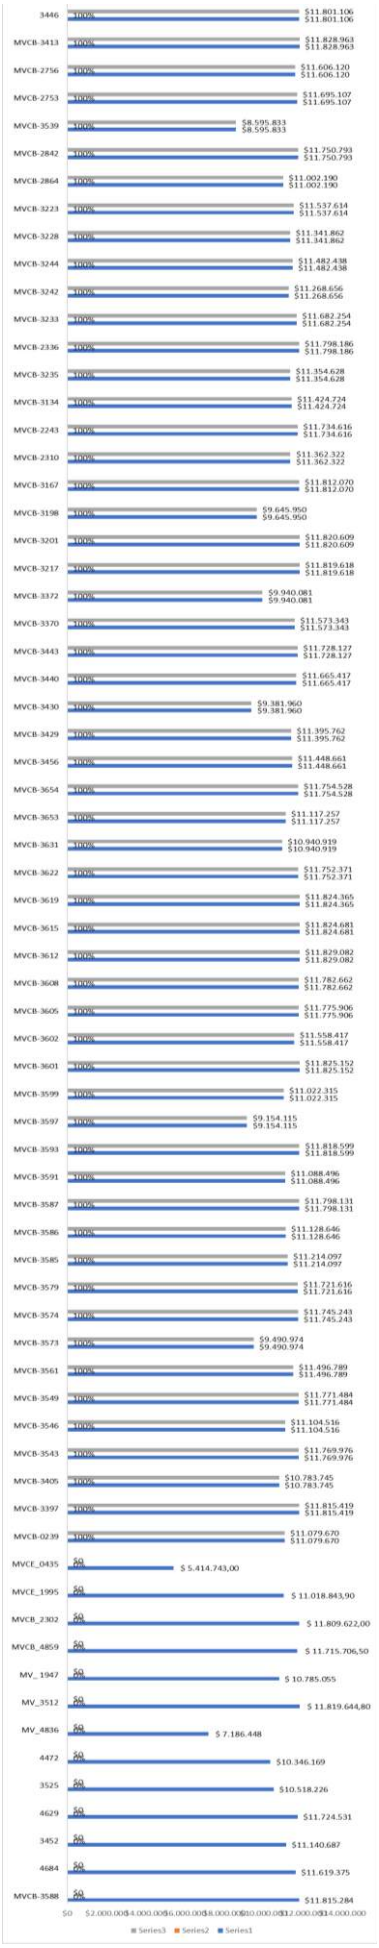
3446 100% $11.801.106 $11.801.106
MVCB-3413 100% $11.828.963 $11.828.963
MVCB-2756 100% $11.606.120 $11.606.120
MVCB-2753 100% $11.695.107 $11.695.107
MVCB-3539 100% $8.595.833 $8.595.833
MVCB-2842 100% $11.750.793 $11.750.793
MVCB-2864 100% $11.002.190 $11.002.190
MVCB-3223 100% $11.537.614 $11.537.614
MVCB-3228 100% $11.341.862 $11.341.862
MVCB-3244 100% $11.482.438 $11.482.438
MVCB-3242 100% $11.268.656 $11.268.656
MVCB-3233 100% $11.682.254 $11.682.254
MVCB-2336 100% $11.798.186 $11.798.186
MVCB-3235 100% $11.354.628 $11.354.628
MVCB-3134 100% $11.424.724 $11.424.724
MVCB-2243 100% $11.734.616 $11.734.616
MVCB-2310 100% $11.362.322 $11.362.322
MVCB-3167 100% $11.812.070 $11.812.070
MVCB-3198 100% $9.645.950 $9.645.950
MVCB-3201 100% $11.820.609 $11.820.609
MVCB-3217 100% $11.819.618 $11.819.618
MVCB-3372 100% $9.940.081 $9.940.081
MVCB-3370 100% $11.573.343 $11.573.343
MVCB-3443 100% $11.728.127 $11.728.127
MVCB-3440 100% $11.665.417 $11.665.417
MVCB-3430 100% $9.381.960 $9.381.960
MVCB-3429 100% $11.395.762 $11.395.762
MVCB-3456 100% $11.448.661 $11.448.661
MVCB-3654 100% $11.754.528 $11.754.528
MVCB-3653 100% $11.117.257 $11.117.257
MVCB-3631 100% $10.940.919 $10.940.919
MVCB-3622 100% $11.752.371 $11.752.371
MVCB-3619 100% $11.824.365 $11.824.365
MVCB-3615 100% $11.824.681 $11.824.681
MVCB-3612 100% $11.829.082 $11.829.082
MVCB-3608 100% $11.782.662 $11.782.662
MVCB-3605 100% $11.775.906 $11.775.906
MVCB-3602 100% $11.558.417 $11.558.417
MVCB-3601 100% $11.825.152 $11.825.152
MVCB-3599 100% $11.022.315 $11.022.315
MVCB-3597 100% $9.154.115 $9.154.115
MVCB-3593 100% $11.818.599 $11.818.599
MVCB-3591 100% $11.088.496 $11.088.496
MVCB-3587 100% $11.798.131 $11.798.131
MVCB-3586 100% $11.128.646 $11.128.646
MVCB-3585 100% $11.214.097 $11.214.097
MVCB-3579 100% $11.721.616 $11.721.616
MVCB-3574 100% $11.745.243 $11.745.243
MVCB-3573 100% $9.490.974 $9.490.974
MVCB-3561 100% $11.496.789 $11.496.789
MVCB-3549 100% $11.771.484 $11.771.484
MVCB-3546 100% $11.104.516 $11.104.516
MVCB-3543 100% $11.769.976 $11.769.976
MVCB-3405 100% $10.783.745 $10.783.745
MVCB-3397 100% $11.815.419 $11.815.419
MVCB-0239 100% $11.079.670 $11.079.670
MVCE_0435 $0 $ 5.414.743,00
MVCE_1995 $0 $ 11.018.843,90
MVCB_2302 $0 $ 11.809.622,00
MVCB_4859 $0 $ 11.715.706,50
MV_ 1947 $0 $ 10.785.055
MV_3512 $0 $ 11.819.644,80
MV_4836 $0 $ 7.186.448
4472 $0 $10.346.169
3525 $0 $10.518.226
4629 $0 $11.724.531
3452 $0 $11.140.687
4684 $0 $11.619.375
MVCB-3588 $0 $11.815.284
$0 $2.000.000 $4.000.000 $6.000.000 $8.000.000 $10.000.000 $12.000.000 $14.000.000
Series3 Series2 Series1

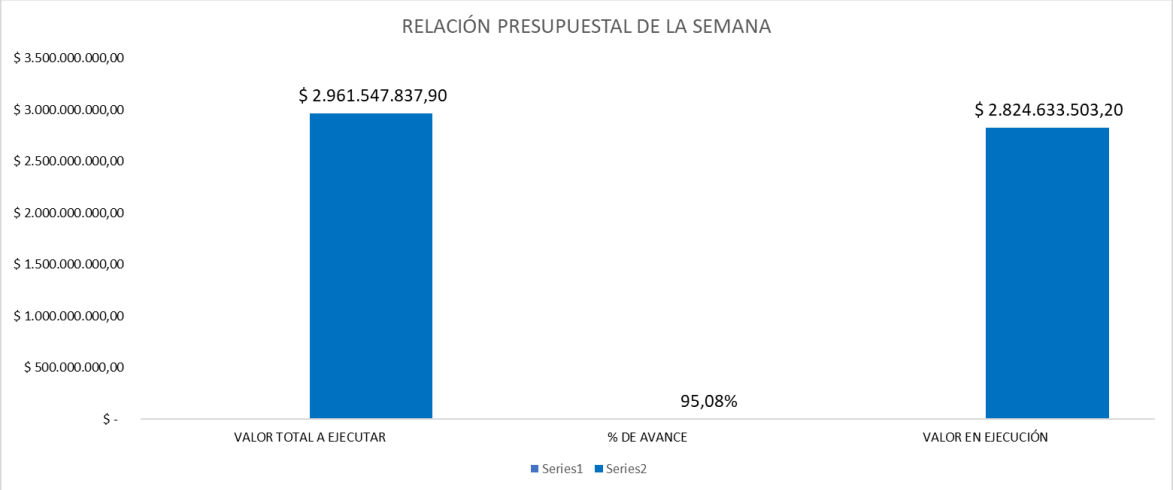

En el transcurso de la semana se están ejecutando 264 viviendas, de las cuales tenemos los siguientes datos.

RENUNCIAS	13	$ -
VIVIENDAS EN EL 0%	-	$ -
VIVIENDAS ENTRE EL 1% Y 49%	-	$ -
VIVIENDAS ENTRE EL 50% Y 99%	-	$ -
VIVIENDAS EN EL 100%	251	$ 2.824.633.503,20

$	**2.824.633.503,20**

INFORME SEMANAL 22

TÉCNICO

RELACIÓN MV – INFORME SEMANA 22

ARQ. CAMILA GIRALDO

1	MVCB_3859	KR 18U 66B 80 SUR	MARIA DEL PILAR PATIÑO VANEGAS
2	MVCB_3838	KR 18U 66B 81 SUR	MARIA DE JESUS GONZALEZ
3	MVCB_3837	KR 18U 66B 77 SUR	GELMAN ORLANDO JIMENEZ FUENTES
4	MVCB_3835	KR 18U 66B 69 SUR	FABIO ANCIZAR TRUJILLO GARCES
5	MVCB_3833	KR 18U 66B 59 SUR	LEIDY MAIDE SOSA CONTRERAS
6	MVCB_3865	KR 18U 66B 46 SUR	ANA TERESA VALENCIA GRANADOS
7	MVCB_3866	KR 18U 66B 38 SUR MJ	RAFAEL FRANCO CASTRO
8	MVCB_3867	KR 18U 66B 34 SUR	NUBIA DEL CARMEN SERNA RESTREPO
9	MVCB_3830	KR 18U 66B 41 SUR	CLAUDIA MIREYA ESPERANZA CABRERA
10	MVCB_3869	KR 18U 66B 22 SUR	CARMEN JULIA BARRETO BELTRAN
11	MVCB_3825	KR 18U 66B 11 SUR MJ	LIGIA ROSARIO TORRES DE MORALES
12	MVCB_3871	KR 18U 66B 10 SUR MJ	MILY YOMARA CALDERÓN CUESTA
13	MVCB_3751	KR 18V 66B 11 SUR	MARIA JUDITH LERMA VARGAS
14	MVCB_3813	TV 18U BIS 66B 64 SUR	MARIA LUCILA IBAGUE
15	MVCB_3875	KR 18T BIS 66B 17 SUR	ROSALBINA GIL DE SOLER
16	MVCB_4847	KR 18U 67C 32 SUR	ALFER YESID CASTAÑEDA PACHÓN
17	MVCB_4862	KR 18V BIS 67C 22 SUR	NANCY MORENO RADA
18	MVCB_ 4863	KR 18V BIS 67C 16 SUR	EULINE CARDENAS RUIZ
19	MVCB_4860	CL 67D SUR 18U 80	RUFINA MENA MURILLO
20	MVCB_4859	CL 67D SUR 18U 74	EVELIA MUÑOZ
21	MVCB_4881	CL 67C BIS SUR 18U 80	ROQUELINA MENA MURILLO
22	MVCB_2302	CL 67D SUR 18U 73	LORENA MARGARITA ESPAÑA MONTENEGRO
23	MVCB_2297	CL 68 SUR 18U 72	CONSUELO DE JESÚS GRAJALES RODRIGUEZ
24	MVCB_2292	CL 68 SUR 18U 48	HERNAN ANACONA PALECHOR
25	MVCB_2337	CL 68 SUR 18U 08	SARA SANCHEZ VIVAS
26	MVCB_4818	KR18T BIS 67C 20 SUR	ROHELFY PACHON SOTO
27	MVCB_2350	CL 68 SUR 18U 25	CARLOS ALFONSO SANCHEZ
28	MVCB_2287	CL 68 SUR 18U 35	LUZ MARINA GOMEZ CEDEÑO
29	MVCB_2288	TV 18U BIS 68 21 SUR	SIMONA TORRES MANYOMA
30	MVCB_2284	CL 68 SUR 18U 51	MARIA HELENA ANGEL BEDOYA
31	MVCB_2234	KR 18V BIS 68 13 SUR	MARIA OLGA SILVA VARGAS Y OTRO
32	MVCB_2238	KR 18V BIS 68 37 SUR	DIANA MARCELA TICORA LOPEZ

33	MVCB_2221	KR 18V BIS 68A 21 SUR	KERLY JOHANNA CELY MENDEZ
34	MVCB_2275	CL 68A SUR 18U 56	JOSÉ HERNANDO SEGURA CORTÉS
35	MVCB_2270	CL 68A SUR 18U 40	NUBIA GALLEGO CIRO
36	MVCB_2346	CL 68A SUR 18U 30	ISIDRO BONILLA RICO
37	MVCB_2347	TV 18U BIS 68 26 SUR	MARIA DORA ELISABET MARTINEZ SANABRIA
38	MVCB_2360	TV 18U 68 76 SUR	DAMARIS RESTREPO CHAVES
39	MVCB_2359	TV 18U 68A 06 SUR	CARMEN ROSA MARTÍNEZ PÉREZ
40	MVCB_2358	TV 18U 68A 10 SUR	ROSALBA LEON
41	MVCB_3052	DG 68 SUR 18T 42	GENTIL CALDERON CALDERON
42	MVCB_2377	TV 18TBISA 68 66 S	AMPARO MENDEZ
43	MVCB_2373	TV 18T BIS A 68 84 SUR	MARTHA CECILIA ARIAS MORALES
44	MVCB_3039	TV 18T BIS A 68 18 SUR	FLOR ALICIA LOAIZA ARBOLEDA
45	MVCB_3043	TV 18T BIS A 68 03 SUR	MARIA HELENA CASTELLANOS UMAÑA
46	MVCB_3144	KR 18R BIS 68 20 SUR	JACQUELIN GONZALEZ AREVALO
47	MVCB_3145	KR 18R BIS 68 12 SUR	MARIA ESTHER GONZALEZ GOMEZ
48	MVCB_4796	KR 18T 67C 50 SUR MJ	OLGA GUZMAN
49	MVCB_4799	CL 67C BIS SUR 18Q 91	ALICIA SANCHEZ
50	MVCB_4792	CL 68 SUR 18R 16	LUZ MARINA MENDIVELSO TORRES
51	MVCB_4790	CL 68 SUR 18Q 76	MIREYA MELO VASQUEZ
52	MVCB_4806	CL 67C BIS SUR 18Q 65	LUZ ANGELA HERRERA FINO
53	MVCB_3148	CL 68 SUR 18R 11	OTALVINA ESPITIA FORERO
54	MVCB_3151	KR 18R 68 21 SUR	ELVIRA PINZON SIERRA
55	MVCB_4768	KR 18Q BIS B 67C 54 SUR	LEIDY DIANA MUÑOZ OSPINA
56	MVCB_4766	CL 68 SUR 18Q 48 MJ	MARIA OLGA ROMERO DE PULIDO
57	MVCB_3323	KR 18Q 68 23 SUR	ELIA MARIA ARIZA DE PEÑA Y OTRO
58	MVCB_3315	KR 18Q BIS B 68 24 SUR	YANETH TORRES GARCIA Y OTRO
59	MVCB_3332	KR 18Q BIS B 68A 04 SUR	JORGE SANTOS VEGA LINARES
60	MVCB_3336	DG 68A SUR 18Q 15	NANCY OSORIO
61	MVCB_3326	DG 68B SUR 18Q 26	BIBIAN STELLA CALDERON BEJARANO
62	MV_356	CL 36F SUR 11C 50	HECTOR ULISES ROMERO MENDEZ
63	MV_586	CL 37 SUR 11C 33	SANTIAGO AGUIRRE GARCIA
64	MV_600	CL 37 SUR 11A 47	HERMINIA PEÑALOZA
65	MV_077IN	KR 9G 37 27 SUR	SILVIA AMPARO MUÑOZ GUERRERO
66	MVLO_419	KR 9K 44 60 SUR	LUCIA ARDILA MARIN
67	MVPR_0111	KR 9D 40 13 SUR	URIEL JOSE CALDERON MUÑOZ
68	MVCA_3842	KR 8B BIS ESTE 5A 23	IMELDA LOPEZ DE CEBALLOS

69	MVCA_4516	DG 4A 8B 18 ESTE	MARIA JULIA CORDOBA BOLAÑOS	
70	MVCA_4231	DG 4A 8 51 ESTE	ESMERALDA VIDALES ANAYA	
71	MVCA_1783	KR 10A ESTE 2 22	MARIA RUTH OSPINA	
72	MVCA_2132	CL 1B BIS 11A 11 ESTE	JAIME ENRIQUE GUZMAN	
73	MVTB_4354	KR 150 143B 30	BAUDELINO AVILA OLAYA	
74	MVTB_3843	KR 151 143 46	GUILLERMO MONTALVO CHAVEZ	
75	MVTB_0568	KR 152A 143 66	GLORIA DOLORES SANCHEZ DIAZ	
76	MV_0022	KR 146A 139 36	JOSE RICARDO PRIETO GARZON	
77	MVBV_0741	KR 6 192A 12 MJ	BEATRIZ TRIVIÑO	
78	MVBV_0519	KR 6A 189B 06 MJ	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ VDA DE TEJADA	
79	MVBV_0890	KR 6 189A 21 MJ	MARIA MATILDE ALFONSO DE RODRIGUEZ	
80	MVCE_0125	CL 161 4A 22	SALVADOR VELANDA ACERO	
81	MVCE_1995	KR 2 ESTE 161 28	JAIRO ALBERTO GARZÓN RIOS	
82	MVCE_1034	KR 3A 163 62 MJ	JOAN DAVID LEGUIZAMON VILLAMIL	
83	MVCE_2106	KR 1B 163 91 IN 2	MARIA DEL TRANSITO BARON SANTIESTEBAN	
84	MVCE_0435	CALLE 161 1A 61	MARLENY MUÑOZ CASTAÑO	

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **4-abr-21**

Union Temporal MIC Viviendas 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	695-2020			**Plazo**	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo II			**Acta de inicio**	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	**CRP No.**		**Valor del contrato**	**3.728.543.252**

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de	701-2020			**Plazo**	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventoria técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			**Acta de inicio**	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	**CRP No.**		**Valor del contrato**	**894.285.952,00**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT

Territorio o barrio a intervenir	JUAN PABLO II	Barrios	Predios	Total Predios	Validación				Fase 2: Ejecución de obras				
									Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	Renuncias	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	Camila Giraldo Jimenez	9	84	84	84	0	4	22	0	80	0	95,24%	80
		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
Técnico Responsable		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
	Subtotal		84	84	84	0		0	0	80	0	0,00%	80

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			NOVIEMBRE				DICIEMBRE					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL
										SEMANA DEL 4 AL 8	SEMANA DEL 9 AL 15	SEMANA DEL 16AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 06	SEMANA DEL 7 AL 13	SEMANA DEL 14 AL 20	SEMANA DEL 21 AL 27	SEMANA DEL 28 AL 3	SEMANA DEL 4 AL 10	SEMANA DEL 11 AL 17	SEMANA DEL 18 AL 24	SEMANA DEL 25 AL 31	SEMANA DEL 1 AL 07	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28	SEMANA DEL 1 AL 7	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28	SEMANA DEL 29 AL 04
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	**V/ Validada**	**V/ Modificada**	**Vlnicial**	**Fecha inicio**	**Fecha terminada**	**F. Inicio**	**1 semana**	**2 semana**	**3 semana**	**4 semana**	**5 semana**	**6 semana**	**7 semana**	**8 semana**	**9 semana**	**10 semana**	**11 semana**	**12 semana**	**13 semana**	**14 semana**	**15 semana**	**16 semana**	**17 semana**	**18 semana**	**19 semana**	**20 semana**	**21 semana**	**22 semana**
1	MVCB_3859	KR 18U 66B 80 SUR	MARIA DEL PILAR PATIÑO VANEGAS	SI		$ 11.827.598,50	22/1/2021	12/2/2021	22/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	MVCB_3838	KR 18U 66B 81 SUR	MARIA DE JESUS GONZALEZ	SI		$ 10.758.996,80	26/1/2021	10/2/2021	26/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	MVCB_3837	KR 18U 66B 77 SUR	GELMAN ORLANDO JIMENEZ FUENTES	SI		$ 11.825.403,30	2/2/2021	18/3/2021	2/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	15%	30%	55%	80%	80%	100%	100%	100%
4	MVCB_3835	KR 18U 66B 69 SUR	FABIO ANCIZAR TRUJILLO GARCES	SI		$ 11.684.560,10	27/1/2021	11/3/2021	27/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	65%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%
5	MVCB_3833	KR 18U 66B 59 SUR	LEIDY MAIDE SOSA CONTRERAS	SI		$ 11.800.742,60	27/1/2021	20/2/2021	27/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	MVCB_3865	KR 18U 66B 46 SUR	ANA TERESA VALENCIA GRANADOS	SI		$ 11.680.157,70	22/1/2021	15/2/2021	22/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	80%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	MVCB_3866	KR 18U 66B 38 SUR MJ	RAFAEL FRANCO CASTRO	SI	$ 11.830.000,00	$ 8.562.372,60	4/3/2021	23/3/2021	4/3/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	95%	100%	100%
8	MVCB_3867	KR 18U 66B 34 SUR	NUBIA DEL CARMEN SERNA RESTREPO	SI		$ 11.204.834,80	4/2/2021	19/3/2021	4/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	50%	60%	65%	80%	100%	100%	100%
9	MVCB_3830	KR 18U 66B 41 SUR	CLAUDIA MIREYA ESPERANZA CABRERA	SI		$ 9.712.216,90	22/1/2021	24/2/2021	22/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	40%	55%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	MVCB_3869	KR 18U 66B 22 SUR	CARMEN JULIA BARRETO BELTRAN	SI		$ 11.475.278,30	27/11/2020	15/1/2021	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	50%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	MVCB_3825	KR 18U 66B 11 SUR MJ	LIGIA ROSARIO TORRES DE MORALES	SI		$ 11.746.769,10	1/12/2020	25/1/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	30%	45%	50%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	MVCB_3871	KR 18U 66B 10 SUR MJ	MILY YOMARA CALDERÓN CUESTA	SI		$ 11.702.732,90	27/11/2020	2/2/2021	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	10%	30%	35%	45%	60%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	MVCB_3751	KR 18V 66B 11 SUR	MARIA JUDITH LERMA VARGAS	SI		$ 11.596.782,60	26/11/2020	29/12/2020	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	5%	9%	30%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	MVCB_3813	TV 18U BIS 66B 64 SUR	MARIA LUCILA IBAGUE	SI		$ 11.601.821,90	26/11/2020	29/12/2020	26/11/2020	0%	0%	0%	13%	18%	0%	40%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	MVCB_3875	KR 18T BIS 66B 17 SUR	ROSALBINA GIL DE SOLER	SI		$ 11.729.807,40	19/2/2021	9/3/2021	19/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	85%	100%	100%	100%	100%
16	MVCB_4847	KR 18U 67C 32 SUR	ALFER YESID CASTAÑEDA PACHÓN	SI		$ 11.803.645,60	25/11/2020	18/3/2021	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	5%	7%	20%	50%	50%	60%	70%	70%	70%	75%	77%	85%	85%	85%	90%	100%	100%	100%
17	MVCB_4862	KR 18V BIS 67C 22 SUR	NANCY MORENO RADA	SI		$ 11.804.917,00	25/11/2020	6/1/2021	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	1%	1%	12%	65%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	MVCB_4863	KR 18V BIS 67C 16 SUR	EULINE CARDENAS RUIZ	SI		$ 11.743.967,20	25/11/2020	10/2/2021	25/11/2020	0%	0%	0%	10%	12%	13%	13%	45%	45%	60%	60%	65%	65%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	MVCB_4860	CL 67D SUR 18U 80	RUFINA MENA MURILLO	SI		$ 10.961.083,30	9/2/2021	17/3/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	35%	40%	70%	100%	100%	100%
20	MVCB_4859	CL 67D SUR 18U 74	EVELIA MUÑOZ	SI		$ 11.715.706,50	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21	MVCB_4881	CL 67C BIS SUR 18U 80	ROQUELINA MENA MURILLO	SI		$ 11.544.533,80	3/12/2020	22/1/2021	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	35%	42%	55%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	MVCB_2302	CL 67D SUR 18U 73	LORENA MARGARITA ESPAÑA MONTENEGRO	SI		$ 11.809.622,00	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23	MVCB_2297	CL 68 SUR 18U 72	CONSUELO DE JESÚS GRAJALES RODRIGUEZ	SI		$ 11.100.811,10	26/11/2020	2/2/2021	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	11%	15%	20%	60%	65%	75%	85%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	MVCB_2292	CL 68 SUR 18U 48	HERNAN ANACONA PALECHOR	SI		$ 11.800.788,20	2/12/2020	20/1/2021	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	55%	60%	70%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	MVCB_2337	CL 68 SUR 18U 08	SARA SANCHEZ VIVAS	SI		$ 11.809.754,50	1/12/2020	27/1/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	7%	20%	60%	60%	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	MVCB_4818	KR18T BIS 67C 20 SUR	ROHELPY PACHON SOTO	SI		$ 11.371.973,70	2/12/2020	17/12/2020	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	80%	90%	98%	99%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	MVCB_2350	CL 68 SUR 18U 25	CARLOS ALFONSO SANCHEZ	SI		$ 11.810.836,20	8/2/2021	15/3/2021	8/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	45%	80%	90%	100%	100%	100%
28	MVCB_2287	CL 68 SUR 18U 35	LUZ MARINA GOMEZ CEDEÑO	SI		$ 9.632.686,90	2/12/2020	10/2/2021	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	5%	18%	20%	35%	50%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	MVCB_2288	TV 18U BIS 68 21 SUR	SIMONA TORRES MANYOMA	SI		$ 11.468.527,40	27/1/2021	26/2/2021	27/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	45%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	MVCB_2284	CL 68 SUR 18U 51	MARIA HELENA ANGEL BEDOYA	SI		$ 11.102.866,80	28/1/2021	11/3/2021	28/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	80%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
31	MVCB_2234	KR 18V BIS 68 13 SUR	MARIA OLGA SILVA VARGAS Y OTRO	SI		$ 11.680.750,70	2/12/2020	30/12/2020	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	55%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	MVCB_2238	KR 18V BIS 68 37 SUR	DIANA MARCELA TICORA LOPEZ	SI	$ 10.367.612,00	$ 9.776.870,90	4/2/2021	29/3/2021	4/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	25%	30%	35%	50%	55%	70%	90%	100%
33	MVCB_2221	KR 18V BIS 68A 21 SUR	KERLY JOHANNA CELY MENDEZ	SI		$ 11.799.445,60	4/3/2021	3/4/2021	4/3/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	5%	10%	100%
34	MVCB_2275	CL 68A SUR 18U 56	JOSÉ HERNANDO SEGURA CORTÉS	SI		$ 10.617.364,30	2/2/2021	26/3/2021	2/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	35%	45%	45%	50%	65%	80%	100%	100%
35	MVCB_2270	CL 68A SUR 18U 40	NUBIA GALLEGO CIRO	SI		$ 11.827.989,80	2/2/2021	17/2/2021	2/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	50%	62%	85%	95%	100%	100%	100%	100%
36	MVCB_2346	CL 68A SUR 18U 30	ISIDRO BONILLA RICO	SI	$ 11.829.961,00	$ 11.713.338,30	2/2/2021	17/2/2021	2/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	65%	75%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
37	MVCB_2347	TV 18U BIS 68 26 SUR	MARIA DORA ELISABET MARTINEZ SANABRIA	SI		$ 10.663.766,00	27/1/2021	20/2/2021	27/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	55%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	MVCB_2360	TV 18U 68 76 SUR	DAMARIS RESTREPO CHAVES	SI		$ 8.168.895,50	27/1/2021	20/2/2021	27/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	MVCB_2359	TV 18U 68A 06 SUR	CARMEN ROSA MARTÍNEZ PÉREZ	SI	$ 11.830.000,00	$ 11.442.451,60	10/3/2021	3/4/2021	10/3/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
40	MVCB_2358	TV 18U 68A 10 SUR	ROSALBA LEON	SI		$ 10.833.284,30	9/2/2021	31/3/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	35%	55%	60%	85%	100%
41	MVCB_3052	DG 68 SUR 18T 42	GENTIL CALDERON CALDERON	SI		$ 11.829.270,20	9/2/2021	3/4/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	60%	70%	70%	75%	80%	90%	100%
42	MVCB_2377	TV 18TBISA 68 66 S	AMPARO MENDEZ	SI		$ 9.871.968,70	9/2/2021	3/4/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	12%	20%	40%	65%	65%	70%	100%
43	MVCB_2373	TV 18T BIS A 68 84 SUR	MARTHA CECILIA ARIAS MORALES	SI	$ 11.830.000,00	$ 10.644.068,80	26/2/2021	26/3/2021	26/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	90%	95%	100%	100%
44	MVCB_3039	TV 18T BIS A 68 18 SUR	FLOR ALICIA LOAIZA ARBOLEDA	SI		$ 11.817.878,50	9/2/2021	31/3/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	55%	65%	80%	90%	95%	100%
45	MVCB_3043	TV 18T BIS A 68 03 SUR	MARIA HELENA CASTELLANOS LIMAÑA	SI		$ 10.947.092,80	9/2/2021	31/3/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	10%	45%	70%	90%	95%	95%	100%
46	MVCB_3144	KR 18R BIS 68 20 SUR	JACQUELIN GONZALEZ AREVALO	SI		$ 11.757.880,70	9/3/2021	3/4/2021	9/3/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	100%
47	MVCB_3145	KR 18R BIS 68 12 SUR	MARIA ESTHER GONZALEZ GOMEZ	SI		$ 11.822.319,80	5/3/2021	3/4/2021	5/3/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	75%	100%
48	MVCB_4796	KR 18T 67C 50 SUR MJ	OLGA GUZMAN	SI		$ 11.529.818,10	5/3/2021	3/4/2021	5/3/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	45%	100%
49	MVCB_4799	CL 67C BIS SUR 18Q 91	ALICIA SANCHEZ	SI	$ 11.830.000,00	$ 11.553.782,50	5/3/2021	3/4/2021	5/3/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	30%	80%	100%
50	MVCB_4792	CL 68 SUR 18R 16	LUZ MARINA MENDIVELSO TORRES	SI		$ 11.826.872,60	5/3/2021	26/3/2021	5/3/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	60%	100%	100%
51	MVCB_4790	CL 68 SUR 18Q 76	MIREYA MELO VASQUEZ	SI		$ 11.829.325,30	5/3/2021	3/4/2021	5/3/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	65%	100%
52	MVCB_4806	CL 67C BIS SUR 18Q 65	LUZ ANGELA HERRERA FINO	SI		$ 10.590.307,00	5/3/2021	3/4/2021	5/3/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	55%	70%	100%
53	MVCB_3148	CL 68 SUR 18R 11	OTALVINA ESPITIA FORERO	SI		$ 11.827.703,40	6/12/2020	20/1/2021	6/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	3%	20%	50%	80%	95%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	MVCB_3151	KR 18R 68 21 SUR	ELVIRA PINZON SIERRA	SI		$ 11.677.985,10	6/12/2020	15/1/2021	6/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	1%	20%	50%	80%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	4/4/2021	PERIODO No.	22	DEL	29/3/2021	AL	4/4/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 2, la ejecución de 253 mejoramientos de vivienda, localizados en 5 localidades: Usaquén, Santafé, Rafael Uribe Uribe, Suba, Santafé y Ciudad Bolívar, esta última incluye una (1) Intervención de Mejoramiento Integral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	695–2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	894.285.952	VALOR INICIAL :	3.728.543.252,00
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/4/2021	-150
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


ju87uki


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$0,00	#¡DIV/0!	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Barrio o Territorio

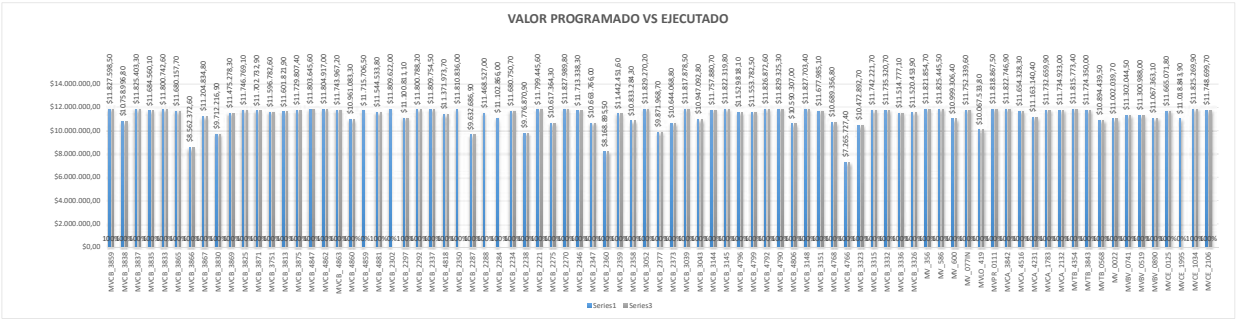

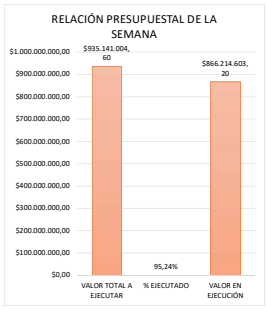

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA
JUAN PABLO II - LAS LOMAS - PUERTO RICO - LOS LACHES - EL CONSUELO
FECHA: 04/04/2021
MVCB_3859 - MARIA DEL PILAR PATIÑO VANEGAS: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 12 de Febrero de 2021
MVCB_3838 - MARIA DE JESUS GONZALEZ : Se realiza entrega unilateral de la vivienda el dia 10 de Febrero de 2021, ya que la beneficiaria presenta inconformidad en cuando a los precios establecidos. Se realiza toma de medidas en compañía de la beneficiario y socializacion de presupuesto y actividades ejecutadas. Se realiza informe por parte de Contratista e Intrventoria.
MVCB_3837 - GELMAN ORLANDO JIMENEZ FUENTES: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 18 de Marzo de 2021.
MVCB_3835 - FABIO ANCIZAR TRUJILLO GARCES: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 11 de Marzo de 2021.
MVCB_3833 - LEIDY MAIDE SOSA CONTRERAS: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 20 de Febrero de 2021.
MVCB_3865 - ANA TERESA VALENCIA GRANADOS: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 15 de Febrero de 2021.
MVCB_3866 - RAFAEL FRANCO CASTRO: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 23 de Marzo de 2021.
MVCB_3867 - NUBIA DEL CARMEN SERNA RESTREPO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Marzo de 2021.
MVCB_3871 - CLAUDIA MIREYA ESPERANZA CABRERA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 24 de Febrero de 2021
MVCB_3869 - CARMEN JULIA BARRETO BELTRAN: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 15 de Enero de 2021
MVCB_3825 - LIGIA ROSARIO TORRES DE MORALES: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 25 de Enero de 2021
MVCB_3871 - MILY YOMARA CALDERON CUESTA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 02 de Febrero de 2021
MVCB_3751 - MARIA JUDITH LERMA VARGAS Y OTRO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 29 de Diciembre de 2020
MVCB_3813 - MARIA LUCILA IBAGUE: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 29 de Diciembre de 2020
MVCB_3875 - ROSALBINA GIL DE SOLER: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 09 de Marzo de 2021.
MVCB_4847 - ALFER YESID CASTANEDA PACHON: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 18 de Marzo de 2021.
MVCB_4862 - NANCY MORENO RADA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 06 de Enero de 2021
MVCB_4863 - EULINE CARDENAS RUIZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 10 de Febrero de 2021.
MVCB_4860 - RUFINA MENA MURRILLO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 17 de Marzo de 2021.
MVCB_4881 - ROQUELINA MENA MURILLO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 22 de Enero de 2021
MVCB_2297 - CONSUELO DE JESÚS GRAJALES RODRÍGUEZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 02 de Febrero de 2021
MVCB_2292 - HERNAN ANACONA PALECHOR: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 20 de Enero de 2021
MVCB_2337 - SARA SANCHEZ VIVAS: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 27 de Enero de 2021.
MVCB_4818 - ROHELFY PACHON SOTO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion.
MVCB_2350 - CARLOS ALFONSO SANCHEZ: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 15 de Marzo 2021.
MVCB_2287 - LUZ MARINA GOMEZ CEDEÑO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 10 de Febrero de 2021
MVCB_2288 - SIMONA TORRES MANYOMA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 26 de Febrero de 2021.
MVCB_2284 - MARIA HELENA ANGEL BEDOYA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 11 de Marzo de 2021.
MVCB_2234 - MARIA OLGA SILVA VARGAS Y OTRO: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 30 de Diciembre de 2020
MVCB_2238 - DIANA MARCELA TICORA LOPEZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 29 de Marzo de 2021
MVCB_2221 - KERLY JOHANNA CELY MENDEZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCB_2275 - JOSÉ HERNANDO SEGURA CORTÉS: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 26 de Marzo de 2021.
MVCB_2270 - NUBIA GALLEGO CIRO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 09 de Marzo de 2021.
MVCB_2346 - ISIDRO BONILLA RICO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 09 de Marzo de 2021.
MVCB_2347 - MARIA DORA ELISABET MARTINEZ SANABRIA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 20 de Febrero de 2021
MVCB_2360 - DAMARIS RESTREPO CHAVES: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 20 de Febrero de 2021.

MVCB_2358 - ROSALBA LEON: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 31 de Marzo de 2021.
MVCB_3052 - GENTIL CALDERON CALDERON: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021.
MVCB_2377 - AMPARO MENDEZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCB_3039 - FLOR ALICIA LOAIZA ARBOLEDA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 31 de Marzo de 2021.
MVCB_3043 - MARIA HELENA CASTELLANOS UMAÑA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 31 de Marzo de 2021.
MVCB_3144 - JACQUELIN GONZALEZ AREVALO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCB_3145 - MARIA ESTHER GONZALEZ GOMEZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCB_4796 - OLGA GUZMAN: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCB_4799 - ALICIA SANCHEZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCB_4792 - LUZ MARINA MENDIVELSO TORRES: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 26 de Marzo de 2021.
MVCB_4790 - MIREYA MELO VASQUEZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCB_4806 - LUZ ANGELA HERRERA FINO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCB_3148 - OTALVINA ESPITIA FORERO: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 20 de Enero de 2021
MVCB_3151 - ELVIRA PINZON SIERRA: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 15 de Enero de 2021.
MVCB_4768 - LEIDY DIANA MUÑOZ OSPINA: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 25 de Enero de 2021
MVCB_4766 - MARIA OLGA ROMERO DE PULIDO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 31 de Marzo de 2021.
MVCB_3323 - ELIA MARIA ARIZA DE PEÑA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 17 de Febrero de 2021.
MVCB_3315 - YANETH TORRES GARCIA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 15 de Febrero de 2021.
MVCB_3332 - JORGE SANTOS VEGA LINARES: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Febrero de 2021.
MVCB_3336 - NANCY OSORIO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 09 de Marzo de 2021
MVCB_3326 - BIBIAN STELLA CALDERON BEJARANO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Febrero de 2021.
MV_356 - HECTOR ULISES ROMERO MENDEZ: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 29 de Marzo de 2021.
MV_586 - SANTIAGO AGUIRRE GARCIA: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 30 de Marzo de 2021.
MV_600 - HERMINIA PEÑALOZA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MV_077IN - SILVIA AMPARO MUÑOZ GUERRERO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVLO_419 - LUCIA ARDILA MARIN: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVPR_0111 - URIEL JOSE CALDERON MUÑOZ: Se realiza entrega unilateral de la vivienda el dia 29 de Marzo de 2021.
MVCA_3842 - IMELDA LOPEZ DE CEBALLOS: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCA_4516 - MARIA JULIA CORDOBA BOLAÑOS: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCA_4231 - ESMERALDA VIDALES ANAYA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCA_1783 - MARIA RUTH OSPINA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCA_2132 - JAIME ENRIQUE GUZMAN: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVTB_4354 - BAUDELINO AVILA OLAYA: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVTB_3843 - GUILLERMO MONTALVO CHAVEZ: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVTB_0568 - GLORIA DOLORES SANCHEZ DIAZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MV_0022 - JOSE RICARDO PRIETO GARZON: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVBV_0741 - BEATRIZ TRIVIÑO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVBV_0519 - MARIA DEL ROSARIO LOPEZ VDA DE TEJADA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVBV_0890 - MARIA MATILDE ALFONSO DE RODRIGUEZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCE_0125 - SALVADOR VELANDA ACERO: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCE_1034 - JOAN DAVID LEGUIZAMON VILLAMIL: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021
MVCE_2106 - MARIA DEL TRANSITO BARON SANTIESTEBAN: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Abril de 2021

3		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio:__JUAN PABLO II_

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA








REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTREGA - MVCB_2359



FECHA: 03-ABRIL-2021



FECHA: 03-ABRIL-2021



FECHA: 03-ABRIL-2021



FECHA: 03-ABRIL-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de la vivienda la cual la beneficiaria recibe a satisfaccion.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTREGA - MVCA_4231



FECHA: 03-ABRIL-2021



FECHA: 03-ABRIL-2021



FECHA: 03-ABRIL-2021



FECHA: 03-ABRIL-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de la vivienda la cual la beneficiaria recibe a satisfaccion.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTREGA - MVTB_0568



DESCRIPCION Y FECHA: 03-04-2021

ACTIVIDAD: ENTREGA DE VIVIENDA.



DESCRIPCION Y FECHA: 03-04-2021

ACTIVIDAD: ENTREGA DE VIVIENDA.



DESCRIPCION Y FECHA: 03-04-2021

ACTIVIDAD: ENTREGA DE VIVIENDA.



DESCRIPCION Y FECHA: 03-04-2021

ACTIVIDAD: ENTREGA DE VIVIENDA.

RELACIÓN MV – INFORME SEMANA 22

DIANA MUÑOZ

1	MV_4647	KR18N BIS A 68 17 SUR	GIOVANI GUTIERREZ RIVERA
2	MV_4669	KR18N BIS A 68 17 SUR	MARIA EUGENIA RIAÑOS
3	MV_4649	CL 67C BIS SUR 18N 25	FLORALBA ACEY LOPEZ
4	MV_4620	CL 67C BIS SUR 18N 22	MARIA ALICIA NAVARRO REYES
5	MV_4671	CL 68 SUR 18N 05 MJ	MARIA SHIRLEY GARCES
6	MV_4865	CL 67C SUR 18V 17	ANA SOFIA AGUILERA
7	MV_4849	CL 67C SUR 18T 45	ALEYDA TORRES
8	MV_4837	CL 67C SUR 18U 11	MARIA ALIRIA FUENTES SEPULVEDA
9	MV_4836	CL 67C SUR 18U 17 MJ	VICTOR JULIO PORTILLA
10	MV_4871	CL 67C SUR 18U 47	CARMELINA ARCILA DE CASTAÑO
11	MV_4869	CL 67C SUR 18U 63	ROSA HELENA PAEZ DE GUEVARA
12	MV_3806	CL 67C SUR 18U 30	JOSE JIMENEZ GONZALEZ
13	MV_4661	KR 18N 67C 13 SUR	MARTHA PATRICIA CORTES HERNANDEZ
14	MV_4660	CL 67C SUR 18N 03	BLANCA EDELMIRA SANCHEZ
15	MV_4891	KR 18N 68 10 SUR	DEYANIRA MARIA ROMERO
16	MV_4886	DG 68A SUR 18M 54	EMMA TEOFILDE MATEUS DE PINEDA
17	MV_3805	CL 67C SUR 18U 20	LUZ MARY VARGAS ARDILA
18	MV_3804	CL 67C SUR 18U 10	MARIA ANA CELIA
19	MV_3857	KR 18U 66B 90 SUR	CECILIA MEJÍA DE RODRÍGUEZ
20	MV_4717	KR 18P BIS 67C 08 SUR	ARACELY ZAMBRANO ROJAS
21	MV_4630	CL 67C SUR 18N 23	MARÍA FELISA CRUZ VARGAS

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	**INF-22**

Unión Temporal MIC Viviendas 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	695-2020			**Plazo**	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat, Grupo II			**Acta de inicio**	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	**CRP No.**		**Valor del contrato**	**3.728.543.252**

Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de	701-2020			**Plazo**	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			**Acta de inicio**	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	**CRP No.**		**Valor del contrato**	**894.285.952,00**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Juan Pablo II, Ciudad Bolivar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**				**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	Renuncia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Diana Milena Muñoz Gordillo	1	21	21	21	0	1	0	0	20	0	95,24%	20
		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
Técnico Responsable		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
Subtotal			**21**	**21**	**21**	**0**	**1**	**0**	**0**	**20**	**0**	**95,24%**	**20**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										NOVIEMBRE				DICIEMBRE					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL
Proyecto				**FASE I**			**Tiempo Programación**			SEMANA DEL 4 AL 8	SEMANA DEL 9 AL 15	SEMANA DEL 16AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 06	SEMANA DEL 7 AL 13	SEMANA DEL 14 AL 20	SEMANA DEL 21 AL 27	SEMANA DEL 28 AL 3	SEMANA DEL 4 AL 10	SEMANA DEL 11 AL 17	SEMANA DEL 18 AL 24	SEMANA DEL 25 AL 31	SEMANA DEL 1 AL 07	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28	SEMANA DEL 1 AL 7	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28	SEMANA DEL 29 AL 04
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	**V/ Validada**	**V/ Modificada**	**VlInicial**	**Fecha inicio**	**Fecha terminada**	**F. Inicio**	**1 semana**	**2 semana**	**3 semana**	**4 semana**	**5 semana**	**6 semana**	**7 semana**	**8 semana**	**9 semana**	**10 semana**	**11 semana**	**12 semana**	**13 semana**	**14 semana**	**15 semana**	**16 semana**	**17 semana**	**18 semana**	**19 semana**	**20 semana**	**21 semana**	**22 semana**
1	MV_4647	KR18N BIS A 68 17 SUR	GIOVANI GUTIERREZ RIVERA	SI		$ 11.828.775	26/11/2020	15/12/2020	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	70%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	MV_4669	KR18N BIS A 68 17 SUR	MARIA EUGENIA RIAÑOS	SI		$ 11.826.810	26/11/2020	15/12/2020	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	MV_4649	CL 67C BIS SUR 18N 25	FLORALBA ACEY LOPEZ	SI		$ 11.800.103	1/12/2020	24/12/2020	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	10%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	MV_4620	CL 67C BIS SUR 18N 22	MARIA ALICIA NAVARRO REYES	SI		$ 11.591.653	1/12/2020	8/1/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	5%	70%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	MV_4671	CL 68 SUR 18N 05 MJ	MARIA SHIRLEY GARCES	SI		$ 10.944.021	2/12/2020	30/12/2020	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	25%	30%	30%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	MV_4865	CL 67C SUR 18V 17	ANA SOFIA AGUILERA	SI		$ 11.424.693	26/11/2020	25/1/2021	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	35%	40%	45%	70%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	MV_4849	CL 67C SUR 18T 45	ALEYDA TORRES	SI		$ 11.531.432	24/11/2020	29/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	15%	45%	60%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	MV_4837	CL 67C SUR 18U 11	MARIA ALIRIA FUENTES SEPULVEDA	SI		$ 10.966.003	25/11/2020	20/1/2021	25/11/2020	0%	0%	0%	15%	20%	30%	50%	50%	50%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	MV_4836	CL 67C SUR 18U 17 MJ	VICTOR JULIO PORTILLA	SI		$ 7.186.448	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	MV_4871	CL 67C SUR 18U 47	CARMELINA ARCILA DE CASTAÑO	SI		$ 11.827.420	24/11/2020	1/2/2021	24/11/2020	0%	0%	20%	20%	20%	40%	75%	80%	80%	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	MV_4869	CL 67C SUR 18U 63	ROSA HELENA PAEZ DE GUEVARA	SI		$ 11.821.057	25/11/2020	15/1/2021	25/11/2020	0%	0%	20%	0%	20%	35%	50%	60%	70%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	MV_3806	CL 67C SUR 18U 30	JOSE JIMENEZ GONZALEZ	SI		$ 10.084.505	26/11/2020	14/1/2021	26/11/2020	0%	0%	10%	0%	10%	30%	60%	65%	65%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	MV_4661	KR 18N 67C 13 SUR	MARTHA PATRICIA CORTES HERNANDE	SI		$ 11.699.250	3/12/2020	30/12/2020	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	20%	25%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	MV_4660	CL 67C SUR 18N 03	BLANCA EDELMIRA SANCHEZ	SI		$ 11.042.292	2/12/2020	7/1/2021	2/12/2020	0%	0%	0%	10%	10%	40%	60%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	MV_4891	KR 18N 68 10 SUR	DEYANIRA MARIA ROMERO	SI		$ 10.388.647	3/12/2020	12/1/2021	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	MV_4886	DG 68A SUR 18M 54	EMMA TEOFILDE MATEUS DE PINEDA	SI		$ 11.363.584	3/12/2020	15/12/2020	3/12/2020	0%	0%	5%	5%	5%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	MV_3805	CL 67C SUR 18U 20	LUZ MARY VARGAS ARDILA	SI		$ 11.442.164	28/11/2020	22/1/2021	28/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	MV_3804	CL 67C SUR 18U 10	MARIA ANA CELIA	SI		$ 10.815.665	28/11/2020	20/1/2021	28/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%	10%	30%	40%	70%	70%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	MV_3857	KR 18U 66B 90 SUR	CECILIA MEJÍA DE RODRÍGUEZ	SI		$ 11.826.451	28/11/2020	7/1/2021	28/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	MV_4717	KR 18P BIS 67C 08 SUR	ARACELY ZAMBRANO ROJAS	SI		$ 11.826.064	3/12/2020	21/1/2021	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	MV_4630	CL 67C SUR 18N 23	MARÍA FELISA CRUZ VARGAS	SI		$ 10.903.004	4/12/2020	24/2/2021	4/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	60%	75%	90%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RELACIÓN MV – INFORME SEMANA 22

EDWIN NÚÑEZ

1	MV_2711	TV 18Q 69A 26 SUR	DANIEL LEON GOMEZ
2	MV_2710	TV 18Q 69A 32 SUR	MARIA HUERTAS ARIAS
3	MV_2709	TV 18Q 69A 40 SUR	ANA GOMEZ LEAL
4	MV_2702	TV 18Q 69A 85 SUR	LUZ LELLY OSORIO
6	MV_2707	TV 18Q 69A 40 SUR	EIDER GONZALEZ CARDONA
7	MV_2717	TV 18P BIS A 69A 86 SUR	LUIS SERRATO LOPEZ
8	MV_2720	TV 18P BIS A 69A 74 SUR	JEISSON NIÑO BAQUERO
9	MV_2721	TV 18P BIS A 69A 70 SUR	GILBERTO AMAYA AMAYA
10	MV_2700	TV 18P BIS A 69A 85 SUR	FLOR CHIA DIAZ
11	MV_2724	TV 18P BIS A 69A 58 SUR	MARCO LEON CASTIBLANCO
12	MV_2727	TV 18P BIS A 69A 44 SUR	RAMONA TAFUR
13	MV_2728	TV 18P BIS A 69A 40 SUR	LEONOR PINZON
14	MV_2729	TV 18P BIS A 69A 36 SUR	JAIME GONZALEZ CARVAJAL
15	MV_2726	TV 18P BIS 68A 48 SUR	MARIA E. SÁNCHEZ SÁNCHEZ
1	MV_2714	DG 69A SUR 18P 51	LUZ TORRES GARCIA
16	MV_2731	TV 18P BIS A 69A 32 SUR	GLORIA EDITH MARTÍNEZ LÓPEZ
17	MV_2735	TV 18P BIS A 69A 20 SUR	LUZ MERY TRIBIÑO RODRÍGUEZ
18	MV_2715	TV 18P BIS A 69A 11 SUR	NURY SÁNCHEZ CALDERÓN
19	MV_2738	TV 18P BIS A 69A 08 SUR	MARÍA DIOMEDES GARCÍA DE TORRES
20	MV_2743	TV 18P BIS 69A 11 SUR	MARÍA DEL CARMEN MORENO
21	MV_2751	TV 18P BIS 69A 35 SUR	MARÍA DE LOS ÁNGELES SOTO BERMÚDEZ
22	MV_3465	TV 18P BIS 69A 74 SUR	GLORIA RUEDA RAMIREZ
23	MV_3473	TV 18P BIS 69A 48 SUR	OLGA INES BARRAGAN AVENDAÑO
24	MV_3482	TV 18P BIS 69A 30 SUR	DORA ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ
25	MV_3490	TV 18P BIS 69A 14 SUR	EMMA SANCHEZ CALDERON
26	MV_3502	TV 18P 69A 19 SUR	JOSE FOCION SOTO SILVA
27	MV_3509	TV 18P 69A 33 SUR	MARLENY MONDRAGON AGUDELO
28	MV_3510	TV 18P 69A 35 SUR	JOSE MANUEL VEGA TOVAR
29	MV_3512	TV 18P 69A 39 SUR	ERNESTINA DEFELIPE GARCIA
30	MV_3542	TV 18P 69A 58 SUR	LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ
62	MV_ 1948	KR 19 BIS 68C 30 SUR	ANA GARCIA GARCIA
57	MV_ 0970	CL 68B SUR 18X 51	MARIA ELENA RAMIREZ

59	MV_ 0940	CL 68B SUR 18X 68	MARIA CORREA GARZON	
60	MV_ 0923	CL 68 SUR 19 32	OCTAVIO OSORIO	
56	MV_ 0963	CL 68 BIS SUR 18Z 04	JULIO ARROYO BRIÑEZ	
55	MV_ 0964	CL 68 BIS SUR 18Z 08	CARLOS CAMARGO MUÑOZ	
58	MV_ 0974	CL 68B SUR 18X 27	MARIA AVILA PEREZ	
49	MV_ 0749	KR 19A 66C 56 SUR	MARIA RIVERA RODRIGUEZ	
50	MV_0833	KR 19 BIS 67D 25 SUR	JOSE PINEDA LOPEZ	
51	MV_ 2167	DG 68C SUR 18Y 05	MARIA CORTES RODRIGUEZ	
52	MV_ 1002	CL 68B BIS SUR 18X 13	RAMON CALDERON ANDRADE	
53	MV_ 0989	CL 68B BIS A SUR 18X 38	ILADISLAO MAPE LEIVA	
54	MV_ 0979	CL 68B BIS SUR 18Z 07	BERNARDO CORREDOR	
61	MV_ 1947	KR 19 BIS 68C 30 SUR	FERMIN AVILA	

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	INF 22

Union Temporal MIC Viviendas 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	695-2020			**Plazo**	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo II			**Acta de inicio**	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	**CRP No.**		**Valor del contrato**	**3.728.543.252**

Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de	701-2020			**Plazo**	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			**Acta de inicio**	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	**CRP No.**		**Valor del contrato**	**894.285.952,00**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Juan Pablo II, Ciudad Bolivar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**				**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	Renuncia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	Mauricio Martinez	2	44	44	44	-	2	2	0	42	0	91,89%	42
			0		0	-		0	0	0	0	0,00%	0
Técnico Responsable			0		0	-		0	0	0	0	0,00%	0
		2	0		0	-		0	0	0	0	0,00%	0
Subtotal			**44**	**44**	**44**	**-**	**2**	**2**	**0**	**42**	**0**	**91,89%**	**42**

AVANCE DE VALIDACION SEMANAL										NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO					FEBRERO								
Proyecto: Juan Pablo II				**FASE I**			**Tiempo Programacion**			SEMANA DEL 4 AL 8	SEMANA DEL 9 AL 15	SEMANA DEL 16 AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 6	SEMANA DEL 07 AL 13	SEMANA DEL 14 AL 20	SEMANA DEL 21 AL 27	SEMANA DEL 28 AL 03	SEMANA DEL 04 AL 10	SEMANA DEL 11 AL 17	SEMANA DEL 18 AL 24	SEMANA DEL 25 AL 31	SEMANA DEL 01 AL 07	SEMANA DEL 08 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28					
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	**V/ Validada**	**V/ Modificada**	**V/Inicial**	**Fecha inicio**	**Fecha terminacion programada**	**F. Inicio**	**1 semana**	**2 semana**	**3 semana**	**4 semana**	**5 semana**	**6 SEMANA**	**7 SEMANA**	**8 SEMANA**	**9 SEMANA**	**10 SEMANA**	**11 SEMANA**	**12 SEMANA**	**13 SEMANA**	**14 SEMANA**	**15 SEMANA**	**16 SEMANA**	**17 SEMANA**	**18 SEMANA**	**19 SEMANA**	**20 SEMANA**	**21 SEMANA**	**22 SEMANA**
1	MV_2711	TV 18Q 69A 26 SUR	DANIEL LEON GOMEZ	SI		$ 10.420.222,80	24 de noviembre de 2020	09 de diciembre de 2020	24 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	6%	25%	52%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				NO																											
2	MV_2710	TV 18Q 69A 32 SUR	MARIA HUERTAS ARIAS	SI		$ 11.821.551,40	30 de noviembre de 2020	15 de diciembre 2020	30 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	4%	38%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				NO																											
3	MV_2709	TV 18Q 69A 40 SUR	ANA GOMEZ LEAL	SI		$ 11.826.641,40	30 de noviembre de 2020	15de diciembre 2020	30 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	6%	27%	37%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				NO																											
4	MV_2702	TV 18Q 69A 85 SUR	LUZ LELLY OSORIO	SI		$ 9.867.133,40	26 de noviembre de 2020	11 de diciembre 2020	26 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	20%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				NO																											
6	MV_2707	TV 18Q 69A 40 SUR	EIDER GONZALEZ CARDONA	SI		$ 9.598.934,00	25 de noviembre de 2020	10 de diciembre de 2020	25 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	3%	5%	45%	79%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				NO																											
7	MV_2717	TV 18P BIS A 69A 86 SUR	LUIS SERRATO LOPEZ	SI		$ 11.123.195,90	05 de diciembre de 2020	20 de diciembre de 2020	05 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	1%	19%	33%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				NO																											
8	MV_2720	TV 18P BIS A 69A 74 SUR	JEISSON NIÑO BAQUERO	SI		$ 11.827.340,30	27 de noviembre de 2020	12 de diciembre 2020	27 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	3%	37%	45%	68%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				NO																											
9	MV_2721	TV 18P BIS A 69A 70 SUR	GILBERTO AMAYA AMAYA	SI		$ 11.779.588,00	05 de diciembre de 2020	20 de diciembre de 2020	05 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	19%	65%	90%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				NO																											
10	MV_2700	TV 18P BIS A 69A 85 SUR	FLOR CHIA DIAZ	SI		$ 11.792.851,20	24 de noviembre de 2020	09 de diciembre de 2020	24 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	4%	10%	39%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				NO																											
11	MV_2724	TV 18P BIS A 69A 58 SUR	MARCO LEON CASTIBLANCO	SI		$ 11.806.491,50	26 de noviembre de 2020	11 de diciembre de 2020	26 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	1%	39%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				NO																											
12	MV_2727	TV 18P BIS A 69A 44 SUR	RAMONA TAFUR	SI		$ 11.796.989,70	25 de noviembre de 2020	10 de diciembre de 2020	25 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	6%	35%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				NO																											

13	MV_2728	TV 18P BIS A 69A 40 SUR	LEONOR PINZON	SI NO		$ 11.262.132,00	24 de noviembre de 2020	09 de diciembre de 2020	24 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	7%	20%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	MV_2729	TV 18P BIS A 69A 36 SUR	JAIME GONZALEZ CARVAJAL	SI NO		$ 11.803.771,80	24 de noviembre de 2020	09 de diciembre de 2020	24 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	3%	13%	55%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	MV_2726	TV 18P BIS 68A 48 SUR	MARIA E. SÁNCHEZ SÁNCHEZ	SI NO		$ 11.795.110,70	26 de noviembre de 2020	11 de diciembre de 2020	26 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	2%	35%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	MV_2714	DG 69A SUR 18P 51	LUZ TORRES GARCIA	SI NO		$ 9.162.951,70	08 de enero de 2021	23 de enero de 2021	08 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	6%	20%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	MV_2731	TV 18P BIS A 69A 32 SUR	ORIA EDITH MARTÍNEZ LÓP	SI NO		$ 11.425.873,70	23 de diciembre de 2020	07 de enerode 2021	23 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	19%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	MV_2735	TV 18P BIS A 69A 20 SUR	IZ MERY TRIBIÑO RODRÍGU	SI NO		$ 11.054.335,80	29 de diciembre de 2020	13 de enero de 2021	29 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	27%	79%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	MV_2715	TV 18P BIS A 69A 11 SUR	NURY SÁNCHEZ CALDERÓN	SI NO		$ 10.514.713,60	04 de enero de 2021	19 de enero de 2021	04 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	MV_2738	TV 18P BIS A 69A 08 SUR	A DIOMEDES GARCÍA DE TO	SI NO		$ 11.679.195,90	04 de enero de 2021	19 de enero de 2021	04 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	MV_2743	TV 18P BIS 69A 11 SUR	MARÍA DEL CARMEN MOREN	SI NO		$ 11.254.171,70	07 de enero de 2021	22 de enero de 2021	07 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	12%	18%	39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	MV_2751	TV 18P BIS 69A 35 SUR	DE LOS ÁNGELES SOTO BE	SI NO		$ 11.218.597,60	23 de diciembre de 2020	07 de enero de 2021	23 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	19%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	MV_3465	TV 18P BIS 69A 74 SUR	GLORIA RUEDA RAMIREZ	SI NO		$ 10.954.939,50	08 de enero de 2021	23 de enero de 2021	08 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	MV_3473	TV 18P BIS 69A 48 SUR	A INES BARRAGAN AVEND	SI NO		$ 9.858.823,00	06 de enero de 2021	21 de enero de 2021	06 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	36%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	MV_3482	TV 18P BIS 69A 30 SUR	RA ALICIA ORTIZ RODRIGU	SI NO		$ 11.467.836,90	22 de diciembre de 2020	06 de enero de 2021	22 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	23%	55%	86%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	MV_3490	TV 18P BIS 69A 14 SUR	EMMA SANCHEZ CALDERÓN	SI NO		$ 10.971.484,10	05 de enero de 2021	20 de enero de 2021	05 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	MV_3502	TV 18P 69A 19 SUR	JOSE FOCION SOTO SILVA	SI NO		$ 11.823.893,70	05 de enero de 2021	20 de enero de 2021	05 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	35%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	MV_3509	TV 18P 69A 33 SUR	RLENY MONDRAGON AGUD	SI NO		$ 11.825.464,30	05 de enero de 2021	20 de enero de 2021	05 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	18%	86%	97%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	MV_3510	TV 18P 69A 35 SUR	JOSE MANUEL VEGA TOVAR	SI NO		$ 9.088.554,20	07 de enero de 2021	22 de enero de 2021	07 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	27%	78%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	MV_3512	TV 18P 69A 39 SUR	RNESTINA DEFELIPE GARC	SI NO		$ 11.819.644,80	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
30	MV_3542	TV 18P 69A 58 SUR	LEIDY JOHANNA RODRIGUE	SI NO		$ 11.825.393,80	24 de diciembre de 2020	08 de enero de 2021	24 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	7%	79%	93%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	MV_ 1948	KR 19 BIS 68C 30 SUR	ANA GARCIA GARCIA	SI NO		$ 10.728.843,10	21 de enero de 2021	05 de febrero de 2021	21 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	22%	32%	92%	97%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	MV_ 0970	CL 68B SUR 18X 51	MARIA ELENA RAMIREZ	SI NO		$ 10.579.067,40	20 de enero de 2021	04 de febrero de 2021	20 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	75%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	MV_ 0940	CL 68B SUR 18X 68	MARIA CORREA GARZON	SI NO		$ 11.622.662,40	20 de enero de 2021	04 de febrero de 2021	20 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	58%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	MV_ 0923	CL 68 SUR 19 32	OCTAVIO OSORIO	SI NO		$ 11.747.763,20	21 de enero de 2021	05 de febrero de 2021	21 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	17%	20%	43%	53%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	MV_ 0963	CL 68 BIS SUR 18Z 04	JULIO ARROYO BRIÑEZ	SI NO		$ 9.791.983,00	20 de enero de 2021	04 de febrero de 2021	20 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	36%	90%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	MV_ 0964	CL 68 BIS SUR 18Z 08	CARLOS CAMARGO MUÑOZ	SI NO		$ 11.675.007,00	20 de enero de 2021	04 de febrero de 2021	20 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	24%	38%	69%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	MV_ 0974	CL 68B SUR 18X 27	MARIA AVILA PEREZ	SI NO		$ 11.823.163,90	25 de enero de 2021	09 de febrero de 2021	25 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	20%	69%	89%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
49	MV_ 0749	KR 19A 66C 56 SUR	MARIA RIVERA RODRIGUEZ	SI NO		$ 10.034.154,70	29 de enero de 2021	13 de febrero de 2021	29 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	49%	65%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

50	MV_0833	KR 19 BIS 67D 25 SUR	JOSE PINEDA LOPEZ	SI NO		$ 10.532.166,70	29 de enero de 2021	13 de febrero de 2021	29 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	47%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	MV_ 2167	DG 68C SUR 18Y 05	MARIA CORTES RODRIGUE	SI NO		$ 11.345.233,10	02 de febrero de 2021	17 de febrero de 2021	02 de febrero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	16%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
52	MV_ 1002	CL 68B BIS SUR 18X 13	AMON CALDERON ANDRAD	SI NO		$ 11.736.925,80	30 de enero de 2021	14 de febrero de 2021	30 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	51%	95%	90%	100%	100%	100%	100%
53	MV_ 0989	CL 68B BIS A SUR 18X 38	ILADISLAO MAPE LEIVA	SI NO		$ 11.665.643,50	01 de febrero de 2021	16 de febrero de 2021	01 de febrero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%	29%	46%	75%	75%	100%	100%	100%
54	MV_ 0979	CL 68B BIS SUR 18Z 07	BERNARDO CORREDOR	SI		$ 11.716.112,20	02 de febrero de 2021	17 de febrero de 2021	02 de febrero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	39%	82%	85%	100%	100%	100%	100%
61	MV_ 1947	KR 19 BIS 68C 30 SUR	FERMIN AVILA	SI NO		$ 10.785.055	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

RELACIÓN MV – INFORME SEMANA 22

Ing. MAURICIO MARTÍNEZ

1	MVCB-3543	TV 18P 69 A 54 SUR	ELIZABETH CANO TRIANA
2	MVCB-3546	TV 18P 69 A 44 SUR	LEONILDE LUNA
3	MVCB-3549	TV 18P 69 A 36 SUR	FLOR MARINA RODRIGUEZ
4	MVCB-3561	TV 18P 69 A 12 SUR	JAIRO MONTOYA
5	MVCB-3573	TV 18N BIS A 69 A 27 SUR	CECILIA ULLOA DE VASALLO
6	MVCB-3574	TV 18N BIS A 69 A 31 SUR	MARIA ROSALBA BARBOSOA
7	MVCB-3579	TV 18N BIS A 69 A 51 SUR	WILSON BARBOSA RAMIREZ
8	MVCB-3585	TV 18N BIS A 69 A 69 SUR	EMMA ALCIRA CELY
9	MVCB-3586	TV 18N BIS A 69 A 71 SUR	BLANCA CECILIA VARGAS SILVA
10	MVCB-3587	TV 18N BIS A 69 A 75 SUR	EMPERATRIZ ESPITIA DAZA
11	MVCB-3588	TV 18N BIS A 69 A 79 SUR	MARIA ISABEL CARRASCO BERNAL
12	MVCB-3591	TV 18N BIS A 69 A 91 SUR	LUCY CEPEDA MARENTES
13	MVCB-3593	TV 18N BIS A 69 A 95 SUR	ANGEL MARIA LOZANO SALAZAR
14	MVCB-3597	DG 69C SUR 18N38	FLOR ALBA VEGA BUITRAGO
15	MVCB-3599	TV 18N BIS A 69 A 90 SUR	ROSA ELVIRA DUCUARA DE DUCUARA
16	MVCB-3601	TV 18N BIS A 69 A 82 SUR	LUIS FERNANDO ARIZA MEDINA
17	MVCB-3602	TV 18N BIS A 69 A 78 SUR	LUZ MYRIAN MENDEZ CARDENAS
18	MVCB-3605	TV 18 BIS A 69 A 66 SUR	ETELVINA LOPEZ CAMARGO
19	MVCB-3608	TV 18N BIS A 69 A 56 SUR	YERLYAMPARODUCUARA DUCUARA
20	MVCB-3612	TV 18N BIS A 69 A 46 SUR	DIMAS MORENO JIMENEZ Y OTRA
21	MVCB-3615	TV 18N BIS A 69 A 34 SUR	ANGILBERTO URREGO ORTIZ
22	MVCB-3619	TV 18N BIS A 69 A 18 SUR	FABIOLA LOPEZ CARDENAS
23	MVCB-3622	TV 18N BIS A 69 A 06 SUR	ISIDRO FLORIAN FRANCO
24	MVCB-3631	TV 18N BIS 69 A 35 SUR	MARIA VIBIAN REYES CASTELLANOS
25	MVCB-3653	DG 69 A SUR 18 M 44	MARIA DEL CARMNE DE SALVADOR GARAY
26	MVCB-3654	DG 69 A SUR 18 N 02	MARIELA AGUILAR QUINTERO
27	MVCB-3456	DG 69 A SUR 18 N 10	MIGUELANTONIO JIMENEZ REYES
28	MVCB-3429	DG 69 A SUR 18 P 12	PASCUALA NIEVES CHACON
29	MVCB-3430	DG 69 A SUR 18 P 16	HECTOR JOSE ARIAS
30	MVCB-3440	KR 18 Q 69 32 SUR	YMELDA RUIZ RODRIGUEZ
31	MVCB-3443	KR 18 Q 69 02 SUR	JULIO CESAR LEON LEON Y OTROS
32	MVCB-3370	TV 18 Q 69 A 05 SUR	MARIA SOLDEDAD GARCIA CARDONA Y OTRO
33	MVCB-3372	TV 18Q 69A 15 SUR	YEIMY INES RAMIREZ GRISALES Y OTROS
34	MVCB-3217	KR 18Q BIS B 69 75 SUR	MARIA FANNY VERGARA ARENAS

35	MVCB-3201	KR 18R 69 72 SUR	OFELIA EVANGELINA VELASQUEZ GONZALEZ Y OTRO
36	MVCB-3198	KR 18R 69 90 SUR	MARIA DEL CARMEN VEGA GAMEZ
37	MVCB-3167	KR 18R 69 45 SUR	AURA ROSA GOMEZ DE BEDOYA
38	MVCB-2310	KR 18R BIS 69 31 SUR	SERAFINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
39	MVCB-2243	TV 18R BIS A 69 84 SUR	ELIAS BARRIGA MORENO
40	MVCB-3134	KR 18R BIS 69 76 SUR	RUBI STELLA FORERO
41	MVCB-3235	KR 18R BIS 69B 10 SUR	JOSE GABRIEL OSPINA
42	MVCB-2336	KR 18R BIS 69B 17 SUR	JORGE HERNANDO PARRA RINCON
43	MVCB-3233	KR 18R BIS 69B 22 SUR	SAUL JIMENEZ
44	MVCB-3242	KR 18R 69B 23 SUR	JOSE MELECIO LEON
45	MVCB-3244	KR 18R 69B 31 SUR	CLAUDIA MARÍA SÁNCHEZ
46	MVCB-3228	KR 18R BIS 69B 40 SUR	MARIA DE JESUS RAMIREZ DE CHITIVA
47	MVCB-3223	KR 18R BIS 69B 60 SUR	LUZ MARIA ARIZA RONCANCIO
48	MVCB-2864	DG 69C SUR 18N 69	MIRIAN PEÑUELA GOMEZ
49	MVCB-2842	DG 69C BIS SUR 18P 04	GUILLERMINA HERNÁNDEZ GORDILLO
50	MVCB-3539	TV 18 P 69 A 68 SUR	MARTHA ISABEL BECERRA MERIDA
51	MVCB-2753	TV 18 P BIS 69 A 43 SUR	EDNA MERIZA GARZON TIRADO
52	MVCB-2756	TV 18 P BIS 69 A 55 SUR	FLORA MARIA IBAÑEZ CORREA
53	MVCB-3405	DG 69 SUR 18 N 66	ELENA VILLALOBOS APONTE
54	MVCB-3397	DG 69 SUR 18 N 34	MAURA INES RODRIGUEZ
55	MVCB-3413	DG 68 B SUR 18 P 35	ELIANA ACUÑA ARENAS
56	MVCB-0239	CALLE 65 BIS SUR 18 N 81	GLORIA EZEQUIELA VIRGUEZ CASTELLANOS

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **5-abr-21**

Union Temporal MIC Viviendas 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	695-2020			**Plazo**	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo II			**Acta de inicio**	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	**CRP No.**		**Valor del contrato**	**3.728.543.252**

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de	701-2020			**Plazo**	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			**Acta de inicio**	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	**CRP No.**		**Valor del contrato**	**894.285.952,00**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT

Territorio o barrio a intervenir	JUAN PABLO II	Barrios	Predios	Total Predios	Validación				Fase 2: Ejecución de obras: Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	Renunucia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	Ing. MAURICIO MARTINEZ	JUAN PABLO II	56	56	55	0	1	0	0	55	0	98,21%	55
		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
Técnico Responsable		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
	Subtotal		56	56	55	0	1	0	0	55	0	0,00%	55

SEMANAS EN EJECUCIÓN

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			NOVIEMBRE				DICIEMBRE					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	SEMANA DEL 4 AL 8	SEMANA DEL 9 AL 15	SEMANA DEL 16AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 06	SEMANA DEL 7 AL 13	SEMANA DEL 14 AL 20	SEMANA DEL 21 AL 27	SEMANA DEL 28 AL 3	SEMANA DEL 4 AL 10	SEMANA DEL 11 AL 17	SEMANA DEL 18 AL 24	SEMANA DEL 25 AL 31	SEMANA DEL 1 AL 07	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28	SEMANA DEL 1 AL 7	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28	SEMANA DEL 29 AL 04
										1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	5 semana	6 semana	7 semana	8 semana	9 semana	10 semana	11 semana	12 semana	13 semana	14 semana	15 semana	16 semana	17 semana	18 semana	19 semana	20 semana	21 semana	22 semana
1	MVCB-3543	TV 18P 69 A 54 SUR	ELIZABETH CANO TRIANA	SI		$11.769.976	27/11/2020	30/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	3%	9%	11%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	MVCB-3546	TV 18P 69 A 44 SUR	LEONILDE LUNA	SI		$11.104.516	25/11/2020	28/12/2020	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	3%	4%	9%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	MVCB-3549	TV 18P 69 A 36 SUR	FLOR MARINA RODRIGUEZ	SI		$11.771.484	24/11/2020	17/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	19%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	MVCB-3561	TV 18P 69 A 12 SUR	JAIRO MONTOYA	SI		$11.496.789	24/11/2020	17/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	17%	3%	12%	68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	MVCB-3573	TV 18N BIS A 69 A 27 SUR	CECILIA ULLOA DE VASALLO	SI		$9.490.974	28/11/2020	30/12/2020	28/11/2020	0%	0%	0%	16%	0%	0%	24%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	MVCB-3574	TV 18N BIS A 69 A 31 SUR	MARIA ROSALBA BARBOSOA	NO		$11.745.243	18/12/2020	3/01/2021	18/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	40%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	MVCB-3579	TV 18N BIS A 69 A 51 SUR	WILSON BARBOSA RAMIREZ	SI		$11.721.616	27/11/2020	22/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	11%	26%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	MVCB-3585	TV 18N BIS A 69 A 69 SUR	EMMA ALCIRA CELY	SI		$11.214.097	24/11/2020	18/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	15%	57%	66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	MVCB-3586	TV 18N BIS A 69 A 71 SUR	BLANCA CECILIA VARGAS SILVA	NO		$11.128.646	28/11/2020	13/12/2020	28/11/2020	0%	0%	0%	0%	1%	2%	7%	30%	70%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	MVCB-3587	TV 18N BIS A 69 A 75 SUR	EMPERATRIZ ESPITIA DAZA	SI		$11.798.131	27/11/2020	17/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	18%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	MVCB-3588	TV 18N BIS A 69 A 79 SUR	MARIA ISABEL CARRASCO BERNAL	SI		$11.815.284	RENUNCIO	RENUNCIO	RENUNCIO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	MVCB-3591	TV 18N BIS A 69 A 91 SUR	LUCY CEPEDA MARENTES	SI		$11.088.496	27/11/2020	29/12/1900	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	9%	15%	15%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	MVCB-3593	TV 18N BIS A 69 A 95 SUR	ANGEL MARIA LOZANO SALAZAR	SI		$11.818.599	28/11/2020	23/12/2020	28/11/2020	0%	0%	0%	0%	24%	51%	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	MVCB-3597	DG 69C SUR 18N38	FLOR ALBA VEGA BUITRAGO	SI		$9.154.115	1/12/2020	5/01/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	11%	13%	13%	40%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	MVCB-3599	TV 18N BIS A 69 A 90 SUR	ROSA ELVIRA DUCUARA DE DUCUARA	SI		$11.022.315	1/12/2020	5/01/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	10%	24%	24%	95%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	MVCB-3601	TV 18N BIS A 69 A 82 SUR	LUIS FERNANDO ARIZA MEDINA	SI		$11.825.152	3/12/2020	23/12/2020	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	11%	17%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	MVCB-3602	TV 18N BIS A 69 A 78 SUR	LUZ MYRIAN MENDEZ CARDENAS	NO		$11.558.417	3/12/2020	29/12/2020	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	1%	1%	12%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	MVCB-3605	TV 18 BIS A 69 A 66 SUR	ETELVINA LOPEZ CAMARGO	SI		$11.775.906	5/01/2020	20/01/2020	5/01/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	12%	13%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	MVCB-3608	TV 18N BIS A 69 A 56 SUR	YERLYAMPARODUCUARA DUCUARA	SI		$11.782.662	17/12/2020	J/01/2021	17/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	40%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	MVCB-3612	TV 18N BIS A 69 A 46 SUR	DIMAS MORENO JIMENEZ Y OTRA	SI		$11.829.082	7/01/2021	22/01/2021	7/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	33%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	MVCB-3615	TV 18N BIS A 69 A 34 SUR	ANGILBERTO URREGO ORTIZ	SI		$11.824.681	22/12/2021	7/01/2021	22/12/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	24%	39%	67%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	MVCB-3619	TV 18N BIS A 69 A 18 SUR	FABIOLA LOPEZ CARDENAS	SI		$11.824.365	6/01/2021	21/01/2021	6/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	15%	41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	MVCB-3622	TV 18N BIS A 69 A 06 SUR	ISIDRO FLORIAN FRANCO	SI		$11.752.371	6/01/2021	21/01/2021	6/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	46%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	MVCB-3631	TV 18N BIS 69 A 35 SUR	MARIA VIBIAN REYES CASTELLANOS	SI		$10.940.919	8/01/2021	23/01/2021	8/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	MVCB-3653	DG 69 A SUR 18 M 44	MARIA DEL CARMNE DE SALVADOR GARAY	SI		$11.117.257	8/01/2021	23/01/2021	8/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	47%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	MVCB-3654	DG 69 A SUR 18 N 02	MARIELA AGUILAR QUINTERO	SI		$11.754.528	8/01/2021	23/01/2021	8/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	36%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	MVCB-3656	DG 69 A SUR 18 N 10	MIGUELANTONIO JIMENEZ REYES	SI		$11.448.661	6/01/2021	21/01/2021	6/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	MVCB-3429	DG 69 A SUR 18 P 12	PASCUALA NIEVES CHACON	SI		$11.395.762	5/01/2020	20/01/2021	5/01/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	13%	56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	MVCB-3430	DG 69 A SUR 18 P 16	HECTOR JOSE ARIAS	SI		$9.381.960	7/01/2021	22/01/2021	7/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	MVCB-3440	KR 18 Q 69 32 SUR	YMELDA RUIZ RODRIGUEZ	SI		$11.665.417	13/01/2021	28/01/2021	13/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	27%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

31	MVCB-3443	KR 18 Q 69 02 SUR	JULIO CESAR LEON LEON Y OTROS	SI NO		$11.728.127	15/01/2021	30/01/2021	15/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	30%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	MVCB-3370	TV 18 Q 69 A 05 SUR	MARIA SOLDEDAD GARCIA CARDONA Y OTRO	SI NO		$11.573.343	5/02/2021	20/02/2021	5/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	75%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	MVCB-3372	TV 18Q 69A 15 SUR	YEIMY INES RAMIREZ GIRSALES Y OTROS	SI NO		$9.940.081	16/02/2021	3/03/2021	16/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	45%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
34	MVCB-3217	KR 18Q BIS B 69 75 SUR	MARIA FANNY VERGARA ARENAS	SI NO		$11.819.618	16/02/2021	3/03/2021	16/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	23%	33%	100%	100%	100%	100%	100%
35	MVCB-3201	KR 18R 69 72 SUR	OFELIA EVANGELINA VELASQUEZ GONZALEZ Y OTRO	SI NO		$11.820.609	22/01/2021	8/01/2021	22/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	30%	43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	MVCB-3198	KR 18R 69 90 SUR	MARIA DEL CARMEN VEGA GAMEZ	SI NO		$9.645.950	25/01/2021	10/02/2021	25/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	35%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	MVCB-3167	KR 18R 69 45 SUR	AURA ROSA GOMEZ DE BEDOYA	SI NO		$11.812.070	21/01/2021	6/01/2021	21/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	MVCB-2310	KR 18R BIS 69 31 SUR	SERAFINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ	SI NO		$11.362.322	3/02/2021	18/02/2021	3/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	30%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	MVCB-2243	TV 18R BIS A 69 84 SUR	ELIAS BARRIGA MORENO	SI NO		$11.734.616	5/02/2021	20/02/2021	5/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	MVCB-3134	KR 18R BIS 69 76 SUR	RUBI STELLA FORERO	SI NO		$11.424.724	12/02/2021	27/02/2021	12/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	41%	90%	100%	100%	100%	100%
41	MVCB-3235	KR 18R BIS 69B 10 SUR	JOSE GABRIEL OSPINA	SI NO		$11.354.628	29/01/2021	14/02/2021	29/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	20%	28%	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	MVCB-2336	KR 18R BIS 69B 17 SUR	JORGE HERNANDO PARRA RINCON	SI NO		$11.798.186	12/02/2021	27/02/2021	12/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	36%	95%	100%	100%	100%	100%
43	MVCB-3233	KR 18R BIS 69B 22 SUR	SAUL JIMENEZ	SI NO		$11.682.254	9/02/2021	24/02/2021	9/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	30%	43%	95%	100%	100%	100%	100%
44	MVCB-3242	KR 18R 69B 23 SUR	JOSE MELECIO LEON	SI NO		$11.268.656	5/02/2021	20/02/2021	5/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	MVCB-3244	KR 18R 69B 31 SUR	CLAUDIA MARÍA SÁNCHEZ	SI NO		$11.482.438	11/02/2021	26/02/2021	11/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
46	MVCB-3228	KR 18R BIS 69B 40 SUR	MARIA DE JESUS RAMIREZ DE CHITIVA	SI NO		$11.341.862	3/02/2021	18/02/2021	3/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	25%	55%	60%	95%	100%	100%	100%	100%
47	MVCB-3223	KR 18R BIS 69B 60 SUR	LUZ MARIA ARIZA RONCANCIO	SI NO		$11.537.614	27/01/2021	12/02/2021	27/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	MVCB-2864	DG 69C SUR 18N 69	MIRIAN PEÑUELA GOMEZ	SI NO		$11.002.190	16/02/2021	3/03/2021	16/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	70%	90%	95%	100%	100%
49	MVCB-2842	DG 69C BIS SUR 18P 04	GUILLERMINA HERNÁNDEZ GORDILLO	SI NO		$11.750.793	23/02/2021	11/03/2021	23/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	80%	90%	100%	100%	100%
50	MVCB-3539	TV 18 P 69 A 68 SUR	MARTHA ISABEL BECERRA MERIDA	SI NO		$8.595.833	25/02/2021	12/03/2021	25/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	90%	87%	100%	100%
51	MVCB-2753	TV 18 P BIS 69 A 43 SUR	EDNA MERIZA GARZON TIRADO	SI NO		$11.695.107	2/03/2021	17/03/2021	2/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	43%	100%	100%
52	MVCB-2756	TV 18 P BIS 69 A 55 SUR	FLORA MARIA IBAÑEZ CORREA	SI NO		$11.606.120	2/03/2021	17/03/2021	2/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	40%	100%	100%
53	MVCB-3405	DG 69 SUR 18 N 66	ELENA VILLALOBOS APONTE	SI NO		$10.783.745	10/03/2021	25/03/2021	10/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	53%	100%
54	MVCB-3397	DG 69 SUR 18 N 34	MAURA INES RODRIGUEZ	SI NO		$11.815.419	8/03/2021	23/03/2021	8/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	36%	50%	100%
55	MVCB-3413	DG 68 B SUR 18 P 35	ELIANA ACUÑA ARENAS	SI NO		$11.828.963	5/03/2021	20/03/2021	5/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	42%	81%	100%
56	MVCB-0239	CALLE 65 BIS SUR 18 N 81	GLORIA EZEQUIELA VIRGUEZ CASTELLANOS	SI NO		$11.079.670	10/03/2021	25/03/2021	10/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	45%	100%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES & INTERVENTORES

FECHA	5/04/2021	PERIODO No.	11	DEL	29/03/2021	AL	5/03/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 2, la ejecución de 253 mejoramientos de vivienda, localizados en 5 localidades: Usaquén, Santafé, Rafael Uribe Uribe, Suba, Santafé y Ciudad Bolívar, esta última incluye una (1) Intervención de Mejoramiento Integral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	695--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	894.285.952	VALOR INICIAL :	3.728.543.252,00
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	-150
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded segimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$0,00	#¡DIV/0!	


3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

Barrio o Territorio

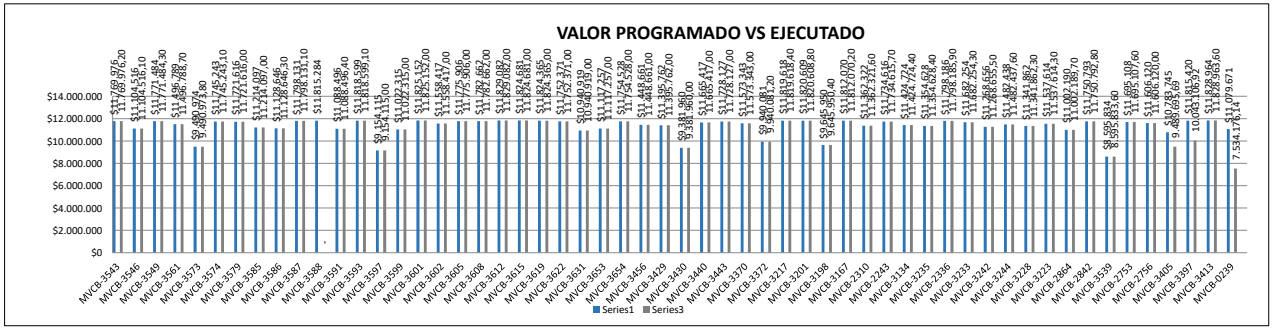

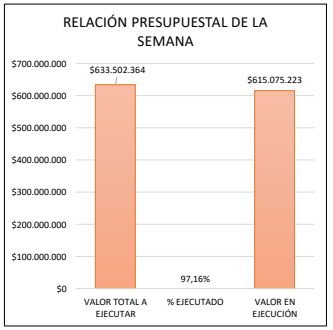

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA
BARRIO JUAN PABLO II
FECHA: 04/04/2021
MVCB_3543 : ELIZABETH CANO TRIANA: Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 30/12/2020
MVCB_3546 : LEONILDE LUNA : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 28/12/2020
MVCB_3549 : FLOR MARINA RODRIGUEZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 17/12/2020
MVCB_3561 : JAIRO MONTOYA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 17/12/2020
MVCB_3573 : CECILIA ULLOA DE VASALLO : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 30/12/2020
MVCB_3574 : MARIA ROSALBA BARBOSDA : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 29/01/2021
MVCB_3579 : WILSON BARBOSA RAMIREZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 22/12/2020
MVCB_3585 : EMMA ALCIRA CELY : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 18/12/2020
MVCB_3586 : BLANCA CECILIA VARGAS SILVA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 14/01/2021.
MVCB_3587 : EMPERATRIS ESPITIA DAZA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 17/12/2020.
MVCB_3588 : MARIA ISABEL CARRASCO BERNAL : RENUNCIA.
MVCB_3591 : LUCY CEPEDA MARENTES : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 29/12/2020.
MVCB_3593 : ANGEL MARIA LOZANOSALAZAR : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 23/12/2020.
MVCB_3597 : FLOR ALBA VEGA BUITRAGO Y OTROS : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 05/01/2021.
MVCB_3599 : ROSA ELVIRA DUCUARA DE DUCUARA : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 05/01/2021.
MVCB_3601 : LUIS FERNANDO ARIZA MEDINA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 23/12/2020.
MVCB_3602 LUZ MIRIAN MENDEZ CARDENAS : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 29/12/2020.
MVCB_3605 : ETELVINA LOPEZ CAMARGO : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 22/02/2021.
MVCB_3608 : YERLEY AMPARO DUCUARA DUCUARA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 15/01/2021.
MVCB_3612 :DIMAS MORENOJIMENEZ Y OTRA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 03/02/2021.
MVCB_3615 : ANGILBERTO URREGO ORTIZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 01/02/2021.
MVCB_3619 : FABIOLA LOPEZ CARDENAS : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 28/01/2021.
MVCB_3622 : ISIDRO FLORIAN FRANCO : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 28/01/2021.
MVCB_3631 : MARIA VIBIAN REYES CASTELLANOS : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 28/01/2021.
MVCB_3653 : MARIA DEL CARMEN DE SALVADOR GARAVITO : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 02/02/2021.
MVCB_3654 : MARIELA AGUILAR QUINTERO : PENDIENTE; Entrega de vivienda a beneficiarios el día 03/02/2021.
MVCB_3656 : MIGUEL ANTONIO JIMENEZ REYES : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 22/01/2021.
MVCB_3429 : PASCUALA NIEVES CHACON : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 29/01/2021.
MVCB_3430 : HECTOR JOSE ARIAS : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 22/01/2021.
MVCB_3440 : YMELDA RUIZ RODRIGUEZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 02/02/2021.
MVCB_3443 : JULIO CESAR LEON LEON Y OTRA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 05/02/2021.

MVCB_3370 : MARIA SOLEDAD GARCIA CARDONA Y OTRO : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 03/03/2021.
MVCB_3372 : YEYMY INES RAMIREZ GRISALES Y OTROS : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 10/03/2021.
MVCB_3217 : MARIA FANNY VERGARA ARENAS : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 10/03/2021.
MVCB_3201 : OFELIA EVANGELINA VELASQUEZ GONZALES Y OTROS : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 18/02/2021.
MVCB_3198 : MARIA DEL CARMEN VEGA GAMEZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 18/02/2021.
MVCB_3167 : AURA ROSA GOMEZ DE BEDOYA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 09/02/2021.
MVCB_2310 : SERAFINA HERNANDEZ RAMIREZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 23/02/2021.
MVCB_2243 : ELIAS BARRIGA MORENO : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 25/02/2021.
MVCB_3134 : RUBI STELLA FORERO : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 10/03/2021.
MVCB_3235 : JOSE GABRIEL OSPINA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 23/02/2021.
MVCB_2336 : JORGE HERNANDO PARRA RINCON : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 08/03/2021.
MVCB_3233 : SAUL JIMENEZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 08/03/2021.
MVCB_3242 : JOSE MELECIO LEON : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 23/02/2021.
MVCB_3244 : CLAUDIA MARIA SANCHEZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 05/03/2021.
MVCB_3228 : MARIA DE JESUS RAMIREZ DE CHITIVA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 12/03/2021.
MVCB_3223 : LUZ MARIA ARIZA RONCANCIO : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 09/02/2021.
MVCB_2864 : MIRIAN PEÑUELA GOMEZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 23/03/2021.
MVCB_2842 : GUILLERMINA HERNANDEZ GORDILLO : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 18/03/2021.
MVCB_3539 : MARTHA ISABEL BECERRA MERIDA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 26/03/2021.
MVCB_2753 : EDNA MERIZA GARZON TIRADO : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 26/03/2021.
MVCB_2756 : FLORA MARIA IBAÑEZ CORREA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 26/03/2021.
MVCB_3405 : ELENA VILLALOBOS APONTE : Se realiza chequeo de actividades para su posterior entrega.
MVCB_3397 : MAURA INES RODRIGUEZ : Se realiza chequeo de actividades para su posterior entrega.
MVCB_3413 : ELIANA ACUÑA ARENAS : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 26/03/2021.
MVCB_0239 : GLORIA EZEQUIELA VIRGUEZ CASTELLANOS : Se presentan dificultades en la ejecución de enchape de piso en la zona de alcobas puesto fue presupuestado baldosa anti deslizante y el contratista no dispone de este material.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio:_____JUAN PABLO II_____

Se presenta una preocupación en las viviendas en ejecución pues los materiales no son de una muy buena calidad, tenemos inconvenientes con los agregados y el pegacor que se están utilizando para intervenir las viviendas.
- En la arena se ha solicitado en varias ocasiones el certificado de cantera o ficha técnica.
- En cuestión del pegacor llego en un embolsado casero sin cumplir con un buen sellado y mucho menos tiene certificado de calidad.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






REGISTRO FOTOGRAFICO
MV - N° 3413



DESCRIPCION Y FECHA: 31-03-2021

ACTIVIDAD: ENTREGA DE VIVIENDA.



DESCRIPCION Y FECHA: 31-03-2021

ACTIVIDAD: ENTREGA DE VIVIENDA.



DESCRIPCION Y FECHA: 31-03-2021

ACTIVIDAD: ENTREGA DE VIVIENDA.



DESCRIPCION Y FECHA: 31-03-2021

ACTIVIDAD: ENTREGA DE VIVIENDA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV - N° 3405



DESCRIPCION Y FECHA: 31-03-2021

ACTIVIDAD: EJECUCION DE ENCHAPE EN COCINA Y MEZON.



DESCRIPCION Y FECHA: 31-03-2021

ACTIVIDAD: EJECUCION DE ENCHA EN ZONA DE ROPAS.



DESCRIPCION Y FECHA: 31-03-2021

ACTIVIDAD: EJECUCION DE NECHAPE EN BAÑO.



DESCRIPCION Y FECHA: 31-03-2021

ACTIVIDAD: EJECUCIÓN DE ENCHAPE EN ALCOBA 2.

RELACIÓN MV – INFORME SEMANA 22

MILLER ALBERTO CASTAÑEDA

1	3446	DG 69 SUR 18N 83	ANA DE DIOS MANSO DE BATERO
2	3450	DG 69 SUR18 N 65	ABAD LOPEZ CARDONA
3	3662	DG 69 SUR 18 M 69	MARCELINA ROJAS VILLABONA
4	3664	DG 69 SUR 18M 61	MARCO JULIO TORRES RAVELO
5	2610	DG 69 SUR 18M 62	MARY LUZ GUTIERREZ
6	3666	DG 69 SUR 18M 51	MARIA AURORA SILVA VIUDA DE GARZON
7	3453	DG 69 SUR 18N 51	JUDITH RESTREPO CHAVES
8	2612	DG 69 SUR 18M 70	BLANCA LILIA PARRA DOMINGUEZ
9	3415	DG 68B SUR 18N 79	JOSE LELIS NERI GARZON SILVA
10	3420	DG 68B SUR 18N 57	MARCO TULIO RUBIO
11	3400	DG 69 SUR 18N 46	BETSABE MALAGON LOZANO
12	3661	DG 69 SUR 18M 73	ANA TULIA ROJAS
13	3668	DG 69 SUR 18M 43	ROSALBA PAEZ VASQUEZ
14	3670	DG 69 SUR 18M 35	ISABEL ADRIANA CORONADO ARIAS
15	2684	DG 68B SUR 18M 50	LIGIA JACOME NIETO
16	2618	DG 68B SUR 18M 51	GILBERTO SALAZAR PERDOMO
17	2620	DG 68B SUR 18M 43	MANUEL MARINO MOSQUERA MOSQUERA
18	2682	DG 68B SUR 18M 42	LEONOR MORENO MENDEZ
19	4707	KR 18P BIS 68 22 SUR MJ	MARIA ELADIA GIRALDO CASTAÑO
20	3393	DG 68A SUR 18N 41	ELIZABETH PACHON TELLEZ
21	4696	KR 18P 67C 44 SUR	LUIS EDGAR ALBARRACIN
22	3404	DG 69 SUR 18N 62	MARIA EUGENIA TORRES RAVELO Y OTRO
23	4687	DG 68A SUR 18N 50	SIXTA TULIA MARTINEZ MARTINEZ
24	4684	KR 18N BIS B 67C 59 SUR	LUIS ANTONIO PULIDO PRADA
25	4681	KR 18N BIS B 67C 43 SUR	ANA ROSA CRUZ CRUZ
26	4636	KR 18N BIS B 67C 58 SUR	ABRAHAN MUÑOZ CRUZ
27	2686	DG 68B SUR 18M 58	JAIRO PULIDO RUIZ Y OTRO
28	4695	KR 18P 67C 50 SUR	VITELVINA MONTES GOMEZ
29	4680	KR 18N BIS B 67C 35 SUR	MISAEL LEON PEREZ
30	4679	KR 18N BIS B 67C 31 SUR	SAIN FAJARDO VANEGAS
31	4637	KR 18N BIS B 67C 52 SUR	INES AURORA ACERO BAQUERO

32	3452	DG 69 SUR 18N 55	BRIGETTE CORDOBA GOMEZ
33	3349	DG 68B SUR 18Q 57	LUCILA BALLESTEROS SOLANO
34	3348	DG 68B SUR 18Q 67	JOHN JIMMY DAZA ANTOLINEZ
35	3195	KR 18Q BIS B 68B 09 SUR	YAZMIN ALICIA TRIANA GUERRERO
36	3175	KR 18R 68 84 SUR	AMANDA FLORIAN
37	3157	KR 18R 68 75 SUR	EDILMA MARIA POVEDA HERNANDEZ
38	3366	DG 69 SUR 18Q 13	LUZ STELLA LOPEZ FLOREZ Y OTRO
39	3363	DG 69 SUR 18Q 31	MIRIAN OSORIO RAMÍREZ
40	3209	DG 69 SUR 18Q 65	MARTHA ISABEL GAMBOA LIZARAZO
41	3211	KR 18Q BIS B 69 17 SUR	MARIA INES LIZARAZO DE GAMBOA Y OTRO
42	3212	KR 18Q BIS B 69 25 SUR	HELBERTH ARTURO SOLORZA ACOSTA
43	3361	KR 18Q BIS B 69 24 SUR	OMAR CUBILLOS
44	4748	CL 68 SUR 18P 82 MJ	LUIS HERNANDO GRACIA ZAMORA
45	4733	KR 18P BIS A 67C 36 SUR	AURA MARIA LUZ CUESTA ROJAS
46	4753	KR 18Q 67C 24 SUR	MARIA DINA GOMEZ
47	4735	KR 18P BIS A 67C 22 SUR	MARIA ALCIRA BELTRAN AMAYA
48	4743	KR 18P BIS 67C 27 SUR	BERTILDA CAÑON ALFARO
49	4758	CL 67C SUR 18P 81	PEDRO ANTONIO CASTRO RAMIREZ
50	4137	CL 67C SUR 18P 44	PEDRO ANTONIO PINEDA PINEDA Y OTRO
51	4131	CL 67C SUR 18N 68	NELLY AVILA SANTOS
52	4273	CL 67C SUR 18N 34	MARIA MARLEN HERNANDEZ DE CORTES
53	4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
54	4269	CL 67C SUR 18N 16	EMMA ZULINDA ORDOÑEZ ESCARRAGA
55	4293	CL 67B SUR 18N 05	FLOR EDITH ERAZO
56	3414	DG 68 B 18P 29	BERNARDO GARZON NIETO
57	3525	TV 18P -69 A 65 SUR	ALEJANDRINA BENAVIDES MUÑOZ
58	3470	TV 18P BIS 69A -56 SUR	LUZ IDALIA MAFLA VILLEGAS
59	4472	KR 18M BIS 66D 17 SUR	SANDRA LUCIA RODRIGUEZ CIFUENTES

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **4-abr-21**

Unión Temporal MIC Viviendas 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	695-2020			**Plazo**	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo II			**Acta de inicio**	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	**CRP No.**		**Valor del contrato**	**3.728.543.252**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de	701-2020			**Plazo**	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaria distrital de hábitat.			**Acta de inicio**	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	**CRP No.**		**Valor del contrato**	**894.285.952,00**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									**Fase 2: Ejecución de obras**				
					Validación				**Ejecución**				
Territorio o barrio a intervenir	**Juan Pablo II, Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	Validada	V/Por Validar	Renuncia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Miller Alberto Castañeda	1	59	59	59	0	5	10	0	54	0	91,53%	54
		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
Técnico Responsable		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
	Subtotal		59	59	59	0		0	0	54	0	0,00%	54

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

										NOVIEMBRE				DICIEMBRE					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL
Proyecto Jerusalén 2				**FASE I**			**Tiempo Programación**			SEMANA DEL 4 AL 8	SEMANA DEL 9 AL 15	SEMANA DEL 16AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 06	SEMANA DEL 7 AL 13	SEMANA DEL 14 AL 20	SEMANA DEL 21 AL 27	SEMANA DEL 28 AL 3	SEMANA DEL 4 AL 10	SEMANA DEL 11 AL 17	SEMANA DEL 18 AL 24	SEMANA DEL 25 AL 31	SEMANA DEL 1 AL 07	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28	SEMANA DEL 1 AL 7	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28	SEMANA DEL 29 AL 04
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	**V/ Validada**	**V/ Modificada**	**V/Inicial**	**Fecha inicio**	**Fecha terminada**	**F. Inicio**	**1 semana**	**2 semana**	**3 semana**	**4 semana**	**5 semana**	**6 semana**	**7 semana**	**8 semana**	**9 semana**	**10 semana**	**11 semana**	**12 semana**	**13 semana**	**14 semana**	**15 semana**	**16 semana**	**17 semana**	**18 semana**	**19 semana**	**20 semana**	**21 semana**	**22 semana**
1	3446	DG 69 SUR 18N 83	ANA DE DIOS MANSO DE BATERO	SI	$11.801.064	$11.801.106	27/11/2020	12/02/2021	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	5%	5%	20%	20%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3450	DG 69 SUR18 N 65	ABAD LOPEZ CARDONA	SI		$11.383.198	1/12/2020	12/02/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	12%	25%	45%	55%	70%	85%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3662	DG 69 SUR 18 M 69	MARCELINA ROJAS VILLABONA	SI	$11.041.255	$11.041.254	1/12/2020	15/01/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	5%	15%	15%	40%	65%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	3664	DG 69 SUR 18M 61	MARCO JULIO TORRES RAVELO	SI	$11.305.014	$11.305.276	27/11/2020	14/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	35%	60%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2610	DG 69 SUR 18M 62	MARY LUZ GUTIERREZ	SI	$11.527.887	$11.529.634	4/12/2020	10/02/2021	4/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	70%	80%	90%	95%	95%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	3666	DG 69 SUR 18M 51	MARIA AURORA SILVA VIUDA DE GARZON	SI	$11.759.087	$11.762.595	27/11/2020	15/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	20%	50%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	3453	DG 69 SUR 18N 51	JUDITH RESTREPO CHAVES	SI	$9.773.080	$11.763.967	1/12/2020	15/01/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	45%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	2612	DG 69 SUR 18M 70	BLANCA LILIA PARRA DOMINGUEZ	SI		$10.879.048	4/12/2020	2/02/2021	4/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	25%	35%	50%	60%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	3415	DG 68B SUR 18N 79	JOSE LELIS NERI GARZON SILVA	SI		$11.707.001	8/01/2021	22/01/2021	8/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	3420	DG 68B SUR 18N 57	MARCO TULIO RUBIO	SI	$7.307.707	$7.307.709	1/12/2020	30/12/2020	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	20%	60%	85%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	3400	DG 69 SUR 18N 46	BETSABE MALAGON LOZANO	SI	$11.542.101	$11.542.102	2/12/2020	16/02/2021	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	5%	10%	15%	25%	28%	40%	50%	70%	85%	90%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	3661	DG 69 SUR 18M 73	ANA TULIA ROJAS	SI	$7.217.407	$7.217.448	3/12/2020	18/12/2020	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	3668	DG 69 SUR 18M 43	ROSALBA PAEZ VASQUEZ	SI		$11.702.181	12/01/2021	23/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	60%	80%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	3670	DG 69 SUR 18M 35	ISABEL ADRIANA CORONADO ARIAS	SI		$11.310.007	3/12/2020	23/02/2021	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	40%	55%	60%	80%	85%	95%	95%	95%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	2684	DG 68B SUR 18M 50	LIGIA JACOME NIETO	SI		$11.806.005	8/01/2021	23/01/2021	8/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	65%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	2618	DG 68B SUR 18M 51	GILBERTO SALAZAR PERDOMO	SI		$11.140.497	13/01/2021	1/02/2021	13/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	60%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	2620	DG 68B SUR 18M 43	MANUEL MARINO MOSQUERA MOSQUERA	SI		$11.780.990	12/01/2021	4/03/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	30%	50%	60%	75%	85%	87%	90%	90%	100%	100%	100%
18	2682	DG 68B SUR 18M 42	LEONOR MORENO MENDEZ	SI		$11.826.523	14/01/2021	23/02/2021	14/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	60%	75%	80%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	4707	KR 18P BIS 68 22 SUR MJ	MARIA ELADIA GIRALDO CASTAÑO	SI		$11.727.123	5/02/2021	8/03/2021	5/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	45%	55%	90%	100%	100%	100%	100%
20	3393	DG 68A SUR 18N 41	ELIZABETH PACHON TELLEZ	SI		$11.735.850	12/01/2021	10/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	50%	80%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	4696	KR 18P 67C 44 SUR	LUIS EDGAR ALBARRACIN	SI		$11.776.788	12/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	35%	60%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	3404	DG 69 SUR 18N 62	MARIA EUGENIA TORRES RAVELO Y OTRO	SI		$11.792.973	4/03/2021	30/03/2021	4/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	50%	70%	100%
23	4687	DG 68A SUR 18N 50	SIXTA TULIA MARTINEZ MARTINEZ	SI		$11.268.048	12/01/2021	11/03/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	60%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
24	4684	KR 18N BIS B 67C 59 SUR	LUIS ANTONIO PULIDO PRADA	SI		$11.619.375	RENUCIA	RENUNCIA	RENUCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
25	4681	KR 18N BIS B 67C 43 SUR	ANA ROSA CRUZ CRUZ	SI		$11.363.741	12/01/2021	10/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	40%	65%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	4636	KR 18N BIS B 67C 58 SUR	ABRAHAN MUÑOZ CRUZ	SI		$11.826.340	12/01/2021	1/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	2686	DG 68B SUR 18M 58	JAIRO PULIDO RUIZ Y OTRO	SI		$11.826.839	12/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	30%	60%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	4695	KR 18P 67C 50 SUR	VITELVINA MONTES GOMEZ	SI		$11.790.955	12/01/2021	4/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	4680	KR 18N BIS B 67C 35 SUR	MISAEL LEON PEREZ	SI		$11.581.556	12/01/2021	12/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	4679	KR 18N BIS B 67C 31 SUR	SAIN FAJARDO VANEGAS	SI		$11.635.904	12/01/2021	10/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	4637	KR 18N BIS B 67C 52 SUR	INES AURORA ACERO BAQUERO	SI		$10.666.035	12/01/2021	2/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	3452	DG 69 SUR 18N 55	BRIGETTE CORDOBA GOMEZ	SI		$11.140.687	RENUCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
33	3349	DG 68B SUR 18Q 57	LUCILA BALLESTEROS SOLANO	SI		$11.512.431	18/02/2021	9/03/2021	18/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	50%	85%	100%	100%	100%	100%
34	3348	DG 68B SUR 18Q 67	JOHN JIMMY DAZA ANTOLINEZ	SI		$11.641.853	17/02/2021	18/03/2021	17/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	75%	85%	100%	100%	100%
35	3195	KR 18Q BIS B 68B 09 SUR	YAZMIN ALICIA TRIANA GUERRERO	SI		$11.766.931	19/02/2021	17/03/2021	19/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	50%	75%	100%	100%	100%
36	3175	KR 18R 68 84 SUR	AMANDA FLORIAN	SI		$10.178.683	15/02/2021	17/03/2021	15/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	70%	80%	100%	100%	100%
37	3157	KR 18R 68 75 SUR	EDILMA MARIA POVEDA HERNANDEZ	SI		$11.741.099	23/02/2021	23/03/2021	23/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	80%	90%	100%	100%
38	3366	DG 69 SUR 18Q 13	LUZ STELLA LOPEZ FLOREZ Y OTRO	SI		$8.214.886	4/02/2021	18/02/2021	4/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	3363	DG 69 SUR 18Q 31	MIRIAN OSORIO RAMÍREZ	SI		$11.748.812	15/02/2021	8/03/2021	15/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	70%	100%	100%	100%	100%

40	3209	DG 69 SUR 18Q 65	MARTHA ISABEL GAMBOA LIZARAZO	SI NO		$11.804.648	8/02/2021	6/03/2021	8/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
41	3211	KR 18Q BIS B 69 17 SUR	MARIA INES LIZARAZO DE GAMBOA Y OTRO	SI NO		$11.641.897	15/02/2021	2/03/2021	15/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
42	3212	KR 18Q BIS B 69 25 SUR	HELBERTH ARTURO SOLORZA ACOSTA	SI NO		$11.481.355	19/02/2021	15/03/2021	19/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	40%	85%	100%	100%	100%
43	3361	KR 18Q BIS B 69 24 SUR	OMAR CUBILLOS	SI NO	$11.830.000	$11.702.961	19/02/2021	16/03/2021	19/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	50%	85%	100%	100%	100%
44	4748	CL 68 SUR 18P 82 MJ	LUIS HERNANDO GRACIA ZAMORA	SI NO		$10.416.384	4/03/2021	31/03/2021	4/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	38%	70%	100%
45	4733	KR 18P BIS A 67C 36 SUR	AURA MARIA LUZ CUESTA ROJAS	SI NO		$11.549.667	25/02/2021	26/03/2021	25/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	50%	80%	100%	100%
46	4753	KR 18Q 67C 24 SUR	MARIA DINA GOMEZ	SI NO		$10.024.550	3/03/2021	3/04/2021	3/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	45%	100%
47	4735	KR 18P BIS A 67C 22 SUR	MARIA ALCIRA BELTRAN AMAYA	SI NO		$11.680.915	25/02/2021	23/03/2021	25/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	50%	80%	100%	100%
48	4743	KR 18P BIS 67C 27 SUR	BERTILDA CAÑON ALFARO	SI NO		$11.710.953	25/02/2021	31/03/2021	25/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	50%	70%	100%
49	4758	CL 67C SUR 18P 81	PEDRO ANTONIO CASTRO RAMIREZ	SI NO		$11.731.975	25/02/2021	25/03/2021	25/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	50%	100%	100%
50	4137	CL 67C SUR 18P 44	PEDRO ANTONIO PINEDA PINEDA Y OTRO	SI NO		$11.801.541	4/03/2021	3/04/2021	4/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	50%	75%	100%
51	4131	CL 67C SUR 18N 68	NELLY AVILA SANTOS	SI NO		$11.761.268	19/02/2021	9/03/2021	19/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	80%	100%	100%	100%	100%
52	4273	CL 67C SUR 18N 34	MARIA MARLEN HERNANDEZ DE CORTES	SI NO		$10.814.851	25/02/2021	25/03/2021	25/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	70%	85%	100%	100%
53	4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI NO		$11.724.531	RENUCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
54	4269	CL 67C SUR 18N 16	EMMA ZULINDA ORDOÑEZ ESCARRAGA	SI NO		$11.729.999	26/01/2021	3/03/2021	26/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	10%	30%	50%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
55	4293	CL 67B SUR 18N 05	FLOR EDITH ERAZO	SI NO		$10.350.399	2/02/2021	4/03/2021	2/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	80%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
56	3414	DG 68 B 18P 29	BERNARDO GARZON NIETO	SI NO		$11.828.000	9/03/2021	31/03/2021	9/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	60%	100%
57	3525	TV 18P -69 A 65 SUR	ALEJANDRINA BENAVIDES MUÑOZ	SI NO		$10.518.226	RENUCIA	RENUNCIA	RENUCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
58	3470	TV 18P BIS 69A -56 SUR	LUZ IDALIA MAFLA VILLEGAS	SI NO		$11.114.342	9/03/2021	30/03/2021	9/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	70%	100%
59	4472	KR 18M BIS 66D 17 SUR	SANDRA LUCIA RODRIGUEZ CIFUENTES	SI NO		$10.346.169	RENUCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA	5/04/2021	PERIODO No.	22	DEL	29/03/2021	AL	4/04/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 2, la ejecución de 253 mejoramientos de vivienda, localizados en 5 localidades: Usaquén, Santafé, Rafael Uribe Uribe, Suba, Santafé y Ciudad Bolívar, esta última incluye una (1) Intervención de Mejoramiento Integral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	695--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	894.285.952	VALOR INICIAL :	3.728.543.252,00
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	-150
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded seguimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$0,00	#¡DIV/0!	


3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

Barrio o Territorio

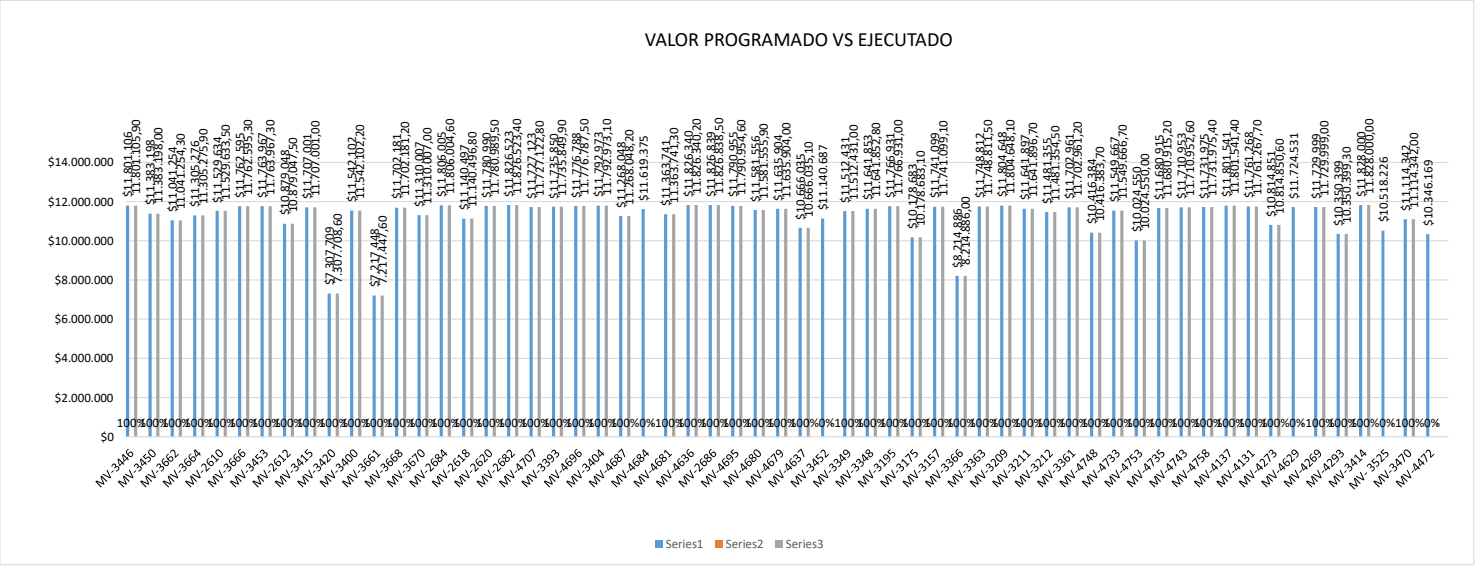

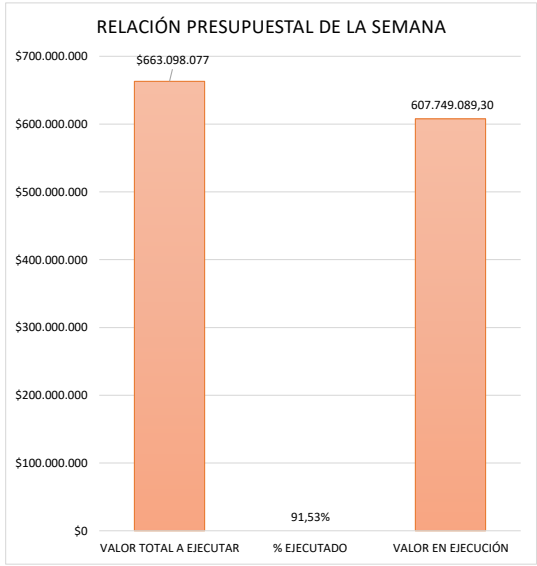

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

JUAN PABLO II

FECHA: 28/03/2021

MV_ 4748 LUIS HERNANDO GRACIA ZAMORA : Se realio entrega de vivienda (31/03/2021)

MV_ 3404 MARIA EUGENIA TORRES RAVELO Y OTRO : Se realio entrega de vivienda (30/03/2021)

MV_ 4753 MARIA DINA GOMEZ : Se realio entrega de vivienda (03/04/2021)

MV_ 4743 BERTILDA CAÑON ALFARO : Se realio entrega de vivienda (21/03/2021)

MV_ 3470 LUZ IDALIA MAFLA VILLEGAS : Se realio entrega de vivienda (30/03/2021)

MV_ 4137 PEDRO ANTONIO PINEDA PINEDA Y OTRO : Se realio entrega de vivienda (03/04/2021)

MV_ 3414 BERNARDO GARZON NIETO : Se realio entrega de vivienda (31/03/2021)

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA


6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
Barrio o Territorio: JUAN PABLO II , CIUDAD BOLIVAR
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





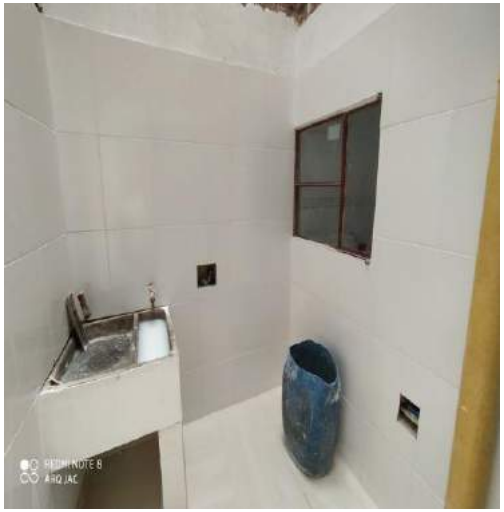

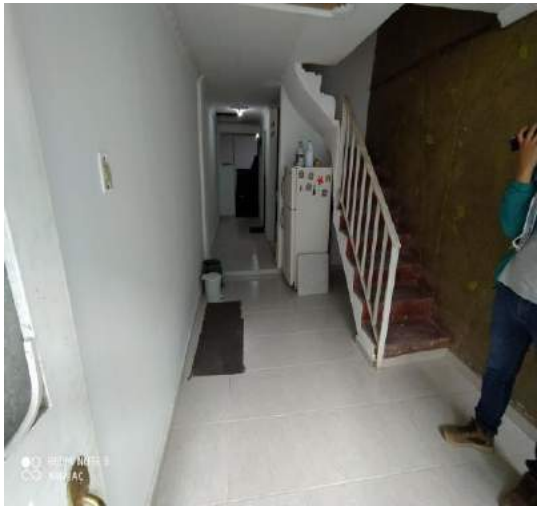

MV - No.4137



DESCRIPCIÓN Y FECHA : Se realizo entrega de vivienda (03/04/2021)



DESCRIPCIÓN Y FECHA : Se realizo entrega de vivienda (03/04/2021)



DESCRIPCIÓN Y FECHA : Se realizo entrega de vivienda (03/04/2021)




DESCRIPCIÓN Y FECHA : Se realizo entrega de vivienda (03/04/2021)

MV - No.4753



DESCRIPCIÓN Y FECHA : Se realizo entrega de vivienda (03/04/2021)

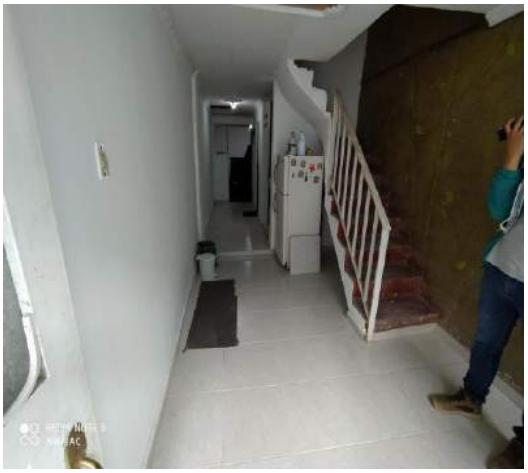

DESCRIPCIÓN Y FECHA : Se realizo entrega de vivienda (03/04/2021)



DESCRIPCIÓN Y FECHA : Se realizo entrega de vivienda (03/04/2021)



DESCRIPCIÓN Y FECHA : Se realizo entrega de vivienda (03/04/2021)

INFORME SEMANAL 22

SOCIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S. Ingenieros Constructores e Interventores

FECHA	29/03/2021	**PERIODO No.**	21	DEL	**22/03/2021**	AL	**27/03/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 2, la ejecución de 253 mejoramientos de vivienda, localizados en 5 localidades: Usaquén, Santafé, Rafael Uribe Uribe, Suba, Santafé y Ciudad Bolívar, esta última incluye una (1) Intervención de Mejoramiento Integral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	695--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894.285.952,00	VALOR INICIAL :	$ 3.728.543.252,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -IMPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$0,00	#¡DIV/0!	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$0,00	#¡DIV/0!	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA
CIUDAD BOLIVAR
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
VALIDACIONES REALIZADAS
no se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS
MVCB_2359 CARMEN ROSA MARTÍNEZ PÉREZ
APERTURAS FALLIDAS
en el transcurso de la semana no se presentaron.
SEGUIMIENTOS SOCIALES
29/03/2021 MVCB_3405 Elena VollalobosAponte Avance de obra, sin novedad desde la parte social
29/03/2021 MVCB_3397 Maura Innes Rodriguez Avance de obra, sin novedad desde la parte social
29/03/2021 MVCB_3413 Eliana Acuña Arenas Avance de obra, sin novedad desde la parte social
29/03/2021 MVCB_0239 Gloria Ezequiela Virguez Avance de obra, sin novedad desde la parte social
29/03/2021 MVCB_4743 Bertilda Cañon Alfaro Se realiza seguimiento social y técnico en el cual se evidencia avance en obra de enchape de mesón, sin observaciones ni novedades.
29/03/2021 MVCB_4748 Luis Hernando Gracia Zamora Se realiza seguimiento social y técnico en el cual se evidencia avance en obra en instalación de drywall en habitación, sin observaciones por parte del beneficiario.
29/03/2021 MVCB_3414 Bernardo Garzon Se realiza seguimiento social y técnico en el cual el beneficiario tiene algunas dudas, las cuales son solucionadas por el técnico encargado de obra, se aclara que los filos de la habitación 3 en el portón y ventana se ejecutaran
29/03/2021 MVCB_3470 Idalia Mafla Villegas Se realiza seguimiento social y técnico en el cual la beneficiaria no manifiesta observaciones de las actividades en ejecución, refiere estar conforme.
29/03/2021 MVCB_3404 Maria Eugenia Torres Se realiza seguimiento social y técnico en el cual la beneficiaria no tiene observaciones acerca de las actividades por el momento ejecutadas
29/03/2021 MVCB_4753 Maria Dina Gomez Se realiza seguimiento social y técnico en el cual la beneficiaria, no manifiesta novedades.
29/03/2021 MVCB_ 2238 DIANA MARCELA TICORA LOPEZ
29/03/2021 MVCB_4799 Alicia Sanchez Se realiza visita de seguimiento social y técnica en compañía de la SDHT para aclaración de los altos costos del material y la mano de obra presupuesto y de lagunas actividades de que no se ejecutaron debido al alcance de presuspuesto.
30/03/2021 MVCB_3405 Elena Villalobos Aponte Avance de obra, sin novedad desde la parte social
30/03/2021 MVCB_3397 Maura Ines Rodriguez Avance de obra, sin novedad desde la parte social
30/03/2021 MVCB_0239Gloria Ezequiela Virguez Avance de obra, sin novedad desde la parte social
30/03/2021 MVCB_3413 Eliana Acuña Avance de obra, sin novedad desde la parte social
30/03/2021 MVCB_4766 Maria ROMERO Avance de obra, sin novedad desde la parte social
30/03/2021 MVCB_4790 Mireya Melo Avance de obra, sin novedad desde la parte social

30/03/2021 MVCB_4796 Olga Guzman 30/03/2021 MVCB_4790 Mireya Melo Avance de obra, sin novedad desde la parte social
30/03/2021 MVCB_4806 Luz Angela Herrera Avance de obra, sin novedad desde la parte social
31/03/2021 MVCB_3405 Elena Villalobos Aponte Avance de obra del 88%, sin novedad desde el área social.
31/03/2021 MVCB_3397 Maura Ines Rodriguez Avance de obra del 85%, sin novedad desde el área social.
31/03/2021 MVCB_3144 Jackelin Gonzalez Arevalo Se realiza seguimiento de obra, se evidencia trabajos en baño, Sra Angie apoderada manifiesta conformidad con las actividades
31/03/2021 MVCB_3145 Maria Esther Gonzalez Gomez Se realiza seguimiento de obra, se evidencia trabajos en cocina, no es posible realizar anotaciones en bitácora ya que no está el beneficiario y la dejo en una habitación bajo llave.
31/03/2021 MVCB_0239 Gloria Ezequiela Virguez Avance de obra del 68%, sin novedad desde el área social.
ENTREGAS
30/03/2021 MVCB_3470 LUZ IDALIA MAFLA VILLEGAS Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
31/03/2021 MVCB_3413 ELIANA ACUÑA ARENAS Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
31/03/2021 MVCB_4743 BERTILDA CAÑON ALFARO Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
31/03/2021 MVCB_3414 EVELINA ROJAS DE GARZON Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
31/03/2021 MVCB_ 4748 LUIS HERNANDO GRACIA ZAMORA Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
31/03/2021 MVCB_4766 MARIA OLGA ROMERO DE PULIDO Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
31/03/2021 MVCB_ 2358 ROSALBA LEON Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
31/03/2021 MVCB_ 3039 FLOR ALICIA LOAIZA ARBOLEDA Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
31/03/2021 MVCB_ 3043 MARIA HELENA CASTELLANOS Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
31/03/2021 MVCB_ 4137 PEDRO ANTONIO PINEDA PINEDA Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCB_ 3145 MARIA ESTHER GONZALEZ GOMEZ Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCB_ 4753 MARIA DINA GOMEZ Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCB_ 4790 MIREYA MELO VASQUEZ Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.

03/04/2021 MVCB_ 4796 OLGA GUZMAN Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCB_ 4799 ALICIA SANCHEZ Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCB_ 4806 LUZ ANGELA HERRERA FINO Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCB_ 3397 MAURA INES RODRIGUEZ Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCB_ 3405 ELENA VILLALOBOS APONTE Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCB_0239 GLORIA EZEQUIELA VIRGUEZ CASTELLANOS Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCB_ 3144 JAQUELINE GONZALEZ AREVALO Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCB_ 3052 GENTIL CALDERON CALDERON Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.

RENUNCIAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
USAQUEN
BARRIO O TERRITORIO: Buenavista – Cerros del norte – Urbanización santa Cecilia
VALIDACIONES REALIZADAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
No se realizaron en el transcurso de la semana
ENTREGAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana

SANTA FE
BARRIO O TERRITORIO: Laches – El consuelo
VALIDACIONES REALIZADAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
30/03/2021 MVCA_3842 Imelda Lopez Avance de alistamiento de pisos, enchape de cocina, se deja anotado en bitacora de algunos cambios solicitados por el beneficiario
30/03/2021 MVCA_4231 Esmeralda Vidales Avance de enchape de baños, vinilo en muros de sala y habitaciones, fundida de meson de cocina
30/03/2021 MVCA_1783 Maria Ruth Ospina Avance de cielo raso en habitaciones, vinilo en habitaciones,
30/03/2021 MVCA_2132 Jaime Enrique Guzman Avance de vinilo en habitaciones, enchape de muros de cocina
ENTREGAS
03/04/2021 MVCA_3842 IMELDA LOPEZ DE CEBALLOS Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCA_4231 ESMERALDA VIDALES ANAYA Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVCA_1783 MARIA RUTH OSPINA Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
RENUNCIAS
en el transcurso de esta semana no se presento ninguna renuncia
PQRS
NO SE PRESENTARON
SUBA
BARRIO O TERRITORIO: Bilbao segundo sector
VALIDACIONES REALIZADAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS
No se realizaron en el transcurso de la semana

APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
31/03/2021 MVTB_4354 Baudelino Avila El beneficiario no se encontraba en la Vivienda por lo que no se pudo avanzar en obra,
31/03/2021 MVTB_3843 Guillermo Montalvo Avance en instalación de cielo raso, enchape de baño
31/03/2021 MVTB_ 0568 Gloria Dolores Sanchez Avance de obra en vinilo de habitaciones, enchape de pisos, enchape de cocina
31/03/2021 MV_0022 Jose Ricardo Prieto Avance de obra en estuco en habitaciones, enchape de pisos, enchape de cocina y enchape de baño
ENTREGAS
03/04/2021 MVTB_3843 GUILLERMO MONTALVO CHAVEZ Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVTB_ 0568 GLORIA DOLORES SANCHEZ DIAZ Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MV_0022 JOSE RICARDO PRIETO GARZON Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
RENUNCIAS
en el transcurso de esta semana no se presento ninguna renuncia
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
RAFAEL URIBE URIBE
BARRIO O TERRITORIO: Las lomas – El mirador sur – Puerto rico
VALIDACIONES REALIZADAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana

SEGUIMIENTOS SOCIALES
29/03/2021 MV_600 Herminia Peñaloza Avance en enchape de muro y pisos de baño, enchape de meson en cocina, enchape de piso en hall
29/03/2021 MV_077IN Silvia Amparo Muñoz Avance en vinilo de habitaciones, enchape de pisos y fundida de meson
29/03/2021 MVLO_419 Lucia Ardila Marin Avance de pañetes en baño y alistamiento de pisos
ENTREGAS
29/03/2021 MV_356 HECTOR ULISES ROMERO MENDEZ Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
30/03/2021 MV_586 SANTIAGO AGUIRRE GARCIA Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
30/03/2021 MVPR_0111 URIEL JOSE CALDERON MUÑOZ Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MV_600 HERMINIA PEÑALOZA Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MV_077IN SILVIA AMPARO MUÑOZ GUERRERO Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
03/04/2021 MVLO_419 LUCIA ARDILA MARIN Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
RENUNCIAS
en el transcurso de esta semana no se presento ninguna renuncia
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
PAC
Se realiza atención a la comunidad en el PAC ubicado en la calle 67c sur # 18p - 51 Juan Pablo II; Los días: Martes: 8:30 am a 12:00 pm Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm Sábados: 8:30 a 12:00 pm Donde se atendieron a algunos beneficiarios para preguntar como postulasen a los subsidios y la dirección de la Secretaria de Hábitat.
HISTORIAS DE VIDA
MVCB_3413 Se realiza acompañamiento al componente de comunicaciones, con el fin de desarrollar el video de Historia de vida. Durante el ejercicio se destaca el empoderamiento de la mujer que prioriza el crecimiento académico como herramienta para el logro del bienestar de ella y su familia; en consecuencia, el mejoramiento habitacional pasa a un segundo plano. Durante la entrevista la beneficiaria refiere el cambio no solo a nivel de imagen, sino sus alcances a nivel motivacional y de salud. MVCB_2753 Se realiza acompañamiento al componente de comunicaciones, con el fin de desarrollar el video de Historia de vida. Durante el ejercicio se destaca la lucha por sobrevivir con los hijos en una ciudad que los recibe en su estado de victimas del conflicto armado por desplazamiento, donde sus recursos se priorizan para la alimentación. Obtiene la casa en obra negra a través del subsidio de desplazamiento otorgado por el estado, sin adecuaciones posteriores ya que el recurso obtenido en las ventas informales les alcanza escasamente para las necesidades básicas de alimentación, vestido, educación y pago de servicios.
BARRIO O TERRITORIO
JUAN PABLO II

HISTORIAS DE VIDA
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA

5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
Durante el transcurso de la semana se llevo a cabo acompañamiento a las visitas de seguimiento de los predios en los cuales ya se iniciaron labores de obra, Se evidencia que en algunas viviendas no se a dado inicio a las actividades de ejecución ya que no se cuenta con materiales ni maestros en las viviendas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
Imagen

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS					
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MV_0022	JOSE RICARDO PRIETO GARZON	BARRIO BERLIN	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2618	GILBERTO SALAZAR PERDOMO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	13/01/2021	1/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2684	LIGIA JACOME NIETO	JUAN PABLO II	X			SE NOTIFICA A LOS BENEFICIARIOS POR MEDIO DE LLAMADA TELEFÓNICA LA VISITA A REALIZAR.	5/01/2021	11/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2686	JAIRO PULIDO RUIZ Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	11/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2729	JAIME GONZÁLEZ CARVAJAL	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	21/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2743	MARÍA DEL CARMEN MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/01/2021	5/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2751	MARÍA DE LOS ÁNGELES SOTO BERMÚDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	23/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3052	GENTIL CALDERON CALDERON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3157	EDILMA MARIA POVEDA HERNANDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se	23/02/2021	23/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento
MVCB_3167	AURA ROSA GOMEZ DE BEDOYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	21/01/2021	9/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3175	AMANDA FLORIAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	15/02/2021	17/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_3195	YAZMIN ALICIA TRIANA GUERRERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	19/02/2021	17/03/2021	S	S	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3209	MARTHA ISABEL GAMBOA LIZARAZO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/02/2021	6/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3211	MARIA INES LIZARAZO DE GAMBOA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	15/02/2021	2/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3212	HELBERTH ARTURO SOLORZA ACOSTA	JUAN PABLO II	X		S	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	19/02/2021	15/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3326	BIBIAN STELLA CALDERON BEJARANO Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021	19/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3336	NANCY OSORIO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021	9/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3348	JOHN JIMMY DAZA ANTOLINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	17/02/2021	18/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3361	OMAR CUBILLOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	19/02/2021	16/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3430	HECTOR JOSE ARIAS	JUAN PABLO II	X			Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	7/01/2021	22/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3450	ABAD LOPEZ CARDONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	12/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3452	BRIGETTE CORDOBA GOMEZ	JUAN PABLO II	RENUNCIA																			

MVCB_3482	DORA ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	22/12/2020	26/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_0923	OCTAVIO OSORIO	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	21/01/2021	2/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_0940	MARIA DELFINA CORREA GARZON	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	20/01/2021	11/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_0963	JULIO GENTIL ARROYO BRIÑEZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		X	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	20/01/2021	17/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_0964	CARLOS ARTURO CAMARGO MUÑOZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	20/01/2021	26/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_0970	MARIA ELENA RAMIREZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		S	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	20/01/2021	8/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_0979	BERNARDO CORREDOR	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/02/2021	1/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_0989	ILADISLAO MAPE LEIVA	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/02/2021	1/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3542	LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/12/2020	28/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3543	ELIZABETH CANO TRIANA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_3587	EMPERATRIZ ESPITIA DAZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	17/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3588	MARIA ISABEL CARRASCO BERNAL	JUAN PABLO II	RENUNCIA																			
MVCB_3591	LUCY CEPEDA MARENTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3593	ANGEL MARIA LOZANO SALAZAR	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020	22/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3597	FLOR ALBA VEGA BUITRAGO Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	5/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3605	ETELVINA LOPEZ CAMARGO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/01/2021	22/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3608	YERLY AMPARO DUCUARA DUCUARA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	17/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3612	DIMAS MORENO JIMENEZ Y OTRA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	7/01/2021	3/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3654	MARIELA AGUILAR QUINTERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/01/2021	3/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3661	ANA TULIA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_3662	MARCELINA ROJAS VILLABONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X							SI	

MVCB_3664	MARCO JULIO TORRES RAVELO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	21/12/2020	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4293	FLOR EDITH ERAZO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	29/01/2021	4/03/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4671	MARIA SHIRLEY GARCES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4679	SAIN FAJARDO VANEGAS	JUAN PABLO II			SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	10/02/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4680	MISAEL LEON PEREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	12/02/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4681	ANA ROSA CRUZ CRUZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	10/02/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4684	LUIS ANTONIO PULIDO PRADA	JUAN PABLO II	RENUNCIA																			
MVCB_4707	MARIA ELADIA GIRALDO CASTAÑO	JUAN PABLO II	X			SE NOTIFICA A LOS BENEFICIARIOS POR MEDIO DE LLAMADA TELEFÒNICA LA VISITA A REALIZAR.	5/02/2021	8/03/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4733	AURA MARIA LUZ CUESTA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/02/2021	26/03/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4735	MARIA ALCIRA BELTRAN AMAYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/02/2021	23/03/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4743	BERTILDA CAÑON ALFARO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/02/2021	31/03/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4748	LUIS HERNANDO GRACIA ZAMORA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/03/2021	31/03/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4753	MARIA DINA GOMEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	

MVCB_4837	MARIA ALIRIA FUENTES SEPULVEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	20/01/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_4849	ALEIDA TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_2270	NUBIA GALLEGO CIRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	feb-21	9/03/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_2275	JOSÉ HERNANDO SEGURA CORTÉS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/02/2021	26/03/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_2360	DAMARIS RESTREPO CHAVES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021	20/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2373	MARTHA CECILIA ARIAS MORALES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/02/2021	26/03/2021	SI	SI	X			X				Beneficiaria interpone derecho de peticion ya que desde el 1 de enero esta pagando arriendo, la ejecucion de las obras va muy lenta, el presupuesto inicial aprobado es de 14.444.281 y se estan inflando los valores por lo cual desea que se mejoren otras areas de la vivienda ejemplo la instalacion de la ceramica en toda la vivienda	El dia 16 de marzo de 2020 se realiza visita entorno a la solicitud realizada por la beneficiaria, en compañia de la SDHT se brinda informacion con respecto a los precios determinados por la entidad, se vrinda informacion con respecto a costos definidos por medio de una licitacion publica, con respecto a las actividades se realiza revision y llega a unos acuerdos con la beneficiaria, de igual manera se explia a la beneficiaria acerca del balance para verificar estado del presupuesto, la familia solicita finalizar obras en adecuadas condiciones, por parte de la SDHT se realiza acompañamiento para dar atencion al derecho de peticion sin embargo los beneficiarios refieren no firmar ningun documento	3 dias	SI	SE REALIZA ENTREGA UNILATERAL
MVCB_2700	FLOR HELIA CHIA DIAZ Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	23/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2702	LUZ LELLY OSORIO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	19/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2707	EIDER GONZÁLEZ CARDONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2709	ANA MERCEDES GOMEZ LEAL	JUAN PABLO II	X		Si	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	30/11/2020	28/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2710	MARIA DE LOS ANGELES HUERTAS ARIAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	30/11/2020	21/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_2711	DANIEL LEÓN GÓMEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	19/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2714	LUZ BELIA TORRES GARCÍA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/01/2021	4/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2715	NURY SÁNCHEZ CALDERÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/01/2021	21/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2720	JEISSON ALEXANDER NIÑO BAQUERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	7/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2721	GILBERTO AMAYA AMAYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2724	MARCO ANTONIO LEÓN CASTIBLANCO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	23/12/2020	SI	SI	X		X								SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2726	MARIA ERMELINDA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	24/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2727	RAMONA TAFUR	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	18/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2728	LEONOR PINZÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	18/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2731	GLORIA EDITH MARTÍNEZ LÓPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	23/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_2735	LUZ MERY TRIBIÑO RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	29/12/2020	28/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2738	MARÍA DIOMEDES GARCÍA DE TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/01/2021	20/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3366	LUZ STELLA LOPEZ FLOREZ Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/02/2021	18/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3370	MARIA SOLDEDAD GARCIA CARDONA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/02/2021	3/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3372	YEIMY INES RAMIREZ GRISALES Y OTROS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	16/02/2021	10/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3429	PASCUALA NIEVES CHACON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/01/2021	30/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3465	GLORIA RUEDA RAMIREZ	JUAN PABLO II	X			Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/01/2021	30/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3490	EMMA SANCHEZ CALDERON	JUAN PABLO II	X			Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/01/2021	20/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3502	JOSE FOCION SOTO SILVA	JUAN PABLO II	X			Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/01/2021	27/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3561	JAIRO MONTOYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	17/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_3656	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	6/01/2021	22/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3813	MARIA LUCILA IBAGUE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3867	NUBIA DEL CARMEN SERNA RESTREPO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/02/2021	19/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4273	MARIA MARLEN HERNANDEZ DE CORTES Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/02/2021	25/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4620	MARIA ALICIA NAVARRO REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	8/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	REMPLAZO SDHT																			
MVCB_4630	MARÍA FELISA CRUZ VARGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	24/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4766	MARIA OLGA ROMERO DE PULIDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/03/2021	31/03/201													SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2221	KERLY JOHANNA CELY MENDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2238	DIANA MARCELA TICORA LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/02/2021	29/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2284	MARIA HELENA ANGEL BEDOYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/01/2021	11/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2287	LUZ MARINA GOMEZ CEDEÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	10/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_2288	SIMONA TORRES MANYOMA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021	26/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2292	HERNAN ANACONA PALECHOR	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	20/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2297	CONSUELO DE JESÚS GRAJALES RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	2/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2310	SERAFINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/02/2021	23/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2336	JORGE HERNANDO PARRA RINCON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/02/2021	8/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2337	SARA SANCHEZ VIVAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	27/01/2021	SI	SI	X			X				Se realiza visita social de seguimiento en el cual los beneficiarios estan demasiado molestos e inconformes por que desde el dia 08 de diciembre de 2020 tienen escombro botado fuera de la vivienda y no recogen con constancia y los vecinos del secto tomaron esta zona como botadero de basura	Desde el momento de la apertura del PQRS se alertó y se gestionó con al área encargada para que generara la recogida del escombro y de la basura evidenciada. El día 07/01/2020 se realizó la recogida de todo el escombro y la basura acumulada a las 4:00 pm; por tal motivo el día 08/01/2021 se realizó la visita para la verificación del estado de la vivienda por tal motivo se da por cerrado el PQRS.	1 dia	SI	Se hizo el acompañamiento en visita de seguimiento y verificación de la presencia de trabajadores para el retiro de escombros en la vivienda
MVCB_2346	ISIDRO BONILLA RICO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/02/2021	10/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2358	ROSALBA LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021	31/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2359	CARMEN ROSA MARTÍNEZ PÉREZ	JUAN PABLO II	X					3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2610	MARY LUZ GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/12/2020	10/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2682	LEONOR MORENO MENDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	14/01/2021	23/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2842	GUILLERMINA HERNÁNDEZ GORDILLO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	23/02/2021	18/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_3134	RUBI STELLA FORERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/02/2021	10/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3144	JACQUELIN GONZALEZ AREVALO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3145	MARIA ESTHER GONZALEZ GOMEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3148	OTALVINA ESPITIA FORERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/12/2020	20/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3151	ELVIRA PINZON SIERRA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3198	MARIA DEL CARMEN VEGA GAMEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021	19/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3201	OFELIA EVANGELINA VELASQUEZ GONZALEZ Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	22/01/2021	19/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3217	MARIA FANNY VERGARA ARENAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	16/02/2021	10/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3223	LUZ MARIA ARIZA RONCANCIO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021	9/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3228	MARIA DE JESUS RAMIREZ DE CHITIVA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/02/2021	12/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3233	SAUL JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021	8/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_3235	JOSE GABRIEL OSPINA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	29/01/2021	23/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3242	JOSE MELECIO LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/02/2021	23/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3315	YANETH TORRES GARCIA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021	15/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3323	ELIA MARIA ARIZA DE PEÑA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021	17/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3332	JORGE SANTOS VEGA LINARES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021	19/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3393	ELIZABETH PACHON TELLEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	10/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3400	BETSABE MALAGON LOZANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	16/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3404	MARIA EUGENIA TORRES RAVELO Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/03/2021	30/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3415	JOSE LELIS NERI GARZON SILVA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/01/2021	22/01/2021	SI	SI	X	X		X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3420	MARCO TULIO RUBIO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3440	YMELDA RUIZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	2/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3443	JULIO CESAR LEON LEON Y OTRA	JUAN PABLO II			SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	5/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3446	ANA DE DIOS MANSO DE BATERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	12/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_3573	CECILIA ULLOA DE VASALLO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3574	MARIA ROSALBA BARBOSDA	JUAN PABLO II	X			Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	18/12/2020	30/01/2021	SI	SI	X			X							SI	LA CASA SE ENCONTRABA LISTA PARA ENTREGA DESDE EL 15/01/21 PERO LA BENEFICIARIA NO SE ENCONTRABA EN BOGOTA Y NO PUDO PRESENTARSE PARA LA ENTREGA HASTA EL 29/01/2021
MVCB_4131	NELLY AVILA SANTOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	19/02/2021	9/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4137	PEDRO ANTONIO PINEDA PINEDA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/03/2021	3/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4661	MARTHA PATRICIA CORTES HERNANDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4669	MARIA EUGENIA RIAÑO MOJICA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	19/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4695	VITELVINA MONTES GOMEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	4/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4696	LUIS EDGAR ALBARRACIN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	13/01/2021	11/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4717	ARACELY ZAMBRANO ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	29/12/2020	21/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4758	PEDRO ANTONIO CASTRO RAMIREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/02/2021	25/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4847	ALFER YESID CASTANEDA PACHON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	18/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_4891	DEYANIRA MARIA ROMERO ARIZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/20202	12/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2347	MARIA DORA ELISABET MARTINEZ SANABRIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021	20/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2350	CARLOS ALFONSO SANCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/02/2021	15/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2612	BLANCA LILIA PARRA DOMINGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/12/2020	2/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2167	MARIA BETSABE CORTES RODRIGUEZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/02/2021	6/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_0974	MARIA ANGELICA AVILA PEREZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021	8/03/2021	SI	SI	X			X			Desde el día miércoles 17 de enero del 2021, el maestro llevo un auxiliar nuevo para la ayuda en las obras, el día sábado se presento un presunto robo de una pulidora marca Bosch de 7 pulgadas y 2.200 W y 8500 RPM, por lo cual solicita sea devuelta o se reponga con las mismas especificaciones de la que se perdió. Para así dejar sacar el material y herramienta de los trabajadores de obra.	se da por cerrado el PQRS una vez que se realizo la entrega de la pulidora a la beneficiaria y se continuaron las obras en la vivienda	8 DIAS	SI	se da por cerrado el PQRS una vez que se realizo la entrega de la pulidora a la beneficiaria y se continuaron las obras en la vivienda
MVCB_2864	MIRIAN PEÑUELA GOMEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	16/02/2021	23/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_0749	MARIA DEL TRANSITO RIVERA RODRIGUEZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/01/2021	3/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_0833	JOSE GILBERTO PINEDA LOPEZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/01/2021	17/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_1002	RAMON CALDERON ANDRADE	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	30/01/2021	1/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_1947	FERMIN AVILA	MARANDU	RENUNCIA																			
MVCB_1948	ANA PAULINA GARCIA GARCIA	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	21/01/2021	1/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_3473	OLGA INES BARRAGAN AVENDAÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	7/01/2021	28/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3510	JOSE MANUEL VEGA TOVAR	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	7/01/2021	3/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3512	ERNESTINA DEFELIPE GARCIA	JUAN PABLO II	RENUNCIA																				
MVCB_3546	LEONILDE LUNA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	28/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3549	FLOR MARINA RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	17/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3599	ROSA ELVIRA DUCUARA DE DUCUARA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	5/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3653	MARIA DEL CARMNE DE SALVADOR GARAVITO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/01/2021	2/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3666	MARIA AURORA SILVA VIUDA DE GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	23/12/2020	SI	SI	X		SI								SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3668	ROSALBA PAEZ VASQUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	13/01/2021	23/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3670	ISABEL ADRIANA CORONADO ARIAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	23/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3804	MARIA ANA CELIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020	20/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_3805	LUZ MARY VARGAS ARDILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020	22/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3825	LIGIA ROSARIO TORRES DE MORALES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	25/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4649	FLORALBA ACEY LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	24/12/2020	SI	SI	X			X				Beneficiaria presentó queja mediante llamada telefónica el día sábado 5 diciembre 2020 durante atención del PAC, debido a que se dio apertura de obra desde el 1 de diciembre de 2020 y aun no se inician labores constructivas en su predio	El miércoles 9 de diciembre se visitó predio para cierre de PQRS, debido a que ya se iniciaron labores de obra.	4 dias	SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4687	SIXTA TULIA MARTINEZ MARTINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	9/02/2021	SI	SI	X			X							SI	SE REALIZA ENTREGA UNILATERAL
MVCB_4790	MIREYA MELO VASQUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4792	LUZ MARINA MENDIVELSO TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021	26/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4799	ALICIA SANCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4806	LUZ ANGELA HERRERA FINO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4836	VICTOR JULIO PORTILLA	JUAN PABLO II	RENUNCIA																			
MVCB_4859	EVELIA MUÑOZ	JUAN PABLO II	PLAN TERRAZA																			
MVCB_4860	RUFINA MENA MURRILLO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021	17/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4865	ANA SOFIA AGUILERA GONZALEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	25/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_4869	ROSA HELENA PAEZ DE GUEVARA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4881	ROQUELINA MENA MURILLO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	22/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4886	EMMA TEOFILDE MATEUS DE PINEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	19/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2302	LORENA MARGARITA ESPAÑA MONTENEGRO	JUAN PABLO II	RENUNCIA																			
MVCB_3806	JOSE JIMENEZ GONZALEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	14/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4269	EMMA ZULINDA ORDOÑEZ ESCARRAGA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/01/2021	3/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4637	INES AURORA ACERO BAQUERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	2/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4660	BLANCA EDELMIRA SANCHEZ CACERES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	7/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4871	CARMELINA ARCILA DE CASTAÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2021	1/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVBV_0519	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ VDA DE TEJADA	BUENAVISTA	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVBV_0741	BEATRIZ TRIVIÑO	BUENAVISTA	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVBV_0890	MARIA MATILDE ALFONSO DE RODRIGUEZ	BUENAVISTA	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCA_1783	MARIA RUTH OSPINA	EL CONSUELO	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCA_2132	JAIME ENRIQUE GUZMAN	EL CONSUELO	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCA_4231	ESMERALDA VIDALES ANAYA	LOS LACHES	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCE_0125	SALVADOR VELANDA ACERO	BARRIO EL CERRO - USAQUEN PARTE BAJA (VILLA NIDYA)	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	10/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCE_1034	JOAN DAVID LEGUIZAMON VILLAMIL	URBANIZACION SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	10/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCE_2106	MARIA DEL TRANSITO BARON SANTIESTEBAN	URBANIZACION SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	10/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2234	MARIA OLGA SILVA VARGAS Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2243	ELIAS BARRIGA MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/02/2021	25/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2377	AMPARO MENDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2620	MANUEL MARINO MOSQUERA MOSQUERA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	14/01/2021	4/03/2021	X	X	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2717	LUIS ANGEL SERRATO LÓPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3244	CLAUDIA MARÍA SÁNCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	11/02/2021	5/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_3349	LUCILA BALLESTEROS SOLANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	18/02/2021	9/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3363	MIRIAN OSORIO RAMÍREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	15/02/2021	8/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3453	JUDITH RESTREPO CHAVES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3579	WILSON BARBOSA RAMIREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	22/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3585	EMMA ALCIRA CELY	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	18/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3586	BLANCA CECILIA VARGAS SILVA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020	14/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3601	LUIS FERNANDO ARIZA MEDINA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/11/2020	23/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3602	LUZ MYRIAM MENDEZ CARDENAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3615	ANGILBERTO URREGO ORTÍZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/12/2020	1/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3619	FABIOLA LOPEZ CARDENAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	6/01/2021	28/01/2021	SI	SI	X			X							SI	
MVCB_3751	MARIA JUDITH LERMA VARGAS Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X		X					Se realiza visita social, en el cual la beneficiaria demuestra inconformidad, debido a la falta de material, puesto que perjudica el avance de obra, y por tal razón el personal de obra no tiene como ejecutar las actividades	el dia 10 de diciembre se realiza visita por parte del area social de interventoria con el fin de realizar seguimiento al PQRS presentado por la beneficiaria, evidenciando que las obras avanzan adecuadamente por lo cual se solicita al area social de obra realizar el cierre correspondiente, ya que la beneficiaria refiere no tener inconvenientes; se realiza	25 DIAS	SI	La beneficiaria firmo el cierre del PQRS en el momento que se dio por entregada la vivienda.

MVCB_3830	CLAUDIA MIREYA ESPERANZA CABRERA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	22/01/2021	24/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3833	LEIDY MAIDE SOSA CONTRERAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021	20/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3835	FABIO ANCIZAR TRUJILLO GARCES Y OTRA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021	11/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3837	GELMAN ORLANDO JIMENEZ FUENTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/02/2021	18/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3838	MARIA DE JESUS GONZALEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/01/2021	10/02/2021	SI	SI	X			X							SI	SE REALIZA ENTREGA UNILATERAL
MVCB_3857	CECILIA MEJÍA DE RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020	7/01/2021	SI	SI	X			X								Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3859	MARIA DEL PILAR PATIÑO VANEGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	22/01/2021	12/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3865	ANA TERESA VALENCIA GRANADOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	22/01/2021	15/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3869	CARMEN JULIA BARRETO BELTRAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3875	ROSALBINA GIL DE SOLER	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	19/02/2021	9/03/2021	SI	SI	X			X								Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCB_4636	ABRAHAN MUÑOZ CRUZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	1/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4647	GIOVANI GUTIÉRREZ RIVERA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	18/12/2020	SI	SI	X			X								Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4768	LEIDY DIANA MUÑOZ OSPINA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021	25/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4796	OLGA GUZMAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4818	ROHELFY PACHON SOTO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	25/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4862	NANCY MORENO RADA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	6/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4863	EULINE CARDENAS RUIZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	10/02/2021	SI	SI	X			X				27/01/2021 MVCB-4863 Euline Cardenas Se realiza PQRSya que la beneficiaria refiere estar inconforme por las multiples demoras en la ejecucion de la obra, refiriendo que los maestros no vienen constantemente, desde el dia 23 de enero, el espacio del baño es mmuy reducido, rompieron un tubo en el area del lavadero lo cual genero que se presentara humedad por filtracion de agua en el primer piso, se daño un closet por el movimiento, dañaron una pala la cual no han repuesto, deben una factura de las compras que realizo por solicitud del maestro por un valo de $38.200, la vivienda cumplio 2 meses de ejecucion y no se ve avance de obra por lo cual se solicita se de prioridad a la vivienda y se pueda subsanar lo solicitado dpor la beneficiaria	Se realiza visita de seguimiento para hacer la entrega satisfacción del mejoramiento de vivienda asignado; a la vez para evidenciar que las inconformidades expuestas en el PQRS quedaran subsanadas, se procede a dar cierre al PQRS establecido por la beneficiaria.	13 DIAS	SI	SE REALIZO EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LA VIVIENDA CON EL FIN DE SUBSANAR LO SOCLICITADO POR LA BENEFICIARIA
MVCB_3039	FLOR ALICIA LOAIZA ARBOLEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021	31/03/2021	SI	SI	X			X								Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3043	MARIA HELENA CASTELLANOS UMAÑA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021	31/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCE_1995	JAIRO ALBERTO GARZÓN RIOS	CERROS DEL NORTE	RENUNCIA	X																		

MVLO_419	LUCIA ARDILA MARIN	BARRIO EL MIRADOR SUR 1 Y 2	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	17/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MV_356	HECTOR ULISES ROMERO MENDEZ	LAS LOMAS	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/03/2021	29/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MV_077IN	SILVIA AMPARO MUÑOZ GUERRERO	LAS LOMAS	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MV_600	HERMINIA PEÑALOZA	LAS LOMAS	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MV_586	SANTIAGO AGUIRRE GARCIA	LAS LOMAS	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/03/2021	30/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVPR_0111	URIEL JOSE CALDERON MUÑOZ	PUERTO RICO	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/03/2021	30/03/2021	SI	SI	X			X							SI	SE REALIZA ENTREGA UNILATERAL
MVTB_0568	GLORIA DOLORES SANCHEZ DIAZ	BILBAO SEGUNDO SECTOR SECCIONES A-B-C-D-E	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVTB_3843	GUILLERMO MONTALVO CHAVEZ	BILBAO SEGUNDO SECTOR SECCIONES A-B-C-D-E	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVTB_4354	BAUDELINO AVILA OLAYA	BILBAO SEGUNDO SECTOR SECCIONES A-B-C-D-E	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.

MVCA_3842	IMELDA LOPEZ DE CEBALLOS	LOS LACHES	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X				La beneficiaria remite derecho de peticion "Con respecto al as visitas realizadas por el contratistas de obra para la ejecución de mi subsidio, se me ha manifestado por parte de ellos que las obras que se van a realizar no son acordes con lo estipulado en el expediente entregado por la caja de vivienda popular y que por ley y mandato de la alcaldesa deben ser inferior, esto resulta perjudicial a favor mío por que la ejecución y el derecho que tengo de acceder al valor del subsidio será menor a lo que por ley está estipulado y de lo que está presupuestado por la caja de vivienda popular, esto resulta menos obra ejecutada y menor beneficio para mí y mi familia, solicito atentamente se respete el presupuesto de obra y se ejecuten las obras acorde a lo manifestado en el expediente por la caja de vivienda	El 24 de febrero 2021 se realiza visita de atención de derecho de petición MVCA_3842 Imelda López de Ceballos casa 7 zona E. Barrio Los Laches. Hace presencia la SDH, la Interventoría y el Contratista (área técnica y social) para dar claridad a la beneficiaria y familiares, acerca de las actividades y presupuesto del mejoramiento de vivienda.	15 DIAS	SI	El 24 de febrero 2021 se realiza visita de atención de derecho de petición MVCA_3842 Imelda López de Ceballos casa 7 zona E. Barrio Los Laches. Hace presencia la SDH, la Interventoría y el Contratista (área técnica y social) para dar claridad a la beneficiaria y familiares, acerca de las actividades y presupuesto del mejoramiento de vivienda.
MVCA_4516	MARIA JULIA CORDOBA BOLAÑOS	LOS LACHES	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	11/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3866	RAFAEL FRANCO CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/03/2021	23/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3509	MARLENY MONDRAGON AGUDELO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/01/2021	10/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3622	ISIDRO FLORIÁN FRANCO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	6/01/2021	29/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3631	MARIA VIBIAN REYES CASTELLANOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/01/2021	28/01/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3871	MILY YOMARA CALDERON CUESTA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	2/02/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_4472	SANDRA LUCIA RODRIGUEZ CIFUENTES	JUAN PABLO II																			SI	caso especial SDHT

MVCB_3539	MARTHA ISABEL BECERRA MERIDA	JUAN PABLO II			SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/02/2021	26/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2753	EDNA MERIZA GARZON TIRADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/03/2021	26/03/2021	SI	SI	X		SI								SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_2756	FLORA MARIA IBAÑEZ CORREA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/03/2021	26/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3405	ELENA VILLALOBOS APONTE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	10/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3470	LUZ IDALIA MAFIA VILLEGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/03/2021	30/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_0239	GLORIA EZEQUIELA VIRGÚEZ CASTELLANOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	10/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las obras.
MVCB_3413	ELIANA ACUÑA ARENAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los	2/03/2021	31/03/2021	SI	SI	X		SI								SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las
MVCB_3397	MAURA INES RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda	10/03/2021	3/04/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la
MVCB_3414	BERNARDO GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los	9/03/2021	31/03/2021	SI	SI	X			X							SI	Se realizo acompañamiento social durante la ejecucion de las
MVCB_3525	ALEJANDRINA BENEVIDES MUÑOZ	JUAN PABLO II	RENUNCIA																			

Seguimiento de obra MVCB_0239	Seguimiento de obra MVCB_ 3397	Seguimiento de obra MVCB_ 3405
		
Cierre de obra MVCB_ 3413	**Historias de vida MVCB_3413**	**Historias de vida MVCB_ 2753**
		

Entrega de obra MV_356	Seguimiento de obra MV_077IN	Seguimiento de obra MVLO_419
		
Entrega de obra MV_586	**Seguimiento de obra MVCA_3842**	**Seguimiento de obra MVCA_4231**
		

Entrega de obra Fallida MVPR_0111	Seguimiento de obra MVTB_4354	Seguimiento de obra MVTB_3843
		
Seguimiento de obra MV_0022	**Seguimiento de obra MVCB_4748**	**Seguimiento de obra MVCB_3470**
		

Entrega de obra MVCB_4748	Entrega de obra MVCB_3414	Seguimiento de obra MVCB_4753
		
Entrega de obra MVCB_3470	**Entrega de obra MVCB_4743**	**Visita de SDHT MVCB_4799**
		

Entrega de obra MVCB_2238	Entrega de obra MVCB_4766	Entrega de obra MVCB_2358
		
Entrega de obra MVCB_3039	**Entrega de obra MVCB_3043**	**Entrega de obra MVCB_4137**
		

ntrega de obra MV_600	Entreg de obra MV_077IN	Entrega de obra MVLO_419
		
Entrega de obra MVCA_3842	**Entrega de obra MVCA_1783**	**Entrega de obra MVCA_4231**
		

Entrega de obra MV_0022	Apertura obra MVCB_2359	Entrega de obra MVCB_3145
		
Entrega de obra MVCB_4753	**Entrega de obra MVCB_4790**	**Entrega de obra MVCB_4796**
		

BASE DE DATOS SEGUIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EJECUCION DE OBRAS
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Nº	Nº CONSECUTIVO DEL	MV - ID	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE	LOCALIDAD	TCO	BARRIO	DIRECCION	TELEFONO DE CONTACTO	TIPO DE SOLICTUD				DESCRIPCION DEL ASUNTO Y/O SITUACION	RECOMENDACIÓN / TRAMITE Y/O RESPUESTA	SEGUIMIENTO OBRA	SEGUIMIENTO INTERVENTORIA	RESPUESTA DE CIERRE Y SOPORTE O TRAMITE ADELANTADO	ESTADO	
											P	Q	R	S						ABIERTO	CERRADO
1		3751	26/11/2020	29/12/2020	MARIA JUDITH LERMA VARGAS	CIUDAD BOLIVAR	HABITARTE 2019	JUAN PABLO II	KR 18V 66B 11 SUR	3208392659 - 3661296		X			Se realiza visita social, en el cual la beneficiaria demuestra inconformidad, debido a la falta de material, puesto que perjudica el avance de obra, y por tal razón el personal de obra no tiene como ejecutar las actividades		el dia 11 de diciembre se realiza visita de seguimiento social con el area social de obra para dar cierre al PQRS sin embargo la beneficiaria refiere que no firmara el cierre ya que nuevamente no tiene materiales en la vivienda y los maestros no pueden ejecutar actividades.	el dia 10 de diciembre se realiza visita por parte del area social de interventoria con el fin de realizar seguimiento al PQRS presentado por la beneficiaria, evidenciando que las obras avanzan adecuadamente por lo cual se solicita al area social de obra realizar el cierre correspondiente, ya que la beneficiaria refiere no tener inconvenientes; se realiza acompañamiento el dia 11 de diciembre evidenciando que nuevamente no cuentan con material en la vivienda por lo cual no se puede dar cierre al PQRS, el dia 22 y 24 de diciembre se realiza acompañamiento a la vivienda la beneficaiaria muestra inconformidad por que no tiene material en la vivienda para acabar las actividades; Se da por cerrado el PQRS, debido a que ya se culminó la obra y se realizara la entrega del mejoramiento de vivienda.	Se da por cerrado el PQRS, debido a que ya se culminó la obra y se realizara la entrega del mejoramiento de vivienda.		X
2		4649	1/11/2020	24/12/2020	FLOR ALBA ACEY	CIUDAD BOLIVAR	HABITARTE 2019	JUAN PABLO II	CL 67C BIS SUR 18N 25			X			Beneficiaria presentó queja mediante llamada telefónica el día sábado 5 diciembre 2020 durante atención del PAC, debido a que se dio apertura de obra desde el 1 de diciembre de 2020 y aun no se inician labores constructivas en su predio		El miércoles 9 de diciembre se visitó predio para cierre de PQRS, debido a que ya se iniciaron labores de obra.	Se hizo el acompañamiento en visita de seguimiento y verificación de la presencia de trabajadores en labores de obra			X
3		2337	7/01/2021	8/01/2021	SARA SANCHEZ	CIUDAD BOLIVAR	HABITARTE 2019	JUAN PABLO II	CL 68 SUR Nº 18 A - 08	3042647118		X			Se realiza visita social de seguimiento en el cual los beneficiarios estan demasiado molestos e inconformes por que desde el dia 08 de diciembre de 2020 tienen escombro botado fuera de la vivienda y no recogen con constancia y los vecinos del secto tomaron esta zona como botadero de basura		Desde el momento de la apertura del PQRS se alertó y se gestionó con al área encargada para que generara la recogida del escombro y de la basura evidenciada. El día 07/01/2020 se realizó la recogida de todo el escombro y la basura acumulada a las 4:00 pm; por tal motivo el día 08/01/2021 se realizó la visita para la verificación del estado de la vivienda por tal motivo se da por cerrado el PQRS.	Se hizo el acompañamiento en visita de seguimiento y verificación de la presencia de trabajadores para el retiro de escombros en la vivienda	se da por cerrado el PQRS, debido a quese recogio el escombro de la vivienda a.		X
4		4863	27/01/2021	10/02/2021	EULINE CARDENAS	CIUDAD BOLIVAR	HABITARTE 2019	JUAN PABLO II	KR 18V BIS 67C 16			X			Se realiza PQRSya que la beneficiaria refiere estar inconforme por las multiples demoras en la ejecucion de la obra, refiriendo que los maestros no vienen constantemente, desde el dia 23 de enero, el espacio del baño es mmuy reducido, rompieron un tubo en el area del lavadero lo cual genero que se presentara humedad por filtracion de agua en el primer piso, se daño un closet por el movimiento, dañaron una pala la cual no han repuesto, deben una factura de las compras que realizo por solicitud del maestro por un valo de $38.200, la vivienda cumplio 2 meses de ejecucion y no se ve avance de obra por lo cual se solicita se de prioridad a la vivienda y se pueda subsanar lo solicitado dpor la beneficiaria		Desde el momento de la apertura del PQRS se alertó y se gestionó con al área encargada para que se de solucion en cuanto a los requerimientos solicitados por la beneficiaria	se hizo acompañamiento y visita de seguimiento y verificacion evidenciando que todo lo solicitado por la beneficiaria quedo subsanado	se da por cerrado el PQRS, el contratista da solucion a la solicitado por la beneficiaria.		X
5		MVCA_3842	8/07/2021		IMELDA LOPEZ DE CEBALLOS	SANTA FE	CENTRO ALTO	LOS LACHES	KR 8B BIS ESTE 5A 23	3123070448-2332876	X				La beneficiaria remite derecho de peticion "Con respecto al as visitas realizadas por el contratistas de obra para la ejecución de mi subsidio, se me ha manifestado por parte de ellos que las obras que se van a realizar no son acordes con lo estipulado en el expediente entregado por la caja de vivienda popular y que por ley y mandato de la alcaldesa deben ser inferior, esto resulta perjudicial a favor mío por que la ejecución y el derecho que tengo de acceder al valor del subsidio será menor a lo que por ley está estipulado y de lo que está presupuestado por la caja de vivienda popular, esto resulta menos obra ejecutada y menor beneficio para mí y mi familia, solicito atentamente se respete el presupuesto de obra y se ejecuten las obras acorde a lo manifestado en el expediente por la caja de vivienda popular a la SDHT."		El 24 de febrero 2021 se realiza visita de atención de derecho de petición MVCA_3842 Imelda López de Ceballos casa 7 zona E. Barrio Los Laches. Hace presencia la SDH, la Interventoría y el Contratista (área técnica y social) para dar claridad a la beneficiaria y familiares, acerca de las actividades y presupuesto del mejoramiento de vivienda.	El 24 de febrero 2021 se realiza visita de atención de derecho de petición MVCA_3842 Imelda López de Ceballos casa 7 zona E. Barrio Los Laches. Hace presencia la SDH, la Interventoría y el Contratista (área técnica y social) para dar claridad a la beneficiaria y familiares, acerca de las actividades y presupuesto del mejoramiento de vivienda.			

INFORME SEMANAL 22

SISO

INPLAYCO S.A.S. Ingenieros Constructores e Interventores	**INFORME HSE**	

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	29/3/2021	"Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, administrativa y financiera para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat."	20
HASTA	3/4/2021		SEMANA 22

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

Contratista : Se verifica que se haga la respectiva Desinfección de manos y Botas antes de ingresar al MV dando cumplimiento al protocolo, Se Realiza inducción al personal operativo que se va designando a cada MV en caso de ser nuevo y se deja encargado a cada grupo por la toma de condiciones de salud, , capacita a los Beneficiarios que se les hace entrega del mejoramiento sobre el uso de las tres canecas blanca,verde y negra para así den un buen uso y reciclaje, Se realizan charlas al personal operativo segun cronograma .

Interventoría: Se verifica en los MV que el personal cumpla con todo lo debido al SG-SST y se habla que en las nuevas aperturas el personal debe contar con todo lo debido con el Área SST. Se espera que en esta próximas aperturas el personal que tenga hacer cubierta cuente con seguridad social,cursos de altura vigentes y permisos firmados por un coordinador de alturas.

Inconformidades:

-Un 96% del personal no cuenta con casco en los Mv
-Exámenes de ingreso del personal faltante ya que llevan más de 5 dias laborando y no se han presentado en su totalidad.
-Falta examenes con enfasis en alturas del personal que trabaja en el mismo.
-Se esta aperturando Mv en las localidades faltantes el cual el personal no les estan entregando Dotacion, Epp,s completos todo ello se deja anotado en Bitacora y informado al sst del contratista para solucionar el hallazgo.

Solicitudes al contratista:

- Verificar curso de altura que se adecuados a la actividad con su respectivo certificado que este avalado por el ministerio de trabajo.
- Permiso de trabajo por el ministerio de trabajo para trabajar fines de semana ya que se consideran como tiempo extra.
- Entrega de equipos de proteccion de caidas en buen estado y certificado de que son actos para su uso ya cuando se utilizaron de mas de un año.
- Ficha tecnica de estos equipos de altura
- Tener claros estos mv que se van hacer cubiertas
- Certificado de escombros
- Recoger escombro que aún sigue fuera de los MV ya que llevan más de dos días
- Cumplir acuerdo de las aperturas deben tener todos sus Epps,s y dotacion

INDUCCIÓN: se hace inducción al personal como se va asignando por vivienda por parte de la profesional sst del contratista, el cual realizará actividades en los MV aperturados socializando protocolo y políticas que se deben tener en cuenta al momento de iniciar sus labores.	SI	100%
	REALIZADA	

2. Gestión Ambiental

En el momento no se tiene ningún residuo.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
Escombro	0	161,5	CEMEX (Escombrera tunjuelo)	NO SE ENTREGARON CERTIFICADOS POR EL CONTRATISTA

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

3.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por festivos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Semanales	**284**	**1**	**516**	**0**	**0**

Total Acumulado	**1136**	**1**	**2064**	**0**	**0**

3.1.1.Incidendentalidad

	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento médico)
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Capacitaciones y Charlas

FECHA	CHARLA	FOTOS
15/3/2021	INDUCCIÓN SST- POLÍTICAS SST Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-	
15 AL 20 DE MARZO	NO HUBO	NO HUBO CHARLAS EN LA SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA

3.3. Condiciones y Acciones Subsanar			
3.3.1 Condición Subestándar			
No	**Descripción**	**Acción Tomada**	**La Condición Continua?**
1	Se encuentra al personal sin elementos de protección personal	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
2	Se encuentra al personal sin Dotación adecuada para las actividades a realizar	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
3	Se encuentra al personal en los MV sin estar afiliados a seguridad social	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
4	Se encuentra trabajos ya realizados y otros por realizar en alturas sin autorización	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
5	Se encuentra Escombro fuera de los Mv	Se habla con el personal y se les recuerda que deben dejar el escombro dentro del mv a menos de que el mismo dia pasen por el.	**SI**

4. Registro Fotográfico
Imagen

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SISO

Inplayco S.A.S.

Fecha: 29 de Marzo al 03 de Abrli de 2021

META DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD: 100%

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES O CHARLAS					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NÚMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kgs)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TÉCNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE	RELACIÓN DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
CONTRATO **695 - 2020** CONTRATISTA: **UNIÓN TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020**			Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Hábitat. Grupo II	212	1696	0,0	0,0	1,8	0	0	0	0	**0**		00/00/0000	0	0					
				212	1696	0,0	0,0	1,8	0	0	15	0	**0**		00/00/0000	0	0					
				212	1696	0,0	0,0	1,8	0	0	15	0	**0**		00/00/0000	0	0					
				212	1696	0,0	0,0	1,8	0	0	0	0	**0**		00/00/0000	0	0					
				212	1696	0,0	0,0	1,8	0	0	15	0	**0**		00/00/0000	0	0					
				212	1060	0,0	0,0	1,8	0	0	0	0	**0**		00/00/0000	0	0					
				212	9540	0,0	0,0	11,0	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0	0		0			

ELABORO: JOHN RODRIGO NORENA BAEZ-PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISO

MV:ACTIVOS
46

PROMEDIO DE CONSUMO DE AGUA POR MV	
LITROS	40
m3	0,04

INDICADORES SST- CONTRATO No. 4952018	
META AL PLAN AMBIENTAL 100%	%
META AL PLAN DE CALIDAD 100%	%
HORAS HOMBRE SEMANAL	9.540
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	38.160
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	0,00
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADA MENSUAL	0,00

Inplayco S.A.S.

Fecha: 29 de Marzo al 03 de Abrli de 2021

RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIDAS (Fechas)	OBSERVACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
NO SE REPORTO NINGUN TEMA POR EL CONTRATISTA	Se verifica que sean efectivas las charlas, de igual manera estas se hacen según el cronograma SST y novedades de los MV .				


GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	0
ESCOMBROS (Cantidad acomuladas mes)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal Semanal	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acomuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	11
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	44

INFORME SISO

Fecha: 29 de Marzo al 03 de Abrli de 2021


CONTRATO: 695 - 2020
UNION TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

No.	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINÚA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
		ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE			
1	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	8/3/2021	9/3/2021	MV 3835		
2	Se encuentra al personal sin Dotacion adecuada para las actividades a realizar	0	1	2/3/2021	4/3/2021	MV 4707		
3	Se encuentra al personal sin Dotacion adecuada para las actividades a realizar	0	1	2/3/2021	8/3/2021	MV 3363		
4	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	9/3/2021	10/3/2021	MV 3875		

5	Se encuentra al personal en los MV sin estar afiliados a seguridad social	0	1	2/3/2021	4/3/2021	MV 3361 TRABAJADOR CAMILO MARTINEZ HUESO, EL TRABAJADOR CUENTA CON TODAS LAS AFILIACIONES ARL-EPS- PENSION.	  
6	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	2/3/2021	4/3/2021	MV 3348	 
7	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	2/3/2021	4/3/2021	MV 3211	 
8	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	10/3/2021	16/3/2021	MV 4847	 
9	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	8/3/2021	16/3/2021	MV 3865	 
10	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	8/3/2021	16/3/2021	MV 3837	 

11	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	8/3/2021	16/3/2021	MV 3867		
12	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	15/3/2021	18/3/2021	MV 3157		
13	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	15/3/2021	18/3/2021	MV 3175		
14	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	15/3/2021	18/3/2021	MV 3195		
15	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA	0	1	8/3/2021	16/3/2021	MV 3866		
16	Se encuentra al personal sin Dotacion adecuada para las actividades a realizar	0	1	15/3/2021	18/3/2021	MV 3195		

17	Se encuentra al personal sin Dotacion adecuada para las actividades a realizar	0	1	15/3/2021	18/3/2021	MV 3348		
18	Se encuentra al personal sin Dotacion adecuada para las actividades a realizar	0	1	2/3/2021	8/3/2021	MV 3195		
		0	18					

TOTAL ACCIONES ABIERTAS	0
TOTAL ACCIONES CERRADAS	18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SISO

Fecha: 29 de Marzo al 03 de Abrli de 2021

CONTRATO: 695-2020
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRATIVO
UT MIC VIVIENDAS 2020

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
1	Yuly Andrea Casas Merchán	1.032.387.457	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
2	Adriana Ximena Santana Romero	52.476.883	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
3	Nancy Alejandra Charry Ávila	1.015.413.551	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
4	Robert Andrey Benavides Novoa	1.019.026.005	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
5	Astrid Espitia López	1.023.874.373	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
6	Alba Cristina Melo Martínez	36.759.988	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
7	José Dionisio Cárdenas Bolívar	79.511.489	20/11/2020	X		ok	x	AXA COLPATRIA	x		
8	Omar Yesid Cifuentes Cristiano	1.124.827.565	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
9	Jesús Andrés Melo Gachancipá	79.690.448	20/11/2020	X		ok	ok	X		x	
10	Adriana Castelblanco	52.428.231	20/11/2020	X		x	ok	AXA COLPATRIA	x		
11	Sharon Adriana Arias Aldana	1.013.673.517	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
12	Daniela Sanchéz Molina	1.015.463.608	20/11/2020	X		x	x	AXA COLPATRIA	x		
13	Martha Yolanda Pinzón Silva	1.101.685.570	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
14	Paula Betancourt Uzeta	1030684980	10/12/2020	X		ok	ok	X		x	
15	Didier Alexis Rueda Monsalve	1.100.964.716	7/1/2021	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
16	Juan Andres Corredor Mayorga	1.022.401.358	28/1/2021	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
			TOTAL	**16**	**0**			**TOTAL**	**14**	**2**	

OPERATIVO
AHME CONSTRUCCIONES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
1	FLORENCIO FORERO ARTEAGA	79582932	17/11/2020		x	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
2	GILDARDO DUQUE CIFUENTES	80237066	17/11/2020		x	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	x		
3	JHON BEJARANO TENZA	1013585125	17/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
4	JORGE MORA CORTES	80771112	17/11/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
5	ROBINSON CIFUENTES VALENCIA	1095808493	19/01/2021		x	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	x		
6	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	M836225801071979	18/11/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
7	ROBERT SALAZAR CARREÑO	M835913327071985	18/11/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
8	FABIO SILVA ORTEGA	2954992	24/11/2020		x	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
9	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRRY	16833656	24/11/2020		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	x		
10	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	12270044	24/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
11	LUIS GARCES GOMEZ	79354168	13/12/2020		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	x		
12	WILLIAM ARIAS GONZALEZ	80063977	26/11/2020		x	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
13	ANDRES DURAN ESTEPA	1033760141	1/12/2020		x	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	x		
14	NORBEY AREVALO CASTAÑEDA	18235741	1/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
15	HECTOR RAMIREZ GOMEZ	14259617	1/12/2020		x	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
16	RIGOBERTO ESTREN CAMAÑO	1129525247	1/12/2020		x	CAJACOPI	PORVENIR	POSITIVA	x		
17	MAICOL DURAN BENITEZ	1033768558	1/12/2020		x	CAPITAL SALUD	ADMUTUAL	POSITIVA	x		
18	DALADIER CUELLAR GONGORA	79637053	1/12/2020		x	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
19	WILLIANS MERIÑO BAEZ	1032510255	10/12/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
20	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	1067038139	8/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
21	DIEGO CORRECHA RIVERA	93207369	12/12/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
22	JOSE DOMINGO AREVALO	3232140	24/11/2020		x	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA		x	
23	STIVEN PRIETO OLIVEROS	1033810108	1/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
24	MAURICIO FREIRE	79267381	12/11/2020		x	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
25	JUAN HERAZO VALDES	79476251	17/11/2020		x	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	x		
26	SADDIEL BERTI RODRIGUEZ	942458427051975	25/11/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
27	FIDEL RODRIGUEZ	1033480242	11/12/2020		x	X	PORVENIR	POSITIVA		x	envio copia de contraseña comprobando que fue rechazada en la EPS salud total ya que esta vencida nunca presentó la cédula afiliarlo a la
28	MICHEL GAMBA MELO	1000107874	11/12/2020		x	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
29	JHON MAYORGA BENAVIDES	1033721955	1/12/2020		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	x		
30	EDUARD VALENZUELA	1026576425	18/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
31	EDWIN BUITRAGO	1070919070	10/12/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
32	ISAAC MONTOYA	19212654	8/12/2020		x	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
33	JHON EDWIN ZULUAGA	1032401694	1/12/2020		x	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	x		
34	OCTAVIO MOLANO	91107563	8/12/2020		x	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
35	EDWIN FERREIRA BRACHO	810277414021984	10/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
36	JAIVER CRISPIN VANEGAS	79609536	4/12/2020		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	x		
37	JOSE RUIZ MUÑOZ	1033750096	8/12/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
38	LUIS EVELIO HERNANDEZ	19219713	9/12/2020		x	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	x		
39	CESAR PARDO PEÑA	79863108	8/12/2020		x	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		x	
40	DIEGO PEÑA PEÑA	1069303999	11/12/2020		x	EPS SURA	COLFONDOS	POSITIVA	x		
41	PEDRO PEÑA ROMERO	261568	10/12/2020		x	CONVIDA	X	POSITIVA		x	estaba cotizando en el fondo de pensiones PORVENIR; ya tiene la edad para tramitar la pensión
42	ALEJANDRO RANGEL PARRA	PM801726928092000	11/12/2020		x	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	x		
43	DOMINGO MENDOZA GARCIA	PM809306716031969	10/12/2020		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	x		
44	JOSE RODRIGUEZ CASTIBLANCO	19399343	24/11/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
45	JONATHAN QUIMBAY RODRIGUEZ	80165089	24/11/2020		x	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	x		
46	JOSE RAVELO BLANCO	79769383	27/11/2020		x	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	x		
47	ANDRES GUTIERREZ PARRA	10331136682	12/12/2020		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		x	
48	BRANDON REYES RONCANCIO	1001284627	11/12/2020		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	x		
49	DIEGO YAGUARA GARCIA	1111337806	4/12/2020		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	x		
50	DIONER PULIDO GAMBA	79913877	12/12/2020		x	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
51	JEDER VEGA PRIETO	79223253	11/12/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
52	JEFFERSON RAMIREZ AVILA	100022415	11/12/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		

53	JOSE CORDOBA MAHECHA	80842696	12/12/2020		x	SURA	PORVENIR	POSITIVA	x		
54	JOSE MAURICIO GONZALEZ QUINTERO	79666743	26/11/2020		x	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
55	LUIS BUITRAGO LAVERDE	1070916164	18/11/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
56	MICHAEL RINCON ROJAS	1000616916	12/12/2020		x	X	PORVENIR	POSITIVA	x		la EPS CAPITAL SALUD solicita los documentos de los hijo del señor MICHEL RINCON , para hacer la afiliación, se solicitaron desde el día
57	ROQUE PARRA ESTUPIÑAN	13925263	1/12/2020		x	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
58	RUBEN SANCHEZ SALAMANCA	1032487616	12/12/2020		x	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	x		
59	STEVEN BALLEN ARIZA	1013613490	12/12/2020		x	COMPESAR	PROTECCION	POSITIVA		x	
60	WILSON LUNA DAZA	79767907	1/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
61	YAIR VEGA VEGA	1000364494	11/12/2020		x	CONVIDA	PORVENIR	POSITIVA	x		
62	YORWIN VARGAS GONZALEZ	M836663326081993	11/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
63	JOSE LINARES LINARES	80376575	26/11/2020		x	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		x	
64	NERY VILLAMIZAR LOZANO	1022971724	27/11/2020		x	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	x		
65	ORLANDO DE JESUS ROJAS	1018467716	11/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
66	HENRY CONDE HIGARDO	772500127031	13/12/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
67	JHON ELIECER GONZALEZ	80247578	13/12/2020		x	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA		x	
68	NORMAN RINCON ROJAS	1024514956	17/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
69	VICTOR RODRIGUEZ CASTIBLANCO	79444038	17/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
70	CARLOS ORTIZ CASTAÑO	1045764905	13/12/2020		x	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	x		
71	ANDRES GARCIA	80895628	15/12/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		x	
72	CARLOS MUÑOZ MONROY	3162248	15/12/2020		x	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
73	EDGAR RAMIREZ	79922315	15/12/2020		x	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		x	
74	EMMANEL GUILLEN MENDOZA	M734208408021983	15/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
75	JEISON LOPEZ MEJIA	1033816388	15/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
76	JULIAN ARAGON DEVIA	1030628205	15/12/2020		x	CONVIDA	PORVENIR	POSITIVA		x	
77	CRISTIAN AVILA CORTES	1033814196	16/12/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		x	
78	LUIS DURAN BENITEZ	80373984	16/12/2020		x	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		x	
79	MAYBER DUQUE RODRIGUEZ	1000693460	15/12/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		x	
80	EDINSON VENENCIA	72120789	24/11/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
81	BRIAM LOAIZA MARTINEZ	1024534272	18/12/2020		x	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
82	CESAR BENAVIDES JIMENEZ	1193036484	27/11/2020		x	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA		x	
83	CRISTIAN GARCIA ROJAS	1024538808	19/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
84	JUAN PEROZO ROMERO	832140302061977	22/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
85	WILFREDO TORRES FLOREZ	944410404111983	21/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
86	HECTOR CHOURIO	14444608	2/12/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
87	ANGEL DUARTE ROMERO	79666071	11/12/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
88	JOSE MARTINEZ VARGAS	79666136	27/11/2020		x	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
89	VICTOR RIZO MIRANDA	1066097223	5/01/2021		x	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA	x		
90	EDER GONZALEZ CASTELBONDO	84062070	1/12/2020		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		x	
91	FERNANDO MORENO HUERTAS	3199429	26/11/2020		x	X	PORVENIR	POSITIVA	x		NO HA LLEVADO LAS COPIAS DEL REGISTRO CIVIL DE LOS HIJOS
92	ILDEFONSO PEÑARANDA IGUARAN	1118873986	1/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
93	MANUEL MARTINEZ DUARTE	79560342	16/12/2020		x	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
94	VICTOR AVILA MARTINEZ	79595625	8/01/2021		x	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	x		
95	ALEX AREVALO CORTES	79919441	7/01/2021		x	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
96	ANDRES PARRA GUTIERREZ	1023947059	7/01/2021		x	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
97	ARNALDO PIÑERUA	M90671322411978	5/01/2021		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		x	
98	CRISTIAN VELANDIA CASTIBLANCO	1012361554	7/01/2021		x	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA		x	
99	DAIRO RAFAEL CARDENAS NARVAEZ	1043606888	6/01/2021		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
100	FABIAN TORRES GARCIA	79808126	6/01/2021		x	EPS SURA	PORVENIR	POSITIVA		x	
101	FRANCISCO CUBILLOS CHIQUINQUIRA	1023895682	7/01/2021		x	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
102	WILLIAM GARZON	79956633	7/01/2021		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
103	JEISSON TORRES CARREÑO	1023033517	7/01/2021		x	EPS SURA	PORVENIR	POSITIVA		x	
104	JOSE CAÑON SANA	79452832	7/01/2021		x	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
105	JOSE OSPINA MUÑOZ	449569	8/01/2021		x	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
106	LESCARLOS BAUTISTA	1003124440	7/01/2021		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		x	
107	OMAR GOMEZ MEDINA	M833897123021999	7/01/2021		x	MUTUAL SER	PROTECCIÓN	POSITIVA		x	
108	ORLANDO HERNANDEZ	5842300	7/01/2021		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
109	JONNY PALACIOS JUYO	1000514366	7/01/2021		x	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		x	
110	JOSMAN OSORIO GAONA	1022427780	7/01/2021		x	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		x	

111	LUIS REYES RODRIGUEZ	79655749	12/01/2021		x	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		x	
112	NORBERTO AMAYA ALVAREZ	1033687438	12/01/2021		x	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA		x	
113	WILSON MORALES PEÑA	1033697359	9/01/2021		x	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	x		
114	ANDRES BARON ALVAREZ	1033783510	12/01/2021		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
115	JHONATAN RAMIREZ MOLINA	1010209390	13/01/2021		x	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA		x	
116	ROGELIO ROBLES BELLO	19935160	13/01/2021		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
117	CRISTIAN LINARES BELTRAN	1000855005	18/11/2020		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		x	
118	JUAN LADINO CASTELBLANCO	1033696448	23/11/2020		x	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
119	ALONSO SOLER DUMAR ALEXIS	1002682938	24/11/2020		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		x	
120	ABELLO TRIANA GIOVANNY ALEXANDER	1013636864	26/11/2020		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		x	
121	PALMERO ROIMAN RAMO	948216420011 030	18/11/2020		x	X	PORVENIR	POSITIVA		x	La EPS rechazo la afiliacion ni es legible el PERMISO ESPECIAL DE PERMANCIA, se lo solicitue varias veces nuevamente par afiliar a la
122	OSPINA TOVAR ALEJANDRO	82338410	16/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
123	SILVA LOPEZ LEONAL GERARDO	PE 456736120091984	17/11/2020		x	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
124	CIPRIAN FRANCO JORGE ANATOLIO	79769383	23/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
125	VIVAS CALDERON OVIDIO	79493842	24/11/2020		x	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
126	VIVAS BOHORQUEZ LUIS ALFONSO	79493842	17/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
127	CRUZ CRUZ MANUEL LEONARDO	79573733	23/11/2020		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		x	
128	MARTINEZ BUSTOS JHONY	79583292	25/11/2020		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		x	
129	MESA LEON JOSE JAVIER	79322883	23/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
130	GARCIA RINCON LUIS ALFONSO	79668467	16/11/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
131	ACERO OJEDA CARLOS ARTURO	79433284	16/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
132	RIVERA GOMEZ WILSON ENRIQUE	11524043	23/11/2020		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		x	
133	CARDONA JARAMILLO JORGE ANTONIO	16111922	21/12/2020		x	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
134	FORERO ARTEAGA JORGE	19350740	16/11/2020		x	EPS SURA	PORVENIR	POSITIVA		x	
135	HERAZO PEREZ WILLY JOSE	1051362748	16/11/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
136	GOMEZ FUENTES CARLOS ANDRES	1073603255	16/11/2020		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		x	
137	MOSQUERA MOSQUERA JHON DAVID	1015460856	25/11/2020		x	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
138	RUIZ CASTELLANOS CARLOS ONEIBER	1018414764	23/11/2020		x	EPS SURA	PORVENIR	POSITIVA		x	
139	TORRES CARREÑO JEFFER FABIAN	1023013197	24/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
140	HERNANDEZ DIEGO HERNAN	1032405268	24/11/2020		x	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
141	GABRIEL GARAVITO SALAMANCA	79345951	14/01/2021		x	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
142	HABITH OROZCO OLIVERO	1051361502	13/01/2021		x	EPS SANITAS	PORVENIR	POSITIVA		x	
143	JESUS JIMENEZ	M818438318091981	14/01/2021		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
144	MIGUEL SERRATO ALVAREZ	10325113211	14/01/2021		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		x	
145	ROBER CESPEDES MIQUELENA	M835657422111975	14/01/2021		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
146	WILLIAM GORDO ROJAS	1033706587	14/01/2021		x	X	PORVENIR	POSITIVA	x		la EPS CAPITAL SALUD solicita los documentos de los hijo para hacerle la afiliacion, s lesolitaron desde el dia 14 de enero hasta el dia
147	JOSE PINILLA GONZALEZ	79670742	13/01/2021		x	EPS SANITAS	PORVENIR	POSITIVA		x	
148	WILSON PEREZ SERRATO	79975166	13/01/2021		x	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
149	ADELINO MALLARINO ACEVEDO	73094673	15/01/2021		x	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		x	
150	DANIEL RODRIGUEZ MAHECHA	80200854	15/01/2021		x	EPS SANITAS	PROTECCION	POSITIVA		x	
151	PEDRO VALERO CELIS	M835190319011994	15/01/2021		x	EPS SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	x		
152	KEVIN AREVALO SUAREZ	1000338453	18/01/2021		x	EPS SANITAS	PROTECCION	POSITIVA		x	
153	LUIS MOLINA GUTIERREZ	80722832	18/01/2021		x	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA		x	
154	MIGUEL ORTIZ MORA	1106781809	18/01/2021		x	ECOOPSOS	PROTECCION	POSITIVA		x	
155	PABLO MORA CORTES	80769891	18/01/2021		x	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
156	ALFREDO GUTIERREZ LACRUZ	M944669825031995	15/01/2021		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA			
157	JUSTIN TRIVIÑO DELGADO	1000727448	15/01/2021		x	COMPENSAR EPS	PORVENIR	POSITIVA		x	
158	CRIPRIANO PIÑEROS	79703764	30/11/2020		x	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA			
159	JORGE BEROES	M933222013111989	14/01/2021		x	NUEVA EPS	X	POSITIVA		x	**PENSIONADO POR PROTECCIÓN,** se le solicitó certificación de protecci
160	RAUL OSORIO RINCON	79669250	17/11/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
161	VICTOR GUERRERO PACHECO	80126593	26/11/2020		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	x		
162	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1101879446	25/11/2020		x	COMPARTA	PORVENIR	POSITIVA	x		
163	CARLOS OVIEDO GOMEZ	1024502152	20/01/2021		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
164	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1033776296	20/01/2021		x	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA		x	
165	RAFAEL GAMEZ MARTINEZ	1065810726	20/01/2021		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
166	DUVAN HERNANDEZ	1082974394	26/01/2021		x	COMPARTA	PORVENIR	POSITIVA		x	
167	DEIBY PEDRAZA LONDOÑO	1012343367	10/12/2020		x	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA			
168	NICOLAS RUBIANO REYES	1001276100	28/01/2021		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		x	

169	WILLIAM PEDRAZA LONDOÑO	80214620	15/01/2021		x	X	COLPENSIONES	POSITIVA		x	El personal no cuenta con toda la documentacion que de fe del cumplimiento del SG - SST
170	OSCAR PULIDO GUEVARA	1012443203	2/02/2021		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
171	MICHAEL CRISTIANO RAMIREZ	1033806404	4/02/2021		x	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		x	
172	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80774495	6/02/2021		x	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA	x		
173	ANDRES BARAHONA GOMEZ	80256059	22/01/2021		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
174	JOHN RAMOS YAGUARA	80748603	7/01/2021		x	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
175	EDILBERTO CAÑON CASALLAS	79924548	5/01/2021		x	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		x	
176	ANDRES PEREZ ARIAS	1063625214	5/02/2021		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	x		
177	MICHEL SALAS CELIS	1033766212	17/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
178	OSBAR BERNAL PAEZ	80778371	20/11/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		x	
179	WILSON BERNAL GUSCA	1033707175	11/02/2021		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
180	ANDERSON BUSTOS ZULUAGA	1000694458	8/02/2021		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
181	JOHAN CESPEDES MENDOZA	1013694701	9/02/2021		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
182	KEVIN MARTINEZ RODRIGUEZ	1000118548	9/02/2021		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		x	
183	EDGAR MURCIA ORDOÑEZ	14322354	12/02/2021		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
184	OSWALDO RINCON	1047512742	13/01/2021		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
185	LUIS HERNANDEZ BARRERO	80858697	13/01/2021		x	EPS SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	x		
186	JAISON ACERO DE LA ROSA	1044391694	18/02/2021		x	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	x		
187	MARLON GUZMAN TRANSLAVIÑA	1007339845	15/02/2021		x	COOMEVA	PORVENIR	POSITIVA		x	
188	FABIAN ESCOBAR GOMEZ	1024482810	18/01/2021		x	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	x		
189	LUIS CARRILLO	79460485	18/02/2021		x	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		x	
190	MIGUEL AMADO MONTEJO	1007392839	18/02/2021		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
200	PAOLA BOHORQUEZ RUBIANO	53152764	18/01/2021		x	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	POSITIVA		x	
201	EDILSON CASTRO SOTO	1033680989	25/02/2021		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	x		
202	CAMILO MARTINEZ HUESO	80743123	26/02/2021		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	x		
203	SOCRATES TORRENEGRA	8601642	20/01/2021		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	x		
204	WUILLIAM ZABALA	16102961	10/01/2021		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
205	ISAAC SOTO BARRIOS	1016119459	4/03/2021		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
206	JORGE HERNANDEZ RAMIREZ	79771079	9/03/2021		x	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	x		
207	SAUL ROSAS VARGAS	20534087	9/03/2021		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		x	
208	JULIAN AVILA DAZA	1023939926	25/01/2021		x	SANITAS		POSITIVA	x		
209	OSCAR AVILA DAZA	1007454186	13/03/2021		x	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	x		
210	CARLOS VIANA	9774730	15/03/2021		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
211	RAUL SALAMANCA SALGADO	80749213	16/03/2021		x	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	x		
212	JULIO ESPINOZA ALVARADO	17860730	16/03/2021		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
213	ANGEL PINTOR	79853246	16/03/2021		x	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	x		
214	GREGORIO OLMOS BENITEZ	4066960	16/03/2021		x	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	x		
215	LEONID BARBOSA PEINADO	1003275162	16/03/2021		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	x		
216	HECTOR VILLALOBOS CASTILLO	19569500	17/03/2021		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
217	LUIS DORANTE ADAN	13991730	17/03/2021		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	x		
			TOTAL	**0**	**217**			**TOTAL**	**104**	**101**	

ACUARELA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JAVIER PALENCIA JIMENEZ	1143171522	11/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	x		
2	ALEXIS MENDEZ GARCIA	96193680312	18/11/20		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA		x	
3	ARLEY CAMILO GIRALDO ORTIZ	1.013.689.988	12/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	x		
4	RONALDO CASTRO SANCHEZ	102460239	15/12/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA		x	
5	EDSON JOHAN ROMERO LOPEZ	1024604236	24/11/2020		x	SANITAS	PORVENIR	SURA	x		
6	FERNANDEZ GABRIEL ALEJANDRO	773439426021978	15/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	x		
7	HUMBERTO MOSCOSO GARCIA	71536150	18/11/2020		x	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPÁTRIA	x		
8	IVAN ANTONIO LOPEZ CHIVATA	1002314572	24/11/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		x	
9	JUNIOR DAVID BRACHO	Z831775706 081987	11/12/20		x	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	x		
10	MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRERO	79502676	24/11/2020		x	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	x		
11	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VASQUEZ	1031152755	25/11/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	x		
12	MIGUEL ANGEL REY CUADROS	1024541228	4/12/2020		x	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXA COLPATRIA	x		
13	MIGUEL RIVERO	2761157	11/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
14	PEDRO RUIZ ANGULO	98429140	11/12/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	x		
15	PERALES FLORIAN DAIRO	85.163.998	12/12/2020		x	COOMEVA	PROTECCION	SURA	x		
16	RAFAEL HERNANDEZ ARANDA	834934223101995	12/12/20		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
17	RENNY JOSE MONTERO ZAMORA	9712761	24/11/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	x		
18	WILMAR DELGADO	1003923499	11/12/20		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	x		
19	WILMER ANDRES MENDIETA ALVAREZ	1022938136	9/12/2020		x	NUEVA EPS	COMPENSAR	POSITIVA	x		
20	PEDRO MONDRAGON VACA	4047037	13/01/2021		x	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA		x	
21	JUAN CARLOS CERQUERA MENDEZ	80859935	2/02/2021		x	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	AXA COLPATRIA		x	
22	JOINER DAVID BRACHO GONZALEZ	26126465	25/01/2021		x	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	x		
23	HERNAN VANEGAS IBAÑEZ	80896790	26/01/2021		x	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	x		
24	JUAN RAMIREZ MANCERA	79990751	23/12/2020		x	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	x		
25	JASBLEIDY FORIGUA CASTILLO	52326579	20/12/2020	x		FAMISANAR	COMPENSAR	SURA	x		
26	ANGEL HERNANDO SANCHEZ GOMEZ	79726856	31/10/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
27	ANDRES DELGADO	1031182992	15/02/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
28	BRAYAN MONSALVE	1033783407	30/10/2020		x	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
29	CAMILO GANOA SOTELO	1033726953	30/10/2020		x	X	COLPENSIONES	POSITIVA		x	El personal no cuenta con toda la documerntación que de fe del cumplimiento del SG - SST
30	EDISON CASTRO	1033719974	30/10/2020		x	SANITAS	EPS SANITAS	POSITIVA		x	El personal no cuenta con toda la documerntación que de fe del cumplimiento del SG - SST
31	EDIXON GUTIERREZ LOAIZA	86086644	30/10/2020		x	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		x	
32	JOAN ARIAS GOMEZ	1033812687	30/10/2020		x	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		x	
33	MAURICIO JAIMES LUCENA	79407194	31/10/2020		x	SANITAS	X	POSITIVA		x	El personal no cuenta con toda la documerntación que de fe del cumplimiento del SG - SST
34	WILLIAM BONILLA OSORIO	1032376827	5/09/2019		x	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA		x	
35	WILMER PIÑA	1237443301	30/10/2020		x	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		x	
36	EDIGAR RAMOS ROMERO	842225131101984	12/12/2020		x	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		x	
37	VARGAS MENDOZA DIOCEL STEVENS	1.006.857.064	5/09/2019		x	FAMISANAR	PORVENIR	SURA		x	
38	BRAYAN STEVEN ROJAS	1024594954	12/12/2020		x	CAPITAL SALUD	PROTECCIÒN	AXA COLPATRIA		x	

39	LUCIANO TOVAR MER	92558171	18/11/2020	X		X	COLPENSIONES	SURA		x	El personal no cuenta con toda la documerntación que de fe del cumplimiento del SG - SST
40	ANDRES MAURICIO TORRES	1070957742	18/11/2020	X		X	X	SURA		x	El personal no cuenta con toda la documerntación que de fe del cumplimiento del SG - SST
41	GINETTE NATALIA TORRES DIAZ	1014195383	SURA	X		X	X	SURA		x	El personal no cuenta con toda la documerntación que de fe del cumplimiento del SG - SST
42	MARIA ELENA MENCO COLON	1102870684	27/11/2020	X		SANITAS	PORVENIR	SURA	X		
43	EDGAR FABIAN PENAGOS PADILLA	1013647069	18/11/2020	X		X	X	SURA	X		El personal no cuenta con toda la documerntación que de fe del cumplimiento del SG - SST
44	JUAN CARLOS CORREA MARTINEZ	79273846	24/11/2020	X		COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	X		
45	WILMER TORRES LEAL	1012426714	2/02/2021		X	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	X		
46	NICOLAS MONTOYA SARMIENTO	79668628	02/02/2021		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA		x	
47	RAFAEL MONTILLA MENDOZA	1043613599	29/1/2021		X	EPS SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	X		
48	LUIS SAMACA	79465357	02/02/2021		X	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA		X	
49	LUIS FRANCISCO MIONCADA MONCADA	1098170318	02/02/2021		X	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	X		
50	JOHAN ARIZA	1005294400	02/02/2021		X	NUEVA EPS	PROTECCION	AXA COLPATRIA		x	
51	EDGAR MARTINEZ	79296107	02/02/2021		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA		x	
52	EDGAR ANDRES ALARCON BERCALDO	1032448252	23/12/2020		X	FAMISANAR	PROTECCION	AXA COLPATRIA	X		
53	CRISTIAN DELGADO CASTRO	1003923418	02/02/2021		X	CAPITAL SALUD	PORVENRI	AXA COLPATRIA	X		
54	ELIO RIVERA ORTIZ	79679114	29/01/2021		X	CAPITAL SALUD	PROTECCION	AXA COLPATRIA		X	
55	LUIS CHICUASAQUE ARIAS	1033728934	29/01/2021		X	CAPITAL SALUD	PORVENIR	AXA COLPATRIA	X		
56	JORGE GANOA BETANCUR	1033773045	29/01/2021		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXA COLPATRIA	X		
57	JORGE LEONARDO RUIZ PIRELA	82946815091992	4/02/2021		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA		X	
58	JOSE MUÑOZ	82497852705	4/02/2021		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	X		
59	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7330323	15/12/2020		X	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURAMERICANA		X	
60	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4103403	15/12/2020		X	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SURA		X	
61	EDILBERTO CRUZ SANTA	106780037	4/02/2021	X		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	X		
62	YESID MANUEL TAPIA	79355917	2/02/2021		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	X		
63	JOSE EDGAR IBAGUE	79480674	2/02/2021	X		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	X		
64	JOSE FRANCISCO ZAMUDIO VARGAS	1006737961	2/02/2021		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	X		
65	JHON FREDY URREGO	107249670	2/02/2021		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	X		
66	DUBERNEY LIZCANO MONROY	1083882905	2/02/2021		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	X		
67	JHON FREDDY TRUJILLO	17497039	2/02/2021		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	X		
68	CARLOS ALBERTO TALERO PINEDA	1033739164	21/02/2021		X	EPS SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA		X	
69	JESSICA NATALIA DUARTE FIERRO	1010222972		X		X	PORVENIR	SURA	X		
70	MANUEL RODRIGO HERRERA SANCHEZ	79816557			X	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	X		
71	WILLIAM ALEXANDER RODRIGUEZ GOMEZ	79216433			X	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	X		
72	JONATHAN STEVEN MONROY NUÑEZ	1000691014			X	MEDIMAS	PORVENIR	SURA	X		
73	IRMA PAOLA ORTEGA PADILLA	1073702769			X	MEDIMAS	PORVENIR	SURA	X		
74	JHON JAIRO CASILLAS LOPEZ	79211497			X	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	X		
75	LUIS ALFREDO CRUZ BELTRAN	79659590			X	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	X		
				10	65				45	30	

INFORME SISO

Fecha: 29 de Marzo al 03 de Abrli de 2021

CONTRATO: 695-2020
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

ADMINISTRATIVO
UT MIC VIVIENDAS 2020

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO/NO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	ACTIVO	RETIRADO	
1	Yuly Andrea Casas Merchán	1.032.387.457	20/11/2020	23/11/2020	X			X	X		
2	Adriana Ximena Santana Romero	52.476.883	20/11/2020	23/11/2020	X			X	X		
3	Nancy Alejandra Charry Ávila	1.015.413.551	20/11/2020	1/12/2020	X			X	X		
4	Robert Andrey Benavides Novoa	1.019.026.005	20/11/2020	22/1/2020	X			X	X		
5	Astrid Espitia López	1.023.874.373	20/11/2020	23/11/2020	X			X	X		
6	Alba Cristina Melo Martínez	36.759.988	20/11/2020	1/12/2020	X			X	X		
7	José Dionisio Cárdenas Bolívar	79.511.489	20/11/2020	1/12/2020	X			X	X		
8	Omar Yesid Cifuentes Cristiano	1.124.827.565	20/11/2020	1/12/2020	X			X	X		
9	Jesús Andrés Melo Gachancipá	79.690.448	30/11/2020	30/11/2020	X			X		X	
10	Adriana Castelblanco	52.428.231	20/11/2020	X	X			X	X		
11	Sharon Adriana Arias Aldana	1.013.673.517	20/11/2020	13/11/2020	X			X	X		
12	Daniela Sanchéz Molina	1.015.463.608	30/11/2020	1/12/2020	X			X	X		
13	Martha Yolanda Pinzón Silva	1.101.685.570	20/11/2020	23/11/2020	X		X		X		
14	Paula Betancourt Uzeta	1030684980	10/12/2020	5/11/2020	X			X		X	
15	Didier Alexis Rueda Monsalve	1.100.964.716	7/1/2021	X	X		X		X		
16	Juan Andres Corredor Mayorga	1.022.401.358	28/1/2021	24/11/2020	X			X	X		
RESULTADOS:					**16**	**0**	**2**	**16**	**14**	**2**	

OPERATIVO
AHME CONSTRUCCIONES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO/NO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	ACTIVO	RETIRADO	
1	FLORENCIO FORERO ARTEAGA	79582932	17/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
2	GILDARDO DUQUE CIFUENTES	80237066	17/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso

3	JHON BEJARANO TENZA	1013585125	17/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
4	JORGE MORA CORTES	80771112	17/11/2020			X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
5	ROBINSON CIFUENTES VALENCIA	1095808493	19/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
6	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	M836225801071979	18/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
7	ROBERT SALAZAR CARREÑO	M835913327071985	18/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
8	FABIO SILVA ORTEGA	2954992	24/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
9	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRRY	16833656	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
10	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	12270044	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
11	LUIS GARCES GOMEZ	79354168	13/12/2020	2/12/2020		X			X		
12	WILLIAM ARIAS GONZALEZ	80063977	26/11/2020	2/12/2020		X			X		
13	ANDRES DURAN ESTEPA	1033760141	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
14	NORBEY AREVALO CASTAÑEDA	18235741	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
15	HECTOR RAMIREZ GOMEZ	14259617	1/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
16	RIGOBERTO ESTREN CAMAÑO	1129525247	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
17	MAICOL DURAN BENITEZ	1033768558	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
18	DALADIER CUELLAR GONGORA	79637053	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
19	WILLIANS MERIÑO BAEZ	1032510255	10/12/2020	2/12/2020		X			X		
20	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	1067038139	8/12/2020	2/12/2020		X				X	
21	DIEGO CORRECHA RIVERA	93207369	12/12/2020	2/12/2020		X	X		X		
22	JOSE DOMINGO AREVALO	3232140	24/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
23	STIVEN PRIETO OLIVEROS	1033810108	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
24	MAURICIO FREIRE	79267381	12/11/2020	2/12/2020		X			X		
25	JUAN HERAZO VALDES	79476251	17/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
26	SADDIEL BERTI RODRIGUEZ	942458427051975	25/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
27	FIDEL RODRIGUEZ	1033480242	11/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
28	MICHEL GAMBA MELO	1000107874	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
29	JHON MAYORGA BENAVIDES	1033721955	1/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
30	EDUARD VALENZUELA	1026576425	18/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
31	EDWIN BUITRAGO	1070919070	10/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
32	ISAAC MONTOYA	19212654	8/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
33	JHON EDWIN ZULUAGA	1032401694	1/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
34	OCTAVIO MOLANO	91107563	8/12/2020	2/12/2020		X				X	
35	EDWIN FERREIRA BRACHO	810277414021984	10/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
36	JAIVER CRISPIN VANEGAS	79609536	4/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
37	JOSE RUIZ MUÑOZ	1033750096	8/12/2020	2/12/2020		X			X		
38	LUIS EVELIO HERNANDEZ	19219713	9/12/2020	2/12/2020		X			X		
39	CESAR PARDO PEÑA	79863108	8/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
40	DIEGO PEÑA PEÑA	1069303999	11/12/2020	14/10/2020		X	X		X		
41	PEDRO PEÑA ROMERO	261568	10/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
42	ALEJANDRO RANGEL PARRA	PM801726928092000	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
43	DOMINGO MENDOZA GARCIA	PM809306716031969	10/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
44	JOSE RODRIGUEZ CASTIBLANCO	19399343	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
45	JONATHAN QUIMBAY RODRIGUEZ	80165089	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
46	JOSE RAVELO BLANCO	79769383	27/11/2020	2/12/2020		X			X		
47	ANDRES GUTIERREZ PARRA	10331136682	12/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
48	BRANDON REYES RONCANCIO	1001284627	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
49	DIEGO YAGUARA GARCIA	1111337806	4/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
50	DIONER PULIDO GAMBA	79913877	12/12/2020	18/12/2020		X			X		
51	JEDER VEGA PRIETO	79223253	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
52	JEFFERSON RAMIREZ AVILA	100022415	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
53	JOSE CORDOBA MAHECHA	80842696	12/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
54	JOSE MAURICIO GONZALEZ QUINTERO	79666743	26/11/2020	22/12/2020		X			X		
55	LUIS BUITRAGO LAVERDE	1070916164	18/11/2020	2/12/2020		X			X		
56	MICHAEL RINCON ROJAS	1000616916	12/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso

57	ROQUE PARRA ESTUPIÑAN	13925263	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
58	RUBEN SANCHEZ SALAMANCA	1032487616	12/12/2020	18/12/2020		X			X		
59	STEVEN BALLEN ARIZA	1013613490	12/12/2020	2/12/2020		X				X	
60	WILSON LUNA DAZA	79767907	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
61	YAIR VEGA VEGA	1000364494	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
62	YORWIN VARGAS GONZALEZ	M836663326081993	11/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
63	JOSE LINARES LINARES	80376575	26/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
64	NERY VILLAMIZAR LOZANO	1022971724	27/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
65	ORLANDO DE JESUS ROJAS	1018467716	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
66	HENRY CONDE HIGARDO	772500127031	13/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
67	JHON ELIECER GONZALEZ	80247578	13/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
68	NORMAN RINCON ROJAS	1024514956	17/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
69	VICTOR RODRIGUEZ CASTIBLANCO	79444038	17/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
70	CARLOS ORTIZ CASTAÑO	1045764905	13/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
71	ANDRES GARCIA	80895628	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
72	CARLOS MUÑOZ MONROY	3162248	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
73	EDGAR RAMIREZ	79922315	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
74	EMMANEL GUILLEN MENDOZA	M734208408021983	15/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
75	JEISON LOPEZ MEJIA	1033816388	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
76	JULIAN ARAGON DEVIA	1030628205	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
77	CRISTIAN AVILA CORTES	1033814196	16/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
78	LUIS DURAN BENITEZ	80373984	16/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
79	MAYBER DUQUE RODRIGUEZ	1000693460	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
80	EDINSON VENENCIA	72120789	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
81	BRIAM LOAIZA MARTINEZ	1024534272	18/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
82	CESAR BENAVIDES JIMENEZ	1193036484	27/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
83	CRISTIAN GARCIA ROJAS	1024538808	19/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
84	JUAN PEROZO ROMERO	832140302061977	22/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
85	WILFREDO TORRES FLOREZ	944410404111983	21/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
86	HECTOR CHOURIO	14444608	2/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
87	ANGEL DUARTE ROMERO	79666071	11/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
88	JOSE MARTINEZ VARGAS	79666136	27/11/2020	2/12/2020		X				X	
89	VICTOR RIZO MIRANDA	1066097223	5/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
90	EDER GONZALEZ CASTELBONDO	84062070	1/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
91	FERNANDO MORENO HUERTAS	3199429	26/11/2020	2/12/2020		X			X		
92	ILDEFONSO PEÑARANDA IGUARAN	1118873986	1/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
93	MANUEL MARTINEZ DUARTE	79560342	16/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
94	VICTOR AVILA MARTINEZ	79595625	8/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
95	ALEX AREVALO CORTES	79919441	7/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
96	ANDRES PARRA GUTIERREZ	1023947059	7/01/2021			X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
97	ARNALDO PIÑERUA	M90671322411978	5/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
98	CRISTIAN VELANDIA CASTIBLANCO	1012361554	7/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
99	DAIRO RAFAEL CARDENAS NARVAEZ	1043606888	6/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
100	FABIAN TORRES GARCIA	79808126	6/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
101	FRANCISCO CUBILLOS CHIQUINQUIRA	1023895682	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
102	WILLIAM GARZON	79956633	7/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
103	JEISSON TORRES CARREÑO	1023033517	7/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
104	JOSE CAÑON SANA	79452832	7/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
105	JOSE OSPINA MUÑOZ	449569	8/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
106	LESCARLOS BAUTISTA	1003124440	7/01/2021			X	X			X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
107	OMAR GOMEZ MEDINA	M833897123021999	7/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
108	ORLANDO HERNANDEZ	5842300	7/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
109	JONNY PALACIOS JUYO	1000514366	7/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
110	JOSMAN OSORIO GAONA	1022427780	7/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso

111	LUIS REYES RODRIGUEZ	79655749	12/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
112	NORBERTO AMAYA ALVAREZ	1033687438	12/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
113	WILSON MORALES PEÑA	1033697359	9/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
114	ANDRES BARON ALVAREZ	1033783510	12/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
115	JHONATAN RAMIREZ MOLINA	1010209390	13/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
116	ROGELIO ROBLES BELLO	19935160	13/01/2021			X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
117	CRISTIAN LINARES BELTRAN	1000855005	18/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
118	JUAN LADINO CASTELBLANCO	1033696448	23/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
119	ALONSO SOLER DUMAR ALEXIS	1002682938	24/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
120	ABELLO TRIANA GIOVANNY ALEXANDER	1013636864	26/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
121	PALMERO ROIMAN RAMO	948216420011	18/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
122	OSPINA TOVAR ALEJANDRO	82338410	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
123	SILVA LOPEZ LEONAL GERARDO	PE 456736120091984	17/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
124	CIPRIAN FRANCO JORGE ANATOLIO	79769383	23/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
125	VIVAS CALDERON OVIDIO	79493842	24/11/2020	2/12/2020		X				X	
126	VIVAS BOHORQUEZ LUIS ALFONSO	79493842	17/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
127	CRUZ CRUZ MANUEL LEONARDO	79573733	23/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
128	MARTINEZ BUSTOS JHONY	79583292	25/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
129	MESA LEON JOSE JAVIER	79322883	23/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
130	GARCIA RINCON LUIS ALFONSO	79668467	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
131	ACERO OJEDA CARLOS ARTURO	79433284	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
132	RIVERA GOMEZ WILSON ENRIQUE	11524043	23/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
133	CARDONA JARAMILLO JORGE ANTONIO	16111922	21/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
134	FORERO ARTEAGA JORGE	19350740	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
135	HERAZO PEREZ WILLY JOSE	1051362748	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
136	GOMEZ FUENTES CARLOS ANDRES	1073603255	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
137	MOSQUERA MOSQUERA JHON DAVID	1015460856	25/11/2020			X				X	
138	RUIZ CASTELLANOS CARLOS ONEIBER	1018414764	23/11/2020			X				X	
139	TORRES CARREÑO JEFFER FABIAN	1023013197	24/11/2020			X				X	
140	HERNANDEZ DIEGO HERNAN	1032405268	24/11/2020			X				X	
141	GABRIEL GARAVITO SALAMANCA	79345951	14/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
142	HABITH OROZCO OLIVERO	1051361502	13/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
143	JESUS JIMENEZ	M818438318091981	14/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
144	MIGUEL SERRATO ALVAREZ	10325113211	14/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
145	ROBER CESPEDES MIQUELENA	M835657422111975	14/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
146	WILLIAM GORDO ROJAS	1033706587	14/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
147	JOSE PINILLA GONZALEZ	79670742	13/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
148	WILSON PEREZ SERRATO	79975166	13/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
149	ADELINO MALLARINO ACEVEDO	73094673	15/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
150	DANIEL RODRIGUEZ MAHECHA	80200854	15/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
151	PEDRO VALERO CELIS	M835190319011994	15/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
152	KEVIN AREVALO SUAREZ	1000338453	18/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
153	LUIS MOLINA GUTIERREZ	80722832	18/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
154	MIGUEL ORTIZ MORA	1106781809	18/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
155	PABLO MORA CORTES	80769891	18/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
156	ALFREDO GUTIERREZ LACRUZ	M944669825031995	15/01/2021			X					No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
157	JUSTIN TRIVIÑO DELGADO	1000727448	15/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
158	CRIPRIANO PIÑEROS	79703764	30/11/2020	2/12/2020		X					
159	JORGE BEROES	M933222013111989	14/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
160	RAUL OSORIO RINCON	79669250	17/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
161	VICTOR GUERRERO PACHECO	80126593	26/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
162	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1101879446	25/11/2020	2/12/2020		X			X		
163	CARLOS OVIEDO GOMEZ	1024502152	20/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
164	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1033776296	20/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso

165	RAFAEL GAMEZ MARTINEZ	1065810726	20/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
166	DUVAN HERNANDEZ	1082974394	26/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
167	DEIBY PEDRAZA LONDOÑO	1012343367	10/12/2020			X					No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
168	NICOLAS RUBIANO REYES	1001276100	28/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
169	WILLIAM PEDRAZA LONDOÑO	80214620	15/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
170	OSCAR PULIDO GUEVARA	1012443203	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
171	MICHAEL CRISTIANO RAMIREZ	1033806404	4/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
172	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80774495	6/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
173	ANDRES BARAHONA GOMEZ	80256059	22/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
174	JOHN RAMOS YAGUARA	80748603	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
175	EDILBERTO CAÑON CASALLAS	79924548	5/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
176	ANDRES PEREZ ARIAS	1063625214	5/02/2021	2/12/2020		X			X		
177	MICHEL SALAS CELIS	1033766212	17/11/2020	2/12/2020		X			X		
178	OSBAR BERNAL PAEZ	80778371	20/11/2020	2/12/2020		X				X	
179	WILSON BERNAL GUSCA	1033707175	11/02/2021	2/12/2020		X				X	
180	ANDERSON BUSTOS ZULUAGA	1000694458	8/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
181	JOHAN CESPEDES MENDOZA	1013694701	9/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
182	KEVIN MARTINEZ RODRIGUEZ	1000118548	9/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
183	EDGAR MURCIA ORDOÑEZ	14322354	12/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
184	OSWALDO RINCON	1047512742	13/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
185	LUIS HERNANDEZ BARRERO	80858697	13/01/2021	2/12/2020		X			X		
186	JAISON ACERO DE LA ROSA	1044391694	18/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
187	MARLON GUZMAN TRANSLAVIÑA	1007339845	15/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
188	FABIAN ESCOBAR GOMEZ	1024482810	18/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
189	LUIS CARRILLO	79460485	18/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
190	MIGUEL AMADO MONTEJO	1007392839	18/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
200	PAOLA BOHORQUEZ RUBIANO	53152764	18/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
201	EDILSON CASTRO SOTO	1033680989	25/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
202	CAMILO MARTINEZ HUESO	80743123	26/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
203	SOCRATES TORRENEGRA	8601642	20/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
204	WUILLIAM ZABALA	16102961	10/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
205	ISAAC SOTO BARRIOS	1016119459	4/03/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
206	JORGE HERNANDEZ RAMIREZ	79771079	9/03/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
207	SAUL ROSAS VARGAS	20534087	9/03/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
208	JULIAN AVILA DAZA	1023939926	25/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
209	OSCAR AVILA DAZA	1007454186	13/03/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
210	CARLOS VIANA	9774730	15/03/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
211	RAUL SALAMANCA SALGADO	80749213	16/03/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
212	JULIO ESPINOZA ALVARADO	17860730	16/03/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
213	ANGEL PINTOR	79853246	16/03/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
214	GREGORIO OLMOS BENITEZ	4066960	16/03/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
215	LEONID BARBOSA PEINADO	1003275162	16/03/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
216	HECTOR VILLALOBOS CASTILLO	19569500	17/03/2021			X			X		
217	LUIS DORANTE ADAN	13991730	17/03/2021			X			X		
RESULTADOS:				**34**	**0**	**217**	**6**		**104**	**101**	

ACUARELA

				FECHA DE EXAMEN	PERSONAL	Personal Trabajos en Alturas	ESTADOL ACTUAL	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO/NO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	ACTIVO	RETIRADO	OBSERVACIONES
1	CARLOS JAVIER PALENCIA JIMENEZ	1143171522	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
2	ALEXIS MENDEZ GARCIA	96193680312				X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
3	ARLEY CAMILO GIRALDO ORTIZ	1.013.689.988	12/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
4	RONALDO CASTRO SANCHEZ	102460239	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
5	EDSON JOHAN ROMERO LOPEZ	1024604236	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
6	FERNANDEZ GABRIEL ALEJANDRO	773439426021978	15/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
7	HUMBERTO MOSCOSO GARCIA	71536150	18/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
8	IVAN ANTONIO LOPEZ CHIVATA	1002314572	24/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
9	JUNIOR DAVID BRACHO	Z831775706 081987	11/12/20	16/1/2021		X			X		
10	MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRERO	79502676	24/11/2020	16/1/2021		X			X		
11	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VASQUEZ	1031152755	25/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
12	MIGUEL ANGEL REY CUADROS	1024541228	4/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
13	MIGUEL RIVERO	2761157	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
14	PEDRO RUIZ ANGULO	98429140	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
15	PERALES FLORIAN DAIRO	85.163.998	12/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
16	RAFAEL HERNANDEZ ARANDA	834934223101995	12/12/20			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
17	RENNY JOSE MONTERO ZAMORA	9712761	24/11/2020	16/1/2021		X			X		
18	WILMAR DELGADO	1003923499	11/12/20			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
19	WILMER ANDRES MENDIETA ALVAREZ	1022938136	9/12/2020	2/10/2020		X	X		X		
20	PEDRO MONDRAGON VACA	4047037	13/01/2021	3/01/2021		X	X			X	
21	JUAN CARLOS CERQUERA MENDEZ	80859935	2/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
22	JOINER DAVID BRACHO GONZALEZ	26126465	25/01/2021	16/1/2021		X			X		
23	HERNAN VANEGAS IBAÑEZ	80896790	26/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
24	JUAN RAMIREZ MANCERA	79990751	23/12/2020			X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
25	JASBLEIDY FORIGUA CASTILLO	52326579	20/12/2020		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
26	ANGEL HERNANDO SANCHEZ GOMEZ	79726856	31/10/2020	16/01/2021		X				X	
27	ANDRES DELGADO	1031182992	15/02/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
28	BRAYAN MONSALVE	1033783407	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
29	CAMILO GANOA SOTELO	1033726953	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
30	EDISON CASTRO	1033719974	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
31	EDIXON GUTIERREZ LOAIZA	86086644	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
32	JOAN ARIAS GOMEZ	1033812687	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
33	MAURICIO JAIMES LUCENA	79407194	31/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
34	WILLIAM BONILLA OSORIO	1032376827	5/09/2019			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
35	WILMER PIÑA	1237443301	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
36	EDIGAR RAMOS ROMERO	842225131101984	12/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
37	VARGAS MENDOZA DIOCEL STEVENS	1.006.857.064	5/09/2019			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
38	BRAYAN STEVEN ROJAS	1024594954	12/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
39	LUCIANO TOVAR MER	92558171	18/11/2020		X					X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
40	ANDRES MAURICIO TORRES	1070957742	18/11/2020		X					X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
41	GINETTE NATALIA TORRES DIAZ	1014195383	SURA		X					X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
42	MARIA ELENA MENCO COLON	1102870684	27/11/2020		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
43	EDGAR FABIAN PENAGOS PADILLA	1013647069	18/11/2020		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
44	JUAN CARLOS CORREA MARTINEZ	79273846	24/11/2020		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
45	WILMER TORRES LEAL	1012426714	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
46	NICOLAS MONTOYA SARMIENTO	79668628	02/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
47	RAFAEL MONTILLA MENDOZA	1043613599	29/1/2021	16/01/2021		X			X		
48	LUIS SAMACA	79465357	02/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
49	LUIS FRANCISCO MIONCADA MONCADA	1098170318	02/02/2021	30/07/2020		X	X		X		

50	JOHAN ARIZA	1005294400				X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
51	EDGAR MARTINEZ	79296107	02/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
52	EDGAR ANDRES ALARCON BERCALDO	1032448252	22/12/2020	16/01/2021		X			X		
53	CRISTIAN DELGADO CASTRO	1003923418	02/02/2021	19/01/2021		X	X		X		
54	ELIO RIVERA ORTIZ	79679114	29/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
55	LUIS CHICUASAQUE ARIAS	1033728934	29/01/2021	16/01/2021		X			X		
56	JORGE GANOA BETANCUR	1033773045	29/01/2021	16/01/2021		X			X		
57	JORGE LEONARDO RUIZ PIRELA	82946815091992	4/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
58	JOSE MUÑOZ	82497852705	4/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
59	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7330323	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
60	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4103403	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
61	EDILBERTO CRUZ SANTA	106780037	4/02/2021		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
62	YESID MANUEL TAPIA	79355917	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
63	JOSE EDGAR IBAGUE	79480674	2/02/2021		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
64	JOSE FRANCISCO ZAMUDIO VARGAS	1006737961	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
65	JHON FREDY URREGO	107249670	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
66	DUBERNEY LIZCANO MONROY	1083882905	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
67	JHON FREDDY TRUJILLO	17497039	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
68	CARLOS ALBERTO TALERO PINEDA	1033739164	21/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
69	JESSICA NATALIA DUARTE FIERRO	1010222972			X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
70	MANUEL RODRIGO HERRERA SANCHEZ	79816557				X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
71	WILLIAM ALEXANDER RODRIGUEZ GOMEZ	79216433				X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
72	JONATHAN STEVEN MONROY NUÑEZ	1000691014				X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
73	IRMA PAOLA ORTEGA PADILLA	1073702769				X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
74	JHON JAIRO CASILLAS LOPEZ	79211497				X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
75	LUIS ALFREDO CRUZ BELTRAN	79659590				X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
RESULTADOS:				**13**	**10**	**66**	**5**		**45**	**30**	

INFORME SISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Fecha: 29 de Marzo al 03 de Abrli de 2021

CONTRATO: 695-2020
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

ADMINISTRATIVO
UT MIC VIVIENDAS 2020

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	Yuly Andrea Casas Merchán	1.032.387.457	20/11/2020	23/11/2020	X		X		X		
2	Adriana Ximena Santana Romero	52.476.883	20/11/2020	23/11/2020	X		X		X		
3	Nancy Alejandra Charry Ávila	1.015.413.551	20/11/2020	1/12/2020	X		X		X		
4	Robert Andrey Benavides Novoa	1.019.026.005	20/11/2020	22/01/2020	X		X		X		
5	Astrid Espitia López	1.023.874.373	20/11/2020	23/11/2020	X		X		X		
6	Alba Cristina Melo Martínez	36.759.988	20/11/2020	1/12/2020	X		X		X		
7	José Dionisio Cárdenas Bolívar	79.511.489	20/11/2020	1/12/2020	X		X		X		
8	Omar Yesid Cifuentes Cristiano	1.124.827.565	20/11/2020	1/12/2020	X		X		X		
9	Jesús Andrés Melo Gachancipá	79.690.448	30/11/2020	30/11/2020	X		X			X	
10	Adriana Castelblanco	52.428.231	20/11/2020	30/11/2020	X		X		X		
11	Sharon Adriana Arias Aldana	1.013.673.517	20/11/2020	13/11/2020	X		X		X		
12	Daniela Sanchéz Molina	1.015.463.608	30/11/2020	1/12/2020	X		X		X		
13	Martha Yolanda Pinzón Silva	1.101.685.570	20/11/2020	23/11/2020	X		X		X		
14	Paula Betancourt Uzeta	1030684980	10/12/2020	5/11/2020	X		X			X	
15	Didier Alexis Rueda Monsalve	1.100.964.716	7/1/2021	X	X		X		X		
16	Juan Andres Corredor Mayorga	1.022.401.358	28/1/2021	X	X		X		X		
RESULTADOS:					**16**	**0**	**16**	**0**	**14**	**2**	

OPERATIVO
AHME CONSTRUCCIONES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	

1	FLORENCIO FORERO ARTEAGA	79582932	17/11/2020			X	X			X	
2	GILDARDO DUQUE CIFUENTES	80237066	17/11/2020			X	X		X		
3	JHON BEJARANO TENZA	1013585125	17/11/2020			X	X		X		
4	JORGE MORA CORTES	80771112	17/11/2020			X	X		X		
5	ROBINSON CIFUENTES VALENCIA	1095808493	19/01/2021			X	X		X		
6	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	M836225801071979	18/11/2020			X	X		X		
7	ROBERT SALAZAR CARREÑO	M835913327071985	18/11/2020			X	X		X		
8	FABIO SILVA ORTEGA	2954992	24/11/2020			X	X			X	
9	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRRY	16833656	24/11/2020			X	X		X		
10	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	12270044	24/11/2020			X	X		X		
11	LUIS GARCES GOMEZ	79354168	13/12/2020			X	X		X		
12	WILLIAM ARIAS GONZALEZ	80063977	26/11/2020			X	X		X		
13	ANDRES DURAN ESTEPA	1033760141	1/12/2020			X	X		X		
14	NORBEY AREVALO CASTAÑEDA	18235741	1/12/2020			X	X		X		
15	HECTOR RAMIREZ GOMEZ	14259617	1/12/2020			X	X		X		
16	RIGOBERTO ESTREN CAMAÑO	1129525247	1/12/2020			X	X		X		
17	MAICOL DURAN BENITEZ	1033768558	1/12/2020			X	X		X		
18	DALADIER CUELLAR GONGORA	79637053	1/12/2020			X	X		X		
19	WILLIANS MERIÑO BAEZ	1032510255	10/12/2020			X	X		X		
20	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	1067038139	8/12/2020			X	X			X	
21	DIEGO CORRECHA RIVERA	93207369	12/12/2020			X	X		X		
22	JOSE DOMINGO AREVALO	3232140	24/11/2020			X	X			X	
23	STIVEN PRIETO OLIVEROS	1033810108	1/12/2020			X	X		X		
24	MAURICIO FREIRE	79267381	12/11/2020			X	X		X		
25	JUAN HERAZO VALDES	79476251	17/11/2020			X	X		X		
26	SADDIEL BERTI RODRIGUEZ	942458427051975	25/11/2020			X	X		X		
27	FIDEL RODRIGUEZ	1033480242	11/12/2020			X	X			X	
28	MICHEL GAMBA MELO	1000107874	11/12/2020			X	X		X		
29	JHON MAYORGA BENAVIDES	1033721955	1/12/2020			X	X		X		
30	EDUARD VALENZUELA	1026576425	18/11/2020			X	X			X	
31	EDWIN BUITRAGO	1070919070	10/12/2020			X	X		X		
32	ISAAC MONTOYA	19212654	8/12/2020			X	X		X		
33	JHON EDWIN ZULUAGA	1032401694	1/12/2020			X	X		X		
34	OCTAVIO MOLANO	91107563	8/12/2020			X	X			X	
35	EDWIN FERREIRA BRACHO	810277414021984	10/12/2020			X	X			X	
36	JAIVER CRISPIN VANEGAS	79609536	4/12/2020			X	X		X		
37	JOSE RUIZ MUÑOZ	1033750096	8/12/2020			X	X		X		
38	LUIS EVELIO HERNANDEZ	19219713	9/12/2020			X	X		X		
39	CESAR PARDO PEÑA	79863108	8/12/2020			X	X			X	
40	DIEGO PEÑA PEÑA	1069303999	11/12/2020			X	X		X		
41	PEDRO PEÑA ROMERO	261568	10/12/2020			X	X			X	
42	ALEJANDRO RANGEL PARRA	PM801726928092000	11/12/2020			X	X		X		
43	DOMINGO MENDOZA GARCIA	PM809306716031969	10/12/2020			X	X		X		

44	JOSE RODRIGUEZ CASTIBLANCO	19399343	24/11/2020			X	X		X		
45	JONATHAN QUIMBAY RODRIGUEZ	80165089	24/11/2020			X	X		X		
46	JOSE RAVELO BLANCO	79769383	27/11/2020			X	X		X		
47	ANDRES GUTIERREZ PARRA	10331136682	12/12/2020			X	X			X	
48	BRANDON REYES RONCANCIO	1001284627	11/12/2020			X	X		X		
49	DIEGO YAGUARA GARCIA	1111337806	4/12/2020			X	X		X		
50	DIONER PULIDO GAMBA	79913877	12/12/2020			X	X		X		
51	JEDER VEGA PRIETO	79223253	11/12/2020			X	X		X		
52	JEFFERSON RAMIREZ AVILA	100022415	11/12/2020			X	X		X		
53	JOSE CORDOBA MAHECHA	80842696	12/12/2020			X	X		X		
54	JOSE MAURICIO GONZALEZ QUINTERO	79666743	26/11/2020			X	X		X		
55	LUIS BUITRAGO LAVERDE	1070916164	18/11/2020			X	X		X		
56	MICHAEL RINCON ROJAS	1000616916	12/12/2020			X	X		X		
57	ROQUE PARRA ESTUPIÑAN	13925263	1/12/2020			X	X		X		
58	RUBEN SANCHEZ SALAMANCA	1032487616	12/12/2020			X	X		X		
59	STEVEN BALLEN ARIZA	1013613490	12/12/2020			X	X			X	
60	WILSON LUNA DAZA	79767907	1/12/2020			X	X		X		
61	YAIR VEGA VEGA	1000364494	11/12/2020			X	X		X		
62	YORWIN VARGAS GONZALEZ	M836663326081993	11/12/2020			X	X			X	
63	JOSE LINARES LINARES	80376575	26/11/2020			X	X			X	
64	NERY VILLAMIZAR LOZANO	1022971724	27/11/2020			X	X		X		
65	ORLANDO DE JESUS ROJAS	1018467716	11/12/2020			X	X		X		
66	HENRY CONDE HIGARDO	772500127031	13/12/2020			X	X		X		
67	JHON ELIECER GONZALEZ	80247578	13/12/2020			X	X			X	
68	NORMAN RINCON ROJAS	1024514956	17/11/2020			X	X		X		
69	VICTOR RODRIGUEZ CASTIBLANCO	79444038	17/11/2020			X	X		X		
70	CARLOS ORTIZ CASTAÑO	1045764905	13/12/2020			X	X		X		
71	ANDRES GARCIA	80895628	15/12/2020			X	X			X	
72	CARLOS MUÑOZ MONROY	3162248	15/12/2020			X	X			X	
73	EDGAR RAMIREZ	79922315	15/12/2020			X	X			X	
74	EMMANEL GUILLEN MENDOZA	M734208408021983	15/12/2020			X	X		X		
75	JEISON LOPEZ MEJIA	1033816388	15/12/2020			X	X			X	
76	JULIAN ARAGON DEVIA	1030628205	15/12/2020			X	X			X	
77	CRISTIAN AVILA CORTES	1033814196	16/12/2020			X	X			X	
78	LUIS DURAN BENITEZ	80373984	16/12/2020			X	X			X	
79	MAYBER DUQUE RODRIGUEZ	1000693460	15/12/2020			X	X			X	
80	EDINSON VENENCIA	72120789	24/11/2020			X	X		X		
81	BRIAM LOAIZA MARTINEZ	1024534272	18/12/2020			X	X			X	
82	CESAR BENAVIDES JIMENEZ	1193036484	27/11/2020			X	X			X	
83	CRISTIAN GARCIA ROJAS	1024538808	19/12/2020			X	X			X	
84	JUAN PEROZO ROMERO	832140302061977	22/12/2020			X	X			X	
85	WILFREDO TORRES FLOREZ	944410404111983	21/12/2020			X	X			X	
86	HECTOR CHOURIO	14444608	2/12/2020			X	X		X		

87	ANGEL DUARTE ROMERO	79666071	11/12/2020			X	X			X	
88	JOSE MARTINEZ VARGAS	79666136	27/11/2020			X	X			X	
89	VICTOR RIZO MIRANDA	1066097223	5/01/2021			X	X		X		
90	EDER GONZALEZ CASTELBONDO	84062070	1/12/2020			X	X			X	
91	FERNANDO MORENO HUERTAS	3199429	26/11/2020			X	X		X		
92	ILDEFONSO PEÑARANDA IGUARAN	1118873986	1/12/2020			X	X		X		
93	MANUEL MARTINEZ DUARTE	79560342	16/12/2020			X	X			X	
94	VICTOR AVILA MARTINEZ	79595625	8/01/2021			X	X		X		
95	ALEX AREVALO CORTES	79919441	7/01/2021			X	X			X	
96	ANDRES PARRA GUTIERREZ	1023947059	7/01/2021			X	X		X		
97	ARNALDO PIÑERUA	M90671322411978	5/01/2021			X	X			X	
98	CRISTIAN VELANDIA CASTIBLANCO	1012361554	7/01/2021			X	X			X	
99	DAIRO RAFAEL CARDENAS NARVAEZ	1043606888	6/01/2021			X	X		X		
100	FABIAN TORRES GARCIA	79808126	6/01/2021			X	X			X	
101	FRANCISCO CUBILLOS CHIQUINQUIRA	1023895682	7/01/2021			X	X		X		
102	WILLIAM GARZON	79956633	7/01/2021			X	X			X	
103	JEISSON TORRES CARREÑO	1023033517	7/01/2021			X	X			X	
104	JOSE CAÑON SANA	79452832	7/01/2021			X	X			X	
105	JOSE OSPINA MUÑOZ	449569	8/01/2021			X	X			X	
106	LESCARLOS BAUTISTA	1003124440	7/01/2021			X	X			X	
107	OMAR GOMEZ MEDINA	M833897123021999	7/01/2021			X	X			X	
108	ORLANDO HERNANDEZ	5842300	7/01/2021			X	X			X	
109	JONNY PALACIOS JUYO	1000514366	7/01/2021			X	X			X	
110	JOSMAN OSORIO GAONA	1022427780	7/01/2021			X	X			X	
111	LUIS REYES RODRIGUEZ	79655749	12/01/2021			X	X			X	
112	NORBERTO AMAYA ALVAREZ	1033687438	12/01/2021			X	X			X	
113	WILSON MORALES PEÑA	1033697359	9/01/2021			X	X		X		
114	ANDRES BARON ALVAREZ	1033783510	12/01/2021			X	X			X	
115	JHONATAN RAMIREZ MOLINA	1010209390	13/01/2021			X	X			X	
116	ROGELIO ROBLES BELLO	19935160	13/01/2021			X	X		X		
117	CRISTIAN LINARES BELTRAN	1000855005	18/11/2020			X	X			X	
118	JUAN LADINO CASTELBLANCO	1033696448	23/11/2020			X	X			X	
119	ALONSO SOLER DUMAR ALEXIS	1002682938	24/11/2020			X	X			X	
120	ABELLO TRIANA GIOVANNY ALEXANDER	1013636864	26/11/2020			X	X			X	
121	PALMERO ROIMAN RAMO	948216420011	18/11/2020			X	X			X	
122	OSPINA TOVAR ALEJANDRO	82338410	16/11/2020			X	X			X	
123	SILVA LOPEZ LEONAL GERARDO	PE 456736120091984	17/11/2020			X	X			X	
124	CIPRIAN FRANCO JORGE ANATOLIO	79769383	23/11/2020			X	X			X	
125	VIVAS CALDERON OVIDIO	79493842	24/11/2020			X	X			X	
126	VIVAS BOHORQUEZ LUIS ALFONSO	79493842	17/11/2020			X	X			X	
127	CRUZ CRUZ MANUEL LEONARDO	79573733	23/11/2020			X	X			X	
128	MARTINEZ BUSTOS JHONY	79583292	25/11/2020			X	X			X	
129	MESA LEON JOSE JAVIER	79322883	23/11/2020			X	X			X	

130	GARCIA RINCON LUIS ALFONSO	79668467	16/11/2020			x	x			x		
131	ACERO OJEDA CARLOS ARTURO	79433284	16/11/2020			x	x			x		
132	RIVERA GOMEZ WILSON ENRIQUE	11524043	23/11/2020			x	x			x		
133	CARDONA JARAMILLO JORGE ANTONIO	16111922	21/12/2020			x	x			x		
134	FORERO ARTEAGA JORGE	19350740	16/11/2020			x	x			x		
135	HERAZO PEREZ WILLY JOSE	1051362748	16/11/2020			x	x			x		
136	GOMEZ FUENTES CARLOS ANDRES	1073603255	16/11/2020			x	x			x		
137	MOSQUERA MOSQUERA JHON DAVID	1015460856	25/11/2020			x	x			x		
138	RUIZ CASTELLANOS CARLOS ONEIBER	1018414764	23/11/2020			x	x			x		
139	TORRES CARREÑO JEFFER FABIAN	1023013197	24/11/2020			x	x			x		
140	HERNANDEZ DIEGO HERNAN	1032405268	24/11/2020			x	x			x		
141	GABRIEL GARAVITO SALAMANCA	79345951	14/01/2021			x	x			x		
142	HABITH OROZCO OLIVERO	1051361502	13/01/2021			x	x			x		
143	JESUS JIMENEZ	M818438318091981	14/01/2021			x	x		x			
144	MIGUEL SERRATO ALVAREZ	10325113211	14/01/2021			x	x			x		
145	ROBER CESPEDES MIQUELENA	M835657422111975	14/01/2021			x	x		x			
146	WILLIAM GORDO ROJAS	1033706587	14/01/2021			x	x		x			
147	JOSE PINILLA GONZALEZ	79670742	13/01/2021			x	x			x		
148	WILSON PEREZ SERRATO	79975166	13/01/2021			x	x			x		
149	ADELINO MALLARINO ACEVEDO	73094673	15/01/2021			x	x			x		
150	DANIEL RODRIGUEZ MAHECHA	80200854	15/01/2021			x	x			x		
151	PEDRO VALERO CELIS	M835190319011994	15/01/2021			x	x		x			
152	KEVIN AREVALO SUAREZ	1000338453	18/01/2021			x	x			x		
153	LUIS MOLINA GUTIERREZ	80722832	18/01/2021			x	x			x		
154	MIGUEL ORTIZ MORA	1106781809	18/01/2021			x	x			x		
155	PABLO MORA CORTES	80769891	18/01/2021			x	x		x			
156	ALFREDO GUTIERREZ LACRUZ	M944669825031995	15/01/2021			x	x					
157	JUSTIN TRIVIÑO DELGADO	1000727448	15/01/2021			x	x			x		
158	CRIPRIANO PIÑEROS	79703764	30/11/2020			x	x					
159	JORGE BEROES	M933222013111989	14/01/2021			x	x			x		
160	RAUL OSORIO RINCON	79669250	17/11/2020			x	x		x			
161	VICTOR GUERRERO PACHECO	80126593	26/11/2020			x	x		x			
162	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1101879446	25/11/2020			x	x		x			
163	CARLOS OVIEDO GOMEZ	1024502152	20/01/2021			x	x			x		
164	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1033776296	20/01/2021			x	x			x		
165	RAFAEL GAMEZ MARTINEZ	1065810726	20/01/2021			x	x		x			
166	DUVAN HERNANDEZ	1082974394	26/01/2021			x	x			x		
167	DEIBY PEDRAZA LONDOÑO	1012343367	10/12/2020			x	x					
168	NICOLAS RUBIANO REYES	1001276100	28/01/2021			x	x			x		
169	WILLIAM PEDRAZA LONDOÑO	80214620	15/01/2021			x	x			x		
170	OSCAR PULIDO GUEVARA	1012443203	2/02/2021			x	x		x			
171	MICHAEL CRISTIANO RAMIREZ	1033806404	4/02/2021			x	x			x		
172	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80774495	6/02/2021			x	x		x			

173	ANDRES BARAHONA GOMEZ	80256059	22/01/2021			X	X			X	
174	JOHN RAMOS YAGUARA	80748603	7/01/2021			X	X		X		
175	EDILBERTO CAÑON CASALLAS	79924548	5/01/2021			X	X			X	
176	ANDRES PEREZ ARIAS	1063625214	5/02/2021			X	X		X		
177	MICHEL SALAS CELIS	1033766212	17/11/2020			X	X		X		
178	OSBAR BERNAL PAEZ	80778371	20/11/2020			X	X			X	
179	WILSON BERNAL GUSCA	1033707175	11/02/2021			X	X			X	
180	ANDERSON BUSTOS ZULUAGA	1000694458	8/02/2021			X	X			X	
181	JOHAN CESPEDES MENDOZA	1013694701	9/02/2021			X	X		X		
182	KEVIN MARTINEZ RODRIGUEZ	1000118548	9/02/2021			X	X			X	
183	EDGAR MURCIA ORDOÑEZ	14322354	12/02/2021			X	X		X		
184	OSWALDO RINCON	1047512742	13/01/2021			X	X		X		
185	LUIS HERNANDEZ BARRERO	80858697	13/01/2021			X	X		X		
186	JAISON ACERO DE LA ROSA	1044391694	18/02/2021			X	X		X		
187	MARLON GUZMAN TRANSLAVIÑA	1007339845	15/02/2021			X	X			X	
188	FABIAN ESCOBAR GOMEZ	1024482810	18/01/2021			X	X		X		
189	LUIS CARRILLO	79460485	18/02/2021			X	X			X	
190	MIGUEL AMADO MONTEJO	1007392839	18/02/2021			X	X		X		
200	PAOLA BOHORQUEZ RUBIANO	53152764	18/01/2021			X	X			X	
201	EDILSON CASTRO SOTO	1033680989	25/02/2021			X	X		X		
202	CAMILO MARTINEZ HUESO	80743123	26/02/2021			X	X		X		
203	SOCRATES TORRENEGRA	8601642	20/01/2021			X	X		X		
204	WUILLIAM ZABALA	16102961	10/01/2021			X	X		X		
205	ISAAC SOTO BARRIOS	1016119459	4/03/2021			X	X		X		
206	JORGE HERNANDEZ RAMIREZ	79771079	9/03/2021			X	X		X		
207	SAUL ROSAS VARGAS	20534087	9/03/2021			X	X			X	
208	JULIAN AVILA DAZA	1023939926	25/01/2021			X	X		X		
209	OSCAR AVILA DAZA	1007454186	13/03/2021			X	X		X		
210	CARLOS VIANA	9774730	15/03/2021			X	X		X		
211	RAUL SALAMANCA SALGADO	80749213	16/03/2021			X	X		X		
212	JULIO ESPINOZA ALVARADO	17860730	16/03/2021			X	X		X		
213	ANGEL PINTOR	79853246	16/03/2021			X	X		X		
214	GREGORIO OLMOS BENITEZ	4066960	16/03/2021			X	X		X		
215	LEONID BARBOSA PEINADO	1003275162	16/03/2021			X	X		X		
216	HECTOR VILLALOBOS CASTILLO	19569500	17/03/2021			X	X		X		
217	LUIS DORANTE ADAN	13991730	17/03/2021			X	X		X		
RESULTADOS:					**0**	**217**		**0**	**104**	**101**	

ACUARELA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JAVIER PALENCIA JIMENEZ	1143171522	11/12/2020			X	X		X		
2	ALEXIS MENDEZ GARCIA	96193680312				X	X			X	
3	ARLEY CAMILO GIRALDO ORTIZ	1.013.689.988	12/12/2020			X	X		X		
4	RONALDO CASTRO SANCHEZ	102460239	15/12/2020			X	X			X	
5	EDSON JOHAN ROMERO LOPEZ	1024604236	24/11/2020			X	X		X		
6	FERNANDEZ GABRIEL ALEJANDRO	##########	15/12/2020			X	X		X		
7	HUMBERTO MOSCOSO GARCIA	71536150	18/11/2020			X	X		X		
8	IVAN ANTONIO LOPEZ CHIVATA	1002314572	24/11/2020			X	X			X	
9	JUNIOR DAVID BRACHO	Z831775706 081987	11/12/20			X	X		X		
10	MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRERO	79502676	24/11/2020			X	X		X		
11	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VASQUEZ	1031152755	25/11/2020			X	X		X		
12	MIGUEL ANGEL REY CUADROS	1024541228	4/12/2020			X	X		X		
13	MIGUEL RIVERO	2761157	11/12/2020			X	X		X		
14	PEDRO RUIZ ANGULO	98429140	11/12/2020			X	X		X		
15	PERALES FLORIAN DAIRO	85.163.998	12/12/2020			X	X		X		
16	RAFAEL HERNANDEZ ARANDA	834934223101995	12/12/20			X	X		X		
17	RENNY JOSE MONTERO ZAMORA	9712761	24/11/2020			X	X		X		
18	WILMAR DELGADO	1003923499	11/12/20			X	X		X		
19	WILMER ANDRES MENDIETA ALVAREZ	1022938136	9/12/2020	2/10/2020		X	X		X		
20	PEDRO MONDRAGON VACA	4047037	13/01/2021	3/01/2021		X	X			X	
21	JUAN CARLOS CERQUERA MENDEZ	80859935	2/02/2021			X	X			X	
22	JOINER DAVID BRACHO GONZALEZ	26126465	25/01/2021			X	X		X		
23	HERNAN VANEGAS IBAÑEZ	80896790	26/01/2021			X	X		X		
24	JUAN RAMIREZ MANCERA	79990751	23/12/2020			X	X		X		
25	JASBLEIDY FORIGUA CASTILLO	52326579	20/12/2020		X		X		X		
26	ANGEL HERNANDO SANCHEZ GOMEZ	79726856	31/10/2020			X	X			X	
27	ANDRES DELGADO	1031182992	15/02/2020			X	X			X	
28	BRAYAN MONSALVE	1033783407	30/10/2020			X	X			X	
29	CAMILO GANOA SOTELO	1033726953	30/10/2020			X	X			X	
30	EDISON CASTRO	1033719974	30/10/2020			X	X			X	
31	EDIXON GUTIERREZ LOAIZA	86086644	30/10/2020			X	X			X	
32	JOAN ARIAS GOMEZ	1033812687	30/10/2020			X	X			X	
33	MAURICIO JAIMES LUCENA	79407194	31/10/2020			X	X			X	
34	WILLIAM BONILLA OSORIO	1032376827	5/09/2019			X	X			X	
35	WILMER PIÑA	1237443301	30/10/2020			X	X			X	
36	EDIGAR RAMOS ROMERO	842225131101984	12/12/2020			X	X			X	
37	VARGAS MENDOZA DIOCEL STEVENS	1.006.857.064	5/09/2019			X	X			X	
38	BRAYAN STEVEN ROJAS	1024594954	12/12/2020			X	X			X	
39	LUCIANO TOVAR MER	92558171	18/11/2020		X		X			X	

40	ANDRES MAURICIO TORRES	1070957742	18/11/2020		X		X			X	
41	GINETTE NATALIA TORRES DIAZ	1014195383	SURA		X		X			X	
42	MARIA ELENA MENCO COLON	1102870684	27/11/2020		X		X		X		
43	EDGAR FABIAN PENAGOS PADILLA	1013647069	18/11/2020		X		X		X		
44	JUAN CARLOS CORREA MARTINEZ	79273846	24/11/2020		X		X		X		
45	WILMER TORRES LEAL	1012426714	2/02/2021			X	X		X		
46	NICOLAS MONTOYA SARMIENTO	79668628	03/03/2021			X	X			X	
47	RAFAEL MONTILLA MENDOZA	1043613599	29/1/2021			X	X		X		
48	LUIS SAMACA	79465357	03/03/2021			X	X			X	
49	LUIS FRANCISCO MIONCADA MONCADA	1098170318	03/03/2021	30/07/2020		X	X		X		
50	JOHAN ARIZA	1005294400				X	X			X	
51	EDGAR MARTINEZ	79296107	03/03/2021			X	X			X	
52	EDGAR ANDRES ALARCON BERCALDO	1032448252	22/12/2020			X	X		X		
53	CRISTIAN DELGADO CASTRO	1003923418	03/03/2021	19/01/2021		X	X		X		
54	ELIO RIVERA ORTIZ	79679114	29/01/2021			X	X			X	
55	LUIS CHICUASAQUE ARIAS	1033728934	29/01/2021			X	X		X		
56	JORGE GANOA BETANCUR	1033773045	29/01/2021			X	X		X		
57	JORGE LEONARDO RUIZ PIRELA	82946815091992	4/03/2021			X	X			X	
58	JOSE MUÑOZ	82497852705	4/03/2021			X	X		X		
59	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7330323	15/12/2020			X	X			X	
60	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4103403	15/12/2020			X	X			X	
61	EDILBERTO CRUZ SANTA	106780037	4/02/2021		X		X		X		
62	YESID MANUEL TAPIA	79355917	2/02/2021			X	X		X		
63	JOSE EDGAR IBAGUE	79480674	2/02/2021		X		X		X		
64	JOSE FRANCISCO ZAMUDIO VARGAS	1006737961	2/02/2021			X	X		X		
65	JHON FREDY URREGO	107249670	2/02/2021			X	X		X		
66	DUBERNEY LIZCANO MONROY	1083882905	2/02/2021			X	X		X		
67	JHON FREDDY TRUJILLO	17497039	2/02/2021			X	X		X		
68	CARLOS ALBERTO TALERO PINEDA	1033739164	21/02/2021			X	X			X	
69	JESSICA NATALIA DUARTE FIERRO	1010222972			X		X		X		
70	MANUEL RODRIGO HERRERA SANCHEZ	79816557				X	X		X		
71	WILLIAM ALEXANDER RODRIGUEZ GOMEZ	79216433				X	X		X		
72	JONATHAN STEVEN MONROY NUÑEZ	1000691014				X	X		X		
73	IRMA PAOLA ORTEGA PADILLA	1073702769				X	X		X		
74	JHON JAIRO CASILLAS LOPEZ	79211497				X	X		X		
75	LUIS ALFREDO CRUZ BELTRAN	79659590				X	X		X		

RESULTADOS:								**0**		**0**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MV - 2221		MV - 3039













FECHA:29/03/21

DESCRIPCIÓN:SE REALIZA PROTOCOLO DE INGRESO AL MV ,MAS LA ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO DEL MV Y BENEFICIARIO. SE ENTREGA KIT DE BIOSEGURIDAD

FECHA:29/03/21

DESCRIPCIÓN:SE REALIZA PROTOCOLO DE INGRESO AL MV ,MAS LA ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO DEL MV Y BENEFICIARIO. SE ENTREGA KIT DE BIOSEGURIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV - 3043		MV - 2358 - 4799









FECHA:29/03/21 **DESCRIPCIÓN**:SE REALIZA PROTOCOLO DE INGRESO AL MV ,MAS LA ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO DEL MV Y BENEFICIARIO. SE ENTREGA KIT DE BIOSEGURIDAD		**FECHA:29/03/21** **DESCRIPCIÓN**:SE REALIZA PROTOCOLO DE INGRESO AL MV.

REGISTRO FOTOGRAFICO


MV - 4796 - 3404		MV - 3414









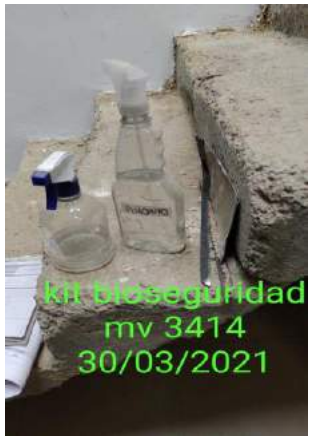

FECHA:30/03/21 **DESCRIPCIÓN**:SE REALIZA PROTOCOLO DE INGRESO AL MV ,MAS LA ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO DEL MV Y BENEFICIARIO.		**FECHA:30/03/21** **DESCRIPCIÓN**:SE REALIZA PROTOCOLO DE INGRESO AL MV ,MAS LA ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO DEL MV Y BENEFICIARIO. SE ENTREGA KIT DE BIOSEGURIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV - 4743		MV - 4766
		
		
FECHA:30/03/21 **DESCRIPCIÓN**:SE REALIZA PROTOCOLO DE INGRESO AL MV ,MAS LA ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO DEL MV Y BENEFICIARIO.		**FECHA:30/03/21** **DESCRIPCIÓN**:SE REALIZA PROTOCOLO DE INGRESO AL MV ,MAS LA ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO DEL MV Y BENEFICIARIO.
