SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1258 de 2020
CONTRATO DE OBRA N°1218 de 2020

INTERVENTORÍA
CONSORCIO GEYKA





INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 2601 PIENDAMÓ MORALES; 2602A PIENDAMÓ SILVÍA TOTORO; 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO; 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

PERIODO:

DEL 20 DE MARZO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

RUTAS 2601 PIENDAMÓ MORALES; 2602A PIENDAMÓ SILVÍA TOTORO; 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO; 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CUADRO DE ASPECTOS CONTRACTUALES




Contratista de obra:	INGAP S.A.S
Contrato de Obra No:	1218 DE 2020
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 2601 PIENDAMÓ MORALES; 2602A PIENDAMÓ SILVÍA TOTORO; 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO; 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Plazo de ejecución inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2020
Fecha de iniciación:	20 de octubre de 2020
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2020
Plazo de ejecución actual:	Hasta 31 de diciembre de 2020
Fecha de terminación actual:	31 de diciembre de 2020

Contratista de Interventoría:	CONSORCIO GEYKA
Contrato Interventoría No:	1258 DE 2020
Objeto:	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 2601 PIENDAMÓ MORALES; 2602A PIENDAMÓ SILVÍA TOTORO; 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO; 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Plazo de ejecución inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2020
Fecha de iniciación:	20 de octubre de 2020
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2020
Plazo de ejecución actual:	Hasta 31 de diciembre de 2020
Fecha de terminación actual:	31 de octubre de 2020

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

NUMERO DE REVISIÓN		**1**
Responsable por Elaboración	**Nombre:**	Ing. Richard Wilson Yela Caicedo
	Cargo:	Director de Interventoría
	Firma:	
	Fecha:	
Responsable por Revisión	**Nombre:**	Oscar Javier Garzón Diaz
	Cargo:	Representante Legal Interventoría
	Firma:	
	Fecha:	
Responsable por Aprobación	**Nombre:**	Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas
	Cargo:	Supervisor del contrato de Interventoría
	Firma:	
	Fecha:	

1. INTRODUCCIÓN.

En el presente informe de Interventoría correspondiente al mes de octubre de 2020, se describen las actividades desarrolladas dentro del contrato de obra No. 1218 de 2020, para las obras de mantenimiento de las vías: 2601 Piendamó Morales; 2602a Piendamó Silvia Totoró; 3105 Santander de Quilichao rio desbaratado; 3702 Guadualejo Belalcázar Naranjal y 3702 Guadualejo Belalcázar El Palo departamento del cauca.

El Proyecto está a cargo de la SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS.

El Ingeniero Jorge Alonso Ortega Rojas, fue designado como Supervisor del contrato de Interventoría, mediante resolución No. 2327 de fecha 07 de octubre de 2020.

El presente Informe Mensual de Interventoría N° 1, se elaboró atendiendo lo establecido en el MANUAL DE INTERVENTORÍA del INVIAS y en él, se describen las principales actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2020 y 31 de octubre de 2020.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 Localización.

Las obras para ejecutar en el marco del contrato de interventoría número 1258 de 2020, se desarrollarán en las rutas 2601 Piendamó Morales; 2602A Piendamó Silvia Totoró; 3105 Santander de Quilichao Rio Desbaratado; 3702 Guadualejo Belalcázar Naranjal y 3702 Guadualejo Belalcázar El Palo departamento del Cauca.

A continuación, se presenta el mapa de localización de las rutas a intervenir:

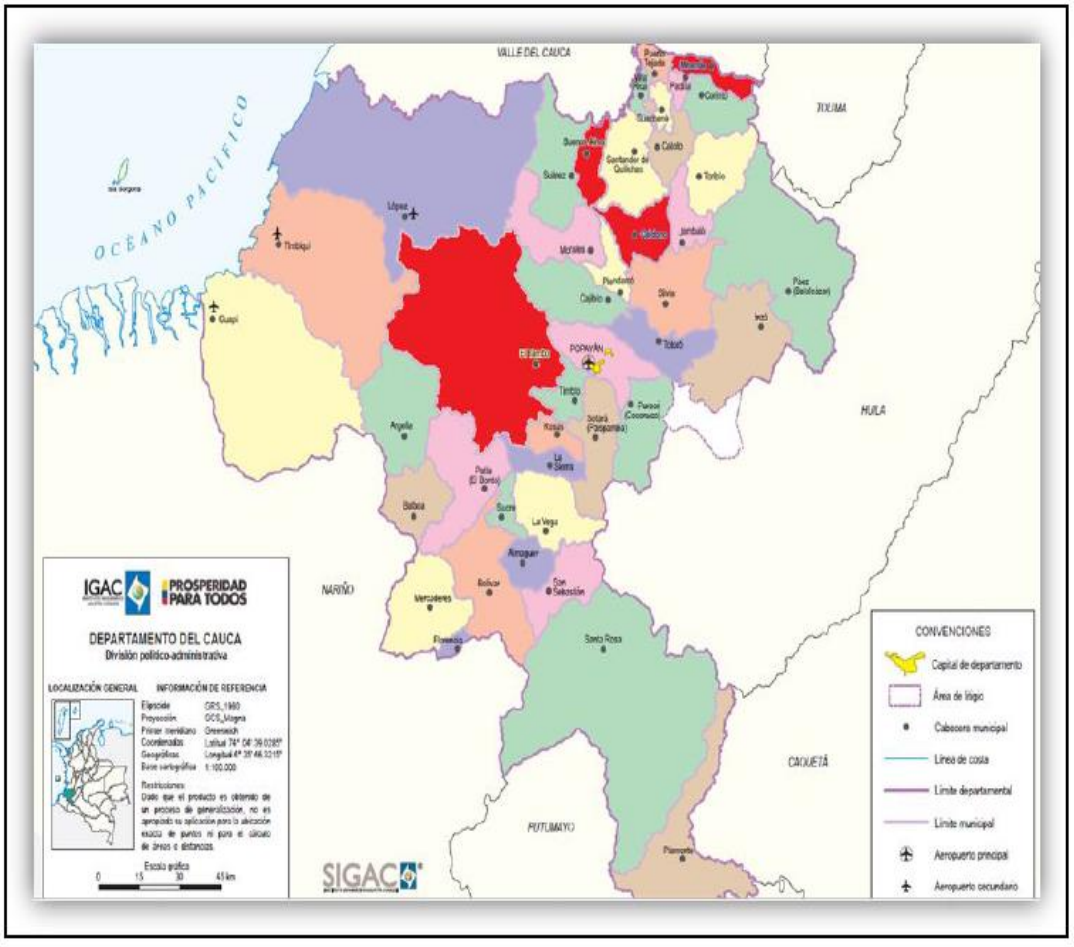


Figura 1. Localización General del Proyecto

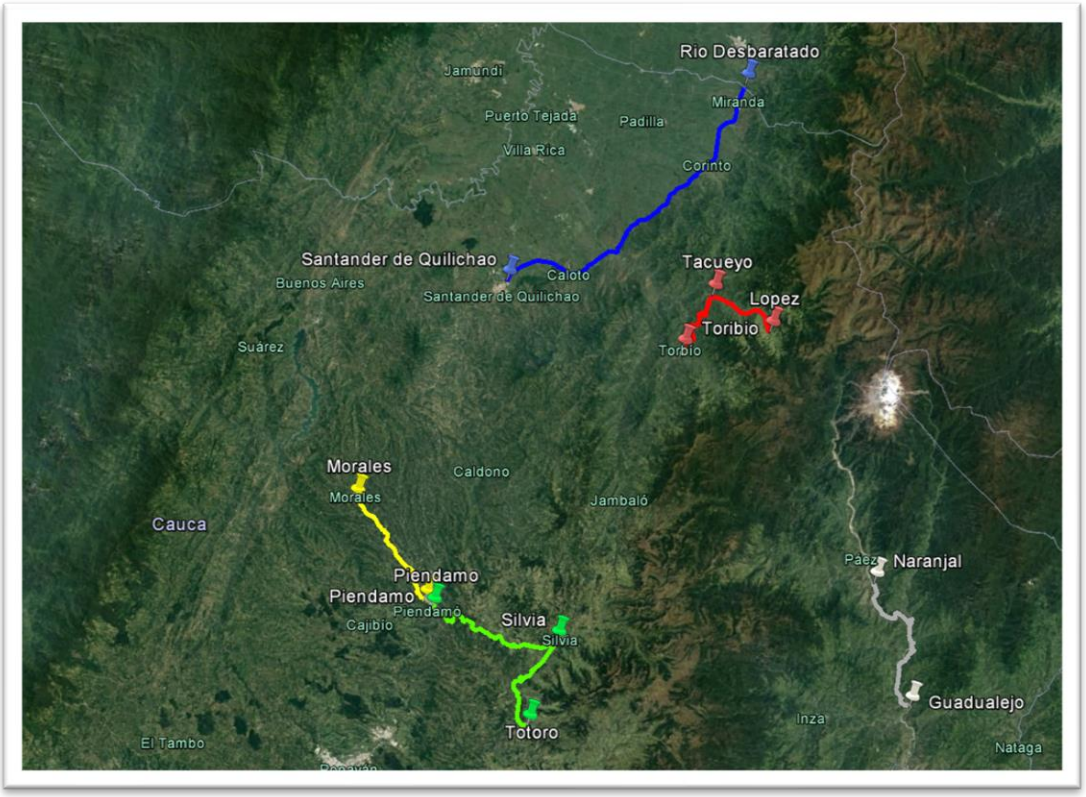


Figura 2.1 Localización General del Proyecto

La intervención se realizará en diferentes sectores, los cuales se describen a continuación:

Ruta 2601 Morales – Piendamó

Piendamó:

Localización: El Municipio de Piendamó se encuentra ubicado en la zona centro del Departamento del cauca a 2° 38″ latitud norte y 76° 30″ longitud oeste, parte media de la región montañosa de la subcuenca del río Piendamó, sobre la vertiente occidental de la cordillera central, su cabecera Municipal está ubicada sobre la carretera panamericana a 100 Km de la Ciudad de Cali y 25 Km de la ciudad de Popayán.

Limita al oriente con el Municipio de Silvia, al occidente con el municipio de Morales, al norte con el Municipio de Caldono y al sur con el Municipio de Cajibío.

Morales:

Localización: Municipio de Colombia perteneciente al departamento del Cauca y cuya cabecera dista 41 km de Popayán, la capital departamental. su territorio es llano o

ligeramente ondulado, localizado en las proximidades del río Cauca; con una extensión total de 265 Km2 y una altitud de la cabecera municipal de 1635 m.s.n.m.

Limita con La región montañosa circundante, corresponde a las cordilleras Occidental y Central avenado por los ríos Cauca, Caimital, Dinde, Ingüito, Nangué, Pescador, Piendamó y San Buenaventura.

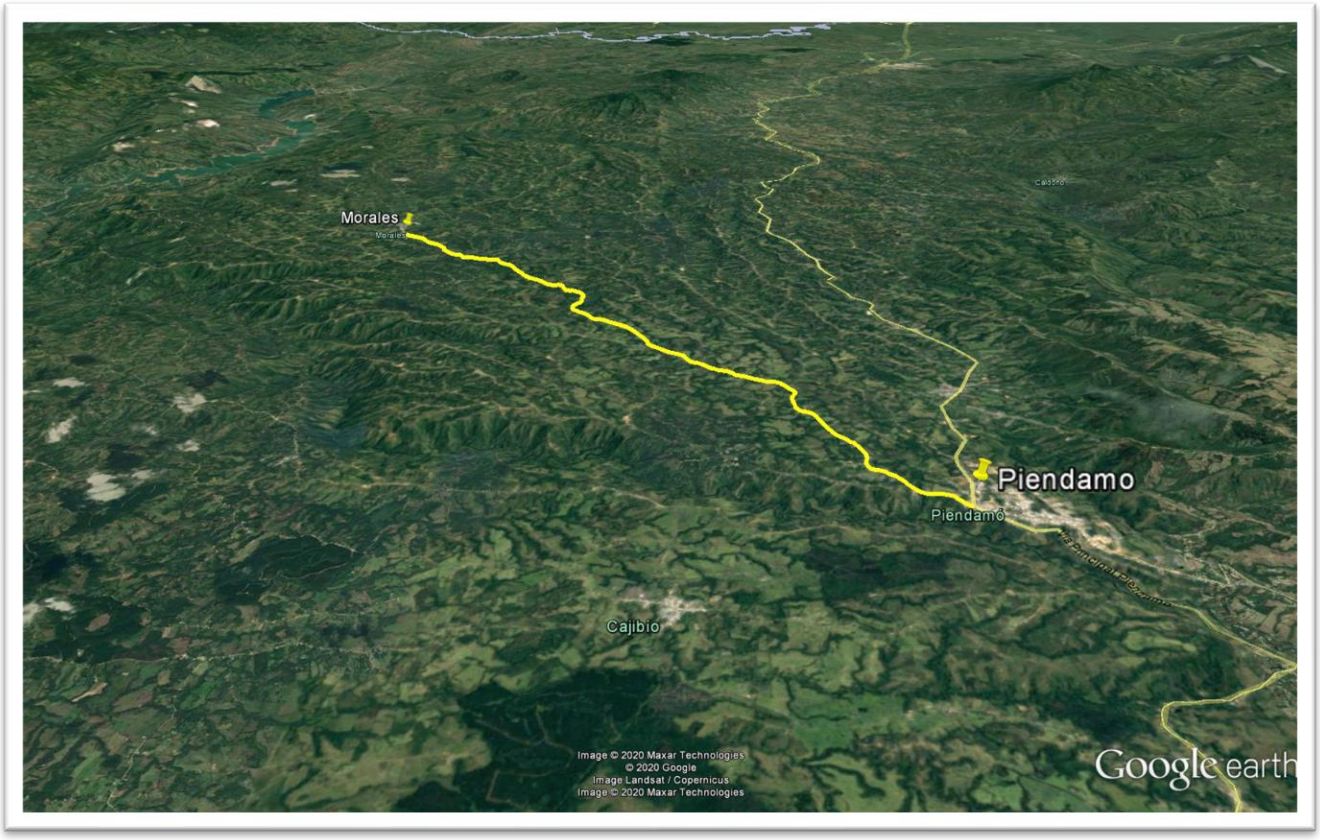


Figura 4. Localización especifica del Proyecto

Se intervendrá la ruta 2601 en el sector de Piendamó - Morales, realizando las siguientes actividades: mejoramiento de la vía con mezcla densa en caliente para bacheo, construcción de cunetas en concreto y construcción de una alcantarilla.

Ruta 2602A Piendamó - Silvia – Totoró

Piendamó:

Localización: El Municipio de Piendamó se encuentra ubicado en la zona centro del Departamento del cauca a 2° 38″ latitud norte y 76° 30″ longitud oeste, parte media de la región montañosa de la subcuenca del río Piendamó, sobre la vertiente occidental de la

cordillera central, su cabecera Municipal está ubicada sobre la carretera panamericana a 100 Kms de la Ciudad de cali y 25 Kmts de la ciudad de Popayán.

Limita al oriente con el Municipio de Silvia, al occidente con el municipio de Morales, al norte con el Municipio de Caldono y al sur con el Municipio de Cajibío.

Silvia:

Localización: Silvia está situada en el nororiente del Departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, entre los 2º47'37'' y 2º31'24'' de latitud norte y entre los 76º10'40'' y 76º31'05" de longitud al occidente del meridiano de Greenwich, sobre el flanco occidental de la cordillera central. La cabecera municipal está ubicada entre el río Piendamó y la quebrada Manchay sobre los 02º36'50'' norte y 76º22'58'' al oeste, a 2.600 metros de altitud. Dista de Popayán 59 Km. Su área es de 662,4 Km2, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y de 656,7 Km2 según el sistema de Información utilizado para la elaboración del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT.

El rango altitudinal del Municipio varía entre 1.800 y 3.800 m.s.n.m, desde el río Ovejas en el límite con Caldono, hasta la cima del cerro Porayatún ubicado entre los Resguardos de Pitayó y Guambía. Silvia limita por el norte con los Municipios de Caldono y Jambaló por el oriente con Páez e Inzá por el sur con Totoró, por el suroeste con Cajibío y por el occidente con Piendamó.

Totoró:

Localización: Se encuentra situado al sur occidente de Colombia, en la zona Oriental del Departamento del Cauca. Su cabecera municipal está localizada a una altura de 2.750 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 14° C, entre los 2º 38´ de latitud norte y 2° 15' longitud Oeste. Dista de Popayán 25 kilómetros hasta el crucero de Río Blanco. Actualmente 30 kilómetros se encuentran pavimentados; este municipio se convierte en un eje muy importante de comunicación, pues es la vía de contacto entre Popayán y los municipios de Inzá, Belalcázar, Puracé, Silvia y el departamento del Huila.

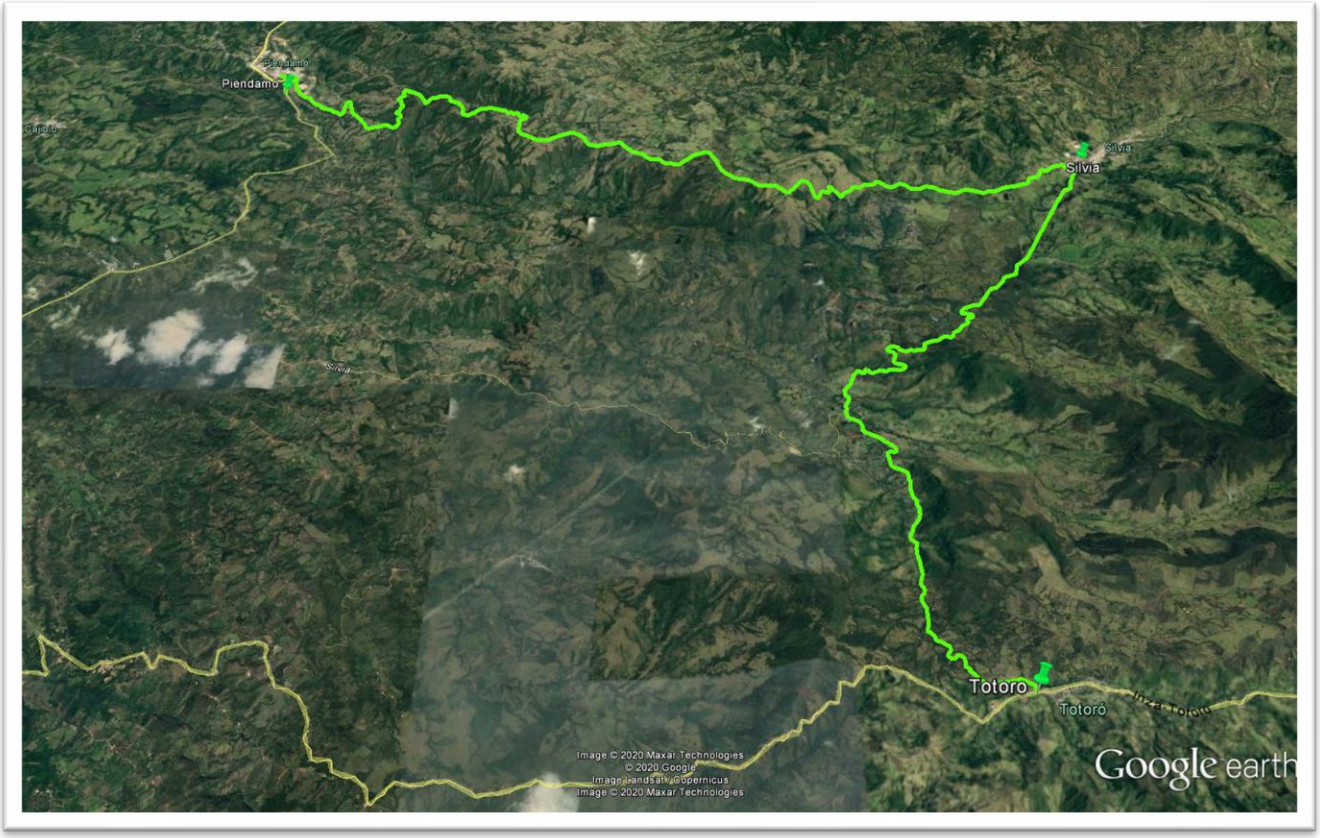


Figura 5. Localización especifica del Proyecto

Se intervendrá la ruta 2602A en el sector de Piendamó – Silvia - Totoró, realizando las siguientes actividades: mejoramiento de la vía con mezcla densa en caliente para bacheo, reposición de losas en concreto hidráulico y reposición de cunetas y bordillos.

Ruta 3105 Santander de Quilichao – Rio Desbaratado

Localización: El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector Norte del Departamento del Cauca, a 97 Km al norte de Popayán y a 45 Km al Sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca. El municipio de Santander de Quilichao limita al norte con los municipios de Villa Rica y Jamundí, al sur con el municipio de Caldono, al occidente con el Municipio de Buenos Aires, al Oriente con los Municipios de Caloto y Jambaló. Su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 0' 38" Latitud Norte y 2º 23' 30" latitud Oeste.

La extensión total del municipio de Santander de Quilichao es de 518 Km2, de la cual la extensión del área urbana representa 8,58 Km2 y la extensión del área rural representa

509,42 Km2. El municipio presenta una temperatura media de 26ºC. En cuanto a la altitud, la cabecera municipal se encuentra a 1.071 metros sobre el nivel del mar. Tiene una distancia de referencia a Popayán de 97 Km.

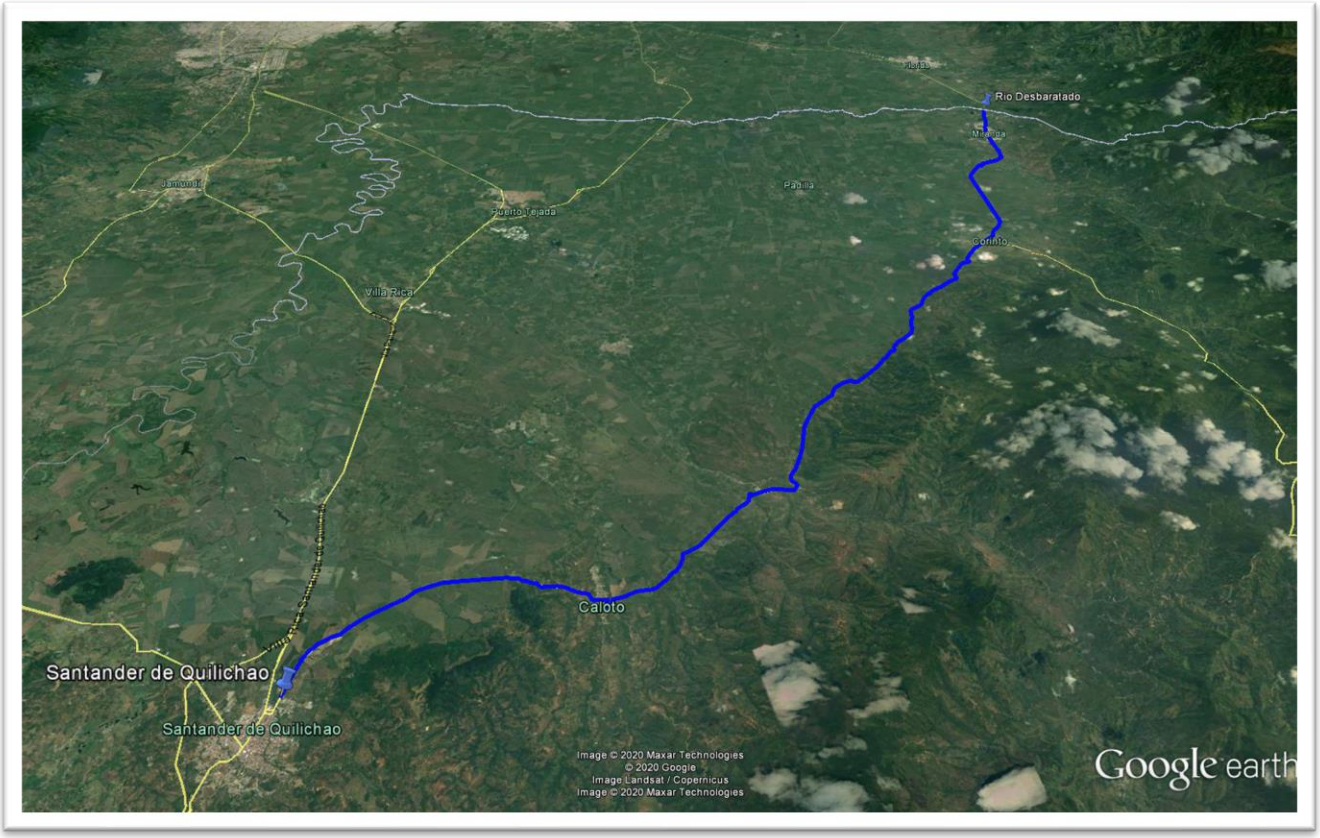


Figura 6. Localización especifica del Proyecto

Vía a intervenir 3105 Sector Santander de Quilichao - Rio Desbaratado del Departamento del Cauca, se realizarán las siguientes actividades: Pavimento mezcla densa en caliente para bacheos en diferentes puntos del tramo Santander de Quilichao - Rio Desbaratado, anden peatonal en concreto en el PR00 + 0220 A PR00 + 0870, colocación de geotextil tipo no tejido en el PR32 + 0100, material granular no drenante en el PR32 + 0100, construcción de muro en gaviones y construcción de alcantarilla nueva con tubería de concreto reforzado de 900mm en el K18 + 0700.

RUTA 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR – EL PALO, SECTOR LÓPEZ – TACUEYÓ - TORIBIO

Localización: El Municipio de Toribio se ubica al nororiente del departamento del Cauca, a una distancia de 123 kilómetros de la capital del departamento, Popayán y a 83 kilómetros de la ciudad de Cali. Sus terrenos montañosos ubicados sobre la Cordillera Central, que alcanza su máxima altura de 4.150 msnm en el páramo de Santo Domingo, limitan al norte con el municipio de Corinto, al sur con el municipio de Jámbalo, al oriente con los departamentos del Huila y Tolima, y al occidente con el municipio de Caloto. Sumado a lo anterior, Toribio es una despensa agrícola que suministra productos a los mercados regionales de Santander de Quilichao, Corinto y Cali.

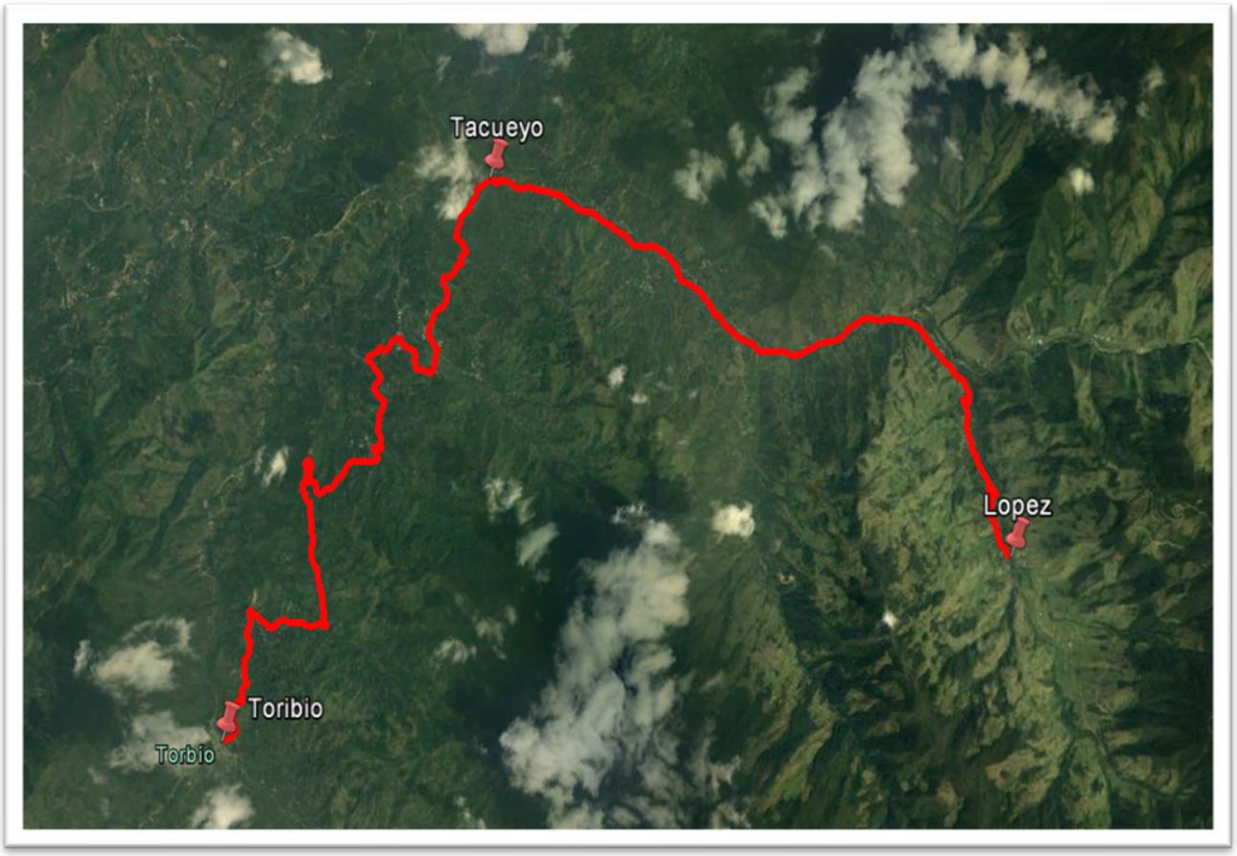


Figura 7. Localización especifica del Proyecto

Vía para intervenir 3702 Guadualejo – Belalcázar – Naranjal, Sector López – Tacueyó - Toribio en el Departamento del Cauca, se realizarán las siguientes actividades: Suministro de material de afirmado en los sitios donde se encuentra en muy mal estado, conformación de la calzada y la construcción de obras de arte.

RUTA 3702 GUADALEJO – BELALCAZAR – NARANJAL

Localización: El Municipio de Páez, está ubicado en el oriente caucano aproximadamente a 130 Kms de Popayán por la vía Totoró, Inzá a su cabecera municipal que es Belalcázar, a la que también se puede llegar por la vía Popayán, Piendamó, Silvia, Mosoco o por la vía Neiva, La Plata en el Departamento del Huila.



Figura 8. Localización especifica del Proyecto

Ruta a intervenir 3702 Guadalejo – Belalcázar – El Palo en el Departamento del Cauca, se realizarán las siguientes actividades: Suministro de material de afirmado en los sitios donde se encuentra en muy mal estado, conformación de la calzada, construcción de obras de arte, cunetas e instalación de defensa metálica

2.2. Inventario y Estado Inicial de las vías

En el recorrido inicial realizado en las vía, Morales – Piendamó se localizaron sectores que presentan un elevado deterioro de la carpeta asfáltica existente, predominando, fisuras piel de cocodrilo y una continua aparición de baches, por ello de manera general se requiere de una pronta intervención por medio de actividades de bacheo, para mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad de la vía, toda vez, que estos daños representan un foco potencial de riesgo para la ocurrencia de accidentes. También se evidencia daños parciales y totales en diferentes tuberías y cabezales de las alcantarillas, se requiere la construcción de un anden peatonal en el sector de Piendamó para brindar confort y seguridad a la ciudadanía

En la ruta Piendamó – Silvia - Totoró, en términos generales se requiere hacer la demolición y reconstrucción de algunas losas de pavimento rígido entre el PR 24+0748 al PR 25+0298, paso urbano por Silvia y el suministro y conformación de afirmado en el tramo sin pavimento.

En el sector de Santander de Quilichao – Rio Desbaratado, actualmente la superficie de rodadura se encuentra entre regular y mal estado, presentando daños tipo baches, fisuras tipo piel de cocodrilo y deformaciones las cuales se encuentran con severidad alta que indican una falla por fatiga de la estructura del pavimento por tránsito o por deficiencia en el sector de las capas, generando riesgo para los usuarios que transitan por este sector, por lo cual se requiere llevara a cabo actividades de bacheo; de igual manera se evidencia a lo largo de la ruta 3105 daños en las estructuras de algunos los puentes, alcantarillas colapsadas y muros en gaviones averiados.

En el recorrido de la ruta 3702, Guadalejo – Belalcázar – Naranjal, Sector López – Tacueyó – Toribio y Guadalejo – Belalcázar – El Palo, se evidencia que la superficie de rodadura que se encuentra en afirmado, presenta un estado que va de regular a malo, por lo cual requiere principalmente el suministro de material de afirmado en los sitios donde presenta mayor deterioro, además de la conformación de la calzada, la construcción de cunetas, instalación de defensas metálicas de seguridad y obras de arte.

ESTADO INICIAL DE LAS VIAS


Ruta No. 2601 Morales - Piendamó



Fotografía 1.



Fotografía 2.

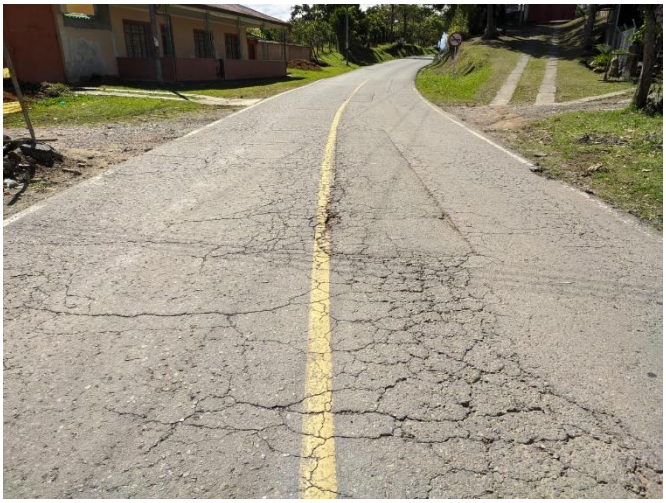

Fotografía 3.



Fotografía 4.

Ruta No. 2602A Piendamó - Silvia - Totoró



Fotografía 5.



Fotografía 6.



Fotografía 7.



Fotografía 8.

Ruta No. 3105 Santander de Quilichao – Rio Desbaratado



Fotografía 9.



Fotografía 10.



Fotografía 11.



Fotografía 12.

Ruta No. 3702 Guadalejo – Belalcázar – Naranjal, Sector López – Tacueyó - Toribio

Durante el periodo de octubre no se realizaron visitas al sitio; por lo que las evidencias del estado inicial de las vías comprendidas en la ruta se presentaran en el próximo informe mensual.

Ruta No. 3702 Guadalejo – Belalcázar – El Palo

Durante el periodo de octubre no se realizaron visitas al sitio; por lo que las evidencias del estado inicial de las vías comprendidas en la ruta se presentaran en el próximo informe mensual.

2.3. Características técnicas del proyecto.

Las obras del contrato No. 1218 de 2020, se desarrollarán en cinco frentes de intervención, ejecutando las actividades que se describen a continuación:

- ✓ Recuperación y/o mantenimiento de la superficie de rodadura con base granular y mezcla asfáltica para bacheos.
- ✓ Construcción de obras de alcantarillas.
- ✓ Construcción de pavimento rígido.
- ✓ Mejoramiento de vía con material de afirmado.
- ✓ Construcción de andenes en concreto.
- ✓ Construcción de gaviones.
- ✓ Construcción de cunetas.

El siguiente es el resumen de las obras programadas para ejecutar dentro del contrato:

DESCRIPCIÓN

- Remoción de derrumbes
- Sub-base granular para bacheo CLASE A
- Base granular para bacheo CLASE A
- Sub-base granular CLASE A
- Base granular CLASE A
- Fresado de pavimento asfaltico
- Excavación para reparación del pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0
- Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
- Excavaciones varias sin clasificar
- Excavaciones varias en material común en seco
- Excavaciones varias en material común en seco a mano

- Relleno para estructuras con suelo
- Relleno para estructuras con recebo
- Concreto Resistencia 21 Mpa (D)
- Concreto Resistencia 14 Mpa (F)
- Demolición de pavimentos rígidos
- Pavimento de concreto hidráulico
- Cuneta de concreto vaciada in situ; No incluye la conformación de la superficie de apoyo.
- Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo
- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
- Bordillo de concreto vaciado in situ; No incluye la conformación de la superficie de apoyo
- Geotextil No tejido
- Material granular drenante
- Material de cobertura tipo subbase
- Línea de demarcación con pintura en frio
- Suministro e instalación de señales verticales SR y SI tablero de (75*75cm) con lamina retroreflectiva tipo IX o superior
- Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)
- Conformación de la calzada existente
- Afirmado
- Tubería de concreto reforzada clase 1, de 900 mm de diámetro interior tubería de concreto d=900 mm (36”).
- Mezcla densa en caliente tipo mcd-19, para bacheo
- Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)
- Defensa metálica.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1 Información General del Contrato.

Contrato de Obra No:	**1218 de 2020**
Objeto:	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 2601 PIENDAMÓ MORALES; 2602A PIENDAMÓ SILVÍA TOTORO; 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO; 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA**
Contratista:	**INGAP S.A.S** **NIT. 811.047.188-0**
Dirección correspondencia:	**Carrera 12 # 56N-52 barrio Villa del Viento**
Teléfono:	**3108768899**
Correo electrónico:	**mantenimientocauca@gmail.com**
Valor inicial del contrato incluido IVA:	**$ 4.041.183.864,00**
Fecha de inicio del contrato:	**20 de octubre de 2020**
Plazo inicial del contrato:	**31 de diciembre de 2020**
Fecha de terminación actualizada:	**31 de diciembre de 2020**
Programa de Inversiones vigente:	**Programación No. 1**
Tiempo Total En Meses:	**Dos (2) Meses y doce (12) días**
Pólizas:	**Compañía aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Responsabilidad Civil M-100021089 Anexo 1. Póliza de Cumplimiento No. M-100123315 Anexo 2.**

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Durante el presente mes, comprendido entre el 20 hasta el 31 de octubre de 2020, se realizaron las actividades que se relacionan a continuación:

Ruta 2601 MORALES - PIENDAMO:

- Recorrido de la vía a intervenir con participación del personal del contratista, interventoría, y supervisor del proyecto por parte de INVIAS (Ing. Alonso Ortega) y las administraciones viales de los grupos 4 y 5 con el fin de identificar los puntos a intervenir de mayor prioridad.
- Se realizó visita a obra conjuntamente entre contratista e interventoría para definir la longitud de anden a construir
- Se realizó recorrido de la vía entre contratista e interventoría y se inició la demarcación de las áreas a intervenir con mezcla densa en caliente para bacheo.

Ruta 2602A PIENDAMÓ – SILVIA - TOTORÓ:

- Recorrido de la ruta a intervenir con participación del personal del contratista, interventoría, y supervisor del proyecto por parte de INVIAS (Ing. Alonso Ortega) y las administraciones viales de los grupos 4 y 5 con el fin de identificar los puntos a intervenir de mayor prioridad, principalmente en el sector urbano de Silvia donde se requiere la demolición y construcción de pavimento rígido.
- Se inició el levantamiento de actas de vecindad de inicio en el sector urbano de Silvia conjuntamente entre contratista e interventoría.

Ruta 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO

- Recorrido de la vía a intervenir con participación del personal del contratista, interventoría, y supervisor del proyecto por parte de INVIAS (Ing. Alonso Ortega) y las administraciones viales de los grupos 4 y 5 con el fin de identificar los puntos a intervenir de mayor prioridad.

Ruta 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR – NARANJAL SECTOR LÓPEZ – TACUEYÓ - TORIBIO:

- No se realizaron actividades en este frente de trabajo.

Ruta 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR – EL PALO:

- No se realizaron actividades en este frente de trabajo.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS:

A la fecha no se presentan Ítems No previstos en la ejecución del proyecto

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

FRENTE DE INTERVENCIÓN	VALOR EJECUTADO BASICO	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
CONTRATO 1218 DE 2020	$ -	0.00%
2601 MORALES - PIENDAMÓ	$ -	0.00%
2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO	$ -	0.00%
3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO	$ -	0.00%
3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL	$ -	0.00%
3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO	$ -	0.00%

A continuación, se detallan las gestiones realizadas por la Interventoría durante el periodo correspondiente al presente informe:

La interventoría durante este periodo realizo acompañamientos a las diferentes rutas, para definir el alcance de la obra, de igual manera acompaño al contratista en la realización de las actas de vecindad de la ruta 2602A Piendamo – Silvia – Totoró, en el sector de Silvia para la construcción del pavimento en concreto hidráulico.
La interventoría solicito al contratista la información de las empresas o plantas que va a utilizar para el suministro de materiales, para la realización de las diferentes obras en los tramos a intervenir.
Se realizo seguimiento a la divulgación de la obra por medio digital, perifoneo entrega de volanteo u cuñas radiales.
Se solicito al contratista entrega del cronograma de las actividades de gestión socio - ambiental y de igual manera se solicitó al contratista la entrega preliminar del PAGA – Programa de Adaptación a la Guía Ambiental.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

En el Formato MIMFRA-MN-IN-15-FR-3, se registra de manera resumida el estado general de ejecución del contrato.

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

En el Formato MIMFRA-MN-IN-15-FR-4, se registra el control diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras, que hasta el momento es cero debido que aún no se ha iniciado ejecución de obras y se registra el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones.

4.3 Personal contrato de obra

En el Formato MIMFRA-MN-IN-15-FR-6, se registra el control diario de personal dispuesto en la obra en cumplimiento de previsto en el pliego de condiciones.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

En el Formato MIMFRA-MN-IN-15-FR-8, se presenta el informe financiero y presupuestal.

De acuerdo con el contrato de obra, se pagará al contratista mediante actas de recibo parcial presentadas por el Contratista mensualmente, revisadas y aprobadas por la Interventoría, previo anexo del programa de inversión del correspondiente mes y de la presentación de los soportes de pago de seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista.

4.5 Estado General del Tiempo

En el Formato MIMFRA-MN-IN-15-FR-10, se presenta el registro del estado general del tiempo imperante en la zona del proyecto durante el presente mes.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

En el Formato MIMFRA-MN-IN-15-FR-11, se presenta el registro de los resultados de los ensayos de laboratorio ejecutados para verificar la calidad de los materiales empleados y de las obras ejecutadas.

4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

En el Formato MIMFRA-MN-IN-15-FR-12, se presenta el registro de la verificación del pago de aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista

4.8 Informe Avance Físico - Financiero

En el Formato MIMFRA-MN-IN-15-FR-14, se presenta el avance físico – financiero de la obra.

4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

En el Formato MIMFRA-MN-IN-15-FR-15, se presenta el seguimiento de las garantías y seguros del contrato de obra, las cuales se encuentran vigentes a la fecha del presente informe.


4.10 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo:

  Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1.

- Seguimiento programa de obra:

FRENTE DE INTERVENCIÓN	VALOR PROGRAMADO BASICO	PORCENTAJE PROGRAMADO (%)	VALOR EJECUTADO BASICO	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
CONTRATO 1218 DE 2020	$ 2,975,421.00	0.08%	$ -	0.00%
2601 MORALES - PIENDAMÓ	$ 624,452.00	0.017%	$ -	0.00%
2602A PIENDAMÓ - SILVIA – TOTORO	$ 884,309.00	0.024%	$ -	0.00%
3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO	$ 819,604.00	0.022%	$ -	0.00%
3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL	$ 431,370.00	0.012%	$ -	0.00%
3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO	$ 215,686.00	0.006%	$ -	0.00%

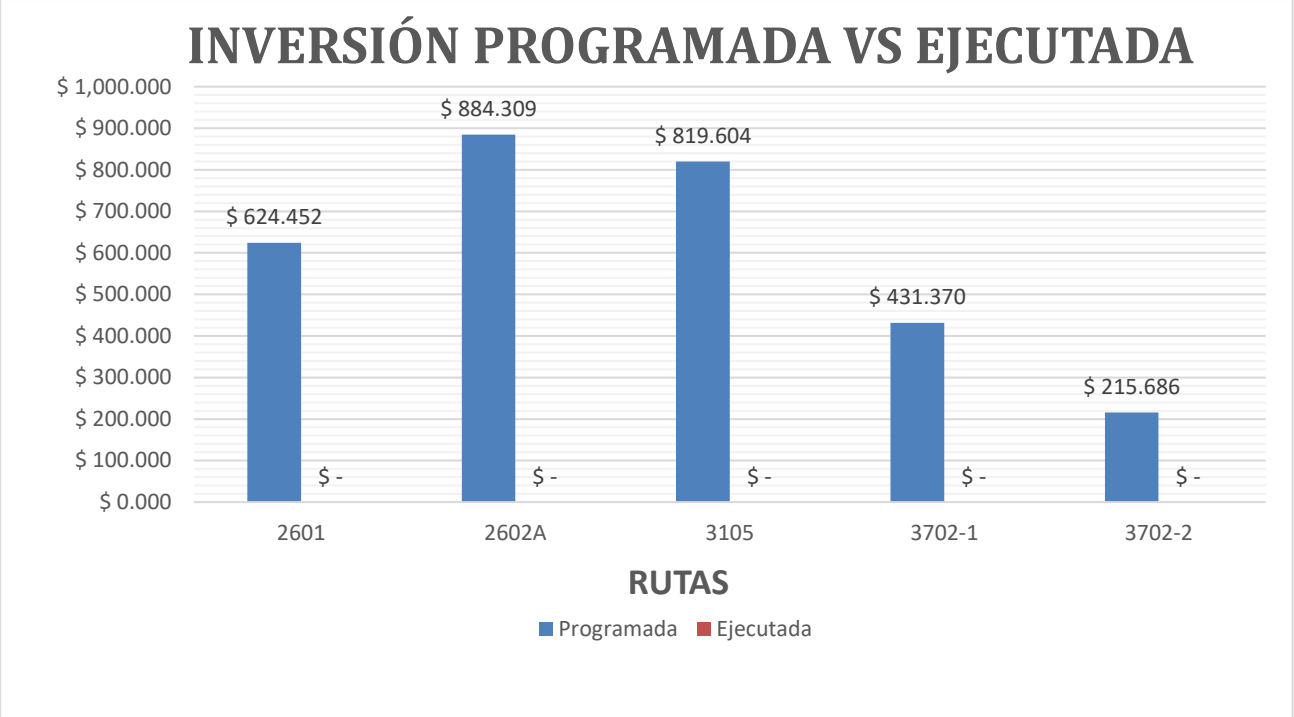

- Programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones

  Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y MINFRA-MN-IN-6-FR-2. Contiene la información referente al programa de inversiones de cada una de las obras del contrato.

- **Actas de Reunión MINFRA-MN-IN-14-FR-1**

  El día 28 - 10 - 2020, se realizó reunión con presencia de personal del contratista INGAP S.A.S. y personal de la interventoría del consorcio GEYKA, en un sitio con facilidad del cumplimiento del protocolo de bioseguridad. En esta reunión, se realizó la presentación de las metas a cumplir a 31 de diciembre de 2020, y se definió un cronograma de recorridos y actividades a cumplir la semana siguiente para definir el alcance del contrato.

- **Actas de Comité de Obra MINFRA-MN-IN-14-FR-1**

  El día 30 - 10 - 2020, se realizó comité de obra virtualmente, que contó con la presencia de representantes del contratista INGAP S.A.S, personal de la interventoría del Consorcio GEYKA, personal de la administración vial, supervisor del INVIAS y Director Territorial del INVIAS del Departamento Cauca. En esta reunión,

se desarrollo con el fin de conocer y presentar el equipo completo que conforma la interventoría, el contratista y socializar los temas relacionados con el inicio de las obras en los diferentes frentes de trabajo, el estado en el que se encuentran y el avance alcanzado a la fecha.

- **Informes Semanales MINFRA-MN-IN-15-FR-2**

  Se presenta copia de los informes semanales, cuyos originales fueron radicados cada semana en el INVIAS Territorial Cauca y copia de los cuales se remitió al Gestor del contrato:

  - Informe Semanal No. 1 periodo: 20 al 22 de octubre de 2020
  - Informe Semanal No. 2 periodo: 23 al 29 de octubre de 2020

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 Información general del contrato.

Contrato de Interventoría Nº:	**1258 de 2020**
Objeto:	**INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 2601 PIENDAMÓ MORALES; 2602A PIENDAMÓ SILVÍA TOTORO; 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO; 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**
Contratista:	**CONSORCIO GEYKA**
Dirección correspondencia:	**Calle 25 # 2E – 415 casa 1Manzana B barrio Colinas de Pomona Popayán (C)**
Teléfono:	**3183170007**
Correo electrónico:	**contrato126inv@gmail.com**
Valor del contrato incluido IVA:	**$ 506.446.770**
Fecha de inicio del contrato:	**20 de octubre de 2020**
Fecha de terminación inicial:	**31 de diciembre de 2020**

Plazo inicial del contrato:	**Hasta 31 de diciembre de 2020**
Fecha de terminación actualizada:	**31 de diciembre de 2020**
Pólizas:	**Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento No. NB – 100139698, Anexo 4**

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Recorrido en los frentes de obra, para identificar los sitios críticos que serán intervenidos mediante el contrato y demarcación de los puntos de intervención
- Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista
- Control de permanencia del personal calificado y no calificado
- Revisión de los diferentes documentos presentados por el contratista
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato
- Archivo actualizado de la Interventoría
- Comunicados dirigidos al contratista
- Comunicados dirigidos al INVIAS
- Reuniones con el contratista
- Asistir a las reuniones citadas por el INVIAS
- Seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el Contratista en los sectores donde se desarrollan las obras
- Elaboración de informes semanales
- Elaboración de informe mensual

5.3 Informe Especialistas

Para este periodo del presente informe no se realizó recorridos, ni se emitieron conceptos de especialista.

5.4 Informe Profesional Social

En este periodo la profesional Social, realizo acompañamiento al contratista en las diferentes actividades que se presentaron en los frentes de trabajo. Se anexa informe de la profesional Social.

5.5 Informe Profesional Ambiental

En este periodo la profesional Ambiental, realizo gestiones para que el contratista entregara en la mayor brevedad la documentación requerida en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA. Se anexa informe de la profesional Ambiental.

5.6 Informe Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo

En este periodo la profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, gestiono diferentes actividades para la consecución de los implementos de bioseguridad frente al COVID-19. Se anexa informe de la profesional SST.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría hace el respectivo seguimiento con los ingenieros de Interventoría.

6.1 Equipo Contrato de Interventoría: Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5, se presenta el equipo utilizado por la Interventoría durante el periodo del presente informe.

6.2 Personal Contrato de Interventoría:

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría:

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9

6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría:

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría:

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-2

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

RUTA No.1 2601 ÍENDAMO - MORALES:

OBSERVACIONES

- No se iniciaron obras de intervención de este frente de trabajo durante el periodo del presente informe.

- En este sector se presentan daños puntuales ubicados a lo largo de la vía, que deben ser intervenidos por medio de la instalación de mezcla asfáltica para bacheo. Por esta razón, se ha solicitado al contratista en diferentes oportunidades, agilizar su intervención para eliminar el riesgo que representan para la ocurrencia de accidentes.

CONCLUSIONES

- El contratista debe tomar todas las medidas y correcciones necesarias, para agilizar la intervención en este frente de trabajo, para lograr la terminación de las obras dentro del plazo establecido contractualmente.

RUTA No. 2 2602A PIENDAMO – SILVIA – TOTORO:

OBSERVACIONES

- No se iniciaron obras de intervención de este frente de trabajo durante el periodo del presente informe.

- En este sector se presentan daños puntuales ubicados a lo largo de la vía de la cabecera municipal de Silvia, que deben ser intervenidos por medio de reemplazo de losas de concreto hidráulico. Por esta razón, se ha solicitado al contratista en diferentes oportunidades, agilizar su intervención para eliminar el riesgo que representan para la ocurrencia de accidentes.

CONCLUSIONES

- Concluidas las actividades sobre el tramo de afirmado, se realizó la verificación de las densidades sobre dicha capa. Los resultados de las densidades fueron satisfactorios.

RUTA No.3 3501 SANTANDER DE QUILICHAO – RIO DESBARATADO:

OBSERVACIONES

- No se iniciaron obras de intervención de este frente de trabajo durante el periodo del presente informe.

- En este sector se presentan daños puntuales ubicados a lo largo de la vía, que deben ser intervenidos por medio de la instalación de mezcla asfáltica para bacheo. Por esta razón, se ha solicitado al contratista en diferentes oportunidades, agilizar su intervención para eliminar el riesgo que representan para la ocurrencia de accidentes.

CONCLUSIONES

- El contratista debe tomar todas las medidas y correcciones necesarias, para agilizar la intervención en este frente de trabajo, para lograr la terminación de las obras dentro del plazo establecido contractualmente.
-

RUTA No.4 3702 GUADUALEJO – BELALCAZAR – NARANJARL:

OBSERVACIONES

- No se iniciaron obras de intervención de este frente de trabajo durante el periodo del presente informe.

- En este sector se presentan daños puntuales ubicados a lo largo de la vía, que deben ser intervenidos por medio de material granular de afirmado. Por esta razón, se ha solicitado al contratista en diferentes oportunidades, agilizar su intervención para eliminar el riesgo que representan para la ocurrencia de accidentes.

CONCLUSIONES

- El contratista debe tomar todas las medidas y correcciones necesarias, para agilizar la intervención en este frente de trabajo cumpliendo con el plan de contingencia, para lograr la terminación de las obras dentro del plazo establecido contractualmente.

RUTA No.5 3702 GUADUALEJO – BELALCAZAR – EL PALO:

OBSERVACIONES

- No se iniciaron obras de intervención de este frente de trabajo durante el periodo del presente informe.

- En este sector se presentan daños puntuales ubicados a lo largo de la vía, que deben ser intervenidos por medio de material granular de afirmado. Por esta razón, se ha solicitado al contratista en diferentes oportunidades, agilizar su intervención para eliminar el riesgo que representan para la ocurrencia de accidentes.

CONCLUSIONES

- El contratista debe tomar todas las medidas y correcciones necesarias, para agilizar la intervención en este frente de trabajo cumpliendo con el plan de contingencia, para lograr la terminación de las obras dentro del plazo establecido contractualmente.

CONCLUSIÓNES GENERALES:

- La Interventoría para este periodo reporta un avance de obra del 0%, el cual refleja un atraso de obra del 0.08% que equivale a 2,975,421.00 pesos, con respecto al porcentaje acumulado programado. Se presenta este atraso por motivos de que el contratista esta realizando estudios y diseños de las diferentes obras a realizar en los tramos a intervenir, antes de iniciar con labores.

- La Interventoría mediante reuniones realizadas con el contratista, solicitó en repetidas oportunidades agilizar la intervención de las obras.

- El Contratista ha manifestado tener inquietudes sobre los diseños del bacheo para la iniciación de las obras en los frentes de trabajo donde se van a realizar bacheo con mezcla asfáltica.

8. ANEXOS


8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Se anexa copia de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo del presente informe e informes de las profesionales Social, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.

8.2 Registro Fotográfico

Se presenta como documento anexo.

Atentamente,



_____

RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Contrato No. 1258 de 2020

INFORME DE GESTION AMBIENTAL
CONSORCIO GEYKA
OCTUBRE 2020

PROYECTO
"INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ SILVIA TOTORÓ, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

El proyecto en referencia con acta de inicio a partir del 20 de octubre de 2020 inicia con una fase de planeación desde el área técnica, a partir de la cual se hace referencia a la elaboración y entrega del PAGA, como una herramienta de vital importancia en el inicio y desarrollo de la obra, por cuanto es necesario salvaguardar el proyecto y las instituciones que representamos de sanciones legales ambientales y sociales. De acuerdo con esta salvedad, desde el área ambiental nos enfocamos en la identificación de aspectos e impactos ambientales que puedan afectar el proyecto, y estos evaluarlos cualitativa y cuantitativamente a través del PAGA.

AVANCE-COMPROMISO	FECHA	OBSERVACIONES
Comité No. 1	28 de octubre	Se solicita al contratista adelantar la entrega del PAGA
Comité No. 2	30 de octubre	se solicita la entrega de los siguientes documentos: - Cronograma de Actividades Ambientales. - Listado de Canteras. - Documentos Ambientales de las Canteras (Permisos y Documentos). - Avance del Documento PAGA.

VALIDACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES

UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIÓN
POPAYAN		Se realiza reunión entre los profesionales ambientales de obra e interventoría para el cumplimiento del documento referente al PAGA por parte del contratista.
Ruta 3105 **PR 37+0850**		Reconstrucción de alcantarilla

CONSIDERACIONES

1. Se solicita de manera inmediata la presentación del documento PAGA, el cual según lo establecido contractualmente debe ser presentado en un plazo no superior a treinta (30) días calendario a partir de la orden de inicio.

2. Suministrar documentación de los proveedores de materiales a utilizar en los diferentes frentes de trabajo. Es de obligatorio la notificación del uso de los diferentes proveedores.

Firma en Documento Original

Elaborado por:
Lizeth Alejandra Erazo
Residente Ambiental
Consorcio GEYKA

INFORME ACTIVIDADES SOCIALES
MES DE OCTUBRE 2020

Proyecto: "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ SILVIA TOTORÓ, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Para el mes de octubre se realizó acompañamiento al contratista en las siguientes actividades:

Acompañamiento entrega de volantes informativos a la comunidad del municipio de Silvia, para el inicio de las actas de vecindad el 27 de octubre de 2020.





Inicio de levantamiento de actas de vecindad mes de octubre en el municipio de Silvia, en conjunto con el área social de la interventoría y contratista.









Recorrido ruta 2601 Morales – Piendamo, por parte del área técnica y social de contratista e interventoría con el fin de conocer las condiciones iniciales y de esta forma identificar las necesidades presentadas en este sector, las cuales están enfocadas a buscar la seguridad de usuarios y peatones.





Participación comité de obra para inicio de actividades de obra y sociales.






NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORIA PARA EL MENTENIMIENTO DE LAS VIAS 2601MORALES PIENDAMO,2602A PIENDAMO SILVIA TOTORO,3105 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO,3702GUADULEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LAS VIAS 2601MORALES PIENDAMO,2602A PIENDAMO SILVIA TOTORO,3105 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO,3702GUADULEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	**Consorcio GEYKA**
CONTRATO No.:	**1258 2020**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**OCTUBRE**

En el mes de octubre la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo realizo gestiones para la implementación de los elementos de bioseguridad contra el Covid 19, quien relaciona sus actividades de la siguiente manera:

Cotización insumos de protocolo de Bioseguridad Covid-19

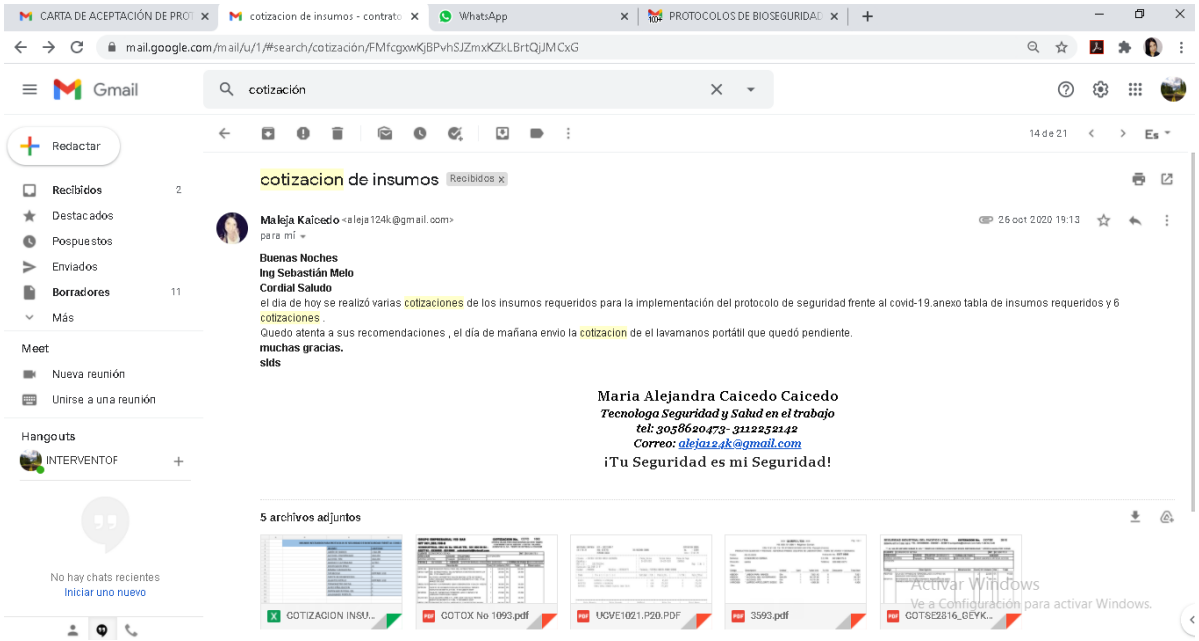

COTIZACION DE UNSUMOS PARA PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19

INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PROVEDOR	VALOR TOTAL
Jabón de manos	1Galon	$ 7.821	QUIMPO LIMITADA	$ 7.821
Alcoholgel glis eriado	1Galon	$ 30.157	QUIMPO LIMITADA	$ 30.157
Alcohol 70%	1Galon	$ 14.551	QUIMPO LIMITADA	$ 14.551
Hipocrorito de sodio (Limpido)	1Galon	$ 4.900	QUIMPO LIMITADA	$ 4.900
Spray dosificador alcohol	15x120 ml	$ 2.220	QUIMPO LIMITADA	$ 33.750
Amonio cuaternario "Safercol"	1litro	$ 45.600	MULTIAGRO LIMITADA	$ 45.600
Bomba Fumigadora de espalda Indutrial goizpe	1	$ 244.188	DUWEST COLOMBIA	$ 244.188
Bomba fumigadora de espalda royal industrial 20 lts	1	$ 270.000	MULTIAGRO LIMITADA	$ 270.000
Tapabocas termos ellado de obra 3 capas	Caja x50	$ 880	SEINPA LIMITADA	$ 44.000
Tapabocas en tela economico negro/azul	Caja x100	$ 800	SEINPA LIMITADA	$ 80.000
Tapabocas N95	1	$ 4.000	SEINPA LIMITADA	$ 4.000
Gel antibacterial "bienes exentos decreto 417"	1 Galon	$ 45.000	GRUPO EMPRESARIAL VID	$ 45.000
Acohol "bienes exentos decreto 417"		$ 19.000	GRUPO EMPRESARIAL VID	$ 19.000
Amonio Cuaternario QSM 5 generacion	1Galon	$ 30.000	GRUPO EMPRESARIAL VID	$ 30.000
Tapete de desinfeccion multifuncional	1	$ 85.000	GRUPO EMPRESARIAL VID	$ 85.000
Tapabocas termos ellado de obra 3 capas	Caja x 50	$ 22.000	GRUPO EMPRESARIAL VID	$ 22.000
guante nitrilo"bienes exentos decreto 417"	Caja	$ 49.000	GRUPO EMPRESARIAL VID	$ 49.000
Termometro Digital infrarojo con registro invima	1	$ 180.000	GRUPO EMPRESARIAL VID	$ 180.000
aviso pendon señalizacion medidas de seguridad	1	$ 18.487	GRUPO EMPRESARIAL VID	$ 18.487
aviso señalizacion distanciamiento covid-19	1	$ 6.303	GRUPO EMPRESARIAL VID	$ 6.303
Dispensador de pedal para gel antibacterial	1	$ 120.000	OXIMEDICA	$ 120.000
Lavamanos de portatil	1	*pendiente cotiz	OXIMEDICA	*pendiente cotizar

MARIA ALEJANDRA CAICEDO
TNLGO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

INSUMOS NECESARIOS PARA PROTOCOLOS SE SEGURIDAD DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 PARA 15 COLABORADORES

INSUMO	CANTIDAD
JABÓN DE MANOS	1 GALON
ALCOHOL GRLISERINADO	1GALON
ALCOHOL 70%	1GALON
AMONIO CUATERNARIO	1LITRO
DOSIFICADOR SPRAY	15
BOMBA FUMIGADORA	1
TAPABOCAS	DEPENDE USO
TAPETE DE DESINFECCION	1
GUANTES NITRILO	DEPENDE USO
TERMOMETRO DIGITAL	1
AVISO SEÑALIZACION	2
DISPENSADOR PEDAL GEL	1
LAVAMANOS PORTATIL	1

MARIA ALEJANDRA CAICEDO
TNLGO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

MULTIAGRO LIMITADA NIT.: 800213488-7 — COTIZACION VENTA
CR 6 5N 28 PBX: 8234790 — IVA REGIMEN COMUN — No. - 20289
POPAYAN CAUCA — Hora : 05:48 PM

Cliente : CAICEDO CAICEDO MARIA ALEJANDRA
Establec.:
NIT o CC : 1061758130-6
Direccion: CLL 56AN 10 87
Ciudad : POPAYAN Telefono : 3058620473

Fecha Cotiza: 26-OCT-2020 — Valida Hasta: 26-OCT-2020 — Forma de Pago: CONTADO
Pag: 1 de 1
Vendedor: VICTORIA BEDOYA FABER ANDRES

Items	Descripcion	Cantidad	U.M.	Precio_Uni.	% IVA	Valor_Total
014321	SAFERCOL X LITRO(DA)	1	LTS	45,600	0	45,600
SAF36760	SAFERCOL X GALON(DA)	1	GLN	176,000	0	176,000
FAF30001	FUMIG ROYAL CONDOR CLASICA INOX 20LTS	1	UND	270,400	5	270,400

Valor Excento	Valor Gravado	SubTotal	Valor Iva	Total Pagar
221,600	257,524	479,124	12,876	492,000

Son : CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MCTE.
Observaciones: Peso: 2

Aprobado Por:

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PACIFICO LTDA **COTIZACION No.** COTSE 2815
SEINPA NIT 817.000.185-8 TEL. 3016999898 - 8308001 - 8339813 seinpaltda@hotmail.com Calle 1 AN No 9-49

*** AL VALOR UNITARIO SUMAR EL IVA ** TIEMPO DE ENTREGA A CONVENIR SEGÚN DISPONIBILIDAD ** OFERTA VALIDA POR 15 DIAS

CLIENTE	CONSORCIO GEYKA				NIT	901266175 0
DIRECCION	CIUDAD	TELEFON	3058620473	FORMA DE PAGO	ASESOR	
BARRIO CENTRO	Popayán	FECHA	26/10/2020	SEIN CONTADO	EIBAR ANDRES ORTEGA HOYOS	
COTIZACIÓN						

Codigo	Descripción	Observacion	Cant.	V/r Unitario	IVA	Total
RESP030	CAJA DE TAPABOCAS TERMOSELLADO 3 CAPAS X 50 UNIDADES DISPOSABLE MASK		2	22.000	0%	44.000
RESP153	RESPIRADOR EN TELA ECONOMICO NEGROAZUL/BLANCO "BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020"		100	800	0%	80.000

Valor en Letras
CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	124.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DOCUMENTO	124.000

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____

>>> QUIMPO LTDA >>>

Pág. 1 de 1

Nit. 800.131.956-1 Régimen Común

CRA 15 # 1-02 Tel: TELEFONOS 8310031-8215754 Popayán (Cauca)

PRODUCTOS QUIMICOS Y PISCINAS - MATERIAS PRIMAS -EQUIPOS DE LABORATORIO - FIBRA DE VIDRIO Y CERAMICA

Fecha: 26-10-2020 Cotización No. **COT 3593**

Señor(a): CONSORCIO GERKA C.C./Nit: 901266175-0

Dirección: centro Teléfono: 305-862-0473

Obs:

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unit.	% IVA	Descuento	Total Item
ASEO04	* JABON PARA MANOS	Gln	1	7,821.42	0		7,821
ASES30	* ALCOHOL GEL GLICERINADO	GALON	1	30,157.30	0		30,157
VARIO503	* ALCOHOL 70%	Gln	1	14,751.00	0		14,751
VARIO359	* LIMPIDO HIPOCLORITO SODIO	Gln	1	4,900.00	0		4,900

GRUPO EMPRESARIAL VID SAS
NIT 901.285.199-8
OXINDUSTRIAL CRA 6A No 10N-40 TEL 301 699 99 94 - 8227715 - 8339565 - 8216968 oxindustrial@hotmail.com

COTIZACION No. COTO 1093

OFERTA VALIDA POR 8 DIAS DESPUES DE ESTE TIEMPO
CONFIRMAR CON SU ASESOR - A ESTOS VALORES
AUMENTAR EL IVA - TIEMPO DE ENTREGA A CONVENIR

CLIENTE	CONSORCIO GEYKA			NIT	901266175 0
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	COTIZACIÓN		
BARRIO CENTRO	Popayán	3058620473			
FECHA	26/10/2020	ASESOR	VICTOR MANUEL ESGUERRA SANCHEZ	FORMA DE PAGO	OXI CONTADO

	Descripción	Cant.	V/r Unitario	IVA	Total	Observacion
SEÑA158	DISPENSADOR PEDAL PARA GEL ANTIBACTERIAL	1	120.000	0%	120.000	
MEQU11467	GEL ANTIBACTERIAL GALON"BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020"	1	45.000	0%	45.000	
MEQU469	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON MK/OSA LOTE J8-730350-2 VENC.2020/09/30 "BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020"	1	19.000	0%	19.000	
MEQU13015	AMONIO CUATERNARIO QSM 5 GENERACION X GALON 400216	1	30.000	0%	30.000	
SEÑA740	TAPETE DE DESINFECCION MULTIFUNCIONAL "BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020"	1	85.000	0%	85.000	
RESP030	CAJA DE TAPABOCAS TERMOSELLADO 3 CAPAS X 50 UNIDADES DISPOSABLE MASK	1	22.000	0%	22.000	
GUAN1063	CAJA GUANTE NITRILO T: L REF: 6025 / NIXI SJ40 "BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020"	1	49.000	0%	49.000	
MEQU11501	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO CON REGISTRO INVIMA	1	180.000	0%	180.000	
SEÑA483	AVISO PENDON SEÑALIZACION MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19	1	18.487	19%	18.487	
CARE222	CARETA FACIAL ANTIGOLPES POLIURETANO	1	25.000	0%	25.000	
CARE055	CARETA TRANSPARENTE EPI CON VISOR EN PET REF: 20-01PET-AZ "BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020"	1	40.000	0%	40.000	
MONO307	GAFA CLARA ANTIEMPAÑANTE NEGRO TIPO UVEX"BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020"	1	8.000	0%	8.000	
MONO028	GAFA CLARA SENCILLA MARCO NEGRO/TRICOLOR TIPO UVEX REF: AL026CL/3C /20575 7709544947965"BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020"	1	5.000	0%	5.000	
SEÑA440	AVISO SEÑALIZACION DE PISO DISTANCIAMIENTO REDONDO	1	8.403	19%	8.403	
PEGA078	CINTA DEMARCACION HUMANPACK AMARILLA 50MM X 33MM REF: ALTONA	1	12.605	19%	12.605	
ROPA733	OVEROL TIPO TYVEK EN TELA ANTIFLUIDO NEGRO TALLA:L/XL	1	55.000	0%	55.000	
SEÑA009	AVISO SEÑALIZACION MANTENGA LA DISTANCIA/PROHIBIDO EL PASO/USO TAPABOCAS/DESINFECCION CUERPO/EVITE CONTACTO/ZONA DESINFECCION MANOS 20X30	1	6.303	19%	6.303	

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	728.798
DESCUENTO	0
IVA	8.702
TOTAL DOCUMENT	737.500

En el mes de octubre se realiza la entrega de los elementos de protección y bioseguridad contra el Covid 19.

Entrega de elementos de bioseguridad al personal de la interventoría 28-octubre -2020








Lavado de manos del personal de interventoría 29 0CTUBRE 2020





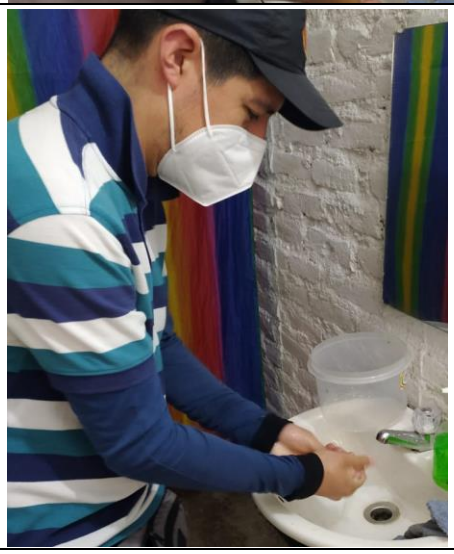

Terraplaza.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 29 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1218 DE 2020

CONTRATISTA: INGAP S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1259 DE ###

INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
RICHARD YELA CAICEDO	Director Interventoría	CONSORCIO GEYKA
FABIÁN RAMÍREZ	Ingeniero Residente Intervent.	CONSORCIO GEYKA
NAYIBE PORTILLA	Profesional Social	CONSORCIO GEYKA
LICETH ERAZO	Profesional Ambiental	CONSORCIO GEYKA
ALEJANDRA CAICEDO	Profesional SISO	CONSORCIO GEYKA
ALEJANDRO LEÓN	Auxiliar Interventoría	CONSORCIO GEYKA
ADRIÁN BOLAÑOS	Auxiliar Interventoría	CONSORCIO GEYKA
Oscar muñoz.	Director obra.	INGAP SAS.
Alejandro Arteaga.	Auxiliar obra.	INGAP SAS.
Cristian Camilo muñoz	Residente obra	INGAP SAS.
Hugo Solis	Residente Ambiental	INGAP SAS.
Stefany Muñoz	Residente Social	INGAP SAS.
Geraldin ramargo	Residente SST	INGAP SAS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Dar a conocer por parte del Contratista INGAP S.A.S. Aa la Interventoría, el plan de trabajo con el cual iniciara obras en las Rutas que conforman el contrato de obra No 1218 de 2020

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Identificación de las rutas que conforman el contrato de Obra No. 1218 de 2020.
Descripción de las obras a ejecutar en las rutas que conforman el Contrato No. 1218 de 2020
Identificación de las rutas en las cuales se iniciará a ejecutar las obras.
Actividades con las que se iniciará a ejecutar obra en las rutas seleccionadas para su inicio

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Ingeniero Richard Yela-Director de Interventoría solicita al Ingeniero Oscar Muñoz -Director de Obra, el plan de ejecución de las obras que conforman las rutas del presente contrato.

El Ingeniero Oscar Muñoz describe las actividades a realizar en la presente semana, así:

Ruta 2602A Piendamó -Silvia-Totoró. El día de mañana Jueves 29 de octubre de 2020 iniciarán a elaborar las actas de vecindad en el Municipio de Silvia, donde se ejecutará la construcción del pavimento en concreto rígido en el paso urbano de éste Municipio. La interventoría solicita realizar el levantamiento topográfico de este sector para determinar las cantidades exactas de obra a realizar y así conocer el presupuesto a invertir en esta obra, además se solicita realizar la toma de CBR en el sector donde se construirán las losas de concreto. El contratista radicará en la Alcaldía del Municipio de Silcia el documento mediante el cual informa a la Administración Municipal sobre las obras a realizar y solicita información sobre posibles intervenciones a ejecutar por parte de la Alcaldía en este sector.

Pyela

Escaneado con CamScanner

Ruta 2601 Morales Piendamó. El Contratista informa que en esta ruta, el día viernes 23 de octubre de 2020 se realizó recorrido conjuntamente entre el Contratista y la Interventoría para demarcar los sitios donde se realizará bacheo, demarcación que se realizó entre el Pr00+0000 y el Pr 07+0710, expresa que el bacheo iniciará el 09 de noviembre de 2020fecha para la cual ya debe tener definido el sitio de desalojo de escombros ; la construcción y reparación de obras menores como alcantarillas y cunetas iniciará el 05 de noviembre de 2020. La Interventoría requiere que la Trabajadora Sociale del Contratista se desplace hasta el sector donde se construirá el andén, en el Casco urbano de Piendamó con el fin de adelantar las actas de vecindad. Para definir el espesor de la capa de rodadura a instalar, se decidió que éste tema se expondrá en comité con el Invias para su definición.

Ruta 3105 Santander de Quilichao-Miranda: El contratista informa que solicitará aprobación presupuestal a la Intervnetoría para realizar una visita a esta vía con el Especialista estructural, para que éste emita un concepto sobre la patología de los pontones del Pr20 y Pr35 de esta ruta, además de los gaviones colapsados en el box coulvert del Pr13+0888. La Interventoría solicita al Contratista, solicitar concepto del Especialista Hidráulico para determinar la sección del box coulvert a construir en el Pr37+0300 donde se presenta colapso de la tubería doble de 24 pulgadas de la alcantarilla existente, además de levantar la topografía del sitio para definir si se debe subir la rasante de la vía. El Contratista expresa que el bacheo en ésta vía lo iniciará tentativamente el 25 de noviembre con otra cuadrilla diferente a la que realizará el bacheo de la vía Morales-Piendamó; La interventoría expresa al contratista que la fecha estimada para inicar el bacheo está muy lejana y que debe iniciar lo antes posible esta actividad.

Ruta 3702 Guadualejo-Belalcázar Naranjal y Guadualejo-Belalcázar -El Palo. El contratista expresaa que para la conformación y afirmado de ésta vía está adelantando negociaciones para contratar la maquijnaria, dado que por la distancia, los precios están muy elevados. Informa también que está analizando las posibles canteras para extracción del material de afirmado. La Interventoría requiere al contratista realizar la próxima semana un recorrido a ésta vía para identificar el sitio y definir las obras a realizar en el Pr97+0030 donde posiblemente se debe construir un box coulvert.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	2
FECHA	29 (Día)	10 (Mes)	2020 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Levantamiento topográfico paso urbano de Silvia	Sábado 31 de octubre de 2020	INGAP S.A.S
Radicación de documento informativo en la Alcaldía de Silvia	Jueves 29 de octubre de 2020	INGAP S.A.S
Toma de CBR paso urbano Municipio de Silvia	Viernes 30 de octubre de 2020	INGAP S.A.S
Inicio de elaboración de actas de vecindad en el Mpio de Silvia	Viernes 30 de octubre de 2020	CONSORCIO GEYKA-INGAP S.A.S.
Visita técnica sector construcción de andenes en Piendamó	Jueves 29 de octubre de 2020	CONSORCIO GEYKA-INGAP S.A.S.
inicio de reparación y construcción de obras de arte	05 de noviembre de 2020	INGAP S.A.S
Inicio de bacheo Vía Morales -Piendamó	09 de noviembre de 2020	INGAP S.A.S
Visita con especialista estructural a puentes Pr20 y Pr35 Ruta 3105	Por definir	INGAP S.A.S
Visita con especialista hidráulico box coulvert Pr37+0300 Ruta 3105	Por definir	INGAP S.A.S
Levantamiento topográfico Pr37+0300 Ruta 3105	Por definir	INGAP S.A.S

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 30 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
RICHARD YELA CAICEDO Director interventoria.	
FABIÁN RAMÍREZ ING. RES. INTERVENTORIA YEIKA	
NAYIBE PORTILLA Res. Social interventoria Yeika	
LISETH ERAZO Res Ambiental interventoria	
ALEJANDRA CAICEDO Siso interventoria Yeika.	
ALEJANDRO LEÓN ING. AUX interventoria Yeika	
ADRIÁN BOLAÑOS IN. AUX interventoria Yeika.	
Oscar Mutta · Director	
Camilo Muñoz Castillo	
Manuel Alejandro Arteaga Benavides	
Hugo Javier Solis Chaves	

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	INFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 29 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Alejandro Arteaga. INGAP. ING. Aux.	
Stefany Muñoz. INGAP. Res. Social.	
Geraldin Camayo INGAP. SISO.	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3
		FECHA	30 (Día)	10 (Mes)	2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1218 **DE** 2020

CONTRATISTA: INGAP S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO – BELALCAZAR – NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO – BELALCAZAR – EL PALO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Richard Yela Caicedo	Director interventoria	Consorcio GEYKA
Adrian Bolaños	Ingeniero Auxilial Inteventoria	Consorcio GEYKA
Alejandro León Vidal	Ingeniero Auxilial Inteventoria	Consorcio GEYKA
Fabian Ramirez Narvaez	Ingeniero Residente interventoria	Consorcio GEYKA
Lizeth Erazo Erazo	Residente Ambiental	Consorcio GEYKA
Nayibe Portilla Caicedo	Residente Social	Consorcio GEYKA
Diana Maria Messa	Aux Administravo interventoría	Consorcio GEYKA
Maria Alejandra Caicedo	Inspector SST interventoria	Consorcio GEYKA
Astrid Milena Sanchez	Ingeniera Residente	Adminstracion Vial Grupo 4
Aideni Bolaño	Ingeniera Auxiliar	Adminstracion Vial Grupo 4
Jose Adrian Valencia Castrillon	Director Territorial Cauca	INVIAS Cauca
Jorge Alonso Ortega Rojas	Supervisor INVIAS Cauca	INVIAS Cauca
Sebastian Melo	Coordinador del proyecto	Consorcio GEYKA
Oscar Miguel Muñoz	Director de Obra	INGAP S.A.S
Pedro Jose Varon	Gestor Técnico Contrato	INVIAS Bogotá
Felipe Fernandez	Especialista Pavimentos	INGAP S.A.S
Hugo Solis	Ingeniero ambiental contratista	INGAP S.A.S
Sandra Maria Garcia	Abogada	INGAP S.A.S
SIGEANNY MUÑOZ		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

El comité se desarrolla con el fin de conocer y presentar el equipo de trabajo completo que conforma la interventoria, el contratista de obra y el personal que se relaciona directamente con el contrato. Asi mismo socializar temas relacionados con el inicio de las obras en los diferentes frentes de trabajo, el estado en el que se encuentran y el avance alcanzado.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta del comité realizado el dia 28 de octubre de 2020.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Presentación de los participantes
2. Hojas de vida personal del Contratista
3. Programa de reintegración-Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.
4. Equipo minimo contratado
5. APU
6. Plan de calidad
7. PMT
8. Estudios y diseños
9. Inicio de obra
10. Actividades a desarrollar
11. Varios

Yela

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	31 DE	3
		FECHA	30 (Día) 10 (Mes)	2020 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Presentación y saludo de los participantes.

2. El director de la interventoria solicita al director de obra la presentación del personal dispuesto para la ejecución del proyecto y requiere subsanar algunas observaciones hechas a las hojas de vida de los especialistas.

3. De acuerdo al programa de reintegración, se manifiesta de parte de la interventoria que el contratista aún no ha presentado el documento a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, solicitando la relación de las personas que estén vinculadas a la Agencia y que puedan vincularse al proyecto. El Director de Interventoria manifiesta que el documento lo radicará la próxima semana.

4. La interventoria manifiesta que el contratista entregó la ficha técnica del equipo mínimo requerido, pero se presenta sin certificación de disponibilidad, para lo que el director de obra refiere que este trámite se realizará, sin embargo el director de obra se compromete a entregar el documento requerido.

5. El ingeniero Richard Yela, director de interventoria señala que a la fecha solo se han recibido 23 APU, los cuales no presentan costo de señalización preventiva, se observan errores en la multiplicación de valor unitario y cantidades, presentan APU para todas las vías aunque en algunas no se harán dichas actividades, por lo que se solicita al contratista de la obra llevar a cabo la revisión de los APU, existen inconsistencias en la transcripción de los APU no coinciden con la propuesta económica. El director de obra refiere tener conocimiento del inconveniente y dice que está en proceso de revisión.

6. La interventoria requiere que por parte del contratista se entregue el informe de inspección de ensayos de los materiales a utilizar que hacen parte del plan de calidad.

7. El contratista de obra presentó el PMT, pero la interventoria le hace la observación relacionada a que no se presenta la distancia de ubicación entre cada una de las señales de acuerdo con el manual de señalización vial vigente, entre otras.

8. Estudios y diseños: El director de interventoria recomienda dar inicio a obras menores que no requieren de estudios y/o diseños; Hace la solicitud de agilizar estudios de topografía y actas de vecindad para dar inicio con la obra de pavimento rígido del Municipio de Silvia y expresa que se envió al contratista los diseños, enviados por la territorial Cauca, para el pavimento del Municipio de Silvia para su estudio. Por parte del contratista hace intervención el Ing Felipe Fernandez especialista en pavimentos y en su exposición recomienda el uso de los estudios y diseños realizados por INVIAS en febrero del presente año, para éste Municipio. El Contratista emitirá documento escrito a la interventoria para su revisión y aprobación, respecto a éstos diseños. El Ing. Adrián Valencia, Director de la territorial Cauca concluye que si la interventoria avala obras que no necesiten de realización de estudios y diseños, se pueden iniciar por parte del contratista de obra; En cuanto a la solicitud del concepto técnico de los estudios y diseños una vez el contratista los radique, la interventoria dará respuesta el mismo dia a esta solicitud para darle el respectivo trámite.

9. Se solicita al contratista la caracterización de las fuentes del material para afirmado, se necesita legalizar los diseños de mezclas para comenzar con obras en la via de Morales-Piendamo.

10. El contratista expresa su inquietud sobre presupuesto del tramo de Silvia, referente al alcance de las obras; la interventoria hace énfasis en que se debe garantizar las obras de drenaje y que se deben incluir en el diseño. El Ing Adrian Valencia solicita se agilize la socialización a la comunidad de las obras a realizar en Silvia y consecuente a esto apresurar con las actas de vecindad en el mismo Municipio

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1. Presentar personal completo de obra.	Miercoles, 4 de noviembre	Oscar Muñoz- contratista obra
2. Programa de Reintegración	Miercoles, 4 de noviembre	Oscar Muñoz- contratista obra
3. Documentación Equipo mínimo	Miercoles, 4 de noviembre	Oscar Muñoz- contratista obra
4. Atención a observaciones de APU	Jueves, 5 de noviembre	Oscar Muñoz- contratista obra
5. Entrega de informe de inspección de ensayos que hacen parte del plan de calidad	Martes, 3 de noviembre	Oscar Muñoz- contratista obra
6. Caracterización fuentes de material de afirmado	Viernes, 13 de noviembre (2	Oscar Muñoz- contratista obra
7. Diseños pavimento Via Morales - Piendamo	Viernes, 6 de Noviembre	Oscar Muñoz- contratista obra
8. Inicio de cunetas Morales - Piendamo	Martes, 3 de noviembre	Oscar Muñoz- contratista obra
9. Terminación actas de vecindad en Silvia	Sabado, 7 de noviembre	Oscar Muñoz- contratista obra
10. Concepto técnico estudios y diseños de pavimento paso urbano de Silvia	Martes, 3 de noviembre	Oscar Muñoz- contratista obra
11. Aval concepto técnico estudios y diseños de pavimento paso urbano de Silvia	Martes, 3 de noviembre	Interventoria

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 9 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	3
		FECHA	30 (Día)	10 (Mes)	2020 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.
3. Se aclara que el comité se realizó de forma virtual, El acta del comité se enviará a los correos electróncos de los participantes para su respectiva firma.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
RICHARD YELA CAICEDO	
Oscar Miguel Mutta	
Hugo Javier Solís Chávez	
Stefanny Muñoz	
Nayibe Portilla Caicedo.	
Alejandra León Vidal	
Luis Adrián Bolaños Caicedo.	
Edinson Fabián Ramirez N	
Diana Maria Messa	
Maria Alejandra Caicedo	

Original: Informe mensual de Interventoria.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL CAUCA


INFORME MENSUAL N. 1

FECHA INFORME MENSUAL: 20 AL 31 DE OCTUBRE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO GEYKA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1258 DE 2020

OBJETO CONTRATO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, DEPARTAMENTO DE CAUCA

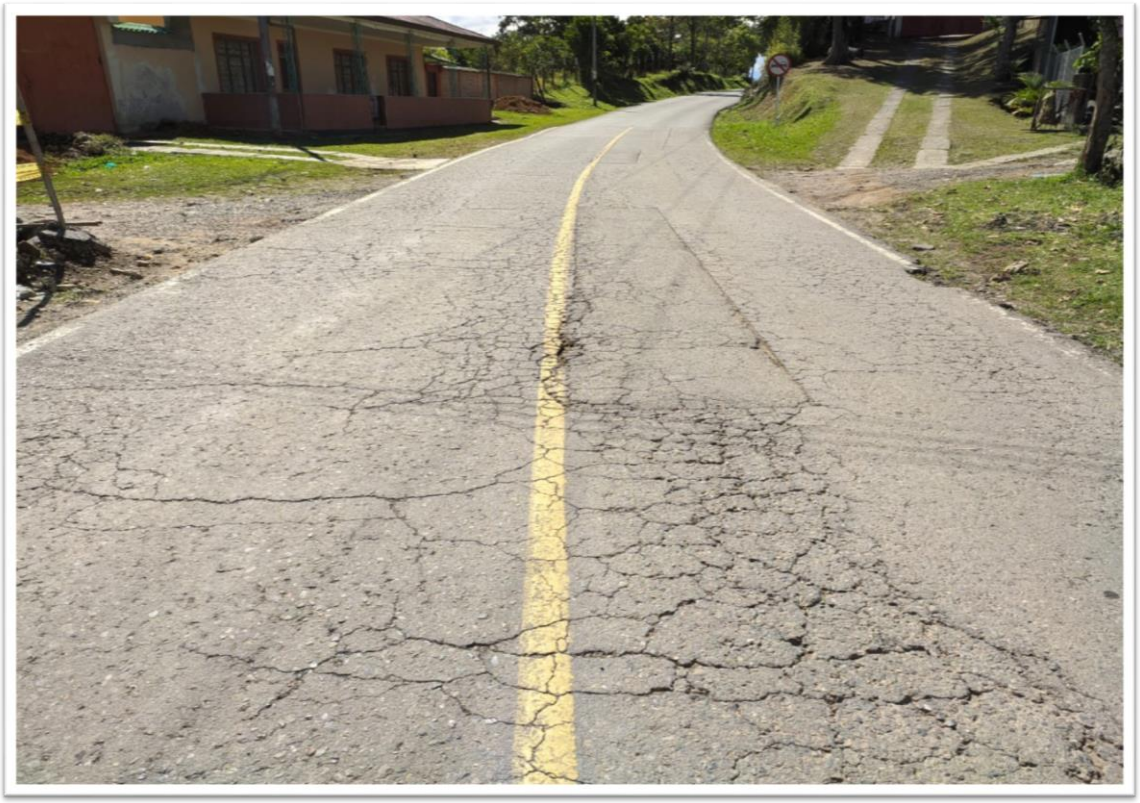

VIA	SECTOR
2601	MORALES - PIENDAMÓ
2602A	PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORÓ
3105	SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO
3702	LOPEZ - TACUEYO - TORIBIO
3702	GUADALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL

POPAYAN 05 DE NOVIEMBRE DE 2020


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL No. 1

MES O PERIODO: 20 A 31 DE OCTUBRE DE 2020

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		**X**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		**X**		5
2,1	Localización		**X**		5
2,2	Inventario y estado inicial de la vía		**X**		13
2,3	Características técnicas del proyecto		**X**		17
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		**X**		19
3,1	Información general del contrato		**X**		19
3,2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		**X**		20
3,3	Seguimiento Ítems no previstos		**X**		21
3,4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		**X**		21
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		**X**		22
4,1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	**X**		22
4,2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	**X**		22
4,3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	**X**		22
4,4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	**X**		22
4,5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	**X**		22
4,6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	**X**		22
4,7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	**X**		23
4,8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	**X**		23
4,9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	**X**		23
4,10	Otros documentos seguimiento mensual		**X**		23
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	**X**		23
	• Seguimiento Programa de Obra		**X**		24
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	**X**		24
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	**X**		24
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	**X**		24
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	**X**		24
4,11	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	**X**		24
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		**X**		25
5,1	Información general del contrato		**X**		25
5,2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		**X**		26
5,3	Informes especialistas			**X**	26
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		**X**		27
6,1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	**X**		27
6,2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	**X**		27
6,3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	**X**		27
6,4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	**X**		27
6,5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	**X**		27
6,6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	**X**		27
6,7	Otros documentos seguimiento mensual		**X**		27
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	**X**		27
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	**X**		27
7	**Observaciones y Conclusiones**		**X**		28
8	**Anexos**		**X**		31
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		**X**		31
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		**X**		31
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales			**X**	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

RUTAS: **2601, 2602A, 3105, 3702**

CONTATANTE: **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

CONTRATISTA: **INGAP S.A.S.**

CONTRATO DE OBRA No. **1218-2020**

OBJETO CONTRATO: **MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, DEPARTAMENTO DE CAUCA**

FECHA DE INICIACION: **20 DE OCTUBRE 2020**

FECHA DE TERMINACION: **31 DE DICIEMBRE DE 2020**

VALOR CONTRATO: **$ 4.041.183.864,00**

VALOR POR RUTAS:

1. 2601 MORALES - PIENDAMÓ	**$**	**1.188.945.896,00**
2. 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORÓ	**$**	**670.760.487,00**
3. 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO	**$**	**1.561.989.352,00**
4. 3702 LOPEZ - TACUEYO - TORIBIO	**$**	**91.805.810,00**
5. 3702 GUADALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL	**$**	**157.274.051,00**
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE POSIBLES OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	**$**	**147.439.032,00**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	**$**	**25.000.000,00**
IVA COSTOS BASICOS OBRA	**$**	**28.085.030,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$**	**100.000.000,00**
IVA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$**	**19.000.000,00**
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$**	**50.884.206,00**
COSTO TOTAL	**$**	**4.041.183.864,00**

DIRECTOR DE OBRA **OSCAR MIGUEL MUÑOZ**

RESIDENTE DE OBRA **CRISTIAN CAMILO MUÑOZ**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

5.1. INFORMCION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

VIAS:	**2601, 2602A, 3105, 3702**
CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO GEYKA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**1258 DE 2020**
OBJETO CONTRATO:	**INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, DEPARTAMENTO DE CAUCA**
FECHA DE INICIACION:	**20 de octubre de 2020**
FECHA DE TERMINACION:	**31 de diciembre de 2020**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 506.446.770,00**

TRAMOS:

VIA	SECTOR
2601	MORALES - PIENDAMÓ
2602A	PIENDAMO - SILVIA - TOTORO
3105	SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO
3702	LOPEZ - TACUEYO - TORIBIO
3702	GUADALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ**
INGENIERO AUXILIAR	**Nombre:JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL**
INGENIERO AUXILIAR	**Nombre: LUIS ADRIÁN BOLAÑOS CAICEDO**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PERIODO MES: 20 AL 31 DE OCTUBRE 2020

CONTRATO DE OBRA No.: **1218-2020**

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONTRATISTA: INGAP S.A.S.

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2020
FECHA DE INICIACION: 20 de octubre de 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.041.183.864,00
VALOR ACUMULADO: $ 4.041.183.864,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 31 de diciembre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES:
AMORTIZACION ANTICIPO: $ 1.921.607.314,00

VALOR BÁSICO INCLUIDO IVA SECTOR MORALES - PIENDAMO	$ 1.188.945.896,00
VALOR BÁSICO INCLUIDO IVASECTOR PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORÓ	$ 670.760.487,00
VALOR BÁSICO INCLUIDO IVA SECTOR SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO	$ 1.561.989.352,00
VALOR BÁSICO INCLUIDO IVA SECTOR LOPEZ - TACUEYO - TORIBIO	$ 91.805.810,00
VALOR BÁSICO INCLUIDO IVA SECTOR GUADALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL	$ 157.274.051,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **1258 DE 2020**

INTERVENTOR: **CONSORCIO GEYKA**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	OBRA
Mejoramiento	M3	2481	
Bacheo	M3	1660	
Pavimento concreto hidráulico	M3	500	
cunetas	M3	464	
Concretos	M3	193	

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	M3	0
Bacheo	M3	0
Pavimento concreto hidráulico	M3	0
Andén peatonal	M2	0
Alcantarillas	UND	0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	2.975.421,00	-	-	-	0,00	$ 20.884.405	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Acumulado:	2.975.421,00	-	-	-	0,00	$ 20.884.405	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 4.041.183.864,00
Total	$ 4.041.183.864,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00	0,40	0,17	2,00	$ 4.041.183.864,00		$ 4.041.183.864,00	$ 4.041.183.864,00
Interventor:	0,04	0,40	0,17	2,00	$ 485.562.365,00		$ 485.562.365,00	$ 485.562.365,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE POSIBLES OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	147.439.032,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	25.000.000,00
IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%)	28.085.030,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.000.000,00
IVA DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	19.000.000,00
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	50.884.206,00
VALOR TOTAL	4.041.183.864,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	6	11	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	23-sep-20	30-jun-2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	23-sep-20	30-jun-2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	23-sep-20	31-dic-2025
Calidad de Estudios y Diseños	31-dic-20	31-dic-2025
Estabilidad y Calidad de Obra	31-dic-20	31-dic-2025

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
2. Responsabilidad Civil Extracontractual	23-sep-20	31-dic-2020

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: ANEXO 2 - CERTIFICADO 14575218 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica): NO APLICA

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SE EMITIO EL ORDEN DE INICIO EL DIA MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL CUAL LOS PRIMEROS DIEZ DIAS LA INTERVENTORIA REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO AL CONTRATISTA INGAP S.A.S., ADMINISTRACION VIAL, SUPERVISOR INVIAS EN LOS DIFERENTES TRAMOS.

SE SOLICITO AL CONTRATISTA REMITIR INFORMACION DEL CONTRATO, TAL COMO ES LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL, PROGRAMAS DE REINTEGRACION, DOCUMENTOS DEL EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO, PROGRAMA DE OBRA, PROGRAMA DE INVERSIONES, FLUJO DE CAJA, LABORATORIO TOMA DE CONTROL DE CALIDAD.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

EL CONTRATO CUENTA CON UN PLAZO LIMITADO Y LA INTERVENTORIA REQUIERE QUE EL CONTRATISTA DISPONGA DE LOS RECURSOS NECESARIOS (MAQUINARIA, EQUIPO, PERSONAL, ETC) PARA INICIAR LAS LABORES EN LOS DIFERENTES TRAMOS A INTERVENIR EN EL SIGUIENTE PERIORDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CONFORME A LA PRIORIZACION QUE RESULTÓ DE LOS RECORRIDOS EN CONJUNTO CON LA ADMINISTRACION VIAL, CONTRATISTA, SUPERVISOR INVIAS E INTERVENTORIA.

Firma

Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202-085808 NRÑ

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 5	

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CONTRATO No.** 1218-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2601

CONTRATISTA: INGAP S.A.S. **SECTOR:** MORALES - PIENDAMÓ (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL						

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HAN INICIADO OBRAS EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2	DE 5

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CONTRATO No.** 1218-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2602A

CONTRATISTA: INGAP S.A.S. **SECTOR:** PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORÓ (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL						

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HAN INICIADO OBRAS EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	3	DE 5

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CONTRATO No.** 1218-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 3105

CONTRATISTA: INGAP S.A.S. **SECTOR:** SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL						

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HAN INICIADO OBRAS EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	4 DE 5	

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CONTRATO No.** 1218-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 3702

CONTRATISTA: INGAP S.A.S. **SECTOR:** LOPEZ - TACUEYO - TORIBIO
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL						

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HAN INICIADO OBRAS EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	5 DE 5	

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CONTRATO No.** 1218-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 3702

CONTRATISTA: INGAP S.A.S. **SECTOR:** GUADALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL						

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HAN INICIADO OBRAS EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: oct-2020 **CONTRATO DE OBRA No.** 1218-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2601

CONTRATISTA: INGAP S.A.S. **SECTOR:** MORALES - PIENDAMÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OSCAR MIGUEL MUNOZ	DIRECTOR DE OBRA				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL		X	X	X	X	X	DOMINICAL	X	X	X	X	X	X
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ	RESIDENTE DE OBRA																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
STEFANNY CAROLINA MUÑOZ	RESIDENTE SOCIAL																					X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
EMERSON ANTOY GONZALES	CONDUCTOR																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
HUGO JAVIER SOLIS	RESIDENTE AMBIENTAL																											X	X	X	X	X
GERALDINE FERNANDA CAMARGO	RESIDENTE SST																											X	X	X	X	X
MANUEL ALEJANDRO ARTEAGA	INGENIERO AUXILIAR																												X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HAN INICIADO OBRAS EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: oct-2020 **CONTRATO DE OBRA No.** 1218-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2602A

CONTRATISTA: INGAP S.A.S. **SECTOR:** PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OSCAR MIGUEL MUNOZ	DIRECTOR DE OBRA				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL		X	X	X	X	X	DOMINICAL	X	X	X	X	X	X
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ	RESIDENTE DE OBRA																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
STEFANNY CAROLINA MUÑOZ	RESIDENTE SOCIAL																					X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
EMERSON ANTOY GONZALES	CONDUCTOR																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
HUGO JAVIER SOLIS	RESIDENTE AMBIENTAL																											X	X	X	X	X
GERALDINE FERNANDA CAMARGO	RESIDENTE SST																											X	X	X	X	X
MANUEL ALEJANDRO ARTEAGA	INGENIERO AUXILIAR																												X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HAN INICIADO OBRAS EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, RETIRO= R, INACTIVO= I.**

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: oct-2020 **CONTRATO DE OBRA No.** 1218-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 3105

CONTRATISTA: INGAP S.A.S. **SECTOR:** SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OSCAR MIGUEL MUNOZ	DIRECTOR DE OBRA				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL		X	X	X	X	X	DOMINICAL	X	X	X	X	X	X
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ	RESIDENTE DE OBRA																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
STEFANNY CAROLINA MUÑOZ	RESIDENTE SOCIAL																					X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
EMERSON ANTOY GONZALES	CONDUCTOR																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
HUGO JAVIER SOLIS	RESIDENTE AMBIENTAL																											X	X	X	X	X
GERALDINE FERNANDA CAMARGO	RESIDENTE SST																											X	X	X	X	X
MANUEL ALEJANDRO ARTEAGA	INGENIERO AUXILIAR																												X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HAN INICIADO OBRAS EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: oct-2020 **CONTRATO DE OBRA No.** 1218-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 3702

CONTRATISTA: INGAP S.A.S. **SECTOR:** LOPEZ - TACUEYO - TORIBIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OSCAR MIGUEL MUNOZ	DIRECTOR DE OBRA				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL		X	X	X	X	X	DOMINICAL	X	X	X	X	X	X
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ	RESIDENTE DE OBRA																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
STEFANNY CAROLINA MUÑOZ	RESIDENTE SOCIAL																					X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
EMERSON ANTOY GONZALES	CONDUCTOR																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
HUGO JAVIER SOLIS	RESIDENTE AMBIENTAL																											X	X	X	X	X
GERALDINE FERNANDA CAMARGO	RESIDENTE SST																											X	X	X	X	X
MANUEL ALEJANDRO ARTEAGA	INGENIERO AUXILIAR																												X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HAN INICIADO OBRAS EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	5 DE 5	

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: oct-2020 **CONTRATO DE OBRA No.** 1218-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 3702

CONTRATISTA: INGAP S.A.S. **SECTOR:** GUADALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OSCAR MIGUEL MUNOZ	DIRECTOR DE OBRA				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL		X	X	X	X	X	DOMINICAL	X	X	X	X	X	X
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ	RESIDENTE DE OBRA																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
STEFANNY CAROLINA MUÑOZ	RESIDENTE SOCIAL																					X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
EMERSON ANTOY GONZALES	CONDUCTOR																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
HUGO JAVIER SOLIS	RESIDENTE AMBIENTAL																											X	X	X	X	X
GERALDINE FERNANDA CAMARGO	RESIDENTE SST																											X	X	X	X	X
MANUEL ALEJANDRO ARTEAGA	INGENIERO AUXILIAR																												X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HAN INICIADO OBRAS EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, RETIRO= R, INACTIVO= I.**

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1218-2020 **CONTRATISTA:** INGAP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: oct-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2601, 2602A, 3105 y 3702

SECTOR: PIENDAMO-MORALES, PIENDAMO-SILVIA-TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO, SECTOR LOPEZ-TACUEYO-TORIBIO Y GUADUALEJO-BELALCAZAR-NARANJAL.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	532320 DEL 25-09-2020	C-2401-0600-105-0-2401023-02	20	PROPIOS	1218-2020	216.043.250,00
2020	532320 DEL 25-09-2020	C-2401-0600-138-0-2401023-02	20	PROPIOS	1218-2020	3.825.140.614,00
			TOTAL			4.041.183.864,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.041.183.864,00
VALOR ASIGNADO $ 4.041.183.864,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.532320 De 25-09-2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
			$ -	$ -	$ -	0	$ 1.921.607.314,00	$ 216.043.250,00	$ -	$ 4.041.183.864,00				
														DESEMBOLSO A LA FIDUSIA
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.921.607.314,00	$ -	$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	0,00	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE EL PAGA)			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES, ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL	$ -		$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

OBSERVACIÓN:

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: OSCAR MIGUEL MUÑOZ
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-149479 CAU

Firma
Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202-085808 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		PAGINA	1	DE 5

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1218-2020 **CONTRATISTA:** INGAP S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2601

SECTOR: MORALES - PIENDAMÓ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL		24	24	24	24	24	DOMINICAL	24	24	20	22	20	21	**251**
Lluvias moderadas																				0	0	0	0	0		0	0	1	2	4	1	**8**
Lluvias intensas																				0	0	0	0	0		0	0	3	0	0	2	**5**
Total	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**		**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES: NO SE HAN INICAIDO ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN.

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		PAGINA	2 DE 5	

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1218-2020 **CONTRATISTA:** INGAP S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2602A

SECTOR: PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORÓ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL		24	24	24	24	24	DOMINICAL	24	24	20	22	20	21	**251**
Lluvias moderadas																				0	0	0	0	0		0	0	0	2	2	3	**7**
Lluvias intensas																				0	0	0	0	0		0	0	4	0	2	0	**6**
Total	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**		**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES: NO SE HAN INICAIDO ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN.

Firma

CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma

Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		PAGINA	3 DE 5	

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1218-2020 **CONTRATISTA:** INGAP S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 3105

SECTOR: SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL		24	24	24	24	24	DOMINICAL	24	24	24	24	24	24	**264**
Lluvias moderadas																				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	**0**
Lluvias intensas																				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**		**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES: NO SE HAN INICAIDO ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN.

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		PAGINA	4 DE 5	

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1218-2020 **CONTRATISTA:** INGAP S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 3702

SECTOR: LOPEZ - TACUEYO - TORIBIO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL		24	24	24	24	24	DOMINICAL	24	24	23	22	22	23	**258**
Lluvias moderadas																				0	0	0	0	0		0	0	1	0	1	1	**3**
Lluvias intensas																				0	0	0	0	0		0	0	0	2	1	0	**3**
Total	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**		**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES: NO SE HAN INICAIDO ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN.

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		PAGINA	5	DE	5

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1218-2020 **CONTRATISTA:** INGAP S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 3702

SECTOR: GUADALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco				DOMINICAL							DOMINICAL							DOMINICAL		24	24	24	24	24	DOMINICAL	24	24	22	23	23	24	**260**
Lluvias moderadas																				0	0	0	0	0		0	0	2	1	1	0	**4**
Lluvias intensas																				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**		**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES: NO SE HAN INICAIDO ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE DE INTERVENCIÓN.

Firma
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ
Residente de Obra
Matricula No.: 66202-300635 RIS

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 6 (Día) / 11 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1218-2020

CONTRATISTA: INGAP S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: 2601, 2602A, 3105 y 3702

SECTOR: PIENDAMO-MORALES, PIENDAMO-SILVIA-TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO, SECTOR LOPEZ-TACUEYO-TORIBIO Y GUADUALEJO-BELALCAZAR-NARANJAL.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO SOLICITADOS POR EL CONTRATISTA

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO SOLICITADOS POR LA INTERVENTORÍA

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PRESENTE PERIODO

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

Nombre: OSCAR MIGUEL MUÑOZ
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-149479 CAU

Firma

Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202-085808 NRÑ

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	6 (Dia)	11 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1218-2020 **CONTRATISTA:** INGAP S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2601, 2602A, 3105 y 3702

SECTOR: PIENDAMO-MORALES, PIENDAMO-SILVIA-TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO, SECTOR LOPEZ-TACUEYO-TORIBIO Y GUADUALEJO-BELALCAZAR-NARANJAL.

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	EPS Planilla	EPS No. días cotizados	ARL	Pensiones Planilla	Pensiones No. días cotizados	Caja de Compensación - ICBF Y SENA Planilla	Caja de Compensación - ICBF Y SENA No. días cotizados	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
OSCAR MIGUEL MUNOZ	DIRECTOR DE OBRA	OCTUBRE	12	98.339.261																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12			12		12	INGAP S.A.S	
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ	RESIDENTE DE OBRA	OCTUBRE	12	1.085.661.683																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12			12		12	INGAP S.A.S	
STEFANNY CAROLINA MUÑOZ	RESIDENTE SOCIAL	OCTUBRE	11	1.061.693.007																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		11			11		11	INGAP S.A.S	
EMERSON ANTOY GONZALES	CONDUCTOR	OCTUBRE	12	1.085.660.770																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12			12		12	INGAP S.A.S	
HUGO JAVIER SOLIS	RESIDENTE AMBIENTAL	OCTUBRE	5	10.297.791																											X	X	X	X	X		5			5		5	INGAP S.A.S	
GERALDINE FERNANDA CAMARGO	RESIDENTE SST	OCTUBRE	5	1.061.781.809																											X	X	X	X	X		5			5		5	INGAP S.A.S	
MANUEL ALEJANDRO ARTEAGA	INGENIERO AUXILIAR	OCTUBRE	4	1.085.270.967																												X	X	X	X		4			4		4	INGAP S.A.S	

NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EL SOPORTE DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: OSCAR MIGUEL MUÑOZ
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-149479 CAU

Firma
Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202-085808 NRÑ

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
		VERSION	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA DE ELABORACIÓN: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1 **PERIODO MES:** 20 A 31 DE OCTUBRE DE 2020 **VALOR BÁSICO ACTA:**

CONTRATO DE OBRA No : 1218-2020

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, DEPARTAMENTO DE CAUCA

CONTRATISTA: INGAP S.A.S.

SECTOR: PIENDAMO-MORALES, PIENDAMO-SILVIA-TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO, SECTOR LOPEZ-TACUEYO-TORIBIO Y GUADUALEJO-BELALCAZAR-NARANJAL.

RUTA: 2601, 2602A, 3105 y 3702

TRAMO: PIENDAMO-MORALES, PIENDAMO-SILVIA-TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO, SECTOR LOPEZ-TACUEYO-TORIBIO Y GUADUALEJO-BELALCAZAR-NARANJAL.

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE OCTUBRE 2020

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.041.183.864,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.041.183.864,00

ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR ADICIONALES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ 1.997.049.417,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1258 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1218-2020	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	4.041.183.864,00	4.041.183.864,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	4.041.183.864,00
	-
Total	4.041.183.864,00

ANTICIPOS

Otorgado $	0
Amortizado $	0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1258 DE 2020	HASTA 31 DE DIC. DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 506.446.770	506.446.770,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	2.975.421,0	-	-	-	0,00	$ 20.884.405	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Acumulado:	2.975.421,0	-	-	-	0,00	$ 20.884.405	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00	0,40	0,17	2,00	$ 4.041.183.864,00	$ -	$ 4.041.183.864,00	$ 4.041.183.864,00
Interventor:	0,04	0,40	0,17	2,00	$ 485.562.365,00	$ -	$ 485.562.365,00	$ 485.562.365,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	6
Calzada:	6
Bermas:	0
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	0,1

Observaciones: NO SE TIENEN CARACTERISTICAS HOMOGÉNEAS DE LA VÍA EN RAZÓN A QUE EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL INTERVIENENE VÍAS DE DIFERENTES SECCIONES TRANSVERSALES Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE POSIBLES OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	
IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%)	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O	
IVA DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O	
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	
VALOR TOTAL	0,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1 **PERIODO MES:** 20 A 31 DE OCTUBRE DE 2020 **VALOR BÁSICO ACTA:**

CONTRATO DE OBRA No :	1218-2020	PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020	PLAZO ACUMULADO:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, DEPARTAMENTO DE CAUCA	FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE OCTUBRE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	INGAP S.A.S.	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
SECTOR:	PIENDAMO-MORALES, PIENDAMO-SILVIA-TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO, SECTOR LOPEZ-TACUEYO-TORIBIO Y GUADUALEJO-BELALCAZAR-NARANJAL.	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 4.041.183.864,00	VALOR ADICIONALES:	
RUTA	2601, 2602A, 3105 y 3702	VALOR ACUMULADO:	$ 4.041.183.864,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 1.997.049.417,00
TRAMO:	PIENDAMO-MORALES, PIENDAMO-SILVIA-TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO, SECTOR LOPEZ-TACUEYO-TORIBIO Y GUADUALEJO-BELALCAZAR-NARANJAL.	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1258 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
EXPLANACIONES									$ -	-	$ 6.095	-	$ -	$ -	-	$ 6.095,08	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									$ -	-	$ 685.685	-	$ -	$ -	-	$ 685.685,33	
PAVIMENTO ASFALTICO									$ -	-	$ 1.262.708	-	$ -	$ -	-	$ 1.262.708,12	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO									$ -	-	$ 331.797	-	$ -	$ -	-	$ 331.796,73	
ESTRUCTURAS DE BRENAJE									$ -	-	$ 638.446	-	$ -	$ -	-	$ 638.446,35	
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL									$ -	-	$ 44.197	-	$ -	$ -	-	$ 44.196,87	
TRANSPORTE									$ -	-	$ 6.493	-	$ -	$ -	-	$ 6.492,52	

NOTAS: EN EL PRESENTE MES NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: OSCAR MIGUEL MUÑOZ
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-149479 CAU

Firma
Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202-085808 NRÑ

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1218-2020 **CONTRATISTA:** INGAP S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, DEPARTAMENTO DE CAUCA

FECHA DE INICIO: 20 DE OCTUBRE 2020

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.041.183.864,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.041.183.864,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 100.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 100.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 404.118.386,40	23/9/2019	30/6/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.921.607.314,00	23/9/2019	30/6/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 808.236.772,80	23/9/2019	31/12/2021
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.212.355.159,20	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL
Calidad del Servicio	30%	$ 35.700.000,00	31/12/2020	31/12/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100123315

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **Compañía Mundial de Seguros S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10	$ 351.121.200,00	23/9/2019	31/12/2019
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100021089 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **Compañía Mundial de Seguros S.A.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101194607

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A.

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma

Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202-085808 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	6	11	2020
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1218 **DE** 2020 **CONTRATISTA:** INGAP S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: **MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, DEPARTAMENTO DE CAUCA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 **DE** 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Materiales	$ 452.020.585,00	$ 452.020.585,00			$ 904.041.170,00	47,05%
2	Transporte de Materiales	$ 300.469.932,00	$ 300.469.932,00			$ 600.939.864,00	31,27%
3	Maquinaria y Equipo	$ 280.000.000,00				$ 280.000.000,00	14,57%
4	Mano de Obra	$ 68.313.140,00	$ 68.313.140,00			$ 136.626.280,00	7,11%
5							
6							
TOTAL		**$ 1.100.803.657,00**	**$ 820.803.657,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.921.607.314,00**	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

OBSERVACIONES: La nomina que se pagara con los recursos del anticipo sera exclusivamente para personal contratado para laborar en la obra con contrato No. 1258-2020

(Firma)
Nombre: MARIA YORLENY PALACIO LOPERA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula No.: 05202-087232 ANT

(Firma)
Nombre: OSCAR JAVIER GARZÓN DIAZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula No.: 25202-27254 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MINFRA-MN-IN-6-FR-1 | 1 | 1 DE 1

6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAUCA**

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. **1** (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: **1218 de 2020**

OBJETO: **MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, DEPARTAMENTO DE CAUCA**

CONTRATISTA: **INGAP S.A.S**

LOCALIZACIÓN: **2601, 2602A, 3105, 3702 DEPARTAMENTO DE CAUCA** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1258 de 2020**

INTERVENTOR: **CONSORCIO GEYKA**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020** (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **20/10/2020** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.041.183.864,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.041.183.864,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2020** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Del 20/10 al 31/10/20	2 nov-20	3 dic-20	4	5	6	7	8	9	10
1. VIA 2601 MORALES - PIENDAMÓ, ENTRE EL PR 0+000 Y EL PR 17+0000														
EXPLANACIONES	$ 1.448,200	0,04%	0,00%	% P	0,01%	0,02%	0,02%							
				$ P	$272	$568	$609							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 354.216,630	9,65%	0,00%	% P	0,00%	1,27%	8,38%							
				$ P	$0	$46.633	$307.584							
				$ E	$0	$0	$0	100%						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 443.424,200	12,08%	0,00%	% P	0,00%	1,58%	10,50%							
				$ P	$0	$58.102	$385.323							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 355.796,334	9,69%	0,00%	% P	0,00%	1,46%	8,23%							
				$ P	$0	$53.560	$302.236							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 32.517,900	0,89%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,89%							
				$ P	$0	$0	$32.518	90%						
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
TRANSPORTE	$ 1.542,632	0,04%	0,00%	% P	0,01%	0,02%	0,01%							
				$ P	$353	$753	$437							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
2. VIA 2602A PIENDAMO - SILVIA - TOTORO														
EXPLANACIONES	$ 2.283,700	0,06%	0,00%	% P	0,01%	0,02%	0,03%							
				$ P	$428	$895	$960							
				$ E	$0	$0	$0	80%						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 156.366,370	4,26%	0,00%	% P	0,00%	0,54%	3,72%							
				$ P	$0	$19.744	$136.622							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO	$ 409.337,485	11,15%	0,00%	% P	0,00%	0,89%	10,26%							
				$ P	$0	$32.624	$376.714							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 96.833,320	2,64%	0,00%	% P	0,00%	0,34%	2,30%	70%						
				$ P	$0	$12.546	$84.287							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
				% P	0,00%	0,00%	0,10%							

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 3.507,000	0,10%	0,00%	$ P	$0	$0	$3.507	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTE	$ 2.432,612	0,07%	0,00%	% P	0,01%	0,03%	0,03%	
				$ P	$456	$954	$1.023	
								60%
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
3. VIA 3105 SECTOR SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO PR 0+0000 AL PR 50+0000								
EXPLANACIONES	$ 2.116,600	0,06%	0,00%	% P	0,01%	0,02%	0,02%	
				$ P	$397	$830	$890	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 161.102,210	4,39%	0,00%	% P	0,00%	0,59%	3,30%	
				$ P	$0	$21.749	$139.353	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	50%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 1.114.378,260	30,36%	0,00%	% P	0,00%	3,61%	26,75%	
				$ P	$0	$132.495	$981.883	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 282.137,666	7,69%	0,00%	% P	0,00%	1,20%	6,49%	
				$ P	$0	$43.969	$238.169	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTE	$ 2.254,616	0,06%	0,00%	% P	0,01%	0,02%	0,03%	
				$ P	$423	$884	$948	
								40%
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
4. VIA 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, SECTOR LOPEZ - TACUEYO - TORIBIO PR 85+0000 AL PR 113+0000								
EXPLANACIONES	$ 1.114,000	0,03%	0,00%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	
				$ P	$209	$437	$468	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 63.586,881	1,73%	0,00%	% P	0,00%	0,21%	1,52%	
				$ P	$0	$7.726	$55.861	
				$ E	$0	$0	$0	30%
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 25.918,289	0,71%	0,00%	% P	0,00%	0,09%	0,61%	
				$ P	$0	$3.377	$22.541	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTE	$ 1.186,640	0,03%	0,00%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	
				$ P	$222	$465	$499	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
5. VIA 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL PR0+000 AL PR29+0300								
EXPLANACIONES	$ 557,000	0,02%	0,00%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	20%
				$ P	$104	$218	$234	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 110.657,600	3,01%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	3,01%	
				$ P	$0	$0	$110.658	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 26.965,371	0,73%	0,00%	% P	0,00%	0,03%	0,71%	
				$ P	$0	$926	$26.039	
								10%
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 18.500,760	0,50%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,50%	
				$ P	$0	$0	$18.501	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTE	$ 593,320	0,02%	0,00%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	
				$ P	$111	$233	$249	

TRANSPORTE																				
				$ E	$0	$0	$0													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 3.670.775,596**	100,00%	0,00%																	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 0**	0,00%	-																	

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,081%	11,978%	87,941%																
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.975	$439.688	$3.228.112																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,08%	12,06%	100,00%																
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.975	$442.663	$3.670.776																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,0%	0,00%	0,00%																
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,0	$0,0	$0,0																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%																
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 147.439
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 25.000
IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%)	$ 28.085
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 100.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 19.000
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 50.884
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 370.408
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.041.184**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **MARIA YORLENY PALACIO LOPERA**
Representante legal Ingap S.A.S.
C.C. No. : 43.623.142 de Medellin

Aprueba Firma:
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
Representante legal Consorcio GEYKA
C.C. No.: 79.296.441 de Bogotá

Firma:
Nombre: **LYDA MILENA ESQUIVEL ROA**
Subdirectora de la Red Nacional de Carreteras
Matrícula No.: 01197-0436

Revisó Firma:
Nombre: **JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-16412 CAU

Revisó Firma:
Nombre: **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLÓN**
Director Territorial Cauca
Matrícula No.: 19202-40638 CAU

Firma:
Nombre: **PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.: 25202-088039 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MINFRA-MN-IN-6-FR-1 | 1 | 1 DE 1

6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAUCA**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 (Indicar mes y año) **DE** oct-2020

SEGUIMIENTO No. 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: **1218 de 2020**

OBJETO: **MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, DEPARTAMENTO DE CAUCA**

CONTRATISTA: **INGAP S.A.S**

LOCALIZACIÓN: **2601, 2602A, 3105, 3702 DEPARTAMENTO DE CAUCA**
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1258 de 2020**

INTERVENTOR: **CONSORCIO GEYKA**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **20/10/2020** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2020** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.041.183.864,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.041.183.864,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Del 20/10 al 31/10/20	2 nov-20	3 dic-20	4	5	6	7	8	9	10
1. VIA 2601 MORALES - PIENDAMÓ, ENTRE EL PR 0+000 Y EL PR 17+0000														
EXPLANACIONES	$ 1.448,200	0,04%	0,00%	% P	0,01%	0,02%	0,02%							
				$ P	$272	$568	$609							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 354.216,630	9,65%	0,00%	% P	0,00%	1,27%	8,38%							
				$ P	$0	$46.633	$307.584							
				$ E	$0	$0	$0	100%						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 443.424,200	12,08%	0,00%	% P	0,00%	1,58%	10,50%							
				$ P	$0	$58.102	$385.323							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 355.796,334	9,69%	0,00%	% P	0,00%	1,46%	8,23%							
				$ P	$0	$53.560	$302.236							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 32.517,900	0,89%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,89%							
				$ P	$0	$0	$32.518	90%						
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
TRANSPORTE	$ 1.542,632	0,04%	0,00%	% P	0,01%	0,02%	0,01%							
				$ P	$353	$753	$437							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
2. VIA 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO														
EXPLANACIONES	$ 2.283,700	0,06%	0,00%	% P	0,01%	0,02%	0,03%							
				$ P	$428	$895	$960							
				$ E	$0	$0	$0	80%						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 156.366,370	4,26%	0,00%	% P	0,00%	0,54%	3,72%	-						
				$ P	$0	$19.744	$136.622							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO	$ 409.337,485	11,15%	0,00%	% P	0,00%	0,89%	10,26%							
				$ P	$0	$32.624	$376.714							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 96.833,320	2,64%	0,00%	% P	0,00%	0,34%	2,30%	70%						
				$ P	$0	$12.546	$84.287							
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
				% P	0,00%	0,00%	0,10%							

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 3.507,000	0,10%	0,00%	$ P	$0	$0	$3.507	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTE	$ 2.432,612	0,07%	0,00%	% P	0,01%	0,03%	0,03%	
				$ P	$456	$954	$1.023	
								60%
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
3. VIA 3105 SECTOR SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO PR 0+0000 AL PR 50+0000								
EXPLANACIONES	$ 2.116,600	0,06%	0,00%	% P	0,01%	0,02%	0,02%	
				$ P	$397	$830	$890	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 161.102,210	4,39%	0,00%	% P	0,00%	0,59%	3,30%	
				$ P	$0	$21.749	$139.353	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	50%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 1.114.378,260	30,36%	0,00%	% P	0,00%	3,61%	26,75%	
				$ P	$0	$132.495	$981.883	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 282.137,666	7,69%	0,00%	% P	0,00%	1,20%	6,49%	
				$ P	$0	$43.969	$238.169	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTE	$ 2.254,616	0,06%	0,00%	% P	0,01%	0,02%	0,03%	
				$ P	$423	$884	$948	
								40%
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
4. VIA 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, SECTOR LOPEZ - TACUEYO - TORIBIO PR 85+0000 AL PR 113+0000								
EXPLANACIONES	$ 1.114,000	0,03%	0,00%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	
				$ P	$209	$437	$468	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 63.586,881	1,73%	0,00%	% P	0,00%	0,21%	1,52%	
				$ P	$0	$7.726	$55.861	
				$ E	$0	$0	$0	30%
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 25.918,289	0,71%	0,00%	% P	0,00%	0,09%	0,61%	
				$ P	$0	$3.377	$22.541	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTE	$ 1.186,640	0,03%	0,00%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	
				$ P	$222	$465	$499	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
5. VIA 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL PR0+000 AL PR29+0300								
EXPLANACIONES	$ 557,000	0,02%	0,00%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	20%
				$ P	$104	$218	$234	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 110.657,600	3,01%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	3,01%	
				$ P	$0	$0	$110.658	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 26.965,371	0,73%	0,00%	% P	0,00%	0,03%	0,71%	
				$ P	$0	$926	$26.039	
								10%
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 18.500,760	0,50%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,50%	
				$ P	$0	$0	$18.501	
				$ E	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTE	$ 593,320	0,02%	0,00%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	
				$ P	$111	$233	$249	

TRANSPORTE																				
				$ E	$0	$0	$0													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 3.670.775,596**	100,00%	0,00%																	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 0**	0,00%	-																	

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,081%	11,978%	87,941%																
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.975	$439.688	$3.228.112																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,08%	12,06%	100,00%																
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.975	$442.663	$3.670.776																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,0%	0,00%	0,00%																
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,0	$0,0	$0,0																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%																
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 147.439
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 25.000
IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%)	$ 28.085
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 100.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 19.000
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 50.884
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 370.408
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.041.184**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **MARIA YORLENY PALACIO LOPERA**
Representante legal Ingap S.A.S.
C.C. No. : 43.623.142 de Medellin

Aprueba Firma:
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
Representante legal Consorcio GEYKA
C.C. No.: 79.296.441 de Bogotá

Firma:
Nombre: **LYDA MILENA ESQUIVEL ROA**
Subdirectora de la Red Nacional de Carreteras
Matrícula No.: 01197-0436

Revisó Firma:
Nombre: **JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-16412 CAU

Revisó Firma:
Nombre: **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLÓN**
Director Territorial Cauca
Matrícula No.: 19202-40638 CAU

Firma:
Nombre: **PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.: 25202-088039 CND

Escriba el texto aquí

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	6	11	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: **oct-2020** **CONTRATO No.** **1258 DE 2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2601, 2602A, 3105, 3702

SECTOR: PIENDAMO-MORALES, PIENDAMO-SILVIA-TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO, SECTOR LOPEZ-TACUEYO-TORIBIO Y GUADUALEJO-BELALCAZAR-NARANJAL.

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO GEYKA**

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	PLACAS MHR220 MARCA FOR ECOSPORT CILINDRAJE 2.000CC MODELO 2012																											X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202-085808 NRÑ

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 6 (Día) / 11 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: oct-2020 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1258 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2601, 2602A, 3105, 3702

SECTOR: PIENDAMO-MORALES, PIENDAMO-SILVIA-TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO, SECTOR LOPEZ-TACUEYO-TORIBIO Y GUADUALEJO-BELALCAZAR-NARANJAL.

INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Richard Wilson Yela Caicedo	Ingeniero Director de Interventoría																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Edison Fabian Ramirez Narvaez	Ingeniero Residente de Interventoría																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
John Alejandro Leon Vidal	Ingeniero Auxiliar de Interventoría																											X	X	X	X	X
Luis Adrian Bolaños caicedo	Ingeniero Auxiliar de Interventoría																											X	X	X	X	X
Nayibe Sislena Portilla Caicedo	Profesional Social																								X	X	X	X	X	X	X	X
Lizeth Alejandra Erazo Erazo	Profesional Ambiental																											X	X	X	X	X
Maria Alejandra Caicedo Caicedo	Inspector SST																											X	X	X	X	X
Diana Maria Messa Portilla	Secretaria																											X	X	X	X	X
Franco Norbey Caicedo Santander	Conductor																											X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-199902 CAU

Firma
Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.52202-085808 NRÑ

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1258 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

MES INFORME MENSUAL: oct-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2601, 2602A, 3105, 3702

SECTOR: PIENDAMO-MORALES, PIENDAMO-SILVIA-TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO, SECTOR LOPEZ-TACUEYO-TORIBIO Y GUADUALEJO-BELALCAZAR-NARANJAL.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	551020 DEL 02-10-2020	C-2401-0600-105-0-2401023-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 26.456.750
2020	551020 DEL 02-10-2020	C-2401-0600-138-0-2401023-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 479.990.020
			TOTAL			506.446.770,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 506.446.770**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 551020 DEL 02-10-2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
	ANTICIPO					$ 131.931.512,00	$ 506.446.770,00				
1	oct-2020	$ 17.549.920,00	$ 3.334.485,00	$ 20.884.405,00	$ 5.440.475,00	$ 126.491.037,00	$ 485.562.365,00	$ 20.884.405,00	$ 485.562.365,00		VIGENCIA 2020
TOTALES		**$ 17.549.920**	**$ 3.334.485**	**$ 20.884.405**	**$ 5.440.475**		**$ -**	**$ -**	**$ -**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202-085808 NRÑ

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

Escriba el texto aquí

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	6 (Día)	11 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1258 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 2601, 2602A, 3105, 3702

SECTOR: PIENDAMO-MORALES, PIENDAMO-SILVIA-TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO, SECTOR LOPEZ-TACUEYO-TORIBIO Y GUADUALEJO-BELALCAZAR-NARANJAL.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	Richard Wilson Yela Caicedo	98.340.355	Ingeniero Director de Interventoría	$ 5.850.000	$ 2.164.500	$ 150.649,00	$ 86.580,00	$ 346.320,00	$ 86.580,00		
2	Edison Fabian Ramirez Narvaez	10.308.220	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000	$ 1.480.000	$ 103.008,00	$ 59.200,00	$ 236.800,00	$ 59.200,00		
3	John Alejandro Leon Vidal	1.061.755.871	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.100.000	$ 527.000	$ 36.679,00	$ 21.080,00	$ 84.320,00	$ 21.080,00		
4	Luis Adrian Bolaños caicedo	1.088.971.534	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.100.000	$ 527.000	$ 36.679,00	$ 21.080,00	$ 84.320,00	$ 21.080,00		
5	Nayibe Sislena Portilla Caicedo	27.109.194	Profesional Social	$ 3.100.000	$ 837.000	$ 58.255,00	$ 33.480,00	$ 133.920,00	$ 33.480,00		
5	Lizeth Alejandra Erazo Erazo	1.085.904.369	Profesional Ambiental	$ 3.200.000	$ 544.000	$ 37.862,00	$ 21.760,00	$ 87.040,00	$ 21.760,00		
6	Maria Alejandra Caicedo Caicedo	1.061.758.130	Inspector SST	$ 2.150.000	$ 365.500	$ 25.439,00	$ 14.620,00	$ 58.480,00	$ 14.620,00		
7	Diana Maria Messa Portilla	1.082.656.897	Secretaria	$ 950.000	$ 161.500	$ 11.240,00	$ 6.460,00	$ 25.840,00	$ 6.460,00		
8	Franco Norbey Caicedo Santander	13.093.621	Conductor	$ 900.000	$ 153.000	$ 10.649,00	$ 6.120,00	$ 24.480,00	$ 6.120,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 26.350.000,00**	**$ 6.759.500,00**	**$ 470.460,00**	**$ 270.380,00**	**$ 1.081.520,00**	**$ 270.380,00**		

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202-085808 NRÑ

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL

FECHA DE INICIO: 20/10/2020

PLAZO INICIAL: 31/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 506.446.770,00

VALOR ACUMULADO: $ 506.446.770,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 50.644.678	20	10	2020	30	6	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 253.223.385	20	10	2020	30	6	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 101.289.355	20	10	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30	$ 151.934.032	20	10	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB-100139698**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **Compañía Mundial de Seguros S.A.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad del servicio				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB-100139698**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **Compañía Mundial de Seguros S.A.**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202-085808 NRÑ

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	2

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - NARANJAL

INTERVENTOR CONSORCIO GEYKA

FECHA DE INICIO: 20/10/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2020 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2020 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1218-2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA INGAP S.A.S.

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X N ____ VERSIÓN No. **0** FECHA DE VERSIÓN: **29/09/2020**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X **NO** ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ **NO** ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE REPORTE DE NO CONFORMIDADES

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE REPORTE DE QUEJAS O RECLAMOS

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: RICHARD WILSON YELA CAICEDO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 52202-085808 NRÑ

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	5	10	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de La Red Nacional de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1258 **DE** 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 2601 MORALES PIENDAMO, 2602A PIENDAMO SILVIA TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RIC 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DE PERSONAL	$ 26.747.500	$ 39.097.500	$ 39.097.500	$ 104.942.500	79,54%
2	OTROS COSTOS DIRECTOS Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible), Equipo completo de topografía, Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 6.489.012	$ 10.250.000	$ 10.250.000	$ 26.989.012	20,46%
3						
4						
5						
N						
TOTAL		**$ 33.236.512**	**$ 49.347.500**	**$ 49.347.500**	**$ 131.931.512**	**100%**

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 25202-27254 CND

(Firma)
JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No.: 19202-16412

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO GEYKA

NIT: 9 0 1 266175-0

1258 DE 2020

6 de noviembre de 2020

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 1. 2501A HIGUERONES - MOJARRAS; 2. 25CC02 TIMBÍO - EL HATO - EL TABLÓN ; 3. 2601 PIENDAMÓ- MORALES; 4. 2602A PIENDAMÓ - SILVÍA - TOTORO; 5. 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO

Consecutivo correspondiencia Enviada

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	REMITENTE	ASUNTO	RADICADO		Observaciones
					No.	FECHA	
C-A-126-002-2020	2/10/2020	INVIAS BOGOTA	CONSORCIO GEYKA	Entrega Pólizas del Contrato Interventoría	72074	6/10/2020	
C-A-126-003-2020	6/10/2020	INVIAS BOGOTA	CONSORCIO GEYKA	ENTREGA PÓLIZAS ACTUALIZADAS – CONTRATO INTERVENTORÍA	72074	6/10/2020	
C-A-126-004-2020	6/10/2020	INVIAS BOGOTA	CONSORCIO GEYKA	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – CTO. DE INTERVENTORIA 1258 - 2020	72104	6/10/2020	
C-A-126-005-2020	8/10/2020	INVIAS BOGOTA	CONSORCIO GEYKA	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – CTO. DE INTERVENTORIA 1258 - 2020	73071	8/10/2020	
C-A-126-006-2020	8/10/2020	INVIAS BOGOTA Ing. Pedro José Barón Avila	CONSORCIO GEYKA	REMISIÓN PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA	73235	8/10/2020	
C-A-126-007-2020	8/10/2020	INVIAS BOGOTA Ing. Pedro José Barón Avila	CONSORCIO GEYKA	SOLICITUD ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	73167	8/10/2020	
C-A-126-008-2020	8/10/2020	INVIAS BOGOTA Ing. Pedro José Barón Avila	CONSORCIO GEYKA	ENTREGA HOJAS DE VIDA - PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA	73684	9/10/2020	
C-A-126-009-2020	9/10/2020	INGAP S.A.S Atn: Ing. María Yorleny Palacio Lopera	CONSORCIO GEYKA	DOCUMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA	73684	9/10/2020	
C-A-126-010-2020	13/10/2020	INVIAS BOGOTA Ing. Pedro José Barón Avila	CONSORCIO GEYKA	ENTREGA HOJAS DE VIDA - PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA	74074	13/10/2020	
C-A-126-011-2020	13/10/2020	INGAP S.A.S Atn: Ing. María Yorleny Palacio Lopera	CONSORCIO GEYKA	APROBACIÓN MINUTA ANTICIPO CONTRATO DE OBRA			
C-A-126-012-2020	14/10/2020	INVIAS BOGOTA Ing. Pedro José Barón Avila	CONSORCIO GEYKA	ENTREGA HOJAS DE VIDA - PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA	74548	14/10/2020	
C-A-126-013-2020	10/10/2020	INGAP S.A.S Atn: Ing. María Yorleny Palacio Lopera	CONSORCIO GEYKA	APROBACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATO DE OBRA			
C-A-126-014-2020	22/10/2020	INGAP S.A.S Atn: Ing. María Yorleny Palacio Lopera	CONSORCIO GEYKA	REVISION DE HOJAS DE VIDA			ENVIADO POR CORREO
C-A-126-015-2020	23/10/2020	INVIAS BOGOTA Ing. Pedro José Barón Avila	CONSORCIO GEYKA	Solicitud de Estudios y diseños de Referencia del Proceso de Licitación LPDO-SRN-030-2020	77674	26/10/2020	
C-A-126-016-2020	23/10/2020	INGAP S.A.S Atn: Ing. Oscar Miguel Muñoz	CONSORCIO GEYKA	Estudios y Diseño de Pavimentos – Paso Urbano Municipio de Silvia			
C-A-126-017-2020	26/10/2020	INGAP S.A.S Atn: Ing. Oscar Miguel Muñoz	CONSORCIO GEYKA	Respuesta Comunicado OFCAU006 – Entrega Hojas de Vida			
C-A-126-018-2020	26/10/2020	INGAP S.A.S Atn: Ing. Oscar Miguel Muñoz	CONSORCIO GEYKA	Respuesta Comunicado OFCAU008 – Equipo Mínimo			
C-A-126-019-2020	26/10/2020	INGAP S.A.S Atn: Ing. Oscar Miguel Muñoz	CONSORCIO GEYKA	Respuesta Comunicado OFCAU009 – Certificados de Calidad			ENVIADO POR CORREO
C-A-126-020-2020	29/10/2020	INGAP S.A.S Atn: Ing. Oscar Miguel Muñoz	CONSORCIO GEYKA	Respuesta Comunicado OFCAU010 – Observaciones APU Contractuales			ENVIADO POR CORREO
C-A-126-021-2020	29/10/2020	INGAP S.A.S Atn: Ing. Oscar Miguel Muñoz	CONSORCIO GEYKA	Respuesta Comunicado OFCAU014 – Estado puentes ruta 3105.			ENVIADO POR CORREO

Consecutivo correspondiencia recibida

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	REMITENTE	ASUNTO	RADICADO		Observaciones
					No.	FECHA	
SRN 38506	2/10/2020	CONSORCIO GEYKA	INVIAS Subdireccion Técnica Red Nacional De Carreteras	Contrato 1258 de 2020 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 2601 MORALES PIENDAMO, 2602A PIENDAMO SILVIA TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		N.A.	
SRN 40223	14/10/2020	CONSORCIO GEYKA	INVIAS Subdireccion Técnica Red Nacional De Carreteras	Respuesta a Entrada No. 69929 con Fecha 29/09/2020 garantías contractuales CONTRATO 1218 DE 2020 MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO – BELALCAZAR – NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO – BELALCAZAR – EL PALO. DEPARTAMENTO DEL CAUCA		N.A.	
SRN 40859	16/10/2020	CONSORCIO GEYKA	INVIAS Subdireccion Técnica Red Nacional De Carreteras	Respuesta a Entrada No. 74548 con Fecha 14/10/2020 contrato 1258-2020, "INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 2601 MORALES PIENDAMO, 2602A PIENDAMO SILVIA TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO, 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEJO BELALCAZAR EL PALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA"		N.A.	
SRN 41355	20/10/2020	CONSORCIO GEYKA	INVIAS Subdireccion Técnica Red Nacional De Carreteras	Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 1258 de 2020			

(Firma)

Nombre: OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Representante Legal
Interventoría
Matrícula No.: 25202-27254 CND
