INFORME MENSUAL No. 3

PERIODO: 18/04/2019 AL 17/05/2019

CONTRATO No. 319 DE 2018

REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGÍA, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALÓN COMUNAL LOS MONJES, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTÁ D.C

CLIENTE: ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

VERSIÓN: INF-MEN-3-VA01

BOGOTÁ D.C.

MAYO DE 2019

Control de Cambios					
Versión	**Realizada por**	**Revisada por**	**Aprobada por**	**Fecha**	**Cambios al documento anterior**
VA01	NHO	NFR	NFR	Mayo/2019	Versión Inicial
VA02					
VA03					

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 11
2 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 11
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 11
2.2 LOCALIZACIÓN GENERAL 12
2.3 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA 12
2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 13
2.4.1 Informe de Metodología Topografía: 13
2.4.2 Informe información Existente: 13
2.4.3 Levantamiento Topográfico 13
2.4.4 Levantamiento Arquitectónico 13
2.4.5 Levantamiento Estructural 13
2.4.6 Informe plan de Ensayos de Patología 14
2.4.7 Informe de Geotecnia 14
2.4.8 Diagnostico diseño Eléctrico 14
2.4.9 Diagnostico diseño Arquitectónico 14
3 CONTROL TÉCNICO 14
3.1 Programación y control de actividades de la consultoría 14
3.1.1 Control de calidad: 15
3.1.2 Registro Fotográfico: 15
3.2 CONTROL LEGAL Y FINANCIERO 15
3.2.1 Cuadro control legal y financiero: 15
3.2.2 Certificación de pago de obligaciones laborales: 15
3.2.3 Copia de cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificación de vigencia revisor fiscal: 16
3.3 CONTROL ADMINISTRATIVO 16

3.3.1 Actas de comités técnicos: 16

3.3.2 Correspondencia enviada y recibida: 16

3.3.3 Lista de personal de Consultoría y planillas de pago de parafiscales: 22

4 Anexos. 23

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Localización General _____ *12*
Ilustración 2 Localización Especifica Calle 56 # 85I-15(Fuente: Google Maps) _____ *12*

Lista de tablas

Tabla 1. Datos del Contrato ____ *11*
Tabla 2. Control de actividades de programación ____ *15*
Tabla 3. Control de documentos legales ____ *15*
Tabla 4. Control Financiero ____ *15*
Tabla 5. Relación de actas de comités ____ *16*
Tabla 6. Correspondencia recibida ____ *18*
Tabla 7. Correspondencia enviada ____ *22*
Tabla 8. Personal aprobado Consultoría ____ *22*

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual se realiza como parte del Contrato N° 319 de 2018 que tiene por objeto REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGIA, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALON COMUNAL LOS MONJES EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C, localizado en la Calle 56 # 85I – 15.

2 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presentan los datos generales del contrato

NUMERO DE CONTRATO	319
CONTRATISTA	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	900.171.000-8
PROYECTO	625-SALON COMUNAL LOS MONJES-ALE
VALOR	$127.109.677
PLAZO	6 Meses
FECHA ACTA DE INICIO	18/02/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	17/08/2019
OBJETO	Realizar el estudio de patología, análisis de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural del salón comunal los monjes en la localidad de Engativá, Bogotá D.C

Tabla 1. Datos del Contrato

2.2 LOCALIZACIÓN GENERAL

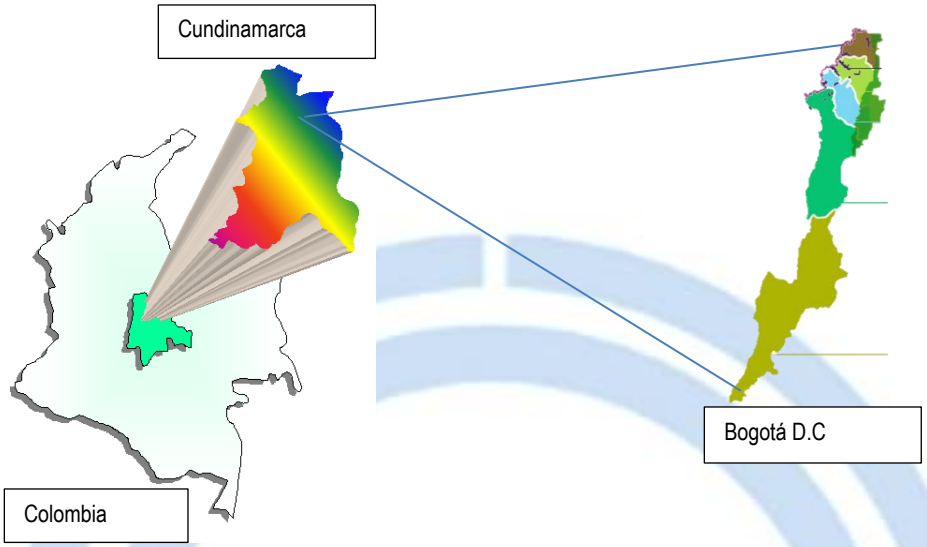


Ilustración 1 Localización General

2.3 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

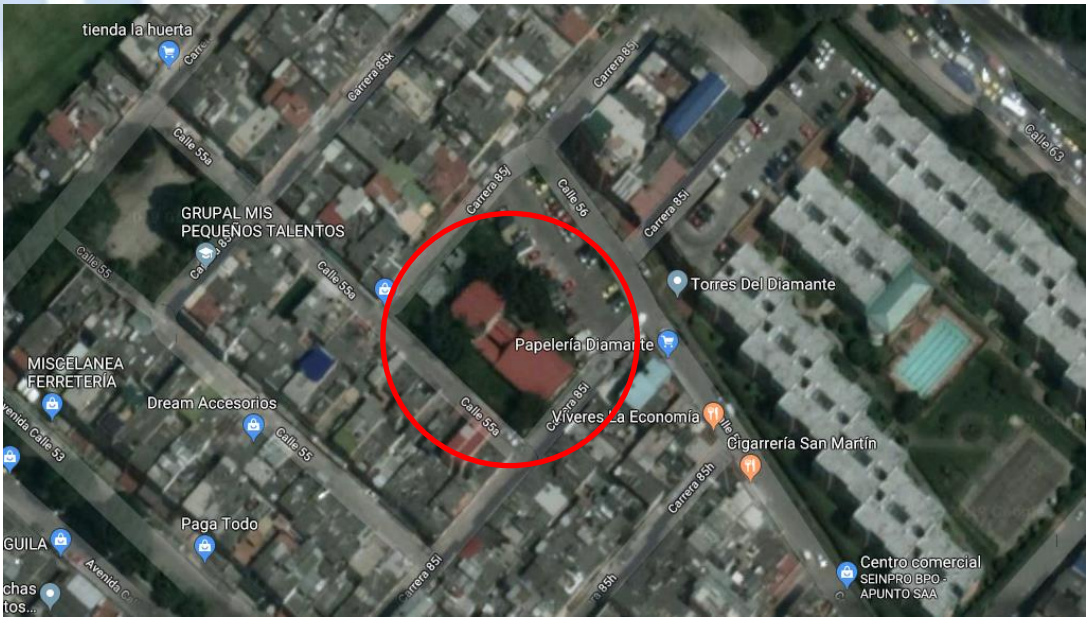


Ilustración 2 Localización Especifica Calle 56 # 85I-15(Fuente: Google Maps)

2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES

Las actividades descritas a continuación corresponden a las contenidas en la programación de actividades aprobada de la consultoría y actividades complementarias no incluidas en la programación.

2.4.1 Informe de Metodología Topografía:

Se envía informe de metodología de topografía, donde se especifica el procedimiento para el desarrolla del levantamiento, este informe se envió vía correo electrónico a la interventoría para su respectiva revisión y/o aprobación.

2.4.2 Informe información Existente:

Se recolecta y analiza la información existente obtenida (planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, memorias de cálculo, estudio de suelos y licencia de construcción), se realiza un informe con el fin de relacionar la información encontrada, este informe se envió vía correo electrónico a la interventoría para su respectiva revisión y/o aprobación.

2.4.3 Levantamiento Topográfico

Se desarrolla el informe de topografía y el plano de levantamiento topográfico, se hace entrega a la interventoría vía correo electrónico para la respectiva revisión y/o aprobación del mismo.

2.4.4 Levantamiento Arquitectónico

Se realizó el levantamiento de la geometría de la arquitectura existente mediante el uso de cinta, flexómetro y medidores laser. Una vez tomadas las medidas en campo se ejecutó y finalizo la elaboración de los planos de levantamiento arquitectónico, los cuales se enviaron mediante correo electrónico a la interventoría para su respectiva revisión y/o aprobación.

2.4.5 Levantamiento Estructural

Se realizó el levantamiento de la geometría de la estructura existente mediante el uso de cinta, flexómetro y medidor laser. Una vez tomadas las medidas en campo se ejecutó y finalizo la elaboración de los planos de levantamiento estructural, los cuales se enviaron mediante correo electrónico a la interventoría para su respectiva revisión y/o aprobación.

Informe Plan de ensayos

2.4.6 Informe plan de Ensayos de Patología

Se envía informe de patología con la descripción de los ensayos destructivos y no destructivos sobre los elementos de concreto y acero que conforman las columnas, vigas y placas de la estructura actual de la edificación y su posterior reparación.

2.4.7 Informe de Geotecnia

Se realiza el estudio geotécnico preliminar donde se presentan los resultados del análisis de suelos y cimentaciones para el estudio de vulnerabilidad sísmica.

2.4.8 Diagnostico diseño Eléctrico

Se presenta el informe diagnóstico del diseño eléctrico existente, en el cual se revisa el cumplimiento de las normatividades vigentes.

2.4.9 Diagnostico diseño Arquitectónico

Se presenta el informe diagnóstico del diseño arquitectónico existente, en el cual se revisa el cumplimiento de las normatividades vigentes.

2.4.10 Diagnostico diseño Hidrosanitario

Se presenta el informe diagnóstico del diseño hidrosanitario existente, en el cual se revisa el cumplimiento de las normatividades vigentes.

3 CONTROL TÉCNICO

3.1 Programación y control de actividades de la consultoría

A continuación, se presenta el control de programación de las actividades programadas para el periodo del informe.

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
01	Recopilación de información existente	100%	100%
02	Levantamiento Arquitectónico	100%	100%

03	Levantamiento Estructural	100%	100%
04	Levantamiento Topográfico	100%	100%
05	Estudio patológico	100%	100%
05	Estudio Geotécnico	70%	70%

Tabla 2. Control de actividades de programación

3.1.1 Control de calidad:

Se ha cumplido con las métricas de calidad establecidas en el plan de calidad.

3.1.2 Registro Fotográfico:

Se realizó registro fotográfico durante las actividades desarrolladas en campo. Se encuentran en el ANEXO No. 1

3.2 CONTROL LEGAL Y FINANCIERO

3.2.1 Cuadro control legal y financiero:

CUADRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS LEGALES	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**FECHA DEL DOCUMENTO**
Contrato 319	2018
Acta de inicio	18 de Febrero de 2019

Tabla 3. Control de documentos legales

CUADRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS LEGALES	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**FECHA DEL DOCUMENTO**
Valor total del contrato	$ 127.109.677
Valor facturado por la Consultoría	$ 0
Valor por pagar a la Consultoría	$ 0

Tabla 4. Control Financiero

3.2.2 Certificación de pago de obligaciones laborales:

Se presenta al presente informe en el ANEXO No. 2

3.2.3 Copia de cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificación de vigencia revisor fiscal:

Se presenta ANEXO No.3 al presente informe.

3.3 CONTROL ADMINISTRATIVO

3.3.1 Actas de comités técnicos:

COMITE	FECHA	HORA	LUGAR	OBJETIVO
No. 01	19/02/2019	11:00 am	Alcaldía Local de Engativá - Infraestructura	Comité de Seguimiento
No. 02	21-02-2019	04:00 pm	Salón Comunal Los Monjes	Visita de Campo
No. 03	06-03-2019	04:00 pm	Alcaldía Local de Engativá - Infraestructura	Comité de Seguimiento
No. 04	18-03-2019	03:00 pm	Alcaldía Local de Engativá - Infraestructura	Comité de Seguimiento
No. 05	08-04-2019	08:30 am	Alcaldía Local de Engativá - Infraestructura	Comité de Seguimiento
No. 06	03-05-2019	04:00 am	Alcaldía Local de Engativá - Infraestructura	Comité de Seguimiento

Tabla 5. Relación de actas de comités

3.3.2 Correspondencia enviada y recibida:

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por correo electrónico:

ITEM	FECHA	ASUNTO	REMITENTE
No. 01	22-02-2019	ODF-ENG-005-19 Aprobación hojas de vida personal de consultoría.	Patricia Molina Fonseca
No. 02	26-02-2019	ODF-ENG-006-19 Visto bueno a la actualización de la póliza	Patricia Molina Fonseca

No. 03	26-02-2019	ODF-ENG-007-19 Extensivo al OFC-005-19	Patricia Molina Fonseca
No. 04	26-02-2019	ODF-ENG-008-19 Extensivo al OFC-006-19	Patricia Molina Fonseca
No. 05	27-02-2019	ODF-ENG-011-19 Apertura correo oficial de consultoría para comunicaciones y manejo exclusivo de la alcaldía local de Engativá.	Patricia Molina Fonseca
No. 06	04-03-2019	ODF-ENG-011-19 Apertura correo oficial de consultoría para comunicaciones y manejo exclusivo de la alcaldía local de Engativá.	Patricia Molina Fonseca
No. 07	04-03-2019	ODF-ENG-012-19 Aclaración fecha, hora y lugar para la realización de los comités y orden del día para el comité No.2	Patricia Molina Fonseca
No. 08	11-03-2019	ODF-ENG-014-19 Solicitud de asistencia a comité extraordinario	Patricia Molina Fonseca
No. 09	15-03-2019	ODF-ENG-015-19 Contestación al oficio PY625-OF10-2019 de fecha 12 de marzo de 2019, acorde a lo tratado con el arquitecto Gerhardo Acevedo Caballero, vía celular el día de hoy y recomendaciones finales.	Patricia Molina Fonseca
No. 10	29-03-2019	ODF-ENG-018-19 Revisión y aprobación del informe de metodología de topografía enviado vía correo electrónico	Patricia Molina Fonseca
No. 11	01-04-2019	ODF-ENG-019-19 Revisión y aprobación del plan de exploración y ensayos de estudio geotécnico para el	Patricia Molina Fonseca

		estudio de patología, análisis de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural para el salón comunal los monjes, enviado vía correo electrónico	
No. 12	04-04-2019	ODF-ENG-020-19 Cambio de horario del comité de seguimiento No.4 del día 05/04/2019	Patricia Molina Fonseca
No. 13	06-04-2019	ODF-ENG-021-19 Aclaración fecha, hora y lugar para la realización y orden del día para el comité No. 04-2019	Patricia Molina Fonseca
No. 14	08-04-2019	Acta de comité No. 4, Asistencia 08 de abril de 2019	José David Hidalgo Amezquita
No. 15	15-04-2019	Rotulo para planos – Papelería	José David Hidalgo Amezquita
No. 16	22-04-2019	Observaciones a los levantamientos	José David Hidalgo Amezquita
No. 17	22-04-2019	Observaciones levantamiento e informe topográfico	José David Hidalgo Amezquita
No. 18	22-04-2019	Observaciones al plan de ensayos de estudio patológico	José David Hidalgo Amezquita
No. 19	23-04-2019	Comité de seguimiento No. 5-2019 (OF-ENG-024-19)	José David Hidalgo Amezquita
No. 20	25-04-2019	Observaciones diagnostico preliminar diseños	José David Hidalgo Amezquita
No. 21	29-04-2019	Modificación fecha del comité No. 05-2019 (OFC-028-19)	José David Hidalgo Amezquita
No. 22	02-05-2019	Observaciones diagnostico eléctrico	José David Hidalgo Amezquita
No. 23	06-05-2019	Acta de comité No 05-2019-03 de mayo de 2019	José David Hidalgo Amezquita
No. 24	08-05-2019	Observaciones al informe preliminar de patología	José David Hidalgo Amezquita

Tabla 6. Correspondencia recibida

A continuación, se presenta la correspondencia enviada:

ITEM	FECHA	ASUNTO	REMITENTE
No. 01	19-02-2019	PY625-OF01-2019 Entrega de Cronograma	Nelson Fernando Rodríguez
No. 02	21/02/2019	Correo electrónico - Aclaración programación de pagos	Nathaly Herrera Ocampo
No. 03	22-02-2019	PY625-OF02-2019 Entrega documentos personal de consultoría	Nelson Fernando Rodríguez
No. 04	25-02-2019	PY625-OF03-2019 Entrega póliza de cumplimiento	Nelson Fernando Rodríguez
No. 05	25/02/2019	Correo electrónico - Informe Semanal No.1	Nathaly Herrera Ocampo
No. 06	26-02-2019	PY625-OF04-2019 Poder archivo central de planeación	Nelson Fernando Rodríguez
No. 07	26-02-2019	PY625-OF05-2019 Entrega Cronograma, Informe semanal No.1	Nelson Fernando Rodríguez
No. 08	04/03/2019	Correo electrónico - Cambio de hora reunión de seguimiento	Nathaly Herrera Ocampo
No. 09	04/03/2019	Correo electrónico - Informe Semanal No.2	Nathaly Herrera Ocampo
No. 10	04/03/2019	Correo electrónico - Cronograma	Nathaly Herrera Ocampo
No. 11	06-03-2019	PY625-OF06-2019 Solicitud copia de planos y documentos - IDPAC	Nelson Fernando Rodríguez
No. 12	08/03/2019	Correo electrónico – cronograma, informe mensual No. 3	Nathaly Herrera Ocampo
No. 13	08-03-2019	PY625-OF07-2019 Entrega cronograma actualizado	Nelson Fernando Rodríguez
No. 14	08-03-2019	PY625-OF08-2019 Entrega informe semanal No.3	Nelson Fernando Rodríguez

No. 15	11-03-2019	PY625-OF09-2019 Entrega cronograma actualizado	Nelson Fernando Rodríguez
No. 16	11/03/2019	Correo electrónico – Solicitud copia planos IDPAC	Nathaly Herrera Ocampo
No. 17	13-03-2019	PY625-OF10-2019 Solicitud de suspensión del contrato	Nelson Fernando Rodríguez
No. 18	13/03/2019	Correo electrónico – PY625-OF10-2019 Solicitud de suspensión del contrato	Nathaly Herrera Ocampo
No. 19	13/03/2019	Correo electrónico – Contrato	Nathaly Herrera Ocampo
No. 20	15-03-2019	PY625-OF11-2019 Solicitud permiso de ingreso	Nelson Fernando Rodríguez
No. 21	15-03-2019	Correo electrónico – PY625-OF11-2019 Solicitud permiso de ingreso	Nathaly Herrera Ocampo
No. 22	18-03-2019	PY625-OF12-2019 Informe Semanal No.4	Nathaly Herrera Ocampo
No. 23	18-03-2019	Informe Mensual	Nelson Fernando Rodríguez
No. 24	26-03-2019	PY625-OF14-2019 Informe Semanal No. 5	Nelson Fernando Rodríguez
No. 25	29-03-2019	PY625-OF17-2019 Informe Semanal No. 6	Nelson Fernando Rodríguez
No. 26	05-04-2019	PY625-OF17-2019-Informe Semanal No. 7	Nelson Fernando Rodríguez
No. 27	08-04-2019	Copia Informe Mensual No.1	Nelson Fernando Rodríguez
No. 29	11-04-2019	Correo electrónico – Modelo rotulo los monjes	Nelson Fernando Rodríguez
No. 30	15-04-2019	PY625-OF19-209-Informe semanal No. 8	Nathaly Herrera Ocampo
No. 31	15-04-2019	Correo electrónico- Estudio de suelos preliminar	Nathaly Herrera Ocampo
No. 32	15-04-2019	Correo electrónico-Informe de diagnóstico eléctrico	Nathaly Herrera Ocampo
No. 33	16-04-2019	Correo electrónico-Informe de topografía y Levantamiento Topográfico	Nathaly Herrera Ocampo

No. 34	16-04-2019	Correo electrónico- Diagnostico diseño existente arquitectónico	Nathaly Herrera Ocampo
No. 35	16-04-2019	Correo electrónico- Levantamiento arquitectónico y estructural	Nathaly Herrera Ocampo
No. 36	22-04-2019	PY625-OF20-2019 Entrega informe semanal No.9	Nelson Fernando Rodríguez
No. 37	23-04-2019	PY625-OF21-2019 Informe mensual No.2	Nelson Fernando Rodríguez
No. 38	26-04-2019	PY625-OF22-2019 Entrega informe semanal No. 10	Nelson Fernando Rodríguez
No. 39	26-04-2019	PY625-OF22-2019 Entrega informe semanal No. 10	Nelson Fernando Rodríguez
No. 40	03-05-2019	PY625-OF23-2019 Entrega informe semanal No. 11	Nelson Fernando Rodríguez
No. 41	08-05-2019	PY625-OF24-2019 Entrega informe preliminar de patología	Nelson Fernando Rodríguez
No. 42	08-05-2019	625-VULN Y REF SALON COMUNAL LOS MONJES-PRODUCTOS PARA EL PRIMER PAGO (Correo electrónico)	Nathaly Herrera Ocampo
No. 43	10-05-2019	PY625-OF25-2019 Entrega documentos para el primer pago del 30%	Nelson Fernando Rodríguez
No. 44	10-05-2019	PY625-OF26-2019 Entrega componente topografía	Nelson Fernando Rodríguez
No. 45	10-05-2019	PY625-OF27-2019 Respuesta a observaciones	Juan Jacobo Pinilla Rodríguez
No. 46	10-05-2019	PY625-OF28-2019 Entrega componente estudio de suelos	Nelson Fernando Rodríguez
No. 47	10-05-2019	PY625-OF29-2019 Entrega componente información existente	Nelson Fernando Rodríguez

No. 48	10-05-2019	PY625-OF30-2019 Entrega componente patología estructural	Juan Jacobo Pinilla Rodríguez
No. 49	10-05-2019	625-VULN Y REF SALON COMUNAL LOS MONJES-RESP OBS INF DE PATOLOGIA (Correo electrónico)	Nathaly Herrera Ocampo
No. 50	13-05-2019	PY625-OF31-2019 Entrega informe semanal No. 12	Nelson Fernando Rodríguez

Tabla 7. Correspondencia enviada

3.3.3 Lista de personal de Consultoría y planillas de pago de parafiscales:

Se presenta listado del personal al presente informe.

No	CEDULA	APELLIDO	NOMBRE	CARGO
1	14139624	Rodríguez Vásquez	Nelson Fernando	Director del Proyecto
2		Ortiz Fuentes	Fernando	Especialista en estructuras
3	80074961	Pinilla Rodríguez	Juan Jacobo	Especialista en Patología de la Construcción
4	79939049	Bonilla Álvarez	John Jairo	Arquitecto
5	17422959	García Melo	Weimar	Especialista en Geotecnia
6	80548477	Rey Velasco	Carlos Arturo	Especialista Hidrosanitario
7	1032435605	Ocampo	Gustavo Alberto	Especialista en redes eléctricas
8	14139624	Rodríguez Vásquez	Nelson Fernando	Ingeniero civil (costos, presupuestos y programación)
9	1019012971	Pacheco Rincón	Johana Paola	Residente Social
10	79889006	Ramírez Farfán	Miguel Ángel	Topógrafo Inspector

Tabla 8. Personal aprobado Consultoría

4 Anexos.

Anexo 1 Registro Fotográfico 24
Anexo 2 Certificación de pago de Obligaciones Laborales 25
Anexo 3 Copia de cedula, tarjeta profesional y certificación de vigencia revisor fiscal 26

Anexo 1 Registro Fotográfico


Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.	CONTRATO: N° 319 DE 2018 cuyo objeto es REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGIA, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALON COMUNAL LOS MONJES, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C	ID.	PY-625-REG_FOT
		VERSIÓN:	VA01
		DEPTO:	PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO	625-VULN Y REF SALON COMUNAL LOS MONJES		**FECHA:**		
DIRECTOR:	I.C. Nelson Fernando Rodriguez	**COORDINADOR:**			
INFORME:	INFORME MENSUAL No.3	**VERSIÓN:**	**VA01**	**PÁGINAS:**	**1 DE 8**

ID.	**20190404_83636**	**Titulo:**	ENSAYOS



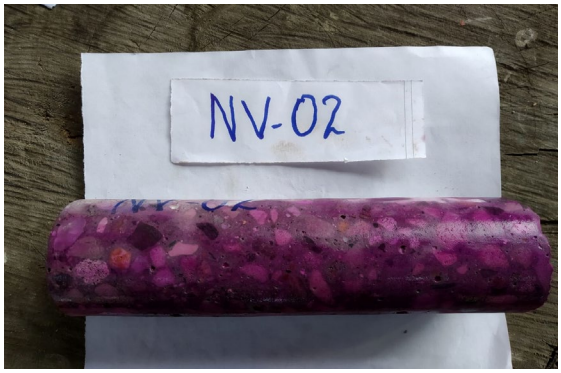

Descripción:	Proceso toma de muestras plan de Ensayos	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	27/04/2019
		Tomada por:	NHO

ID.	**20190404_83637**	**Titulo:**	LEVANTAMIENTOS





Descripción:	Proceso toma de muestras plan de Ensayos	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	27/04/2019
		Tomada por:	NHO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.	CONTRATO: N° 319 DE 2018 cuyo objeto es REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGIA, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALON COMUNAL LOS MONJES, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C	ID.	PY-625-REG_FOT
		VERSIÓN:	VA01
		DEPTO:	PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO	625-VULN Y REF SALON COMUNAL LOS MONJES		**FECHA:**		
DIRECTOR:	I.C. Nelson Fernando Rodriguez	**COORDINADOR:**			
INFORME:	INFORME MENSUAL No.3	**VERSIÓN:**	**VA01**	**PÁGINAS:**	**2 DE 8**


ID.	**20190404_83636**	**Titulo:**	ENSAYOS





Descripción:	Proceso toma de muestras plan de Ensayos	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	27/04/2019
		Tomada por:	NHO

ID.	**20190404_83637**	**Titulo:**	LEVANTAMIENTOS

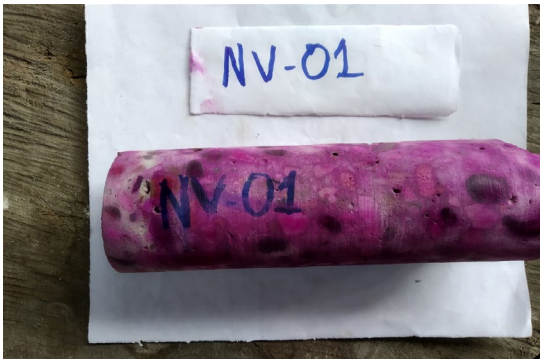



Descripción:	Proceso toma de muestras plan de Ensayos	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	27/04/2019
		Tomada por:	NHO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.	CONTRATO: N° 319 DE 2018 cuyo objeto es REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGIA, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALON COMUNAL LOS MONJES, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C	ID.	PY-625-REG_FOT
		VERSIÓN:	VA01
		DEPTO:	PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO	625-VULN Y REF SALON COMUNAL LOS MONJES		**FECHA:**		
DIRECTOR:	I.C. Nelson Fernando Rodriguez	**COORDINADOR:**			
INFORME:	INFORME MENSUAL No.3	**VERSIÓN:**	**VA01**	**PÁGINAS:**	**3 DE 8**

ID.	**20190404_83636**	**Titulo:**	ENSAYOS





Descripción:	Proceso toma de muestras plan de Ensayos	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	27/04/2019
		Tomada por:	NHO

ID.	**20190404_83637**	**Titulo:**	LEVANTAMIENTOS





Descripción:	Proceso toma de muestras plan de Ensayos	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	27/04/2019
		Tomada por:	NHO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.	CONTRATO: N° 319 DE 2018 cuyo objeto es REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGIA, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALON COMUNAL LOS MONJES, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C	ID.	PY-625-REG_FOT
		VERSIÓN:	VA01
		DEPTO:	PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO	625-VULN Y REF SALON COMUNAL LOS MONJES		**FECHA:**		
DIRECTOR:	I.C. Nelson Fernando Rodriguez	**COORDINADOR:**			
INFORME:	INFORME MENSUAL No.3	**VERSIÓN:**	**VA01**	**PÁGINAS:**	**4 DE 8**

ID.	**20190404_83636**	**Titulo:**	ENSAYOS





Descripción:	Reparaciones ensayos realizados por la consultoria	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	17/05/2019
		Tomada por:	NHO

ID.	**20190404_83637**	**Titulo:**	LEVANTAMIENTOS





Descripción:	Reparaciones ensayos realizados por la consultoria	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	17/05/2019
		Tomada por:	NHO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.	CONTRATO: N° 319 DE 2018 cuyo objeto es REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGIA, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALON COMUNAL LOS MONJES, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C	ID.	PY-625-REG_FOT
		VERSIÓN:	VA01
		DEPTO:	PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO	625-VULN Y REF SALON COMUNAL LOS MONJES		**FECHA:**		
DIRECTOR:	I.C. Nelson Fernando Rodriguez	**COORDINADOR:**			
INFORME:	INFORME MENSUAL No.3	**VERSIÓN:**	**VA01**	**PÁGINAS:**	**5 DE 8**

ID.	**20190404_83636**	**Titulo:**	ENSAYOS





Descripción:	Reparaciones ensayos realizados por la consultoria	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	17/05/2019
		Tomada por:	NHO

ID.	**20190404_83637**	**Titulo:**	LEVANTAMIENTOS





Descripción:	Reparaciones ensayos realizados por la consultoria	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	17/05/2019
		Tomada por:	NHO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.	CONTRATO: N° 319 DE 2018 cuyo objeto es REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGIA, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALON COMUNAL LOS MONJES, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C	ID.	PY-625-REG_FOT
		VERSIÓN:	VA01
		DEPTO:	PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO	625-VULN Y REF SALON COMUNAL LOS MONJES		**FECHA:**		
DIRECTOR:	I.C. Nelson Fernando Rodriguez	**COORDINADOR:**			
INFORME:	INFORME MENSUAL No.3	**VERSIÓN:**	**VA01**	**PÁGINAS:**	**6 DE 8**

ID.	**20190404_83636**	**Titulo:**	ENSAYOS





Descripción:	Reparaciones ensayos realizados por la consultoria	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	17/05/2019
		Tomada por:	NHO

ID.	**20190404_83637**	**Titulo:**	LEVANTAMIENTOS





Descripción:	Reparaciones ensayos realizados por la consultoria	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	17/05/2019
		Tomada por:	NHO


COMENTARIOS U OBSERVACIONES.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.	CONTRATO: N° 319 DE 2018 cuyo objeto es REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGIA, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALON COMUNAL LOS MONJES, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C	ID.	PY-625-REG_FOT
		VERSIÓN:	VA01
		DEPTO:	PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO


PROYECTO	625-VULN Y REF SALON COMUNAL LOS MONJES		**FECHA:**		
DIRECTOR:	I.C. Nelson Fernando Rodriguez	**COORDINADOR:**			
INFORME:	INFORME MENSUAL No.3	**VERSIÓN:**	**VA01**	**PÁGINAS:**	**7 DE 8**

ID.	**20190404_83636**	**Titulo:**	ENSAYOS

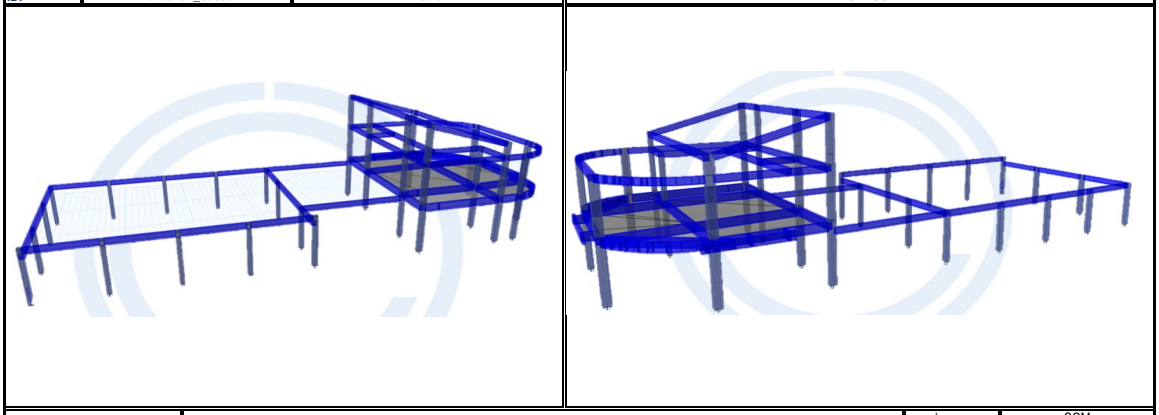

Descripción:	Reparaciones ensayos realizados por la consultoria	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	17/05/2019
		Tomada por:	NHO

ID.	**20190404_83637**	**Titulo:**	LEVANTAMIENTOS

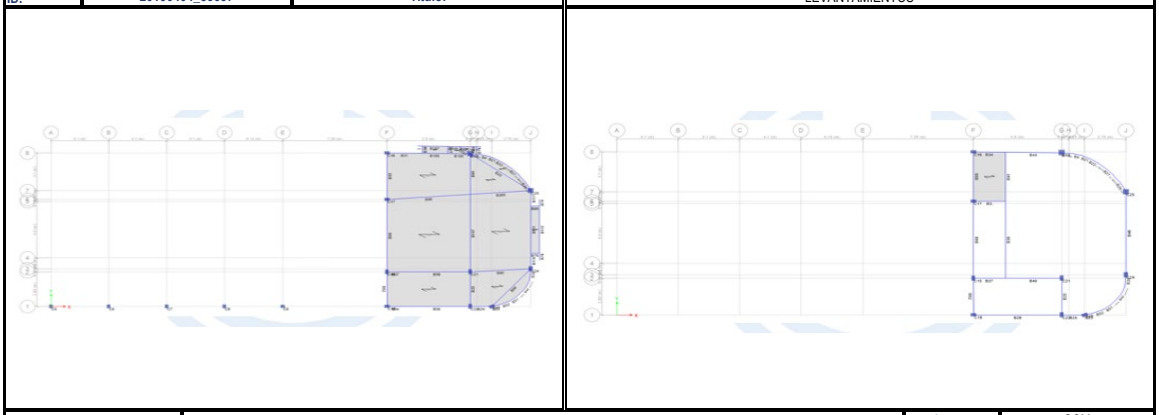

Descripción:	Reparaciones ensayos realizados por la consultoria	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	17/05/2019
		Tomada por:	NHO


COMENTARIOS U OBSERVACIONES.


Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.	CONTRATO: N° 319 DE 2018 cuyo objeto es REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGIA, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALON COMUNAL LOS MONJES, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C	ID.	PY-625-REG_FOT
		VERSIÓN:	VA01
		DEPTO:	PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO	625-VULN Y REF SALON COMUNAL LOS MONJES		**FECHA:**		
DIRECTOR:	I.C. Nelson Fernando Rodriguez	**COORDINADOR:**			
INFORME:	INFORME MENSUAL No.3	**VERSIÓN:**	**VA01**	**PÁGINAS:**	**8 DE 8**

ID.	**20190404_83636**	**Titulo:**	ENSAYOS

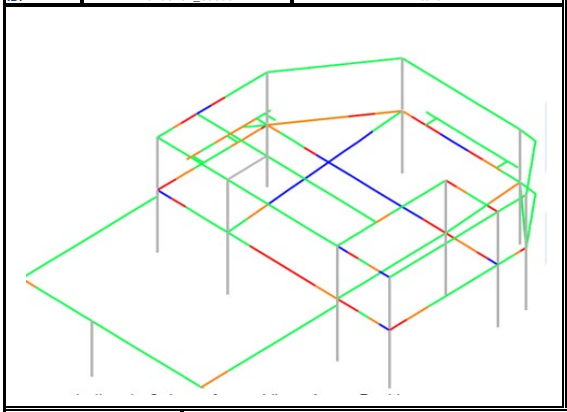

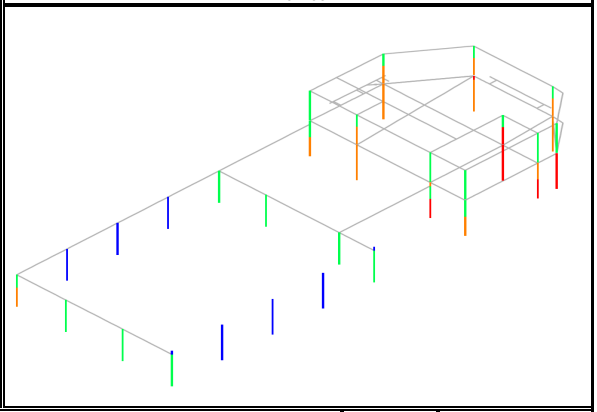

Descripción:	Reparaciones ensayos realizados por la consultoria	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	17/05/2019
		Tomada por:	NHO

ID.	**20190404_83637**	**Titulo:**	LEVANTAMIENTOS

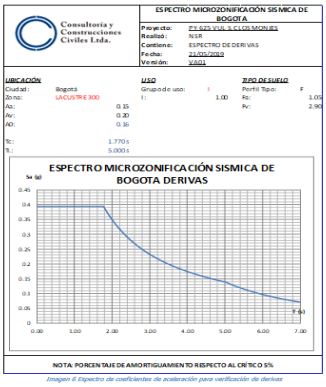


Imagen 6 Espectro de coeficientes de aceleración para verificación de derivas



Imagen 7 Espectro de coeficientes de aceleración para diseño

Descripción:	Reparaciones ensayos realizados por la consultoria	Lugar:	SCM
		Fecha de toma:	17/05/2019
		Tomada por:	NHO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES.

Anexo 2 Certificación de pago de Obligaciones Laborales

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES


REFERENCIA: CONTRATO NO 319 DE 2018 CON OBJETO: "REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGÍA, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALÓN COMUNAL LOS MONJES, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTÁ D.C.".

Yo, **LAURA STHEPHANY VANEGAS MOLINA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.121.885.491 de Villavicencio., en mi condición de Revisor fiscal de la empresa **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA.** Identificada con Nit 900.171.000-8 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa se encuentra al día con el pago de los aportes parafiscales y obligaciones laborales de sus empleados, correspondientes a los sistemas de seguridad social integral de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, legalmente exigibles conforme al cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

A si mismo se han pagado los honorarios a los profesionales derivados del desarrollo del proyecto.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados. Decreto 862 de 2013. Artículo 8.	Si (X)	No ()

Dada en Bogotá, D.C. a los 16 días del mes de mayo de 2019



LAURA STHEPHANY VANEGAS MOLINA
C.C. 1.121.885.491 de Villavicencio.
Revisor Fiscal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900171000	8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 93b N. 17-42 Ofi: 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9261776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	442316496	8491791162	E	2019/05/03	2019/05/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,782,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79280108	HERNANDEZ VARGAS OSCAR EDUARDO																		230201	30	$828,116	$215,400	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	Si	$286,200
2	CC	1031146232	HERRERA OCAMPO NATHALI																		25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
3	CC	1030564918	TORRES GONZALEZ ANDRES LEONARDO																		25-14	25	$3,166,667	$538,500	EPS002	25	$3,166,667	$126,700	CCF21	25	$3,166,667	$126,700	14-23	25	$3,166,667	$16,600	25	$0	$0	Si	$808,500
4	CC	1030564918	TORRES GONZALEZ ANDRES LEONARDO													X					25-14	5	$633,334	$107,800	EPS002	5	$633,334	$25,400	CCF21	5	$633,334	$25,400	14-23	5	$633,334	$0	5	$0	$0	Si	$158,600
5	CC	1018420890	TRIANA HERNANDEZ MARTHA JOHANA		X																230901	3	$333,585	$53,400	EPS008	3	$333,585	$13,400	CCF21	3	$333,585	$13,400	14-23	3	$333,585	$1,800	3	$0	$0	Si	$82,000
6	CC	1018420890	TRIANA HERNANDEZ MARTHA JOHANA											X							230901	2	$148,260	$23,800	EPS008	2	$148,260	$6,000	CCF21	0	$0	$0	14-23	2	$148,260	$0	0	$0	$0	Si	$29,800
Total	**Afiliados(4)**																						$6,809,962	$1,210,900			$6,809,962	$272,700			$6,661,702	$266,700			$6,809,962	$31,700		$0	$0		$1,782,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900171000	8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 93b N. 17-42 Ofi: 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9261776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	442316496	8491791162	E	2019/05/03	2019/05/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,782,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,210,900	$0	$0	$1,210,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$918,300	$0	$0	$918,300
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$77,200	$0	$0	$77,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$215,400	$0	$0	$215,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$31,700	$0	$0	$31,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$266,700	$0	$0	$266,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$266,700	$0	$0	$266,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$272,700	$0	$0	$272,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$87,400	$0	$0	$87,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$185,300	$0	$0	$185,300
TOTAL				4	$1,782,000	$0	$0	$1,782,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928571	2	HABITANS SAS	C - MIPYMES	HABITANS BOGOTA	calle 93b N. 17-42 Ofi: 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9261776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	444138579	8492089257	E	2019/05/17	2019/05/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,433,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HABITANS BOGOTA (18 Afiliados)																							$26,037,714	$4,166,900			$26,037,714	$1,042,300			$26,037,714	$1,042,300			$26,037,714	$181,600		$0	$0		$6,433,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (17 Afiliados)																							$25,136,874	$4,022,600			$25,136,874	$1,006,100			$25,136,874	$1,006,100			$25,136,874	$120,900		$0	$0		$6,155,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																							$25,136,874	$4,022,600			$25,136,874	$1,006,100			$25,136,874	$1,006,100			$25,136,874	$120,900		$0	$0		$6,155,700
1	CC	1019117791	ACUÑA GOMEZ JUAN CAMILO																		230201	30	$1,060,000	$169,600	EPS008	30	$1,060,000	$42,400	CCF22	30	$1,060,000	$42,400	14-11	30	$1,060,000	$5,600	30	$0	$0	Si	$260,000
2	CC	1015419828	BACCA GARCIA JAVIER ORLANDO																		25-14	28	$2,380,000	$380,800	EPS017	28	$2,380,000	$95,200	CCF22	28	$2,380,000	$95,200	14-11	28	$2,380,000	$12,500	28	$0	$0	Si	$583,700
3	CC	1015419828	BACCA GARCIA JAVIER ORLANDO													X					25-14	2	$170,000	$27,200	EPS017	2	$170,000	$6,800	CCF22	2	$170,000	$6,800	14-11	2	$170,000	$0	2	$0	$0	Si	$40,800
4	CC	1032489370	BLANCO BERNAL PEDRO LUIS																		230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS008	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0	Si	$269,800
5	CC	1076622272	CARRASQUILLA OROZCO JHON JAIDER																		230201	26	$2,294,500	$367,200	EPS037	26	$2,294,500	$91,800	CCF22	26	$2,294,500	$91,800	14-11	26	$2,294,500	$12,000	26	$0	$0	Si	$562,800
6	CC	1076622272	CARRASQUILLA OROZCO JHON JAIDER											X							230201	4	$235,334	$37,700	EPS037	4	$235,334	$9,500	CCF22	4	$235,334	$9,500	14-11	4	$235,334	$0	4	$0	$0	Si	$56,700
7	CC	1012420567	CARVAJAL LEON JULIAN SAID																		230301	30	$1,270,800	$203,400	EPS008	30	$1,270,800	$50,900	CCF22	30	$1,270,800	$50,900	14-11	30	$1,270,800	$6,700	30	$0	$0	Si	$311,900
8	CC	1053609973	DELGADO RODRIGUEZ SANDRA CATALINA																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS044	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
9	CC	1032496681	HERNANDEZ JARAMILLO HEIDY LORENA																		230301	30	$900,000	$144,000	ESSC91	30	$900,000	$36,000	CCF22	30	$900,000	$36,000	14-11	30	$900,000	$4,700	30	$0	$0	Si	$220,700
10	CC	1094913286	LUNA COLLAZOS JORGE LUIS																		25-14	30	$1,272,000	$203,600	EPS017	30	$1,272,000	$50,900	CCF22	30	$1,272,000	$50,900	14-11	30	$1,272,000	$6,700	30	$0	$0	Si	$312,100
11	CC	1016083222	MALDONADO CRUZ LAURA ALEJANDRA																		25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF22	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	Si	$331,100
12	CC	1032450357	PALACIOS RODRIGUEZ RAFAEL ANDRES																		230201	27	$1,350,000	$216,000	EPS017	27	$1,350,000	$54,000	CCF22	27	$1,350,000	$54,000	14-11	27	$1,350,000	$7,100	27	$0	$0	Si	$331,100
13	CC	1032450357	PALACIOS RODRIGUEZ RAFAEL ANDRES													X					230201	3	$150,000	$24,000	EPS017	3	$150,000	$6,000	CCF22	3	$150,000	$6,000	14-11	3	$150,000	$0	3	$0	$0	Si	$36,000
14	CC	1023911021	PORTELA GOMEZ HEILER ALEJANDRO		X																230201	9	$349,800	$56,000	EPS008	9	$349,800	$14,000	CCF22	9	$349,800	$14,000	14-11	9	$349,800	$1,900	9	$0	$0	Si	$85,900
15	CC	1023911021	PORTELA GOMEZ HEILER ALEJANDRO													X					230201	2	$77,734	$12,500	EPS008	2	$77,734	$3,200	CCF22	2	$77,734	$3,200	14-11	2	$77,734	$0	2	$0	$0	Si	$18,900
16	CC	1032471228	RIZO ORJUELA ANDREA																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
17	CC	1022336174	RODRIGUEZ SARMIENTO GLORIA MERYBEL																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
18	CC	1022380305	RUIZ PARRA JULIETH PAOLA																		230301	29	$922,200	$147,600	EPS005	29	$922,200	$36,900	CCF22	29	$922,200	$36,900	14-11	29	$922,200	$4,900	29	$0	$0	Si	$226,300
19	CC	1022380305	RUIZ PARRA JULIETH PAOLA													X					230301	1	$31,800	$5,100	EPS005	1	$31,800	$1,300	CCF22	1	$31,800	$1,300	14-11	1	$31,800	$0	1	$0	$0	Si	$7,700
20	CC	1073515168	SALAZAR ROBAYO NICOLAS																		230301	30	$1,484,000	$237,500	EPS008	30	$1,484,000	$59,400	CCF22	30	$1,484,000	$59,400	14-11	30	$1,484,000	$7,800	30	$0	$0	Si	$364,100
21	CC	52373195	SANCHEZ GUILOMBO ELSY																		230301	26	$717,701	$114,900	EPS005	26	$717,701	$28,800	CCF22	26	$717,701	$28,800	14-11	26	$717,701	$3,800	26	$0	$0	Si	$176,300
22	CC	52373195	SANCHEZ GUILOMBO ELSY											X		X					230301	4	$110,416	$17,700	EPS005	4	$110,416	$4,500	CCF22	4	$110,416	$4,500	14-11	4	$110,416	$0	4	$0	$0	Si	$26,700
23	CC	1032460127	SANCHEZ MILLAN LUISA FERNANDA																		230201	1	$47,020	$7,600	EPS008	1	$47,020	$1,900	CCF22	1	$47,020	$1,900	14-11	1	$47,020	$300	1	$0	$0	Si	$11,700
24	CC	1032460127	SANCHEZ MILLAN LUISA FERNANDA													X					230201	29	$1,363,569	$218,200	EPS008	29	$1,363,569	$54,600	CCF22	29	$1,363,569	$54,600	14-11	29	$1,363,569	$0	29	$0	$0	Si	$327,400

| | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14139624
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CA 189 NO 46 - 10 INT 5 APT 202	TELÉFONO:	7041015
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7721338079**			TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	13							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:				449004476

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 288.000	$ 2.800	$ 290.800
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 2.800**	**$ 290.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 225.000	$ 2.200	$ 0	$ 227.200
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 227.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 100	$ 0	$ 9.500
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES													
																												PENSIÓN									SALUD							ARP																															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 14139624	RODRIGUEZ VASQUEZ NELSON FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000	14139624	$ 9.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 527.500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80073609		PINILLA RODRIGUEZ JUAN JACOBO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 83 22a 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9261776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-05	448918071	8492498440	I	2019/06/06	2019/05/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80073609	PINILLA RODRIGUEZ JUAN JACOBO	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS044	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80074961		ORTIZ FUENTES FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23A 37D - 68 AP.404	VILLAVICENCIO-META	6674794	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04		8492406511	I	2019/05/15			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80074961	ORTIZ FUENTES FERNANDO																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,500,000	$7,900	0	$0	$0	No	$435,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0		$435,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80074961		ORTIZ FUENTES FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23A 37D - 68 AP.404	VILLAVICENCIO-META	6674794	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04		8492406511	I	2019/05/15			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,900	$0	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				1	$435,400	$0	$0	$435,400

Anexo 3 Copia de cedula, tarjeta profesional y certificación de vigencia revisor fiscal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.885.491
VANEGAS MOLINA
APELLIDOS
LAURA STHEPHANY
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-1992
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
19-FEB-2010 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5200100-00232700-F-1121885491-20100408 0021947564A 1 34317379


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
219821-T
LAURA STHEPHANY
VANEGAS MOLINA
C.C. 1121885491
RESOLUCION INSCRIPCION 975
FECHA 19/09/2016
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
235943


223272
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5016D95151CA2A90

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA STHEPHANY VANEGAS MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121885491 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 219821-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *
