Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **23** PERIODO: **31/05/2021** **al** **6/06/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		5,12%	CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	OBRAS Y CONSULTORIA ARQTEK SAS		CONTRATISTA:	CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS - JLSM	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.2092712		CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR.2071522	
VALOR INICIAL:	$ 41.888.000,00		VALOR INICIAL:	$ 818.871.366,16	
VALOR ADICIÓN 1:	$ -		VALOR ADICIÓN 1:	$ -	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	**$ 41.888.000,00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$ 818.871.366,16**	
PLAZO INICIAL:	**6 meses**		PLAZO INICIAL:	**6 meses**	
PLAZO ACTUALIZADO:	**6 meses**		PLAZO ACTUALIZADO:	**6 meses**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**		FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**	
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**		FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**	
FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**		FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/06/2021**		FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/06/2021**	
VALOR EJECUTADO SEMANAL:	**$ 628.320,00**	**1,50%**	VALOR EJECUTADO SEMANAL:	**$ 12.283.070,49**	**1,50%**
VALOR ACUMULADO EJECUTADO SEMANAL	**$ 36.652.000,00**	**87,50%**	VALOR ACUMULADO EJECUTADO SEMANAL	**$ 716.512.445,39**	**87,50%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 5.236.000,00**	**12,50%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 102.358.920,77**	**12,50%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO


3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO SEMANA	**% EJECUTADO EN LA SEMANA**	**DIFERENCIA**
Acumulado anterior	94,68%	86,00%	8,68%
Acumulado presente semana	96,01%	87,50%	8,51%
Acumulado Actual	96,01%	87,50%	-8,51%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

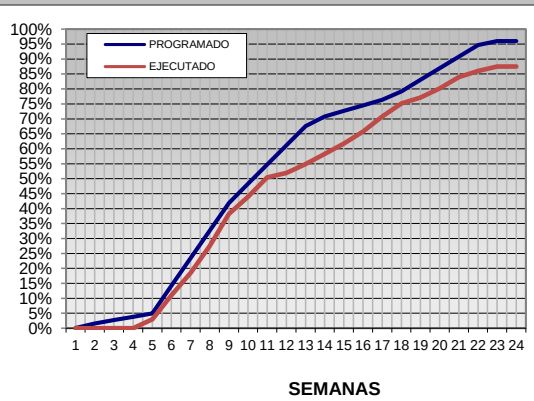

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Tiempo total Contractual	**Tiempo transcurrido**	**Faltante**	**Atraso o adelanto en tiempo**
181	157	24,00	-15,40

Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **23** PERIODO: **31/05/2021** **al** **6/06/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Item 2,2 instalación de tuberia EMT 2"	100,00%	se realiza instalacion de 18 metros	95,00%
Item 2,4 suministro e instalación de tablero de distribución 24 circuitos	100,00%	se realiza instalacion de la carcasa del tablero 8 unidad	95,00%
Item 2,6 suministro e instalación de interruptor automatico	100,00%	se reliza instalacion de: 21 unidades 1x15 amperios, 7unidades 2x30 amperios.	35,00%
NP-11 Tomacorriente GFCI	100,00%	se realiza la instalación de 8 unidades, se instalan 7 metros de cable 12 AWG x3 linea	90,00%
NP-12 interruptor automatico 2x50 amperios	100,00%	se reliza instalacion de: 4 unidades 2x50 amperios	45,00%
Item NP-14 reposición de concreto	100,00%	se realiza reposicio de concreto 89 metros lineales	90,00%
NP-8 bandeja cablofil	100,00%	se instala 1 metro de bandeja cablofil	95,00%
Se instalaron unas acometidas en el piso 3 de lado Norte	100,00%	Se instalaron unas acometidas en el piso 3 de lado Norte	50,00%
Se ihicieron unos empalmes para la conexión de los Toma Normales y Tomas Regulados en los pisos 3 y 4	100,00%	Se ihicieron unos empalmes para la conexión de los Tomas Normales y Tomas Regulados en los pisos 3 y 4	30,00%
NOTA: Por falta de materiales no se adelanto mas en la ejecucion de los trabajos			

RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Ing Guillermo Dimas



Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	

1. INFORMACIÓN GENERAL


INFORME SEMANAL No. **23** PERIODO: **31/05/2021** **al** **6/06/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

REGISTRO FOTOGRAFICO










SE ANEXAN REGISTROS FOTOGRAFICOS
