

Por ti, estamos ahí

epm®

ATENCIONES REALIZADAS

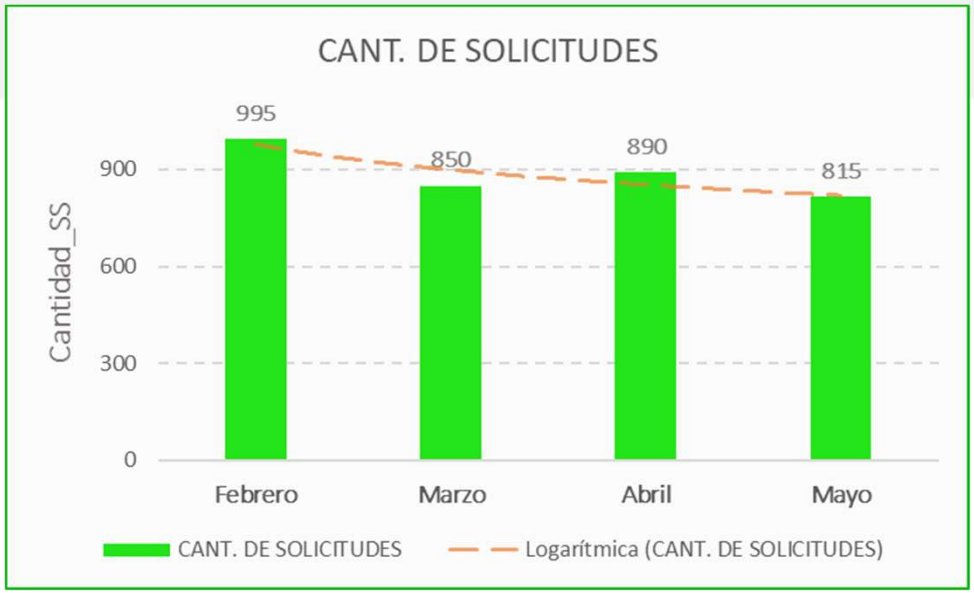

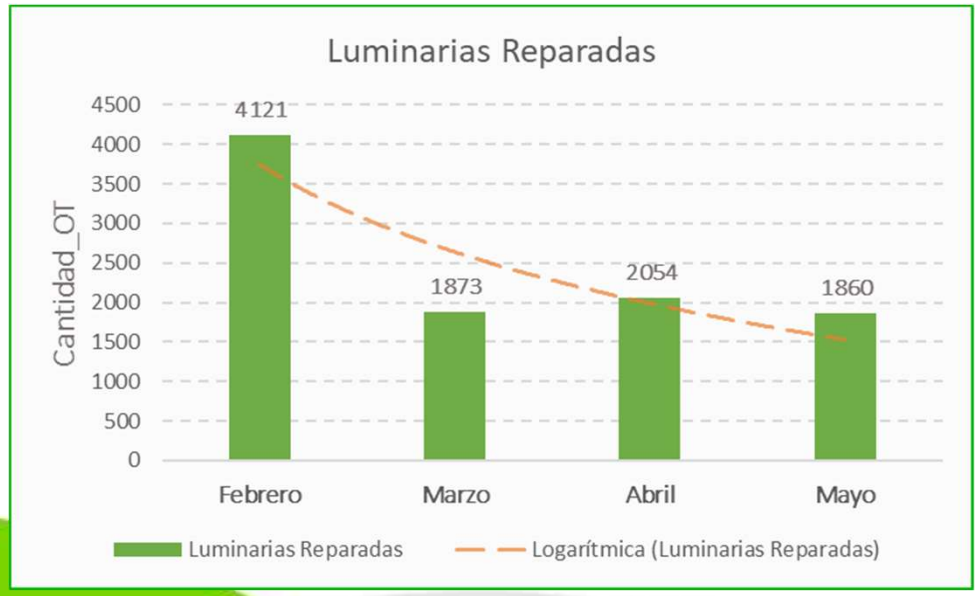


Información reparaciones


Durante el mes de mayo se generaron 815 solicitudes, estas están compuestas de solicitudes de la Comunidad y solicitudes generadas por los recorridos de mantenimiento realizados de forma directa, mas adelante se presenta detalle de los lugares que son reportados en las visitas de seguimiento.


En el mes de febrero se recibió el sistema con un porcentaje de falla de 8,37% Esto equivale a que alrededor de 4.121 Luminarias estaban fuera de servicio como se puede ver la cantidad de luminarias en falla se observa una tendencia a la disminución, la medida para el mes de mayo fue de 3,8% por debajo del valor objetivo del 5%.

Es importante que se incremente la cantidad de solicitudes realizadas por los usuarios, esto es indispensable ya que según la frecuencia programada de los sitios se tendrán periodos en los cuales se depende plenamente de los reporte de los usuarios. Para buscar subsanar esta dificultad en el mes de Abril se dio campaña radial y de televisión de las líneas de atención. En el mes de junio se retomara las pautas en los diferentes medios de comunicación, adicionalmente se incrementara la frecuencia de los recorridos.

TIEMPO DE REPARACIÓN SOLICITUDES

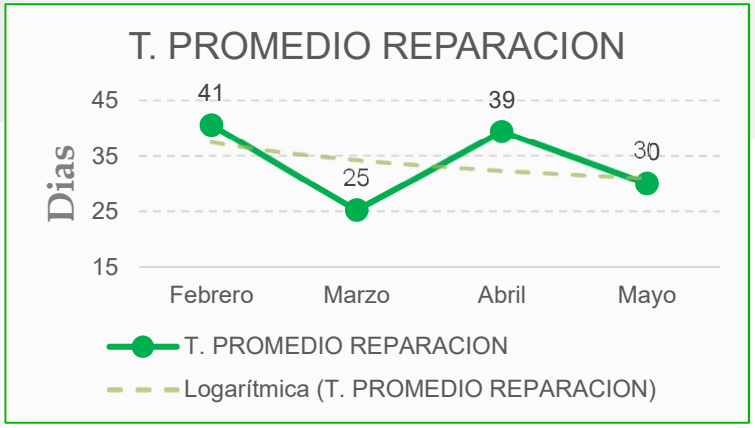

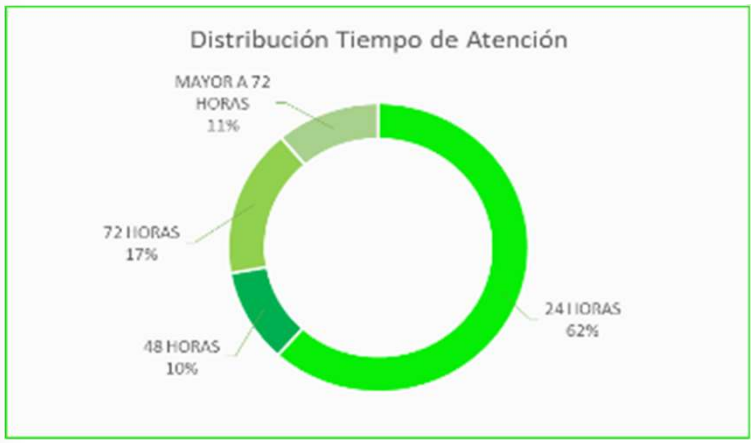

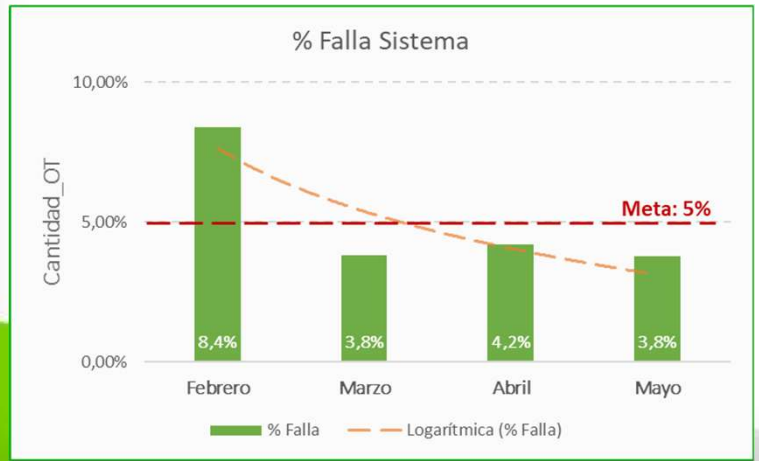

TIEMPO REPARACIÓN SOLICITUDES

Para el desarrollo del proyecto se ha propuesto mantener un porcentaje de falla inferior al 5% y adicionalmente el tiempo promedio de atención se espera sea inferior a 48 Horas. Como se puede ver en las graficas T. promedio de atención se ha cumplido este objetivo el valor para el mes mayo se situó sobre las 30 horas.

En la distribución de estas atenciones se observa que el 62% de las solicitudes es entendido en menos de 24 horas. y el 72% en menos de 48 horas.

Adicionalmente gracias a las actividades de mantenimiento realizada se ha mantenido el % de falla por debajo del valor objetivo.

En el desarrollo de las actividades del mes de mayo se presentaron dos eventos de daños en activos de medida tensión en la avenida Santander, la ejecución de estos trabajos en media tensión debe ser coordinada con el Operador de Red.

El primer evento se presento daño de caja primaria en el trafo exclusivo en el sector de las tenazas

Adicionalmente se presento daño de transformador en el sector el cabrero, esto implico ejecutar reposición de este activo,

Estas actividades fueron ejecutadas con línea viva ya que afinia limita ejecutar suspensiones del servicio en estos sectores

Espacios Intervenidos

Vías
Av. Pedro de Heredia
Av. Santander
Av Principar Barrio San Fernando
Av.del barrio La Esperanza
Av. Perimetral
Av. Pedro Romero
Av. antigua de ternera
Av. Kennedy de Blas de leso.
Av. Troncal de occidente
Acceso al Barrio Chiquinquirá
Acceso al barrio Las gaviotas
Avenida del consulado
Av. Pedro Vélez
Av.marginal de el Cabrero
Av. marginal de Juan Angola
Paseo Bolívar
Av. principal del barrio Nariño
Av. San Martin Bocagrande.
Avenida 1° de Bocagrande o Malecón
Calle 70 de Crespo.
Cuarta avenida de Manga
Av. principal del 20 de Julio.
Av.principal del Pozón
Transversal 54

Los sitios mencionados se les ha realizado recorridos de reparación. Las reparaciones en las vías serán programadas mediante plan de intervención de vías


Adicionalmente se ejecuto mantenimiento a los mástiles alrededor de los monumentos históricos.

Se ejecuto mantenimiento al parque centenario.

Espacios Intervenidos






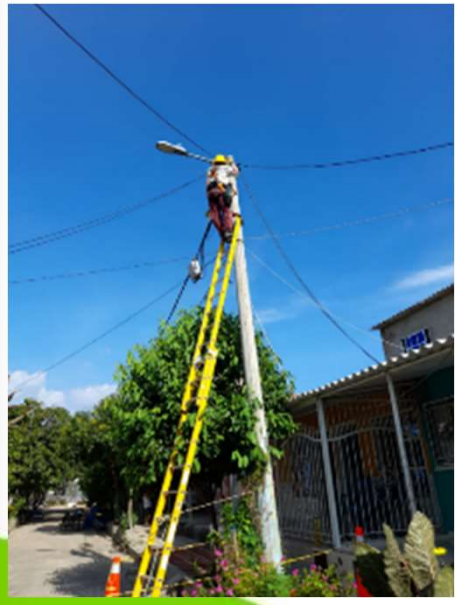





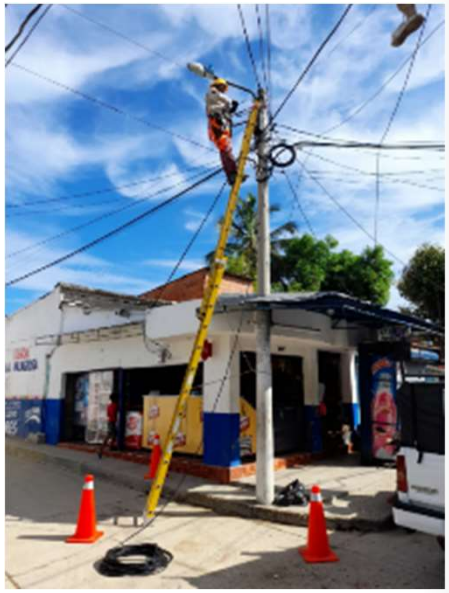


Actividades Ejecutadas construcción infraestructura

Se ejecuto la construcción de infraestructura para los siguientes proyectos

Mes_Proyectado	Fecha radicado	Acta	Proyecto	Fecha Corte	Mes_Ejecutado	UCAP Planeada	UCAP Ejecutada	UCAP Planeada Acumulada	UCAP ejecutado Acumulada
Febrero	11/02/2021	MOD. INFRAESTRUCTURA	TRANSFORMADOR TRA. 54	28/02/2021	Febrero	6,09	6,09	6,09	6,089
Marzo	16/03/2021	AMC-OFI-0024956-2021	AV. VENEZUELA	31/03/2021	Marzo	85,00	85,00	91,09	91,089
Marzo	16/03/2021	AMC-OFI-0024956-2021	AV. BLAS DE LEZO	31/03/2021	Marzo	133,00	133,00	224,09	224,089
Marzo	16/03/2021	AMC-OFI-0024956-2021	AV PEDRO DE HEREDIA I	31/03/2021	Abril	451,00	451,00	675,09	675,089
Marzo	16/03/2021		CALLE LA ROTONDA	31/03/2021	Marzo	19,00	19,00	694,09	694,089
Mayo	5/04/2021	AMC-OFI-0032163-2021	AV. PEDRO HEREDIA TRAMO II	30/04/2021		514,34	0,00	1.208,43	694,089
Abril	5/04/2021	AMC-OFI-0032163-2021	AV. LAGO	30/04/2021	Abril	317,00	317,00	1.525,43	1011,089
Abril	5/04/2021	AMC-OFI-0032163-2021	BARRIO REP LIBANO	30/04/2021	Abril	462,00	462,00	1.987,43	1473,089
Abril	5/04/2021	AMC-OFI-0032163-2021	AV 1° MALECON	30/04/2021	Abril	110,00	110,00	2.097,43	1583,089
Abril	5/04/2021	AMC-OFI-0032163-2021	VIA PERIMETRAL	30/04/2021	Mayo	180,00	201,94	2.277,43	1785,026
Mayo	6/05/2021	AMC-OFI-0045280-2020	PARQUE LA ESPERANZA	31/05/2021	Mayo	29,00	29,00	2.306,43	1814,026
Mayo	6/05/2021	AMC-OFI-0045280-2021	CALLE 30	31/05/2021	Junio	150,00		2.456,43	1814,026
Mayo	6/05/2021	AMC-OFI-0045280-2021	DIAGONAL 22	31/05/2021	Junio	80,00		2.536,43	1814,026
Mayo	6/05/2021	AMC-OFI-0045280-2021	TRANSVERSAL 54	31/05/2021	Junio	273,00		2.809,43	1814,026
Mayo	6/05/2021	AMC-OFI-0045280-2021	AVENIDA RAFAEL NUÑEZ	31/05/2021	Junio	66,81		2.876,24	1814,026
Mayo	18/05/2021	MOD. INFRAESTRUCTURA	TRANSFORMADOR AV SANTANDER	31/05/2021		6,09	6,09	2.882,33	1820,115
Mayo	6/05/2021	MOD. INFRAESTRUCTURA	PROYECTORES EL CASTILLO	31/05/2021		10,00		2.892,33	1820,115
Mayo	6/05/2021	MOD. INFRAESTRUCTURA	PARQUE RAFAEL CALVO	31/05/2021		123,93		3.016,26	1820,115

Actividades Ejecutadas construcción infraestructura

Curva S del Proyecto

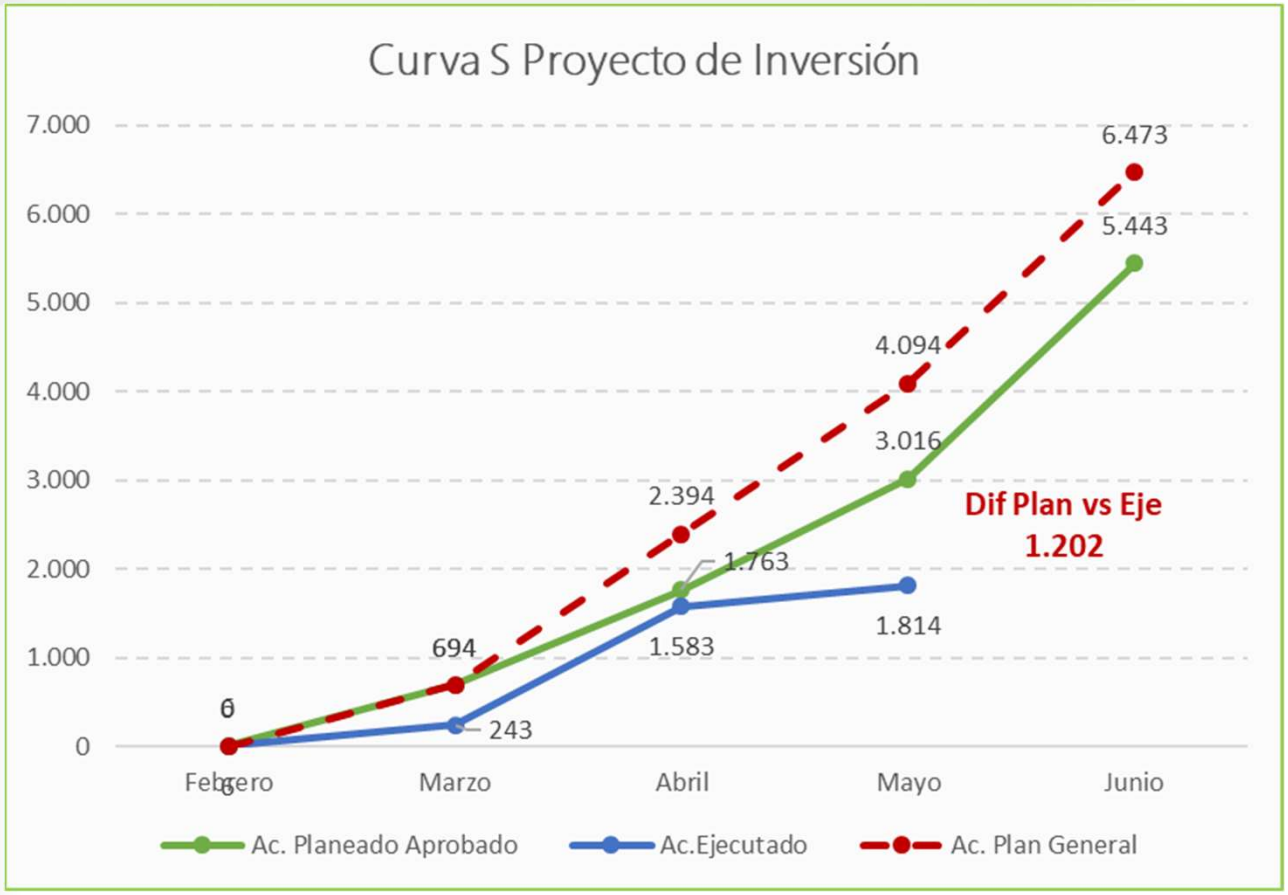

De acuerdo a la ejecución planeada por el distrito medido para el mes del mes de Mayo se presenta un atraso de 1.202 UCAP, esto debido a las dificultades que han tenido los proveedores en la entrega de las luminarias.

Se esperaba las luminarias fueran entregadas a mas tardar el 04 de Mayo, sin embargo por las dificultades asociados al para solo fue posible recibir el 30% y al final del mes de mayo

Como plan de acción EPM espera ejecutar el plan durante el mes de Junio de tal manera que nos pongamos a la par en la ejecución esperada del proyecto. La aprobación de los proyectos del mes de junio ya fue recibida.

Av. Blass de Lezo





	Cantidad
Luminarias Retiradas	42
Luminarias LED instaladas	58
UCAP Colocadas	133
Kw/h al mes (Antes de la ejecución)	8034,8
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	2659,7
Ahorro de energía	67%

Av. Venezuela





	Cantidad
Luminarias Retiradas	76
Luminarias LED instaladas	73
UCAP Colocadas	85
Kw/h al mes (Antes de la ejecución)	6089,0
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	2113,2
Ahorro de energía	65%

Av. Pedro de Heredia Tramo I





	Cantidad
Luminarias Retiradas	373
Postes Colocados	5
Redes Retiradas	300
Luminarias LED instaladas	349
UCAP Colocadas	451
Kw/h al mes (Antes de la ejecución)	25417,8
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	11098,8
Ahorro de energía	56%

Calle de la Ronda acceso Parque La Marina





	Cantidad
Luminarias Retiradas	10
Luminarias LED instaladas	16
UCAP Colocadas	19
Kw/h al mes (Antes de la ejecución)	1004,4
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	460,8
Ahorro de energía	54%

Av. del Lago





	Cantidad
Luminarias Retiradas	198
Postes Colocados	4
Redes Retiradas	90
Luminarias LED instaladas	192
UCAP Colocadas	317
Kw/h al mes (Antes de la ejecución)	18025,9
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	7754,4
Ahorro de energía	57%

Av. 1ra Malecón





	Cantidad
Luminarias Retiradas	76
Postes Colocados	5
Redes Retiradas	175
Luminarias LED instaladas	76
UCAP Colocadas	110
Kw/h al mes (Antes de la ejecución)	6009,1
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	2836,8
Ahorro de energía	53%

Vía perimetral





	Cantidad
Luminarias Retiradas	70
Postes Colocados	15
Luminarias LED instaladas	73
UCAP Colocadas	180
Kw/h al mes (Antes de la ejecución)	7030,8
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	5098,3
Ahorro de energía	27%

Barrio República del Líbano





	Cantidad
Luminarias Retiradas	378
Postes Colocados	4
Redes Retiradas	300
Luminarias LED instaladas	428
UCAP Colocadas	462
Kw/h al mes (Antes de la ejecución)	11183,4
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	7704,0
Ahorro de energía	31%

Glorieta La Esperanza



	Cantidad
Luminarias Retiradas	22
Luminarias LED instaladas	20
UCAP Colocadas	29
Kw/h al mes (Antes de la ejecución)	1766,2
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	1270,1
Ahorro de energía	28%

Av. Rafael Calvo





	Cantidad
Luminarias Retiradas	24
Postes Colocados	8
Redes Retiradas	50
Luminarias LED instaladas	36
UCAP Colocadas	63
Kw/h al mes (Antes de la ejecución)	1615,3
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	1296,0
Ahorro de energía	20%

Calle 30 por el Castillo San Felipe



	Cantidad
Luminarias Retiradas	148
Postes Colocados	21
Luminarias LED instaladas	75
UCAP Colocadas	135
Kw/h al mes (Antes de la ejecución)	7944,1
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	3510,0
Ahorro de energía	56%

Av. Rafael Núñez





	Cantidad
Postes Colocados	10
Luminarias LED instaladas	428
UCAP Colocadas	47
Kw/h al mes (Después de la ejecución)	792
Ahorro de energía	31%

Actividades planeadas mes de Junio

Mes_Proyectado	Fecha radicado	Acta	Proyecto	Fecha Corte	UCAP Planeada
Mayo	6/05/2021	AMC-OFI-0045280-2021	CALLE 30	31/05/2021	150,00
Mayo	6/05/2021	AMC-OFI-0045280-2021	DIAGONAL 22	31/05/2021	80,00
Mayo	6/05/2021	AMC-OFI-0045280-2021	TRANSVERSAL 54	31/05/2021	273,00
Mayo	6/05/2021	AMC-OFI-0045280-2021	AVENIDA RAFAEL NUÑEZ	31/05/2021	66,81
Mayo	6/05/2021	MOD. INFRAESTRUCTURA	PROYECTORES EL CASTILLO	31/05/2021	10,00
Mayo	6/05/2021	MOD. INFRAESTRUCTURA	PARQUE RAFAEL CALVO	31/05/2021	123,93
Junio	20/05/2021	MOD. INFRAESTRUCTURA	CORREGIMIENTO BARU	30/06/2021	8,00
Junio	20/05/2021	MOD. INFRAESTRUCTURA	LOS CALAMARES	30/06/2021	12,10
Junio	20/05/2021	MOD. INFRAESTRUCTURA	PARQUE EL CONTRY	30/06/2021	5,91
Junio	20/05/2021	MOD. INFRAESTRUCTURA	20 DE JULIO	30/06/2021	11,80
Junio	8/06/2021	AMC-OFI	CARRERA 1 AVENIDA SANTANDER	30/06/2021	542,87
Junio	8/06/2021	AMC-OFI	CRA 17 PASO BOLIVAR CASTILLOS SAN FELIPE A CRESPO	30/06/2021	320,00
Junio	8/06/2021	AMC-OFI	CANCHA DE FUTBOL CAMPESTRE	30/06/2021	240,00
Junio	8/06/2021	AMC-OFI	TIERRA BAJA BOQUILLA	30/06/2021	220,48
Junio	8/06/2021	AMC-OFI	CORDIALIDAD TRAMO I DESDE BOMBA EL AMPARO HASTA CALICANTO	30/06/2021	126,00
Junio	8/06/2021	AMC-OFI	CORDIALIDAD TRAMO II DESDE CALICANTO A GLORIETA EL POZON ETAPA I	30/06/2021	850,00
Junio	8/06/2021	AMC-OFI	AV 4° DE MANGA	30/06/2021	90,00

Muchas gracias

Por ti, estamos ahí

epm®
