INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.12

5936

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de Marzo de 2020

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá, Marzo de 2021

5937

CONTENIDO DEL INFORME

1. **RESUMEN DEL ESTADO - CONTRATO DE INTERVENTORIA**
   - **1.0 DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
   - 1.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
   - 1.2 ASPECTO JURIDICO AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
   - 1.3 ASPECTO FINANCIERO AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
   - 1.4 ASPECTO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA - INVERSIÓN EJECUTADA POR COLEGIO
   - 1.5 RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES
   - 1.6 CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA
2. **RESUMEN DEL ESTADO – CONTRATO DE OBRA**
   - 2.0 ASPECTO ADMINISTRATIVO CONSTRUSOCIAL
   - 2.1 ASPECTO JURÍDICO CONSTRUSOCIAL
   - 2.2 ASPECTO FINANCIERO CONSTRUSOCIAL
3. **ACTAS – ACTA DE VISITA- ACTA DE INICIO- ACTA FINAL- INFORME FINAL POR SEDE**
   - 3.0 METODOLOGÍA INTERVENTORÍA
   - 3.1 ACTAS DE SEGUIMIENTO A FRENTES DE OBRA ACTIVIDADES DE EMERGENCIA OBRA CIVIL
   - 3.2 ACTAS DE SEGUIMIENTO A FRENTES DE OBRA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA
4. **RELACIÓN DE ANEXOS.**

1. RESUMEN DEL ESTADO - CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.0 DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

FECHA	ABRIL	**PERIODO**	12	**DEL**	23/03/2021	**AL**	22/04/2021
OBJETO DEL CONTRATO			"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".				
LOCALIZACION DEL PROYECTO			BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES				

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646				
AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S **NIT.** 830.123.577-7 **RL** ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **C.C.** 80228570 **DIRECCION** Carrera 71A no 52A-17 Barrio Normandia **TELEFONO** (+57 1) 2109456 / 311 353 13 84 **E-MAIL** ac2ringenieria@gmail.com				
CONTRATO No.	**N. CO1.PCCNTR. 1440646**			
FECHA DE SUSCRIPCION:	23 DE ABRIL DE 2020			
PLAZO INICIAL:	12 meses			
FECHA DE INICIACION:	23 DE ABRIL DE 2020			
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	22 DE MARZO DE 2021			
MODIFICATORIO N°1:	29 DE DICIEMBRE DE 2020			
FECHA DE TERMINACION:	30 DE MARZO DE 2021			
MODIFICATORIO N°2:	19 DE MARZO DE 2021			
FECHA DE TERMINACION:	30 DE MAYO DE 2021			
PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL:	364 dias	EQUIVALE AL		91%
VALOR INICIAL:	$	**428.828.400**		**COP**
VALOR ADICIONADO ADICION N°1:	$	**182.950.600,00**		**COP**
VALOR ADICIONADO ADICION N°2:	$	**361.226.880,00**		**COP**
VALOR TOTAL:	$	**973.005.880,00**		**COP**
VALOR PAGADO:	Mensual	$	**365.962.691,00**	**COP**
	Avance de obra	$	**208.138.021,00**	**COP**
VALOR POR PAGAR:	$	**398.905.168,00**		**COP**

1.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	23/04/2020
ACTA DE TERMINACION	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

1.2 ASPECTO JURIDICO

LEGALIZACION DEL CONTRATO	**FECHA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	23 de Abril de 2020
OTRO SI, MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	**FECHA**
MODIFICATORIO N°1	30 de Diciembre de 2021
MODIFICATORIO N°2	19 de Marzo de 2021

PÓLIZAS INICIALES

ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	24/07/2021	$ 85.766.900,00	APROBADO

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	25/03/2024	$ 21.441.725,00	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2021	26/03/2026	$ 85.766.900,00	APROBADO
POLIZA No.14-22-101116826					
POLIZAS MODIFICATORIO N°1					
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	24/07/2021	$ 122.355.600,00	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	25/03/2024	$ 30.588.950,00	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2021	26/03/2026	$ 122.355.800,00	APROBADO
POLIZA No.14-22-101116826					
POLIZAS MODIFICATORIO N°2					
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	30/09/2021	$ 194.601.176,00	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	30/05/2024	$ 48.650.294,00	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2021	26/03/2026	$ 194.601.176,00	APROBADO
POLIZA No.14-22-101116826					

1.3 ASPECTO FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

AVANCE FINANCIERO

FECHA	ABRIL	PERIODO	12	DEL	23/03/2020	AL	22/04/2021

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646

CORTE No.	12			
CONTRATO No.	No. CO1.PCCNTR. 1440646			
CONTRATISTA	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S			
NIT.	830.123.577-7			
RL	ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO			
C.C.	80228570			
DIRECCION	Carrera 71A no 52A-17 Barrio Normandia			
TELEFONO	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84			
E-MAIL	ac2ringenieria@gmail.com			
FECHA DE SUSCRIPCION:	23 DE ABRIL DE 2020			
PLAZO INICIAL:	12 meses			
FECHA DE INICIACION:	23 DE ABRIL DE 2020			
FECHA DE TERMINACION INICIAL :	22 DE MARZO DE 2021			
FECHA MODIFICATORIO N°1:	29 DE DICIEMBRE DE 2020			
FECHA DE TERMINACION:	22 DE MARZO DE 2021			
FECHA MODIFICATORIO N°2:	19 DE MARZO DE 2021			
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	30 DE MAYO DE 2021			
PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL:	364 días	EQUIVALE AL		86%
VALOR INICIAL:	$		428.828.400,00	COP

VALOR DEL CONTRATO	$	428.828.400,00	COP

CORTE No.	NOMBRE	PERIODO	VALOR DEL MES			%	SALDO POR FACTURAR		
1	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	ABRIL 23 - MAYO 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55	$	393.400.937,00	91,74%
			Avance de Obra	$	15.935.263,00	3,72			
			SUBTOTAL	$	35.427.463,00	8,27			
2	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	MAYO 23 - JUNIO 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55	$	349.122.456,00	81,41%
			Avance de Obra	$	24.786.281,00	5,78			
			SUBTOTAL	$	44.278.481,00	10,33			
3	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	JUNIO 23 - JULIO 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55	$	317.417.224,00	74,02%
			Avance de Obra	$	12.213.032,00	2,85			
			SUBTOTAL	$	31.705.232,00	7,4			
4	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	JULIO 23 - AGOSTO 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55	$	263.515.834,00	61,45%
			Avance de Obra	$	34.409.190,00	8,02			
			SUBTOTAL	$	53.901.390,00	12,57			
5	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55	$	228.757.343,00	53,34%
			Avance de Obra	$	15.266.291,00	3,56			
			SUBTOTAL	$	34.758.491,00	8,11			
6	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55	$	189.058.749,00	44,09%
			Avance de Obra	$	20.206.394,00	4,71			
			SUBTOTAL	$	39.698.594,00	9,26			
7	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	OCTUBRE 23 - NOVIEMBRE 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55	$	157.216.292,00	36,66%
			Avance de Obra	$	12.350.257,00	2,88			
			SUBTOTAL	$	31.842.457,00	7,43			
8	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55	$	122.011.820,00	28,45%
			Avance de Obra	$	15.712.272,00	1,40			
			SUBTOTAL	$	35.204.472,00	5,95			

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de obra, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$	182.950.600,00	COP
VALOR TOTAL:	$	611.779.000,00	COP


9	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	DICIEMBRE 23 - ENERO 22	Cargo Fijo	$	59.286.539,00	9,69	$	238.862.801,00	39,04%
			Avance de Obra	$	6.813.080,00	1,11			
			SUBTOTAL	$	66.099.619,00	10,8			
10	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	ENERO 23 - FEBRERO 22	Cargo Fijo	$	71.173.160,00	11,63	$	158.294.572,00	25,87%
			Avance de Obra	$	9.395.069,00	1,54			
			SUBTOTAL	$	80.568.229,00	13,17			


Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de obra, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$	361.226.880,00	COP
VALOR TOTAL:	$	973.005.880,00	COP

11	CONSTRUSOCIAL S.A.S	FEBRERO 23 - MARZO 22	Cargo Fijo	$	79.565.392,00	8,18%	$	398.905.168,00	41,00%
			Avance de Obra	$	41.050.892,00	4,22%			
			SUBTOTAL	$	120.616.284,00	12,40%			
12	CONSTRUSOCIAL S.A.S	MARZO 23 - ABRIL 022	Cargo Fijo	$	79.565.392,00	8,18%	$	273.068.668,00	28,06%
			Avance de Obra	$	46.271.108,00	4,76%			
			SUBTOTAL	$	125.836.500,00	12,93%			

En las siguientes graficas se muestra el avance en pesos ($) y porcentaje (%), respectivamente, del valor facturado vs el valor pagado por parte de la SED a la interventoria en el transcurso del contrato

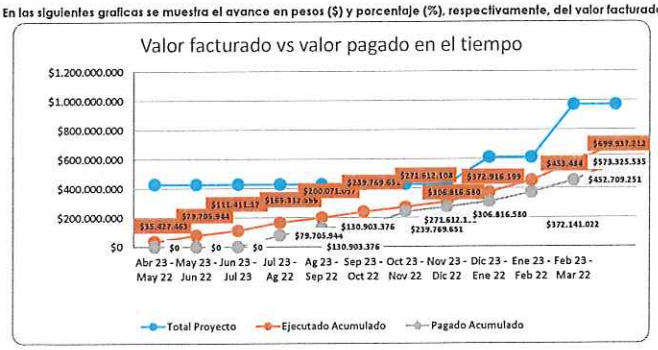

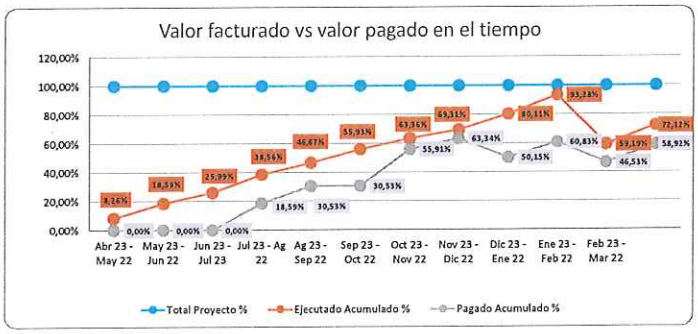

FECHA	ABRIL	PERIODO	12	DEL	23/03/2020	AL	22/04/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646

CORTE No.			12				
CONTRATO No.	No. CO1.PCCNTR. 1440646	VALOR DEL CONTRATO	$ 973.005.880,00	FECHA	2021		
CONTRATISTA	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	FECHA ACTA DE INICIO		23 DE ABRIL DE 2020	DIAS DE EJECUCION	364 dias	
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS	FECHA DE TERMINACION		30 DE MAYO DE 2021	DIAS FALTANTES PARA TERMINACION	59	

VALOR DEL CONTRATO	$	428.828.400,00 COP

CORTE No.	PERIODO	EJECUTADO % AVANCE PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO % AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO % AVANCE EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO % AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	FINANCIERO (*) PAGO PROGRAMADO POR LA SED - Furc	FINANCIERO PAGO REALIZADO POR LA SED	FINANCIERO EJECUTADO	FINANCIERO SALDO POR FACTURAR
1	ABRIL 23 - MAYO 22	9,1%	9,1%	8,26%	8,26%	$ 38.984.400,00	$ -	$ 35.427.463,00	$ 393.400.937,00
2	MAYO 23 - JUNIO 22	9,1%	18,2%	10,33%	18,59%	$ 38.984.400,00	$ -	$ 44.278.481,00	$ 349.122.456,00
3	JUNIO 23 - JULIO 22	9,1%	27,3%	7,40%	25,99%	$ 38.984.400,00	$ -	$ 31.705.232,00	$ 317.417.224,00
4	JULIO 23 - AGOSTO 22	9,1%	36,4%	12,57%	38,56%	$ 38.984.400,00	$ 79.705.944,00	$ 53.901.390,00	$ 263.515.834,00
5	AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22	9,1%	45,5%	8,11%	46,67%	$ 38.984.400,00	$ 51.197.432,00	$ 34.758.491,00	$ 228.757.343,00
6	SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 22	9,1%	54,6%	9,26%	55,93%	$ 38.984.400,00		$ 39.698.594,00	$ 189.058.749,00
7	OCTUBRE 23 - NOVIEMBRE 22	9,1%	63,7%	7,43%	63,36%	$ 38.984.400,00	$ 108.866.275,00	$ 31.842.457,00	$ 157.216.292,00
8	NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 22	9,1%	72,8%	5,95%	69,31%	$ 38.984.400,00	$ 31.842.457,00	$ 35.204.472,00	$ 122.011.820,00

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de obra, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.


VALOR ADICION:	$	182.950.600,00 COP
VALOR TOTAL:	$	611.779.000,00 COP


9	DICIEMBRE 23 - ENERO 22	9,1%	81,9%	10,80%	80,11%	$ 101.654.140,00	$ 35.204.472,00	$ 66.099.619,00	$ 238.862.801,00
10	ENERO 23 - FEBRERO 23	9,1%	91,0%	13,17%	93,28%	$ 101.654.140,00	$ 66.099.619,00	$ 80.568.229,00	$ 158.294.572,00

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de obra, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$	361.226.880,00 COP
VALOR TOTAL:	$	973.005.880,00 COP

11	FEBRERO 23 - MARZO 22	16,3%	63,1%	12,40%	59,19%	$ 159.362.408,59	$ 80.568.229,00	$ 120.616.284,00	$ 398.905.168,00
12	MARZO 23 - ABRIL 22	16,3%	79,4%	12,93%	72,12%	$ 159.362.408,59	$ 120.616.284,00	$ 125.836.500,00	$ 273.068.668,00

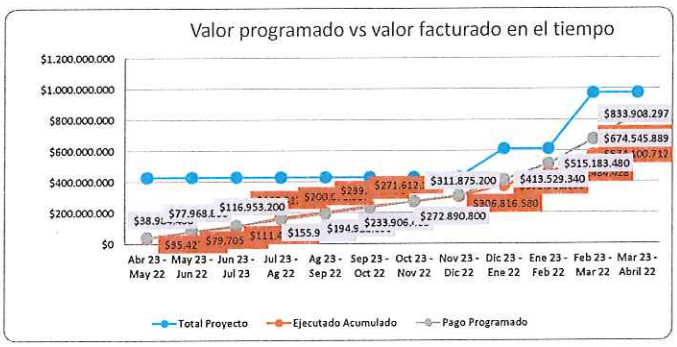

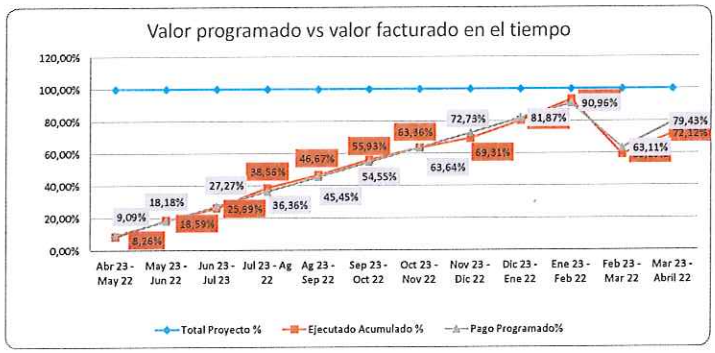

NOTA: (*) EL PAGO MENSUAL DEL CONTRATO PROGRAMADO POR LA SED, PUEDE VARIAR YA QUE EL EL PAGO DE AVANCE DE OBRA ESTA SUJETO AL AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA DURANTE CADA PERIODO, EL CONTRATO EXCEDE EL 100% DE EJECUCION DEBIDO A LAS ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.4 ASPECTO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA - INVERSIÓN EJECUTADA POR COLEGIO

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL:	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	30/12/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 5.285.220.304,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/02/2021	PLAZO ACTUALIZADO:	Doce (12) Meses	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de abril de 2021	$ 5.285.220.304,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	26/03/2021	PLAZO ACTUALIZADO:	Doce (12) Meses, 8 Dias.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	30 de abril de 2021	$ 7.226.733.092,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL:	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/02/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 611.779.000,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/03/2021	PLAZO ACTUALIZADO:	Trece (13) Meses y ocho (8) dias	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	30 de Mayo de 2021	$ 973.005.880,00 COP

5945

INFORME MES 12 (Marzo 23 - Abril 22) - Tecnico

Incluyendo el acta parcial No.12, la inversión acumulada se ve reflejada en el siguiente cuadro:

INVERSION EJECUTADA POR COLEGIO - MES 12

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INVERSION	PORCENTAJE (%)
117	LOTE FONTANAR GRANDE	Baño Seco	$ 1.356.126,00	0,049%
124	IED GENERAL SANTANDER	Estructural	$ 17.799.238,53	0,638%
126	IED BICENTENARIO	Hidraulico	$ 25.822.375,44	0,926%
133	IED MARIA CANO	Hidraulico - Cubierta	$ 12.218.863,72	0,438%
136	IED MONTEBELLO	Estructural	$ 63.391.876,94	2,272%
149	IED GENERAL SANTANDER - Engativa	Cubierta	$ 3.311.947,95	0,119%

OBSERVACIONES: De acuerdo a la inversion ejecutada, de las emergencias reportadas en este periodo, se relacionan todas ya que a la fecha del presente corte, estas continuan abiertas financieramente y se encuentran aun en ejecución.

ACTA 12

CPF - SEDE	INVERSION	PORCENTAJ
459. LA VICTORIA SEDE B	$ 1.575.800,00	0,030%
503. ALMIRANTE PADILLA SEDE A	$ 4.585.988,52	0,087%
508. BRASILIA - USME SEDE A	$ 5.510.890,76	0,105%
509. BRAZUELOS SEDE A	$ 1.331.537,64	0,025%
517. RURAL EL CURUBITAL SEDE A	$ 700.633,80	0,013%
519. RURAL EL HATO SEDE A	$ 710.956,88	0,014%
530. LA ARGENTINA SEDE A	$ 755.564,20	0,014%
531. LA AURORA SEDE A	$ 8.380.634,96	0,160%
534. RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 551.224,40	0,010%
537. RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 588.693,88	0,011%
541. MONTEBLANCO SEDE A	$ 9.315.440,60	0,177%
542. MONTEBLANCO SEDE C	$ 1.029.347,72	0,020%
544. RURAL OLARTE SEDE A	$ 1.329.776,08	0,025%
545. CIUDAD DE VILLAVICENCIO SEDE B	$ 1.994.532,88	0,038%
551. EL CORTIJO - VIANEY SEDE B	$ 3.400.872,80	0,065%

ACTA 13

CPF - SEDE	INVERSION	PORCENTAJ
207. SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 1.171.044,92	0,022%
211. SIMON RODRIGUEZ SEDE A	$ 3.358.258,56	0,064%
406. LOS ALPES SEDE A	$ 1.778.040,88	0,034%
407. MANUELITA SAENZ SEDE A	$ 91.664,00	0,002%
416. ENTRE NUBES SUR ORIENTAL SEDE A	$ 2.369.611,32	0,045%
417. ATENAS SEDE A	$ 565.322,00	0,011%
433. JUAN REY SEDE A	$ 1.922.884,00	0,037%
439. ENTRE NUBES SUR ORIENTAL SEDE B	$ 1.348.104,16	0,026%
443. NUEVA DELHI SEDE A	$ 1.075.259,80	0,020%
449. JUANA ESCOBAR SEDE C	$ 951.196,68	0,018%
461. VEINTE DE JULIO SEDE A	$ 3.254.894,72	0,062%
507. FEDERICO GARCIA LORCA SEDE B	$ 1.440.310,48	0,027%
511. RURAL CHIZACA SEDE A	$ 715.072,20	0,014%
513. FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE B	$ 1.289.898,92	0,025%
516. EL CORTIJO - VIANEY SEDE A	$ 2.235.380,88	0,043%
518. EL DESTINO SEDE A	$ -	0,000%
523. FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE A	$ 4.926.243,60	0,094%
524. FEDERICO GARCIA LORCA SEDE A	$ 5.271.170,76	0,100%

5346

576. MONTEBLANCO SEDE B	$ 2.003.213,96	0,038%
602. VENECIA SEDE A	$ 12.043.842,76	0,229%
605. MARCO FIDEL SUAREZ SEDE A	$ 9.998.975,60	0,190%
609. JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS SEDE B	$ 3.398.127,08	0,065%
611. RUFINO JOSE CUERVO SEDE A	$ 7.332.615,28	0,140%
614. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE C	$ 953.639,16	0,018%
615. INEM SANTIAGO PEREZ SEDE A	$ 20.759.360,40	0,395%
618. VENECIA SEDE B	$ 1.631.356,60	0,031%
622. JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS SEDE A	$ 8.176.205,40	0,156%
624. RUFINO JOSE CUERVO SEDE D	$ 718.954,36	0,014%
628. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE A	$ 11.974.199,48	0,228%
706. GRAN COLOMBIANO SEDE A	$ 6.228.462,72	0,119%
718. GRAN COLOMBIANO SEDE B	$ 4.548.951,20	0,087%
720. GRAN COLOMBIANO SEDE C	$ 1.434.986,00	0,027%
723. CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE B	$ 967.598,28	0,018%
724. GRAN COLOMBIANO SEDE D	$ 2.792.398,76	0,053%
729. SAN BERNARDINO SEDE A	$ 4.431.358,76	0,084%
743. CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C	$ 1.227.097,56	0,023%
750. BRASIL - LOPEZ QUINTANA - GERMAN ARCINIEGAS SEDE	$ 10.276.099,16	0,196%
752. FRANCISCO SOCARRAS SEDE A	$ 15.552.325,16	0,296%
753. CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA - EL PORVENIR SEDE A	$ 22.695.042,60	0,432%
813. CLASS SEDE A	$ 4.227.419,72	0,080%
831. LA AMISTAD SEDE B	$ 1.035.143,56	0,020%
839. CLASS SEDE C	$ 1.445.723,40	0,028%
856. COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA SEDE A	$ 6.738.657,00	0,128%
857. MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	$ 19.272.541,72	0,367%
860. CLASS SEDE B	$ 2.937.309,00	0,056%
875. LA AMISTAD SEDE C	$ 549.391,10	0,010%
1046. REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE A	$ 4.162.018,20	0,079%
1501. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESS	$ 14.381.556,40	0,274%
1502. ATANASIO GIRARDOT SEDE A	$ 8.254.220,84	0,157%
1503. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A	$ 4.959.776,64	0,094%
1508. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESS	$ 5.271.813,20	0,100%
1510. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B	$ 2.634.582,04	0,050%
1512. ATANASIO GIRARDOT SEDE B	$ 1.181.897,60	0,023%
1601. ANTONIO JOSE DE SUCRE SEDE A	$ 1.377.225,80	0,026%
1627. ANDRES BELLO SEDE A	$ 9.226.302,72	0,176%
1830. MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ SEDE A	$ 6.827.571,44	0,130%
1845. MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ SEDE B	$ 1.938.316,00	0,037%
1908. CANADA SEDE A	$ 1.371.022,52	0,026%
1910. CIUDAD DE MONTREAL SEDE A	$ 1.660.619,12	0,032%
1923. LA ARABIA SEDE A	$ 1.847.374,16	0,035%
1931. EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B	$ 3.298.111,92	0,063%
1940. ARBORIZADORA ALTA SEDE B	$ 1.830.459,20	0,035%
1954. SOTAVENTO SEDE A	$ 1.639.370,40	0,031%
1963. LEON DE GREIFF SEDE A	$ 5.817.277,00	0,111%
1983. JOSE MARIA VARGAS VILA SEDE A	$ 14.316.616,40	0,273%
TOTAL	$ 319.109.022,50	22,256%

525. FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE C	$ 889.734,28	0,017%
528. GRAN YOMASA SEDE A	$ 7.259.372,60	0,138%
532. RURAL LA MAYORIA SEDE A	$ 1.098.710,80	0,021%
533. RURAL LA UNION USME SEDE A	$ 1.319.341,00	0,025%
536. RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 517.597,08	0,010%
539. LOS TEJARES SEDE A	$ 2.477.487,96	0,047%
540. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE A	$ 11.337.805,68	0,216%
543. NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS SEDE A	$ 3.535.956,16	0,067%
546. SANTA LIBRADA SEDE A	$ 8.292.743,84	0,158%
547. SANTA MARTHA SEDE A	$ 1.899.373,52	0,036%
550. ATABANZA SEDE A	$ 5.365.489,84	0,102%
562. LOS TEJARES SEDE B	$ 412.553,60	0,008%
566. MORA OSEJO - NUEVO MONTEBLANCO SEDE A	$ 3.838.176,84	0,073%
575. EDUARDO UMAÑA MENDOZA SEDE A	$ 13.741.712,20	0,262%
578. NUEVO MILENIO (PAULO FREIRE) SEDE A	$ 13.285.506,24	0,253%
581. BARRANQUILLITA NUEVO SEDE A	$ 9.304.637,80	0,177%
616. SAN BENITO ABAD SEDE B	$ 1.946.678,80	0,037%
623. SAN BENITO ABAD SEDE A	$ 1.872.738,40	0,036%
625. BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$ 9.078.539,32	0,173%
708. LLANO ORIENTAL SEDE A	$ 2.873.031,12	0,055%
714. PABLO DE TARSO SEDE A	$ 4.289.940,40	0,082%
725. PABLO DE TARSO SEDE B	$ 950.154,48	0,018%
732. LA LIBERTAD - ORLANDO HIGUITA ROJAS SEDE B	$ 2.030.283,64	0,039%
747. LA LIBERTAD - ORLANDO HIGUITA ROJAS SEDE A	$ 11.634.343,36	0,222%
806. ALQUERIA DE LA FRAGUA SEDE A	$ 1.519.381,08	0,029%
807. O.E.A SEDE B	$ 6.206.427,00	0,118%
815. EL JAPON SEDE A	$ 1.630.148,00	0,031%
819. O.E.A SEDE A	$ 7.416.222,80	0,141%
866. INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A	$ 10.017.801,88	0,191%
925. LA FELICIDAD SEDE A	$ 13.352.487,72	0,254%
1001. TABORA SEDE A	$ 11.119.570,80	0,212%
1010. GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE A	$ 1.518.227,40	0,029%
1017. NACIONES UNIDAS SEDE B	$ 3.661.415,36	0,070%
1026. MORISCO SEDE A	$ 5.630.697,80	0,107%
1028. NACIONES UNIDAS SEDE A	$ 2.741.628,32	0,052%
1038. TABORA SEDE B	$ 2.318.826,48	0,044%
1058. REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE C	$ 2.214.883,80	0,042%
1103. HUNZA SEDE C	$ 507.938,60	0,010%
1110. HUNZA SEDE A	$ 3.262.954,20	0,062%
1119. HUNZA SEDE B	$ 1.194.188,80	0,023%
1145. CHORRILLOS NICOLAS BUENAVENTURA SEDE A	$ 10.344.343,80	0,197%
1504. CEDIT JAIME PARDO LEAL SEDE A	$ 7.158.865,52	0,136%
1803. ALEXANDER FLEMING SEDE B	$ 2.134.160,80	0,041%
1808. ALEXANDER FLEMING SEDE C	$ 1.280.583,80	0,024%
1813. ALFREDO IRIARTE SEDE B	$ 1.591.064,60	0,030%
1815. ALEXANDER FLEMING SEDE D	$ 1.382.222,80	0,026%
1824. ALFREDO IRIARTE SEDE C	$ 1.426.362,00	0,027%
1825. LA PAZ SEDE A	$ 968.697,80	0,018%
1837. JOSE MARTI SEDE B	$ 2.261.441,80	0,043%
1838. COLOMBIA VIVA SEDE A	$ 3.035.612,56	0,058%
1842. ALEXANDER FLEMING SEDE A	$ 2.263.218,24	0,043%
1844. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SEDE A	$ 1.703.490,76	0,032%
1847. JOSE MARTI SEDE E	$ 661.999,60	0,013%
1907. EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE A	$ 1.131.516,44	0,022%
1935. PARAISO MIRADOR SEDE C	$ 998.734,88	0,019%
1966. LA ARABIA SEDE B	$ 1.257.157,00	0,024%
1975. PARAISO MIRADOR SEDE A	$ 354.795,52	0,007%
1976. PARAISO MIRADOR SEDE B	$ 2.891.332,68	0,055%
594. FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 513.369,84	0,010%
1174. HUNZA SEDE D	$ 830.662,00	0,016%
590. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE B	$ 1.114.360,60	0,021%
TOTAL	$ 270.688.037,32	22,256%

OBSERVACIONES:	De acuerdo a la inversion ejecutada, durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2021 y el 22 de abril de 2021 para el corte de obra N°12, se señalizaron 134 colegios. Que se relacionaron anterioremente

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

INFORME MES 12 (MARZO 23 - ABRIL 22) - Técnico

En el siguiente cuadro se realiza un breve analisis de la cantidad de frentes solicitados durante el presente mes, asi como frentes terminados y frentes que quedaron en ejecucion para el siguiente periodo:


NUEVAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR LA SED PARA ESTE PERIODO	FRENTES ATENDIDOS DURANTE EL MES	FRENTES TERMINADOS EN EL MES	FRENTES EN EJECUCION	OBSERVACIONES
0	6	0	6	

ESTADISTICAS - MES 12

TOTAL DE EMERGENCIAS ATENDIDAS NUEVAS	6
TOTAL DE EMERGENCIAS ABIERTAS - MES ANTERIOR	18

EMERGENCIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD	CARACTERISTICAS DE LA EMERGENCIA	NUEVAS	%
HIDRAULICO	(Recuperar el suministro del recurso de agua en la institución y con esto la higiene del mismo)	2	33,3%
BATERIAS SANITARIAS	(Se recupera la higiene y salud en la institución)	1	16,7%
CUBIERTA	(Se recuepera la impermeabilización de cubierta y por ende el espacio afectado en la institución.)	1	16,7%
ESTRUCTURAL	(Atencion por riesgo de caida de elementos y condiciones de inseguridad en la sede)	2	33%

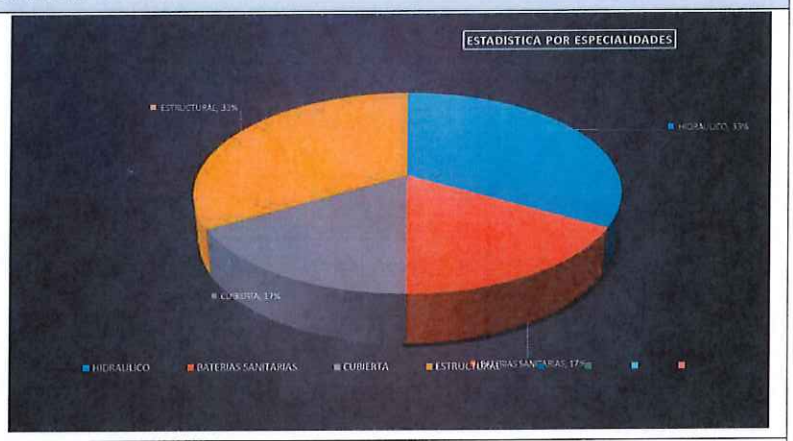

OBSERVACIONES:	De las emergencias que al presente corte fueron atenlidas por el contralista, se lienen que lass emergencias hidraulicas y estructurales equivalen a un 33% y las de cubierta un 16,7%. Estas emergencias se cuentran aun en ejecución y se espera que para el proximo mes, se pueda realizar el cierre financiero de las mismas.

Elaboro: Ing. Meliza Janez Gómez - Interventoria AC2R

LISTADO DE PRIORIZACION ENVIADOS POR LA SED	SEDES ATENDIDAS DURANTE EL MES	SEDES EJECUTADAS EN EL MES	SEDES EN EJECUCION	OBSERVACIONES
2	134	85	49	Se debe mejorar el rendimiento en la medicion y la elaboracion de las memorias de calculo para que los colegios que sean ejecutados durante el mes puedan ser cobrados oportunamente en el acta de corte en curso


ESTADISTICAS - MES 12

TOTAL DE SEDES NUEVAS ATENDIDAS	197
TOTAL DE SEDE ABIERTAS - MES ANTERIOR	37

SEDES INTERVENIDAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD	CARACTERISTICAS DE LA EMERGENCIA	EJECUTADAS	%
SEÑALIZACION (PINTURA)	Aplicacion de pintura amarilla y verde en las señales de circulacion en areas del piso	134	57,3%
SEÑALETICA (SEÑALES)	Instalacion de señales informativas, preventivas y reglamentarias en paredes y puntos donde se requiera	134	57,3%

SEDES INTERVENIDAS POR ESPECIALIDADES



SEDES ATENDIDAS DURANTE EL MES (marzo 23, 2021 - abril 22, 2021)



OBSERVACIONES:	De acuerdo a las 2 listados enviados por la SED durante este mes, se sigue presentando alta demanda en atencion de emergencias en las especialidad de SEÑALETICA (SEÑALES) con un 57%. De los 37 restantes que estaban abiertos del mes pasado se dan por cerrados 85 financieramente y siguen 49 abiertos para continuar con su respectiva ejecucion para el mes siguiente.

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

1.5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

A continuacion se muestra el resumen de actividades y cantidades ejecutadas por cada uno de los **137 frentes** de este mes para las actividades de señalizacion:

ID	CPF	SEDE (Acta 12)
S139	527	MARÍA MONTESSORI SEDE A (1501)
S140	521	MARÍA MONTESSORI SEDE B (1508)
S141	293	LA AMISTAD SEDE B (831)
S142	326	LA AMISTAD SEDE C (875)
S143	557	ANDRÉS BELLO SEDE A (1627)
S144	255	CIUDADELA BOSA SEDE A (753)
S145	319	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A (857)
S146	189	SAN CARLOS SEDE B (609)
S147	201	SAN CARLOS SEDE A (616)
S148	275	CLASS SEDE A (183)
S149	155	CIUDAD VILLAVICENCIO SEDE B (183)
S150	522	ATANASIO GIRARDOT SEDE A SEDE A (1502)
S151	531	ATANASIO GIRARDOT SEDE B (1512)
S152	301	CLASS SEDE C (839)
S153	320	CLASS SEDE B (860)
S154	690	JOSÉ MARÍA VARGAS VILA (1983)
S155	673	LEÓN GREIF SEDE A (1963)
S156	318	NICOLAS ESGUERRA SEDE A (856)
S157	152	DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C (542)
S158	151	DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B (541)
S159	176	DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A (576)
S160	229	GRAN COLOMBIANO SEDE D (724)
S161	225	GRAN COLOMBIANO SEDE C (720)
S162	223	GRAN COLOMBIANO SEDE B (718)
S163	213	GRAN COLOMBIANO SEDE A (706)
S164	205	TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE A (628)
S165	198	VENECIA SEDE B (618)
S166	665	SOTAVENTO SEDE A (1954)
S167	652	ARBORIZADORA ALTA SEDE B (1940)
S168	645	MINUTOS DE BUENOS AIRES SEDE B (1931)
S169	623	CANADA SEDE A (1908)
S170	254	JOSÉ FRANCISCO SOCARRAS SEDE A (752)
S171	523	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A (1503)
S172	118	BRASILIA SEDE A (508)
S173	529	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B (1510)
S174	127	RURAL EL CURIBTAL SEDE B (517)

S175	184	VENECIA SEDE A (602)
S176	114	ADMIRANTE PADILLA SEDE A (503)
S177	595	MANUEL DEL SOCORRO SEDE A (1830)
S178	609	MANUEL DEL SOCORRO SEDE B (1845)
S179	147	RURAL LOS ARRAYANES SEDE A (537)
S180	129	RURAL EL HATO SEDE A (519)
S181	228	CARLOS ALBAN HOLGUIM SEDE B (723)
S182	245	CARLOS ALBAN HOLGUIM SEDE C (743)
S183	119	BRAZUELOS (509)
S184	154	RURAL OLARTE SEDE A (544)
S185	140	RURAL LA ARGENTINA SEDE A (530)
S186	161	CORTIJO SEDE B (551)
S187	625	CIUDAD MONTREAL SEDE A (551)
S188	228	CARLOS ALBAN HOLGUIM SEDE B (723)
S189	637	LA ARABIA SEDE A (723)
S190	403	REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE A (1046)
S191	245	CARLOS ALBAM HOLGUIM SEDE C (1046)
S192	195	INEM SANTIAGO PEREZ SEDE A (615)
S193	194	TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE C (614)
S194	533	ANTONIO JOSE DE SUCRE (1601)
S195	107	LA VICTORIA SEDE B (459)
S196	252	GERMAN ARCINIEGA (459)
S197	141	LA AURORA DE USME (531)
S198	186	MARCO FIDEL SUAREZ (605)
S199	191	RUFINO JOSE CUERVO SEDE A (611)
S200	234	SAN BERBARDINO (729)
S201	144	RURAL LA MERCEDES (534)
S202	203	RUFINO JOSE CUERVO SEDE D (624)

ID	SEDE (Acta 13)
S203	SIMON RODIREGUEZ SEDE A (211)
S204	SIMON RODIREGUEZ SEDE B (207)
S205	ENTRE NUBES SEDE A (416)
S206	ENTRE NUBES SEDE b (439)
S207	VEINTE DE JULIO SEDE A (461)
S208	TABORA SEDE A (1001)
S209	GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE A (1010)
S210	NACIONES UNIDAS SEDE B (1017)
S211	NACIONES UNIDAS SEDE A (1028)
S212	MORISCO SEDE A (1026)
S213	REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE C (1058)
S214	TABORA SEDE B (1038)
S215	JAIME PARDO LEAL (1504)

S216	MIGUEL DE CERVANTES SEDE A (540)
S217	MIGUEL DE CERVANTES SEDE B (540)
S218	SANTA LIBRADA (546)
S219	PAULO FREIRER (578)
S220	GRAN YOMOSA (528)
S221	NICOLAS BUENAVENTURA SEDE A (1145)
S222	SAN BENITO ABAD SEDE A (623)
S223	O.E.A SEDE A (819)
S224	O.E.A SEDE B (807)
S225	ALEXANDER FLEMING SEDE A (1842)
S226	ALEXANDER FLEMING SEDE B (1803)
S227	ALEXANDER FLEMING SEDE C (1808)
S228	ALEXANDER FLEMING SEDE D (1815)
S229	COLOMBIA VIVA SEDE A (1838)
S230	ALQUERIA LA FRAGUA SEDEA (1838)
S231	CORTIJO SEDE A (516)
S232	ATHABANZA SEDE A (550)
S233	SANTA MARTHA SEDE A (547)
S234	SAN BENITO ABAD SEDE B (616)
S235	RURAL LOS ANDES (616)
S236	RURAL LA UNION (533)
S237	RURAL LA MAYORIA (532)
S238	FEDERICO GARCIA LORCA SEDE A (524)
S239	RURAL EL DESTINO (1110)
S240	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (566)
S241	LOS TEJARES SEDE B (562)
S242	HUNZA SEDE A (1110)
S243	HUNZA SEDE B (1119)
S244	HUNZA SEDE C (1103)
S245	HUNZA SEDE D (1103.1)
S246	EDUARDO UMAÑA MENDOZA (575)
S247	PARAISO MIRADOR SEDE A (1975)
S248	PARAISO MIRADOR SEDE B (1935)
S249	PARAISO MIRADOR SEDE C (1976)
S250	ORLANDO HUIGITA SEDE A (747)
S251	ORLANDO HUIGITA SEDE B (747)
S252	RURAL CHIZACA (511)
S253	LA ARABIA SEDE B (1966)
S254	BUENOS AIRES SEDE A (1907)
S255	JOSE MARTI SEDE E (1847)
S256	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (1844)
S257	JOSE MARTI SEDE B (1837)
S258	ALFREDO IRIARTE SEDE C (1824)

S259	ALFREDO IRIARTE SEDE B (1813)
S260	PABLO TARZO SEDE A (714)
S261	PABLO TARZO SEDE B (725)
S262	LA FELICIDAD (919)
S263	LLANO ORIENTAL SEDE A (708)
S264	BERNARDO JARAMILLO SEDE A (625)
S265	ORLANDO FALS SEDE A (581)
S266	FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C (565)
S267	LOS TEJARES SEDE A (539)
S268	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS SEDE A (543)
S269	FABIO LOZANO SEDE C (525)
S270	FABIO LOZANO SEDE A (523)
S271	FABIO LOZANO SEDE B (513)
S272	FEDERICO GARCIA SEDE B (507)
S273	JUANA ESCOBAR SEDE C (449)
S274	JUAN REY SEDE A (433)
S275	LA PAZ SEDE A (1825)

En la revisión del acta 12 Y 13 que corresponde a los colegios ejecutados en el periodo del 23 de marzo de 2021 al 22 de Abril de 2021, se observaron errores ortográficos de digitación, razón por la cual se realizara la corrección de estos en el Acta 14.

A continuación, se relacionan los errores de digitación presentes en el acta 12.

NOMBRE DE INSTITUCIÓN MAL DIGITADA	NOMBRE DE INSTITUCIÓN CORRECTA
BRASILIA SEDE A (508)	508. BRASILIA - USME SEDE A
BRAZUELOS (509)	509. BRAZUELOS SEDE A
RURAL EL CURIBTAL SEDE B (517)	517. RURAL EL CURUBITAL SEDE A
RURAL LA ARGENTINA SEDE A (530)	530. LA ARGENTINA SEDE A
LA AURORA DE USME (531)	531. LA AURORA SEDE A
RURAL LA MERCEDES (534)	534. RURAL LAS MERCEDES SEDE A
DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B (541)	576. MONTEBLANCO SEDE B
DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C (542)	542. MONTEBLANCO SEDE C
CIUDAD VILLAVICENCIO SEDE B (183)	545. CIUDAD DE VILLAVICENCIO SEDE B
CORTIJO SEDE B (551)	551. EL CORTIJO - VIANEY SEDE B
DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A (576)	541. MONTEBLANCO SEDE A
MARCO FIDEL SUAREZ (605)	605. MARCO FIDEL SUAREZ SEDE A
SAN CARLOS SEDE B (609)	609. JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN

TECNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE C (614)	614. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE C
SAN CARLOS SEDE A (616)	622. JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN
TECNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE A (628)	628. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE A
CARLOS ALBAN HOLGUIM SEDE B (723)	723. CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE B
SAN BERBARDINO (729)	729. SAN BERNARDINO SEDE A
CARLOS ALBAN HOLGUIM SEDE C (743)	743. CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C
GERMAN ARCINIEGA (459)	750. BRASIL - LOPEZ QUINTANA - GERMAN ARCINIEGAS SEDE A
CIUDADELA BOSA SEDE A (753)	753. CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA - EL PORVENIR SEDE A
NICOLAS ESGUERRA SEDE A (856)	856. COLEGIO NACIONAL NICOLAS
MARIA MONTESSORI SEDE B (1508)	1501. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA SEDE B
ATANASIO GIRARDOT SEDE A SEDE A (1502)	1502. ATANASIO GIRARDOT SEDE A
MARIA MONTESSORI SEDE A (1501)	1508. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA SEDE A
ANTONIO JOSE DE SUCRE (1601)	1601. ANTONIO JOSE DE SUCRE SEDE A
MANUEL DEL SOCORRO SEDE A (1830)	1830. MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ SEDE A
MANUEL DEL SOCORRO SEDE B (1845)	1845. MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ SEDE B
CIUDAD MONTREAL SEDE A (551)	1910. CIUDAD DE MONTREAL SEDE A
LA ARABIA SEDE A (723)	1923. LA ARABIA SEDE A
MUNUTOS DE BUENOS AIRES SEDE B (1931)	1931. EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE
LEON GREIF SEDE A (1963)	1963. LEON DE GREIFF SEDE A
JOSE MARIA VARGAS VILA (1983)	1983. JOSE MARIA VARGAS VILA SEDE A

A continuación, se relacionan los errores de digitación presentes en el acta 13.

NOMBRE DE INSTITUCIÓN MAL	NOMBRE DE INSTITUCIÓN CORRECTA
SIMON RODIREGUEZ SEDE A (211)	211. SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE A
ENTRE NUBES SEDE A (416)	416. ENTRE NUBES SUR ORIENTAL SEDE A
ENTRE NUBES SEDE b (439)	439. ENTRE NUBES SUR ORIENTAL SEDE B
JAIME PARDO LEAL (1504)	1504. CEDIT JAIME PARDO LEAL SEDE A
MIGUEL DE CERVANTES SEDE A (540)	540. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE A
MIGUEL DE CERVANTES SEDE B (540)	590. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE B

SANTA LIBRADA (546)	546. SANTA LIBRADA SEDE A
PAULO FREIRER (578)	578. NUEVO MILENIO (PAULO FREIRE) SEDE A
GRAN YOMOSA (528)	528. GRAN YOMASA SEDE A
NICOLAS BUENAVENTURA SEDE A	1145. CHORRILLOS NICOLAS BUENAVENTURA
ALQUERIA LA FRAGUA SEDEA (1838)	806. ALQUERIA DE LA FRAGUA SEDE A
CORTIJO SEDE A (516)	516. EL CORTIJO - VIANEY SEDE A
ATHABANZA SEDE A (550)	550. ATABANZA SEDE A
RURAL LOS ANDES (616)	536. RURAL LOS ANDES SEDE A
RURAL LA UNION (533)	533. RURAL LA UNION USME SEDE A
RURAL LA MAYORIA (532)	532. RURAL LA MAYORIA SEDE A
RURAL EL DESTINO (1110)	518. EL DESTINO SEDE A
LUIS EDUARDO MORA OSEJO (566)	566. MORA OSEJO - NUEVO MONTEBLANCO
HUNZA SEDE D (1103.1)	1174. HUNZA SEDE D
EDUARDO UMAÑA MENDOZA (575)	575. EDUARDO UMAÑA MENDOZA SEDE A
PARAISO MIRADOR SEDE B (1935)	1976. PARAISO MIRADOR SEDE B
PARAISO MIRADOR SEDE C (1976)	1935. PARAISO MIRADOR SEDE C
ORLANDO HUIGITA SEDE A (747)	747. LA LIBERTAD - ORLANDO HIGUITA ROJAS
ORLANDO HUIGITA SEDE B (747)	732. LA LIBERTAD - ORLANDO HIGUITA ROJAS
RURAL CHIZACA (511)	511. RURAL CHIZACA SEDE A
BUENOS AIRES SEDE A (1907)	1907. EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE A
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	1844. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SEDE
PABLO TARZO SEDE A (714)	714. PABLO DE TARSO SEDE A
PABLO TARZO SEDE B (725)	725. PABLO DE TARSO SEDE B
LA FELICIDAD (919)	925. LA FELICIDAD SEDE A
ORLANDO FALS SEDE A (581)	581. BARRANQUILLITA NUEVO SEDE A
FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	594. FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C
FABIO LOZANO SEDE C (525)	525. FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE C
FABIO LOZANO SEDE A (523)	523. FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE A
FABIO LOZANO SEDE B (513)	513. FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE B
FEDERICO GARCIA SEDE B (507)	507. FEDERICO GARCIA LORCA SEDE B
SIMON RODIREGUEZ SEDE B (207)	207. SIMON RODRIGUEZ SEDE B

1.6. CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

A continuación, se realizará una trazabilidad de todos los aspectos relevantes y no tan relevantes que se han desarrollado en el contrato en cuanto a control, vigilancia y seguimiento de la FIRMA INTERVENTORA hacia el contratista CONSTRUSOCIAL S.A.S

Durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2021 a 23 de abril de 2021 correspondiente al mes 14, se presentaron inconvenientes los cuales generaron atrasos en el cumplimiento del cronograma de obra entregado para la adición las situaciones presentadas son relacionadas a continuación:

1. MOVILIDAD RESTRINGIDA (CUARENTENAS) AFECTACIÓN DEBIDO AL COVID-19

Por motivo de dichas restricciones el rendimiento de la jornada laboral se vio afectada drásticamente, si bien es cierto que la normatividad permitía la movilidad para el desarrollo de las actividades de obra civil y atención de emergencias, la mayoría de la mano de obra calificada necesaria para el desarrollo de las actividades de Señalización y Señalética, contratada por el constructor, se quedó aislada acatando las medidas preventivas declaradas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y así poder prevenir la exposición al contagio y preservar la vida de sus familias, así como se presentaron casos que por desconocimiento e idiosincrasia del personal de mano de obra, la no asistencia a los frentes de trabajo por miedo a exponerse a una multa por parte de las autoridades, de otra parte los trabajadores que salían a desarrollar las actividades presentaban retrasos en el inicio de la jornada laboral causadas por retenes policiales, lo que conllevo a retrasos en la programación entregada inicialmente en un aproximado de 20 días calendario lo cual también hubo restricciones de toques de queda que no permitieron trabajos nocturnos de las cuadrillas.

2. INGRESOS A LOS COLEGIOS.

Si bien es cierto que la Secretaria de Educación ha realizado la gestión correspondiente con las Direcciones Locales de Educación y rectorías, para que se generara el permiso de ingreso sin contratiempos en los colegios, en el 60% de los casos de ingreso se generaron retrasos aproximados de entre 40 minutos y 1: 30 una hora y media mientras los guardias del empresas de vigilancia de cada una de las sedes a intervenir, rectifican la información con sus supervisores o los funcionarios administrativos de los colegios; destacando que en algunos casos se negó el día de la primer visita totalmente el acceso al colegio.

Lo anterior retrasó los rendimientos de la actividad teniendo en cuenta que de los 60 colegios que se encuentran ejecutados y en ejecución, en todos se ha presentado problemática de ingreso lo que se ve afectado en 8 días calendario de retraso en la programación inicial. De los 137 colegios liquidados en el acta parcial N°12 los colegios que presentaron una demora para acceder de más de hora y media son:

- ANDRÉS BELLO SEDE A,B
- NICOLAS ESGUERRA SEDE A
- TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE A
- MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B
- RURAL CURUBITAL SEDE A
- ALMIRANTE PADILLA SEDE A
- REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE A
- INEM SANTIAGO PÉREZ SEDE A
- MORISCO SEDE A
- MIGUEL DE CERVANTES SEDE A
- ALEXANDER FLEMING SEDE B
- REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SEDE A
- LA PAZ SEDE A



3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- ***DESPLAZAMIENTOS Y LISTADOS HABILITADOS***

En el proceso de solicitud de adición del contrato se notificó por parte de la SED 362 sedes de colegios para la cual se presentó por parte del contratista una programación inicial la cual fue aprobada sin que se requiriera ampliar el plazo inicial del contrato, la cual fue contemplada y logísticamente planteada realizar su ejecución por localidades y sectores de la ciudad, para disminuir los tiempos de desplazamiento excesivo entre las bodegas de acopio de insumos y las sedes educativas de los colegios a ejecutar en el contrato, sin embargo por la necesidad del servicio presentada por la Secretaria de Educación, fue modificada la lista de atención de los colegios por listas de atención prioritaria basada en la metodología de aprobación de la habilitación de los protocolos de bioseguridad, en tres ocasiones lo cual genero, la necesidad de reprogramar la logística desarrollada para atender oportunamente los requisitos de la SED, lo que nos conlleva a retrasos en la programación derivados de los tiempos de desplazamiento entre las sedes de diferentes localidades, durante el día.

Los colegios donde que se encontraban dentro de los listados habilitados y que generaron mayores tiempos de desplazamiento entre localidades y la bodega son los relacionados a continuación:

- LEÓN DE GREIFF SEDE A
- DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A,B,C
- ARBORIZADORA ALTA SEDE B
- MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B
- RURAL EL CURUBITAL


- ALMIRANTE PADILLA SEDE A
- RURAL LOS ARRAYANES SEDEA
- RURAL EL HATO SEDE A
- RURAL OLARTE SEDE A
- RURAL LA ARGENTINA SEDE A
- CUIDAD DE MONTREAL SEDE A
- LA AURORA DE USME SEDE A
- RURAL LAS MERCEDES SEDE A
- MIGUEL DE CERVANTES SEDE A
- NICOLAS BUENAVENTURA SEDE A
- RURAL LOS ANDES SEDE A
- RURAL LA MAYORÍA SEDE A
- PARAÍSO MIRADOR SEDE A,B,C
- RURAL CHIZACA SEDE A
- MINUTOS DE BUENOS AIRES SEDE A
- JUAN REY SEDE A

- ***PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE PINTURA***

Actualmente se emplea la máquina de aspersión, al utilizarla inicialmente aplicando el imprimante y al requerir cambiarlo por la pintura amarilla o verde, la maquina debe tener un proceso de "purgado" limpieza que se debe realizar obligatoriamente para evitar modificaciones en el tono del siguiente color a emplear, igualmente se debe tener en cuenta que para que la maquina tenga un correcto funcionamiento durante las jornadas laborales debe tener periodos de limpieza para evitar daños, los periodos de limpieza y de "purgado" emplean entre 40 min a 1 hora tiempo promedio, este procedimiento retrasa el tiempo programado inicial, si bien es cierto que este es el método que menos tiempo emplea en la ejecución de la señalización en pintura en los colegios, estos procesos generan un retraso de 2 horas diarias, resultantes de la limpieza al inicio para cargar la maquina con el imprimante, luego en la mitad de la jornada el cambio de imprimante a color amarillo y luego a color verde, estas actividades han retrasado la programación general de un rendimiento basado en el APU de aproximadamente 66 ML al día por cuadrilla a un total de aproximadamente 60 ML al día por cuadrilla, este procedimiento fue ejecutado en los 37 colegios proyectados en el acta parcial N°11.

- ***FLECHAS Y LÍNEAS DIVISORIAS EN LAS ESCALERAS***

Después de iniciar la ejecución de actividades se hizo evidente que la plantilla generada para pintar las flechas de ingreso y salida y la plantilla para pintar línea divisoria no es apropiada para ejecutar la señalización en las escaleras por lo que se hace necesario formar las flechas y línea divisoria en sitio empleando cinta de enmascarar como se muestra en el siguiente registro fotográfico y se describe a continuación:

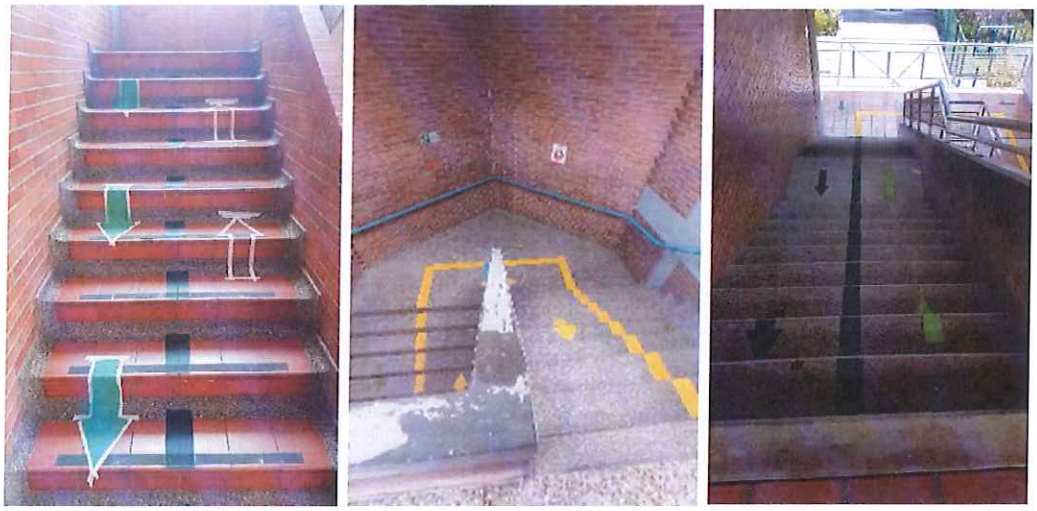

En sitio se definió realizar un trabajo casi artesanal comenzando la ubicación central del eje en el que se pintara la línea divisoria según el ancho de la escalera y la formación con cinta de enmascarar sobre la huella del paso del área a demarcar en pintura amarilla de un grosor de 0.12 mts, posterior a esto se demarcan las flechas con el mismo método empleado anteriormente, trazando un eje equidistante al eje de la línea amarilla y sobre este eje se demarca la flecha en planta con las dimensiones aprobadas en cinta de enmascarar; sin embargo a diferencia de la línea amarilla usando la contrahuella del paso se unen las demarcaciones de las flechas en planta.

Si se realiza una comparación entre el tiempo implementado en la ejecución de la pintura de la línea divisoria y en las flechas con plantilla con el método que debe ser empleado con cinta de enmascarar en la escalera se entiende que se cuadriplica el tiempo de ejecución debido a que se empleaban 3 minutos con plantilla y se emplean 12 minutos con cinta de enmascarar por metro lineal. Esto conlleva un retraso de aproximadamente medio día en colegios medianos y un día en colegios grandes teniendo en cuenta el número de puntos fijos, este retraso se hizo evidente en mayor medida en los siguientes colegios:


- MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A
- CIUDADELA DE BOSA SEDE A
- INEM SANTIAGO PÉREZ SEDE A
- SAN BERNARDINO SEDE A
- MIGUEL DE CERVANTES SEDE A
- CLASS SEDE A
- CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE A
- O.E.A SEDE A
- MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE A
- CIUDADELA DE BOSA SEDE A

Los hechos relacionados anteriormente han alterado el cumplimiento del cronograma inicial posiblemente generando una motivación a solicitud de prórroga.

LLUVIAS.

Entre los días del 23 de marzo al 22 abril del 2021 se continuo con el periodo de lluvias, lo cual genera atrasos en la programación de ejecución de obra pintura y señalética en zonas abiertas. Cuando se presenta el fenómeno natural de lluvia aparte de retrasar la actividad en el momento de la lluvia en las zonas exteriores de la institución educativa también afecta la aplicación del producto el día siguiente ya que el suelo estando húmedo no se puede aplicar la pintura porque a ser una pintura de trafico y tener componentes en base de aceite no tiene adherencia al estar el suelo húmedo entonces el proceso se atrasa hasta que la superficie este totalmente seca.



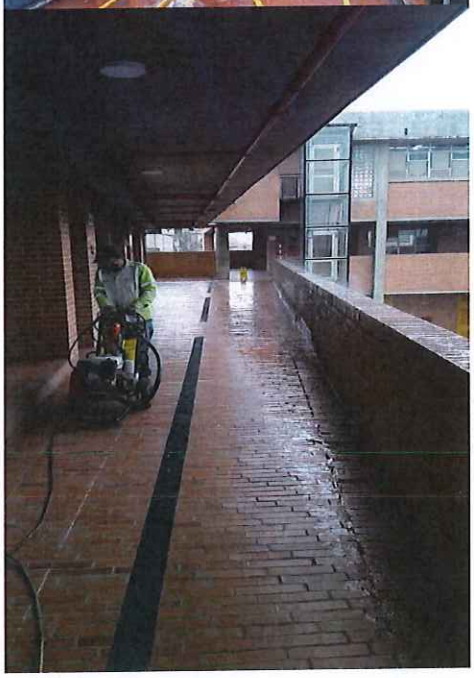


Anéxanos un listado de instituciones educativas que no se pudieron iniciar por factores climáticos

- SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE A,B,C
- ENTRENUBES SEDE A,B
- NACIONES UNIDAS SEDE A,B
- GRAN YOMASA
- ALEXANDER FEMING SEDE C,D
- SAN BENITO DE ABAD SEDE A,B
- LUIS EDUARDO MORA SEDE A
- HUNZA SEDE A,B,C,D
- PARAÍSO MIRADOR SEDE A,B,C,D
- RURAL CHIZACA SEDE A
- BERNARDO JARAMILLO SEDE A
- JUAN REY SEDE A
- FABIO LOZANO SEDE A,B,C
- CIUDADELA DE BOSA SEDE A
- MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A
- CLASS SEDE C
- DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A,B,C
- RURAL LOS ARRAYANES SEDEA
- RURAL EL HATO SEDE A
- RURAL OLARTE SEDE A
- CIUDAD DE MONTREAL SEDE A

ADECUACIONES Y REMODELACIONES.

Las instituciones tenían adecuaciones y/o remodelaciones, ejecución de obras civiles, brigadas de aseo, señalización de cinta internamente en las aulas que disponían el espacio y sin consulta previa sacaban los pupitres al pasillo e interrumpen la ejecución de la actividad de señalización y señalética dando así atrasos a la actividad contratada.





Este retraso se hizo evidente en mayor medida en los siguientes colegios:

- ALEXANDER FLEMING SEDE A,D
- MORISCO SEDE A

- JAIME PARDO LEAL SEDE A
- HUNZA SEDE C
- ORLANDO HIGUITA SEDE B
- JUAN ESCOBAR SEDE C
- CLASS SEDE C

CASOS POSITIVOS DE COVID

En las cuadrillas encargadas por instalar la señalética del contratista Construsocial sus seis miembros (la interventoría abstiene de dar los datos personales de las personas hasta no tener autorización por parte de ellos.) dieron positivo para Covid 19. lo cual genero un atraso de 14 días de aislamiento de este personal lo cual el contratista y la interventoría esperaron que cumplieran con el aislamiento establecido de 14 días lo cual genero atraso en la instalación de las señaléticas.

Lo cual la firma interventora determina que estos agentes externos dan para una prórroga del contrato para la culminación de la señalización y la señalética.

2. RESUMEN DEL ESTADO CONTRATO DE OBRA

Ingeniería & Proyectos S.A.S	**INFORME MENSUAL 12** **DEL 23 MARZO AL 22 ABRIL**	BOGOTÁ **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**

FECHA	ABRIL	**PERIODO**	12	**DEL**	23/03/2021	**AL**	22/04/2021
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES						
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES						

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
NIT. 819.002.537-3
RL RL: German Villanueva Calderon
C.C.
DIRECCION CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA
TELEFONO 4231714 / 3188430358
E-MAIL villanauta@yahoo.com

CONTRATO No.	**No. CO1.PCCNTR.1436286**			
FECHA DE SUSCRIPCION:	23 DE ABRIL DE 2020			
PLAZO INICIAL:	11 meses			
FECHA DE INICIACION:	23 DE ABRIL DE 2020			
FECHA DE TERMINACION:	22 DE MARZO DE 2021			
MODIFICATORIO N°1:	29 DE DICIEMBRE DE 2020			
FECHA DE TERMINACION:	22 DE FEBRERO DE 2021			
MODIFICATORIO N°2:	19 DE FEBRERO DE 2021			
FECHA DE TERMINACION:	22 DE ABRIL DE 2021			
PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL:	364 dias	EQUIVALE AL		92%
VALOR INICIAL:	$	**3.571.094.800,00**		**COP**
VALOR ADICIONADO N°1:	$	**1.714.125.504,00**		**COP**
VALOR ADICIONADO N°2:	$	**1.941.512.788,00**		
VALOR TOTAL:	$	**7.226.733.092,00**		**COP**
VALOR PAGADO:	Mensual	$ **4.114.038.183,00**		**COP**
VALOR POR PAGAR:	$	**3.112.694.909,00**		**COP**

2.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS

ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	23/04/2020
ACTA DE TERMINACION	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.2 ASPECTO JURIDICO

LEGALIZACION DEL CONTRATO	**FECHA**
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	23 de Abril de 2020
OTRO SI, MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	**FECHA**
MODIFICATORIO N°1	29 de Diciembre de 2021
MODIFICATORIO N°2	19 de Febrero de 2021

POLIZAS INICIALES

ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	16/07/2021	$ 714.218.960,00	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	16/01/2024	$ 357.109.480,00	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/02/2021	16/01/2023	$ 714.218.960,00	APROBADO

	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23/04/2020	12/01/2021	$ 351.121.200,00	APROBADO

POLIZA No.21-44-101319813

POLIZAS MODIFICATORIO N°1

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	27/08/2021	$ 714.218.960,00	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	27/02/2024	$ 357.109.480,00	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/02/2021	27/02/2023	$ 714.218.960,00	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/02/2021	23/02/2021	$ 351.121.200,00	APROBADO

POLIZA No.21-44-101319813

POLIZAS MODIFICATORIO N°2

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EN TRAMITE			
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				

POLIZA No.21-44-101319813

2.3 ASPECTO FINANCIERO DE OBRA

AVANCE FINANCIERO

FECHA	ABRIL	PERIODO	12	DEL	23/03/2021	AL	22/04/2021

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286				
CORTE No.	12			
CONTRATO No.	No. CO1.PCCNTR.1436286			
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S			
NIT.	NIT: 819.002.537-3			
RL	RL: German Villanueva Calderon			
C.C.				
DIRECCION	CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA			
TELEFONO	4231714 / 3188430358			
E-MAIL	villanauta@yahoo.com - licitacionesdaff@gmail.com			
FECHA DE SUSCRIPCION:	23 DE ABRIL DE 2020			
PLAZO INICIAL:	11 meses			
FECHA DE INICIACION:	23 DE ABRIL DE 2020			
FECHA DE TERMINACION:	22 DE FEBRERO DE 2021			
MODIFICACION N°1:	19 DE FEBRERO DE 2021			
FECHA DE TERMINACION N°1:	22 DE ABRIL DE 2021			
PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL:	364 dias	EQUIVALE AL		86%
VALOR INICIAL:	$		3.571.094.800,00	COP

VALOR DEL CONTRATO	$	3.571.094.800,00	COP

CORTE No.	NOMBRE	PERIODO	VALOR DEL MES			%	SALDO POR FACTURAR	
1	CONSTRUSOCIAL S.A.S	ABRIL 23 - MAYO 22	Avance de Obra	$	331.769.486,00	9,29%	$ 3.239.325.314,00	90,71%
			SUBTOTAL	$	331.769.486,00	9,29%		
2	CONSTRUSOCIAL S.A.S	MAYO 23 - JUNIO 22	Avance de Obra	$	515.869.451,00	14,45%	$ 2.723.455.863,00	76,26%
			SUBTOTAL	$	515.869.451,00	14,45%		
3	CONSTRUSOCIAL S.A.S	JUNIO 23 - JULIO 22	Avance de Obra	$	254.265.529,00	7,12%	$ 2.469.190.334,00	69,14%
			SUBTOTAL	$	254.265.529,00	7,12%		
4	CONSTRUSOCIAL S.A.S	JULIO 23 - AGOSTO 22	Avance de Obra	$	517.255.081,00	14,48%	$ 1.951.935.253,00	54,66%
			SUBTOTAL	$	517.255.081,00	14,48%		
5	CONSTRUSOCIAL S.A.S	AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22	Avance de Obra	$	317.684.759,00	8,90%	$ 1.634.250.494,00	45,76%
			SUBTOTAL	$	317.684.759,00	8,90%		
6	CONSTRUSOCIAL S.A.S	SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 22	Avance de Obra	$	420.900.000,00	11,79%	$ 1.213.350.494,00	33,98%
			SUBTOTAL	$	420.900.000,00	11,79%		
7	CONSTRUSOCIAL S.A.S	OCTUBRE 23 - NOVIEMBRE 22	Avance de Obra	$	257.020.214,00	7,20%	$ 956.330.280,00	26,78%
			SUBTOTAL	$	257.020.214,00	7,20%		
8	CONSTRUSOCIAL S.A.S	NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 22	Avance de Obra	$	327.280.384,00	9,16%	$ 629.049.896,00	17,62%
			SUBTOTAL	$	327.280.384,00	9,16%		

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$	1.714.125.504,00	COP
VALOR TOTAL:	$	5.285.220.304,00	COP

9	CONSTRUSOCIAL S.A.S	DICIEMBRE 23 - ENERO 22	Avance de Obra	$	159.598.796,00	2,97%	$ 2.183.576.604,00	41,31%
			SUBTOTAL	$	159.598.796,00	2,97%		

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.


10	CONSTRUSOCIAL S.A.S	ENERO 23 - FEBRERO 22	Avance de Obra	$	581.231.179,00	11,00%	$ 1.602.345.425,00	30,32%
			SUBTOTAL	$	581.231.179,00	11,00%		
11	CONSTRUSOCIAL S.A.S	FEBRERO 23 - MARZO 22	Avance de Obra	$	431.163.304,00	8,16%	$ 1.171.182.121,00	22,16%
			SUBTOTAL	$	431.163.304,00	8,16%		


Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$	1.941.512.788,00	COP
VALOR TOTAL:	$	7.226.733.092,00	COP

12	CONSTRUSOCIAL S.A.S	MARZO 23 - ABRIL 22	Avance de Obra 12	$	411.268.759,00	10,54%	$ 2.350.914.970,00	33%
			Avance de Obra 13	$	350.511.180,00			
			SUBTOTAL	$	761.779.939,00	11%		

En las siguientes graficas se muestra el avance en pesos ($) y porcentaje (%), respectivamente, del valor facturado vs el valor pagado por parte de la SED al contratista de obra en el transcurso del contrato

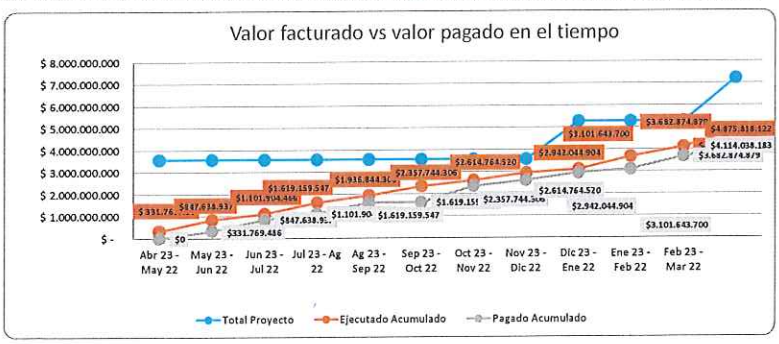

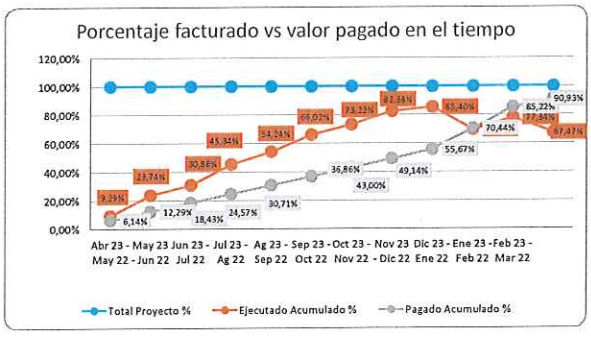

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES				
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES				
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286					
CORTE No.	12				
CONTRATO No.	**No. CO1.PCCNTR.1436286**	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 3.571.094.800,00	**FECHA**	2021
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S**	**FECHA ACTA DE INICIO**	23 DE ABRIL DE 2020	**DIAS DE EJECUCION**	364 días
OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES	**FECHA DE TERMINACION**	22 DE ABRIL DE 2021	**DIAS FALTANTES PARA TERMINACION**	59
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.571.094.800,00 COP				

CORTE No.	PERIODO	EJECUTADO % AVANCE PROGRAMADO ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO ACTUAL	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	FINANCIERO PROGRAMADO	PAGO REALIZADO POR LA SED	EJECUTADO	SALDO POR FACTURAR
1	ABRIL 23 - MAYO 22	6,1%	6,1%	9,29%	9,29%	$ 324.644.981,82	$ -	$ 331.769.486,00	$ 3.239.325.314,00
2	MAYO 23 - JUNIO 22	6,1%	12,3%	14,45%	23,74%	$ 324.644.981,82	$ 331.769.486,00	$ 515.869.451,00	$ 2.723.455.863,00
3	JUNIO 23 - JULIO 22	6,1%	18,4%	7,12%	30,86%	$ 324.644.981,82	$ 515.869.451,00	$ 254.265.529,00	$ 2.469.190.334,00
4	JULIO 23 - AGOSTO 22	6,1%	24,6%	14,48%	45,34%	$ 324.644.981,82	$ 254.265.529,00	$ 517.255.081,00	$ 1.951.935.253,00
5	AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22	6,1%	30,7%	8,90%	54,24%	$ 324.644.981,82	$ 517.255.081,00	$ 317.684.759,00	$ 1.634.250.494,00
6	SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 22	6,1%	36,9%	11,79%	66,02%	$ 324.644.981,82	$ -	$ 420.900.000,00	$ 1.213.350.494,00
7	OCTUBRE 23 - NOVIEMBRE 22	6,1%	43,0%	7,20%	73,22%	$ 324.644.981,82	$ 738.584.759,00	$ 257.020.214,00	$ 956.330.280,00
8	NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 22	6,1%	49,1%	9,16%	82,38%	$ 324.644.981,82	$ 257.020.214,00	$ 327.280.384,00	$ 629.049.896,00

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$ 1.714.125.504,00	COP
VALOR TOTAL:	$ 5.285.220.304,00	COP

9	DICEIMBRE 23 - ENERO 22	14,8%	55,67%	3,02%	85,40%	$ 781.058.466,67	$ 327.280.384,00	$ 159.598.796,00	$ 2.183.576.604,00

Nota aclaratoria: Se ingresa el tiempo adicional del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.


10	ENERO 23 - FEBRERO 22	14,8%	70,44%	11,00%	69,68%	$ 781.058.466,67	$ 159.598.796,00	$ 581.231.179,00	$ 1.602.345.425,00
11	FEBRERO 23 - MARZO 22	14,8%	85,22%	8,16%	77,84%	$ 781.058.466,67	$ 581.231.179,00	$ 431.163.304,00	$ 1.171.182.121,00


Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$ 1.941.512.788,00	COP
VALOR TOTAL:	$ 7.226.733.092,00	COP

12	MARZO 23 - ABRIL 23	34%	90,93%	10,54%	67,47%	$ 2.457.390.717,63	$ 431.163.304,00	$ 761.779.939,00	$ 2.350.914.970,00

En las siguientes graficas se muestra el avance en pesos ($) y porcentaje (%), respectivamente, del valor mensual programado por la SED vs el valor facturado por el contratista de obra durante el avance del contrato EL CONTRATO EXCEDE EL 100% DE

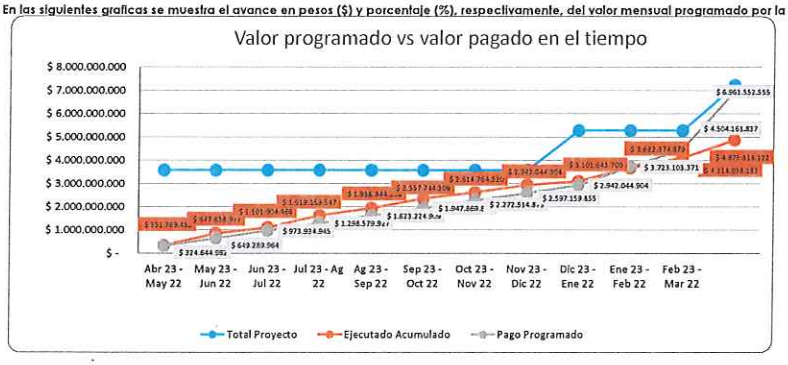

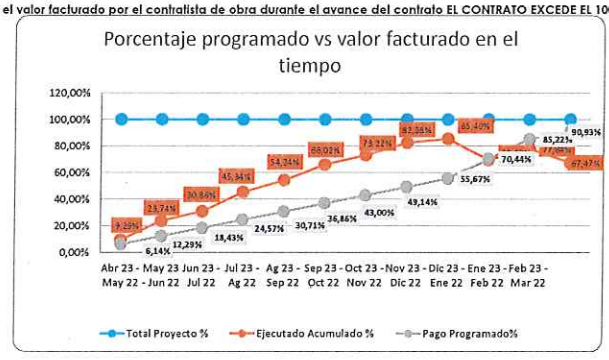


3. ACTA DE VISITA
ACTA DE INICIO
ACTA FINAL
INFORME FINAL POR SEDE

3.0 METODOLOGÍA POR PARTE DE INTERVENTORÍA

Con el fin de realizar un control y seguimiento optimo en el avance, ejecución, desarrollo y finalización de las diferentes actividades a desarrollar en cada uno de los frentes de trabajo reportados por parte de la SED para el presente contrato de emergencias, la interventoría implementa 5 formatos de gestión que serán aplicados durante todo el proceso y duración del contrato de obra e interventoría así:

- FORMATO - 01. ACTA DE VISITA – DIAGNOSTICO INICIAL: Formato destinado para identificar y realizar diagnóstico del problema. Este formato contiene:


- Datos básicos de los contratos de Obra e Interventoría
- Datos de la Institución que será atendida: (Nombre, Código de planta física, Dirección, Localidad)
- Fecha de la visita, tipo de emergencia y lugar.
- Descripción de la Emergencia: (según ficha de solicitud por parte de la SED)
- Diagnóstico de la Visita: (De acuerdo a la visita al sitio de la emergencia, se realiza la descripción y reporte de los problemas o daños encontrados según lo reportado en la ficha de solicitud de la SED)
- Recomendaciones: Se imparten instrucciones o sugerencias al contratista de obra por medio de un listado de actividades a ejecutar para atender y darle solución a la emergencia
- Registro fotográfico: se incluyen imágenes del estado inicial en que se encontraron las áreas y/o elementos a intervenir.
- Observaciones: se podrán incluir aclaraciones, comentarios o sugerencias de acuerdo a lo encontrado en el sitio de la visita.
- Firmas por parte del Representante del Contratista de obra e Interventoría

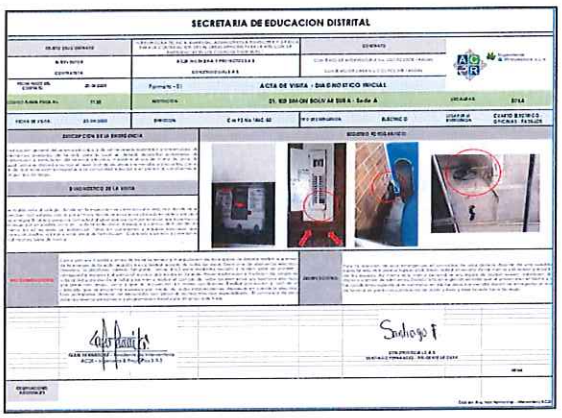
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

- FORMATO - 02. ACTA DE INICIO: Formato para dar aval e iniciar la atención de la emergencia. Este formato contiene:


- Datos básico y generales de los contratos
- Datos de la Institución que será atendida: (Nombre, Código de planta física, Dirección, Localidad)

- Fecha de Inicio, tipo de emergencia, lugar y tiempo estimado de duración de atención de la emergencia
- Clase de atención de la emergencia
- Actividades Iniciales a ejecutar
- Presupuesto y programación inicial
- Observaciones: se podrán incluir aclaraciones, comentarios o sugerencias.
- Firmas por parte del Representante del Contratista de obra e Interventoría

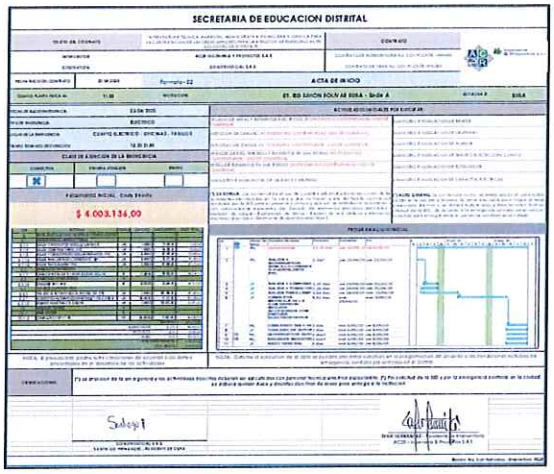

- FORMATO - 03. ACTA FINAL: Formato para verificar las actividades, presupuesto ejecutado y cierre de la atención de la emergencia. Este formato contiene:

- Datos básico y generales de los contratos
- Datos de la Institución atendida: (Nombre, Código de planta física, Dirección, Localidad)
- Fecha de terminación, tipo de emergencia y lugar de atención de la emergencia
- Clase de atención de la emergencia
- Calidad del trabajo ejecutado
- Actividades Finales ejecutadas
- Presupuesto Inicial y Presupuesto Final (nota aclaratoria de la variación del presupuesto en caso de que ocurra)
- Observaciones: se podrán incluir aclaraciones, comentarios o sugerencias de acuerdo a lo encontrado en el sitio de la visita.
- Firmas por parte del Representante del Contratista de obra e Interventoría

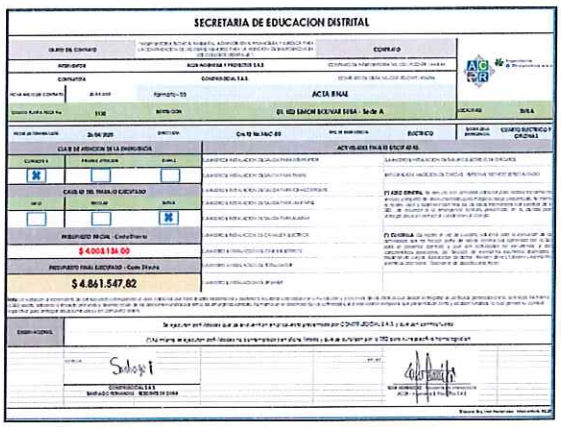

- FORMATO - 04. INFORME FINAL - Interventoría: Formato para informar el desarrollo y estado final de las actividades y áreas intervenidas. Este formato contiene:


- Datos básico y generales de los contratos
- Datos de la Institución atendida: (Nombre, Código de planta física, Dirección, Localidad)
- Tipo de emergencia, lugar de atención de la emergencia

- Clase de atención de la emergencia
- Emergencia Reportada
- Actividades Finales Ejecutadas
- Cantidades Ejecutadas
- Registro Fotográfico (inicial – durante y Final)
- Calidad del trabajo ejecutado
- Duración de la Obra (fecha de inicio – fecha de terminación – Días de ejecución)
- Recomendación de recibido
- Firmas por parte de Representantes de Interventoría



- FORMATO - 05. NOTIFICACIÓN DE ENTREGA: Formato donde se reciben las actividades ejecutadas y se notifica al funcionario de la SED el recibo a satisfacción de las mismas. Este formato contiene:

- Datos básico y generales de los contratos
- Datos de la Institución atendida: (Nombre, Código de planta física, Dirección, Localidad)
- Tipo de emergencia, lugar de atención de la emergencia
- Clase de atención de la emergencia
- Calidad del trabajo ejecutado
- Alcance de la Emergencia atendida
- Notificación a funcionario de la SED del recibo a satisfacción (nombre, cargo y medio por el cual se le informo)
- Firmas por parte del Representante del Contratista de obra e Interventoría

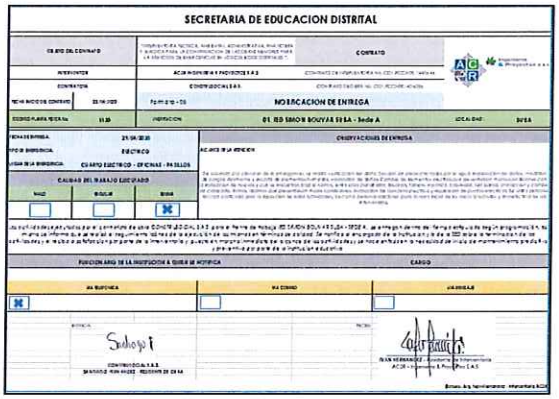

Nota: Este formato No.5, solo será tramitado y socializado una vez sea levantada la cuarentena establecida por el Distrito ya que será la SED quien designe el funcionario encargado para la notificación.

De esta manera y de acuerdo a lo anterior, presentamos dicha información para los diferentes frentes de trabajo que se han ejecutado en el presente periodo:

3.1 ACTAS DE SEGUIMIENTO A FRENTES DE OBRA ACTIVIDADES DE EMERGENCIA OBRA CIVIL

Mediante el presente numeral se relacionan las emergencias que continúan en ejecución, mostrando su estado de ejecución actual.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Mayo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 7.226.733.092,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Junio de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 1.065.195.180,00 COP

INFORME MES 12 (Marzo 23 - Abril 22)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baño Seco	2/10/2020	EN EJECUCION
2	124. IED GENERAL SANTANDER	Estructural	7/07/2020	EN EJECUCION
3	126. IED BICENTENARIO	Hidraulico	14/07/2020	EN EJECUCION
4	133. IED MARIA CANO	Hidraulico - Cubierta	22/10/2020	EN EJECUCION
5	136. IED MONTEBELLO	Estructural	22/10/2020	EN EJECUCION
6	149. IED GENERAL SANTANDER - Engativa	Cubierta	25/07/2020	EN EJECUCION

OBSERVACIONES:

MELIZA JANEZ GOMEZ – Residente De Interventoría
AC2R – INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

Elaboro: Ing. Meliza Janez Gómez - Interventoria AC2R

5973

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.14362B6	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME MES 12 (Marzo 23 - Abril 22)		
FECHA DE INICIO: 2/10/2020	INSTITUCION: 117. LOTE FONTANA GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1168	DIRECCION:	Cra.106 B No.151C-92	TIPO DE EMERGENCIA: BAÑO EN SECO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del día, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		
Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.		

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solcitado, asi como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA **EN EJECUCIÓN**

MELIZA JANEZ GOMEZ – Residente De Interventoría
AC2R – INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

Elaboro: Ing. Meliza Janez Gómez - Interventoria AC2R

5979

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME MES 12 (Marzo 23 - Abril 22)		
FECHA DE INICIO: 7/07/2020	INSTITUCION: 124. IED GENERAL SANTANDER	LOCALIDAD: USAQUEN	
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	138	DIRECCION:	CL 153 No. 8 56/58	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula polivalente provisional presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio generando una posible emergencia sanitaria por afectación de vías respiratorias una vez se reinicien las actividades académicas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400, CONCRETO DE LIMPIEZA, FUNDICIÓN DE BORDILLO, PLACA CONTRAPISO DE 10 cm, BAJANTE ESQUINA AULA 1, DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.) - SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.) - CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA EN EJECUCIÓN

MELIZA JANEZ GOMEZ – Residente De Interventoría
AC2R – INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

Elaboro: Ing. Meliza Janez Gómez - Interventoria AC2R

5975

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME MES 12 (Marzo 23 - Abril 22)		
FECHA DE INICIO: 7/07/2020	INSTITUCION: 126. IED BICENTENARIO		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			


CODIGO PLANTA FISICA No.	1986	DIRECCION:	Calle 81 Sur No 18 P 08	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La institución educativa se encuentra en emergencia de tipo sanitario, ya que no funciona correctamente el sistema hidráulico por deficiencias de presión evidenciada en las baterías de baños, generando que no se evacuen en su totalidad las aguas servidas, así como el sistema sanitario.

REGISTRO FOTOGRAFICO





ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.). DEMOLICION MUROS EN BLOQUE: E = 12 cm. PLACA CONTRAPISO DE 10 cm. BAJANTE ESQUINA AULA 1. BAJANTE ESQUINA AULA 1. DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.). SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.). CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO. ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" - ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4". ACCESORIOS PVC-P Ø 1" - ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4". ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2" - ACCESORIOS PVC-P Ø 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS - REGISTRO PASO DIRECTO DE 1 1/2"" KITZ O SIMILAR, TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1". TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4", TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2". TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2", RESANES GENERALES.

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA EN EJECUCION

MELIZA JANEZ GOMEZ – Residente De Interventoría
AC2R – INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

Elaboro: Ing. Meliza Janez Gómez - Interventoria AC2R

5976

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME MES 12 (Marzo 23 - Abril 22)		
FECHA DE INICIO: 7/07/2020	INSTITUCION: 133. IED MARIA CANO		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1859	DIRECCION: Transversal 5U #48J-30 sur	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: COMEDOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta sobre el hall principal y circulaciones presenta fallas en su impermeabilización evidenciada por humedades en su cara inferior generando filtración de aguas lluvias a este espacio y por ende el contacto de estas con el acabado de piso generando encharcamientos y la posibilidad de que cualquier persona sea de aseo, vigilancia, alumnos o docentes se resbalen y sufran lesiones.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TABLETA GRES LISO Y RECOLECCION DE RESIDUOS

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS Y LAS QUE NO FUERON INTERVENIDAS PERO SI AFECTADAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y trabajos de impermeabilizacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA **TERMINANDO**

MELIZA JANEZ GOMEZ – Residente De Interventoría
AC2R – INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

Elaboro: Ing. Meliza Janez Gómez - Interventoria AC2R

5977

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME MES 12 (Marzo 23 - Abril 22)		
FECHA DE INICIO: 14/07/2020	INSTITUCION: 136. IED MONTEBELLO		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 408	DIRECCION: Calle 26 sur No.1A-44 este	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE – EMT
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS
ASEO DE AREAS INTERVENIDAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 1#12 Y CABLEADO 1#10
ASEO DE AREAS INTERVENIDAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A.
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 Y CAJA DE PASO 10X10
ASEO DE AREAS INTERVENIDAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO DE 12
CM A DOBLE CARA"
SE REALIZAPON PRUEBAS A LAS LUMINARIAS INSTALADAS
ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA EN EJECUCIÓN

MELIZA JANEZ GOMEZ – Residente De Interventoría
AC2R – INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

Elaboro: Ing. Meliza Janez Gómez - Interventoria AC2R

5978

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME MES 12 (Marzo 23 - Abril 22)		
FECHA DE INICIO: 7/07/2020	INSTITUCION: 149. IED GENERAL SANTANDER		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1015	DIRECCION:	Calle 65 A No 123 42	TIPO DE EMERGENCIA:	CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta adyasente a las áreas admistrativas del tercer piso presenta fallas en su impermeabilización generando filtración de aguas lluvias a los espacios inferiores del segundo piso, afectando algunas instalaciones eléctricas por el contacto del agua, produciendo variaciones de carga, cortos circuitos y conatos de incendio, así como serias inundaciones en dichos espacios.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)
AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm
APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm
ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en actividades de obra civil e impermeabilizacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA **EN EJECUCIÓN**

MELIZA JANEZ GOMEZ – Residente De Interventoría
AC2R – INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

Elabore: Ing. Meliza Janez Gómez - Interventoria AC2R

5979

3.2 ACTAS DE SEGUIMIENTO A FRENTES DE OBRA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y SEÑALÉTICA

Las actas relacionadas a continuación corresponden a las sedes cobradas en el acta parcial N°12 y 13, con el fin de realizar un reporte de interventoría detallado por cada una de las sedes, se adjunta:

1. Acta de diagnóstico.
2. Acta de inicio.
3. El acta final no se adjunta al informe N°12, debido a que por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, en cuanto las observaciones sean atendidas se adjuntaran al informe final.
4. El Informe final no se adjunta al informe N°12, debido a que por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, en cuanto las observaciones sean atendidas se adjuntaran al informe final.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1508	INSTITUCIÓN:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA SEDE A	LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO
FECHA DE VISITA: 30/03/2021	DIRECCIÓN:	CL 14 SUR # 14 - 36 -- CL 14 SUR # 14 - 20	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN / LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se identifica unica puerta como principal para acceso y salida, se observa pisos encerados en ladrillo, no se evidencia ningun tipo de señalizacion se entrega al contratista para la ejecucion de las activades de demarcacion y señaletica

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1508	INSTITUCIÓN:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA SEDE A	LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	30/03/2021
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	6 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 13.839.631,04

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NO	ITEMS NO PREVISTOS				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 Ml.)	ML	2.176,25	$ 3.904,00	$ 8,496,080.00
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	96,00	$ 3.394,00	$ 325,424.00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 Ml. - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 Ml.)	UN	337,00	$ 3.345,00	$ 1,408,365.00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1,00	$ 8.256,00	$ 8,256.00
NPG0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	164,00	$ 8.256,00	$ 1,353,984.00
NPG1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	80,00	$ 3.845,00	$ 307,600.00
NPG2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$ 3.845,00	$ 3,845.00
NPG3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	46,00	$ 13.327,00	$ 613,042.00
NPG4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 Ml. - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 Ml.)	UN	337,00	$ 3.923,92	$ 1,323,035.04
				SUBTOTAL: $	$ 13,839,631.04
				ADMINISTRACIÓN 21,00%	$ 2,906,322.00
				IMPREVISTOS 2,00%	$ 276,793.00
				UTILIDAD 5,00%	$ 691,982.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO: $	$ 3,875,097.00
				TOTAL OFERTA: $	$ 17,714,729.04

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1508	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA SEDE A - NORMAL SUPERIOR DIST	9	30-03-21	07-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E:0,1 ML).	5	30-03-21	03-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	02-04-21	02-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML. - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	5	31-03-21	04-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	2	06-04-21	07-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	2	06-04-21	07-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	2	06-04-21	07-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	2	06-04-21	07-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	2	06-04-21	07-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	5	31-03-21	04-04-21



NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

5982

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1501	INSTITUCIÓN:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA SEDE B	LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO
FECHA DE VISITA: 30/03/2021	DIRECCIÓN:	CL 10 SUR # 13 - 27	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN / LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en concreto y baldosa

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1501	INSTITUCIÓN:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA SEDE B	LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	26/03/2021
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	9 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 5.842.479,44

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML)	ML	556,00	$ 3.904,00	$ 3,708,800.00
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	80,00	$ 2,794.00	$ 227,040.00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	82,00	$ 3,945.00	$ 323,490.00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	2,00	$ 8,256.00	$ 16,512.00
NPS60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	82,00	$ 8,256.00	$ 676,992.00
NPS61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	80,00	$ 2,875.00	$ 230,700.00
NPS62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$ 3,845.00	$ 3,845.00
NPS63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN	25,00	$ 13,327.00	$ 333,175.00
NPS64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	82,00	$ 3,925.92	$ 321,925.44
				SUBTOTAL $	$ 5,842,479.44
				ADMINISTRACION 21,00%	$ 2,226,921.00
				IMPREVISTOS 2,00%	$ 116,850.00
				UTILIDAD 5,00%	$ 292,124.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO $	$ 1,635,895.00
				TOTAL OFERTA $	$ 7,478,374.44

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.


Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1501	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA SEDE B - NORMAL SUPERIOR DIST	5	26-03-21	30-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	3	26-03-21	28-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	28-03-21	28-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	3	27-03-21	29-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	30-03-21	30-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	30-03-21	30-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	30-03-21	30-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	30-03-21	30-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	30-03-21	30-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	3	27-03-21	29-03-21

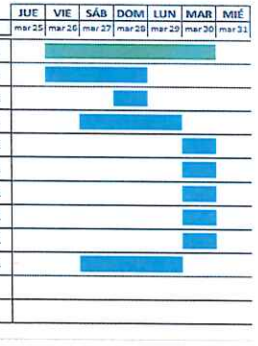

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES:	(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 831	INSTITUCIÓN:	LA AMISTAD SEDE B	LOCALIDAD: KENNEDY
FECHA DE VISITA: 30/03/2021	DIRECCIÓN: KR 83 # 38 B - 12 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en concreto y baldosa encerada

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

5985

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 831	INSTITUCIÓN:	LA AMISTAD SEDE B	LOCALIDAD: KENNEDY

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	30/03/2021
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	5 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 1.265.629,16

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VR UNIT	VR TOTAL
I	PRELIMINARES				
NO	ITEMS NO PRESUPUESTO				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML)	ML	200,00	$ 2,928.00	$ 585,600.00
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	20,00	$ 3,784.00	$ 75,680.00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	23,00	$ 3,945.00	$ 90,735.00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1,00	$ 8,256.00	$ 8,256.00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	15,00	$ 3,336.00	$ 288,960.00
NPG1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	11,00	$ 3,845.50	$ 42,295.00
NPG2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$ 3,845.00	$ 3,845.00
NPG3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	6,00	$ 13,327.00	$ 79,962.00
NPG4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	23,00	$ 3,925.92	$ 90,296.16
				SUBTOTAL	$ 1,265,629.16
				ADMINISTRACION 21,00%	$ 265,782.00
				IMPREVISTOS 2,00%	$ 25,313.00
				UTILIDAD 5,60%	$ 82,261.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 354,376.00
				TOTAL OFERTA	$ 1,620,005.16

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.


Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
831	LA AMISTAD SEDE B - LLANO GRANDE	4	23-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	2	23-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	24-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	24-03-21	25-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	26-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	26-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	26-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	26-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	26-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	24-03-21	25-03-21



NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES:	(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA, Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 875	INSTITUCIÓN:	LA AMISTAD SEDE C	LOCALIDAD: KENNEDY
FECHA DE VISITA: 30/03/2021	DIRECCIÓN: KR 83 # 40 BIS - 36 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y accesos en concreto

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq. Ivan Hernández - Interventoría AC2R

5987

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 875	INSTITUCIÓN:	LA AMISTAD SEDE C	LOCALIDAD: KENNEDY

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	30/03/2021
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	4 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 783.373,00

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

LA AMISTAD SEDE - C (Pinar del Rio)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEM NO PREVISTO				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	72,00	$3.904,00	$281.088,00
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	20,00	$2.784,00	$37.840,00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	10,00	$3.945,00	$39.450,00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1,00	$8.256,00	$8.256,00
NPS8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	15,00	$8.216,00	$123.840,00
NPS1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	10,00	$3.845,00	$38.450,00
NPS2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$3.845,00	$3.845,00
NPS3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	3,00	$13.327,00	$39.981,00
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	10,00	$3.926,00	$39.260,00
				SUBTOTAL	$613.010,00
				ADMINISTRACIÓN 21,00%	$128.522,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$12.240,00
				UTILIDAD 5,00%	$30.601,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$771.363,00
				TOTAL GENERAL	$783.373,00

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
875	LA AMISTAD SEDE C - PINAR DEL RIO	2	23-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	1	23-03-21	23-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	24-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	1	24-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	24-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	24-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	24-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	24-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	24-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	1	24-03-21	24-03-21

LUN mar 22 | MAR mar 23 | MIÉ mar 24 | JUE mar 25

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernández - Interventoría AC2R

5358

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1627	INSTITUCIÓN:	ANDRES BELLO SEDE A	LOCALIDAD: PUENTE ARANDA
FECHA DE VISITA: 17/02/21	DIRECCIÓN: CL 39 SUR # 51 D - 19	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que hay presente una demarcacion previa la cual no corresponde con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:










RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

5923

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1627	INSTITUCIÓN:	ANDRES BELLO SEDE A	LOCALIDAD: PUENTE ARANDA

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	29/03/2021
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	3 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 11.275.120,36

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML)	ML	1.296,60	$ 3.984,50	$ 5,074,419.20
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	120,00	$ 3.784,00	$ 454,080.00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE, TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	525,00	$ 3.945,00	$ 2,047,455.00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	5,00	$ 8.256,00	$ 41,280.00
NPG0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	116,00	$ 8.256,00	$ 957,696.00
NPG1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	86,00	$ 3.845,00	$ 330,670.00
NPG2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	6,00	$ 3.845,00	$ 23,070.00
NPG3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	22,00	$ 13.327,00	$ 293,194.00
NPG4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	523,00	$ 3.925,92	$ 2,053,256.16
			-		
			-		
				SUBTOTAL	$ 11.275.120,36
				ADMINISTRACION 21,00%	$ 2.367.775,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$ 225.502,00
				UTILIDAD 5,00%	$ 563.756,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 3.157.033,00
				TOTAL OFERTA	$ 14.432.153,36

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.


Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1627	ANDRES BELLO SEDE A - ANDRES BELLO	4	23-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	2	23-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	24-03-21	24-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	24-03-21	25-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	26-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	26-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	26-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	26-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	26-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	24-03-21	25-03-21



NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA, Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 753	INSTITUCIÓN:	CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA - EL PORVENIR SEDE A	LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE VISITA: 29/03/2021	DIRECCIÓN:	CL 52 SUR # 97 C - 35	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN / LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa encerada y ascaleras en concreto

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq. Ivan Hernández - Interventoría AC2R

5091

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 753	INSTITUCIÓN:	CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA - EL PORVENIR SEDE A	LOCALIDAD: BOSA

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	29/03/2021
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	7 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 25.769.279,96

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	4.336,00	$ 3.964,00	$ 16.201.600,00
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	80,00	$ 3.784,00	$ 302.720,00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	424,00	$ 7.945,00	$ 3.246.735,00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	2,00	$ 8.256,00	$ 16.512,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	250,00	$ 8.256,00	$ 2.064.000,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	250,00	$ 1.995,60	$ 499.850,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$ 3.845,00	$ 3.845,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	55,00	$ 13.327,00	$ 732.985,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	688,00	$ 3.925,92	$ 2.701.032,96
NP65	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y ADHERENTE PARA TRAFICO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	0,00	$ 51.621,00	$ -
NP66	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y ADHERENTE PARA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	0,00	$ 25.274,90	$ -
				SUBTOTAL	$ 25.769.279,96
				ADMINISTRACION 21,00%	$ 5.411.549,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$ 515.386,00
				UTILIDAD 5,00%	$ 1.288.464,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 7.215.399,00
				TOTAL OFERTA	$ 32.984.678,96

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0.1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.


Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
753	CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA - EL PORVENIR SEDE A - CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA	5	23-03-21	27-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	3	23-03-21	25-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	25-03-21	25-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	3	24-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	27-03-21	27-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	27-03-21	27-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	27-03-21	27-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	27-03-21	27-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	27-03-21	27-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	3	24-03-21	26-03-21

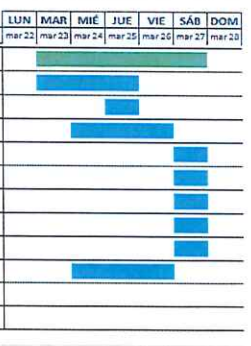

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernández - Interventoría AC2R

5992

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 857	INSTITUCIÓN:	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	LOCALIDAD: KENNEDY
FECHA DE VISITA: 25/03/2021	DIRECCIÓN: CL 56 SUR # 81 - 26	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y accesos en concreto

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contralista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq. Ivan Hernández - Interventoría AC2R

5393

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 857	INSTITUCIÓN:	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	LOCALIDAD: KENNEDY

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	31/03/2021
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	5 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 19.015.784,60

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
APU	ITEMS NO PRESUPUESTOS				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML)	ML	2.450,00	$ 3.984,00	$ 9.576.512,00
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	100,00	$ 3.784,00	$ 378.400,00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	755,00	$ 3.943,00	$ 2.978.475,00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	3,00	$ 8.256,00	$ 24.768,00
NPS10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	198,00	$ 8.256,00	$ 1.634.688,00
NPS11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	111,00	$ 3.845,00	$ 426.795,00
NPS12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	5,00	$ 3.845,00	$ 19.225,00
NPS13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	76,00	$ 13.317,00	$ 1.012.852,00
NPS14	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	751,00	$ 3.925,92	$ 2.964.069,60
NPS15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y ADHERENTE PARA TRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	0,00	$ 14.821,00	$ -
NPS16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y ADHERENTE PARA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML)	ML	0,00	$ 51.278,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 19.015.784,60
				ADMINISTRACIÓN 21,00%	$ 3.993.315,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$ 380.316,00
				UTILIDAD 5,00%	$ 950.789,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.324.420,00
				TOTAL OFERTA	$ 24.340.204,60

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
857	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A - MANUEL CEPEDA VARGAS	4	25-03-21	28-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	2	25-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	26-03-21	26-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	26-03-21	27-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	28-03-21	28-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	28-03-21	28-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	28-03-21	28-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	28-03-21	28-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	28-03-21	28-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	2	26-03-21	27-03-21

MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN
mar 24	mar 25	mar 26	mar 27	mar 28	mar 29

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernández - Interventoría AC2R

5994

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 609	INSTITUCIÓN:	JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS SEDE B	LOCALIDAD: TUNJUELITO
FECHA DE VISITA: 16/03/2021	DIRECCIÓN: KR 19 # 50 - 37 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y accesos en concreto

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq. Ivan Hernández - Interventoría AC2R

5993
