ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	XXX-RE003	**Fecha**	**20-04-21**	**Inicio**	**8:30a:m**	**Fin**	**9:40 a:m**	**Lugar**	**Reunión Virtual**
Proyecto	**Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20** **Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR 1440646**					**Asunto**	Comité No. 21 – Seguimiento de Obra		
Asistentes	**AC2R** : MELIZA GOMEZ - STELLA PINEDA - JUAN FELIPE URIBE - CAMILO ROSARIO					**Asistentes**	**CONSTRUSOCIAL** : SANTIAGO FERNANDEZ – DIEGO FERNANDEZ – GERMAN VILLANUEVA **SED**: EDWIN SANTANA		
Fecha de Elaboración	20-04-21	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

Se realiza reunión No.24 del **Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20** con la participación de las direcciones y residencias de obra a cargo del contratista CONSTRUSOCIAL S.A.S e interventoría a cargo del contratista AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S, como la supervisión de la interventoría a cargo de la SED para dar seguimiento a la ejecución contractual del proyecto de atención de emergencias donde se da análisis a los siguientes puntos:

- **ADMINISTRATIVO:**

Información por parte de la interventoría, de frentes de trabajo intervenidos de acuerdo a las fichas de solicitud generadas por la SED durante el periodo comprendido entre el entre el *23 de Marzo al 11 de Abril de 2021.*

SEMANA 48.2 (Marzo 23 - Marzo 28)

Página 1

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baño Seco	2/10/2020	EN EJECUCION
2	124. IED GENERAL SANTANDER	Estructural	7/07/2020	EN EJECUCION
3	126. IED BICENTENARIO	Hidraulico	14/07/2020	EN EJECUCION
4	133. IED MARIA CANO	Hidraulico - Cubierta	22/10/2020	EN EJECUCION
5	136. IED MONTEBELLO	Estructural	22/10/2020	EN EJECUCION
6	149. IED GENERAL SANTANDER - Engativa	Cubierta	25/07/2020	EN EJECUCION

SEMANA 50 (Abril 05-2021 - Abril 11-2021)

Página 1

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baño Seco	2/10/2020	EN EJECUCION
2	124. IED GENERAL SANTANDER	Estructural	7/07/2020	EN EJECUCION
3	126. IED BICENTENARIO	Hidraulico	14/07/2020	EN EJECUCION
4	133. IED MARIA CANO	Hidraulico - Cubierta	22/10/2020	EN EJECUCION
5	136. IED MONTEBELLO	Estructural	22/10/2020	EN EJECUCION
6	149. IED GENERAL SANTANDER - Engativa	Cubierta	25/07/2020	EN EJECUCION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	XXX-RE003	**Fecha**	**20-04-21**	**Inicio**	**8:30a:m**	**Fin**	**9:40 a:m**	**Lugar**	**Reunión Virtual**
Proyecto	**Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20** **Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR 1440646**					**Asunto**	Comité No. 21 – Seguimiento de Obra		
Asistentes	**AC2R** : MELIZA GOMEZ - STELLA PINEDA - JUAN FELIPE URIBE - CAMILO ROSARIO					**Asistentes**	**CONSTRUSOCIAL** : SANTIAGO FERNANDEZ – DIEGO FERNANDEZ – GERMAN VILLANUEVA **SED**: EDWIN SANTANA		
Fecha de Elaboración	20-04-21	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

SEMANA 48.2 (Marzo 23 - Marzo 28)
-Emergencias en la semana: 6
-Emergencias terminadas: 0
-Emergencias en ejecución: 6

SEMANA 50 (Abril 05-2021 - Abril 11-2021)
-Emergencias en la semana: 6
-Emergencias terminadas: 0
-Emergencias en ejecución: 6

Debido su alto grado de cuidado y complejidad siguen abiertos para este periodo y continúan para el siguiente periodo.

- **TECNICO:**
  Se realiza una presentación especifica por parte de la interventoría de algunos casos especiales acontecidos durante este periodo de tiempo que se consideran relevantes a ser reportadas, donde se brinda por parte la interventoría y contratista, la explicación y justificación y soporte técnico de necesidad y congruencia con el objeto contractual.

FINANCIERO:

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INVERSION	PORCENTAJE (%)
117	LOTE FONTANAR GRANDE	Baño Seco	$ 1.356.126,00	0,049%
124	IED GENERAL SANTANDER	Estructural	$ 8.799.238,53	0,315%
126	IED BICENTENARIO	Hidraulico	$ 10.895.345,23	0,391%
133	IED MARIA CANO	Hidraulico - Cubierta	$ 12.218.863,72	0,438%
136	IED MONTEBELLO	Estructural	$ 24.003.911,13	0,860%
149	IED GENERAL SANTANDER - Engativa	Cubierta	$ 2.449.624,94	0,088%
TOTAL INVERSION - OBRA			$ 59.723.109,56	2,1%

Para el presente periodo, el avance aproximado de obra para estas tres semanas es de **$ 59.723.109,56 –** costo directo, equivalente al **2,1%** aprox., del valor del contrato.

El avance total aproximado a la fecha es de **$ 2623537806,97**- costo directo, equivalente al **94,04%** aprox., del presupuesto Total del contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	XXX-RE003	**Fecha**	**20-04-21**	**Inicio**	**8:30a:m**	**Fin**	**9:40 a:m**	**Lugar**	**Reunión Virtual**
Proyecto	**Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20** **Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR 1440646**					**Asunto**	Comité No. 21 – Seguimiento de Obra		
Asistentes	**AC2R** : MELIZA GOMEZ - STELLA PINEDA - JUAN FELIPE URIBE - CAMILO ROSARIO					**Asistentes**	**CONSTRUSOCIAL** : SANTIAGO FERNANDEZ – DIEGO FERNANDEZ – GERMAN VILLANUEVA **SED**: EDWIN SANTANA		
Fecha de Elaboración	20-04-21	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

- **AMBIENTAL Y SISO:**

- Se envía correo electrónico solicitando las fichas de tratamiento silviculturales pendientes.
- Se remiten fichas de atención de tratamientos silviculturales aprobadas.
- Se realiza reunión presencial con el contratista para la revisión de fichas de tratamiento silvicultural de la Palestina.
- Se realiza verificación del cumplimiento de condiciones establecido por la Secretaría de Educación Distrital (SED) de acuerdo a las listas de chequeo de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo remitidas.

- **OBSERVACIONES Y VARIOS:**

Se le recomienda y recuerda al contratista de obra, que debido a la emergencia sanitaria presentada en la ciudad, las áreas intervenidas en cada uno de los colegios, deberán ser aseadas y desinfectadas a diario, así como una vez sean finalizadas para su respectiva entrega y recibido a satisfacción.

Se le recuerda al contratista de obra, la presentación oportuna de los conceptos técnicos, así como los presupuestos iniciales y programación respectiva para continuar o dar inicio a las actividades de emergencia reportadas

Así mismo se le recomienda al contratista de obra, dar celeridad a la terminación de las actividades que se encuentran actualmente en desarrollo en cada uno de los frentes de trabajo.

NOMBRE: Iván Hernández
CARGO: Residente de interventoría – AC2R contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1440646-20

NOMBRE: Luz Stella Pineda
CARGO: Especialista SISO - AC2R contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1440646-20

NOMBRE: Juan Felipe Uribe
CARGO: Director de Interventoría - contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1440646-20

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	XXX-RE003	**Fecha**	**20-04-21**	**Inicio**	**8:30a:m**	**Fin**	**9:40 a:m**	**Lugar**	**Reunión Virtual**
Proyecto	**Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20** **Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR 1440646**					**Asunto**	Comité No. 21 – Seguimiento de Obra		
Asistentes	**AC2R** : MELIZA GOMEZ - STELLA PINEDA - JUAN FELIPE URIBE - CAMILO ROSARIO					**Asistentes**	**CONSTRUSOCIAL** : SANTIAGO FERNANDEZ – DIEGO FERNANDEZ – GERMAN VILLANUEVA **SED**: EDWIN SANTANA		
Fecha de Elaboración	20-04-21	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

NOMBRE: David Palacios
CARGO: Especialista Ambiental - contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1440646-20

NOMBRE: Santiago Fernández
CARGO: residente de obra CONSTRUSOCIAL
Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20

NOMBRE: Diego Fernández
CARGO: Director de obra CONSTRUSOCIAL
Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20

NOMBRE: German Villanueva
CARGO: RL de CONSTRUSOCIAL
Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20

NOMBRE:
CARGO: Apoyo de la SED - contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20

NOMBRE: Edwin Santana
CARGO: Profesional Especialista SED - contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20

NOMBRE: CAMILO ROSARIO
CARGO: RL de AC2R- contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1440646-20

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	XXX-RE003	**Fecha**	**23-03-21**	**Inicio**	**8:15a:m**	**Fin**	**9:45 a:m**	**Lugar**	**Reunión Virtual**
Proyecto	**Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20** **Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR 1440646**					**Asunto**	Comité No. 22 – Seguimiento de Obra		
Asistentes	AC2R : IVAN HERNANDEZ - STELLA PINEDA - JUAN FELIPE URIBE - CAMILO ROSARIO					**Asistentes**	**CONSTRUSOCIAL** : SANTIAGO FERNANDEZ – DIEGO FERNANDEZ – GERMAN VILLANUEVA **SED**: EDWIN SANTANA		
Fecha de Elaboración	23-03-21	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

Se realiza reunión No.22 del **Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20** con la participación de las direcciones y residencias de obra a cargo del contratista CONSTRUSOCIAL S.A.S e interventoría a cargo del contratista AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S, como la supervisión de la interventoría a cargo de la SED para dar seguimiento a la ejecución contractual del proyecto de atención de emergencias donde se da análisis a los siguientes puntos:

- **ADMINISTRATIVO:**

Información por parte de la interventoría, de frentes de trabajo intervenidos de acuerdo a las fichas de solicitud generadas por la SED durante el periodo comprendido entre el entre el *08 de Marzo al 22 de Marzo de 2021.*

SEMANA 46 (Marzo 08 - Marzo 14)				
No.	COLEGIO	FECHA DE VISITA	INICIA	TERMINA
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	25/09/2020	2/10/2020	EN EJECUCION
2	124. IED GENERAL SANTANDER	5/10/2020	6/10/2020	EN EJECUCION
3	126. IED BICENTENARIO - Hidraulico	17/10/2020	17/10/2020	EN EJECUCION
4	133. IED MARIA CANO	21/10/2020	22/10/2020	EN EJECUCION
5	136. IED MONTEBELLO	21/10/2020	22/10/2020	EN EJECUCION
6	147. IED ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	13/11/2020	19/11/2020	EN EJECUCION
7	150. BODEGA ROSA ZARATE	13/11/2020	16/11/2020	EN EJECUCION
8	169. IED USAQUEN	23/09/2020	10/03/2021	11/03/2021
9	173. IED VENECIA		8/03/2021	9/03/2021
10	175. IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	9/02/2021	12/03/2021	EN EJECUCION
Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R				

SEMANA 46 (Marzo 08 – Marzo 14)

-Emergencias en la semana: 10
-Emergencias terminadas: 2
-Emergencias en ejecución: 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	XXX-RE003	**Fecha**	23-03-21	**Inicio**	8:15a:m	**Fin**	9:45 a:m	**Lugar**	**Reunión Virtual**
Proyecto	**Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20** **Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR 1440646**					**Asunto**	Comité No. 22 – Seguimiento de Obra		
Asistentes	AC2R : IVAN HERNANDEZ - STELLA PINEDA - JUAN FELIPE URIBE - CAMILO ROSARIO					**Asistentes**	**CONSTRUSOCIAL** : SANTIAGO FERNANDEZ – DIEGO FERNANDEZ – GERMAN VILLANUEVA **SED**: EDWIN SANTANA		
Fecha de Elaboración	23-03-21	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

SEMANA 47 (Marzo 15 - Marzo 21)				
No.	COLEGIO	FECHA DE VISITA	INICIA	TERMINA
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	25/09/2020	2/10/2020	EN EJECUCION
2	124. IED GENERAL SANTANDER	5/10/2020	6/10/2020	EN EJECUCION
3	126. IED BICENTENARIO - Hidraulico	17/10/2020	17/10/2020	EN EJECUCION
4	133. IED MARIA CANO	21/10/2020	22/10/2020	EN EJECUCION
5	136. IED MONTEBELLO	21/10/2020	22/10/2020	EN EJECUCION
6	147. IED ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	13/11/2020	19/11/2020	EN EJECUCION
7	150. BODEGA ROSA ZARATE	13/11/2020	16/11/2020	EN EJECUCION
8	175. IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	9/02/2021	12/03/2021	21/03/2021
Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R				

SEMANA 48.1 (Marzo 22 - Marzo 22)				
No.	COLEGIO	FECHA DE VISITA	INICIA	TERMINA
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	25/09/2020	2/10/2020	EN EJECUCION
2	124. IED GENERAL SANTANDER	5/10/2020	6/10/2020	EN EJECUCION
3	126. IED BICENTENARIO - Hidraulico	17/10/2020	17/10/2020	EN EJECUCION
4	133. IED MARIA CANO	21/10/2020	22/10/2020	EN EJECUCION
5	136. IED MONTEBELLO	21/10/2020	22/10/2020	EN EJECUCION
6	147. IED ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	13/11/2020	19/11/2020	EN EJECUCION
7	150. BODEGA ROSA ZARATE	13/11/2020	16/11/2020	EN EJECUCION
Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R				

SEMANA 47 Marzo 15 – Marzo 21)
-Emergencias en la semana: 8
-Emergencias terminadas: 1
-Emergencias en ejecución: 7

SEMANA 48.1 (Marzo 22 – Marzo 22)
-Emergencias en la semana: 7
-Emergencias terminadas: 0
-Emergencias en ejecución: 7

Debido su alto grado de cuidado y complejidad siguen abiertos para este periodo y continúan para el siguiente, los frentes de trabajo, *IED GENERAL SANTANDER – IED MONTEBELLO,* por ser emergencias específicas relacionadas con reforzamientos estructurales

- **TECNICO:**
  Se realiza una presentación especifica por parte de la interventoría de algunos casos especiales acontecidos durante este periodo de tiempo que se consideran relevantes a ser reportadas, donde se brinda por parte la interventoría y contratista, la explicación y justificación y soporte técnico de necesidad y congruencia con el objeto contractual.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	XXX-RE003	**Fecha**	23-03-21	**Inicio**	8:15a:m	**Fin**	9:45 a:m	**Lugar**	**Reunión Virtual**
Proyecto	**Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20** **Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR 1440646**					**Asunto**	Comité No. 22 – Seguimiento de Obra		
Asistentes	AC2R : IVAN HERNANDEZ - STELLA PINEDA - JUAN FELIPE URIBE - CAMILO ROSARIO					**Asistentes**	**CONSTRUSOCIAL** : SANTIAGO FERNANDEZ – DIEGO FERNANDEZ – GERMAN VILLANUEVA **SED**: EDWIN SANTANA		
Fecha de Elaboración	23-03-21	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

FINANCIERO:

- A continuación, se presenta el Avance - (%) de ejecución en tiempo y presupuesto aproximado ejecutado en el periodo

SEMANA 46 (Marzo 08 - Marzo 14)

No.	COLEGIO	FECHA DE VISITA	TERMINA	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO A LA SEMANA	%
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	25/09/2020	EN EJECUCION	$ 90.408,00	
2	124. IED GENERAL SANTANDER	5/10/2020	EN EJECUCION	$ 857.749,00	
3	126. IED BICENTENARIO - Hidraulico	17/10/2020	EN EJECUCION	$ 8.874.550,00	
4	133. IED MARIA CANO	21/10/2020	EN EJECUCION	$ 709.545,00	
5	136. IED MONTEBELLO	21/10/2020	EN EJECUCION	$ 5.908.498,00	
6	147. IED ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	13/11/2020	EN EJECUCION	$ 3.453.736,00	
7	150. BODEGA ROSA ZARATE	13/11/2020	EN EJECUCION	$ 6.758.175,00	
8	169. IED USAQUEN	23/09/2020	11/03/2021	$ 1.276.800,00	
9	173. IED VENECIA		9/03/2021	$ 271.152,00	
10	175. IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	9/02/2021	EN EJECUCION	$ 3.674.836,00	
	Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R			$ 31.875.449,00	0,89%

SEMANA 47 (Marzo 15 - Marzo 21)

No.	COLEGIO	FECHA DE VISITA	TERMINA	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO A LA SEMANA	%
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	25/09/2020	EN EJECUCION	$ 90.408,00	
2	124. IED GENERAL SANTANDER	5/10/2020	EN EJECUCION	$ 511.325,00	
3	126. IED BICENTENARIO - Hidraulico	17/10/2020	EN EJECUCION	$ 3.163.241,00	
4	133. IED MARIA CANO	21/10/2020	EN EJECUCION	$ 709.545,00	
5	136. IED MONTEBELLO	21/10/2020	EN EJECUCION	$ 4.524.176,00	
6	147. IED ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	13/11/2020	EN EJECUCION	$ 3.080.844,00	
7	150. BODEGA ROSA ZARATE	13/11/2020	EN EJECUCION	$ 1.332.450,00	
8	175. IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	9/02/2021	21/03/2021	$ 3.674.836,00	
	Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R			$ 17.086.825,00	0,48%

SEMANA 48.1 (Marzo 22 - Marzo 22)

No.	COLEGIO	FECHA DE VISITA	TERMINA	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO A LA SEMANA	%
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	25/09/2020	EN EJECUCION	$ 90.408,00	
2	124. IED GENERAL SANTANDER	5/10/2020	EN EJECUCION	$ 3.339.469,00	
3	126. IED BICENTENARIO - Hidraulico	17/10/2020	EN EJECUCION	$ 3.163.241,00	
4	133. IED MARIA CANO	21/10/2020	EN EJECUCION	$ 709.545,00	
5	136. IED MONTEBELLO	21/10/2020	EN EJECUCION	$ 4.401.690,00	
6	147. IED ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	13/11/2020	EN EJECUCION	$ 3.080.844,00	
7	150. BODEGA ROSA ZARATE	13/11/2020	EN EJECUCION	$ 131.600,00	
	Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R			$ 14.916.797,00	0,42%

De acuerdo con lo anterior y según revisión realizada en conjunto entre la Supervisión de contrato de la SED, la interventoría AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S y contratista de obra CONSTRUSOCIAL S.A.S., el avance aproximado de obra para estas tres semanas es de **$ 63.879.071,00** – costo directo, equivalente al **1,79%** aprox., del valor del contrato.

El avance total aproximado a la fecha es de **$ 2.588.943.769,74** - costo directo, equivalente al **92,80%** aprox., del presupuesto Total del contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	XXX-RE003	**Fecha**	**23-03-21**	**Inicio**	**8:15a:m**	**Fin**	**9:45 a:m**	**Lugar**	**Reunión Virtual**
Proyecto	**Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20** **Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR 1440646**					**Asunto**	Comité No. 22 – Seguimiento de Obra		
Asistentes	**AC2R** : IVAN HERNANDEZ - STELLA PINEDA - JUAN FELIPE URIBE - CAMILO ROSARIO					**Asistentes**	**CONSTRUSOCIAL** : SANTIAGO FERNANDEZ – DIEGO FERNANDEZ – GERMAN VILLANUEVA **SED**: EDWIN SANTANA		
Fecha de Elaboración	23-03-21	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

- **AMBIENTAL Y SISO:**

- Se envía correo electrónico solicitando las fichas de tratamiento silviculturales pendientes.
- Se remiten fichas de atención de tratamientos silviculturales aprobadas.
- Se realiza reunión presencial con el contratista para la revisión de fichas de tratamiento silvicultural de la Palestina.
- Se realiza verificación del cumplimiento de condiciones establecido por la Secretaría de Educación Distrital (SED) de acuerdo a las listas de chequeo de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo remitidas.

- **OBSERVACIONES Y VARIOS:**

Se le recomienda y recuerda al contratista de obra, que debido a la emergencia sanitaria presentada en la ciudad, las áreas intervenidas en cada uno de los colegios, deberán ser aseadas y desinfectadas a diario, así como una vez sean finalizadas para su respectiva entrega y recibido a satisfacción.

Se le recuerda al contratista de obra, la presentación oportuna de los conceptos técnicos, así como los presupuestos iniciales y programación respectiva para continuar o dar inicio a las actividades de emergencia reportadas

Así mismo se le recomienda al contratista de obra, dar celeridad a la terminación de las actividades que se encuentran actualmente en desarrollo en cada uno de los frentes de trabajo.

NOMBRE: Iván Hernández
CARGO: Residente de interventoría – AC2R contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1440646-20

NOMBRE: Luz Stella Pineda
CARGO: Especialista SISO - AC2R contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1440646-20

NOMBRE: Juan Felipe Uribe
CARGO: Director de Interventoría - contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1440646-20

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	XXX-RE003	**Fecha**	**23-03-21**	**Inicio**	**8:15a:m**	**Fin**	**9:45 a:m**	**Lugar**	**Reunión Virtual**
Proyecto	**Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20** **Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR 1440646**					**Asunto**	Comité No. 22 – Seguimiento de Obra		
Asistentes	**AC2R** : IVAN HERNANDEZ - STELLA PINEDA - JUAN FELIPE URIBE - CAMILO ROSARIO					**Asistentes**	**CONSTRUSOCIAL** : SANTIAGO FERNANDEZ – DIEGO FERNANDEZ – GERMAN VILLANUEVA **SED**: EDWIN SANTANA		
Fecha de Elaboración	23-03-21	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

NOMBRE: David Palacios
CARGO: Especialista Ambiental - contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1440646-20

NOMBRE: Santiago Fernández
CARGO: residente de obra CONSTRUSOCIAL
Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20

NOMBRE: Diego Fernández
CARGO: Director de obra CONSTRUSOCIAL
Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20

NOMBRE: German Villanueva
CARGO: RL de CONSTRUSOCIAL
Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20

NOMBRE:
CARGO: Apoyo de la SED - contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20

NOMBRE: Edwin Santana
CARGO: Profesional Especialista SED - contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286-20

NOMBRE: CAMILO ROSARIO
CARGO: RL de AC2R- contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1440646-20

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°2

FECHA: 28 Mayo 2021 **HORA: 01 : 43 pm** **LUGAR: Microsoft Teams**

SEGUIMIENTO PROGRAMACION SEÑALIZACION Y SEÑALETICA

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Edwin Alexander Santana Rodriguez	Profesional especialista, supervisor del contrato.	SED	
2. Karen Julieth Rivera Suarez	Aux. Ing. SED	SED	
3. Oscar Salamanca	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6722

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°2

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión tomando la localidad de Tunjuelito, el ingeniero Oscar Salamanca da el listado de los colegios que se han intervenido y Karen Rivera Aux. de interventoria toma nota.

Los colegios intervenidos en esa semana son:

COLEGIOS	OBSERVACIONES
COLEGIO TECNICO PILOTO SEDE A	ok señaletica y pintura.
COLEGIO TECNICO PILOTO SEDE B	ok señaletica y pintura.
COLEGIO TECNICO PILOTO SEDE C	ok señaletica y pintura.
COLEGIO TECNICO PILOTO SEDE D	ok señaletica y pintura.
SAN CARLOS SEDE A	ok señaletica y pintura.
SAN CARLOS SEDE B	ok señaletica y pintura.
JOSE MARIA CORDOBA	en ejecución.
MARCO FIDEL SUAREZ	ok señaletica y pintura.

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6723

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°2

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Realizar supervisión en los colegios donde se requiera, para cumplir con las metas y tiempos estipuladas.	Ingeniero Residente Oscar Salamanca	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES:

Se realizo la reunión en la cual se actualiza la información de los colegio en donde se evaluo el estado de ejecución ,el ingeniero Oscar Salamanca asegura que el contratista trabajara la semana santa para cumplir con algunos colegios de la localidad de Usme y Tunjuelito los cuales son prioritarios según el Arquitecto Edwin Santana.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: 29 de Marzo del 2021
HORA: 8:30 PM
LUGAR: Microsoft Teams

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6724

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°3

FECHA: 28 Mayo 2021 **HORA: 01 : 55 pm** **LUGAR: Microsoft Teams**

SEGUIMIENTO PROGRAMACION SEÑALIZACION Y SEÑALETICA

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Edwin Alexander Santana Rodriguez	Profesional especialista, supervisor del contrato.	SED	
2. Karen Julieth Rivera Suarez	Aux. Ing. SED	SED	
3. Oscar Salamanca	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
4. Juan Carlos Rincon	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
5. Jeison Bermudez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
6. Alejandro Diego Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
7. Anderson Cely	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6725

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°3


DESARROLLO:

Se da inico a la reunion actualizando la matriz de demarcacion iniciando con la localidad de Suba, la cual cuenta con 3 colegios los cuales están incumpliendo en cuanto al cornograma el responsable de este segumiento es el inspector Diego Ramirez.

Se continua con la localidad de Engativa se informa que ingresa personal el cual inicia la intervención de las instituciones Tabora sede A y sede B, Manuel Ayala, San Jose norte sede A y sede B, Nidia Quintero de Turbay.

La institución Nestor Forero Alcala sede A y B terminadas y la sede c de la misma no se interviene ya que cuenta con obra civil.

El inspector Diego Ramirez manifiesta que ha tenido bastantes inconvenientes en el ingreso de las instituciones ya que no cuenta con el respectivo permiso para su ingreso, ni el ingreso del personal del constructor (VCR).

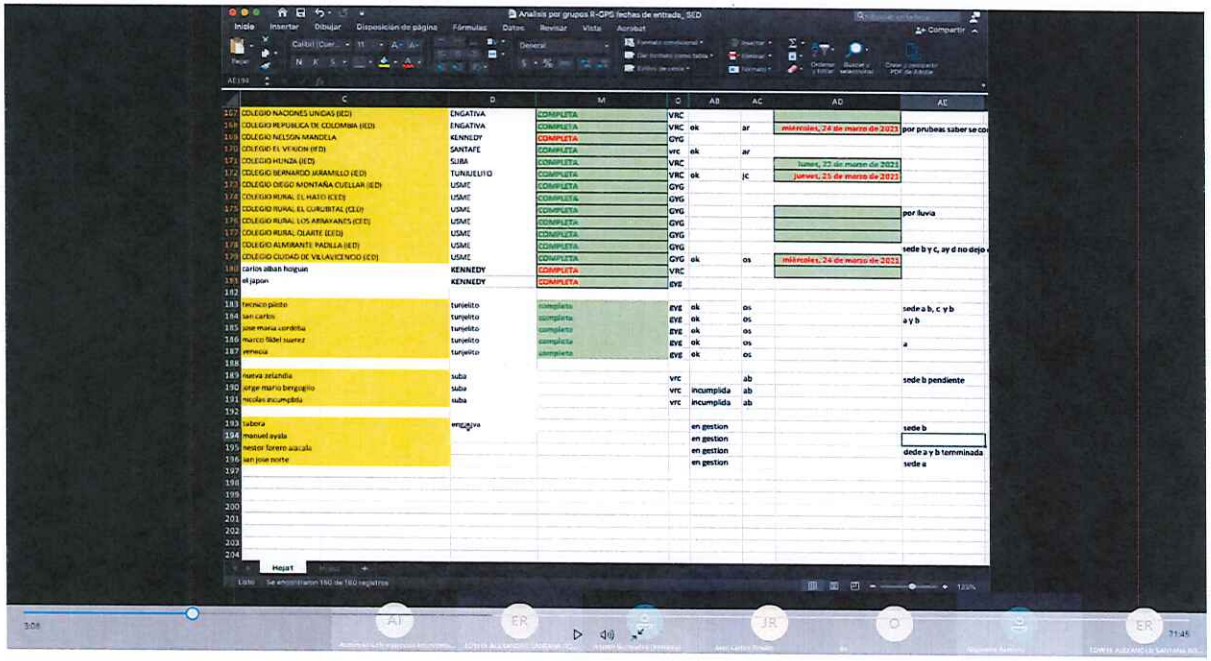


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6726

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°3

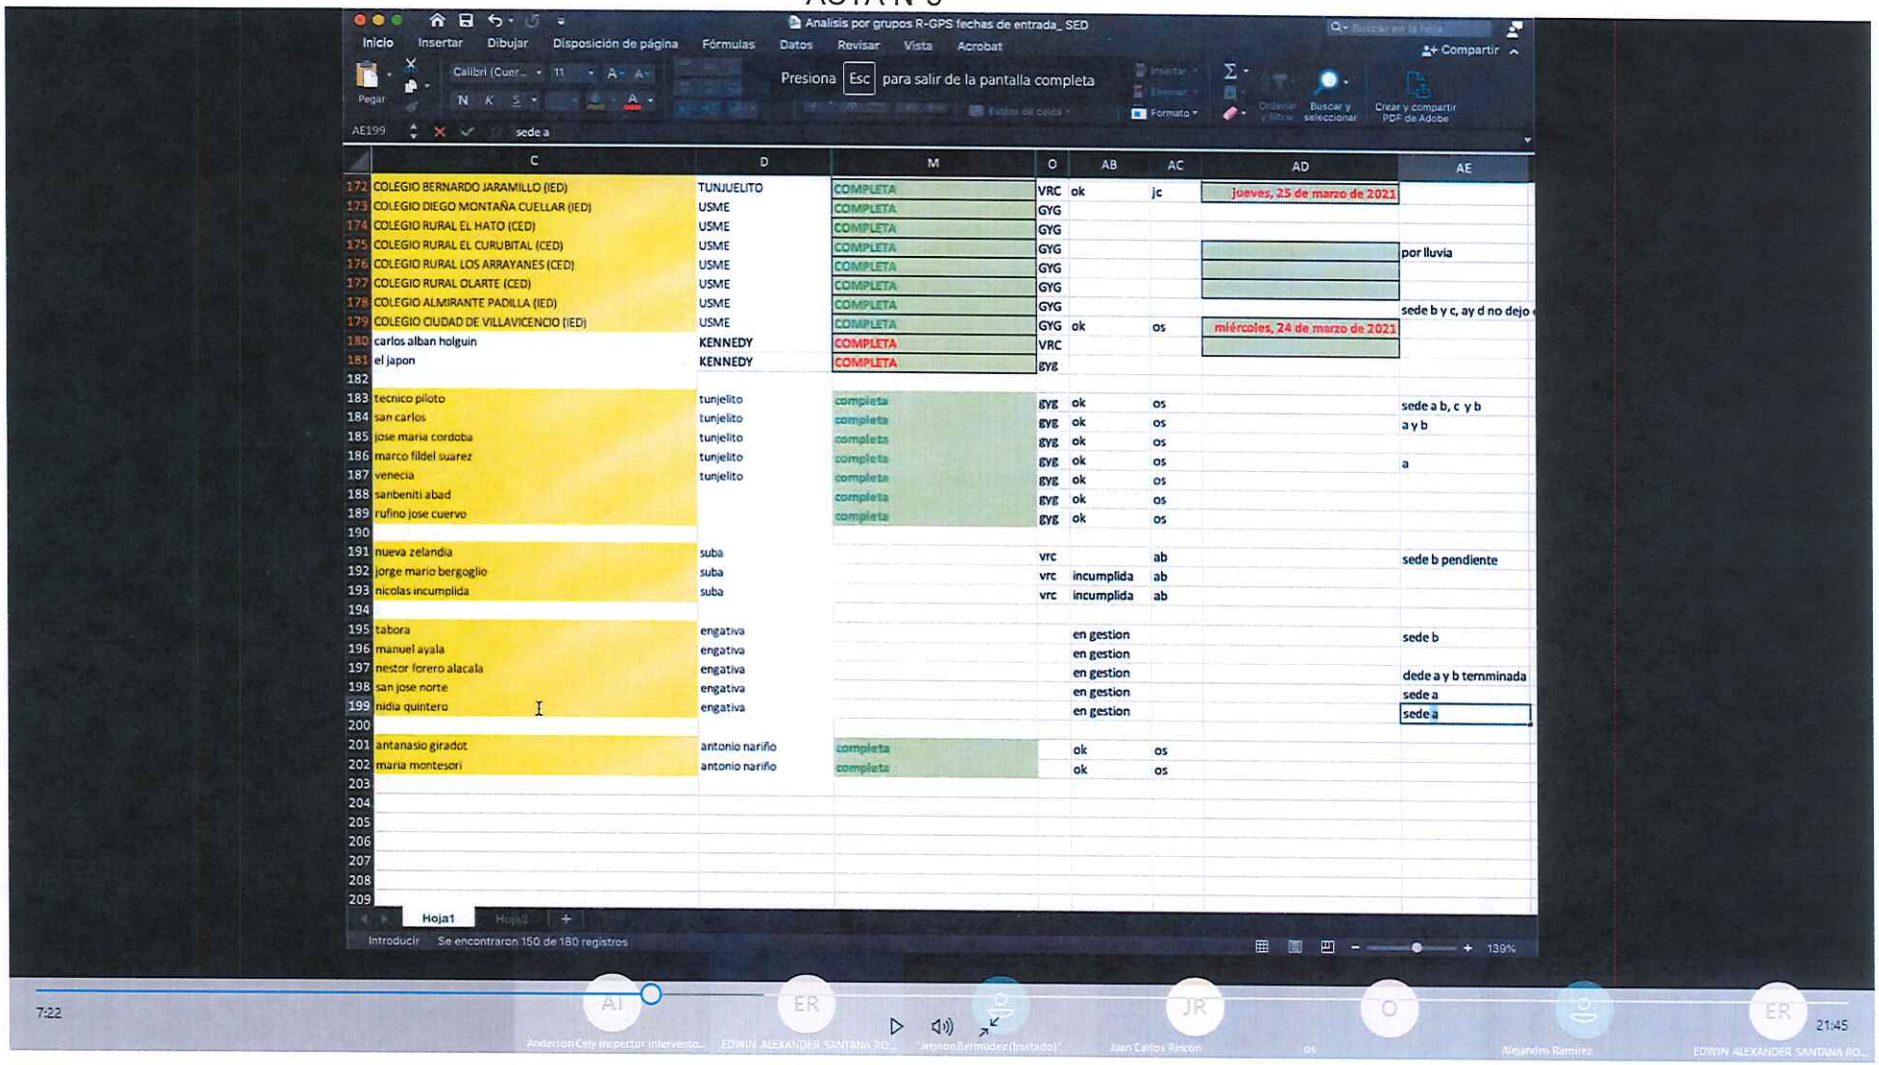

	C	D	M	O	AB	AC	AD	AE
172	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	TUNJUELITO	COMPLETA	VRC	ok	jc	Jueves, 25 de marzo de 2021	
173	COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	COMPLETA	GYG				
174	COLEGIO RURAL EL HATO (CED)	USME	COMPLETA	GYG				
175	COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED)	USME	COMPLETA	GYG				por lluvia
176	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES (CED)	USME	COMPLETA	GYG				
177	COLEGIO RURAL OLARTE (CED)	USME	COMPLETA	GYG				
178	COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)	USME	COMPLETA	GYG				sede b y c, ay d no dejo
179	COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	COMPLETA	GYG	ok	os	miércoles, 24 de marzo de 2021	
180	carlos alban holguin	KENNEDY	COMPLETA	VRC				
181	el japon	KENNEDY	COMPLETA	GYG				
182								
183	tecnico piloto	tunjelito	completa	GYG	ok	os		sede a b, c y b
184	san carlos	tunjelito	completa	GYG	ok	os		a y b
185	jose maria cordoba	tunjelito	completa	GYG	ok	os		
186	marco fildel suarez	tunjelito	completa	GYG	ok	os		a
187	venecia	tunjelito	completa	GYG	ok	os		
188	sanbeniti abad		completa	GYG	ok	os		
189	rufino jose cuervo		completa	GYG	ok	os		
190								
191	nueva zelandia	suba		vrc		ab		sede b pendiente
192	jorge mario bergoglio	suba		vrc	incumplida	ab		
193	nicolas incumplida	suba		vrc	incumplida	ab		
194								
195	tabora	engativa			en gestion			sede b
196	manuel ayala	engativa			en gestion			
197	nestor forero alacala	engativa			en gestion			dede a y b terminada
198	san jose norte	engativa			en gestion			sede a
199	nidia quintero	engativa			en gestion			sede a
200								
201	antanasio giradot	antonio nariño	completa		ok	os		
202	maria montesori	antonio nariño	completa		ok	os		
203								
204								
205								
206								
207								
208								
209								

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6727

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°3

Se toma la localidad de Antonio Nariño la cual corresponde al ingeniero Oscar Salamanca informa que los colegios Atanasio Girardot sede A y sede B terminados, el colegio Maria Montesori terminado.

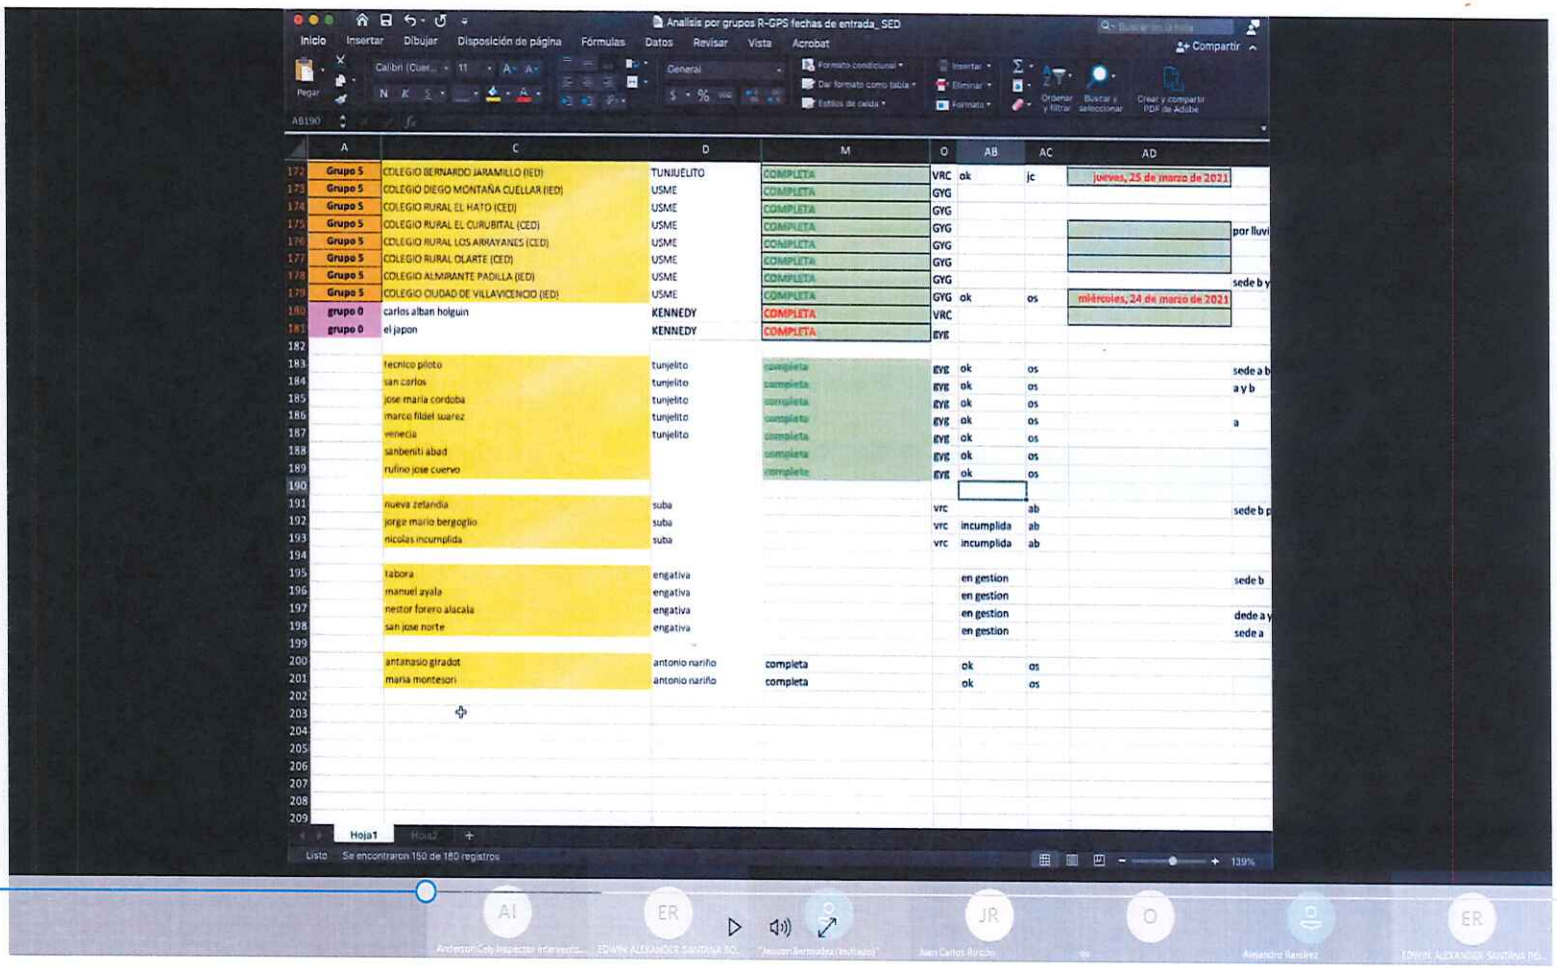

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6728


Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°3

En la localidad de Tunjuelito La institución San benito Abad y Rufino José Cuervo terminadas.

En la localidad de Kenedy los colegios Class sede A, sede B, sede C terminados, el colegio O.E.A sede A y sede B terminados, el colegio Manuel Cepeda Vargas sede A terminada y la sede B y C de la misma están en ejecucion Yaqueline en ejecucion.

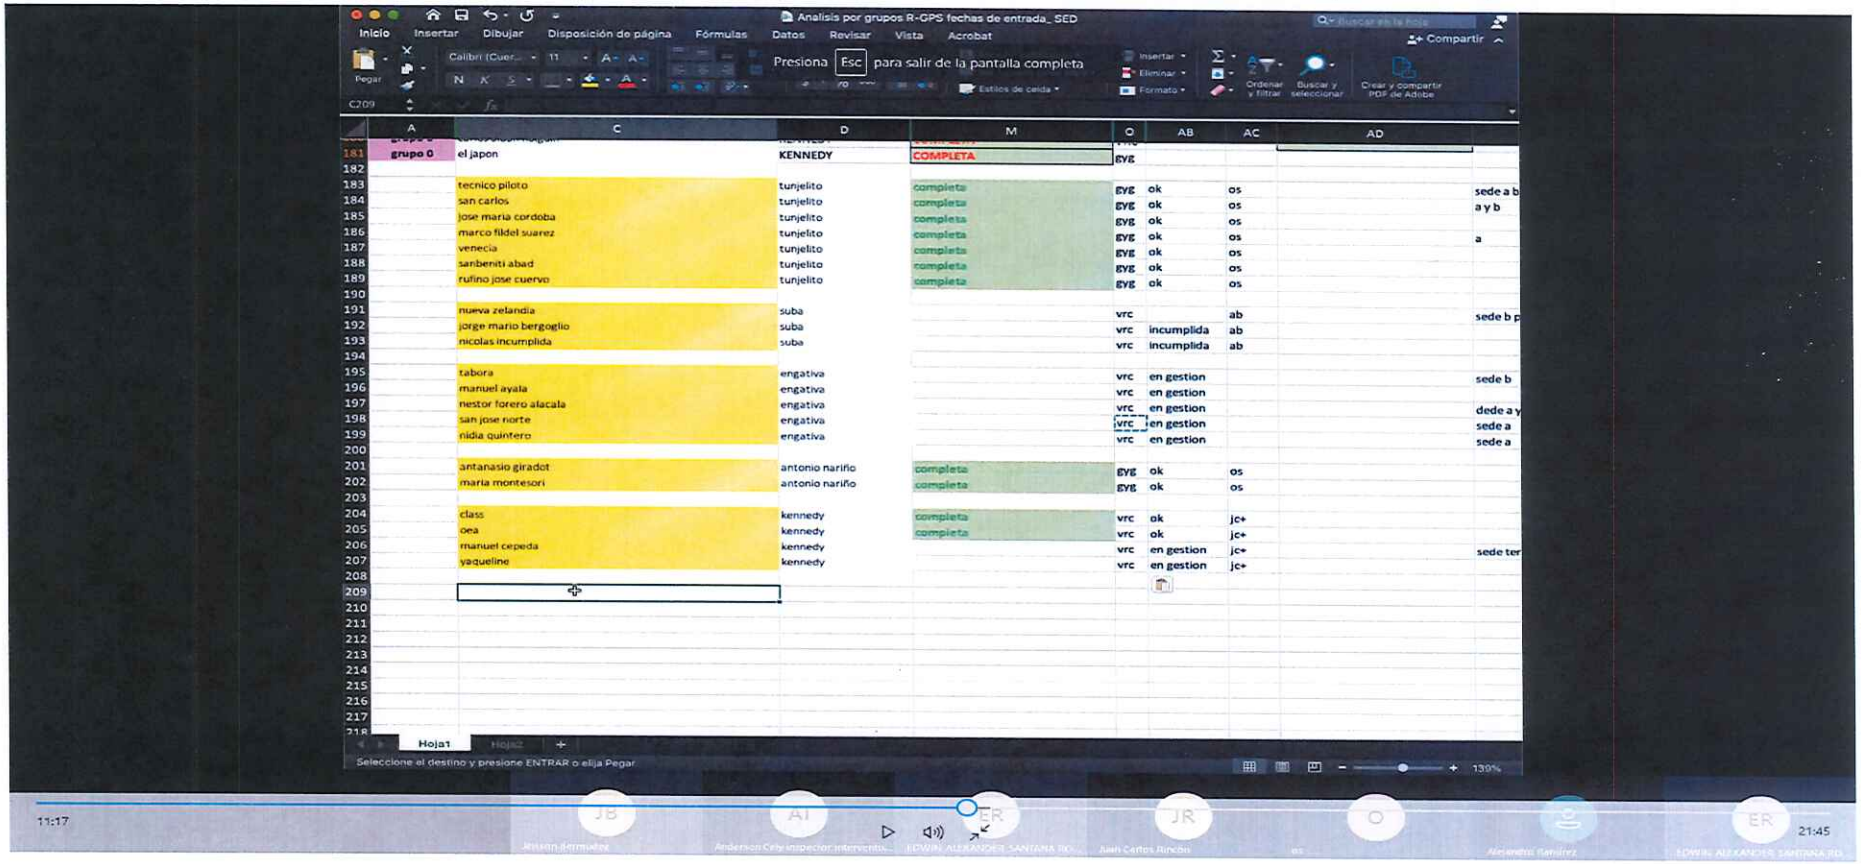

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6729


Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°3

Continua el inspector Jeison Bermudez en la localidad de Bosa y se informa que el colegio Fernando Mazuera sede A en ejecucion, Fernado Mazuera sede B terminada completamente, Fernando Mazuera sede C y sede D terminados en pintura y falta la instalación de la señalética, Orlando Rojas Higuita sede A terminado y la sede B en ejecucion, Llano Oriental en ejecucion, Pablo Tarso sede A en ejecucion, Ruiz Lopes de Mesa en ejecucion, Carlos Alban Holguin terminado la sede A, sede B y sede C.

El ingeniero Oscar Salamanca da información de la localidad aportando que los colegios Gran Colombiano sede A, sede B, sede C y sede D están terminados, German Arciniegas terminado, Porfirio Barbajacob.

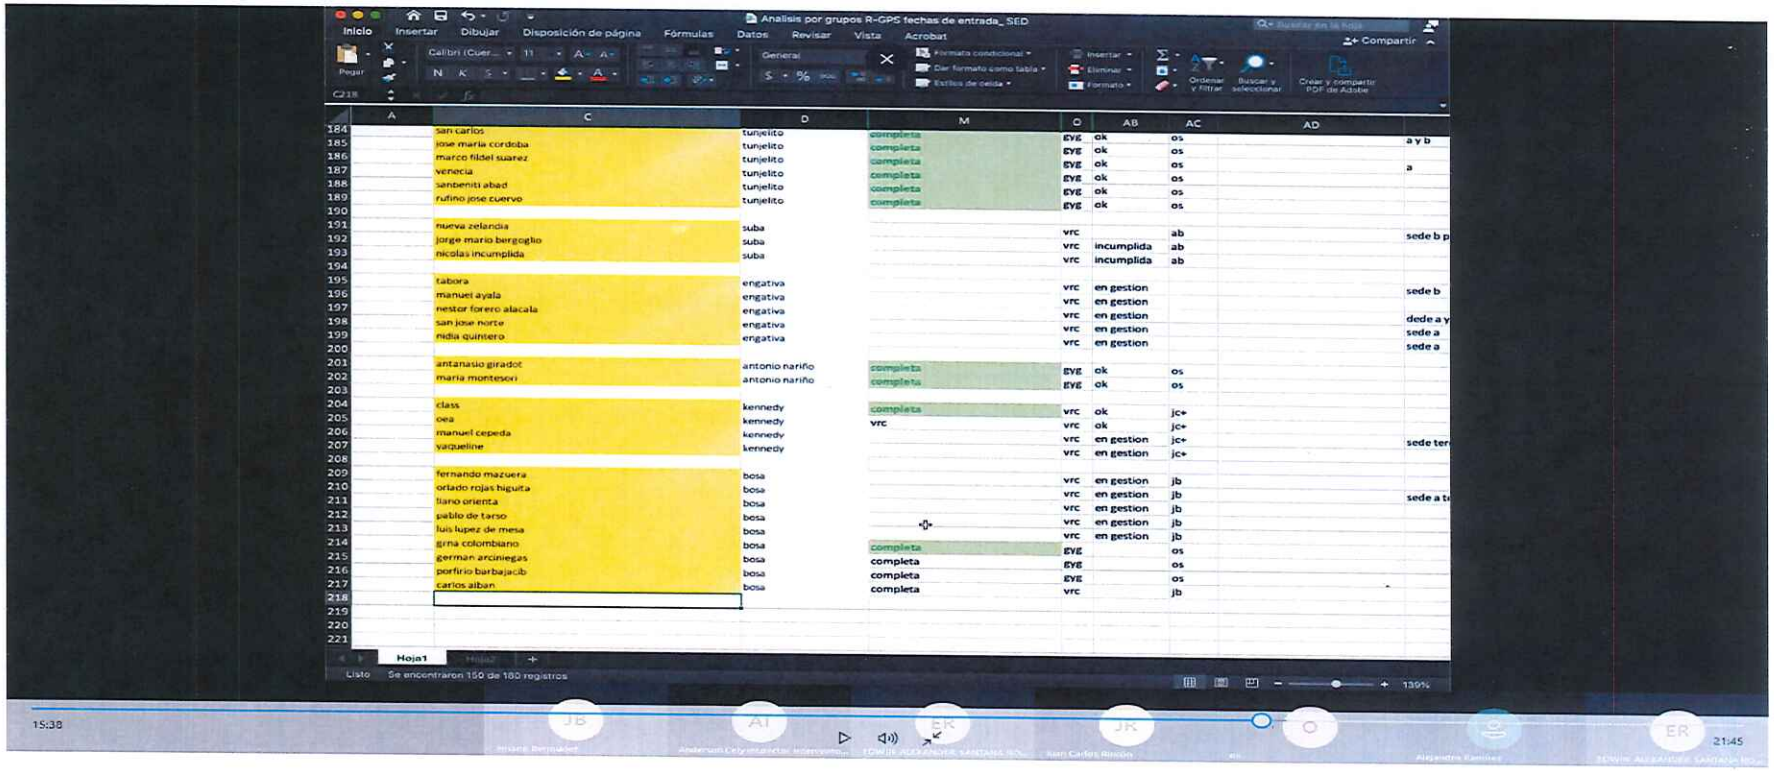

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6730

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°3

Se reportan casos en especificos por el arquitecto Edwin Santana de los colegios Agustin Fernandez sede A y sede B, Nueva Zelandia y Jorge Mario Bergoglio en la localidad de Suba se deben realizar de carácter urgente, ya que ingresan la semana siguiente a clases.

Se realiza el llamado al contratista para que ingrese a las reuniones de revisión de avances para que ellos tengan el conocimiento del tema el cual están ejecutando.

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Ejecutar en mayor brevedad el colegio Agustin Fernandez sede A	Ingeniero Residente Juan Carlos Rincon	05-04-2021
2. Ejecutar en mayor brevedad el colegio Agustin Fernandez sede B	Ingeniero Residente Juan Carlos Rincon	05-04-2021
3. Ejecutar en mayor brevedad el colegio Nueva Zelandia	Ingeniero Residente Oscar Salamanca	09-04-2021
4. Ejecutar en mayor brevedad el colegio Jorge Mario Bergoglio	Ingeniero Residente Oscar Salamanca	09-04-2021

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES:

Se realizo la actualización de la matriz de los colegio en donde se evaluo el estado de ejecución de los colegio marcando los que ya se habían ejecutado completamente, los que están en ejecución y los que no han empezado trabajo para saber cuales de estos están incumpliendo las fechas asignadas en la programación inicial y de esta menera hacer la gestión para su pronta ejecución.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: 05 de Abril del 2021
HORA: 6 PM
LUGAR: Microsoft Teams

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6731

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

FECHA: 6 Abril 2021 **HORA: 02 : 11 pm** **LUGAR: Microsoft Teams**

SEGUIMIENTO PROGRAMACION SEÑALIZACION Y SEÑALETICA

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Edwin Alexander Santana Rodriguez	Profesional especialista, supervisor del contrato.	SED	
2. Karen Julieth Rivera Suarez	Aux. Ing. SED	SED	
3. Juan Carlos Rincon	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
4. Jeison Bermudez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
5. Alejandro Diego Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
6. Anderson Cely	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
7. Braya Calderon	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
8. Jesus Ramirez	Residente contratista	Construsocial	
9. Dairon Caro	Representante	VCR	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6732

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

DESARROLLO:

Se da inico a la reunión la cual en primera instancia se consulta con el residente de construsocial Jesus Ramirez cuantas cuadrillas figuran y cuales son los subcontratistas; 25 cuadrillas por parte de la empresa VCR y 10 cuadrillas en la empresa de G y G las cuales 5 son diurnas y 5 son nocturnas.


Llega un nuevo contratista el cual cuenta con 3 cuadrillas.

Se pregunta por los colegios Luis Carlos Tejada los cuales están pendientes por señalética.

Se empieza actualizando la matriz de demarcacion iniciando con la localidad de Usaquen, la cual reporta Friedich Naumann sede A terminada y sede B en gestión no se ha terminado por obra, Agustin Fernandez prioridad el cual se asignara al contratista nuevo Julio Caneira, Nuevo Horizonte la sede B y sede C terminadas. Se proporcionan unas fechas de cumplimiento por el constratista para llevar a cabo los colegios faltantes.

Se le asigna los colegios faltantes de Usaquen a Julio Caneira.



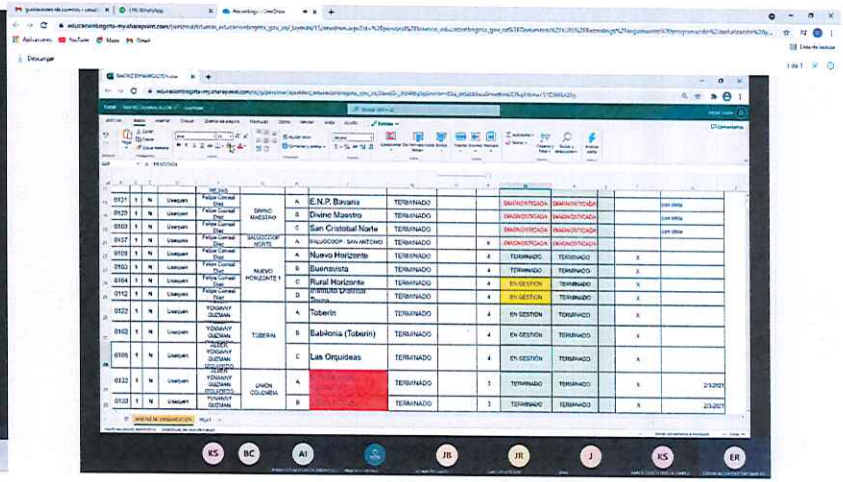


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6733

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

Localidad de Chapinero se inicia en los colegios Simon Rodriguez sede A y sede B terminadas, sede C en ejecucion.

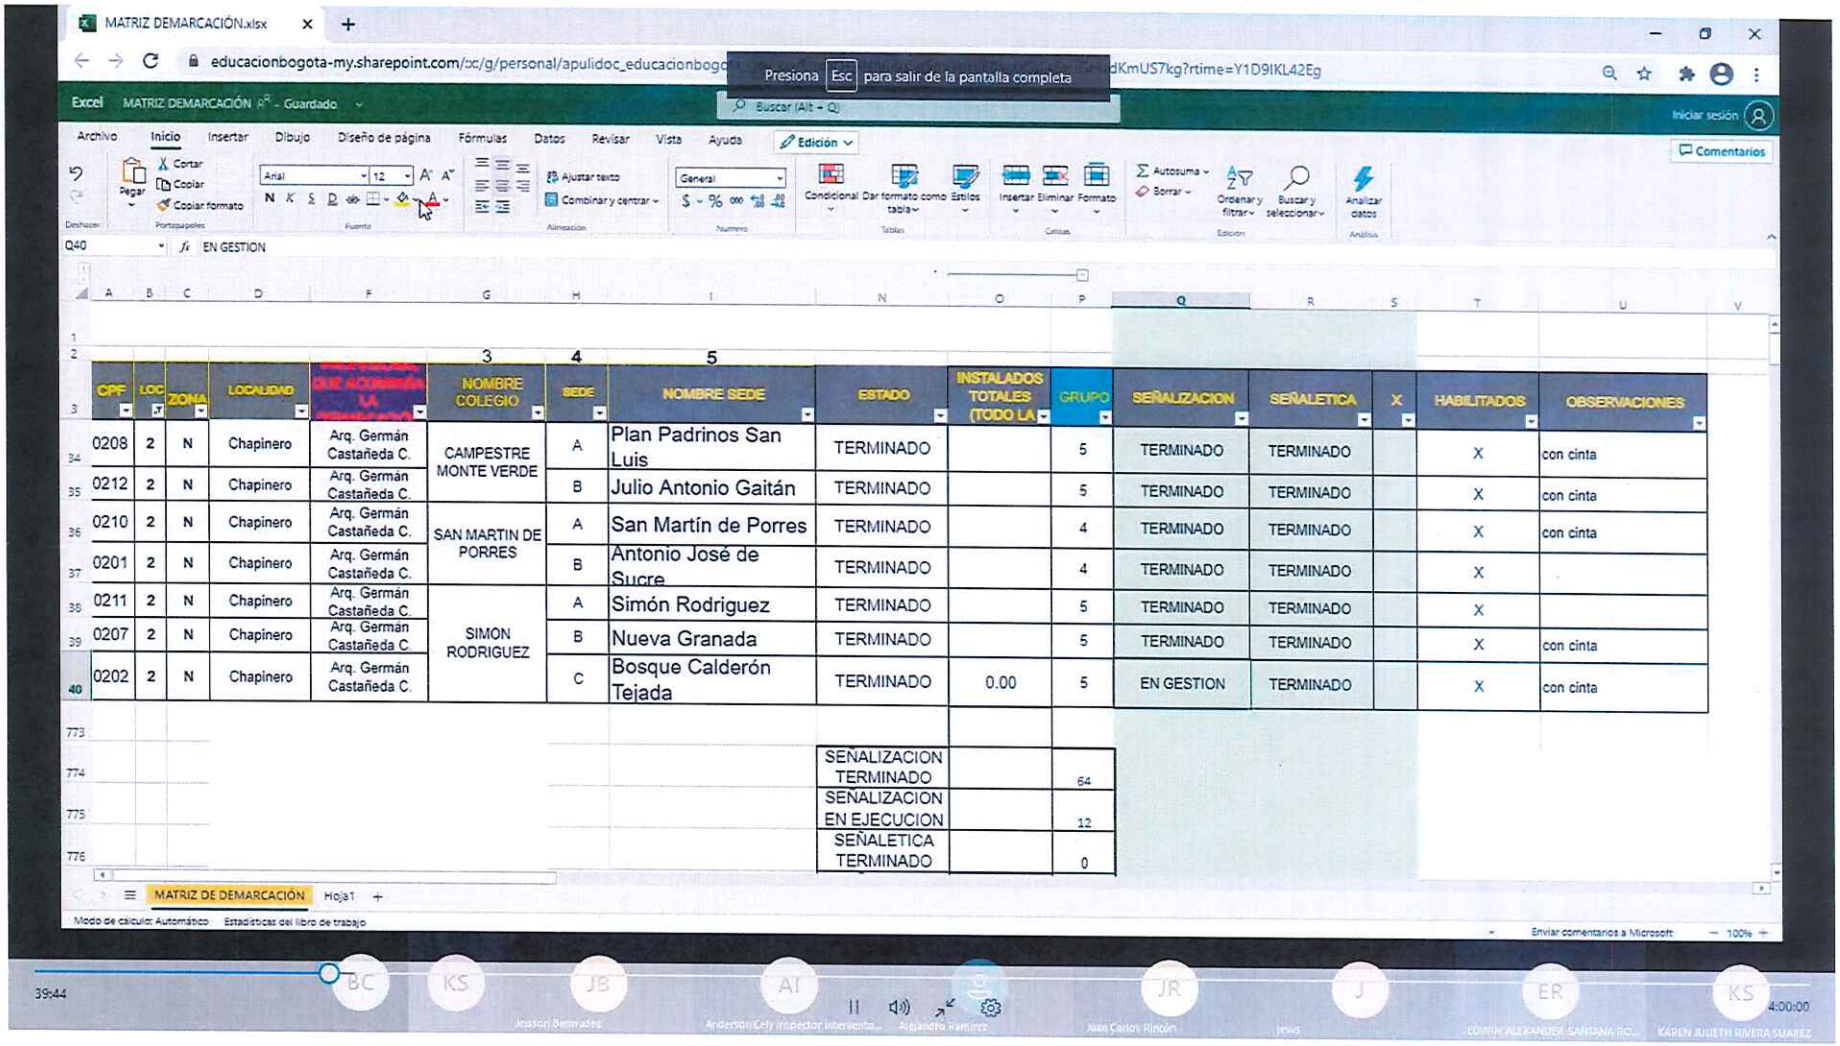

CPF	LOC	ZONA	LOCALIDAD	QUE ACOMPAÑA LA	NOMBRE COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	ESTADO	INSTALADOS TOTALES (TODO LA	GRUPO	SEÑALIZACION	SEÑALETICA	X	HABILITADOS	OBSERVACIONES
					3	4	5								
0208	2	N	Chapinero	Arq. Germán Castañeda C.	CAMPESTRE MONTE VERDE	A	Plan Padrinos San Luis	TERMINADO		5	TERMINADO	TERMINADO		X	con cinta
0212	2	N	Chapinero	Arq. Germán Castañeda C.		B	Julio Antonio Gaitán	TERMINADO		5	TERMINADO	TERMINADO		X	con cinta
0210	2	N	Chapinero	Arq. Germán Castañeda C.	SAN MARTIN DE PORRES	A	San Martín de Porres	TERMINADO		4	TERMINADO	TERMINADO		X	con cinta
0201	2	N	Chapinero	Arq. Germán Castañeda C.		B	Antonio José de Sucre	TERMINADO		4	TERMINADO	TERMINADO		X	
0211	2	N	Chapinero	Arq. Germán Castañeda C.	SIMON RODRIGUEZ	A	Simón Rodriguez	TERMINADO		5	TERMINADO	TERMINADO		X	
0207	2	N	Chapinero	Arq. Germán Castañeda C.		B	Nueva Granada	TERMINADO		5	TERMINADO	TERMINADO		X	con cinta
0202	2	N	Chapinero	Arq. Germán Castañeda C.		C	Bosque Calderón Tejada	TERMINADO	0.00	5	EN GESTION	TERMINADO		X	con cinta

SEÑALIZACION TERMINADO	64
SEÑALIZACION EN EJECUCION	12
SEÑALETICA TERMINADO	0


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6734

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

Se continua con la localidad de Santa Fe verificando los colegio diagnosticados y esperando la respuesta del subcontratista Dairo Cano si se responzabiliza completamente de la localidad para dar fechas concretas.

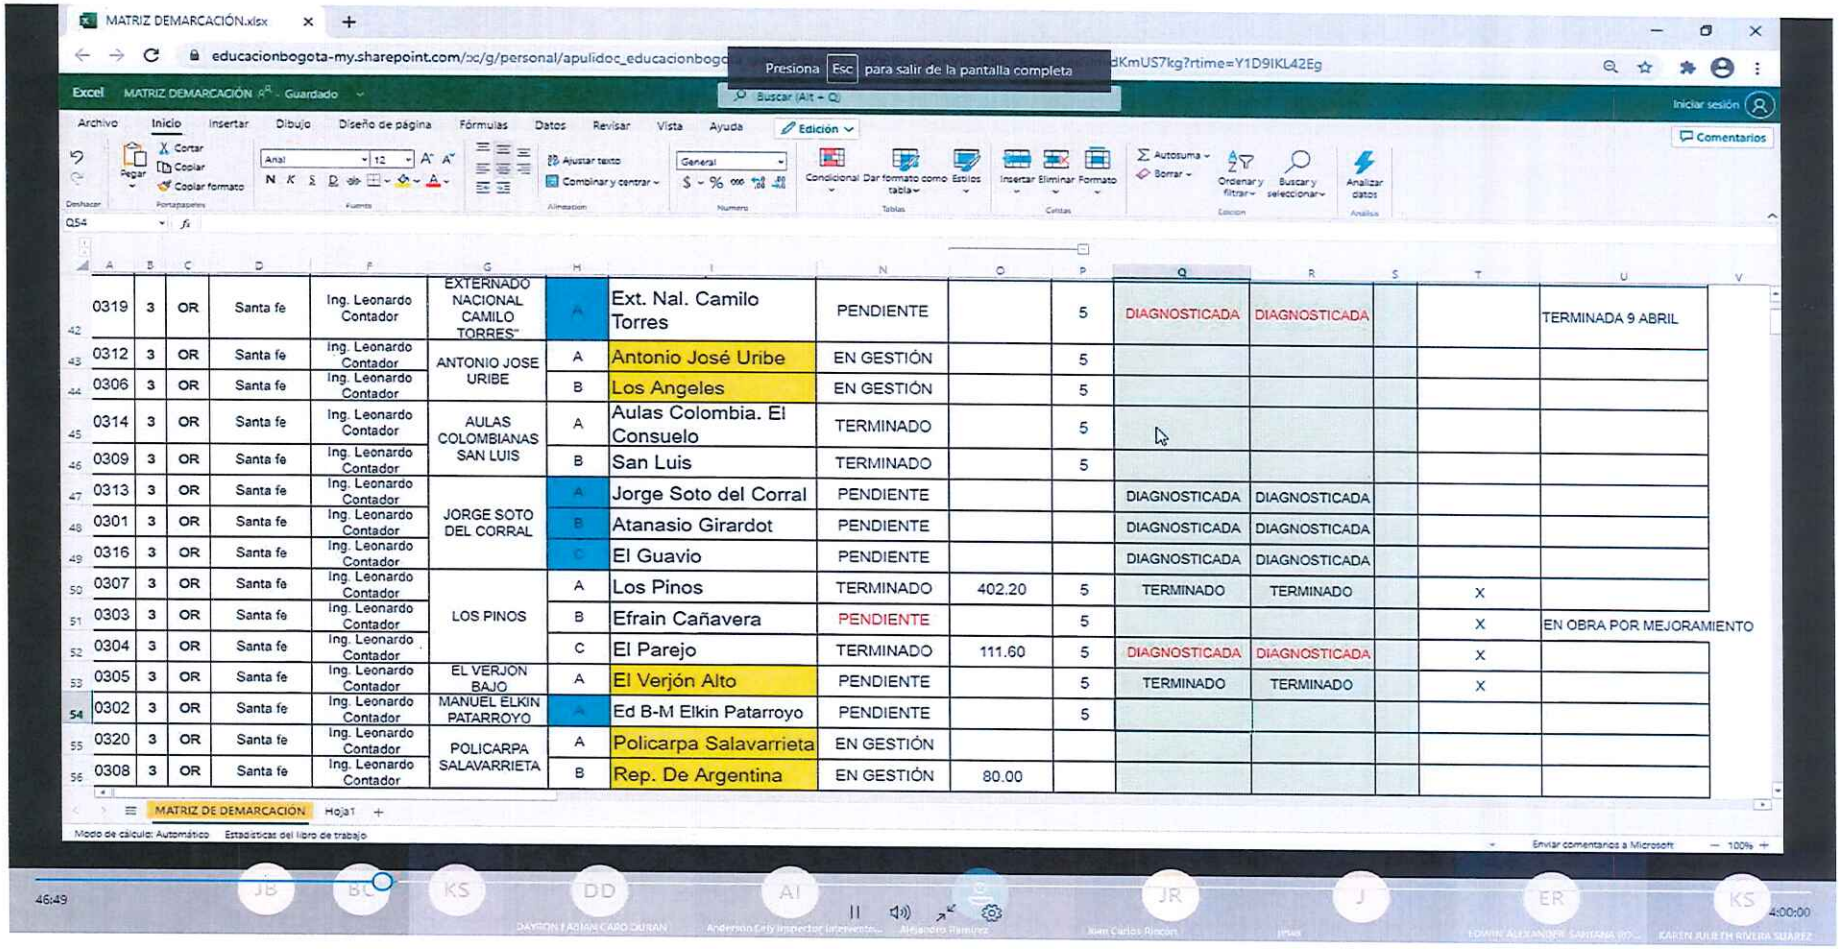

42	0319	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador	EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES"	A	Ext. Nal. Camilo Torres	PENDIENTE		5	DIAGNOSTICADA	DIAGNOSTICADA			TERMINADA 9 ABRIL
43	0312	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador	ANTONIO JOSE URIBE	A	Antonio José Uribe	EN GESTIÓN		5					
44	0306	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador		B	Los Angeles	EN GESTIÓN		5					
45	0314	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador	AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	A	Aulas Colombia. El Consuelo	TERMINADO		5					
46	0309	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador		B	San Luis	TERMINADO		5					
47	0313	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador	JORGE SOTO DEL CORRAL	A	Jorge Soto del Corral	PENDIENTE			DIAGNOSTICADA	DIAGNOSTICADA			
48	0301	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador		B	Atanasio Girardot	PENDIENTE			DIAGNOSTICADA	DIAGNOSTICADA			
49	0316	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador		C	El Guavio	PENDIENTE			DIAGNOSTICADA	DIAGNOSTICADA			
50	0307	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador	LOS PINOS	A	Los Pinos	TERMINADO	402.20	5	TERMINADO	TERMINADO		X	
51	0303	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador		B	Efrain Cañavera	PENDIENTE		5				X	EN OBRA POR MEJORAMIENTO
52	0304	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador		C	El Parejo	TERMINADO	111.60	5	DIAGNOSTICADA	DIAGNOSTICADA		X	
53	0305	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador	EL VERJON BAJO	A	El Verjón Alto	PENDIENTE		5	TERMINADO	TERMINADO		X	
54	0302	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador	MANUEL ELKIN PATARROYO	A	Ed B-M Elkin Patarroyo	PENDIENTE		5					
55	0320	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador	POLICARPA SALAVARRIETA	A	Policarpa Salavarrieta	EN GESTIÓN							
56	0308	3	OR	Santa fe	Ing. Leonardo Contador		B	Rep. De Argentina	EN GESTIÓN	80.00						


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6936

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

Localidad de San Cristobal se revisa la tabla de informacion de los colegios y se obtiene que el Gran Colombia terminado, Jose Acevedo terminado, pendiente el colegio Republica del Ecuador.

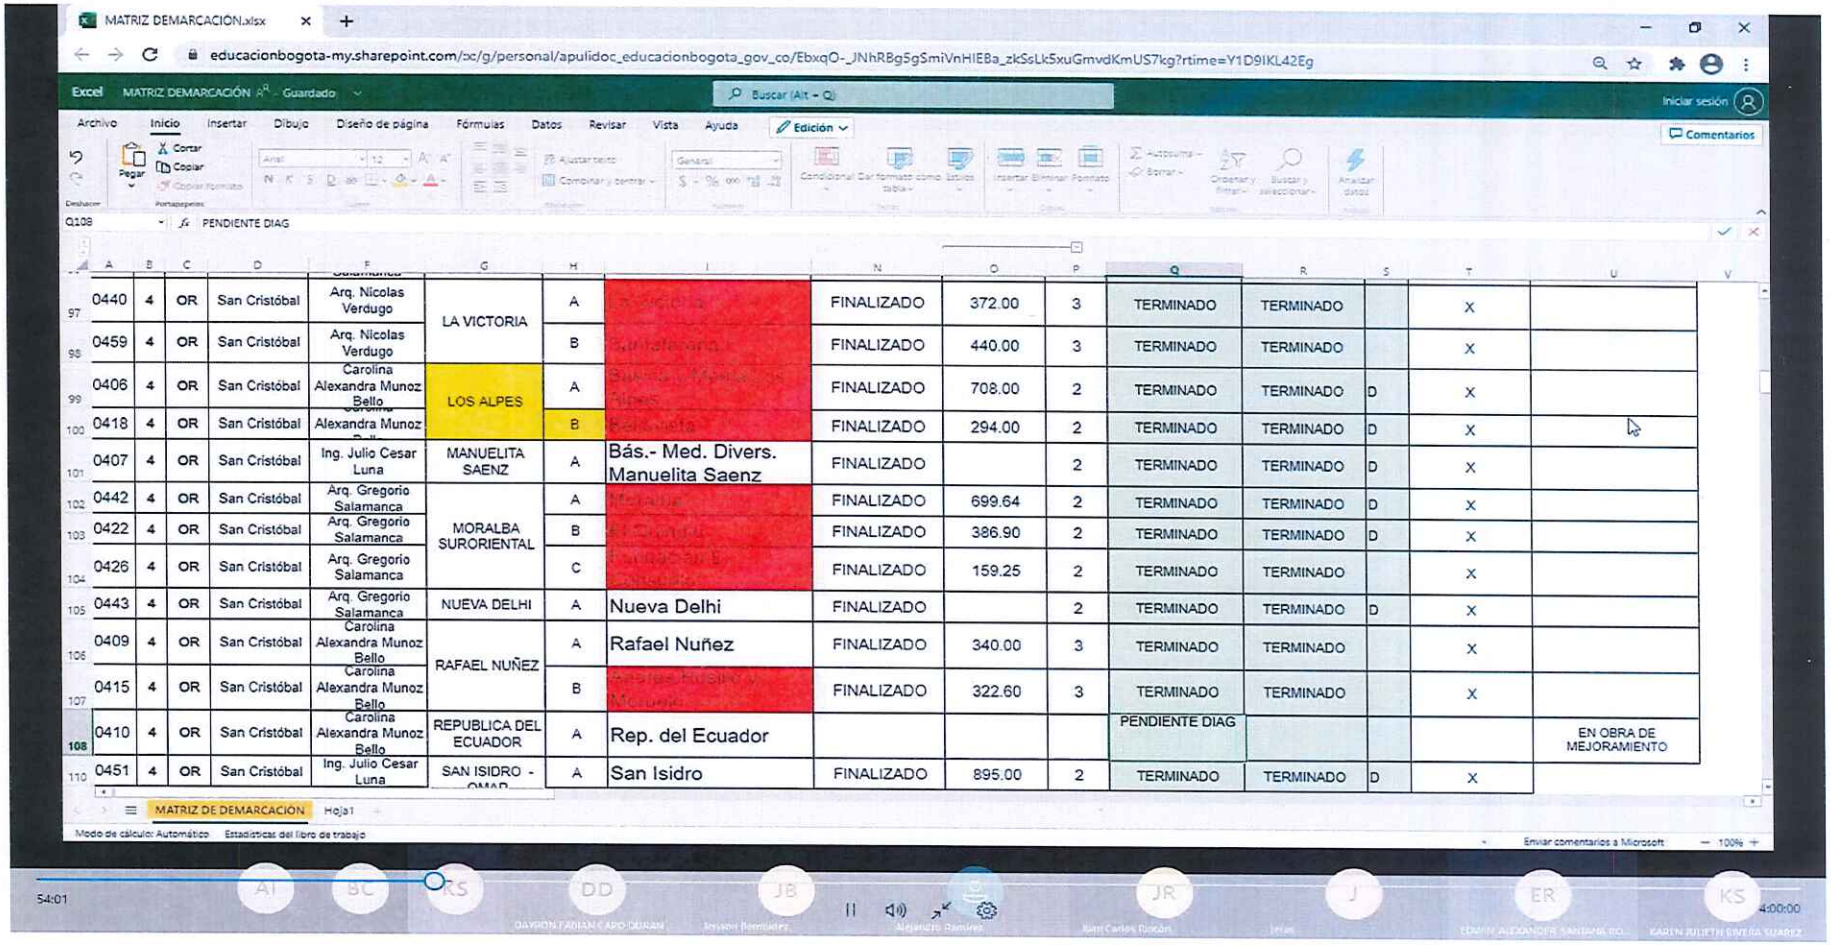

97	0440	4	OR	San Cristóbal	Arq. Nicolas Verdugo	LA VICTORIA	A	[redacted]	FINALIZADO	372.00	3	TERMINADO	TERMINADO		X	
98	0459	4	OR	San Cristóbal	Arq. Nicolas Verdugo		B	[redacted]	FINALIZADO	440.00	3	TERMINADO	TERMINADO		X	
99	0406	4	OR	San Cristóbal	Carolina Alexandra Munoz Bello	LOS ALPES	A	[redacted]	FINALIZADO	708.00	2	TERMINADO	TERMINADO	D	X	
100	0418	4	OR	San Cristóbal	Alexandra Munoz		B	[redacted]	FINALIZADO	294.00	2	TERMINADO	TERMINADO	D	X	
101	0407	4	OR	San Cristóbal	Ing. Julio Cesar Luna	MANUELITA SAENZ	A	Bás.- Med. Divers. Manuelita Saenz	FINALIZADO		2	TERMINADO	TERMINADO	D	X	
102	0442	4	OR	San Cristóbal	Arq. Gregorio Salamanca	MORALBA SURORIENTAL	A	[redacted]	FINALIZADO	699.64	2	TERMINADO	TERMINADO	D	X	
103	0422	4	OR	San Cristóbal	Arq. Gregorio Salamanca		B	[redacted]	FINALIZADO	386.90	2	TERMINADO	TERMINADO	D	X	
104	0426	4	OR	San Cristóbal	Arq. Gregorio Salamanca		C	[redacted]	FINALIZADO	159.25	2	TERMINADO	TERMINADO		X	
105	0443	4	OR	San Cristóbal	Arq. Gregorio Salamanca	NUEVA DELHI	A	Nueva Delhi	FINALIZADO		2	TERMINADO	TERMINADO	D	X	
106	0409	4	OR	San Cristóbal	Carolina Alexandra Munoz Bello	RAFAEL NUÑEZ	A	Rafael Nuñez	FINALIZADO	340.00	3	TERMINADO	TERMINADO		X	
107	0415	4	OR	San Cristóbal	Carolina Alexandra Munoz Bello		B	[redacted]	FINALIZADO	322.60	3	TERMINADO	TERMINADO		X	
108	0410	4	OR	San Cristóbal	Carolina Alexandra Munoz Bello	REPUBLICA DEL ECUADOR	A	Rep. del Ecuador				PENDIENTE DIAG				EN OBRA DE MEJORAMIENTO
110	0451	4	OR	San Cristóbal	Ing. Julio Cesar Luna	SAN ISIDRO -	A	San Isidro	FINALIZADO	895.00	2	TERMINADO	TERMINADO	D	X	

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6736

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

Se continua con la localidad de Kennedy, Manuel Cepeda Vargas en ejecucion, y se asignan fechas a los colegios pendientes por cuenta del subcontratista Dairo Caro, el cual indica intervenir los colegios de suroccidente a nororiente.

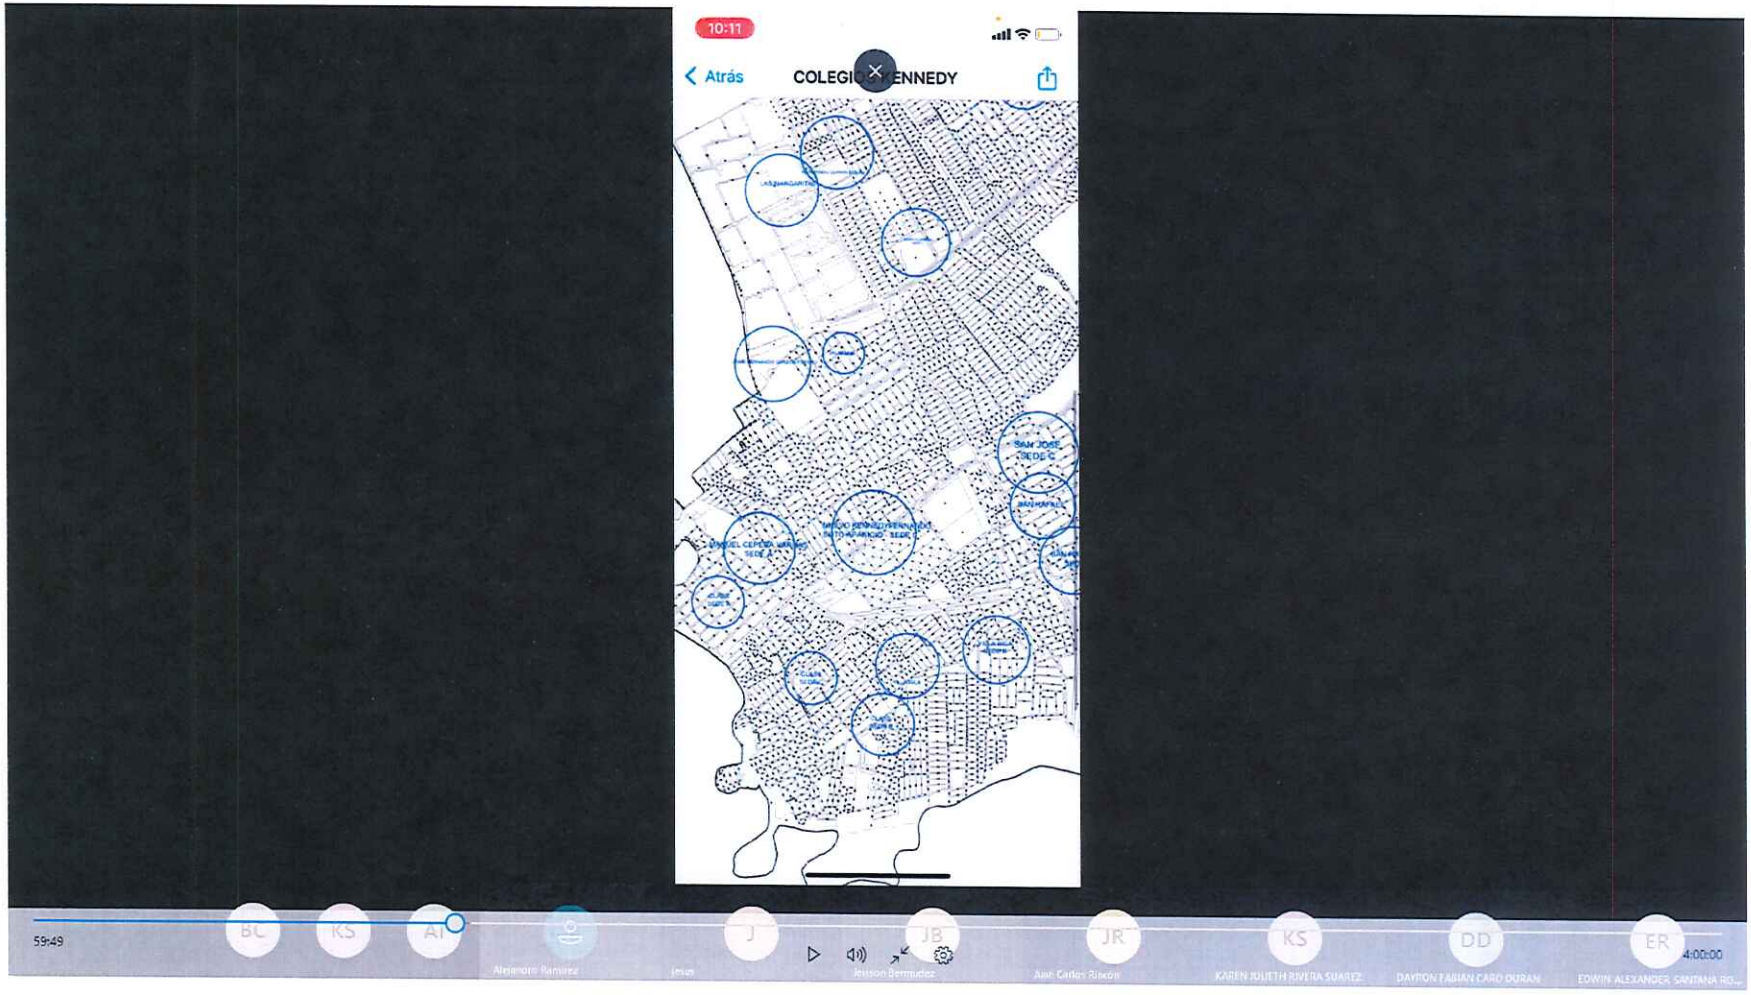

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6737

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

En la localidad de Usme se realiza inspeccion de la matriz para complementarla y se revisa el mapa de la localidad para ubicar los colegios que hacen falta para poder imponer unas fechas limites a cada colegio.

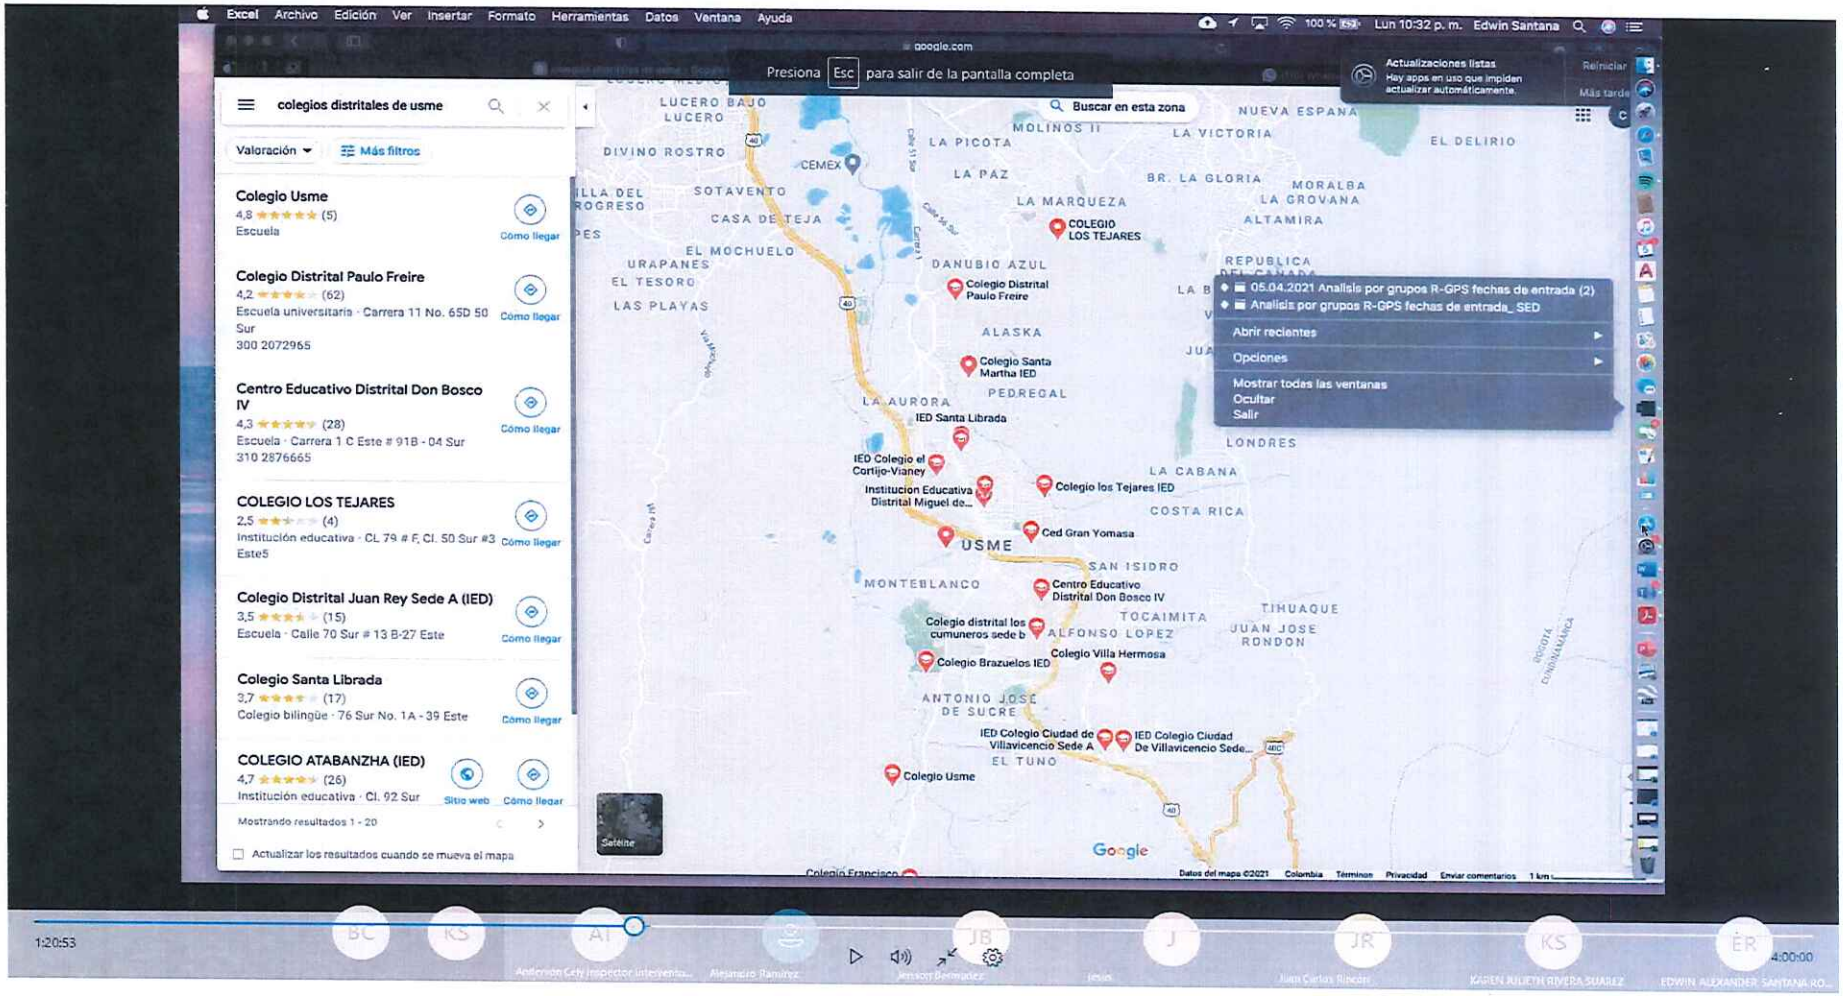


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6738

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

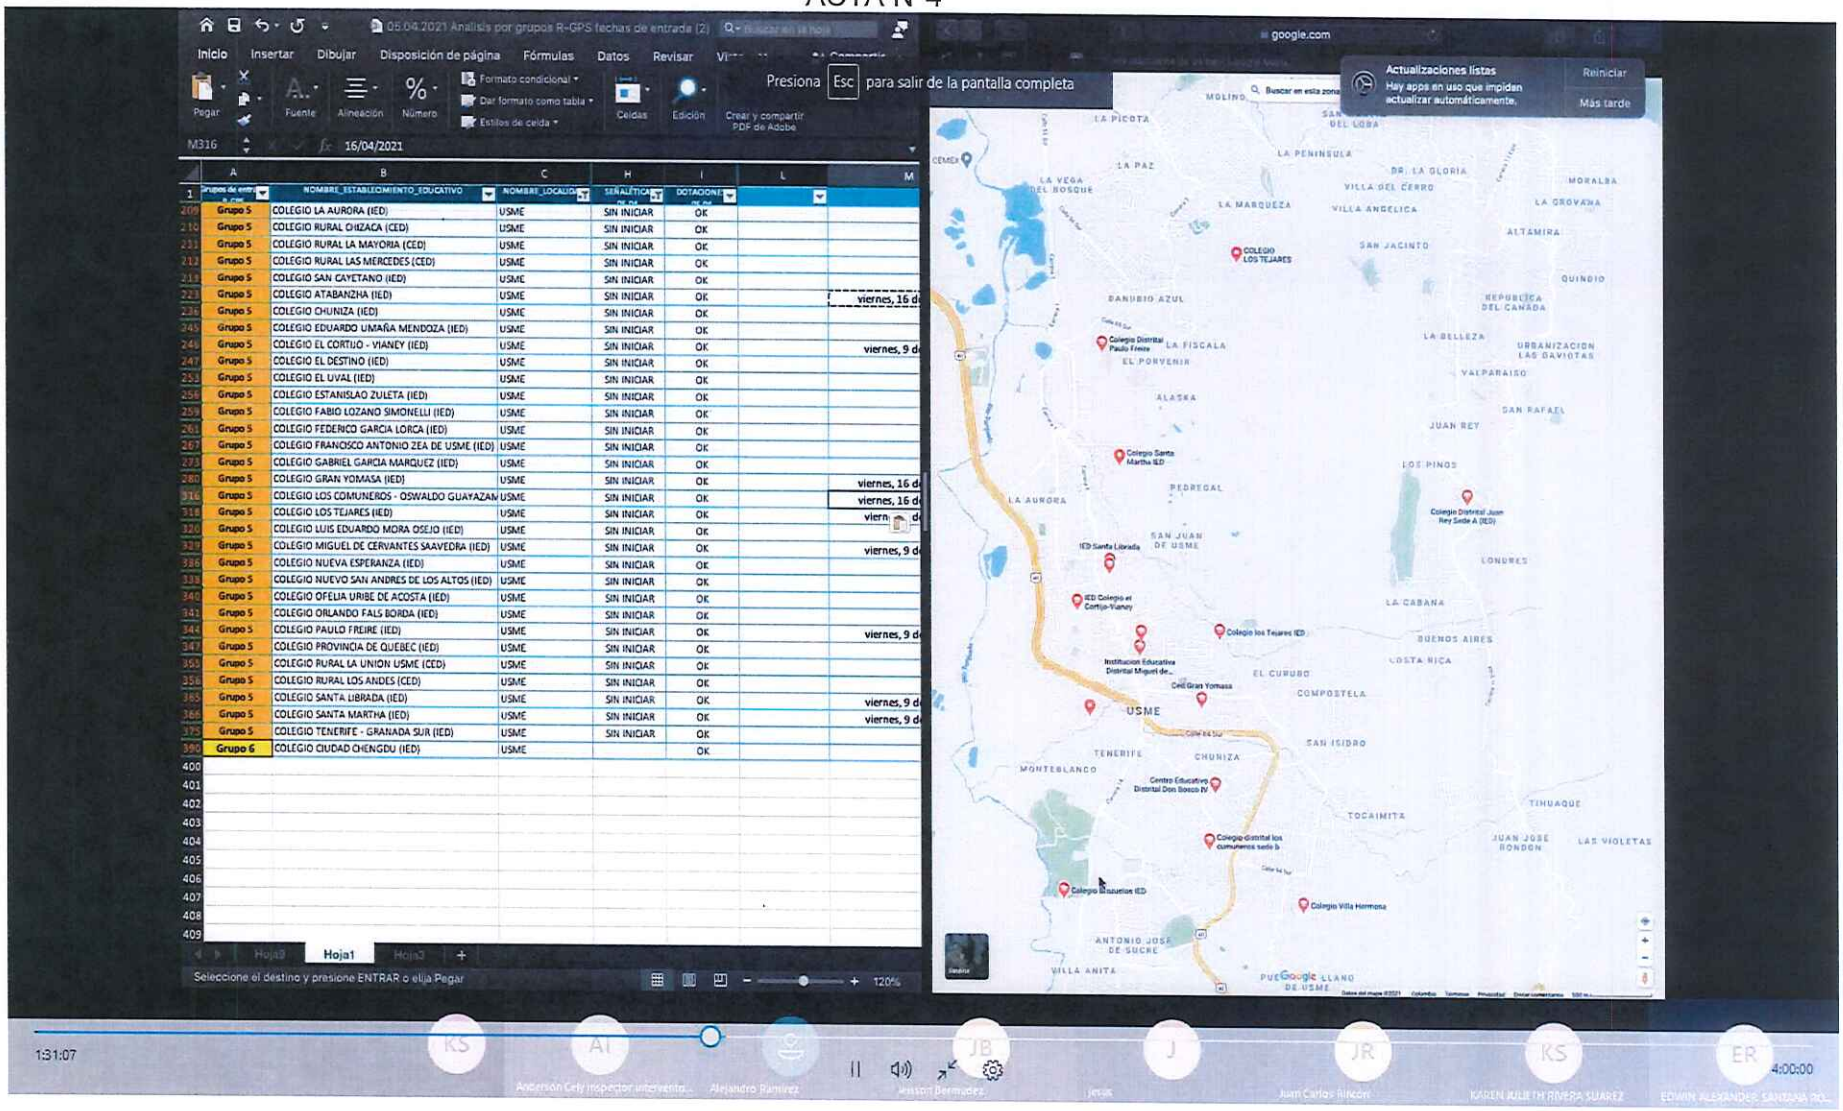

	A	B	C	H	I	L	M
1	Grupos de entre	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDA	SEÑALÉTICA	DOTACIONE		
209	Grupo 5	COLEGIO LA AURORA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
210	Grupo 5	COLEGIO RURAL CHZACA (CED)	USME	SIN INICIAR	OK		
211	Grupo 5	COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED)	USME	SIN INICIAR	OK		
212	Grupo 5	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES (CED)	USME	SIN INICIAR	OK		
213	Grupo 5	COLEGIO SAN CAYETANO (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
223	Grupo 5	COLEGIO ATABANZHA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		viernes, 16 d
236	Grupo 5	COLEGIO CHUNIZA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
245	Grupo 5	COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
246	Grupo 5	COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		viernes, 9 d
247	Grupo 5	COLEGIO EL DESTINO (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
253	Grupo 5	COLEGIO EL UVAL (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
256	Grupo 5	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
259	Grupo 5	COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
261	Grupo 5	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
267	Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
273	Grupo 5	COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
280	Grupo 5	COLEGIO GRAN YOMASA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		viernes, 16 d
316	Grupo 5	COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAN	USME	SIN INICIAR	OK		viernes, 16 d
318	Grupo 5	COLEGIO LOS TEJARES (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		viern
320	Grupo 5	COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
329	Grupo 5	COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		viernes, 9 d
336	Grupo 5	COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
338	Grupo 5	COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
340	Grupo 5	COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
341	Grupo 5	COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
344	Grupo 5	COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		viernes, 9 d
347	Grupo 5	COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
355	Grupo 5	COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED)	USME	SIN INICIAR	OK		
356	Grupo 5	COLEGIO RURAL LOS ANDES (CED)	USME	SIN INICIAR	OK		
365	Grupo 5	COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		viernes, 9 d
366	Grupo 5	COLEGIO SANTA MARTHA (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		viernes, 9 d
375	Grupo 5	COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	USME	SIN INICIAR	OK		
390	Grupo 6	COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)	USME		OK		
400							
401							
402							
403							
404							
405							
406							
407							
408							
409							

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6739

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

En la localidad de Tunjuelito se tiene unos pocos colegios sin intervenir los cuales se les asigna una fecha limite de intervencion.

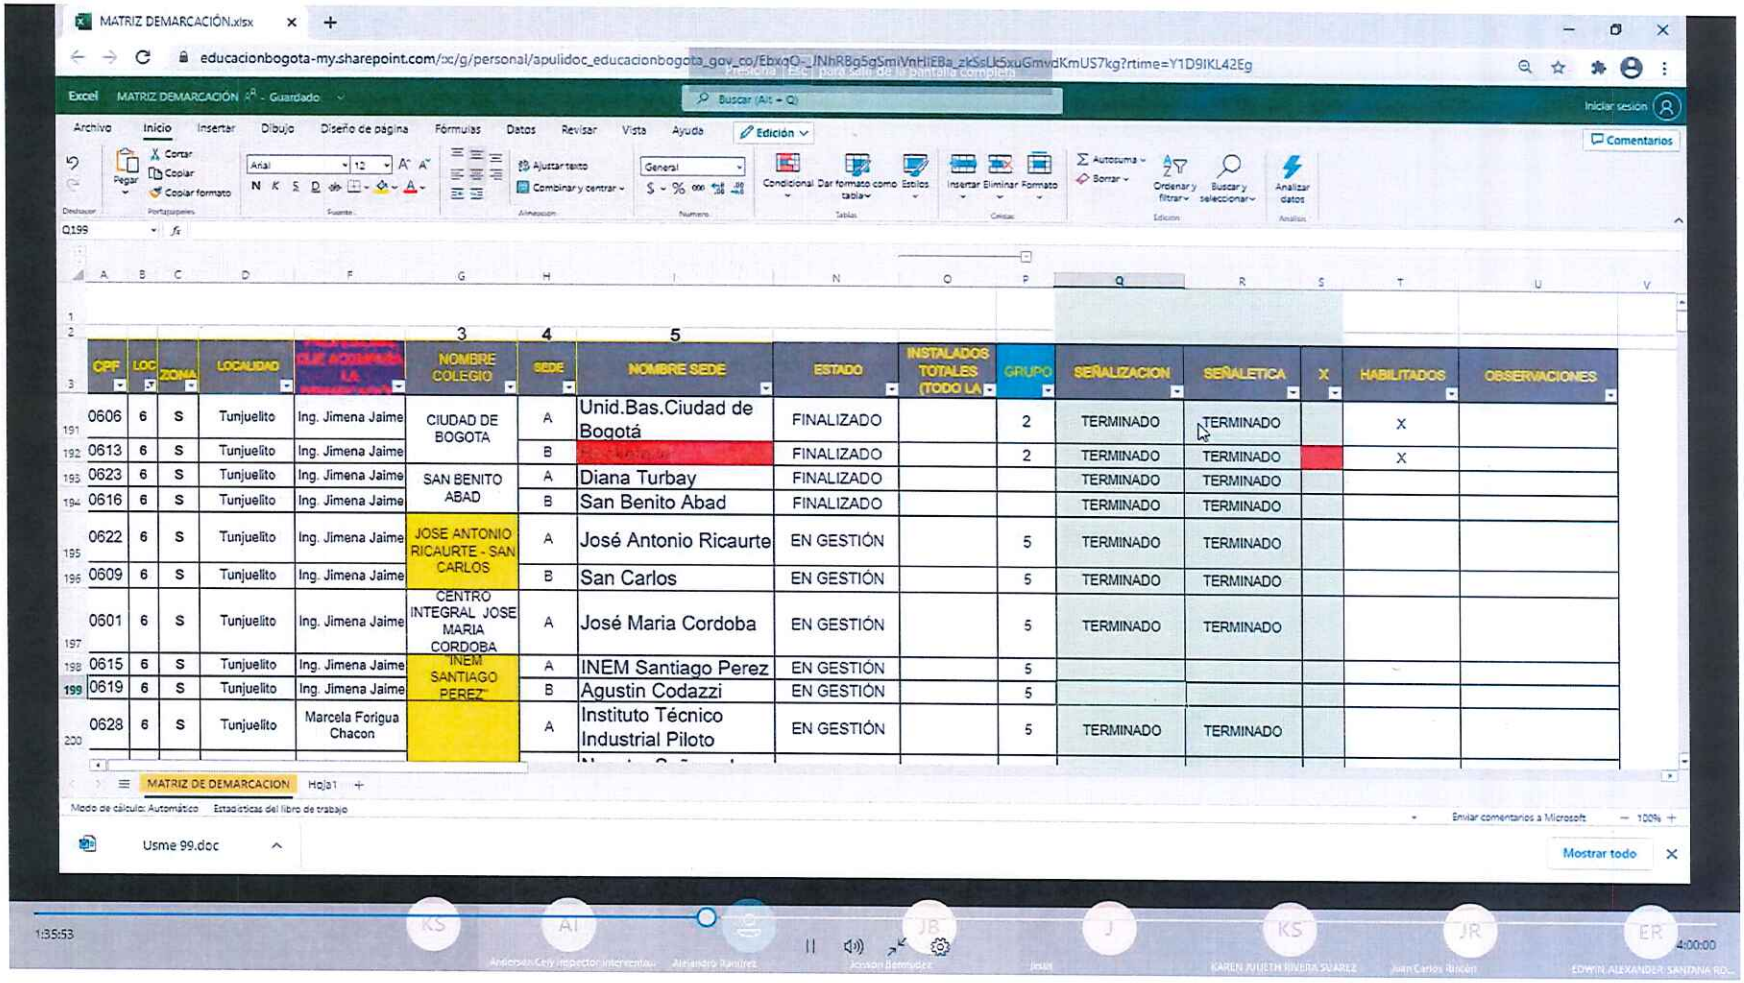

MATRIZ DEMARCACIÓN.xlsx

	CPF	LOC	ZONA	LOCALIDAD	[illegible]	NOMBRE COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	ESTADO	INSTALADOS TOTALES (TODO LA	GRUPO	SEÑALIZACION	SEÑALETICA	X	HABILITADOS	OBSERVACIONES
						3	4	5								
191	0606	6	S	Tunjuelito	Ing. Jimena Jaime	CIUDAD DE BOGOTA	A	Unid.Bas.Ciudad de Bogotá	FINALIZADO		2	TERMINADO	TERMINADO		X	
192	0613	6	S	Tunjuelito	Ing. Jimena Jaime		B	[illegible]	FINALIZADO		2	TERMINADO	TERMINADO		X	
193	0623	6	S	Tunjuelito	Ing. Jimena Jaime	SAN BENITO ABAD	A	Diana Turbay	FINALIZADO			TERMINADO	TERMINADO			
194	0616	6	S	Tunjuelito	Ing. Jimena Jaime		B	San Benito Abad	FINALIZADO			TERMINADO	TERMINADO			
195	0622	6	S	Tunjuelito	Ing. Jimena Jaime	JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS	A	José Antonio Ricaurte	EN GESTIÓN		5	TERMINADO	TERMINADO			
196	0609	6	S	Tunjuelito	Ing. Jimena Jaime		B	San Carlos	EN GESTIÓN		5	TERMINADO	TERMINADO			
197	0601	6	S	Tunjuelito	Ing. Jimena Jaime	CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	A	José Maria Cordoba	EN GESTIÓN		5	TERMINADO	TERMINADO			
198	0615	6	S	Tunjuelito	Ing. Jimena Jaime	"INEM SANTIAGO PEREZ"	A	INEM Santiago Perez	EN GESTIÓN		5					
199	0619	6	S	Tunjuelito	Ing. Jimena Jaime		B	Agustin Codazzi	EN GESTIÓN		5					
200	0628	6	S	Tunjuelito	Marcela Forigua Chacon		A	Instituto Técnico Industrial Piloto	EN GESTIÓN		5	TERMINADO	TERMINADO			


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6740

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

Se pasa a la localidad de Bosa la cual tiene 31 sedes sin intervención, se deja pendiente por asignar fechas ya que el subcontratista Dairo Caro se retiro de la reunión.

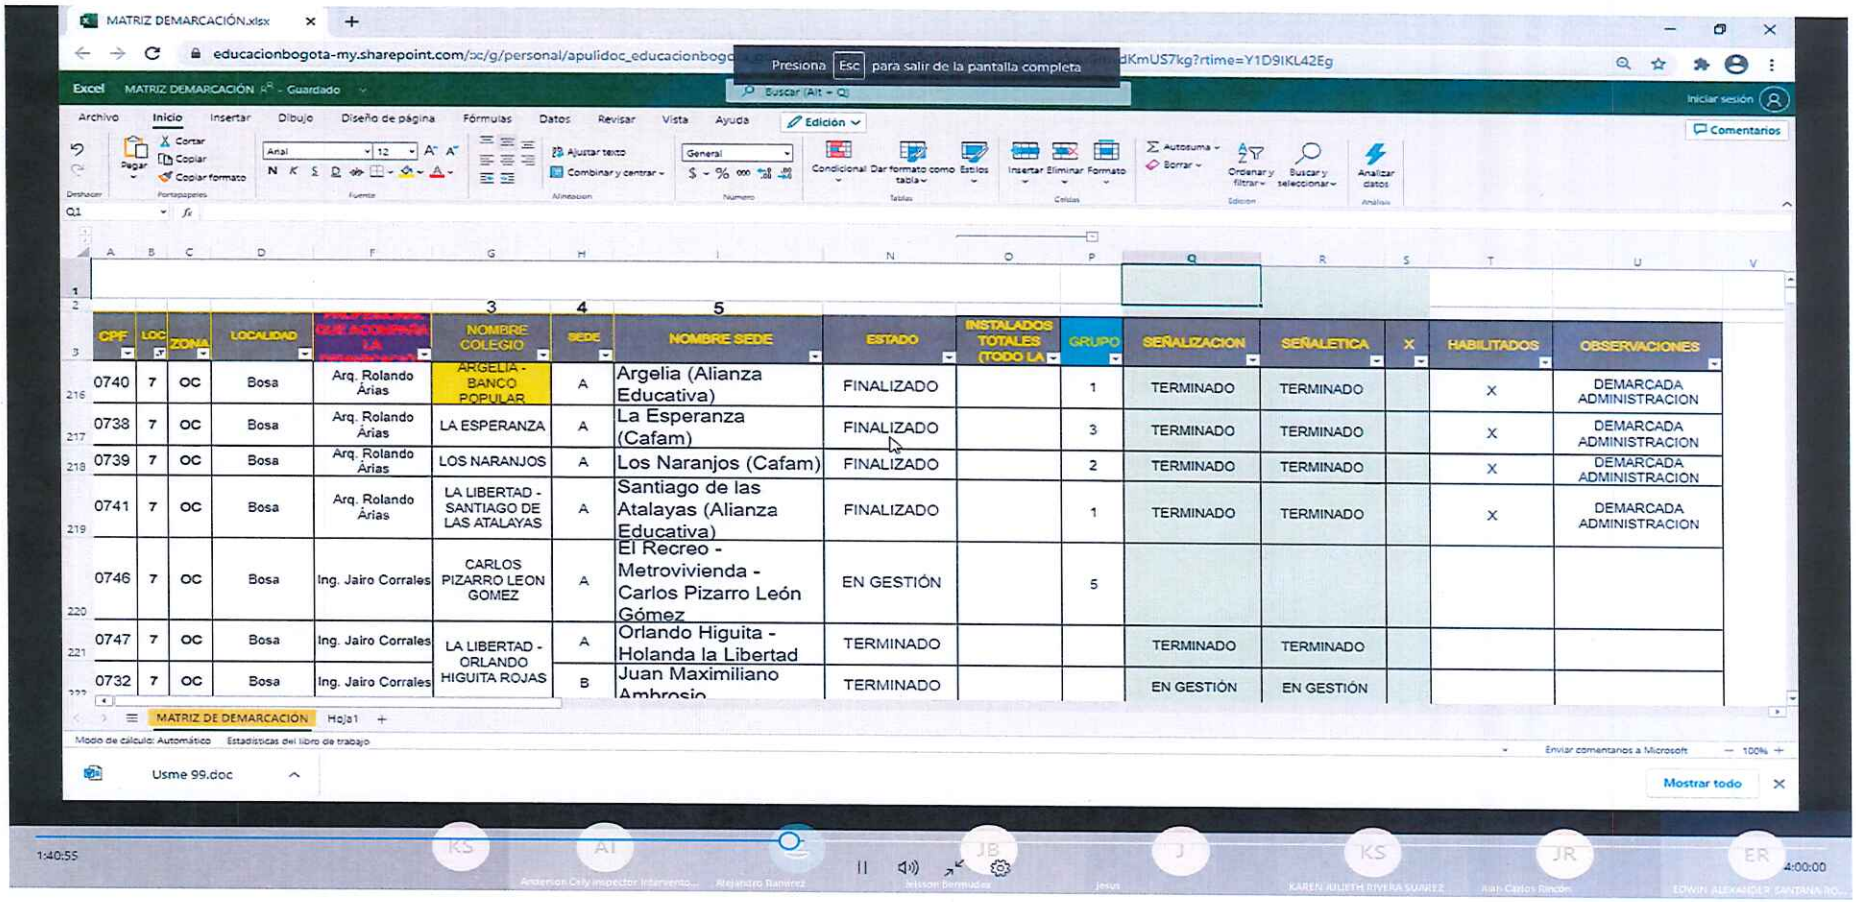

	CPF	LOC	ZONA	LOCALIDAD	PROFESIONAL QUE ACOMPAÑA LA INTERVENCIÓN	3 NOMBRE COLEGIO	4 SEDE	5 NOMBRE SEDE	ESTADO	INSTALADOS TOTALES (TODO LA	GRUPO	SEÑALIZACION	SEÑALETICA	X	HABILITADOS	OBSERVACIONES
216	0740	7	OC	Bosa	Arq. Rolando Árias	ARGELIA - BANCO POPULAR	A	Argelia (Alianza Educativa)	FINALIZADO		1	TERMINADO	TERMINADO		X	DEMARCADA ADMINISTRACION
217	0738	7	OC	Bosa	Arq. Rolando Árias	LA ESPERANZA	A	La Esperanza (Cafam)	FINALIZADO		3	TERMINADO	TERMINADO		X	DEMARCADA ADMINISTRACION
218	0739	7	OC	Bosa	Arq. Rolando Árias	LOS NARANJOS	A	Los Naranjos (Cafam)	FINALIZADO		2	TERMINADO	TERMINADO		X	DEMARCADA ADMINISTRACION
219	0741	7	OC	Bosa	Arq. Rolando Árias	LA LIBERTAD - SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	A	Santiago de las Atalayas (Alianza Educativa)	FINALIZADO		1	TERMINADO	TERMINADO		X	DEMARCADA ADMINISTRACION
220	0746	7	OC	Bosa	Ing. Jairo Corrales	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	A	El Recreo - Metrovivienda - Carlos Pizarro León Gómez	EN GESTIÓN		5					
221	0747	7	OC	Bosa	Ing. Jairo Corrales	LA LIBERTAD - ORLANDO HIGUITA ROJAS	A	Orlando Higuita - Holanda la Libertad	TERMINADO			TERMINADO	TERMINADO			
???	0732	7	OC	Bosa	Ing. Jairo Corrales		B	Juan Maximiliano Ambrosio	TERMINADO			EN GESTIÓN	EN GESTIÓN			


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6741

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

En la localidad de Fontibon se asignan fechas a las instituciones sin intervenir y se informa que la institución Luis Angel Arango se encuentra en ejecucion. Se asigna la localidad de Fontibon el subcontratista G y G.

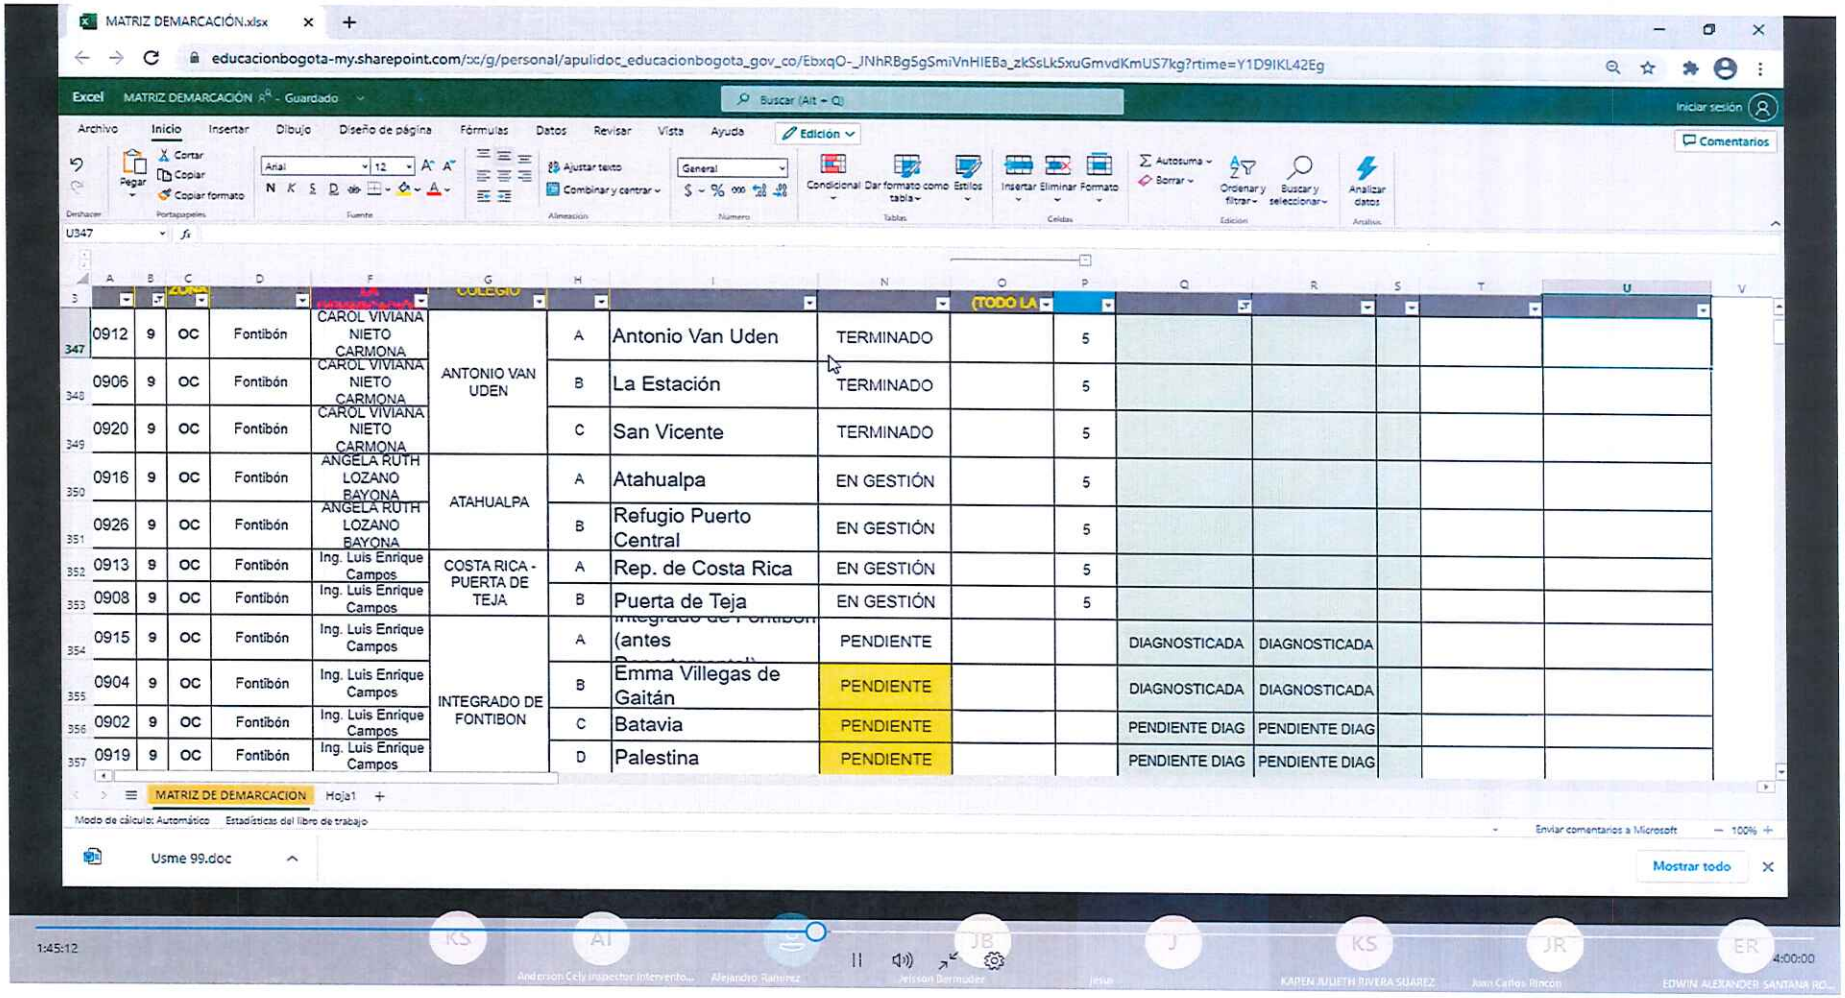

347	0912	9	OC	Fontibón	CAROL VIVIANA NIETO CARMONA	ANTONIO VAN UDEN	A	Antonio Van Uden	TERMINADO		5				
348	0906	9	OC	Fontibón	CAROL VIVIANA NIETO CARMONA		B	La Estación	TERMINADO		5				
349	0920	9	OC	Fontibón	CAROL VIVIANA NIETO CARMONA		C	San Vicente	TERMINADO		5				
350	0916	9	OC	Fontibón	ANGELA RUTH LOZANO BAYONA	ATAHUALPA	A	Atahualpa	EN GESTIÓN		5				
351	0926	9	OC	Fontibón	ANGELA RUTH LOZANO BAYONA		B	Refugio Puerto Central	EN GESTIÓN		5				
352	0913	9	OC	Fontibón	Ing. Luis Enrique Campos	COSTA RICA - PUERTA DE TEJA	A	Rep. de Costa Rica	EN GESTIÓN		5				
353	0908	9	OC	Fontibón	Ing. Luis Enrique Campos		B	Puerta de Teja	EN GESTIÓN		5				
354	0915	9	OC	Fontibón	Ing. Luis Enrique Campos	INTEGRADO DE FONTIBON	A	[illegible] (antes	PENDIENTE			DIAGNOSTICADA	DIAGNOSTICADA		
355	0904	9	OC	Fontibón	Ing. Luis Enrique Campos		B	Emma Villegas de Gaitán	PENDIENTE			DIAGNOSTICADA	DIAGNOSTICADA		
356	0902	9	OC	Fontibón	Ing. Luis Enrique Campos		C	Batavia	PENDIENTE			PENDIENTE DIAG	PENDIENTE DIAG		
357	0919	9	OC	Fontibón	Ing. Luis Enrique Campos		D	Palestina	PENDIENTE			PENDIENTE DIAG	PENDIENTE DIAG		

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6742

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

En la localidad de Engativa 18 sedes educativas cuentan sin intervención o faltan para dar como terminados al 100%.

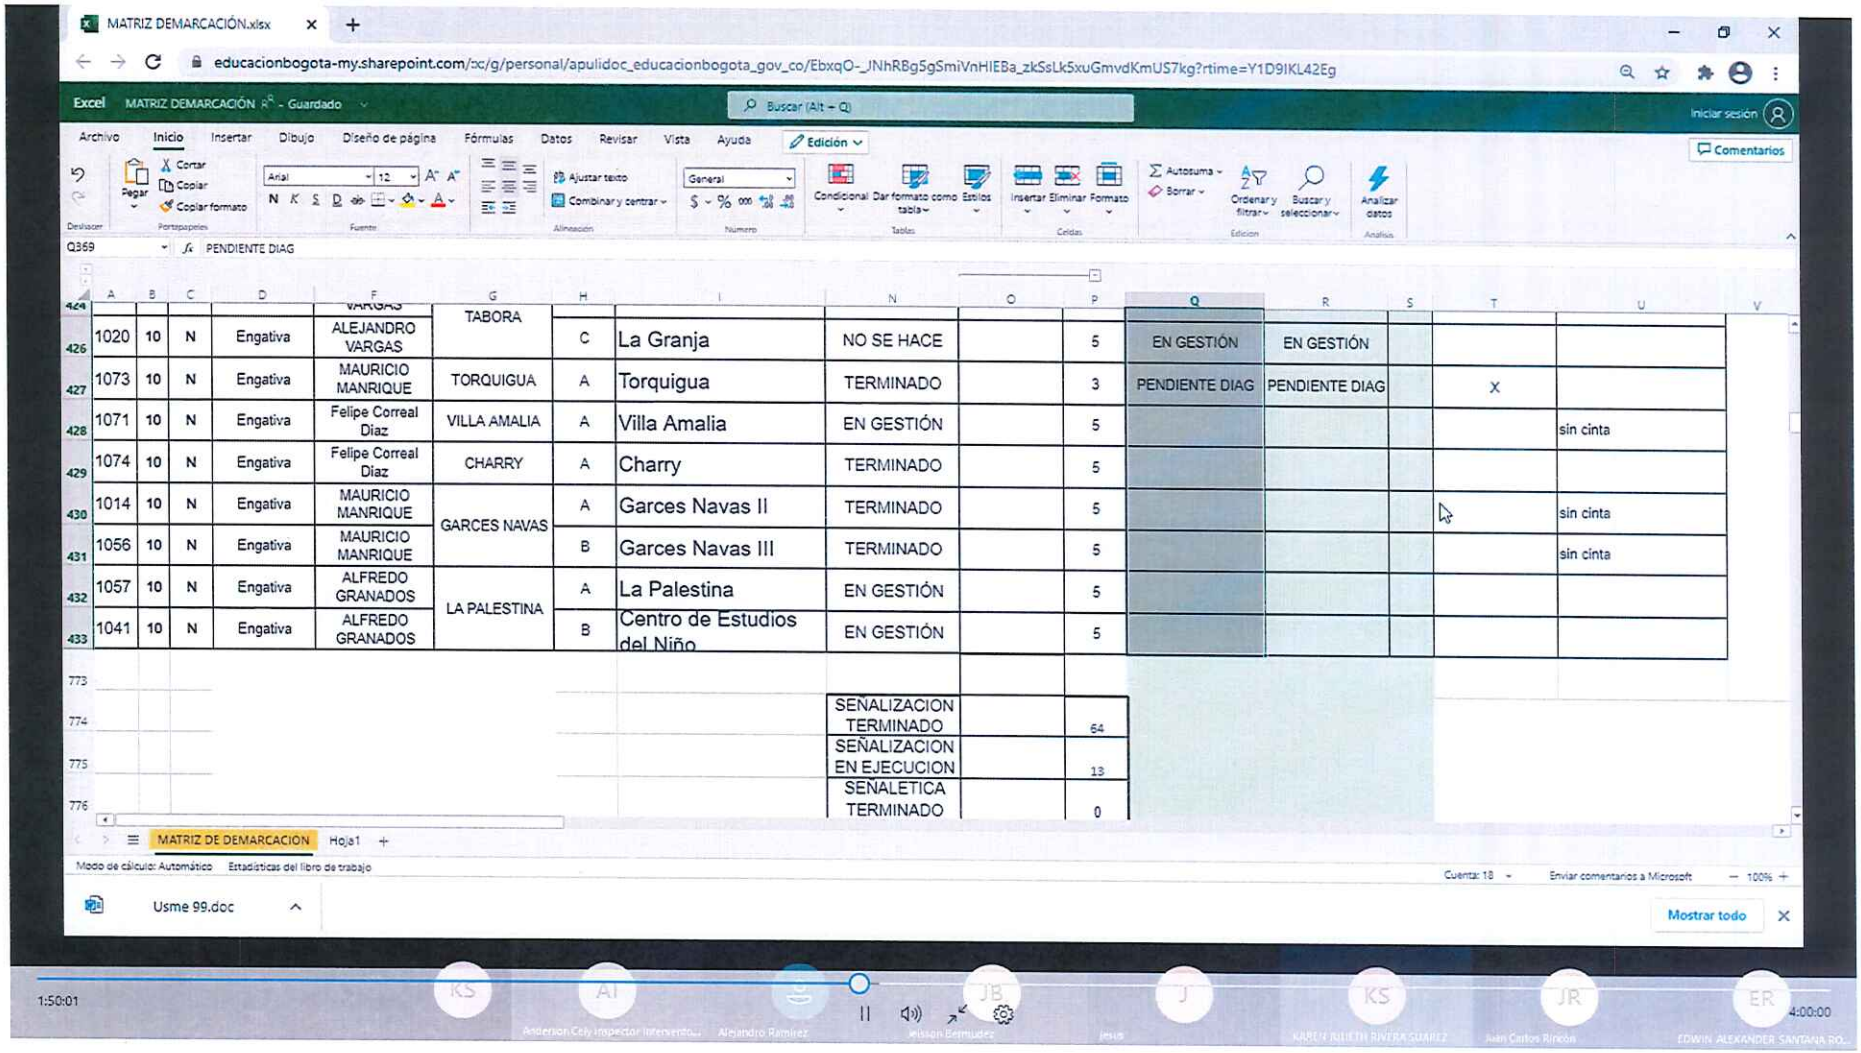

MATRIZ DEMARCACIÓN.xlsx

426	1020	10	N	Engativa	ALEJANDRO VARGAS	TABORA	C	La Granja	NO SE HACE		5	EN GESTIÓN	EN GESTIÓN					
427	1073	10	N	Engativa	MAURICIO MANRIQUE	TORQUIGUA	A	Torquigua	TERMINADO		3	PENDIENTE DIAG	PENDIENTE DIAG		X			
428	1071	10	N	Engativa	Felipe Correal Diaz	VILLA AMALIA	A	Villa Amalia	EN GESTIÓN		5							sin cinta
429	1074	10	N	Engativa	Felipe Correal Diaz	CHARRY	A	Charry	TERMINADO		5							
430	1014	10	N	Engativa	MAURICIO MANRIQUE	GARCES NAVAS	A	Garces Navas II	TERMINADO		5							sin cinta
431	1056	10	N	Engativa	MAURICIO MANRIQUE		B	Garces Navas III	TERMINADO		5							sin cinta
432	1057	10	N	Engativa	ALFREDO GRANADOS	LA PALESTINA	A	La Palestina	EN GESTIÓN		5							
433	1041	10	N	Engativa	ALFREDO GRANADOS		B	Centro de Estudios del Niño	EN GESTIÓN		5							
773																		
774									SEÑALIZACION TERMINADO		64							
775									SEÑALIZACION EN EJECUCION		13							
776									SEÑALETICA TERMINADO		0							

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6743

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

En la localidad de Suba 50 sedes educativas cuentan sin intervención o faltan para dar como terminados al 100%.

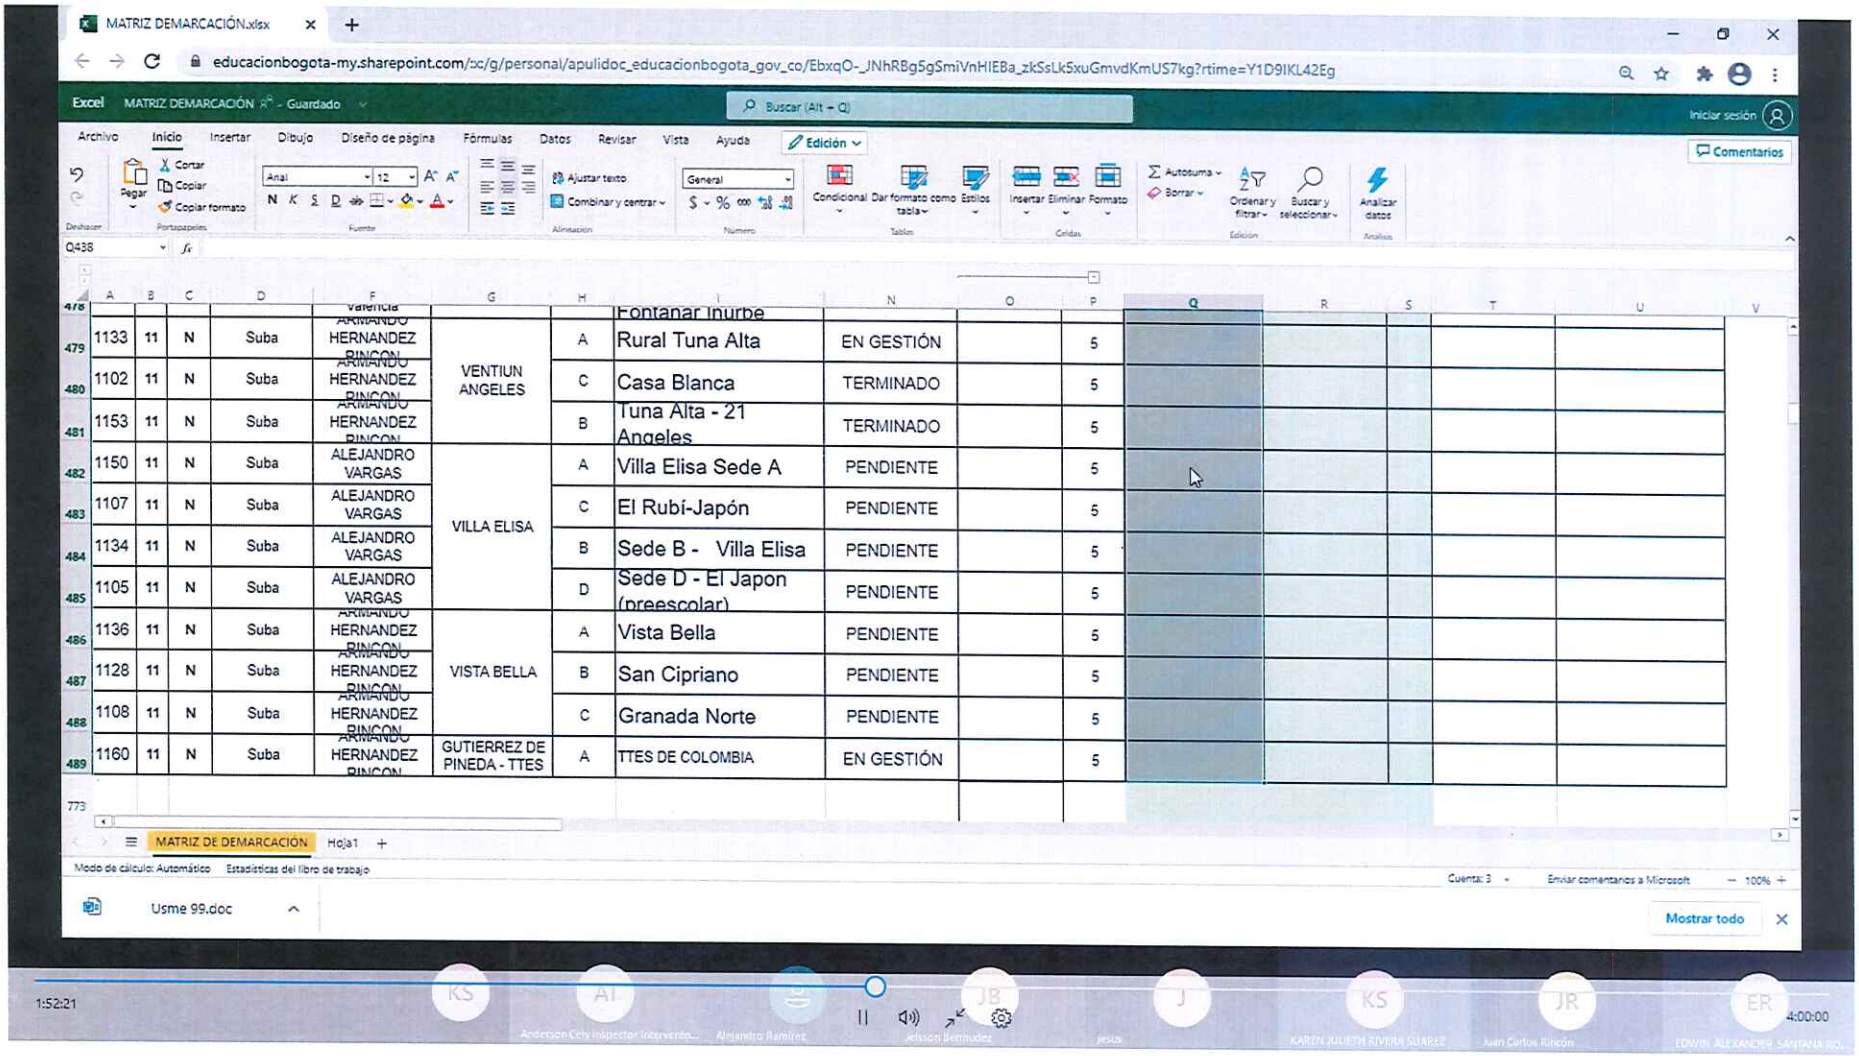

1133	11	N	Suba	ARMANDO HERNANDEZ RINCON	VENTIUN ANGELES	A	Rural Tuna Alta	EN GESTIÓN		5	
1102	11	N	Suba	ARMANDO HERNANDEZ RINCON		C	Casa Blanca	TERMINADO		5	
1153	11	N	Suba	ARMANDO HERNANDEZ RINCON		B	Tuna Alta - 21 Angeles	TERMINADO		5	
1150	11	N	Suba	ALEJANDRO VARGAS	VILLA ELISA	A	Villa Elisa Sede A	PENDIENTE		5	
1107	11	N	Suba	ALEJANDRO VARGAS		C	El Rubí-Japón	PENDIENTE		5	
1134	11	N	Suba	ALEJANDRO VARGAS		B	Sede B - Villa Elisa	PENDIENTE		5	
1105	11	N	Suba	ALEJANDRO VARGAS		D	Sede D - El Japon (preescolar)	PENDIENTE		5	
1136	11	N	Suba	ARMANDO HERNANDEZ RINCON	VISTA BELLA	A	Vista Bella	PENDIENTE		5	
1128	11	N	Suba	ARMANDO HERNANDEZ RINCON		B	San Cipriano	PENDIENTE		5	
1108	11	N	Suba	ARMANDO HERNANDEZ RINCON		C	Granada Norte	PENDIENTE		5	
1160	11	N	Suba	ARMANDO HERNANDEZ RINCON	GUTIERREZ DE PINEDA - TTES	A	TTES DE COLOMBIA	EN GESTIÓN		5	

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6744

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

En la localidad de Barrios Unidos 22 sedes educativas cuentan sin intervención o faltan para dar como terminados al 100%.

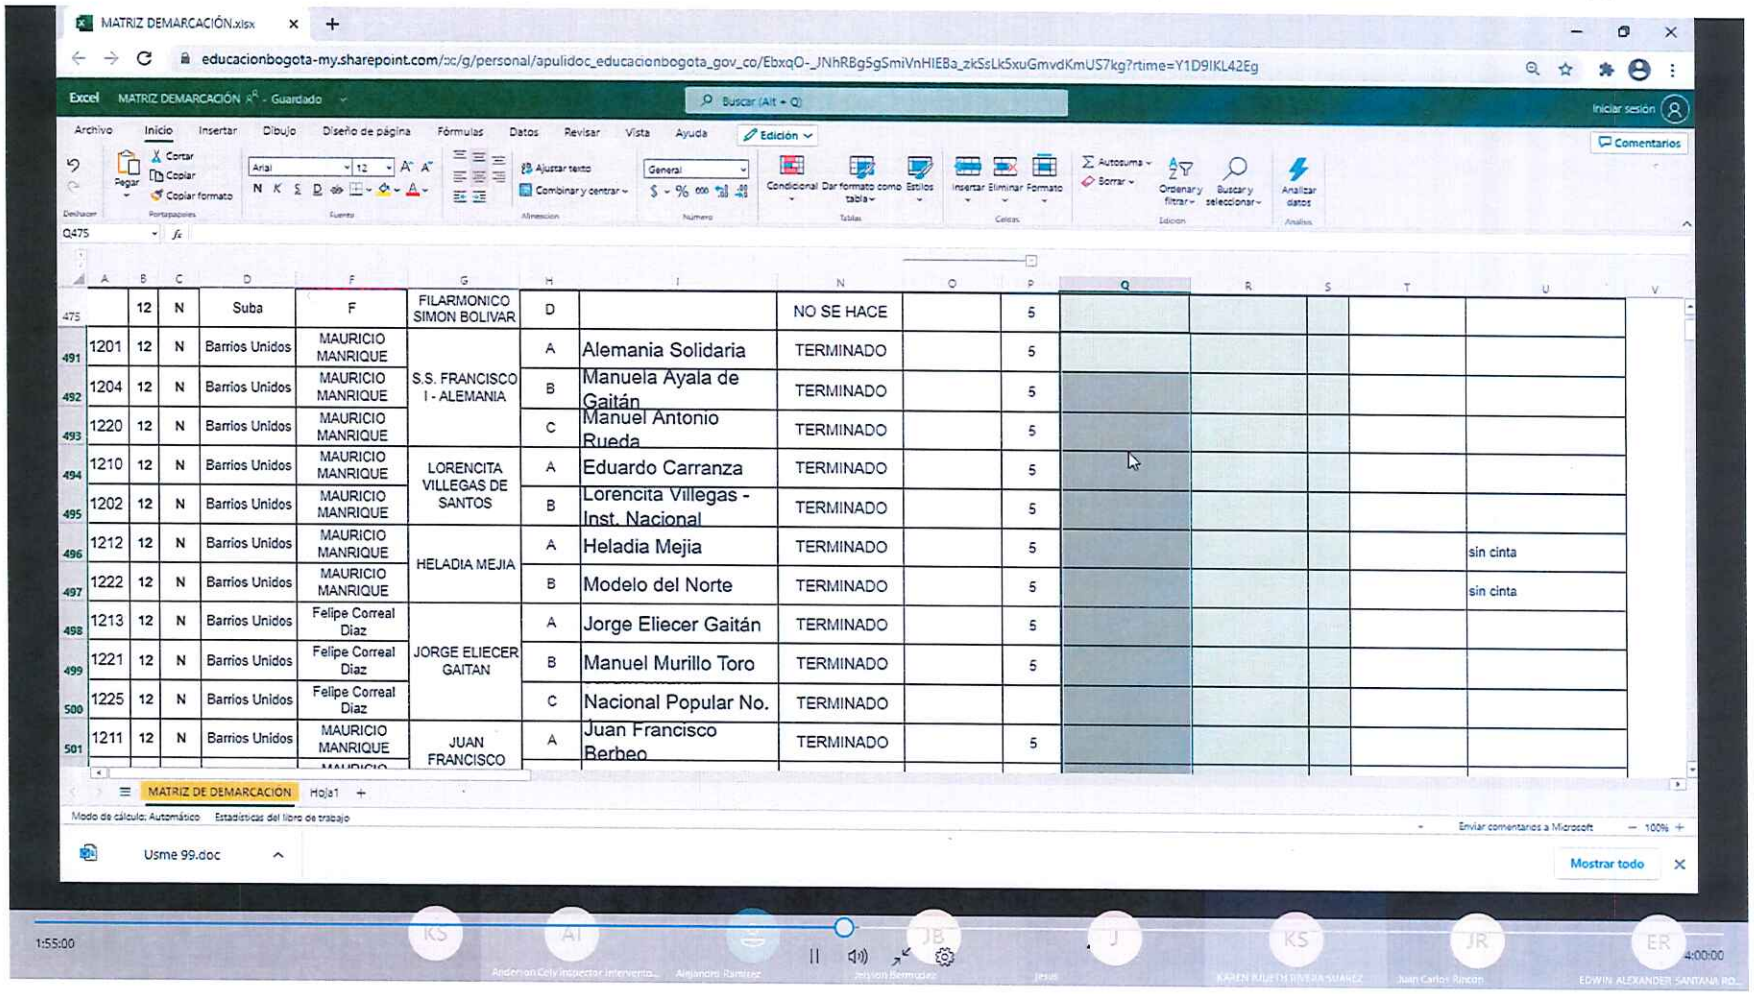


475		12	N	Suba	F	FILARMONICO SIMON BOLIVAR	D		NO SE HACE		5								
491	1201	12	N	Barrios Unidos	MAURICIO MANRIQUE	S.S. FRANCISCO I - ALEMANIA	A	Alemania Solidaria	TERMINADO		5								
492	1204	12	N	Barrios Unidos	MAURICIO MANRIQUE		B	Manuela Ayala de Gaitán	TERMINADO		5								
493	1220	12	N	Barrios Unidos	MAURICIO MANRIQUE		C	Manuel Antonio Rueda	TERMINADO		5								
494	1210	12	N	Barrios Unidos	MAURICIO MANRIQUE	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS	A	Eduardo Carranza	TERMINADO		5								
495	1202	12	N	Barrios Unidos	MAURICIO MANRIQUE		B	Lorencita Villegas - Inst. Nacional	TERMINADO		5								
496	1212	12	N	Barrios Unidos	MAURICIO MANRIQUE	HELADIA MEJIA	A	Heladia Mejia	TERMINADO		5								sin cinta
497	1222	12	N	Barrios Unidos	MAURICIO MANRIQUE		B	Modelo del Norte	TERMINADO		5								sin cinta
498	1213	12	N	Barrios Unidos	Felipe Correal Diaz	JORGE ELIECER GAITAN	A	Jorge Eliecer Gaitán	TERMINADO		5								
499	1221	12	N	Barrios Unidos	Felipe Correal Diaz		B	Manuel Murillo Toro	TERMINADO		5								
500	1225	12	N	Barrios Unidos	Felipe Correal Diaz		C	Nacional Popular No.	TERMINADO										
501	1211	12	N	Barrios Unidos	MAURICIO MANRIQUE	JUAN FRANCISCO	A	Juan Francisco Berbeo	TERMINADO		5								

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

En la localidad de Teusaquillo se encuentran todas las sedes terminadas al 100%.

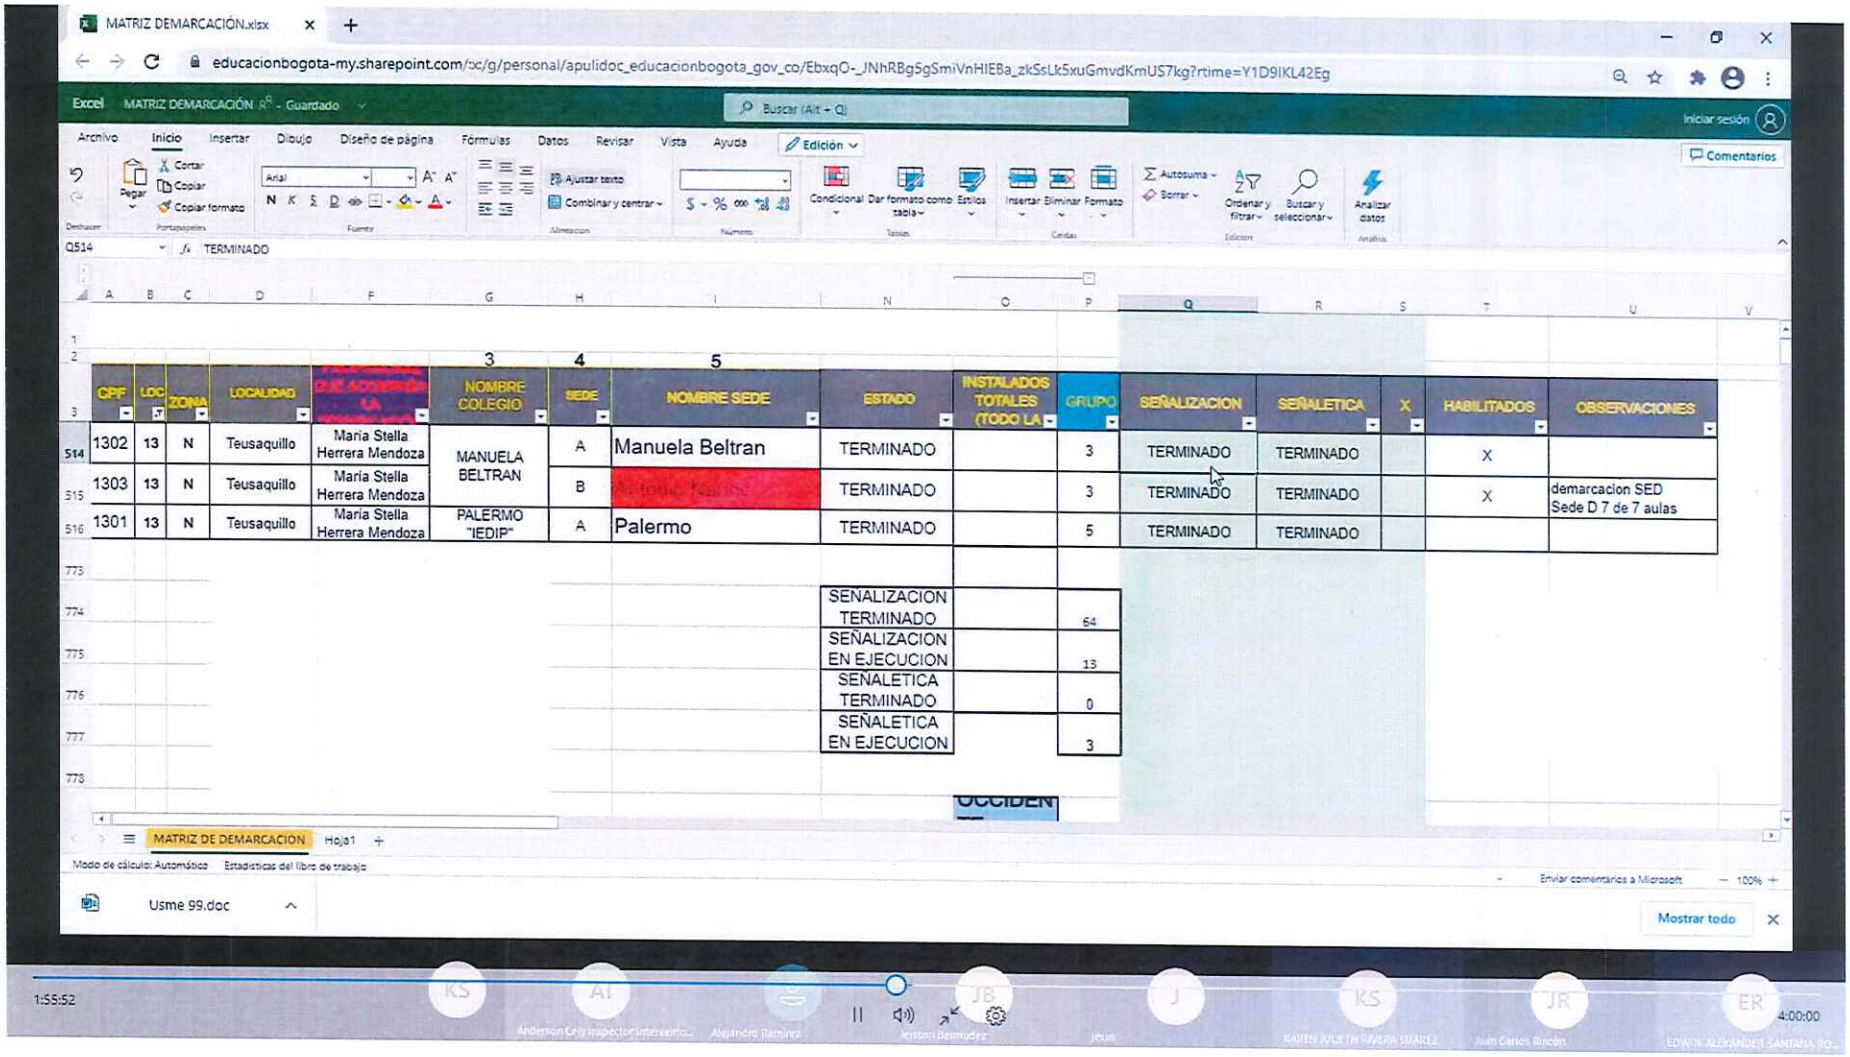

CDP	LOC	ZONA	LOCALIDAD	DIR ACOMPAÑA LA	NOMBRE COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	ESTADO	INSTALADOS TOTALES (TODO LA	GRUPO	SEÑALIZACION	SEÑALETICA	X	HABILITADOS	OBSERVACIONES
1302	13	N	Teusaquillo	Maria Stella Herrera Mendoza	MANUELA BELTRAN	A	Manuela Beltran	TERMINADO		3	TERMINADO	TERMINADO		X	
1303	13	N	Teusaquillo	Maria Stella Herrera Mendoza		B	[redacted]	TERMINADO		3	TERMINADO	TERMINADO		X	demarcacion SED Sede D 7 de 7 aulas
1301	13	N	Teusaquillo	Maria Stella Herrera Mendoza	PALERMO "IEDIP"	A	Palermo	TERMINADO		5	TERMINADO	TERMINADO			

SEÑALIZACION TERMINADO	64
SEÑALIZACION EN EJECUCION	13
SEÑALETICA TERMINADO	0
SEÑALETICA EN EJECUCION	3


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6746

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

En la localidad de Martires se encuentran todas las sedes terminadas al 100%.

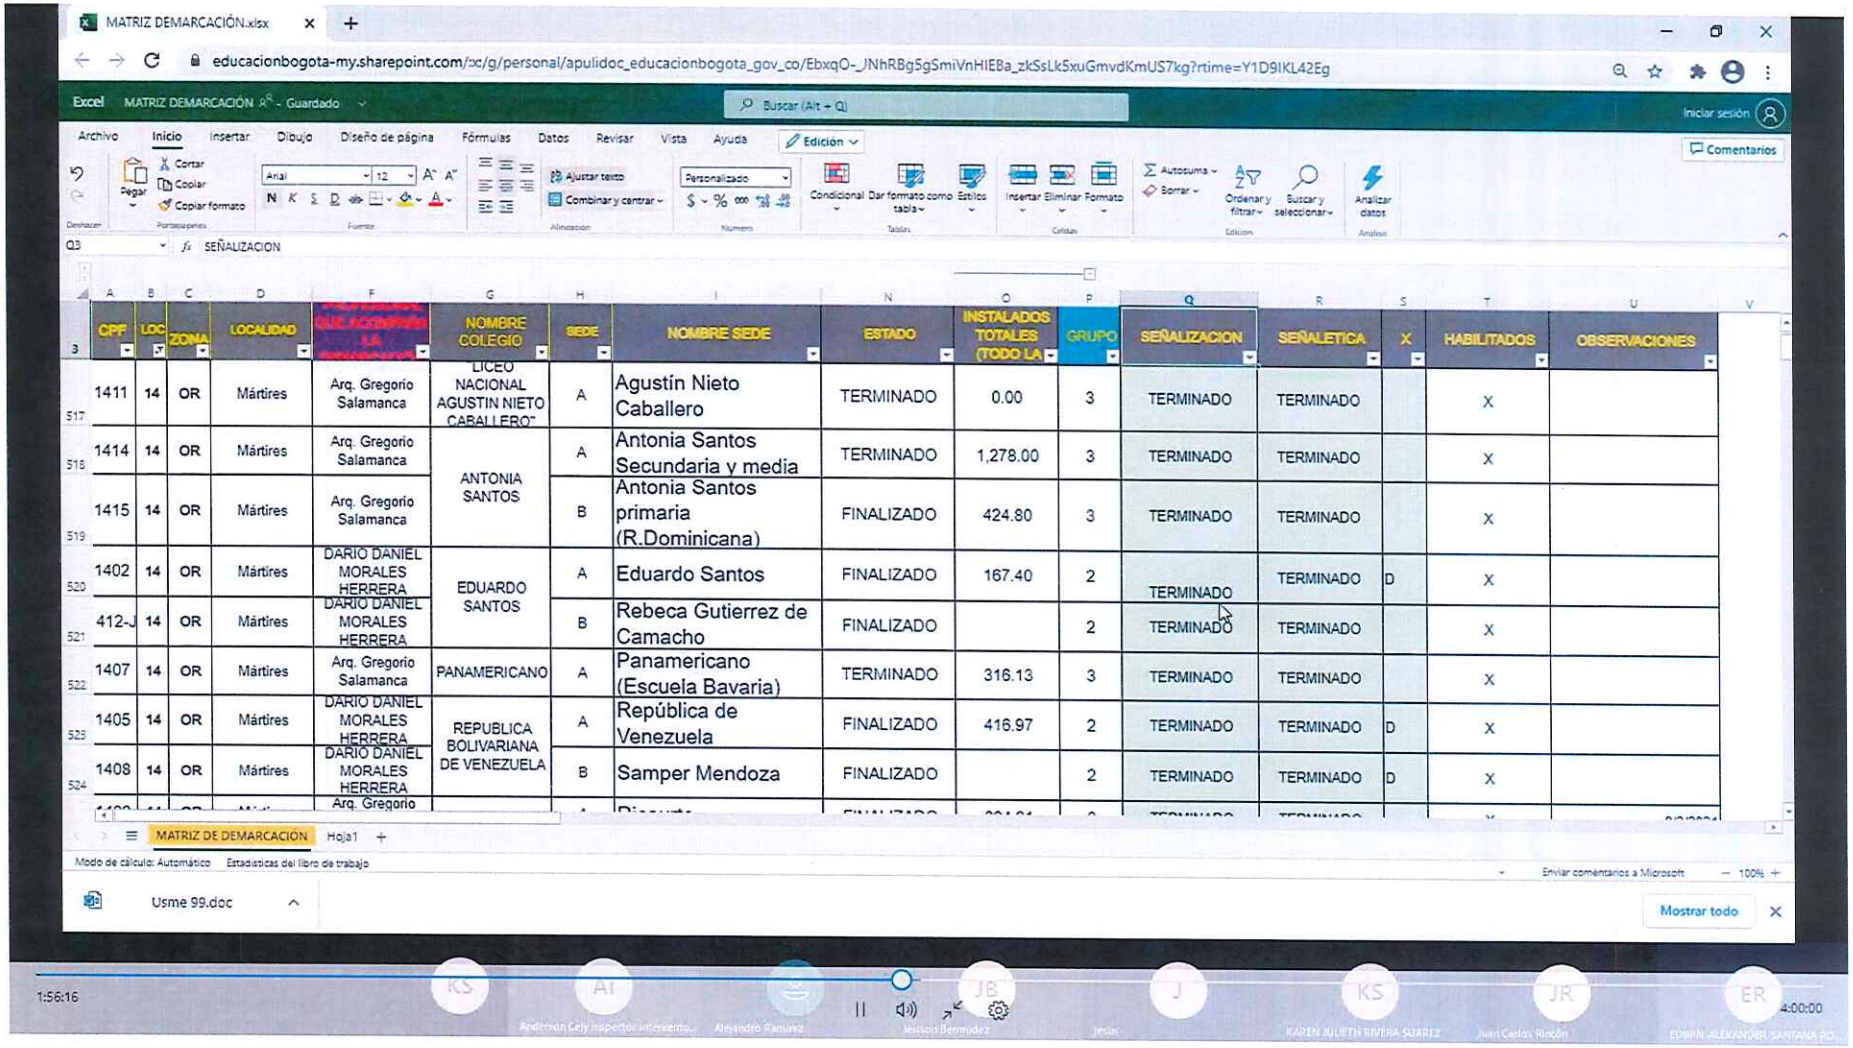

MATRIZ DEMARCACIÓN.xlsx

CPF	LOC	ZONA	LOCALIDAD	QUE ACOMPAÑA LA	NOMBRE COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	ESTADO	INSTALADOS TOTALES (TODO LA	GRUPO	SEÑALIZACION	SEÑALETICA	X	HABILITADOS	OBSERVACIONES
1411	14	OR	Mártires	Arq. Gregorio Salamanca	LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO"	A	Agustín Nieto Caballero	TERMINADO	0.00	3	TERMINADO	TERMINADO		X	
1414	14	OR	Mártires	Arq. Gregorio Salamanca	ANTONIA SANTOS	A	Antonia Santos Secundaria y media	TERMINADO	1,278.00	3	TERMINADO	TERMINADO		X	
1415	14	OR	Mártires	Arq. Gregorio Salamanca		B	Antonia Santos primaria (R.Dominicana)	FINALIZADO	424.80	3	TERMINADO	TERMINADO		X	
1402	14	OR	Mártires	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	EDUARDO SANTOS	A	Eduardo Santos	FINALIZADO	167.40	2	TERMINADO	TERMINADO	D	X	
412-J	14	OR	Mártires	DARIO DANIEL MORALES HERRERA		B	Rebeca Gutierrez de Camacho	FINALIZADO		2	TERMINADO	TERMINADO		X	
1407	14	OR	Mártires	Arq. Gregorio Salamanca	PANAMERICANO	A	Panamericano (Escuela Bavaria)	TERMINADO	316.13	3	TERMINADO	TERMINADO		X	
1405	14	OR	Mártires	DARIO DANIEL MORALES HERRERA	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	A	República de Venezuela	FINALIZADO	416.97	2	TERMINADO	TERMINADO	D	X	
1408	14	OR	Mártires	DARIO DANIEL MORALES HERRERA		B	Samper Mendoza	FINALIZADO		2	TERMINADO	TERMINADO	D	X	


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6747

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

En la localidad de Antonio Nariño se revisa la matriz y se observa que el colegio Atanasio Girardot se encuentra en ejecucion pendiente señaletica, se le asigna para terminar el dia miercoles, y los demas colegios se asignas para terminar 100% de todos los colegios.

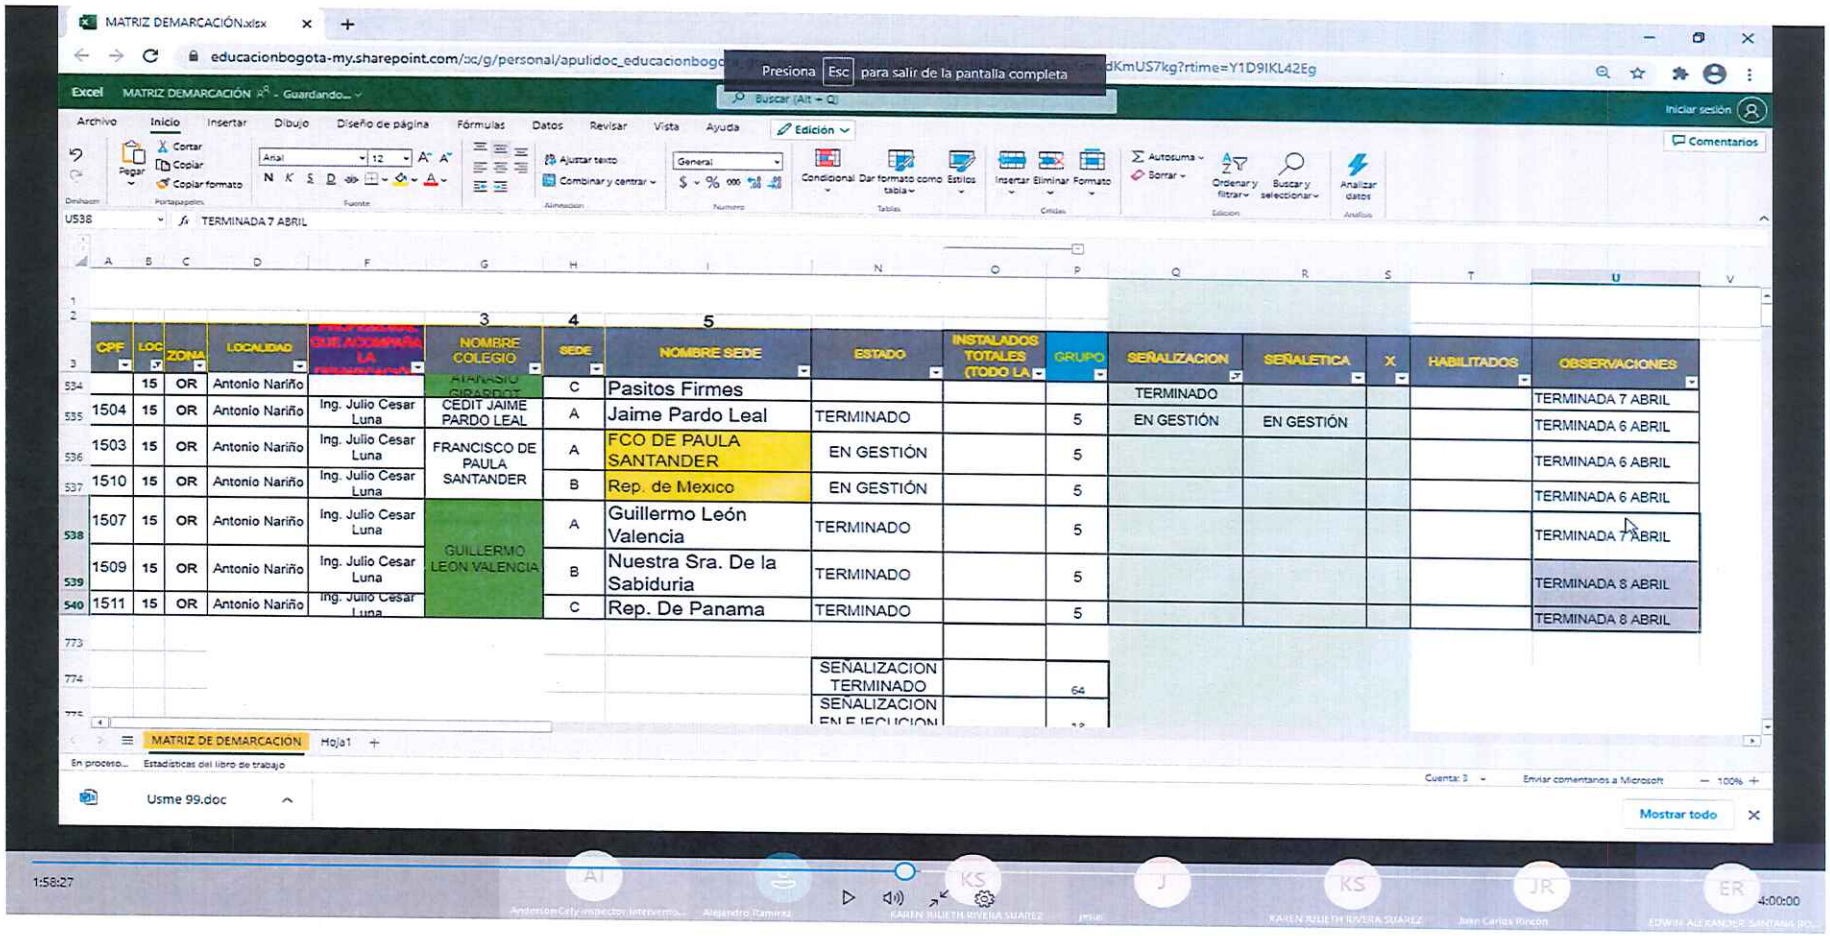


	CPF	LOC	ZONA	LOCALIDAD	QUE ACOMPAÑA LA	NOMBRE COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	ESTADO	INSTALADOS TOTALES (TODO LA	GRUPO	SEÑALIZACION	SEÑALETICA	X	HABILITADOS	OBSERVACIONES
						3	4	5								
534		15	OR	Antonio Nariño		ATANASIO GIRARDOT	C	Pasitos Firmes				TERMINADO				TERMINADA 7 ABRIL
535	1504	15	OR	Antonio Nariño	Ing. Julio Cesar Luna	CEDIT JAIME PARDO LEAL	A	Jaime Pardo Leal	TERMINADO		5	EN GESTIÓN	EN GESTIÓN			TERMINADA 6 ABRIL
536	1503	15	OR	Antonio Nariño	Ing. Julio Cesar Luna	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	FCO DE PAULA SANTANDER	EN GESTIÓN		5					TERMINADA 6 ABRIL
537	1510	15	OR	Antonio Nariño	Ing. Julio Cesar Luna		B	Rep. de Mexico	EN GESTIÓN		5					TERMINADA 6 ABRIL
538	1507	15	OR	Antonio Nariño	Ing. Julio Cesar Luna	GUILLERMO LEON VALENCIA	A	Guillermo León Valencia	TERMINADO		5					TERMINADA 7 ABRIL
539	1509	15	OR	Antonio Nariño	Ing. Julio Cesar Luna		B	Nuestra Sra. De la Sabiduria	TERMINADO		5					TERMINADA 8 ABRIL
540	1511	15	OR	Antonio Nariño	Ing. Julio Cesar Luna		C	Rep. De Panama	TERMINADO		5					TERMINADA 8 ABRIL
773																
774									SEÑALIZACION TERMINADO		64					
									SEÑALIZACION EN EJECUCION							

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6748

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

En la localidad de Puente Aranda están pendientes 15 sedes por intervenir las cuales son asignadas para empezar a intervenir la otra semana.

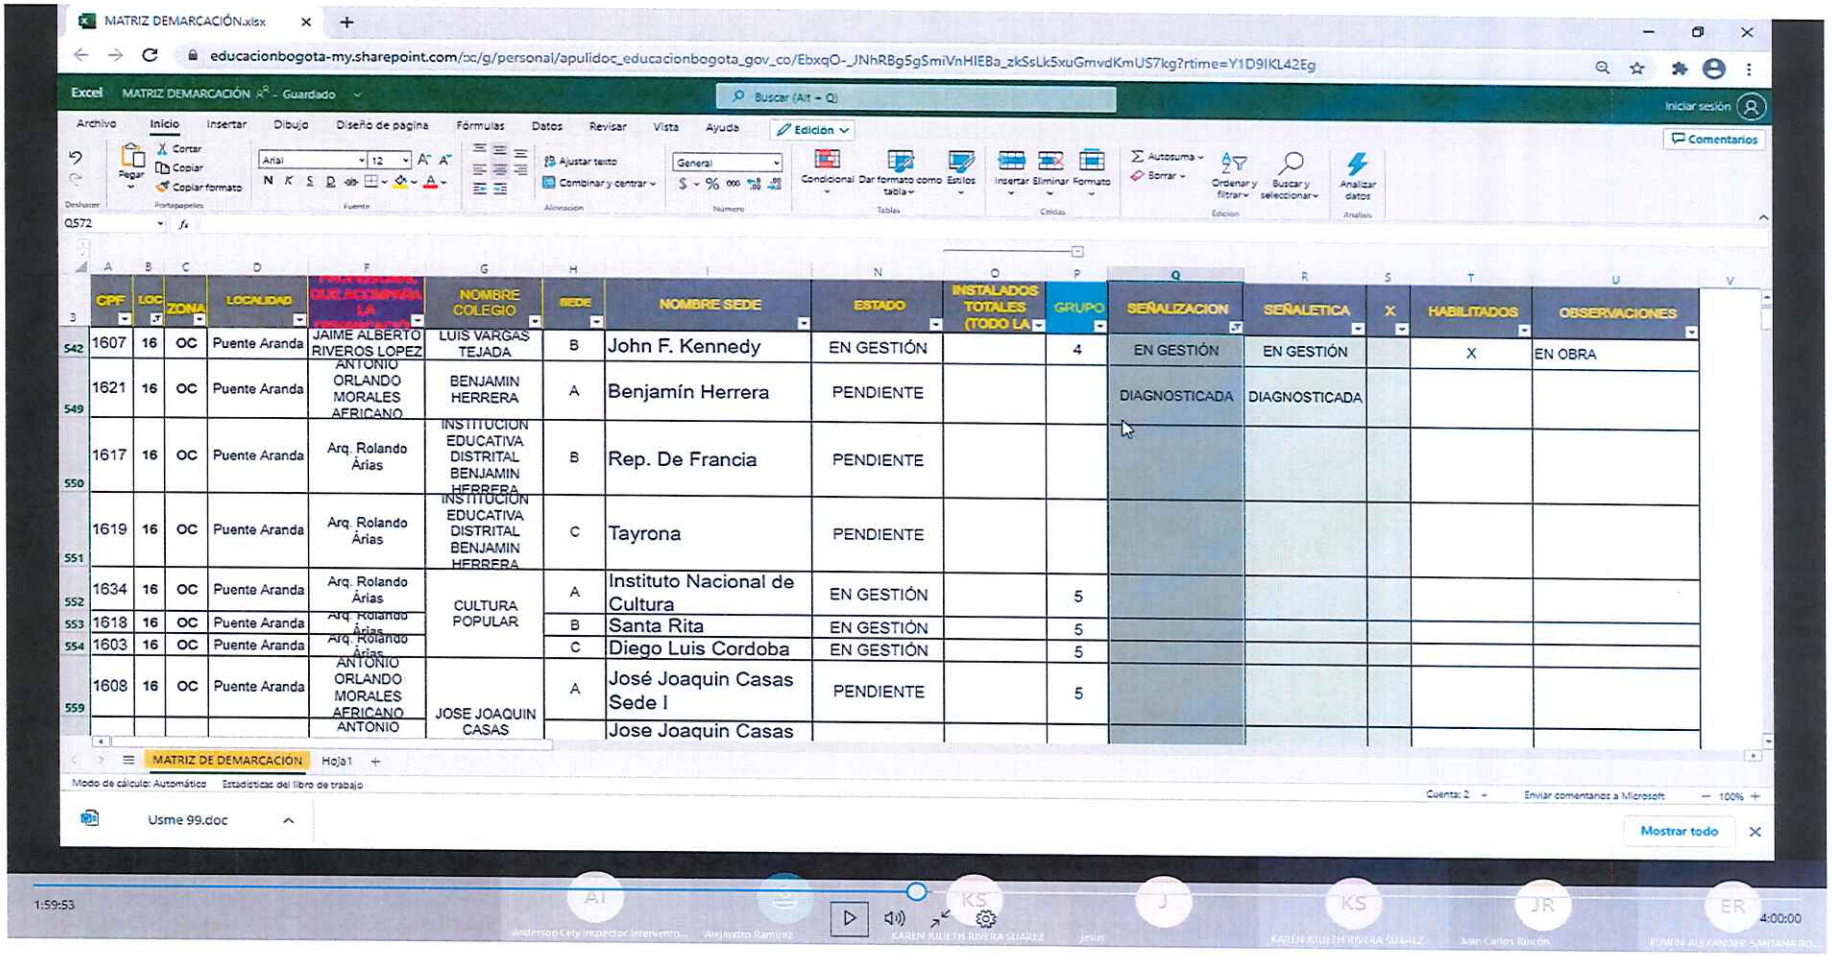

MATRIZ DEMARCACIÓN.xlsx

CPF	LOC	ZONA	LOCALIDAD	[illegible] QUE ACOMPAÑA LA	NOMBRE COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	ESTADO	INSTALADOS TOTALES (TODO LA	GRUPO	SEÑALIZACION	SEÑALETICA	X	HABILITADOS	OBSERVACIONES
1607	16	OC	Puente Aranda	JAIME ALBERTO RIVEROS LOPEZ	LUIS VARGAS TEJADA	B	John F. Kennedy	EN GESTIÓN		4	EN GESTIÓN	EN GESTIÓN		X	EN OBRA
1621	16	OC	Puente Aranda	ANTONIO ORLANDO MORALES AFRICANO	BENJAMIN HERRERA	A	Benjamín Herrera	PENDIENTE			DIAGNOSTICADA	DIAGNOSTICADA			
1617	16	OC	Puente Aranda	Arq. Rolando Árias	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BENJAMIN HERRERA	B	Rep. De Francia	PENDIENTE							
1619	16	OC	Puente Aranda	Arq. Rolando Árias	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BENJAMIN HERRERA	C	Tayrona	PENDIENTE							
1634	16	OC	Puente Aranda	Arq. Rolando Árias	CULTURA POPULAR	A	Instituto Nacional de Cultura	EN GESTIÓN		5					
1618	16	OC	Puente Aranda	Arq. Rolando Árias		B	Santa Rita	EN GESTIÓN		5					
1603	16	OC	Puente Aranda	Arq. Rolando Árias		C	Diego Luis Cordoba	EN GESTIÓN		5					
1608	16	OC	Puente Aranda	ANTONIO ORLANDO MORALES AFRICANO	JOSE JOAQUIN CASAS	A	José Joaquin Casas Sede I	PENDIENTE		5					
				ANTONIO			Jose Joaquin Casas								


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6749

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

La candelaria, en esta localidad están pendientes por intervenir 3 sedes las cuales serán asignadas al subcontratista VCR.

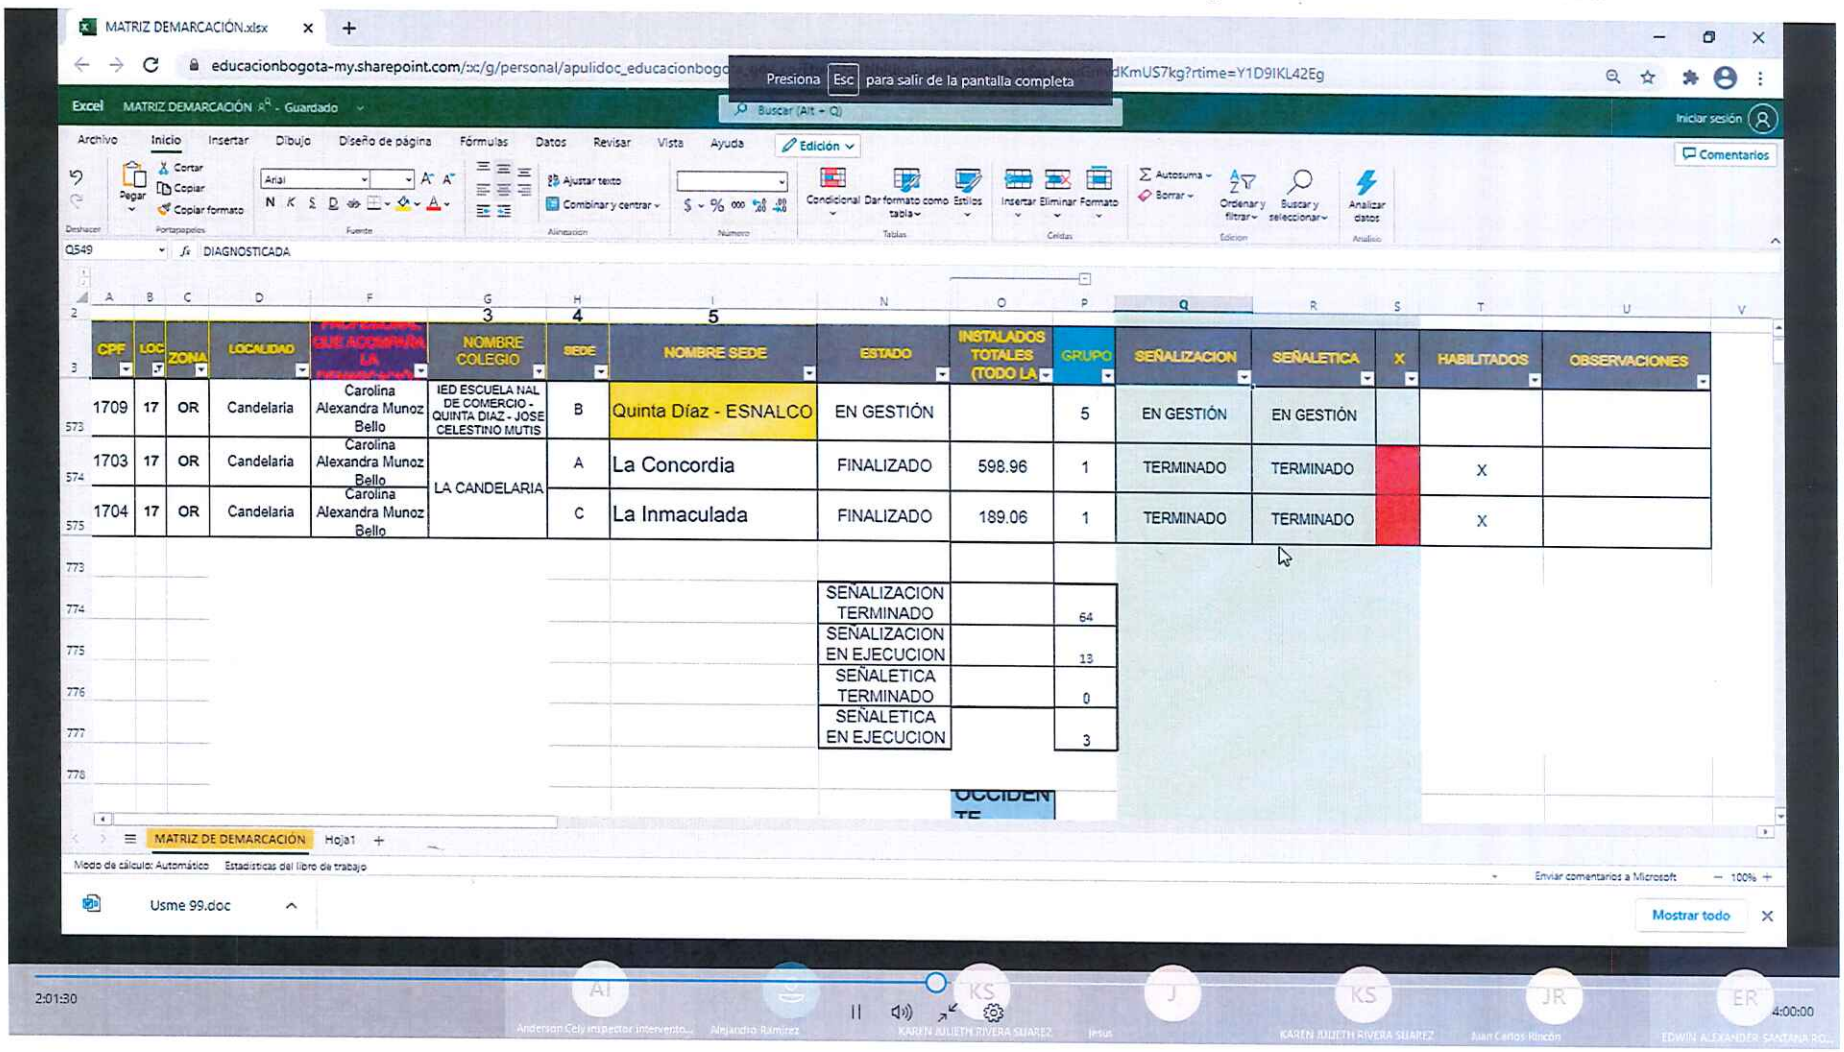

CPF	LOC	ZONA	LOCALIDAD	NOMBRE COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	ESTADO	INSTALADOS TOTALES (TODO LA	GRUPO	SEÑALIZACION	SEÑALETICA	X	HABILITADOS	OBSERVACIONES
1709	17	OR	Candelaria	IED ESCUELA NAL DE COMERCIO - QUINTA DIAZ - JOSE CELESTINO MUTIS	B	Quinta Díaz - ESNALCO	EN GESTIÓN		5	EN GESTIÓN	EN GESTIÓN			
1703	17	OR	Candelaria	LA CANDELARIA	A	La Concordia	FINALIZADO	598.96	1	TERMINADO	TERMINADO		X	
1704	17	OR	Candelaria		C	La Inmaculada	FINALIZADO	189.06	1	TERMINADO	TERMINADO		X	

SEÑALIZACION TERMINADO		64
SEÑALIZACION EN EJECUCION		13
SEÑALETICA TERMINADO		0
SEÑALETICA EN EJECUCION		3

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6750

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S


ACTA DE COMITE
ACTA N°4


La localidad Rafael Uribe Uribe, se encuentra culminada al 100%.

Y la localidad Ciudad Bolivar se leasignan fechas a los colegios como Paraiso mirador, Mochuelo alto, Arborizadora alta, Rural Pasquilla, Minuto de Buenos Aires, deben quedar para el proximo miercoles 14 de abril del 2021.

El colegio Mirador Paraiso las 4 sedes según el inspector Anderson Cely cumple, mochuelo alto culminado, Arborizadora alta sede a terminada y sede b en ejecucion.

Y sin intervenir se encuentran 50 colegios.

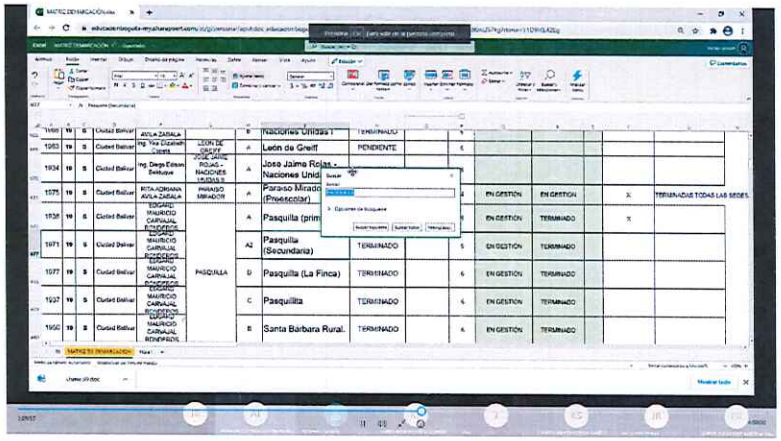

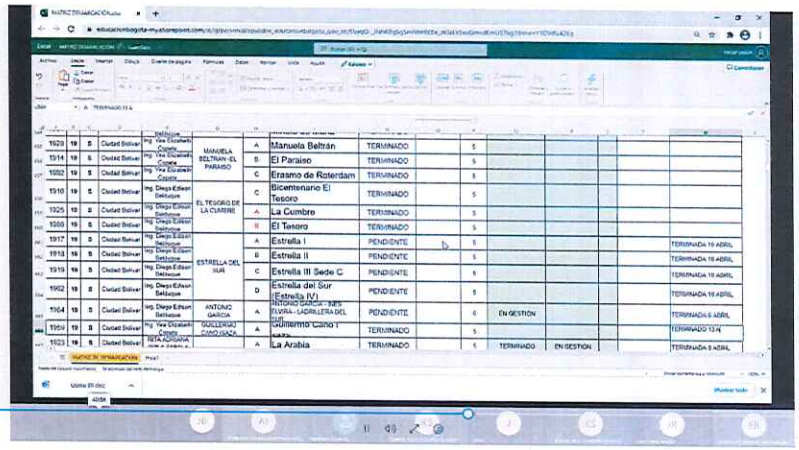

Aparte se iniciaron a ejecutar los colegios Arabia sede A y sede B en esta localidad, no se pudo realizar el diagnostico ya que no dieron ingreso al personal de interventoria, pero si al subcontratista entonces se empezo la ejecuion de la pintura, falta señaletica. Y el inspector Anderson Cely da fechas de colegios según su cronograma.

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6751

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°4

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Construsocial se compromete a realizar seguimiento a los frentes que están críticos	Residente contratista Jesus Ramirez	
2. Entrega de acta	Residente AC2R Juan Rincon	
3. Los inspectores se comprometen a seguir realizando el correspondiente seguimiento a los colegios y localidades asignadas.	Inspectores AC2R	
4.		
5.		

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES:

Se realizo la actualización de la matriz de los colegio en donde se evaluo el estado de ejecución de los colegio marcando los que ya se habían ejecutado completamente, los que están en ejecución y los que no han empezado trabajo para saber cuales de estos están incumpliendo las fechas asignadas en la programación inicial y de esta menera hacer la gestión para su pronta ejecución.

Construsocial se compromete a realizar seguimiento a los frentes que están críticos, progamando los colegios de la manera mas eficiente.

Se debe enviar el acta a la mayor brevedad posible al Arquitecto Edwin Santana.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: 07 de Abril del 2021
HORA: 8 :30 PM
LUGAR: Microsoft Teams

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6752

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

FECHA: 7 Abril 2021 **HORA: 8 : 30 pm** **LUGAR: Microsoft Teams**

SEGUIMIENTO PROGRAMACION SEÑALIZACION Y SEÑALETICA

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Edwin Alexander Santana Rodriguez	Profesional especialista, supervisor del contrato.	SED	
2. Karen Julieth Rivera Suarez	Aux. Ing. SED	SED	
3. Juan Carlos Rincon	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
4. Oscar Salamanca	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
5. Jesus Ramirez	Residente contratista	Construsocial	
6. Jeison Bermudez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
7. Diego Alejandro Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
8. Anderson Cely	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
9. Braya Calderon	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
10. Daniel Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
11. Duvan Guanumen	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
12. Alejandra Olarte	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
13. Fabian Lopez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6753

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

DESARROLLO:

Se da inico a la reunión la cual en primera instancia se verifica la localidad de Ciudad Bolivar la cual corresponde al inspector Anderson Cely, en los colegios acontinuacion se obtienen los datos de avances; Arabia terminados sede A y sede B, Jose Jaime Rojas ejecución, Antonio Garcia terminado, Estrella del sur sede B y sede C ejecución, Paraiso sede D terminado.

Se presentan inconvenientes de ejecución en el colegio Pasquilla por temas de lluvia, se recomienda al contratista ir en horas de la tarde ya que despues del medio dia esta dejando de llover.

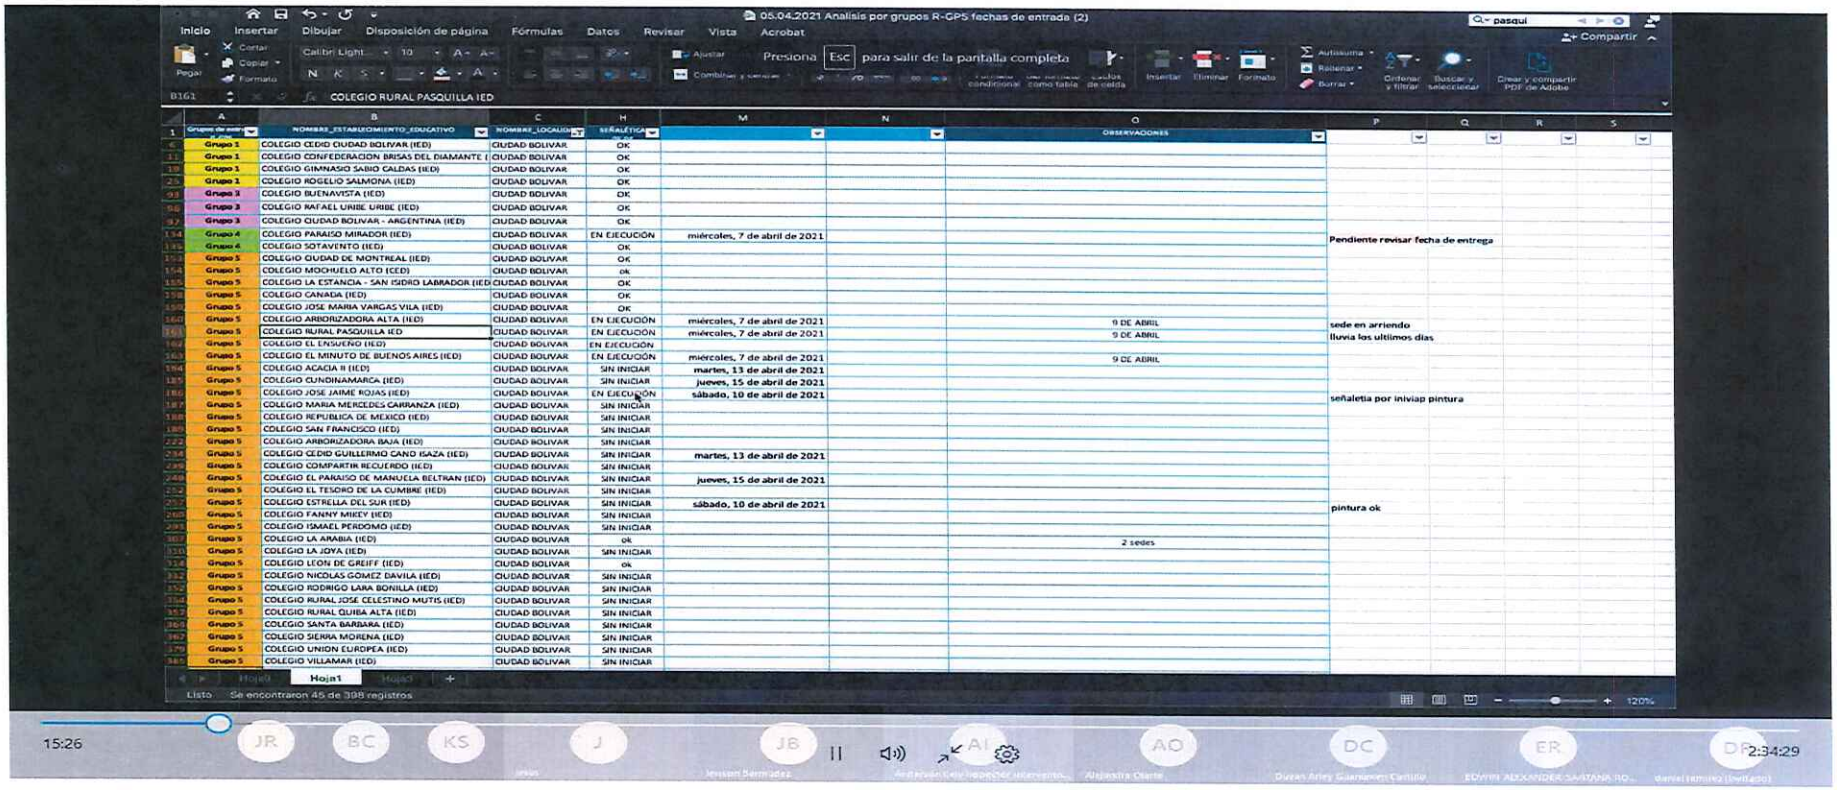

Grupo de entrega	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	M	N	OBSERVACIONES	P	Q	R	S
Grupo 1	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 1	COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 1	COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 1	COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 3	COLEGIO BUENAVISTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 3	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 3	COLEGIO CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 4	COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021			Pendiente revisar fecha de entrega			
Grupo 4	COLEGIO SOTAVENTO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 5	COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 5	COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)	CIUDAD BOLIVAR	ok							
Grupo 5	COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 5	COLEGIO CANADA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 5	COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK							
Grupo 5	COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021		9 DE ABRIL	sede en arriendo			
Grupo 5	COLEGIO RURAL PASQUILLA IED	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021		9 DE ABRIL	lluvia los ultimos dias			
Grupo 5	COLEGIO EL ENSUEÑO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN							
Grupo 5	COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021		9 DE ABRIL				
Grupo 5	COLEGIO ACACIA II (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021						
Grupo 5	COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021						
Grupo 5	COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021			señaletia por iniviap pintura			
Grupo 5	COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021						
Grupo 5	COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021						
Grupo 5	COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 10 de abril de 2021			pintura ok			
Grupo 5	COLEGIO FANNY MIKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 3	COLEGIO LA ARABIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok							
Grupo 5	COLEGIO LA JOYA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR			2 sedes				
Grupo 5	COLEGIO LEON DE GREIFF (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok							
Grupo 5	COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO SANTA BARBARA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							
Grupo 5	COLEGIO VILLAMAR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR							

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

Se continua en la localidad de Bosa la cual corresponde al inspector Jeison Bermudez, en los colegios acontinuacion se obtienen los datos de avances; Pablo Tarso sede A y sede B terminados, Fernando Mazuera en ejecucion, Llano Oriental sede A terminado, Luis Lopez de mesa en ejecucion problemas de retraso por lluvias, Alfonso Reyes Echandia en ejecucion, Bosanova sede B en ejecucion.

Los colegios que no se han terminado se proyecta una fecha de posible finalizacion por parte del contratista. Y quedarian 12 colegios pendientes por ejecucion en esta localidad.

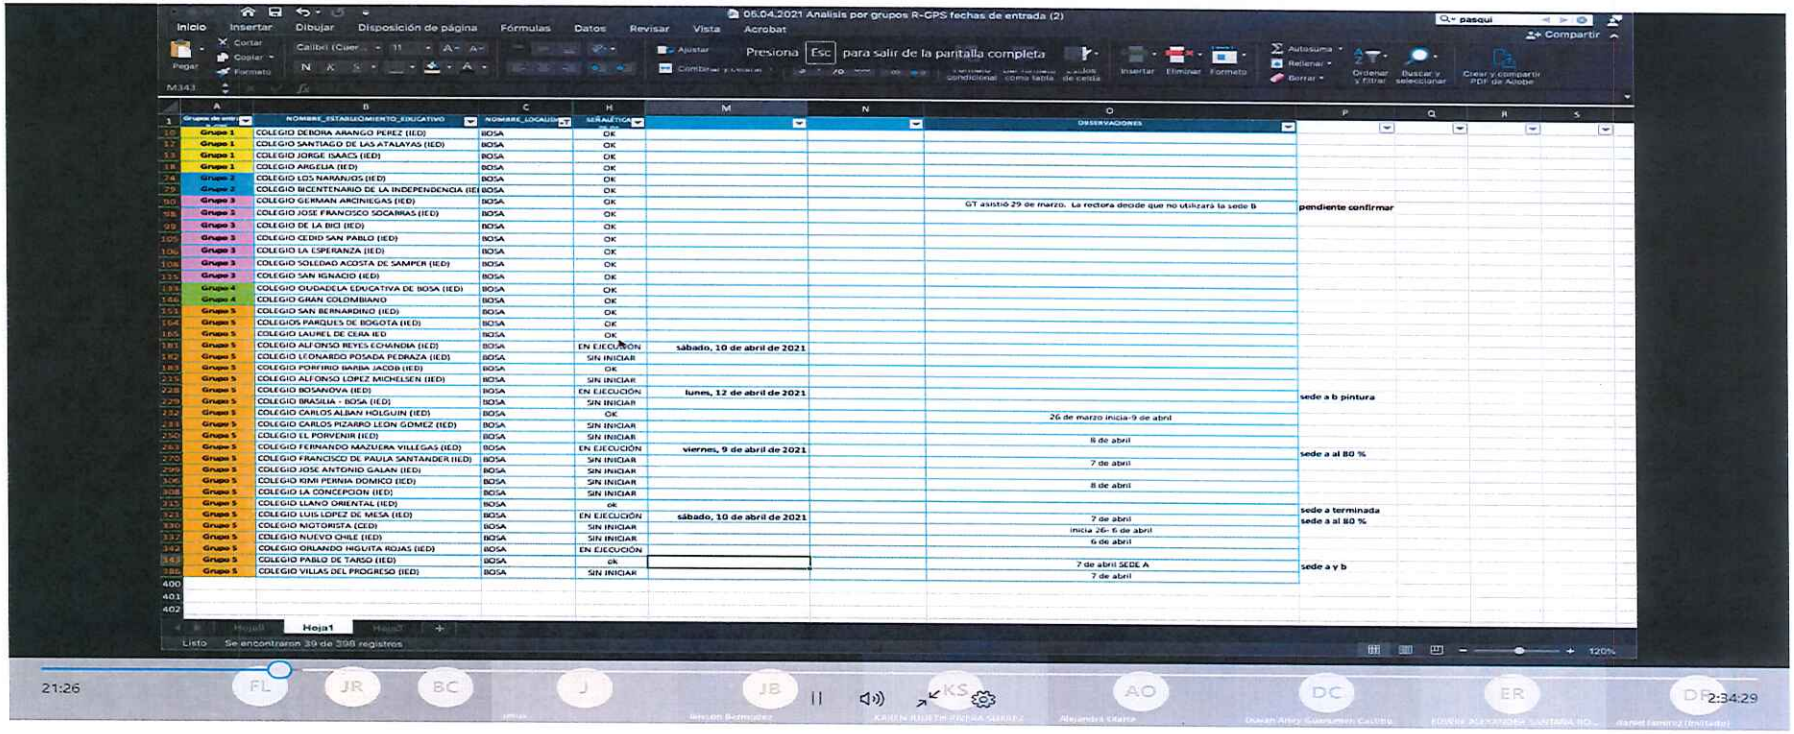

	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEMÁFORO	M	N	OBSERVACIONES	P
Grupo 1	COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED)	BOSA	OK				
Grupo 1	COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)	BOSA	OK				
Grupo 1	COLEGIO JORGE ISAACS (IED)	BOSA	OK				
Grupo 1	COLEGIO ARGELIA (IED)	BOSA	OK				
Grupo 2	COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	BOSA	OK				
Grupo 2	COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)	BOSA	OK				
Grupo 3	COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)	BOSA	OK			GT asistió 29 de marzo. La rectora decide que no utilizará la sede B	pendiente confirmar
Grupo 2	COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	BOSA	OK				
Grupo 3	COLEGIO DE LA BICI (IED)	BOSA	OK				
Grupo 3	COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)	BOSA	OK				
Grupo 3	COLEGIO LA ESPERANZA (IED)	BOSA	OK				
Grupo 3	COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)	BOSA	OK				
Grupo 3	COLEGIO SAN IGNACIO (IED)	BOSA	OK				
Grupo 4	COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	BOSA	OK				
Grupo 4	COLEGIO GRAN COLOMBIANO	BOSA	OK				
Grupo 5	COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	BOSA	OK				
Grupo 5	COLEGIOS PARQUES DE BOGOTA (IED)	BOSA	OK				
Grupo 5	COLEGIO LAUREL DE CERA IED	BOSA	OK				
Grupo 5	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021			
Grupo 5	COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	BOSA	SIN INICIAR				
Grupo 5	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)	BOSA	OK				
Grupo 5	COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	BOSA	SIN INICIAR				
Grupo 5	COLEGIO BOSANOVA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021			
Grupo 5	COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	BOSA	SIN INICIAR				sede a b pintura
Grupo 5	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)	BOSA	OK			26 de marzo inicia-9 de abril	
Grupo 5	COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	BOSA	SIN INICIAR				
Grupo 5	COLEGIO EL PORVENIR (IED)	BOSA	SIN INICIAR			8 de abril	
Grupo 5	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021			
Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	BOSA	SIN INICIAR			7 de abril	sede a al 80 %
Grupo 5	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED)	BOSA	SIN INICIAR				
Grupo 5	COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	BOSA	SIN INICIAR			8 de abril	
Grupo 5	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	BOSA	SIN INICIAR				
Grupo 5	COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)	BOSA	ok				sede a terminada
Grupo 5	COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021		7 de abril	sede a al 80 %
Grupo 5	COLEGIO MOTORISTA (CED)	BOSA	SIN INICIAR			inicia 26- 6 de abril	
Grupo 5	COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	BOSA	SIN INICIAR			6 de abril	
Grupo 5	COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN				
Grupo 5	COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)	BOSA	ok			7 de abril SEDE A	sede a y b
Grupo 5	COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	BOSA	SIN INICIAR			7 de abril	

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6755

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

Se continua con la localidad de Kennedy la cual esta asignada a la inspectora Alejandra Olarte, los siguientes colegios son colegios los cuales se intervino de alguna manera o quedaron terminados. Colegio Class sede A, sede B y sede C terminadas, Jackelin ejecutada, Manuel Cepeda Vargas terminada.

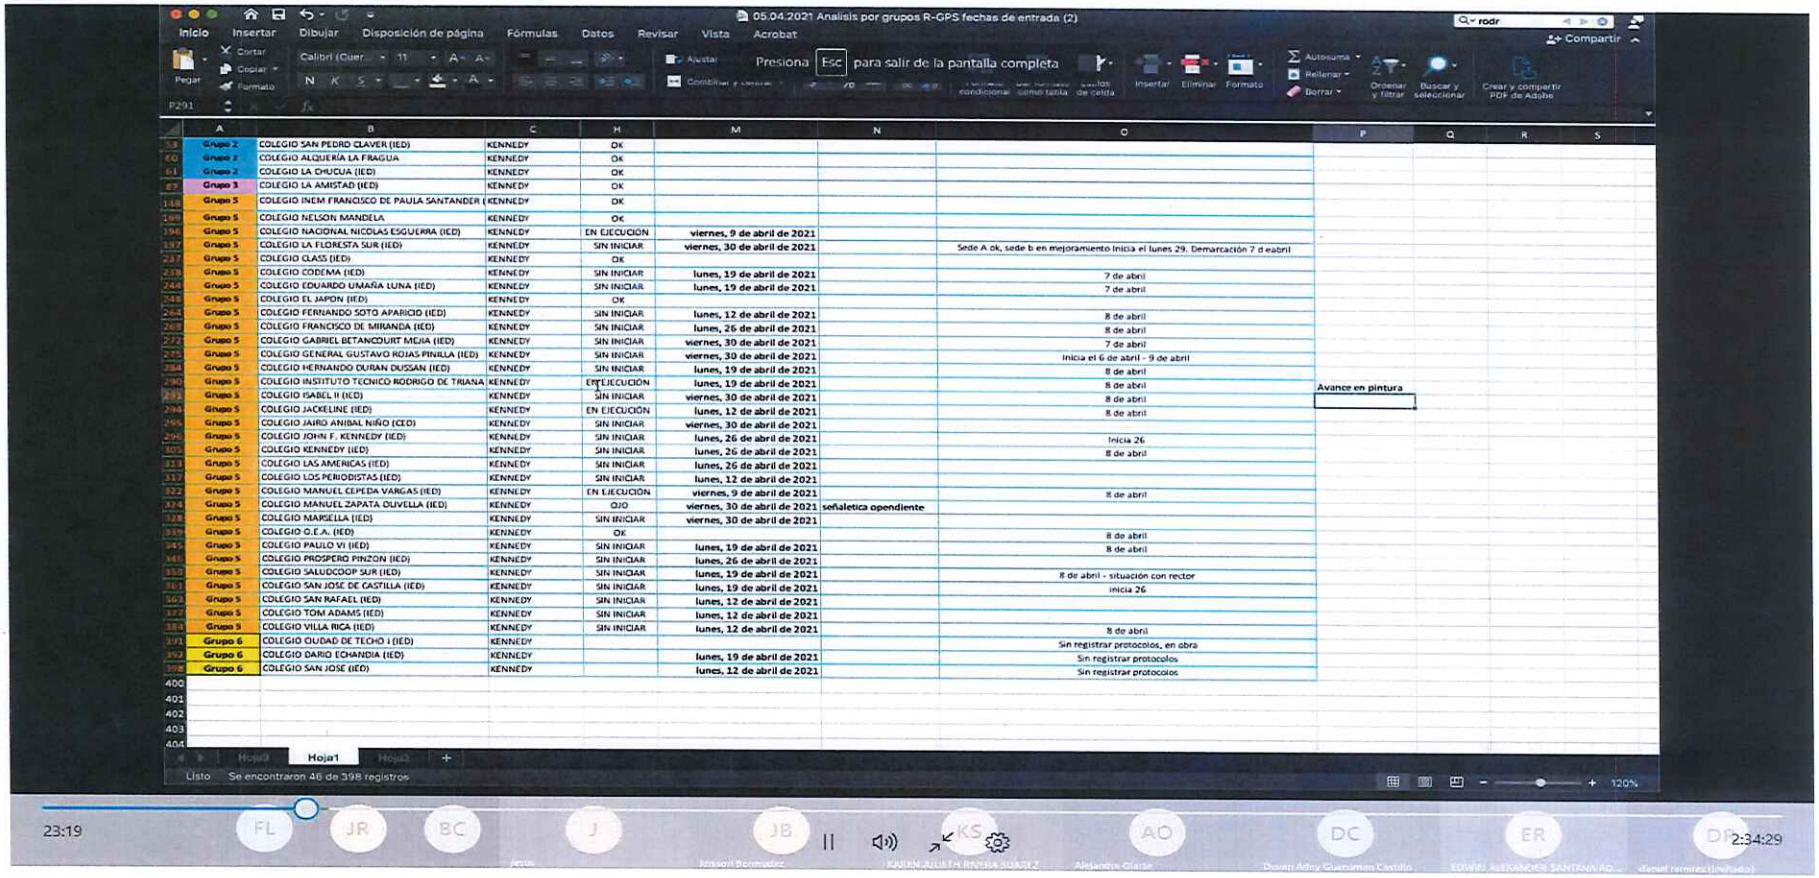

Grupo 2	COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)	KENNEDY	Ok			
Grupo 2	COLEGIO ALQUERÍA LA FRAGUA	KENNEDY	Ok			
Grupo 2	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	KENNEDY	Ok			
Grupo 3	COLEGIO LA AMISTAD (IED)	KENNEDY	Ok			
Grupo 5	COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (	KENNEDY	Ok			
Grupo 5	COLEGIO NELSON MANDELA	KENNEDY	Ok			
Grupo 5	COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	viernes, 9 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		Sede A ok, sede b en mejoramiento inicia el lunes 29. Demarcación 7 d eabril
Grupo 5	COLEGIO CLASS (IED)	KENNEDY	Ok			
Grupo 5	COLEGIO CODEMA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021		7 de abril
Grupo 5	COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021		7 de abril
Grupo 5	COLEGIO EL JAPON (IED)	KENNEDY	Ok			
Grupo 5	COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021		8 de abril
Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021		8 de abril
Grupo 5	COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		7 de abril
Grupo 5	COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		Inicia el 6 de abril - 9 de abril
Grupo 5	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021		8 de abril
Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	EN EJECUCION	lunes, 19 de abril de 2021		8 de abril
Grupo 5	COLEGIO ISABEL II (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		8 de abril
Grupo 5	COLEGIO JACKELINE (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	lunes, 12 de abril de 2021		8 de abril
Grupo 5	COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021		Inicia 26
Grupo 5	COLEGIO KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021		8 de abril
Grupo 5	COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO LOS PERIODISTAS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	viernes, 9 de abril de 2021		8 de abril
Grupo 5	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	KENNEDY	OJO	viernes, 30 de abril de 2021	señaletica opendiente	
Grupo 5	COLEGIO MARSELLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO O.E.A. (IED)	KENNEDY	Ok			8 de abril
Grupo 5	COLEGIO PAULO VI (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021		8 de abril
Grupo 5	COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021		8 de abril - situación con rector
Grupo 5	COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021		inicia 26
Grupo 5	COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO TOM ADAMS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO VILLA RICA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021		8 de abril
Grupo 6	COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED)	KENNEDY				Sin registrar protocolos, en obra
Grupo 6	COLEGIO DARIO ECHANDIA (IED)	KENNEDY		lunes, 19 de abril de 2021		Sin registrar protocolos
Grupo 6	COLEGIO SAN JOSE (IED)	KENNEDY		lunes, 12 de abril de 2021		Sin registrar protocolos

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6756

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

En la localidad Antonio Nariño faltan 7 sedes por ejecutar.

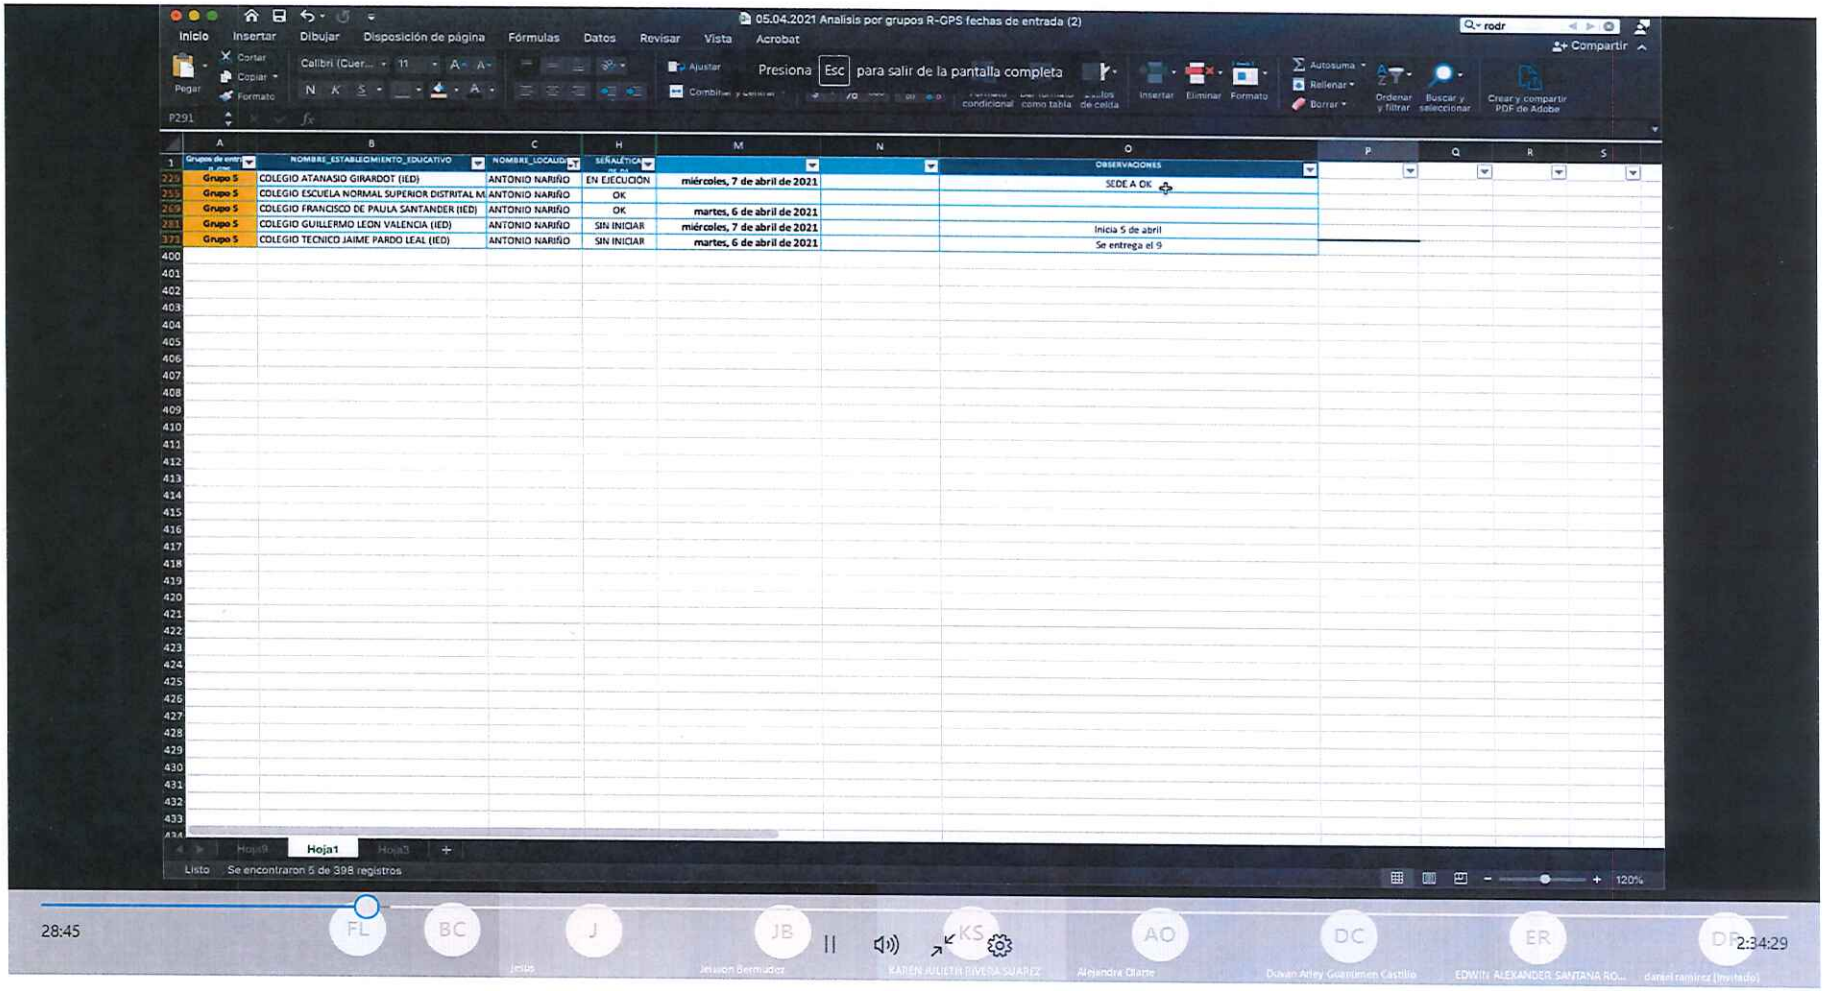

	A	B	C	H	M	N	O
1	Grupos de entr	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALID	SEÑALÉTICA			OBSERVACIONES
229	Grupo 5	COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)	ANTONIO NARIÑO	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021		SEDE A OK
255	Grupo 5	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL M	ANTONIO NARIÑO	OK			
269	Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	ANTONIO NARIÑO	OK	martes, 6 de abril de 2021		
281	Grupo 5	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	ANTONIO NARIÑO	SIN INICIAR	miércoles, 7 de abril de 2021		Inicia 5 de abril
373	Grupo 5	COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL (IED)	ANTONIO NARIÑO	SIN INICIAR	martes, 6 de abril de 2021		Se entrega el 9

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6757

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

En la localida de Barrios Unidos se asignan fechas a 6 colegios los cuales no se han intervenido, para finalizar la siguente semana.

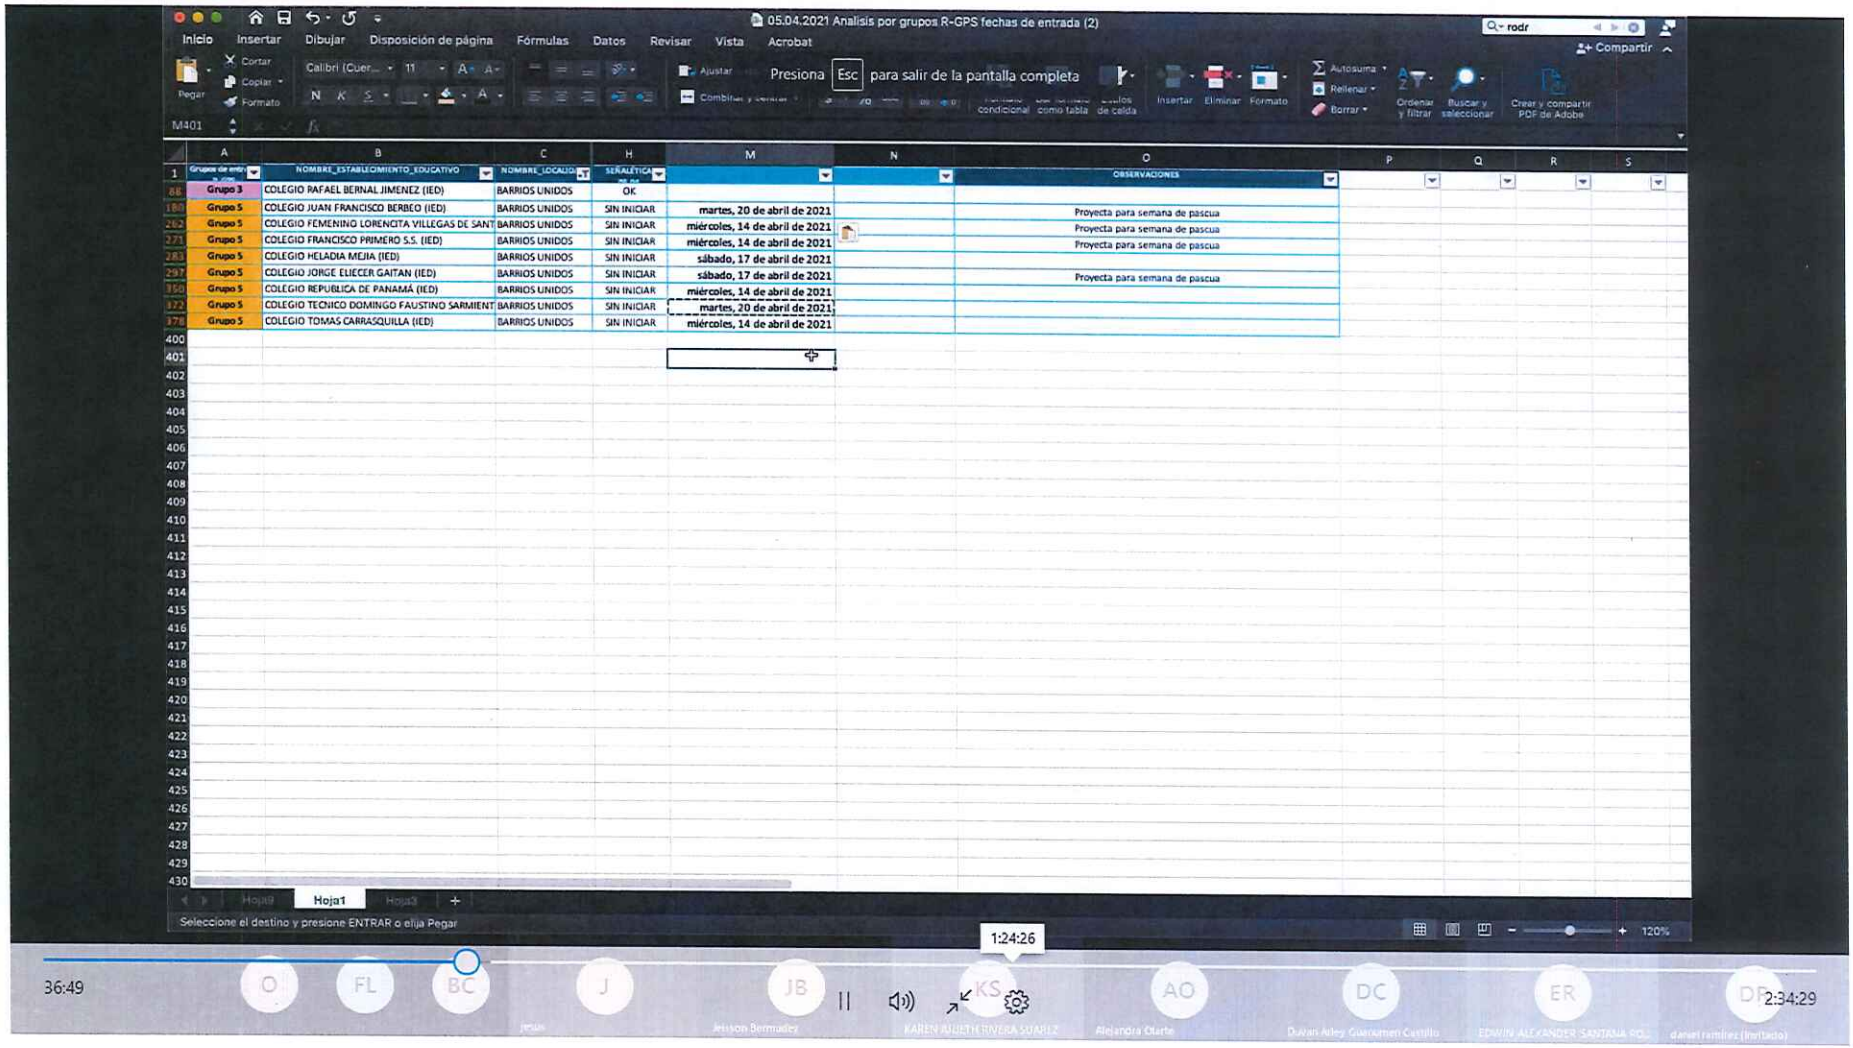

Grupos de entr	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALID	SEÑALÉTICA	M	N	OBSERVACIONES
Grupo 3	COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED)	BARRIOS UNIDOS	OK			
Grupo 5	COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANT	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021		Proyecta para semana de pascua
Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021		Proyecta para semana de pascua
Grupo 5	COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021		Proyecta para semana de pascua
Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENT	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021		

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6758

Ingeniería & Proyectos


AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7


Se vuelve a la localidad de Bosa y se organizan por grupos los colegios que se encuentren cerca para sectorizarlos.

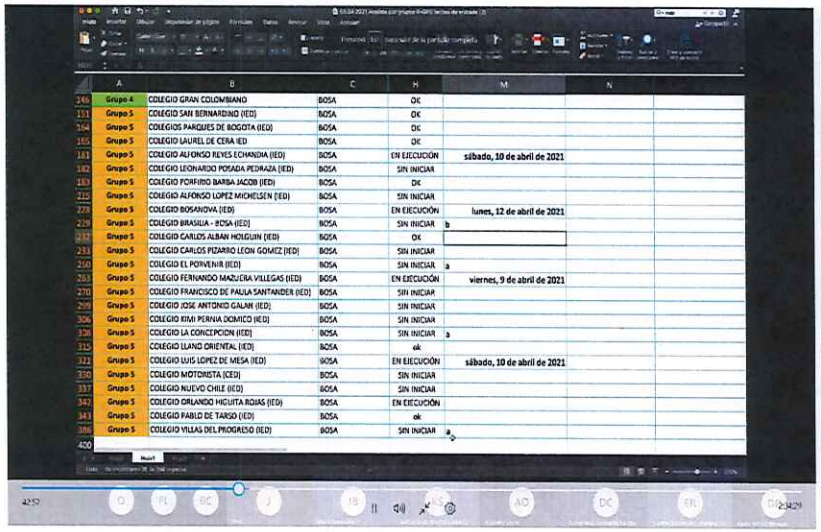

Grupo 4	COLEGIO GRAN COLOMBIANO	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIOS PARQUES DE BOGOTA (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO LAUREL DE CERA IED	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	BOSA	SIN INICIAR		
Grupo 5	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	BOSA	SIN INICIAR		
Grupo 5	COLEGIO BOSANOVA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	BOSA	SIN INICIAR	b	
Grupo 5	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	BOSA	SIN INICIAR		
Grupo 5	COLEGIO EL PORVENIR (IED)	BOSA	SIN INICIAR	a	
Grupo 5	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	BOSA	SIN INICIAR		
Grupo 5	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED)	BOSA	SIN INICIAR		
Grupo 5	COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	BOSA	SIN INICIAR		
Grupo 5	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	BOSA	SIN INICIAR	a	
Grupo 5	COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)	BOSA	ok		
Grupo 5	COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO MOTORISTA (CED)	BOSA	SIN INICIAR		
Grupo 5	COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	BOSA	SIN INICIAR		
Grupo 5	COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN		
Grupo 5	COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)	BOSA	ok		
Grupo 5	COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	a	

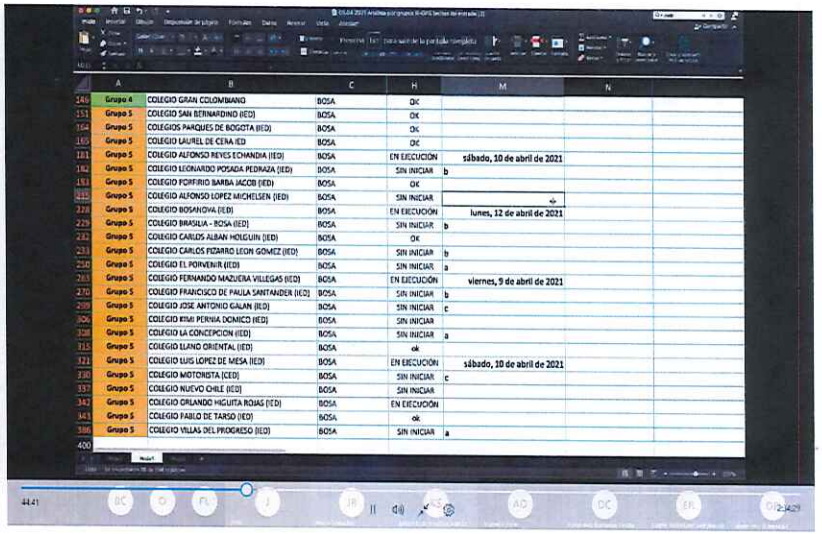

Grupo 4	COLEGIO GRAN COLOMBIANO	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIOS PARQUES DE BOGOTA (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO LAUREL DE CERA IED	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	BOSA	SIN INICIAR	b	
Grupo 5	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	BOSA	SIN INICIAR		
Grupo 5	COLEGIO BOSANOVA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	BOSA	SIN INICIAR	b	
Grupo 5	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	BOSA	SIN INICIAR	b	
Grupo 5	COLEGIO EL PORVENIR (IED)	BOSA	SIN INICIAR	a	
Grupo 5	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	BOSA	SIN INICIAR	b	
Grupo 5	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED)	BOSA	SIN INICIAR	c	
Grupo 5	COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	BOSA	SIN INICIAR		
Grupo 5	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	BOSA	SIN INICIAR	a	
Grupo 5	COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)	BOSA	ok		
Grupo 5	COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO MOTORISTA (CED)	BOSA	SIN INICIAR	c	
Grupo 5	COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	BOSA	SIN INICIAR		
Grupo 5	COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN		
Grupo 5	COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)	BOSA	ok		
Grupo 5	COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	a	

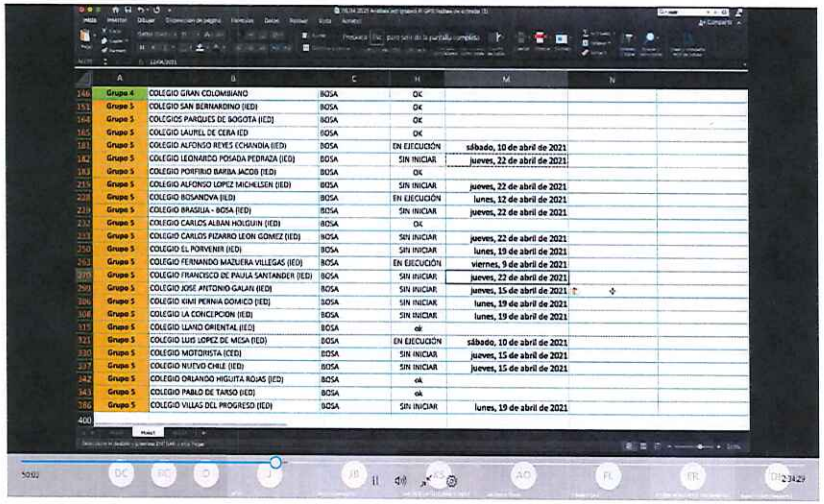

Grupo 4	COLEGIO GRAN COLOMBIANO	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIOS PARQUES DE BOGOTA (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO LAUREL DE CERA IED	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO BOSANOVA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)	BOSA	OK		
Grupo 5	COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO EL PORVENIR (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)	BOSA	ok		
Grupo 5	COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO MOTORISTA (CED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
Grupo 5	COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)	BOSA	ok		
Grupo 5	COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)	BOSA	ok		
Grupo 5	COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

En la localidad de chapinero queda terminada completa.

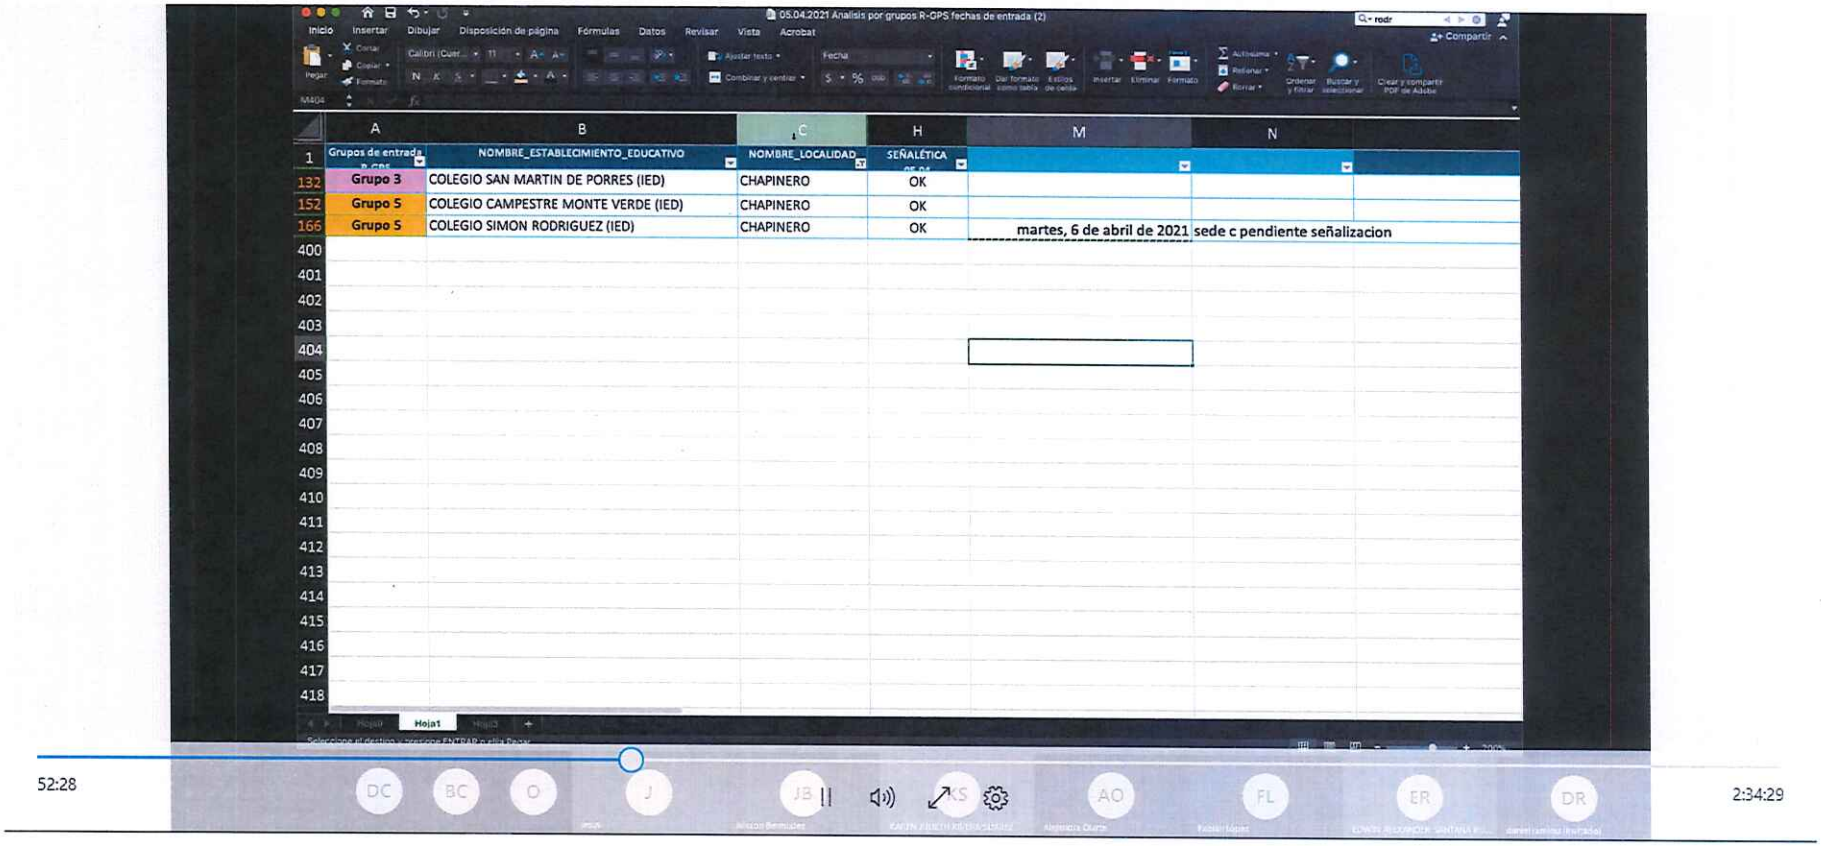

	A	B	C	H	M	N
1	Grupos de entrada R-GPS	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA		
132	Grupo 3	COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)	CHAPINERO	OK		
152	Grupo 5	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	CHAPINERO	OK		
166	Grupo 5	COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)	CHAPINERO	OK	martes, 6 de abril de 2021	sede c pendiente señalizacion


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6760

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

En la localidad de Engativa los colegios Nestor Forero Alcala sede A y sede B terminados, Manuel Ayala de Gaitan en ejecucion, Nidia Quintero de Turbay en ejecucion, San Jose norte en ejecucion, Tabora sede A y sede B terminados, la Palestina sede A y sede B ejecucion, y las sedes que no se han intervenido se ubican por zonas sectorizando los mas cercanos y a esos se les asigna fechas.

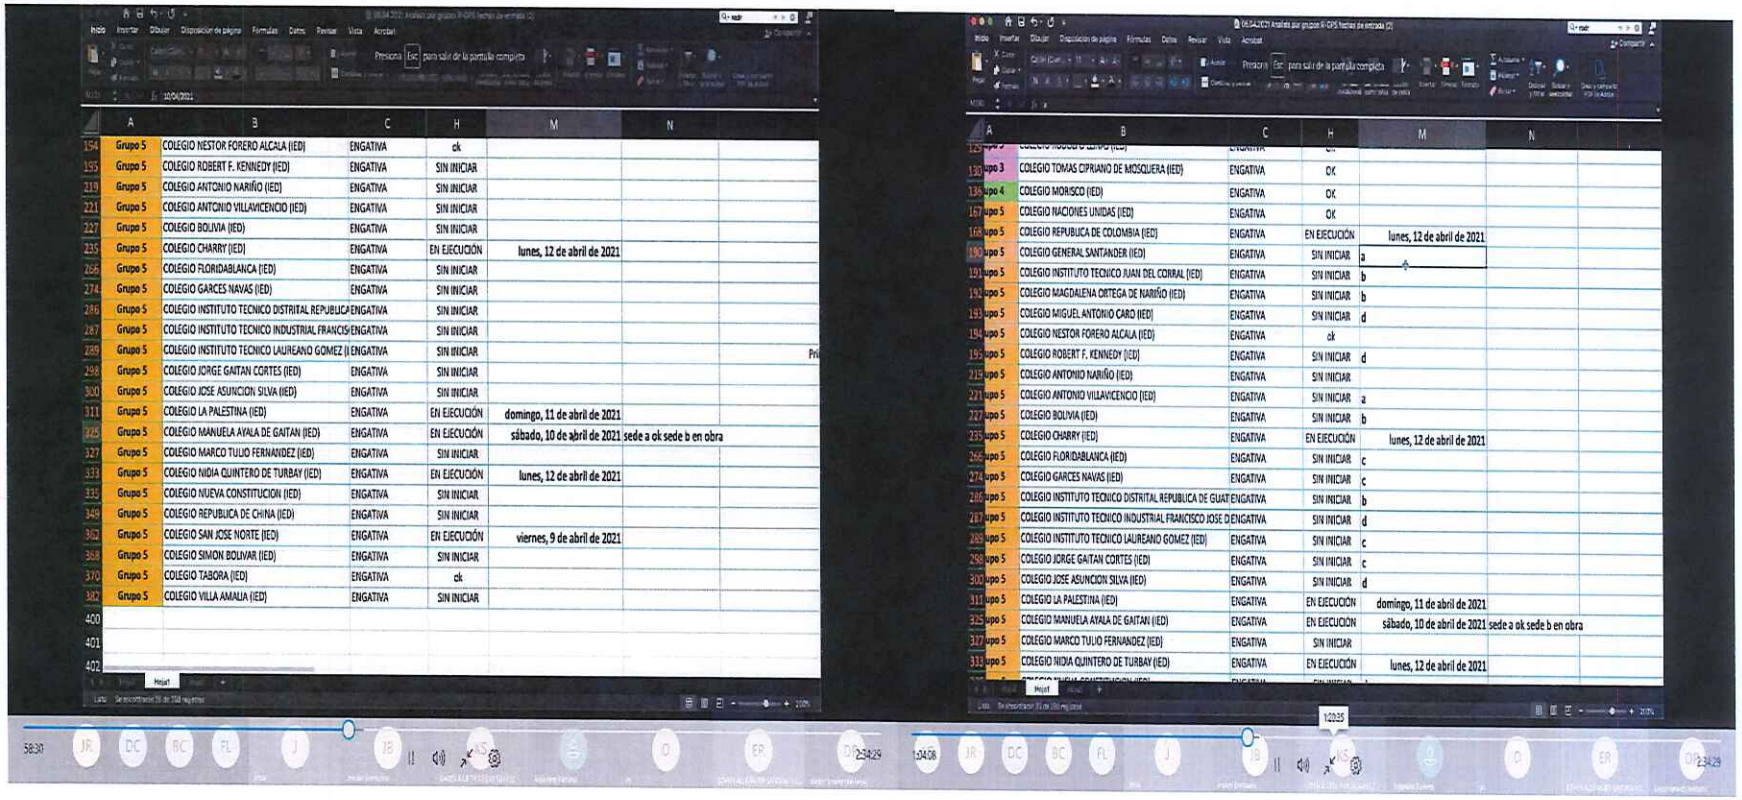

	A	B	C	H	M	N
154	Grupo 5	COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	ENGATIVA	ok		
155	Grupo 5	COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
219	Grupo 5	COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
221	Grupo 5	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
227	Grupo 5	COLEGIO BOLIVIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
235	Grupo 5	COLEGIO CHARRY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
266	Grupo 5	COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
274	Grupo 5	COLEGIO GARCES NAVAS (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
286	Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA	ENGATIVA	SIN INICIAR		
287	Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCIS	ENGATIVA	SIN INICIAR		
289	Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (I	ENGATIVA	SIN INICIAR		
298	Grupo 5	COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
300	Grupo 5	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
311	Grupo 5	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	domingo, 11 de abril de 2021	
325	Grupo 5	COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	sede a ok sede b en obra
327	Grupo 5	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
333	Grupo 5	COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
335	Grupo 5	COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
349	Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
362	Grupo 5	COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	
368	Grupo 5	COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
370	Grupo 5	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	ok		
387	Grupo 5	COLEGIO VILLA AMALIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
400						
401						
402						

	A	B	C	H	M	N
130	upo 3	COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)	ENGATIVA	OK		
135	upo 4	COLEGIO MORISCO (IED)	ENGATIVA	OK		
167	upo 5	COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED)	ENGATIVA	OK		
168	upo 5	COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
190	upo 5	COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	a	
191	upo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	b	
192	upo 5	COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	b	
193	upo 5	COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	d	
154	upo 5	COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	ENGATIVA	ok		
155	upo 5	COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	d	
219	upo 5	COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
221	upo 5	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	a	
227	upo 5	COLEGIO BOLIVIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	b	
235	upo 5	COLEGIO CHARRY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
266	upo 5	COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	c	
274	upo 5	COLEGIO GARCES NAVAS (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	c	
286	upo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUAT	ENGATIVA	SIN INICIAR	b	
287	upo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE D	ENGATIVA	SIN INICIAR	d	
289	upo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	c	
298	upo 5	COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	c	
300	upo 5	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	d	
311	upo 5	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	domingo, 11 de abril de 2021	
325	upo 5	COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	sede a ok sede b en obra
327	upo 5	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR		
333	upo 5	COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6761

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

En la localidad de Fontibon no se ha intervenido ningun colegio por el momento, se les asignan fechas y se sectorizan los colegios para empezar a intervenir la otra semana 15 de Abril del 2021. El Integrado hasta el momento no se tiene autorizacion de intervenir.

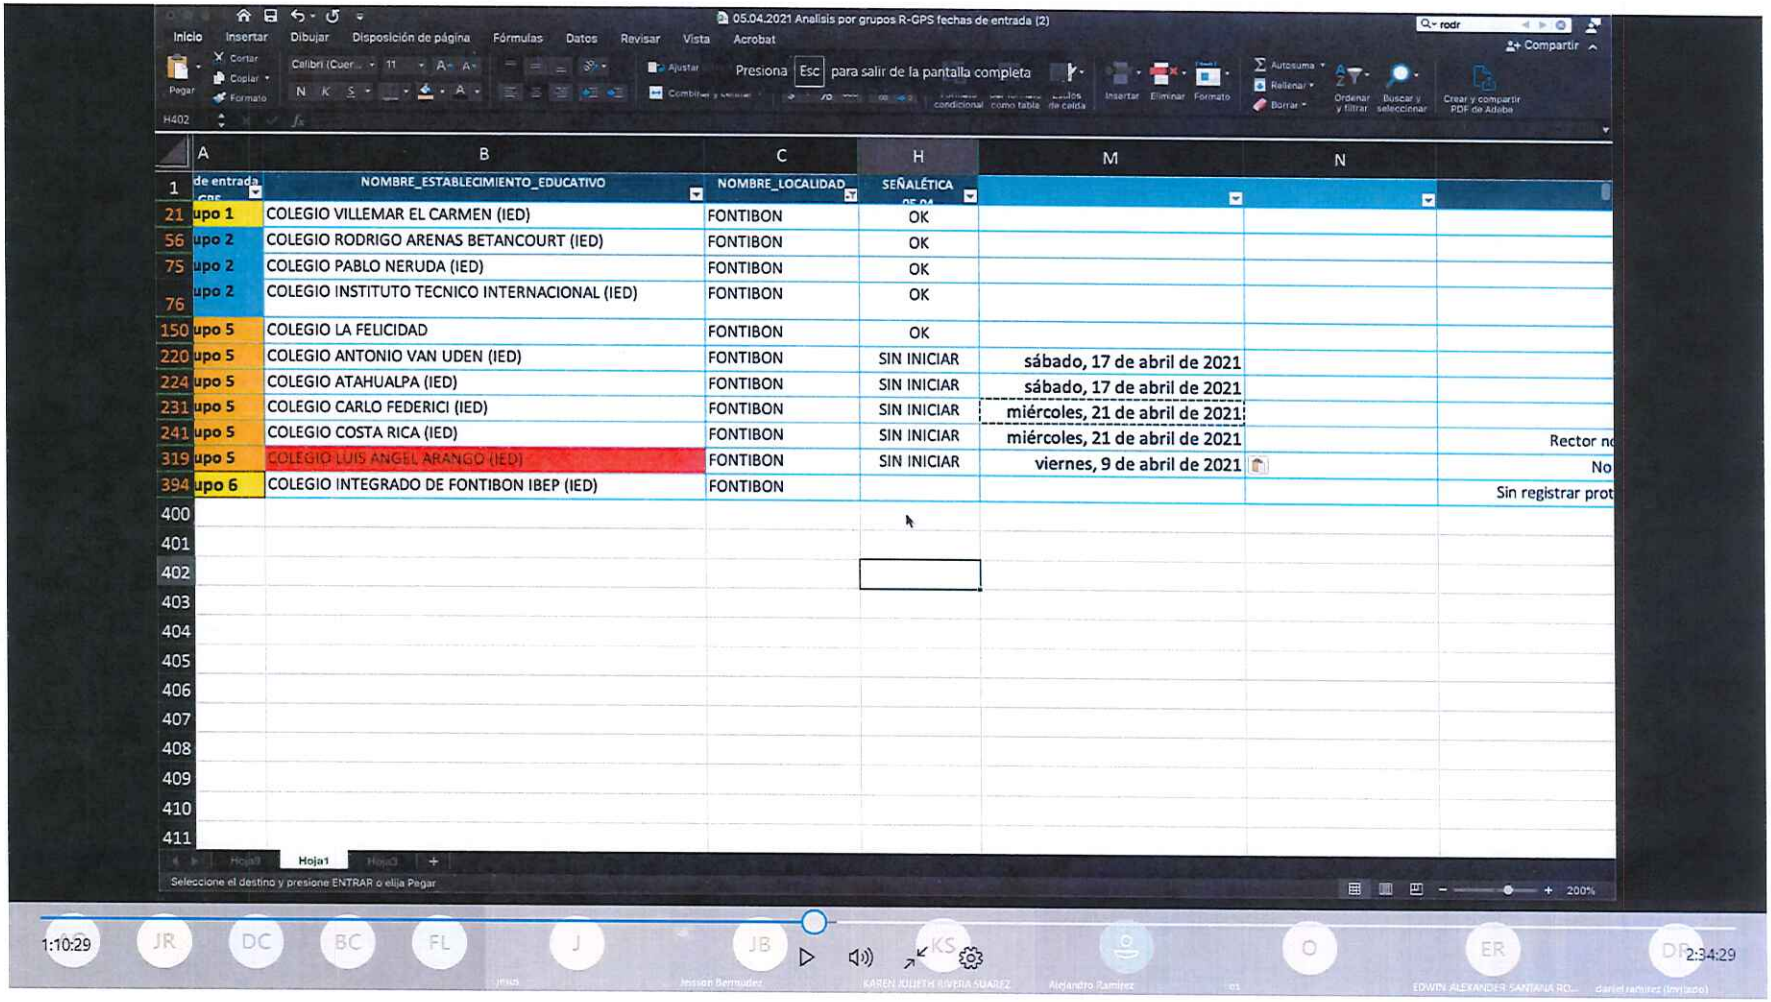

	A	B	C	H	M	N	
1	de entrada GPS	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA DE 04			
21	upo 1	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)	FONTIBON	OK			
56	upo 2	COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED)	FONTIBON	OK			
75	upo 2	COLEGIO PABLO NERUDA (IED)	FONTIBON	OK			
76	upo 2	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)	FONTIBON	OK			
150	upo 5	COLEGIO LA FELICIDAD	FONTIBON	OK			
220	upo 5	COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021		
224	upo 5	COLEGIO ATAHUALPA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021		
231	upo 5	COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021		
241	upo 5	COLEGIO COSTA RICA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021		Rector n
319	upo 5	COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021		No
394	upo 6	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)	FONTIBON				Sin registrar prot


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6762

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

Se vuelve a la localidad de Kennedy la cual ya se le estipularon fechas, ya que se tienen de prioridad dos colegios; el colegio Pablo VI y La Floresta sur. Ya que esta es una peticion especial del subdirector de la localidad.

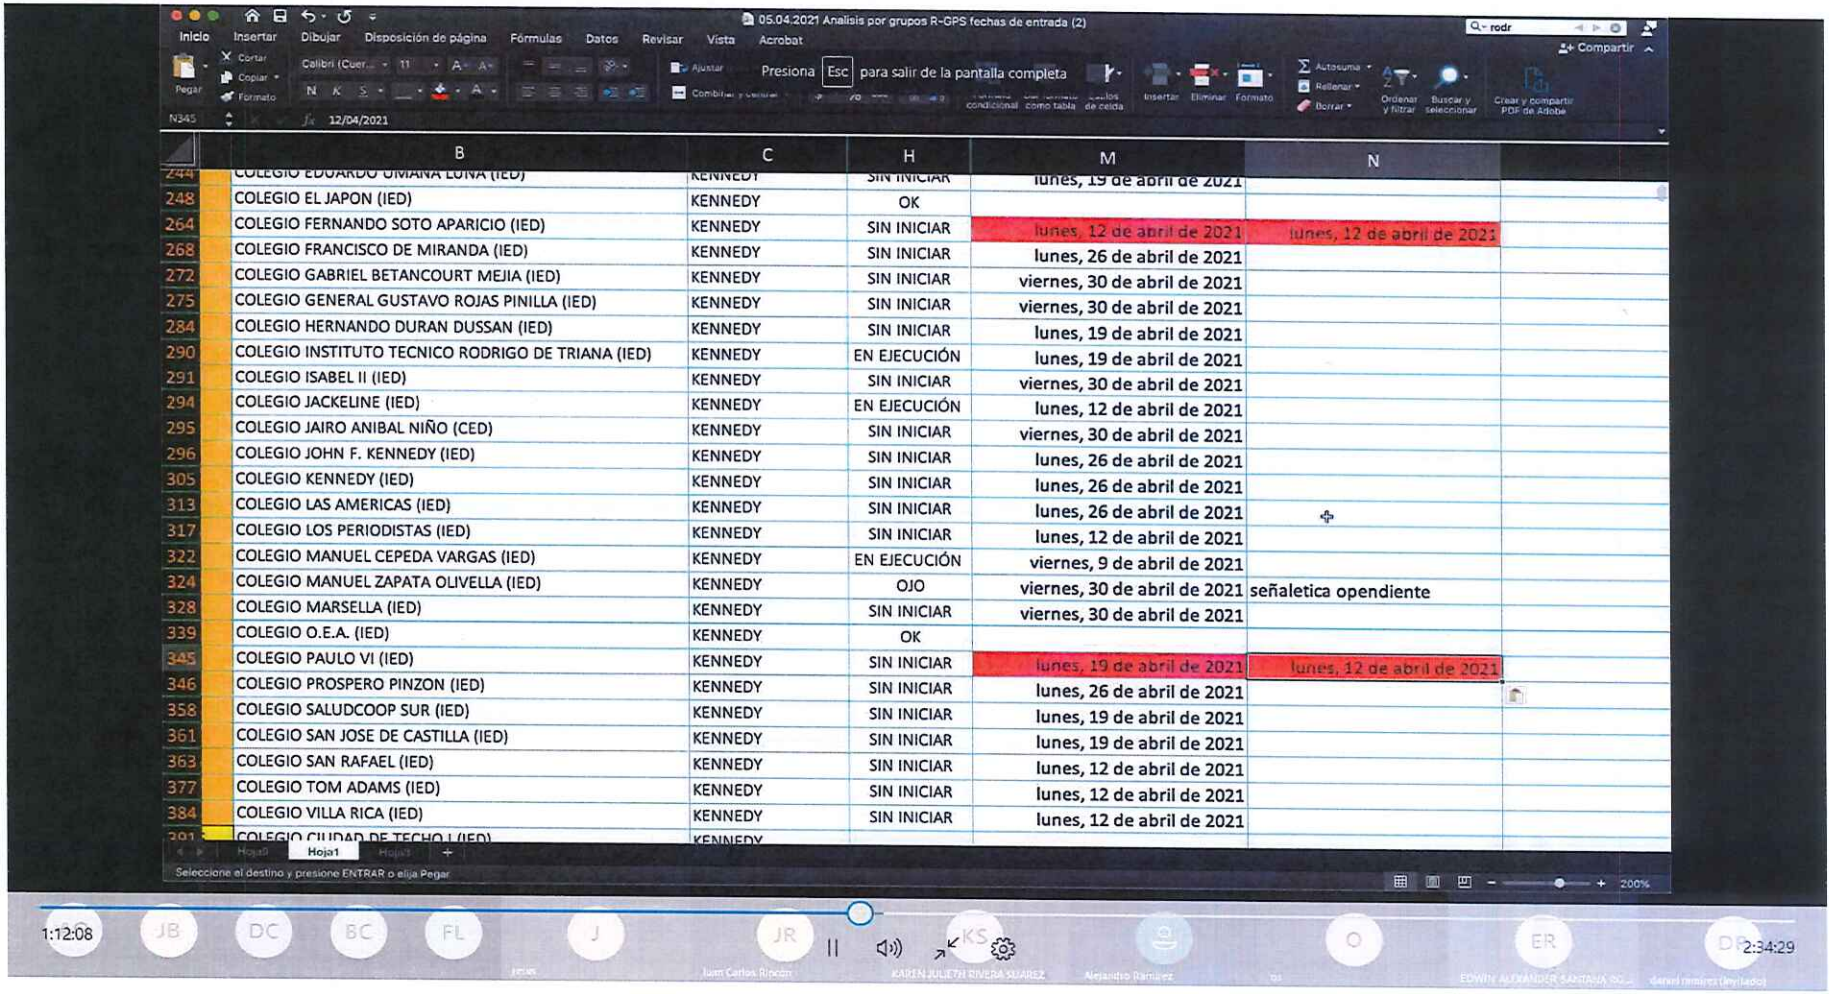

	B	C	H	M	N
244	COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
248	COLEGIO EL JAPON (IED)	KENNEDY	OK		
264	COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
268	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	
272	COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
275	COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
284	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
290	COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	lunes, 19 de abril de 2021	
291	COLEGIO ISABEL II (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
294	COLEGIO JACKELINE (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
295	COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
296	COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	
305	COLEGIO KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	
313	COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	
317	COLEGIO LOS PERIODISTAS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	
322	COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	
324	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	KENNEDY	OJO	viernes, 30 de abril de 2021	señaletica opendiente
328	COLEGIO MARSELLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
339	COLEGIO O.E.A. (IED)	KENNEDY	OK		
345	COLEGIO PAULO VI (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
346	COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	
358	COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
361	COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
363	COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	
377	COLEGIO TOM ADAMS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	
384	COLEGIO VILLA RICA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	
391	COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED)	KENNEDY			


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6763

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

Se continua con la localidad de La Candelaria, pendiente el colegio Escuela Nacional del Comercio, se le asigna al contratistas Julio y se asigna para la semana del miercoles 14 de abril. En la localidad de los Martires todos los colegios estan ejecutados.

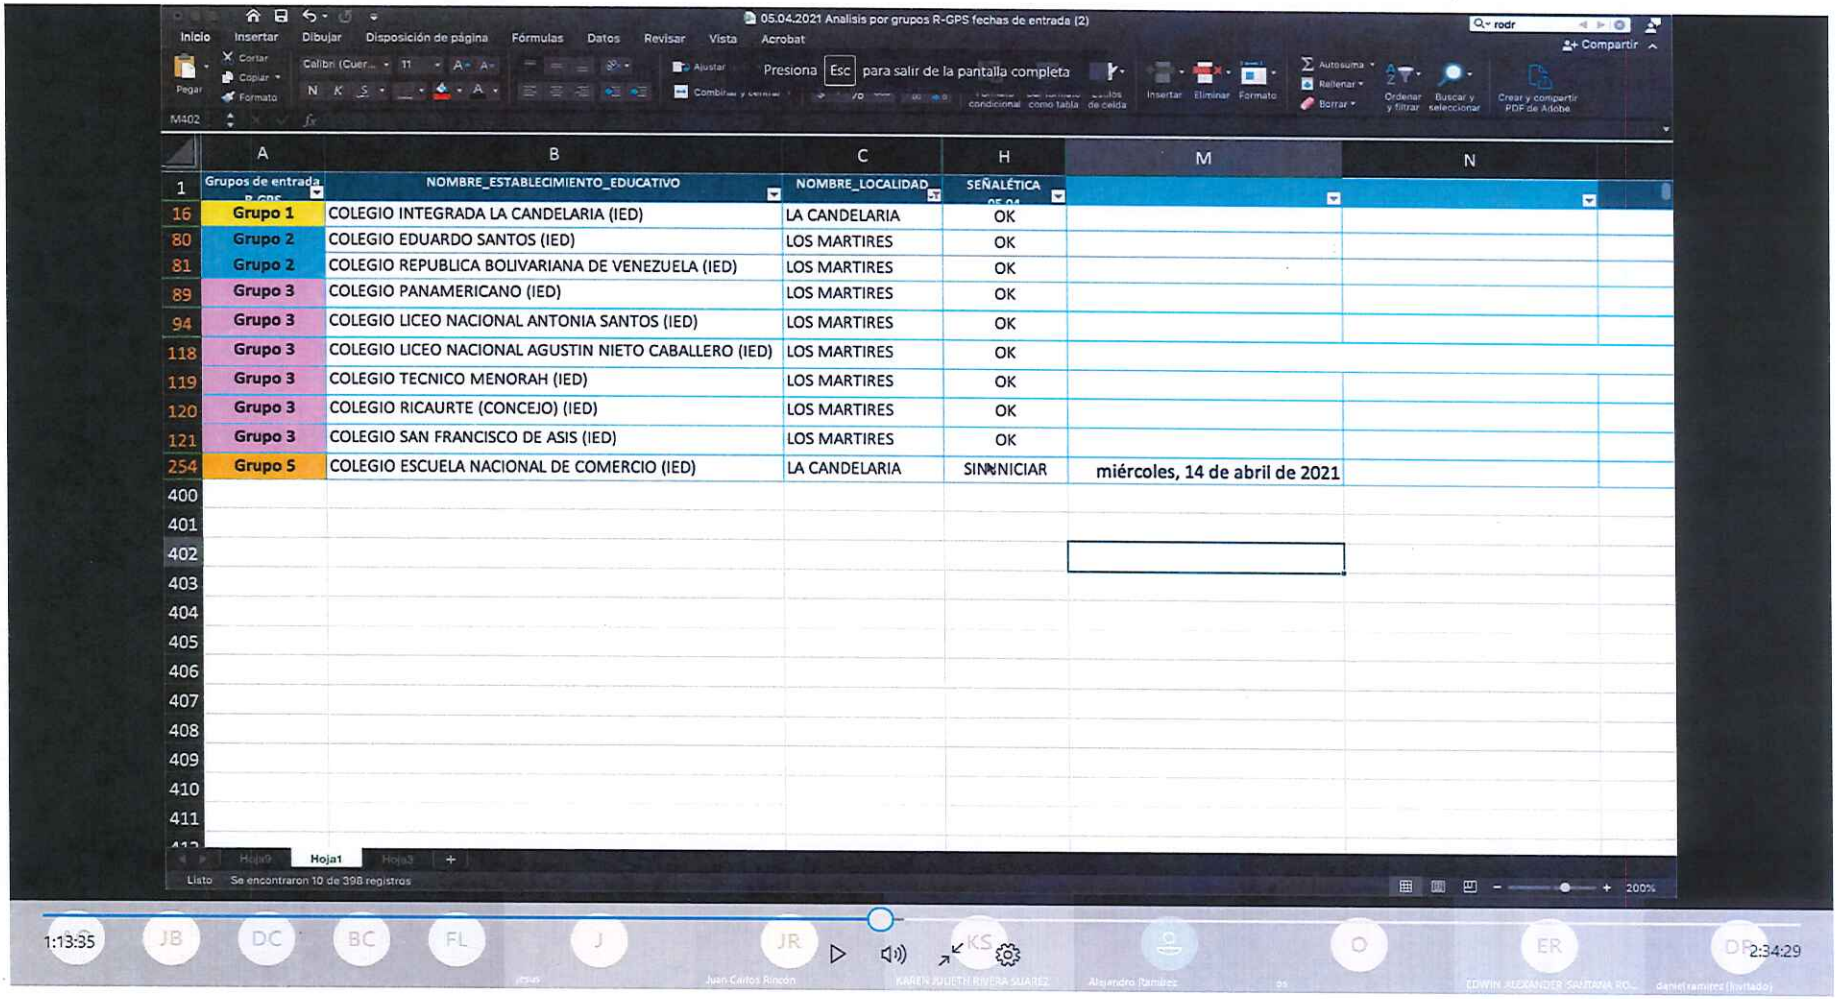

	A	B	C	H	M	N
1	Grupos de entrada R-GPS	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA 05.04		
16	Grupo 1	COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	LA CANDELARIA	OK		
80	Grupo 2	COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	OK		
81	Grupo 2	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED)	LOS MARTIRES	OK		
89	Grupo 3	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MARTIRES	OK		
94	Grupo 3	COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	OK		
118	Grupo 3	COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	LOS MARTIRES	OK		
119	Grupo 3	COLEGIO TECNICO MENORAH (IED)	LOS MARTIRES	OK		
120	Grupo 3	COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED)	LOS MARTIRES	OK		
121	Grupo 3	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MARTIRES	OK		
254	Grupo 5	COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED)	LA CANDELARIA	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6764

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

En la localidad de Puente Aranda hacen falta 6 colegios con subsedes los cuales se agrupan y se asignan fechas para terminar la ejecucion.

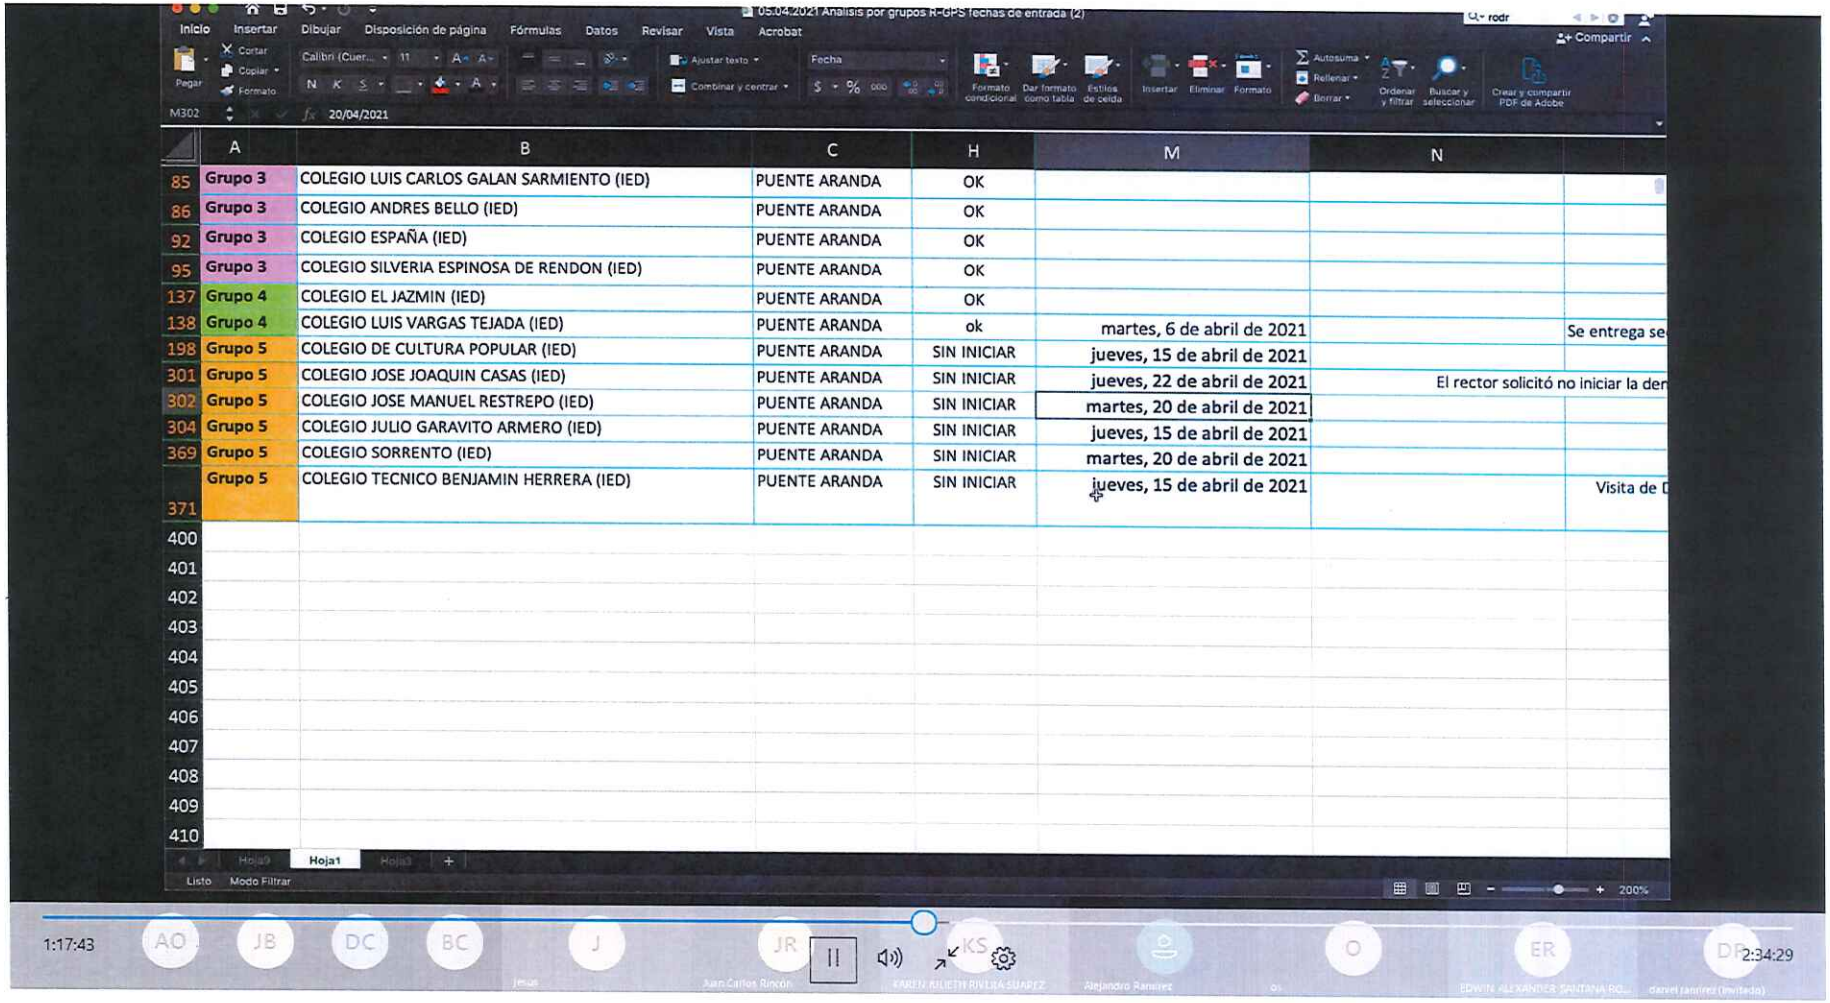

	A	B	C	H	M	N	
85	Grupo 3	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	PUENTE ARANDA	OK			
86	Grupo 3	COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	PUENTE ARANDA	OK			
92	Grupo 3	COLEGIO ESPAÑA (IED)	PUENTE ARANDA	OK			
95	Grupo 3	COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	OK			
137	Grupo 4	COLEGIO EL JAZMIN (IED)	PUENTE ARANDA	OK			
138	Grupo 4	COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)	PUENTE ARANDA	ok	martes, 6 de abril de 2021		Se entrega se
198	Grupo 5	COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021		
301	Grupo 5	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	El rector solicitó no iniciar la der	
302	Grupo 5	COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021		
304	Grupo 5	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021		
369	Grupo 5	COLEGIO SORRENTO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021		
371	Grupo 5	COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021		Visita de D

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6765

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

Se continua con la localidad Rafael Uribe Uribe la cual se encuentra ejecutada completa, en la localidad de San Cristobal el colegio Manantial terminado y el colegio Republica del Ecuador queda asignado para el 10 de abril.

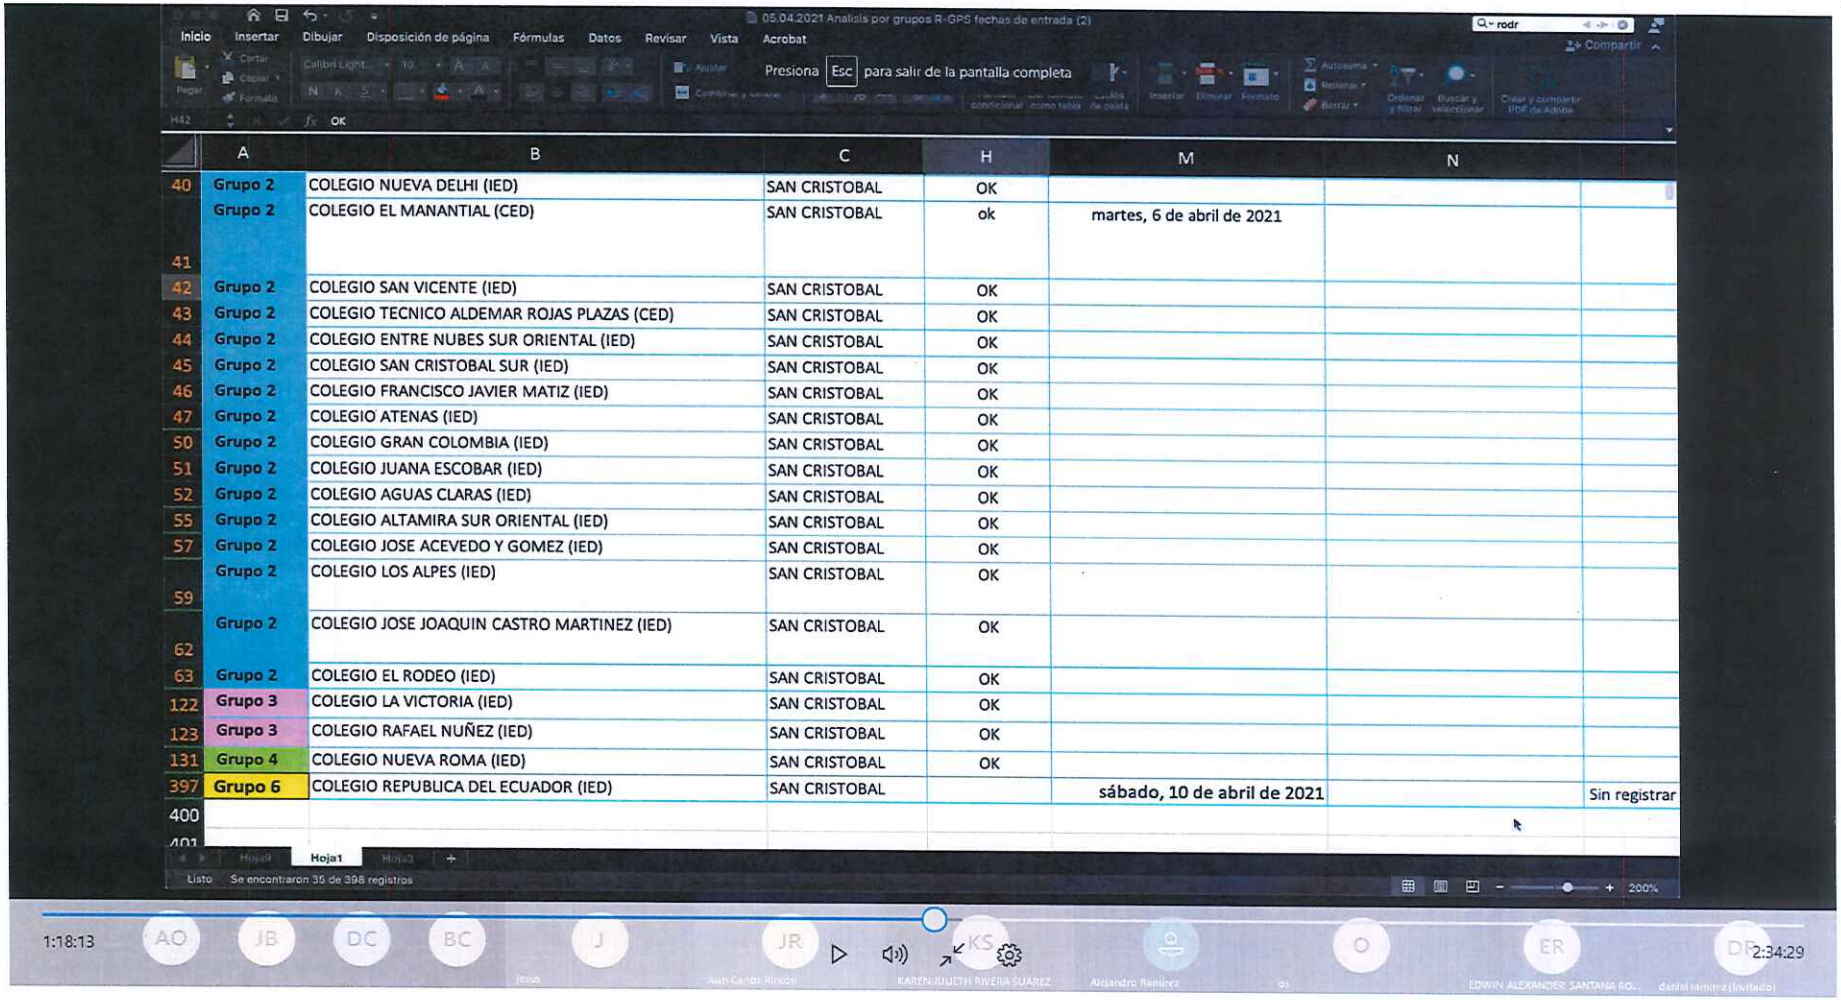

	A	B	C	H	M	N	
40	Grupo 2	COLEGIO NUEVA DELHI (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
41	Grupo 2	COLEGIO EL MANANTIAL (CED)	SAN CRISTOBAL	ok	martes, 6 de abril de 2021		
42	Grupo 2	COLEGIO SAN VICENTE (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
43	Grupo 2	COLEGIO TECNICO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)	SAN CRISTOBAL	OK			
44	Grupo 2	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
45	Grupo 2	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
46	Grupo 2	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
47	Grupo 2	COLEGIO ATENAS (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
50	Grupo 2	COLEGIO GRAN COLOMBIA (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
51	Grupo 2	COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
52	Grupo 2	COLEGIO AGUAS CLARAS (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
55	Grupo 2	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
57	Grupo 2	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
59	Grupo 2	COLEGIO LOS ALPES (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
62	Grupo 2	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
63	Grupo 2	COLEGIO EL RODEO (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
122	Grupo 3	COLEGIO LA VICTORIA (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
123	Grupo 3	COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
131	Grupo 4	COLEGIO NUEVA ROMA (IED)	SAN CRISTOBAL	OK			
397	Grupo 6	COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)	SAN CRISTOBAL		sábado, 10 de abril de 2021		Sin registrar
400							

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6766


Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

En la localidad de Santa Fe el colegio Camino Torres se realiza recorrido con la señora rectora y se realiza la socializacion del personal a Ingeniero Alejandro. Se asignan fechas a los colegios los cuales aun no estan intervenidos.

Asignan al inspector Diego Ramirez para realizar el acompañamiento al arquitecto Edwin Santana en la institucion Nicolas Buenaventura.

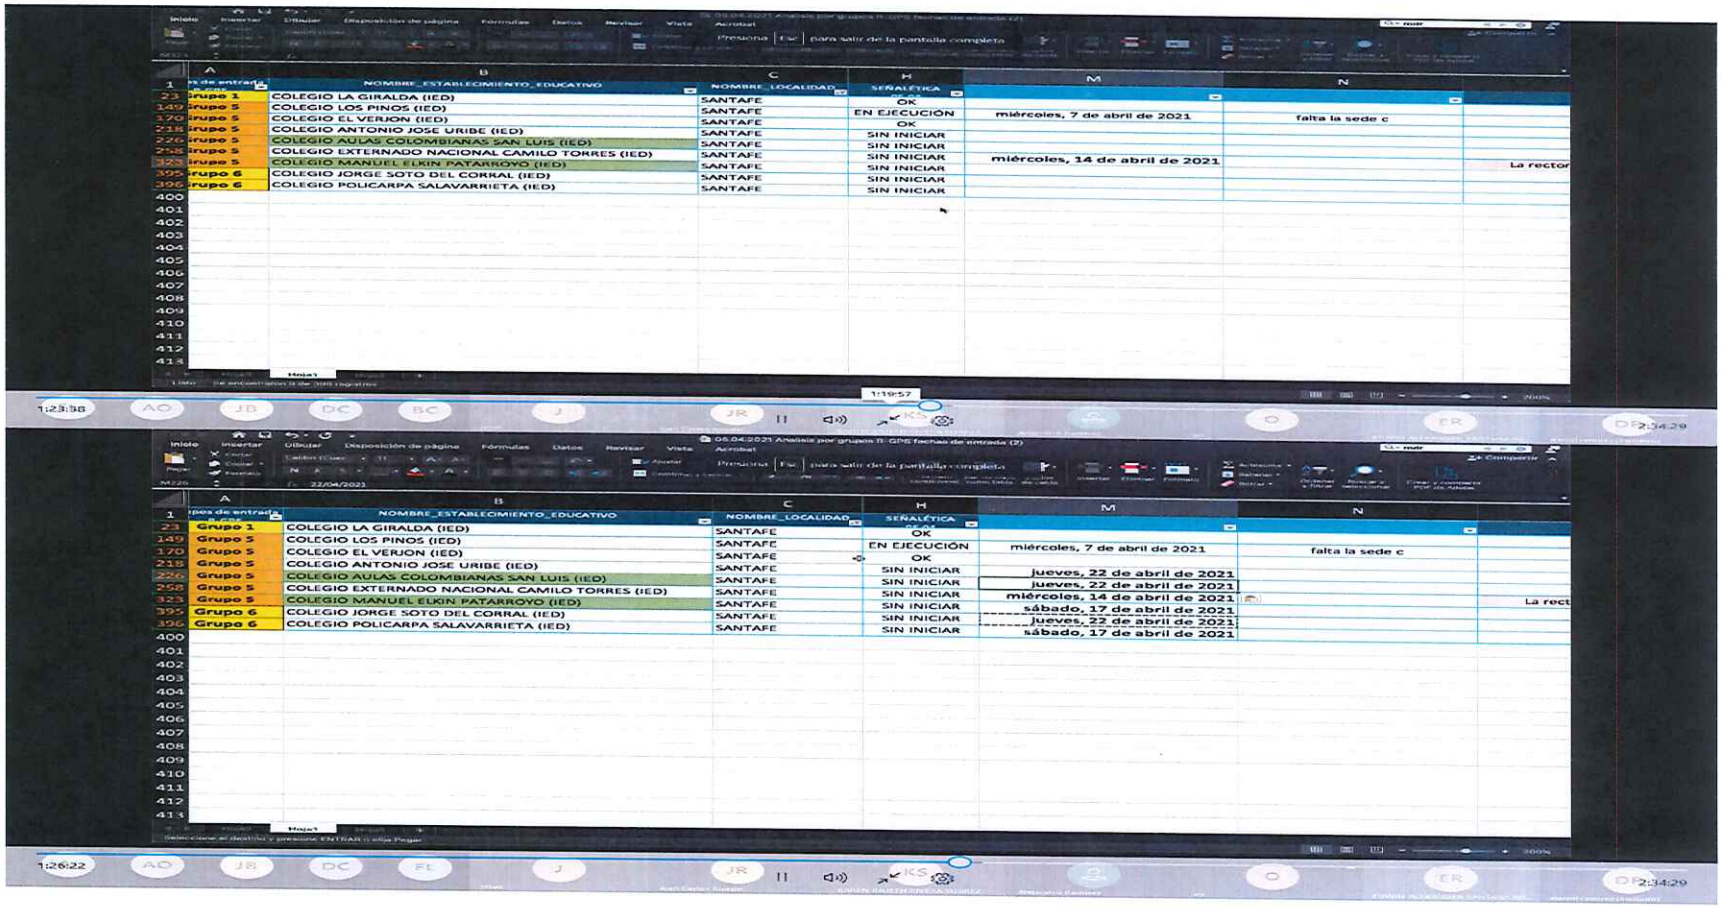

	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	M	N
23	Grupo 1	COLEGIO LA GIRALDA (IED)	SANTAFE	OK	
149	Grupo 5	COLEGIO LOS PINOS (IED)	SANTAFE	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	falta la sede c
170	Grupo 5	COLEGIO EL VERJON (IED)	SANTAFE	OK	
218	Grupo 5	COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	
226	Grupo 5	COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	
258	Grupo 5	COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
323	Grupo 5	COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR		La rector
395	Grupo 6	COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	
396	Grupo 6	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	

	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	M	N
23	Grupo 1	COLEGIO LA GIRALDA (IED)	SANTAFE	OK	
149	Grupo 5	COLEGIO LOS PINOS (IED)	SANTAFE	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	falta la sede c
170	Grupo 5	COLEGIO EL VERJON (IED)	SANTAFE	OK	
218	Grupo 5	COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021
226	Grupo 5	COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021
258	Grupo 5	COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
323	Grupo 5	COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	La rect
395	Grupo 6	COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021
396	Grupo 6	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6767


AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

En la localidad de Suba se realiza la asignacion de fechas ya que el 90% de los colegios no has sido intervenidos aun. Se le asigna al contratista G y G esta localidad.

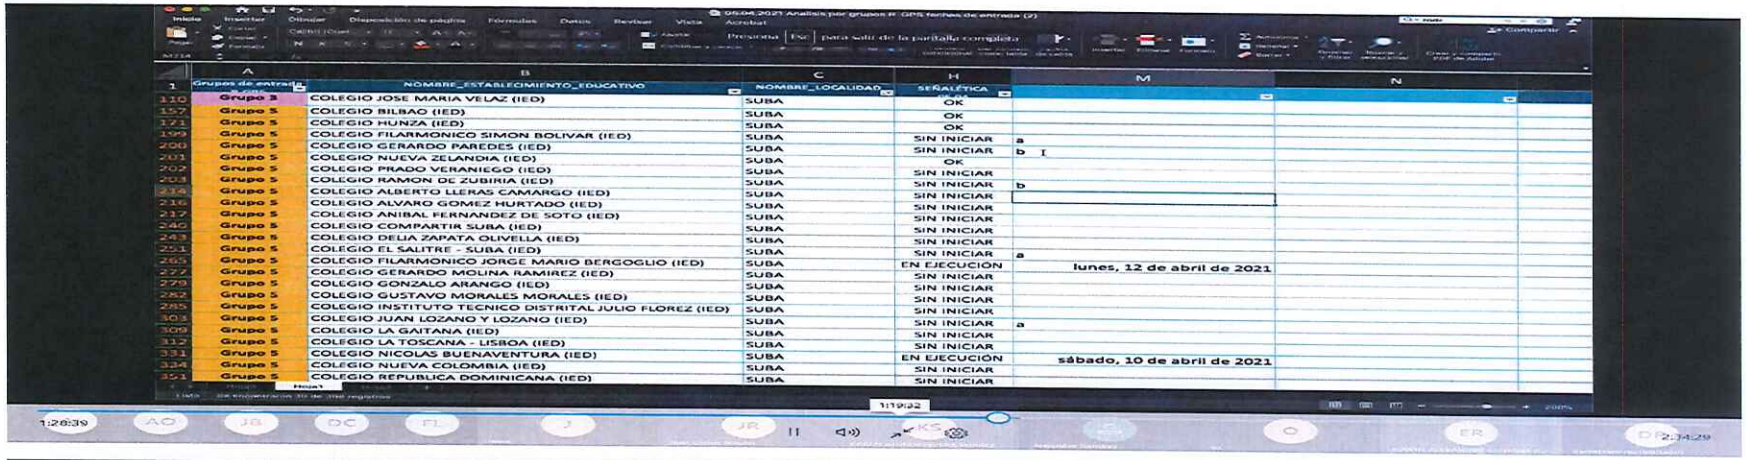

	A	B	C	H	M	N
1	Grupos de entrada	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA		
110	Grupo 3	COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)	SUBA	OK		
157	Grupo 5	COLEGIO BILBAO (IED)	SUBA	OK		
171	Grupo 5	COLEGIO HUNZA (IED)	SUBA	OK		
199	Grupo 5	COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	SUBA	SIN INICIAR	a	
200	Grupo 5	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	SUBA	SIN INICIAR	b	
201	Grupo 5	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	SUBA	OK		
202	Grupo 5	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
203	Grupo 5	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	b	
214	Grupo 5	COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
216	Grupo 5	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
217	Grupo 5	COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
240	Grupo 5	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
243	Grupo 5	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
251	Grupo 5	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	a	
265	Grupo 5	COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
277	Grupo 5	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
279	Grupo 5	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
282	Grupo 5	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
285	Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
303	Grupo 5	COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	a	
309	Grupo 5	COLEGIO LA GAITANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
312	Grupo 5	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
331	Grupo 5	COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
334	Grupo 5	COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	SUBA	SIN INICIAR		
351	Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR		

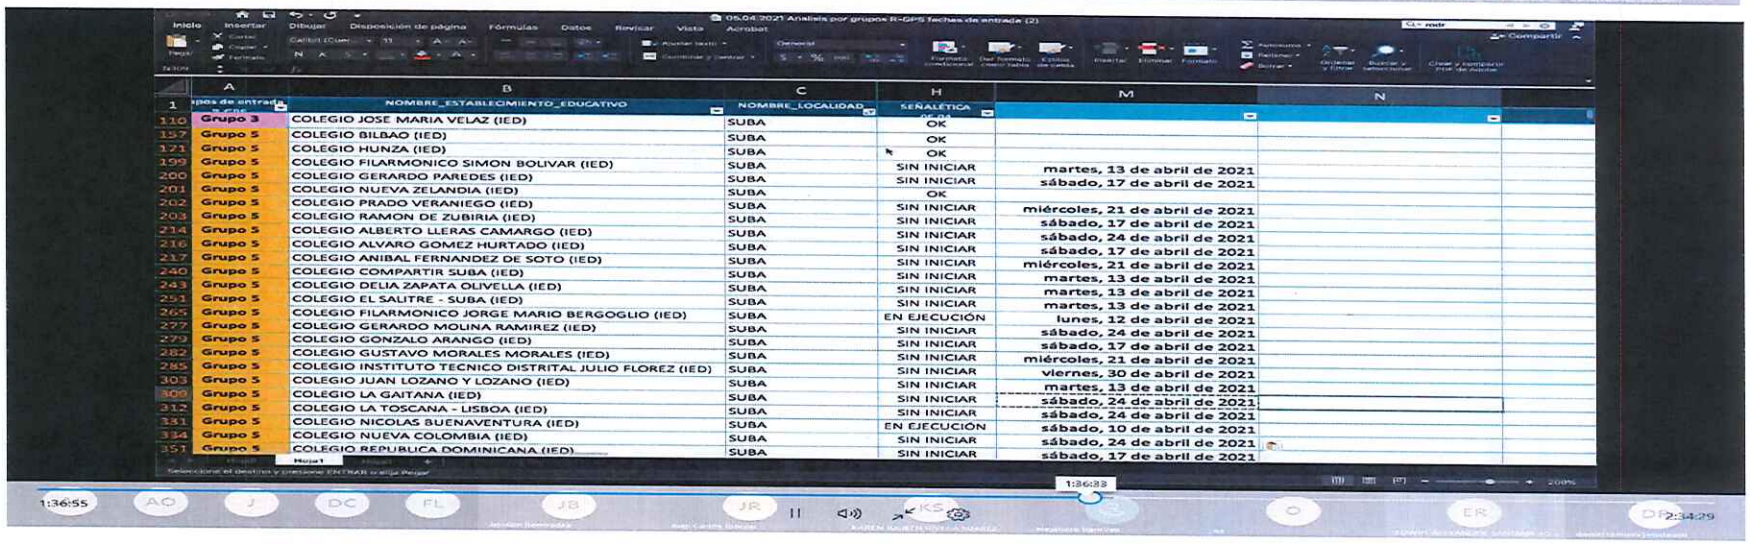


	A	B	C	H	M	N
1	pos de entrada	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA		
110	Grupo 3	COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)	SUBA	OK		
157	Grupo 5	COLEGIO BILBAO (IED)	SUBA	OK		
171	Grupo 5	COLEGIO HUNZA (IED)	SUBA	OK		
199	Grupo 5	COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	
200	Grupo 5	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
201	Grupo 5	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	SUBA	OK		
202	Grupo 5	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	
203	Grupo 5	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
214	Grupo 5	COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
216	Grupo 5	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
217	Grupo 5	COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	
240	Grupo 5	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	
243	Grupo 5	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	
251	Grupo 5	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	
265	Grupo 5	COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
277	Grupo 5	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
279	Grupo 5	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
282	Grupo 5	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	
285	Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
303	Grupo 5	COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	
309	Grupo 5	COLEGIO LA GAITANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
312	Grupo 5	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
331	Grupo 5	COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
334	Grupo 5	COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
351	Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6768

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

Se continua con la localidad de Tunjuelito la cual esta asiganada par el siguiente dia 8 de abril. Estan dos colegios pendientes Isla del Sol y el colegio Rafael Uribe uribe. A loos caules se les reasignan fechas.

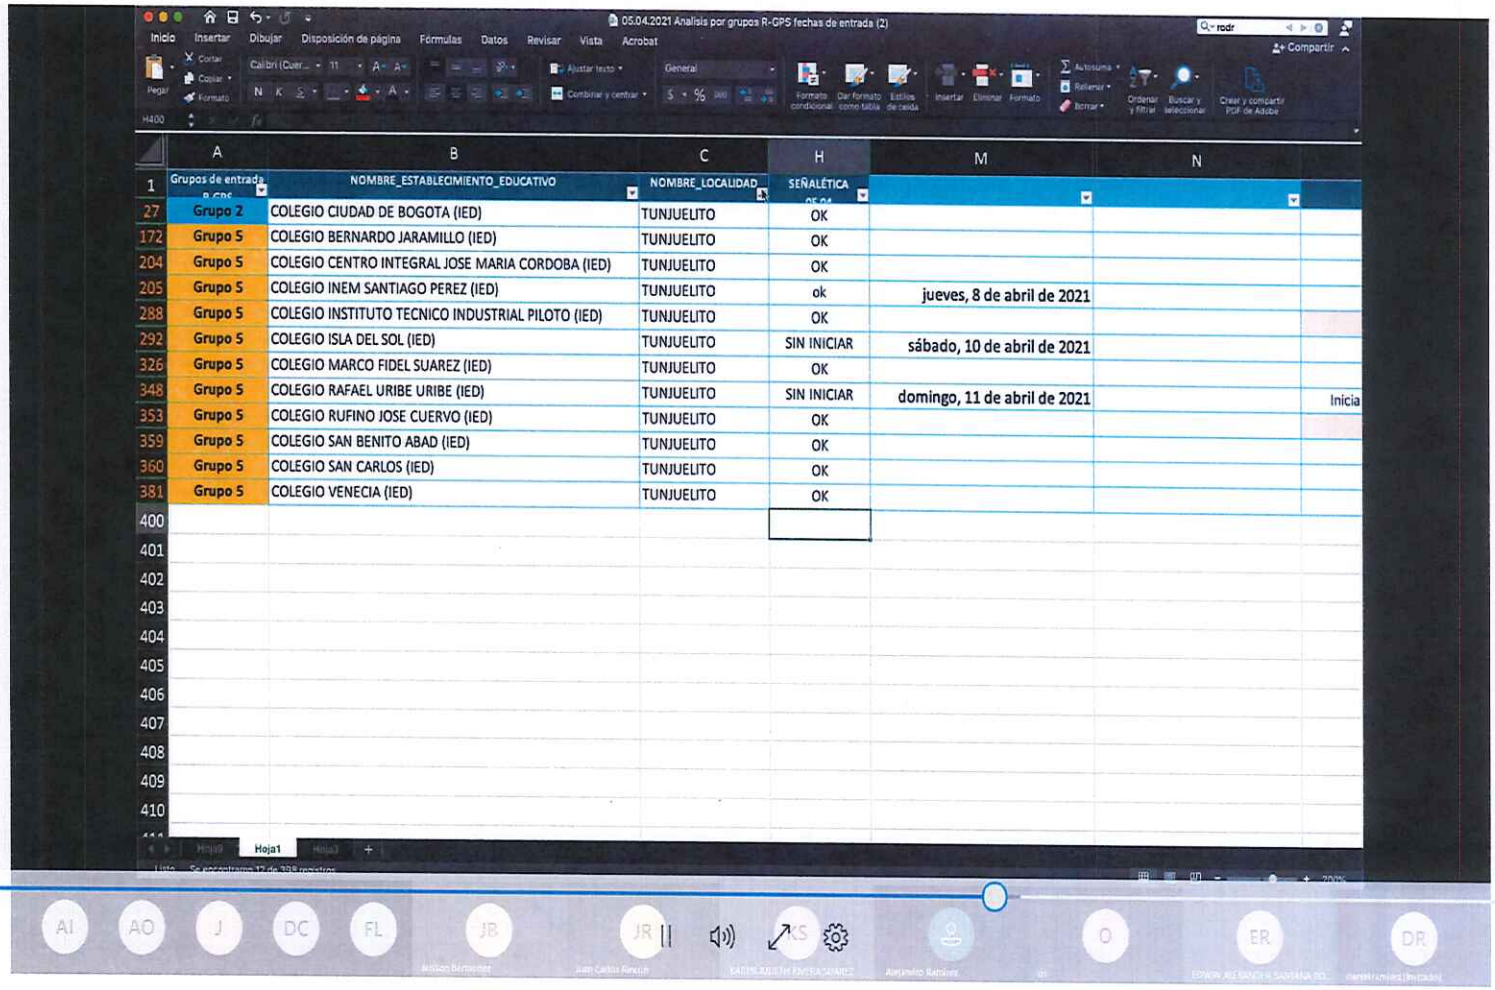

	A	B	C	H	M	N
1	Grupos de entrada R-GPS	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA 05.04		
27	Grupo 2	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)	TUNJUELITO	OK		
172	Grupo 5	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	TUNJUELITO	OK		
204	Grupo 5	COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)	TUNJUELITO	OK		
205	Grupo 5	COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED)	TUNJUELITO	ok	jueves, 8 de abril de 2021	
288	Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)	TUNJUELITO	OK		
292	Grupo 5	COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	sábado, 10 de abril de 2021	
326	Grupo 5	COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)	TUNJUELITO	OK		
348	Grupo 5	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	domingo, 11 de abril de 2021	Inicia
353	Grupo 5	COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED)	TUNJUELITO	OK		
359	Grupo 5	COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED)	TUNJUELITO	OK		
360	Grupo 5	COLEGIO SAN CARLOS (IED)	TUNJUELITO	OK		
381	Grupo 5	COLEGIO VENECIA (IED)	TUNJUELITO	OK		


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6769

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

En la localidad de Usaquen ya se asignaron fechas a los colegios en reuniones pasadas.

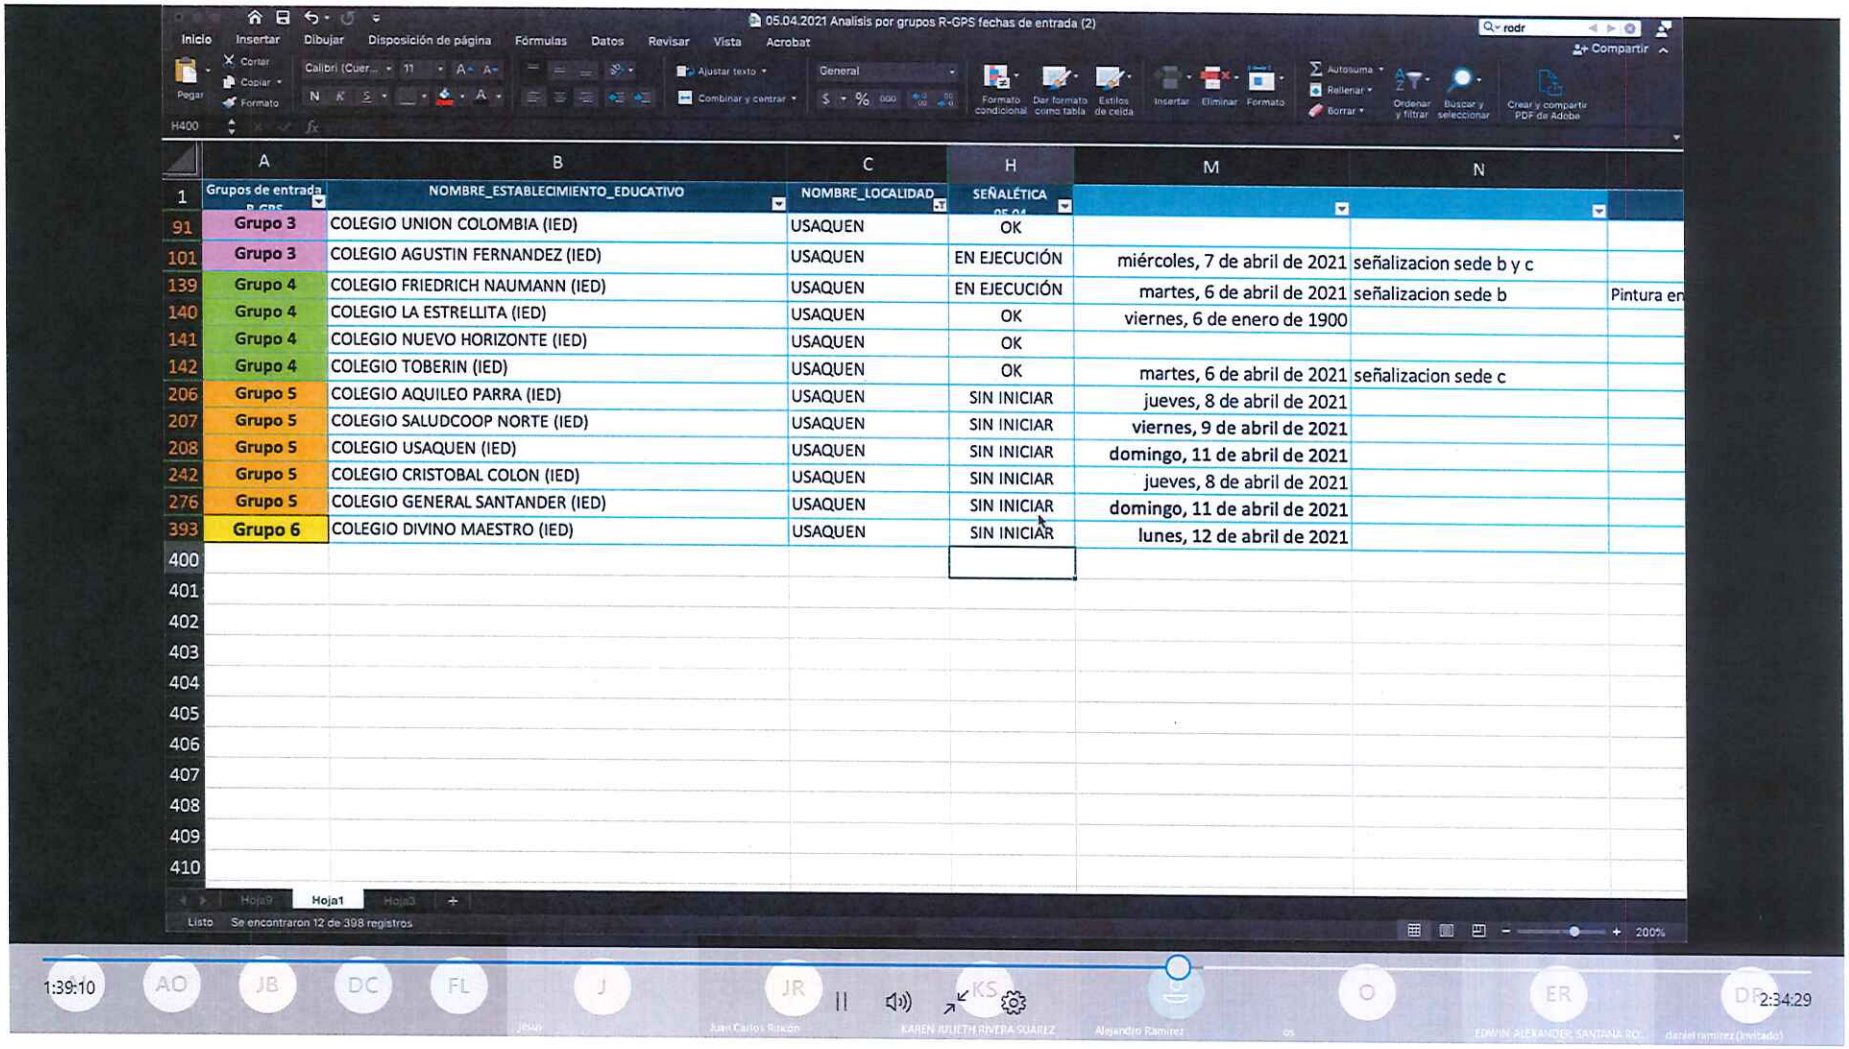

05.04.2021 Analisis por grupos R-GPS fechas de entrada (2)

	A	B	C	H	M	N	
1	Grupos de entrada R-GPS	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA			
91	Grupo 3	COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	USAQUEN	OK			
101	Grupo 3	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	señalizacion sede b y c	
139	Grupo 4	COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	martes, 6 de abril de 2021	señalizacion sede b	Pintura en
140	Grupo 4	COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)	USAQUEN	OK	viernes, 6 de enero de 1900		
141	Grupo 4	COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	USAQUEN	OK			
142	Grupo 4	COLEGIO TOBERIN (IED)	USAQUEN	OK	martes, 6 de abril de 2021	señalizacion sede c	
206	Grupo 5	COLEGIO AQUILEO PARRA (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	jueves, 8 de abril de 2021		
207	Grupo 5	COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021		
208	Grupo 5	COLEGIO USAQUEN (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	domingo, 11 de abril de 2021		
242	Grupo 5	COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	jueves, 8 de abril de 2021		
276	Grupo 5	COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	domingo, 11 de abril de 2021		
393	Grupo 6	COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021		

Hoja9 Hoja1 Hoja3 +

Listo Se encontraron 12 de 398 registros

200%


1:39:10 2:34:29

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6770

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

Por ultimo en la localidad de Usme se reprograman fechas de los colegios pero no todos ya que algunos ya se reportaron en reuniones anteriores como programacion, se realiza la reprogramacion teniendo en cuenta que el contratista G y G empieza a intervenir en la localidad de Suba desde el dia 8 de abril del 2021.

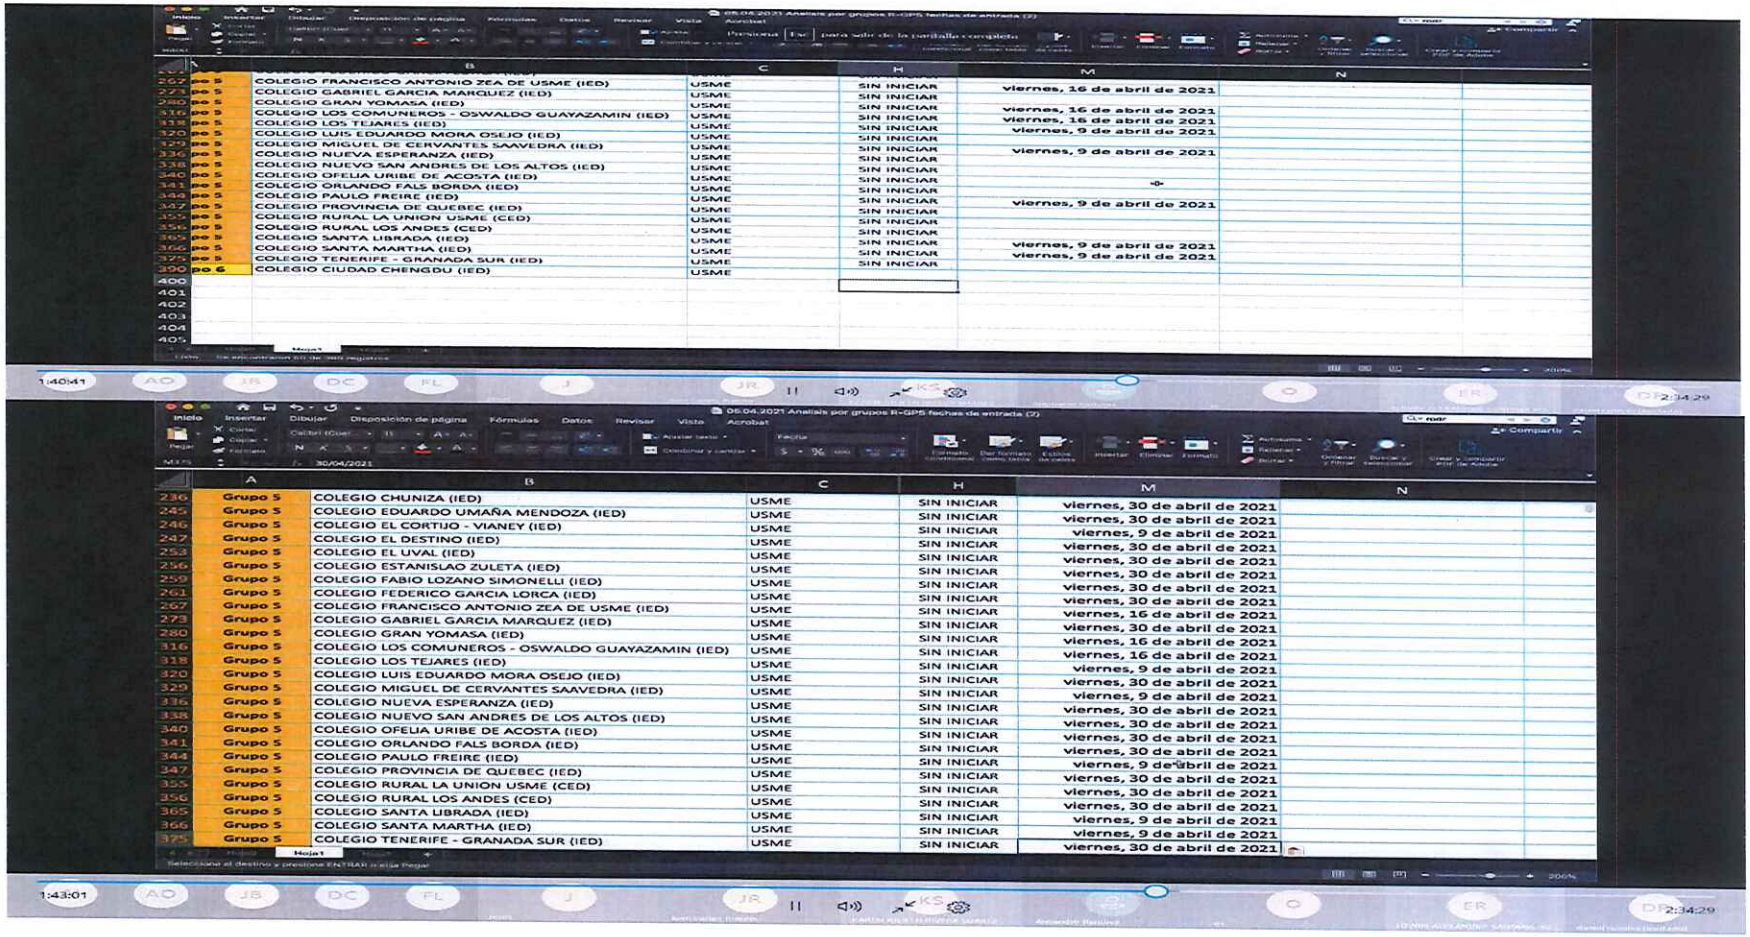

236	Grupo 5	COLEGIO CHUNIZA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
245	Grupo 5	COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
246	Grupo 5	COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021
247	Grupo 5	COLEGIO EL DESTINO (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
253	Grupo 5	COLEGIO EL UVAL (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
256	Grupo 5	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
259	Grupo 5	COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
261	Grupo 5	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
267	Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021
273	Grupo 5	COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
280	Grupo 5	COLEGIO GRAN YOMASA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021
316	Grupo 5	COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021
318	Grupo 5	COLEGIO LOS TEJARES (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021
320	Grupo 5	COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021
329	Grupo 5	COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
336	Grupo 5	COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021
338	Grupo 5	COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
340	Grupo 5	COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
341	Grupo 5	COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
344	Grupo 5	COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021
347	Grupo 5	COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
355	Grupo 5	COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
356	Grupo 5	COLEGIO RURAL LOS ANDES (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021
365	Grupo 5	COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021
366	Grupo 5	COLEGIO SANTA MARTHA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021
375	Grupo 5	COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


6771

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°7

Asi queda reprogramada esta localidad de Usme.

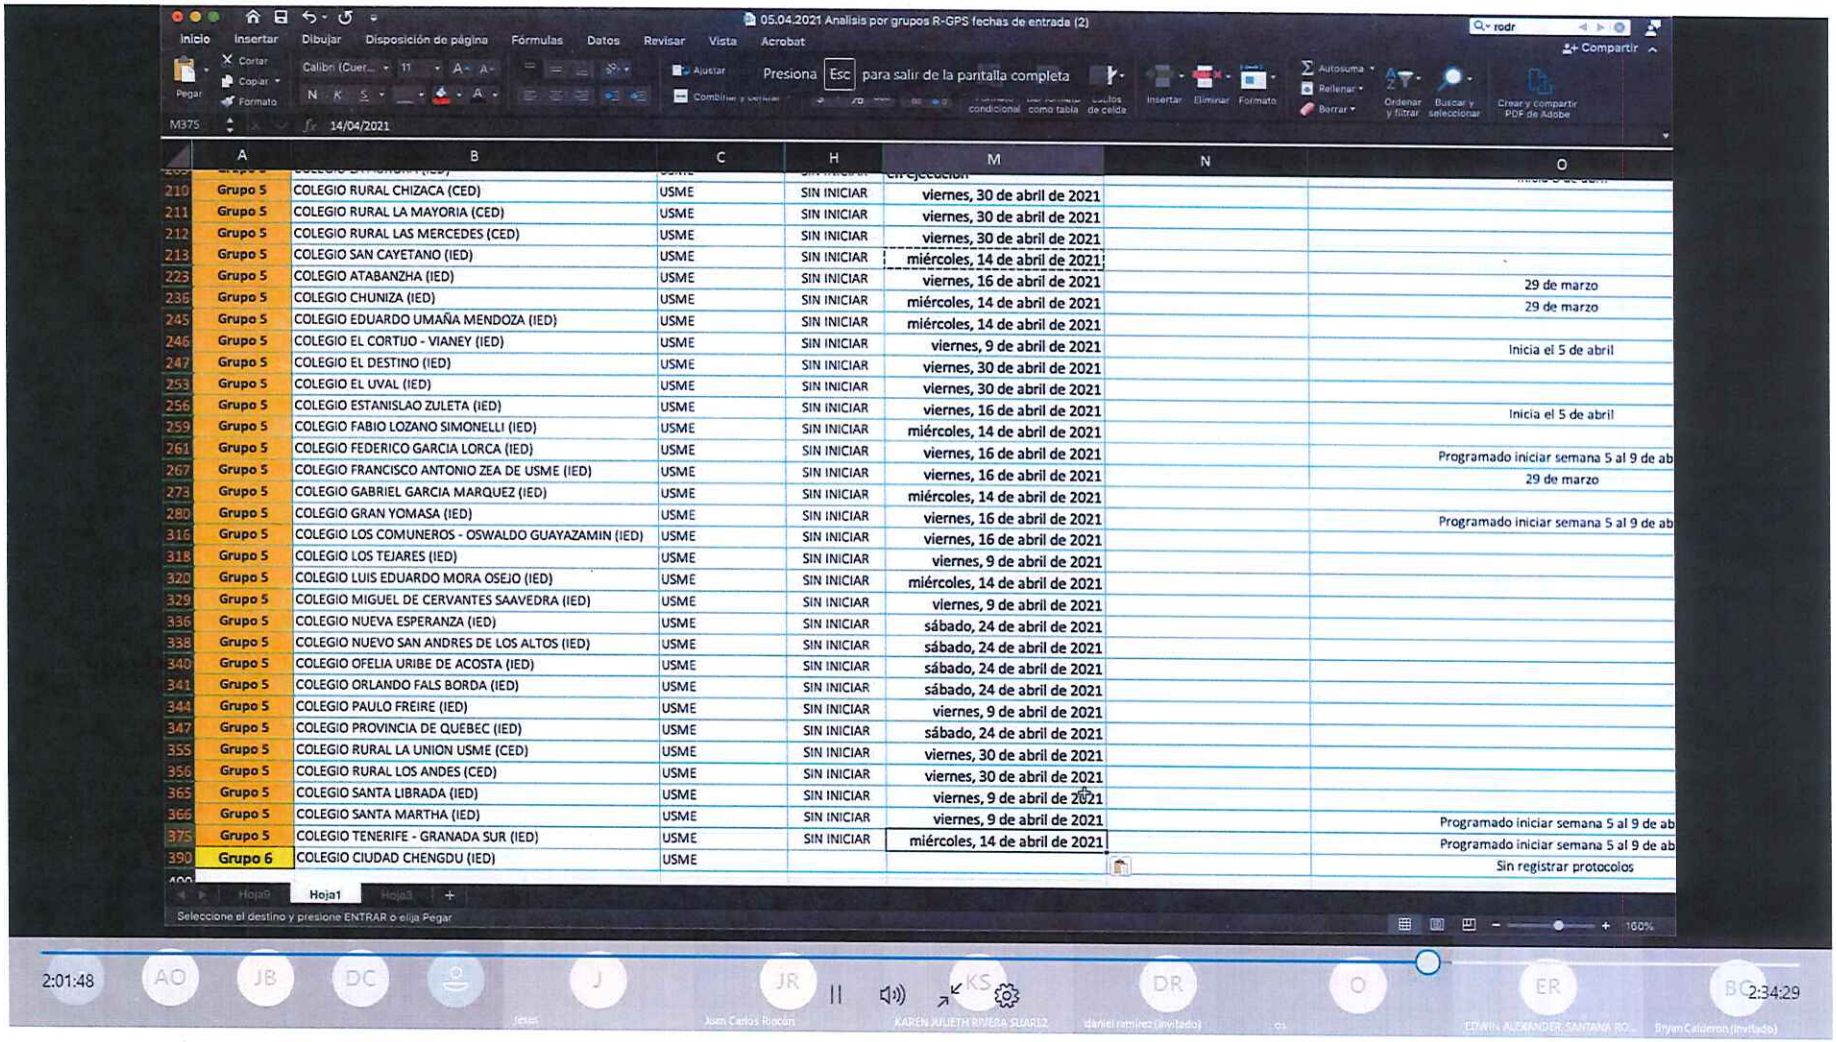

05.04.2021 Analisis por grupos R-GPS fechas de entrada (2)

Presiona Esc para salir de la pantalla completa

M375 14/04/2021

	A	B	C	H	M	N	O
210	Grupo 5	COLEGIO RURAL CHIZACA (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		
211	Grupo 5	COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		
212	Grupo 5	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		
213	Grupo 5	COLEGIO SAN CAYETANO (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021		
223	Grupo 5	COLEGIO ATABANZHA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021		29 de marzo
236	Grupo 5	COLEGIO CHUNIZA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021		29 de marzo
245	Grupo 5	COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021		
246	Grupo 5	COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021		Inicia el 5 de abril
247	Grupo 5	COLEGIO EL DESTINO (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		
253	Grupo 5	COLEGIO EL UVAL (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		
256	Grupo 5	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021		Inicia el 5 de abril
259	Grupo 5	COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021		
261	Grupo 5	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021		Programado iniciar semana 5 al 9 de ab
267	Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021		29 de marzo
273	Grupo 5	COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021		
280	Grupo 5	COLEGIO GRAN YOMASA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021		Programado iniciar semana 5 al 9 de ab
316	Grupo 5	COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021		
318	Grupo 5	COLEGIO LOS TEJARES (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021		
320	Grupo 5	COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021		
329	Grupo 5	COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021		
336	Grupo 5	COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021		
338	Grupo 5	COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021		
340	Grupo 5	COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021		
341	Grupo 5	COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021		
344	Grupo 5	COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021		
347	Grupo 5	COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021		
355	Grupo 5	COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		
356	Grupo 5	COLEGIO RURAL LOS ANDES (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021		
365	Grupo 5	COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021		
366	Grupo 5	COLEGIO SANTA MARTHA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021		Programado iniciar semana 5 al 9 de ab
375	Grupo 5	COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021		Programado iniciar semana 5 al 9 de ab
390	Grupo 6	COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)	USME				Sin registrar protocolos

Hoja3 Hoja1 Hoja3

Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar

2:01:48 2:34:29

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

6772
