CONSTRUSOCIAL

Bogotá, 03 de abril de 2021

Señores
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
Atn. Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO

Ref. EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES.

Asunto: inconvenientes en ejecución de señalización

Respetado Ingeniero.

De la semana 29 de marzo al 31 marzo del 2021 mediante esta carta informamos los inconvenientes y atrasos de cumplimiento de programación de obra por causas mayores entre las cuales tenemos dificultad para el ingreso en instituciones educativas (no se encontraban los permisos habilitados) condiciones climáticas fuertes lluvias impidiendo la continuidad de la aplicación de pintura horizontal en pisos corredores y halles

Con el fin de cumplir con la programación adquirida dejamos la trazabilidad de los percances con un registro fotográfico con evidencia clara y precisa

Colegio camilo torres



Colegio leonardo posada



Cra. 21 #63B-39 Int. 101 – Bogotá.

MAIL: ALEFER55@GMAIL.COM

7191

CONSTRUSOCIAL

Colegio simon rodriguez sede b



Colegio friedrich naumann sede b



Anéxanos un listado de instituciones educativas que no se pudieron iniciar por factores climáticos

Institución educativa Manuel cepeda Vargas
Institución educativa tabora sede a
Institución educativa república de Colombia sede a
Institución educativa Néstor forero de Alcalá sede a
Institución educativa Arabia sede b
Institución educativa Toberín sede c

Cordialmente

Diego Alejandro Fernández
Director de obra

Cra. 21 #63B-39 Int. 101 – Bogotá.

MAIL: ALEFER55@GMAIL.COM

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Reitero señalización y Señaletica colegios prioritarios no ejecutados.

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 5 de abril de 2021, 8:26
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>
Cc: "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>

Estimado ingeniero Rosario buenos días.

De manera atenta y en atención al la reuniones de seguimiento efectuadas en la semana anterior vía Teams, llamadas telefónicas y los chat de la herramienta WhatsApp, me permito indicar la preocupación de la SED, por la no ejecución de los siguientes frentes, los cuales son de características prioritarias, y fueron notificadas a los equipos de obra e interventoría, desde tiempo atrás, sin que a la fecha se tenga respuesta puntal al particular y por el contrario se obtiene repuestas evasivas por parte del responsable del constructor.


- Colegio Agustín Fernández, Localidad de Usaquén,
- Colegio Luis Ángel Arango, Localidad de Fontibón.
- Colegio Nueva Zelandia, Localidad de Suba.
- Colegio Jorge Mario Bergoglio, Localidad de Suba.
- Colegio Nicolas Buenaventura, Localidad de Suba.
- Colegio el Manantial, Localidad de San Cristóbal.
- Colegio Paraíso Mirador, Localidad de Ciudad Bolívar.
- Colegio Arborizadora Alta, Localidad de Ciudad Bolívar.
- Colegio Rural Pasquilla, Localidad de Ciudad Bolívar.
- Colegio Minuto de Buenos Aires, Localidad de Ciudad Bolívar.
- Colegio Los Pinos, Localidad de Chapinero.
- Colegio Simón Rodríguez, Localidad de Chapinero.

Por lo anterior sin afectar la programación que se tiene para los presentes días se solicita, se implemente un plan de contingencia que permita a la menor brevedad posible a fecha máxima de terminación martes 6 de abril, lograr el recibo a satisfacción del eso colegios en todas sus sedes.

De otra parte, nuevamente pongo a consideración de la interventoría, la necesidad de una programación semanal, a la cual se pueda hacer seguimiento permanente como desarrollar la gestión previa de ingresos a los colegios, si bien es cierto la estrategia de apertura de las localidades a los grupos de trabajo, permite alguna flexibilidad para abordar algunos casos de no ingresos, esta no ha permitido llevar un control de reporte de avance.

Por lo cual se convoca hoy a 5 de abril de reunión donde deberá participar el constructor o su representante, junto a los responsable de la interventoría para la presentación de la programación, la cual debe estar diseñada pensado en la fecha de terminación del contrato para el día 30 de abril del presente año, la reunión se programa a las 8:30 de la noche para poder contar con la participación activa, de los equipos

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNmZTI5MzItMmVmYi00YTBmLWIwMjctMDA1NTczY2U5MzZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%22702f05b8-0055-4cf7-aba9-3f0da819be52%22%7d



Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

7133

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS

1 mensaje

Ana Maria Corchuelo <anamaria0930@outlook.com> 5 de abril de 2021, 18:13
Para: "ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com" <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "Arq. Edwin Santana" <esantana@educacionbogota.gov.co>, "alfer55@gmail.com" <alfer55@gmail.com>, nerio jesus ramirez vasquez <cheopezz@gmail.com>, "jessicatavera98@gmail.com" <jessicatavera98@gmail.com>

Ana Maria Corchuelo ha compartido archivos de OneDrive con usted. Para verlos, haga clic en los vínculos siguientes.

MEMORIAS ACTA 11 PDF ITEMS COMPLETOS OBRA CIVIL 1.pdf PDF ACTA 11 OBRA CIVIL CONTRACTUALES Y NP 1.pdf

Buen dia.

Anexo envío oficio No OFICIO No SED-CONS-2020 con los siguientes documentos que corresponden a la factura del corte No 11 del contrato No CO1.PCCNTR.1436286 DE 2020 cuyo Objeto es "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES":

1. Factura proforma FE 1017
2. Formato de información de pagos a contratista FURC.
3. Formato de actualización de datos de terceros.
5. Acta parcial No 11.
6. Memorias de Calculo.
7. Acta para autorizar pagos obra

Quedo atenta, gracias.

Ana Maria Corchuelo
Tel. 3208208361

Enviado desde Correo para Windows 10

8 adjuntos

- **19. ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS OBRA.docx** 139K
- **ACTA FINAL CORTE 11 OK.xlsx** 5104K
- **Actualización de Terceros Obra e Interventoria 2021.xlsx** 145K
- **DOCUMENTOS CONSTRUSOCIAL.pdf** 1611K
- **FACTURA 1017 CORTE 11 SED.pdf** 64K
- **FURC 19.03.2021.xlsx** 503K
- **OFICIO CORTE DE OBRA No 11.pdf** 154K
- **CONSOLIDADO MEMORIAS CORTE 11 SEÑALIZACION.pdf** 21750K

719A

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 5 de abril de 2021, 7:28
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>

Buenos días ingeniero Rosario.

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Secretaría de Educación, acorde a las reuniones adelantadas con la Subsecretaria de Acceso y Permeancia, como ordenador del gasto, y la modificación No 3 del contrato de obra, se hace necesario que de carácter urgente y prioritario, el día de hoy 6 de abril de 2021, se haga entrega del acta no 11 debidamente revisada y aprobada por la Interventoría, dando cumplimiento a las observaciones de forma que se identificaron por la SED el pasado 31 de marzo de 2021.

Consecuentemente se espera el envió de las actas parciales de interventoría.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: miércoles, 31 de marzo de 2021 8:41
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Re: CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS

[El texto citado está oculto]

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 6 de abril de 2021, 7:32
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>

Buenos días ingeniero Rosario.

Nuevamente me permito reiterar la necesidad urgente de radicación del acta parcial No 11, lo anterior teniendo en cuenta que pese a que se remitió correo electrónico el día 6 de abril requiriendo esta entrega INEDIATA a la fecha y hora del presente correo no ha sido remitida, el acta final debidamente aprobada por la interventoría, resaltando la importancia del envío total de acta con el cumplimiento de lleno de requisitos.

Él no envió en oportunidad del acta impide a la SED, efectuar los tramites internos en forma ágil, que permita que la Secretaría de Hacienda efectué los pagos respectivos.

Cordial saludo.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado: lunes, 5 de abril de 2021 7:28
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>; camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>; AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>; alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS

[El texto citado está oculto]

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 6 de abril de 2021, 7:40
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>
Cc: "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>

Estimado ingeniero Rosario buenos días.

De manera muy atenta me permito solicitarle se efectúen las acciones pertinentes que permitan que en forma INMEDITA, sean actualizadas por parte del contratista Construsocial las garantías del contrato de asunto.

Recordando que una vez sean actualizadas estas pólizas deberán ser subidas a la plataforma SECOP, así como deben ser remitidas vía correo electrónico los soportes de actualización como de subida al siga, para que desdela Dirección de Construcciones sea reportado el evento a lo Oficina de Contratos.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 24 de marzo de 2021 14:31
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

Respetado Edwin buenas tardes,

De manera atenta se solicita su colaboración con la actualización de las garantías del contrato del asunto. Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha no han sido allegadas a la Oficina de Contratos las actualizaciones de las garantías.

Agradecemos tener en cuenta lo establecido en la circular 008 de 2020 numeral 3.5.4. Aprobación de garantías: Las solicitudes de trámites de aprobación de garantías, cuando a ello haya lugar, se realizarán a través del SIGA, donde deberá aparecer de forma obligatoria el PDF de la póliza a aprobar, lo suficientemente legible y completo.

Igualmente, se debe cargar en **UN NUEVO REGISTRO** en el numeral 2. Condiciones de SECOP II las pólizas actualizadas según acta de inicio, teniendo en cuenta las nuevas vigencias, **sin modificar ni eliminar los registros existentes.**

Cordial Saludo,

Nancy Guayabo Rodríguez
Profesional Universitario - Oficina de contratos.
Av. El Dorado No. 66 – 63 Piso 1 **torre C**
Nivel Central: 3241000
Ext. 3529
nguayabo@educacionbogota.gov.co

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de marzo de 2021 7:42 a. m.
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>; camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>
Cc: alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; anamaria0930@outlook.com <anamaria0930@outlook.com>; NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

117

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

solicito envió actualización de garantías contrato de interventoria

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 6 de abril de 2021, 7:52
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>

Estimado ingeniero Rosario buenos días.

De manera atenta me permito indicar que a la fecha no ha sido reportado y/o remitidos los soportes de actualización de garantías por parte de la empresa AC2R, asociadas a la modificación No 2 del contrato, teniendo en cuenta que en comunicación telefónica se indico que este tramite ya había sido adelantado por parte de la interventoría, por lo cual me permito solicitarle el envío ***inmediato*** de los soportes o en su defecto el tramite de actualización ante la aseguradora y posterior envío de los soportes a la SED.

Recordando que una vez sean actualizadas estas pólizas deberán ser subidas a la plataforma SECOP, así como deben ser remitidas vía correo electrónico los soportes de actualización como de subida al siga, para que desde la Dirección de Construcciones sea reportado el evento a lo Oficina de Contratos.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

7758

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

se remite oficio nr 70

residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, alefer55@gmail.com

6 de abril de 2021, 12:30

orficio nr 70.pdf
540K

9139

CONSTRUSOCIAL

Bogotá, 06 de abril de 2021

Señores
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
Atn. Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
Representante
Legal Ciudad.

Ref. EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES.

Asunto: cambio de metodología memorias de calculo

Respetado Ingeniero.

Mediante este oficio nos dirigimos para solicitar el cambio de la metodología y presentación de memorias de cálculos, anexando un registro fotográfico de 4 fotos por ítems cobrado y soportado por un video donde se puede apreciar el recorrido siendo narrado, en la cual se evidencian todas las actividades ejecutadas en la institución educativa este video está reflejado por un link en la memoria de cálculo, almacenado en una plata forma digital nube con acceso las 24 horas del día de igual forma presentamos el modelo para su revisión aprobación y cualquier corrección presente

Cordialmente

Diego Alejandro Fernández
Director de obra

fecha de elebaracion		MEMORIAS DE CANTIDADES	fecha de revision	
codigo de planta: 706	direccion	Calle 73F SUR No. 80N-41	localidad	07-BOSA

OBJETO: "ES EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ."

CONSTRUSOCIAL S.A.S	INTERVENTORIAAC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S	
ENTIDAD SECRETARIA DE EDUCACION	COLEGIO A INTERVENIR:	Sede A - Gran Colombiano

CONSTRUSOCIAL

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO			
tramo general	1004.18			1	1004.18
				TOTAL	1,004.1800






OBSERVACIONES: anexamos link con soporte de video de alta defenicion donde estan soportados por medio visual las cantidades en la presente memoria

https://drive.google.com/drive/folders/1MkZLB-MxZsfSdYskZ05qRSS9OYDEZf_E?usp=sharing

DIRECTOR DE OBRA	ELABORO	APROBO
ING. DIEGO FERNANDEZ	ING. SANTIAGO FERNANDEZ RESIDENTEDE OBRA	ING. OSCAR SALAMANCA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

fecha de elebaracion		MEMORIAS DE CANTIDADES	fecha de revision	
codigo de planta: 706	direccion	Calle 73F SUR No. 80N-41	LOCALIDAD	07-BOSA

OBJETO: "ES EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ."

CONSTRUSOCIAL S.A.S	INTERVENTORIAAC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S	
ENTIDAD SECRETARIA DE EDUCACION	COLEGIO A INTERVENIR:	Sede A - Gran Colombiano

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
np55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN

CONSTRUSOCIAL

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		ANCHO			
cancha	29.00			1	29.00
				TOTAL	29.0000





OBSERVACIONES: anexamos link con soporte de video de alta defenicion donde estan soportados por medio visual las cantidades en la presente memoria

https://drive.google.com/drive/folders/1MkZLB-MxZsfSdYskZ05qRSS9OYDEZf_E?usp=sharing

DIRECTOR DE OBRA	ELABORO	APROBO
ING. DIEGO FERNANDEZ	ING. SANTIAGO FERNANDEZ RESIDENTEDE OBRA	ING. OSCAR SALAMANCA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

7202

fecha de elebaracion		MEMORIAS DE CANTIDADES	fecha de revision	
codigo de planta	706	direccion	Calle 73F SUR No. 80N-41	LOCALIDAD	07-BOSA

OBJETO: "ES EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ."


CONSTRUSOCIAL S.A.S	INTERVENTORIAAC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S	
ENTIDAD SECRETARIA DE EDUCACION	COLEGIO A INTERVENIR:	Sede A - Gran Colombiano

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
np56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SENALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN

CONSTRUSOCIAL

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	unidades instaladas	ANCHO			
toda la sede	135.00			1	135.00
				TOTAL	135.0000

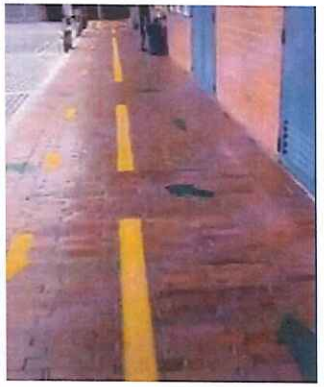

OBSERVACIONES: anexamos link con soporte de video de alta defenicion donde estan soportados por medio visual las cantidades en la presente memoria

https://drive.google.com/drive/folders/1MkZLB-MxZsfSdYskZ05qRSS9OYDEZf_E?usp=sharing

DIRECTOR DE OBRA	ELABORO	APROBO
ING. DIEGO FERNANDEZ	ING. SANTIAGO FERNANDEZ RESIDENTEDE OBRA	ING. OSCAR SALAMANCA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

fecha de elebaracion		MEMORIAS DE CANTIDADES	fecha de revision	
codigo de planta: 706	direccion: Calle 73F SUR No. 80N-41		LOCALIDAD	07-BOSA

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ."

CONSTRUSOCIAL S.A.S	INTERVENTORIAAC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
ENTIDAD SECRETARIA DE EDUCACION	COLEGIO A INTERVENIR: Sede A - Luis Carlos Galán Sarmiento

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN

CONSTRUSOCIAL

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	unidades instaladas	ANCHO			
toda la sede	2.00			1	2.00
				TOTAL	2.0000





OBSERVACIONES: anexamos link con soporte de video de alta defenicion donde estan soportados por medio visual las cantidades en la presente memoria

https://drive.google.com/drive/folders/1MkZLB-MxZsfSdYskZ05gRSS9OYDEZf_E?usp=sharing

DIRECTOR DE OBRA	ELABORO	APROBO
ING. DIEGO FERNANDEZ	ING. SANTIAGO FERNANDEZ RESIDENTEDE OBRA	ING. OSCAR SALAMANCA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

7204

fecha de elebaracion		MEMORIAS DE CANTIDADES	fecha de revision	
codigo de planta	706	direccion	Calle 73F SUR No. 80N-41	LOCALIDAD	07-BOSA

OBJETO: "ES EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ."

CONSTRUSOCIAL S.A.S	INTERVENTORIAAC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
ENTIDAD SECRETARIA DE EDUCACION	COLEGIO A INTERVENIR: Sede A - Gran Colombiano

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN

CONSTRUSOCIAL

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	unidades instaladas				
toda la sede	90.00			1	90.00
				TOTAL	90.0000









OBSERVACIONES: anexamos link con soporte de video de alta defenicion donde estan soportados por medio visual las cantidades en la presente memoria

https://drive.google.com/drive/folders/1MkZLB-MxZsfSdYskZ05qRSS9OYDEZf_E?usp=sharing

DIRECTOR DE OBRA	ELABORO	APROBO
ING. DIEGO FERNANDEZ	ING. SANTIAGO FERNANDEZ RESIDENTEDE OBRA	ING. OSCAR SALAMANCA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

fecha de elebaracion		MEMORIAS DE CANTIDADES			fecha de revision	
codigo de planta	706	direccion	Calle 73F SUR No. 80N-41		LOCALIDAD	07-BOSA
OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ."						
CONSTRUSOCIAL S.A.S			INTERVENTORIAAC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S			
ENTIDAD SECRETARIA DE EDUCACION			COLEGIO A INTERVENIR:	Sede A - Gran Colombiano		

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN

CONSTRUSOCIAL

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	unidades instaladas	ANCHO			
toda la sede	41.00			1	41.00
				TOTAL	41.0000









OBSERVACIONES: anexamos link con soporte de video de alta defenicion donde estan soportados por medio visual las cantidades en la presente memoria

https://drive.google.com/drive/folders/1MkZLB-MxZsfSdYskZ05qRSS9OYDEZf_E?usp=sharing

DIRECTOR DE OBRA	ELABORO	APROBO
ING. DIEGO FERNANDEZ	ING. SANTIAGO FERNANDEZ RESIDENTEDE OBRA	ING. OSCAR SALAMANCA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

fecha de elebaracion		MEMORIAS DE CANTIDADES	fecha de revision	
codigo de planta	706	direccion	Calle 73F SUR No. 80N-41	LOCALIDAD	07-BOSA

OBJETO: "ES EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ."

CONSTRUSOCIAL S.A.S	INTERVENTORIAAC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
ENTIDAD SECRETARIA DE EDUCACION	COLEGIO A INTERVENIR: Sede A - Gran Colombiano

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
np62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN

CONSTRUSOCIAL

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		ANCHO			
toda la sede	1.00			1	1.00
				TOTAL	1.0000



OBSERVACIONES: anexamos link con soporte de video de alta defenicion donde estan soportados por medio visual las cantidades en la presente memoria

https://drive.google.com/drive/folders/1MkZLB-MxZsfSdYskZ05gRSS9OYDEZf_E?usp=sharing

DIRECTOR DE OBRA	ELABORO	APROBO
ING. DIEGO FERNANDEZ	ING. SANTIAGO FERNANDEZ RESIDENTEDE OBRA	ING. OSCAR SALAMANCA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

7207

fecha de elebaracion		MEMORIAS DE CANTIDADES	fecha de revision	
codigo de planta	706	direccion: Calle 73F SUR No. 80N-41	LOCALIDAD	07-BOSA

OBJETO: "ES EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ."


CONSTRUSOCIAL S.A.S	INTERVENTORIAAC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
ENTIDAD SECRETARIA DE EDUCACION	COLEGIO A INTERVENIR: Sede A - Gran Colombiano

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
np63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN

CONSTRUSOCIAL

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		ANCHO			
toda la sede	17.00			1	17.00
				TOTAL	17.0000



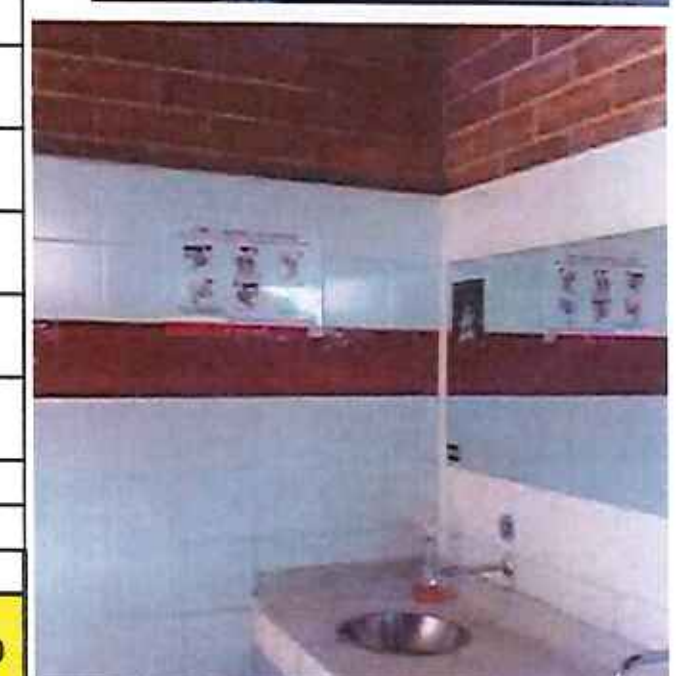


OBSERVACIONES: anexamos link con soporte de video de alta defenicion donde estan soportados por medio visual las cantidades en la presente memoria

https://drive.google.com/drive/folders/1MkZLB-MxZsfSdYskZ05gRSS9OYDEZf_E?usp=sharing

DIRECTOR DE OBRA	ELABORO	APROBO
ING. DIEGO FERNANDEZ	ING. SANTIAGO FERNANDEZ RESIDENTEDE OBRA	ING. OSCAR SALAMANCA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

7208

fecha de elebaracion		MEMORIAS DE CANTIDADES	fecha de revision	
codigo de planta	706	direccion: Calle 73F SUR No. 80N-41	LOCALIDAD	07-BOSA

OBJETO: "ES EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ."

CONSTRUSOCIAL S.A.S	INTERVENTORIAAC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
ENTIDAD SECRETARIA DE EDUCACION	COLEGIO A INTERVENIR: Sede A - Gran Colombiano

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
np64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SENALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN

CONSTRUSOCIAL

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		ANCHO			
toda la sede	132.00			1	132.00
				TOTAL	132.0000






OBSERVACIONES: anexamos link con soporte de video de alta defenicion donde estan soportados por medio visual las cantidades en la presente memoria

https://drive.google.com/drive/folders/1MkZLB-MxZsfSdYskZ05gRSS9OYDEZf_E?usp=sharing

DIRECTOR DE OBRA	ELABORO	APROBO
ING. DIEGO FERNANDEZ	ING. SANTIAGO FERNANDEZ RESIDENTEDE OBRA	ING. OSCAR SALAMANCA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Oficio AC2R-SED-76-2021 Ref. Facturación - Acta N° 11

4 mensajes

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 6 de abril de 2021, 14:54
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>
Cc: alefer55@gmail.com, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>

Buenas tardes,

se remite el oficio **AC2R-SED-76-2021** Ref.

- 0.AC2R-SEDSEÑA-76-2021.pdf
- 01. OFICIO CORTE DE OBRA No 11.pdf
- 02. FACTURA 1017 CORTE 11 SED.pdf
- 03. FURC 19.03.2021.xlsx
- 04. Actualización de Terceros Obra e Intervento...
- 05. CERTIFICACION BANCARIA CONSTRUSOCIAL S...
- 06. ACTA FINAL CORTE 11.xlsx
- 08. DOC Y CERTIFICACION REVISOR FISCAL.pdf
- 09. CERTIFICADO DE PARAFISCALES CONSTRUSOC...
- 10. RESOLUCION DE FACTURACION CONSTRUSOCI...
- 11. CEDULA GVC.pdf
- 12. RUT CONSTRUSOCIAL SAS.pdf
- 13. RIT ACTUALIZADO CONSTRUSOCIAL SAS.pdf
- 19. ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS OBRA.docx
- 20. CONSOLIDADO MEMORIAS CORTE 11 SEÑALIZA...

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

DOCUMENTOS PAGO A TERCEROS.pdf
2370K

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 6 de abril de 2021, 16:03
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>

Ingeniero Rosario buenas tardes de manera atenta informo que nuevamente las observaciones de forma se evidencian en el acta, por lo cual es muy importante podernos reunir en forma inmediata con su equipo de trabajo para poder subsanar eso de inmediato y poder remitir el acta hoy mismo a control y estadística.

De igual manera solicito adjuntar la información completa en el siguiente link.

corte no 11

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: martes, 6 de abril de 2021 14:54
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Cc: alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>
Asunto: Oficio AC2R-SED-76-2021 Ref. Facturación - Acta N° 11

[El texto citado está oculto]

7210

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 7 de abril de 2021, 0:49
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>
Cc: "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>

Ingeniero Rosario buenas dias

Teniendo en cuenta la importancia del tramite del acta parcial no 11, y en vista que no fue posible efectuar la reunión requerida por la SED, de verificación conjunta de la misma, y tan solo se recibió comunicación vía WhatsApp por parte de la interventoría indicado "*Buenas tardes Arq. Estaba revisando el correo enviado a senalizacionemergenciassed y ud dice que el acta presenta observaciones de forma, me puede indicar cuales son para poder subsanarlas*", se opto por volver a verificar el acta y a efectuar su diligenciamiento desde ceros teniendo en cuenta la multiplicidad de errores en formulación, modificación de los acumulados sin justificación, cambio de formato sin previa autorización, no diligenciamiento completo del acta y algunos errores graves de archivo, que persisten desde el acta no 10.

Por lo cual se anexa propuesta de acta con el fin que sea verificada en forma inmediata y devuelta junto a la totalidad de soportes antes de las 9:00 am.

Se requiere sean revisadas la memorias de señalética acorde al acta para que cuenten con la concordancia respectiva según modificaciones efectuadas.

De otra pare genera duda el capitulo final del acta **AJUSTES POR CANTIDADES SUPERIORES O INFERIORES DEL ACTA 10,.** en el entendido que dejaría alguno frentes de trabajo con cantidades en cero que obligaría en un corte parcial 12 a volver a sumar cantidades, por lo que se hace necesario se revise tal postura, resaltado que las cantidades negativas fueron incluida en las filas respectivas, donde la comparación hace genera la duda de la entidad, se resalto color rosado dichas cantidades.

Se resalto en color verde algunas de las memorias que deben ser verificadas y posiblemente modificadas y/o adicionadas.

Por lo anterior y acorde a la vivencia del acta parcial no 10 y a lo evidenciado en al acta parcial no 11 se hace necesario se efectúen los debidos controles de calidad por parte de los profesionales de interventoría, previo al envío del los documentos con el fin de evitar estos retazaos y reprocesos que ya habían sido inclusive notificados desde el pasado miércoles, haciendo caso omiso a los mismos,

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 6 de abril de 2021 16:03
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; **Residencias Emergencias** <admresidencias.emergencias@gmail.com>
Asunto: RE: Oficio AC2R-SED-76-2021 Ref. Facturación - Acta N° 11

[El texto citado está oculto]

6 adjuntos


Captura de Pantalla 2021-04-07 a la(s) 12.01.34 a. m..png
551K


Captura de Pantalla 2021-04-07 a la(s) 12.01.41 a. m..png
392K


Captura de Pantalla 2021-04-07 a la(s) 12.01.46 a. m..png
248K



Captura de Pantalla 2021-04-07 a la(s) 12.02.22 a. m..png
546K


Captura de Pantalla 2021-04-07 a la(s) 12.02.29 a. m..png
888K

ACTA No 11 CIVIL - 11 SENÞALETICA.xlsx
2685K

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 7 de abril de 2021, 10:22
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>
Cc: "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>

Ingenieros Rosario y Fernández , siendo las 10:12 am la secretaria de Educación veo con preocupación que no se ha dado respuesta al hilo del correo donde remitido el acta parcial no 11 del contrato de obra junto a los soportes, acta que tuvo que ser en la noche de ayer y madruga de hoy vuelta a elaborar por la Entidad por los sendos errores que presentaba,

Por lo cual parala Entidad se esperaba la respuesta asertiva por parte de la interventoría y contratista en la verificación inmediata del acta y la corrección y/o elaboración de las memorias paralas 9:00 más aun cuando estos errores desde la semana anterior habían sido ya socializados con el personal del constructor y se ofreció por todos los medios el

acompañamiento de la SED sin que es hubiese aceptado o requerido.

Quedó atento a la respuesta

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 7 de abril de 2021 0:49
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>; camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>
Cc: alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

segunda parte seguimiento programación señalización y señaletica

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 7 de abril de 2021, 11:54
Para: KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "residente01emergenciascol@gmail.com" <residente01emergenciascol@gmail.com>

Buenos dias acorde a la imposibilidad de haber celebrado la continuidad de la reunión el día 6 de abril como se propuso en al reunión del pasado 5 en la noche, se convoca de carácter obligatorio el día de hoy a la hora fijada para o con las actividades de programación.

Se deberá allegar las ubicaciones de los colegios en una PDF como se efectuó en la localidad de Kennedy, para poder apoyar en la programacion por cercanias

Cordail saludo

Reunión de Microsoft Teams

Únete desde tu equipo o aplicación móvil
Haz clic aquí para unirte a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,13319006# Colombia, Bogotá
Phone Conference ID: 133 190 06#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

---

invite.ics
5K

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: SEÑALIZACION EN EXTERIORES - COLEGIO NUEVO HORIZONTE

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 7 de abril de 2021, 15:54
Para: residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>

Buenas tardes ingeniero Rosario de manera atenta solicito respuesta inmediata al presente correo, informado tiene proyectado la fecha de terminación de este colegio teniendo en cuenta que el retorno está programado para el próximo martes.

Es importante recordar que se debe efectuar le 100 de colegio es decir la totalidad de las sedes.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: RUTH SORAYA TORRES CIENDUA <storres@educacionbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 7 de abril de 2021 15:38
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: SEÑALIZACION EN EXTERIORES - COLEGIO NUEVO HORIZONTE

Soraya Torres Ciendúa
Gestora Territorial DCCEE
Tel. 3014664383

De: SANDRA CRISTINA MOJICA DIAZ <sdmojica1@educacionbogota.edu.co>
Enviado: miércoles, 7 de abril de 2021 15:09
Para: RUTH SORAYA TORRES CIENDUA <storres@educacionbogota.gov.co>
Cc: SANDRA CONSTANZA MURCIA GONZALEZ <smurcia@educacionbogota.edu.co>
Asunto: SEÑALIZACION EN EXTERIORES - COLEGIO NUEVO HORIZONTE


Cordial Saludo,

Soraya,

De acuerdo al WhatsApp enviado el día de ayer, por este medio informo lo sucedido con la señalización de exteriores realizadas en las sedes.

En la sede A, se presentó el contratista los días 09,18 y 21 de marzo, dejo instalada la pintura de color negro y dijeron que volvían a terminar, pero no se han presentado de nuevo.



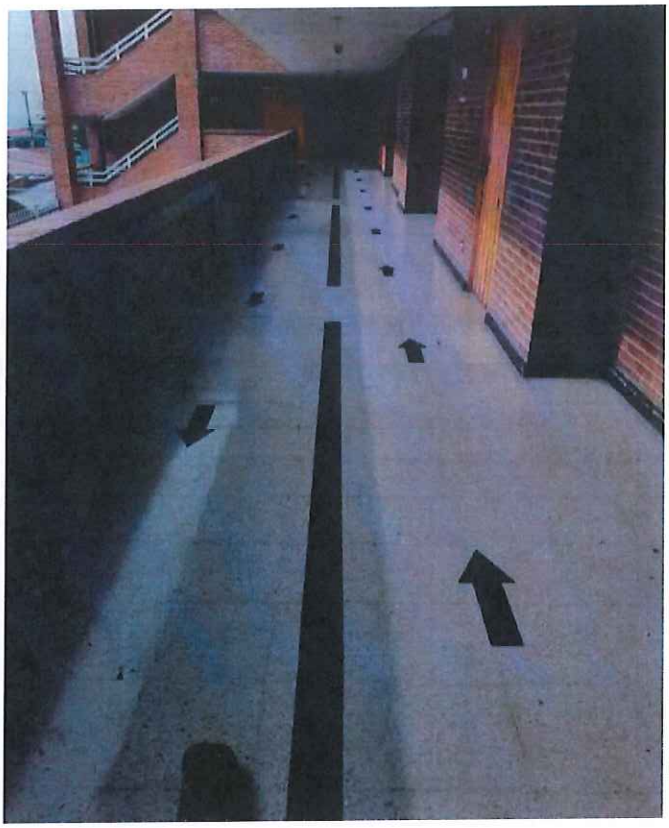

En las sedes b y c, el contratista se presentó los días 25 y 26 de marzo de 2021, pero la pintura instalada se está levantando y en las escaleras de la sede c la pintura no se ve con las mismas dimensiones.



2215







En la sede D, les faltaron áreas por señalizar









Solicitamos por favor nos indiquen las fechas en las que el contratista se presentara a las sedes para terminar y repasar la pintura que se levantó.

De antemano, gracias por tu colaboración con este trámite.

Sandra Cristina Mojica Díaz
Almacenista
COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED
Carrera 5B No. 189 B - 30
Teléfonos: 6745236 - 3002068350
E-mail: sdmojica1@educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

729

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

videos memorias - Invitación para colaborar

1 mensaje

residente01 emergencias (vía Google Drive) <residente01emergenciascol@gmail.com>
Responder a: residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>
Para: senalizacionemergenciassed@gmail.com

8 de abril de 2021, 10:32

residente01emergenciascol@gmail.com te ha invitado a **colaborar en** la siguiente carpeta compartida:

videos memorias

Abrir

Google Drive: Ten todos tus archivos a mano desde cualquier dispositivo.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google™

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Invitación: INDUCCIÓN SST Y AMBIENTAL vie 9 de abr de 2021 9:30am - 10:30am (COT) (senalizacionemergenciassed@gmail.com)

1 mensaje

ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com> 9 de abril de 2021, 9:24
Responder a: ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com
Para: senalizacionemergenciassed@gmail.com, ac2ringenieria@gmail.com

Tienes una invitación para el siguiente evento.

INDUCCIÓN SST Y AMBIENTAL

Cuándo	vie 9 de abr de 2021 9:30am – 10:30am Hora estándar de Colombia	**más detalles »**
Información para unirse	Unirse con Google Meet meet.google.com/jnz-wbgh-ctb	
Calendario	senalizacionemergenciassed@gmail.com	
Quién	• ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com- organizador • ac2ringenieria@gmail.com • senalizacionemergenciassed@gmail.com	

¿Asistirás (senalizacionemergenciassed@gmail.com)? **Sí** - **Quizás** - **No** Más opciones »

Invitación de Google Calendar

Has recibido este correo electrónico en la dirección senalizacionemergenciassed@gmail.com de la cuenta porque estás suscrito para recibir invitaciones del calendario senalizacionemergenciassed@gmail.com.

Si ya no quieres recibir estos correos, inicia sesión en https://calendar.google.com/calendar/ y cambia la configuración de las notificaciones para este calendario.

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, o invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información.

invite.ics
2K

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Requerimiento Formal plan de contingencia en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 9 de abril de 2021, 17:30
Para: "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>

Buen día,

De acuerdo a compromisos programados con el contratista de obra e interventoría respecto a la señalización realizada y faltante por realizar en las instituciones del distrito, me permito adjuntar información para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atento a cometarios.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez

Profesional Especializado

Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149

Fax: 315 34 48

www.educacionbogota.edu.co

Información: Línea 195

2 adjuntos

- **S-2021-126165 Comunicacion Contratista Interventoria para Socualizacion Programacion RJ F.pdf** 8998K
- **S-2021-126175 Comunicacion Contratista Obra para Socualizacion Programacion RJ F (2).pdf** 8997K

722

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº **S-2021-126165**
Fecha: 09-04-2021 - 17:08
Folios: 10 Anexos:
Radicador: EDWIN ALEXANDER SANTANA - 4300
Destino: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: A5R5V

Bogotá D.C, abril de 2021.

Ingeniero
CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
Representante Legal
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Kra 71ª No. 52ª-17 Barrio Normandía
PBX: 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com

Señores
CONSTRUSOCIAL S.A.S.
Atn. Ing. Germán Villanueva
Representante Legal
E-mail: villanauta@yahoo.com alefer55@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: Requerimiento Formal plan de contingencia en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Respetados Ingenieros Rosario y Villanueva.

En atención a los compromisos adquiridos por parte de la empresa constructora en los comités técnicos celebrados los pasados lunes 5 y miércoles 7 de abril, donde se presento la propuesta de programación de intervención por localidad, para lograr la terminación del contrato dentro del plazo contractual del día 30 de abril de 2021, de manera atenta solicito se adelanten las gestiones, técnicas, administrativas y financieras a que haya a lugar para el correcto desarrollo del plan de contingencia, dentro de las fechas establecidas para cada uno de los colegios (incluye la totalidad de las sedes propias o en arriendo).

Es preciso indicar que, basado en el cronograma conciliado el día de 7 de abril, el día 8 de los corrientes, la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, socializó con las diferentes áreas de la Entidad encargadas de seguimiento y control de el Retorno Gradual Progresivo y Seguro de las Instituciones Educativas, siendo necesario efectuar unas modificaciones a las fechas de terminación de unos frentes de trabajo, que tienen programado su retorno en la **semana del 13 abril de 2021**, razón por la cual este cronograma deberá ser cumplido de forma rigurosa.

Por lo anterior es importante para la Entidad contar con todo el seguimiento técnico por parte de los equipos tanto Constructor, como Interventor, que permitan el éxito de desarrollo del contrato.

7123

Comparto las fechas por cada localidad que fueron presentadas a los equipos de trabajo de la SED, dando origen a la necesidad de nuevas fechas de terminación de frentes, por lo que nuevamente reitero la necesidad que se formule por parte del Interventor y Constructor en forma inmediata un plan de contingencia, que permita culminar el alcance del contrato en la fecha de terminación prevista, que corresponde al **30 de abril de 2021**, lo cual seguramente demandará ampliar el número de cuadrillas que efectúen las actividades de Señalización y Señalética en simultánea en las diferentes localidades.

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)	ANTONIO NARIÑO	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONT	ANTONIO NARIÑO	OK		terminado
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	ANTONIO NARIÑO	OK	martes, 6 de abril de 2021	terminado
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	ANTONIO NARIÑO	SIN INICIAR	miércoles, 7 de abril de 2021	12-abr
COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL (IED)	ANTONIO NARIÑO	SIN INICIAR	martes, 6 de abril de 2021	12-abr

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED)	BARRIOS UNIDOS	OK		
COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)	CHAPINERO	OK		
COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	CHAPINERO	OK		
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)	CHAPINERO	OK	martes, 6 de abril de 2021	sede c pendiente señalizacion

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)	FONTIBON	OK		
COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED)	FONTIBON	OK		
COLEGIO PABLO NERUDA (IED)	FONTIBON	OK		
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)	FONTIBON	OK		
COLEGIO LA FELICIDAD	FONTIBON	OK		
COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO ATAHUALPA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	
COLEGIO COSTA RICA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)	FONTIBON			sábado, 17 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	LA CANDELARIA	OK		
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED)	LA CANDELARIA	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	

224

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO TECNICO MENORAH (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MARTIRES	OK		

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO BUENAVISTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	
COLEGIO SOTAVENTO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)	CIUDAD BOLIVAR	ok		terminado
COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO CANADA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL PASQUILLA IED	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	
COLEGIO EL ENSUEÑO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	administracion		
COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	
COLEGIO ACACIA II (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	
COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	martes, 13 de abril de 2021
COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 27 de abril de 2021	domingo, 18 de abril de 2021
COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	martes, 13 de abril de 2021
COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO FANNY MIKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO LA ARABIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok		terminado
COLEGIO LA JOYA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	domingo, 18 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO LEON DE GREIFF (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok		
COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	domingo, 18 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO SANTA BARBARA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	domingo, 18 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO VILLAMAR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok	jueves, 8 de abril de 2021	
COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED)	CIUDAD BOLIVAR			

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

7225

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO JORGE ISAACS (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO ARGELIA (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO DE LA BICI (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO LA ESPERANZA (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO SAN IGNACIO (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO GRAN COLOMBIANO	BOSA	OK		
COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	BOSA	OK		
COLEGIOS PARQUES DE BOGOTA (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO LAUREL DE CERA IED	BOSA	OK		
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO BOSANOVA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO EL PORVENIR (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)	BOSA	ok		
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO MOTORISTA (CED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)	BOSA	ok		
COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)	BOSA	ok		
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO LA MERCED (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	PUENTE ARANDA	OK		terminado
COLEGIO ESPAÑA (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO EL JAZMIN (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)	PUENTE ARANDA	ok	martes, 6 de abril de 2021	terminado
COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	El rector solic
COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	**jueves, 15 de abril de 2021**
COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO SORRENTO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	**en fecha**

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO MORISCO (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	ENGATIVA	ok		
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO BOLIVIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO CHARRY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO GARCES NAVAS (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEI	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	domingo, 11 de abril de 2021	
COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	sede a ok sede b en obra
COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	ok		
COLEGIO VILLA AMALIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO LA GIRALDA (IED)	SANTAFE	OK		
COLEGIO LOS PINOS (IED)	SANTAFE	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	falta la sede c
COLEGIO EL VERJON (IED)	SANTAFE	OK		
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO ANTONIO BARAYA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO SANTA LUCIA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO PALERMO SUR (CED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO JOSE MARTI (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO LA PAZ (CED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO MARIA CANO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)	SUBA	OK		
COLEGIO BILBAO (IED)	SUBA	OK		
COLEGIO HUNZA (IED)	SUBA	OK		
COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	SUBA	OK		terminado
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	
COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	sábado, 24 de abril de 2021
COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO LA GAITANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	martes, 20 de abril de 2021
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO VILLA ELISA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	martes, 20 de abril de 2021
COLEGIO VISTA BELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCAUDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO MONTEBELLO (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		terminado
COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO MANUELITA SAENZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JUAN REY (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO NUEVA DELHI (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO EL MANANTIAL (CED)	SAN CRISTOBAL	ok	martes, 6 de abril de 2021	
COLEGIO SAN VICENTE (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO TECNICO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)	SAN CRISTOBAL	OK		terminado
COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO ATENAS (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO GRAN COLOMBIA (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO AGUAS CLARAS (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO LOS ALPES (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		terminado
COLEGIO EL RODEO (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO LA VICTORIA (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		terminado
COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO NUEVA ROMA (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)	SAN CRISTOBAL		sábado, 10 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCAUDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	OK		TERMINADO
COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)	TEUSAQUILLO	OK	domingo, 11 de abril de 2021	en fecha

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCAUDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED)	TUNJUELITO	ok	jueves, 8 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	domingo, 11 de abril de 2021	
COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED)	TUNJUELITO	OK		TERMINADO
COLEGIO SAN CARLOS (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO VENECIA (IED)	TUNJUELITO	OK		

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO BELLAVISTA (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERO (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO LAS MARGARITAS (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED)	KENNEDY	OK		terminado
COLEGIO CASTILLA (IED)	KENNEDY	OK		terminado
COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO ALQUERÍA LA FRAGUA	KENNEDY	OK		
COLEGIO LA CHUCUA (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO LA AMISTAD (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO NELSON MANDELA	KENNEDY	OK		
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO CLASS (IED)	KENNEDY	OK		terminado
COLEGIO CODEMA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO EL JAPON (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	viernes, 16 de abril de 2021
COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO ISABEL II (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO JACKELINE (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO LOS PERIODISTAS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	KENNEDY	OJO	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO MARSELLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO O.E.A. (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO PAULO VI (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO TOM ADAMS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO VILLA RICA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED)	KENNEDY			
COLEGIO DARIO ECHANDIA (IED)	KENNEDY		lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO SAN JOSE (IED)	KENNEDY		lunes, 12 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	USAQUEN	OK		
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	
COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	martes, 6 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)	USAQUEN	OK	viernes, 6 de enero de 1900	
COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	USAQUEN	OK		
COLEGIO TOBERIN (IED)	USAQUEN	OK	martes, 6 de abril de 2021	
COLEGIO AQUILEO PARRA (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	jueves, 8 de abril de 2021	
COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO USAQUEN (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	domingo, 11 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	jueves, 8 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	domingo, 11 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO MIRAVALLE (IED)	USME	OK		
COLEGIO USMINIA (IED)	USME	OK		
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)	USME	OK		
COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA (IED)	USME	OK		
COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)	USME	OK		
COLEGIO BRASILIA - USME (IED)	USME	OK		
COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED)	USME	OK		
COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)	USME	OK		
COLEGIO BRAZUELOS (IED)	USME	OK		
COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)	USME	OK		
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	OK		
COLEGIO RURAL EL HATO (CED)	USME	OK		
COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED)	USME	OK		
COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES (CED)	USME	OK		
COLEGIO RURAL OLARTE (CED)	USME	OK		
COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)	USME	OK		
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	OK		
COLEGIO LA AURORA (IED)	USME	SIN INICIAR	en ejecucion	
COLEGIO RURAL CHIZACA (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LAS MERCEDES (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO SAN CAYETANO (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO ATABANZHA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO CHUNIZA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO EL DESTINO (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO EL UVAL (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO GRAN YOMASA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO LOS TEJARES (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LOS ANDES (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO SANTA MARTHA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)	USME			

Finalmente, es perentorio recordar que la programación producto del plan de contingencia requerido sea debidamente planteada de manera semanal, donde se determine el universo en el cual se desarrollarán las actividades durante cada semana, ello permitirá el correcto seguimiento de las actividades y reporte a la SED, así como mayor efectividad en los trámites de ingreso con las Direcciones Locales de Educación y Rectores de los Colegios, máxime si tenemos en cuenta que la estrategia de apertura de localidades no ha permitido tener el seguimiento adecuado.

7231

En los anteriores términos, planteamos los requerimientos inherentes a la oportunidad del plan de contingencia; y quedamos a la espera de las gestiones y pronunciamiento correspondiente.

Cordialmente,

Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Revisó: Abg. Nohora He. Pinzón Álzate – Líder Jurídica DCCEE
Proyectó: Arq. Edwin Santana Rodríguez, Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº **S-2021-126175**
Fecha: 09-04-2021 - 17:19
Folios: 10 Anexos:
Radicador: EDWIN ALEXANDER SANTANA - 4300
Destino: CONSTRUSOCIAL SAS

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: WL50P

Bogotá D.C, abril de 2021.

Ingeniero
CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
Representante Legal
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Kra 71ª No. 52ª-17 Barrio Normandía
PBX: 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com

Señores
CONSTRUSOCIAL S.A.S.
Atn. Ing. Germán Villanueva
Representante Legal
E-mail: villanauta@yahoo.com alefer55@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: Requerimiento Formal plan de contingencia en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Respetados Ingenieros Rosario y Villanueva.

En atención a los compromisos adquiridos por parte de la empresa constructora en los comités técnicos celebrados los pasados lunes 5 y miércoles 7 de abril, donde se presento la propuesta de programación de intervención por localidad, para lograr la terminación del contrato dentro del plazo contractual del día 30 de abril de 2021, de manera atenta solicito se adelanten las gestiones, técnicas, administrativas y financieras a que haya a lugar para el correcto desarrollo del plan de contingencia, dentro de las fechas establecidas para cada uno de los colegios (incluye la totalidad de las sedes propias o en arriendo).

Es preciso indicar que, basado en el cronograma conciliado el día de 7 de abril, el día 8 de los corrientes, la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, socializó con las diferentes áreas de la Entidad encargadas de seguimiento y control de el Retorno Gradual Progresivo y Seguro de las Instituciones Educativas, siendo necesario efectuar unas modificaciones a las fechas de terminación de unos frentes de trabajo, que tienen programado su retorno en la **semana del 13 abril de 2021**, razón por la cual este cronograma deberá ser cumplido de forma rigurosa.

Por lo anterior es importante para la Entidad contar con todo el seguimiento técnico por parte de los equipos tanto Constructor, como Interventor, que permitan el éxito de desarrollo del contrato.

7233

Comparto las fechas por cada localidad que fueron presentadas a los equipos de trabajo de la SED, dando origen a la necesidad de nuevas fechas de terminación de frentes, por lo que nuevamente reitero la necesidad que se formule por parte del Interventor y Constructor en forma inmediata un plan de contingencia, que permita culminar el alcance del contrato en la fecha de terminación prevista, que corresponde al **30 de abril de 2021**, lo cual seguramente demandará ampliar el número de cuadrillas que efectúen las actividades de Señalización y Señalética en simultánea en las diferentes localidades.

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)	ANTONIO NARIÑO	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONT	ANTONIO NARIÑO	OK		terminado
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	ANTONIO NARIÑO	OK	martes, 6 de abril de 2021	terminado
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	ANTONIO NARIÑO	SIN INICIAR	miércoles, 7 de abril de 2021	12-abr
COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL (IED)	ANTONIO NARIÑO	SIN INICIAR	martes, 6 de abril de 2021	12-abr

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED)	BARRIOS UNIDOS	OK		
COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)	CHAPINERO	OK		
COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	CHAPINERO	OK		
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)	CHAPINERO	OK	martes, 6 de abril de 2021	sede c pendiente señalizacion

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)	FONTIBON	OK		
COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED)	FONTIBON	OK		
COLEGIO PABLO NERUDA (IED)	FONTIBON	OK		
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)	FONTIBON	OK		
COLEGIO LA FELICIDAD	FONTIBON	OK		
COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO ATAHUALPA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	
COLEGIO COSTA RICA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)	FONTIBON			sábado, 17 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	LA CANDELARIA	OK		
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED)	LA CANDELARIA	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	

7237

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO TECNICO MENORAH (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED)	LOS MARTIRES	OK		
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MARTIRES	OK		

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO BUENAVISTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	
COLEGIO SOTAVENTO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)	CIUDAD BOLIVAR	ok		terminado
COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO CANADA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	OK		
COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL PASQUILLA IED	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	
COLEGIO EL ENSUEÑO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	administracion		
COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	
COLEGIO ACACIA II (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	
COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	martes, 13 de abril de 2021
COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 27 de abril de 2021	domingo, 18 de abril de 2021
COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	martes, 13 de abril de 2021
COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO FANNY MIKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO LA ARABIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok		terminado
COLEGIO LA JOYA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	domingo, 18 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO LEON DE GREIFF (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok		
COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	domingo, 18 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO SANTA BARBARA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	domingo, 18 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO VILLAMAR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok	jueves, 8 de abril de 2021	
COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED)	CIUDAD BOLIVAR			

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

9235

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO JORGE ISAACS (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO ARGELIA (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO DE LA BICI (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO LA ESPERANZA (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO SAN IGNACIO (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO GRAN COLOMBIANO	BOSA	OK		
COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	BOSA	OK		
COLEGIOS PARQUES DE BOGOTA (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO LAUREL DE CERA IED	BOSA	OK		
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO BOSANOVA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)	BOSA	OK		
COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO EL PORVENIR (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)	BOSA	ok		
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO MOTORISTA (CED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)	BOSA	ok		
COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)	BOSA	ok		
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO LA MERCED (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	PUENTE ARANDA	OK		terminado
COLEGIO ESPAÑA (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO EL JAZMIN (IED)	PUENTE ARANDA	OK		
COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)	PUENTE ARANDA	ok	martes, 6 de abril de 2021	terminado
COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	El rector solic
COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	**jueves, 15 de abril de 2021**
COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO SORRENTO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	**en fecha**

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

726

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO MORISCO (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED)	ENGATIVA	OK		
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	ENGATIVA	ok		
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	
COLEGIO BOLIVIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO CHARRY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO GARCES NAVAS (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEI	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	domingo, 11 de abril de 2021	
COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	sede a ok sede b en obra
COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	ok		
COLEGIO VILLA AMALIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO LA GIRALDA (IED)	SANTAFE	OK		
COLEGIO LOS PINOS (IED)	SANTAFE	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	falta la sede c
COLEGIO EL VERJON (IED)	SANTAFE	OK		
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO ANTONIO BARAYA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO SANTA LUCIA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO PALERMO SUR (CED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO JOSE MARTI (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO LA PAZ (CED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO MARIA CANO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	OK		

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)	SUBA	OK		
COLEGIO BILBAO (IED)	SUBA	OK		
COLEGIO HUNZA (IED)	SUBA	OK		
COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	SUBA	OK		terminado
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	
COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	sábado, 24 de abril de 2021
COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO LA GAITANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	martes, 20 de abril de 2021
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO VILLA ELISA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	martes, 20 de abril de 2021
COLEGIO VISTA BELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

7238

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO MONTEBELLO (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		terminado
COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO MANUELITA SAENZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JUAN REY (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO NUEVA DELHI (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO EL MANANTIAL (CED)	SAN CRISTOBAL	ok	martes, 6 de abril de 2021	
COLEGIO SAN VICENTE (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO TECNICO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)	SAN CRISTOBAL	OK		terminado
COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO ATENAS (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO GRAN COLOMBIA (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO AGUAS CLARAS (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO LOS ALPES (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		terminado
COLEGIO EL RODEO (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO LA VICTORIA (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		terminado
COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO NUEVA ROMA (IED)	SAN CRISTOBAL	OK		
COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)	SAN CRISTOBAL		sábado, 10 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	OK		TERMINADO
COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)	TEUSAQUILLO	OK	domingo, 11 de abril de 2021	**en fecha**

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contuingencia semana
COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED)	TUNJUELITO	ok	jueves, 8 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	domingo, 11 de abril de 2021	
COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED)	TUNJUELITO	OK		**TERMINADO**
COLEGIO SAN CARLOS (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO VENECIA (IED)	TUNJUELITO	OK		

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO BELLAVISTA (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERO (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO LAS MARGARITAS (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED)	KENNEDY	OK		terminado
COLEGIO CASTILLA (IED)	KENNEDY	OK		terminado
COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO ALQUERÍA LA FRAGUA	KENNEDY	OK		
COLEGIO LA CHUCUA (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO LA AMISTAD (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO NELSON MANDELA	KENNEDY	OK		
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO CLASS (IED)	KENNEDY	OK		terminado
COLEGIO CODEMA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO EL JAPON (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	viernes, 16 de abril de 2021
COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO ISABEL II (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO JACKELINE (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO LOS PERIODISTAS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	KENNEDY	OJO	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO MARSELLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO O.E.A. (IED)	KENNEDY	OK		
COLEGIO PAULO VI (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO TOM ADAMS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO VILLA RICA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED)	KENNEDY			
COLEGIO DARIO ECHANDIA (IED)	KENNEDY		lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO SAN JOSE (IED)	KENNEDY		lunes, 12 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	USAQUEN	OK		
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	
COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	martes, 6 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)	USAQUEN	OK	viernes, 6 de enero de 1900	
COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	USAQUEN	OK		
COLEGIO TOBERIN (IED)	USAQUEN	OK	martes, 6 de abril de 2021	
COLEGIO AQUILEO PARRA (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	jueves, 8 de abril de 2021	
COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO USAQUEN (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	domingo, 11 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	jueves, 8 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	domingo, 11 de abril de 2021	en fecha
COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	

7240

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	plan de contingencia semana
COLEGIO MIRAVALLE (IED)	USME	OK		
COLEGIO USMINIA (IED)	USME	OK		
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)	USME	OK		
COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA (IED)	USME	OK		
COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)	USME	OK		
COLEGIO BRASILIA - USME (IED)	USME	OK		
COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED)	USME	OK		
COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)	USME	OK		
COLEGIO BRAZUELOS (IED)	USME	OK		
COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)	USME	OK		
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	OK		
COLEGIO RURAL EL HATO (CED)	USME	OK		
COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED)	USME	OK		
COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES (CED)	USME	OK		
COLEGIO RURAL OLARTE (CED)	USME	OK		
COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)	USME	OK		
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	OK		
COLEGIO LA AURORA (IED)	USME	SIN INICIAR	en ejecucion	
COLEGIO RURAL CHIZACA (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LAS MERCEDES (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO SAN CAYETANO (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO ATABANZHA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO CHUNIZA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO EL DESTINO (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO EL UVAL (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO GRAN YOMASA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO LOS TEJARES (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LOS ANDES (CED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO SANTA MARTHA (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	
COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)	USME			

Finalmente, es perentorio recordar que la programación producto del plan de contingencia requerido sea debidamente planteada de manera semanal, donde se determine el universo en el cual se desarrollarán las actividades durante cada semana, ello permitirá el correcto seguimiento de las actividades y reporte a la SED, así como mayor efectividad en los trámites de ingreso con las Direcciones Locales de Educación y Rectores de los Colegios, máxime si tenemos en cuenta que la estrategia de apertura de localidades no ha permitido tener el seguimiento adecuado.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En los anteriores términos, planteamos los requerimientos inherentes a la oportunidad del plan de contingencia; y quedamos a la espera de las gestiones y pronunciamiento correspondiente.

Cordialmente,

Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Revisó: Abg. Nohora He. Pinzón Álzate – Líder Jurídica DCCEE
Proyectó: Arq. Edwin Santana Rodríguez, Profesional Especializado

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

7282

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

SEGUIMIENTO AVANCES DE SEÑALIZACION Y SEÑALETICA

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 9 de abril de 2021, 21:23
Para: KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>

Estimados ingenieros Rosario Y Fernandez

De manera atenta, me permito solicitarles se ordene a los miembros de los equipos de obra e interventoria, asistir a la reunion, con el fin de verificar el avance de actividades programadas para esta semana y asi mismo las que fueron programadas para las demas fechas.

Es prioritario recordar que esta programación fue compartida con los directivos de la SED como guia para grantizar el retorno de los estudiantes, de tal manera que el seguimiento debe alimentarse con información precisa, por lo que se solicita el contratista tenga lista la información para actualización.

Reunión de Microsoft Teams

Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,520769696# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 520 769 696#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

---

invite.ics
5K

9243

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Seguimiento avances colegios priotarios semana del 12 al 16 de abril del 2021

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 9 de abril de 2021, 21:27
Para: "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Estimados ingenieros Rosario Y Fernanadez

De manera atenta, me permito solicitarles se ordene a los miembros de los equipos de obra e interventoria, asistir a la reunion, con el fin de verificar el avance de actividades programadas para esta semana en los colegios priotarios y de esta manera garantizar el retorno a la presencialidad en las instituciones.

Reunión de Microsoft Teams

Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,402981801# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 402 981 801#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

---

invite.ics
5K

1224

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Seguimiento avances colegios priotarios semana del 12 al 16 de abril del 2021

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 9 de abril de 2021, 21:27
Para: "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Estimados ingenieros Rosario Y Fernanadez

De manera atenta, me permito solicitarles se ordene a los miembros de los equipos de obra e interventoria, asistir a la reunion, con el fin de verificar el avance de actividades programadas para esta semana en los colegios priotarios y de esta manera garantizar el retorno a la presencialidad en las instituciones.

Reunión de Microsoft Teams

Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,402981801# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 402 981 801#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

---

invite.ics
5K

7245

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Fwd: CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS OK

1 mensaje

nerio jesus ramirez vasquez <cheopezz@gmail.com> 10 de abril de 2021, 9:22
Para: senalizacionemergenciassed@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Ana Maria Corchuelo** <anamaria0930@outlook.com>
Date: vie, 9 de abr. de 2021 a la(s) 20:46
Subject: RV: CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS OK
To: ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, nerio jesus ramirez vasquez <cheopezz@gmail.com>, alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>, JESSICATAVERA98@gmail.com <JESSICATAVERA98@gmail.com>, Arq. Edwin Santana <esantana@educacionbogota.gov.co>

Ana Maria Corchuelo ha compartido archivos de OneDrive con usted. Para verlos, haga clic en los vínculos siguientes.

CONSOLIDADO SEÑALIZACION 11.pdf MEMORIAS ACTA 11 PDF ITEMS COMPLETOS OBRA CIVIL.pdf PDF ACTA 11 OBRA CIVIL CONTRACTUALES Y NP.pdf

Buen dia.
Anexo envío oficio No OFICIO No SED-CONS-2020 con los siguientes documentos que corresponden a la factura del corte No 11 del contrato No CO1.PCCNTR.1436286 DE 2020 cuyo Objeto es "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES":

1. Factura proforma FE 1017
2. **Formato de información de pagos a contratista FURC.**
3. **Formato de actualización de datos de terceros.**
4. **Acta parcial No 11.**
5. **Memorias de Calculo.**
6. **Acta para autorizar pagos obra**

Quedo atenta, gracias.

Ana Maria Corchuelo
Tel. 3208208361

Enviado desde mi Huawei

7 adjuntos

- **19. ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS OBRA.docx** 139K
- **ACTA No 11 CIVIL - 11 SENÞALETICA.xlsx** 2692K
- **Actualización de Terceros Obra e Interventoria 2021.xlsx** 145K
- **DOCUMENTOS CONSTRUSOCIAL.pdf** 1687K
- **FACTURA 1017 CORTE 11 OK.pdf** 64K
- **FURC 19.03.2021.xlsx** 503K
- **OFICIO CORTE DE OBRA No 11.pdf** 156K

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Remisión de Oficio AC2R-SEDSEÑA-79-2021

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 10 de abril de 2021, 11:35
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "ac2ringeniera@gmail.com" <ac2ringeniera@gmail.com>

Estimado ingeniero Rosario.

Como se indico en la reunión efectuada presencialmente en el colegio Rodolfo LLinaz, el usados del odómetro o cintra métrica a ser artefactos de medición de características comerciales pueden ser utilizados, lo importante como se manifestó ese día al equipo técnico, es que se pueda tener los mecanismo de control respectivos, por parte del personal que hace uso de los mismos así como la forma de registro, que permitan en cualquier momento adelantar una verificación.

Adicionalmente acorde a la reunión del pasado miércoles 7 de abril, para el registro en video podría ser esta herramienta de medición una buena forma de registro que garantizar la tranquilidad en el valor de esta actividad.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 12:22
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Remisión de Oficio AC2R-SEDSEÑA-79-2021

[El texto citado está oculto]

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

DOCUMENTACION ACTA 11 CONTRATISTA

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 10 de abril de 2021, 12:02
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>

Buenos días acuso recibo del correo, no obstante como se manifestó en correos previos al no poder subir la información como adjunto al correo se hace necesario subir la información de inmediato al siguiente link

obra

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: sábado, 10 de abril de 2021 11:58
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Cc: alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>; residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>; Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>
Asunto: DOCUMENTACION ACTA 11 CONTRATISTA

[El texto citado está oculto]

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

72AB

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

DOCUMENTACION ACTA 11

5 mensajes

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 10 de abril de 2021, 12:02
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo.

- 0. AC2R-SEDSEÑA-90-2021 ACTA 19 Y 20.pdf
- 1. FORMA DE PAGO.pdf
- 2. FACTURA ELECTRONICA N°55.pdf
- 3. ACTAS 21 DE INTERVENTORIA.pdf
- 4. FACTURA ELECTRONICA N°56.pdf
- 5. ACTAS 22 DE INTERVENTORIA.pdf
- 6. ACTAS 21 y 22 DE INTERVENTORIA REVISADAS V...
- 7 RUT AC2R.pdf
- 8. RIT AC2R.pdf
- 9. Resolucion factura electronica AC2R.pdf
- 10. DOCUMENTOS YOFANA GALINDO (2).pdf
- 12. PLANILLA MARZO AC2R.pdf
- 13. CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES A...
- 14. CERTIFICACION BANCARIA AC2R 30-12-2020 (1)....
- 15. pago a contratistas.PDF
- 16. ACTA 21 FURC 2020 AC2R - Mensual Fijo.pdf
- 16. ACTA 21 FURC 2020 AC2R - Mensual Fijo.xlsx
- 17. ACTA 22 FURC 2020 AC2R - Avance de Obra.pdf
- 17. ACTA 22 FURC 2020 AC2R - Avance de Obra.xlsx
- ACTA No 11 CIVIL - 11 SENÞALETICA (2).xlsx
- CONSOLIDADO SEÑALIZACION 11.pdf

Envío adjunto la documentación correspondiente al corte 11.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 10 de abril de 2021, 12:17
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Acuso recibo del correo nuevamente solicitó subir la información al drive de la SED

interventoria

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: sábado, 10 de abril de 2021 12:02
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: DOCUMENTACION ACTA 11

720

[El texto citado está oculto]

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

---

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 10 de abril de 2021, 12:26
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo,

ya se encuentran subidos al DRIVE.

[El texto citado está oculto]

--

[El texto citado está oculto]

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 10 de abril de 2021, 12:47
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>

Buenas tardes por favor revisar la información ya que al parecer nuevamente presenta errores, el acta subida al drive no corresponde al acta envía ayer de características informativa para verificación, por parte de la interventoría.

Por lo cual muy respetuosamente solicito se certifique esta información y se responda al presente correo

En el caso eventual que mi interpretación sea correcto se deberá remitir nuevamente la información, y se debra subir completa en el siguiente LINK

corregida 11

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: sábado, 10 de abril de 2021 12:26
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Re: DOCUMENTACION ACTA 11

[El texto citado está oculto]

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 10 de abril de 2021, 12:52
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>

La información se cargó nuevamente a la carpeta solicitada,relacionada a continuación:
