CONSTRUSOCIAL S.A.S.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTA N° 12

SESIÓN: 14 de MAYO del 2021.

LUGAR: Vía virtual, plataforma Zoom

HORA: 10:00 pm a 10:30 pm.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista
2. verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Seguimiento de pendientes.
5. Informe de accidentabilidad.
6. Seguimiento y Mejoras del COPASST.
7. Compromisos y responsables.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Siendo las **10:00** horas del día 14 de MAYO del 2021.por medio de la plataforma zoom, se da inicio a la reunión N°**12** del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, con la asistencia de las siguientes personas:

COMITÉ	INVITADOS
1. Jesús Ramírez	
2. Ana María Córchelo	
3. Brandon Cuan	
4. Santiago Fernández	

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se cuenta con el quórum para deliberar en esta reunión. (Todos los integrantes).

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

✓ Se realiza lectura del acta N° 11 del COPASST, para recordar actividadespendientes y retomar compromisos.

4. SEGUIMIENTO A PENDIENTES:

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	OBSERVACIONES
1	Reportar oportunamente las condiciones Inseguras.	(Coordinador SST – Miembros del COPASST).	MAYO 2021		No se reportaron condiciones inseguras en el corte.
2	Mantener Políticas, procedimientos, instructivos de trabajo, reglamentos y formatos en sitio.	(Coordinador SG).	MAYO 2021		Las políticas se mantienen publicadas en la oficina de CONSTRUSOCIAL SAS ubicada en la siguiente dirección: Transversal 22ª No 53c – 49 Barrio San Luis.
3	Desarrollar actividades relacionadas con los programas de seguridad y salud en el trabajo, campañas y sensibilizaciones relacionadas.	Coordinador SST Coordinador SG	MAYO 2021		
4	Solicitud, entrega y uso de adecuado de EPI	Coordinados SST	MAYO 2021		Se realizó entrega y cambio de elementos de protección individual.

5. INFORME DE ACCIDENTABILIDAD:

MES	PROCESO	Nº	HHT/Mes	Nº accid	Nº días incap	Ind Frec IF	Ind Sev IS	Ind de lesiones incapacitantes ILI
OCT	Administrativos	6	1440	0	0	0	0	0
	OPERATIVO	111	26640	0	0	0	0	0
	TOTAL	117	28080	0	0	0	0	0

6. INFORME SEGUIMIENTO Y MEJORAS DEL COPASST.

- Los representantes tanto de la administración como de la operación presentan una buena comunicación y motivación por la mejora continua del SG-SST
- El personal, se le entrego la dotación

7. COMPROMISOS Y RESPONSABLES:

PROPUESTA O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Inducción y re inducción de instructivos, plan de emergencia.	Coordinados SST	ABRIL 2021
Identificación de peligros y la importancia de pausas activas	Coordinados SST	ABRIL 2021

8. FIRMAS DE ASISTENTES.

NOMBRE	IDENTIFICACION	FIRMA
Jesús Ramírez	685755	
Brandon Cuan	1000830642	Brando Cuan
Santiago Fernández	1013628995	
Ana María Córchelo	1023918863	

Firma del presidente

Firma del secretario

8178

ANEXO 2. ACTAS DE COMITÉ.

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

FECHA: 27 Marzo 2021 **HORA: 08:30 pm** **LUGAR: Microsoft Teams**

SEGUIMIENTO PROGRAMACION DE SEÑALETICA

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Edwin Alexander Santana Rodriguez	Profesional especialista, supervisor del contrato.	SED	
2. Karen Julieth Rivera Suarez	Aux. Ing. SED	SED	
3. Juan Carlos Rincon	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
4. Oscar Salamanca	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
5. Jesus Ramirez	Residente contratista	Construsocial	
6. Jeison Bermudez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
7. Diego Alejandro Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
8. Anderson Cely	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
9. Brayan Calderon	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
10. Daniel Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
11. Duvan Guanumen	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
12. Alejandra Olarte	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
13. Fabian Lopez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

8180


Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión haciendo llamado al inspector de la localidad de bosa, la cual corresponde al inspector Jeisson Javier Bermudez, en los siguientes colegios se obtienen datos de avance; Carlos Pizarro león gomez, jose Antonio galan, Brasilia sede c están TERMINADOS, Leonardo posada Pedraza, Alfonso lopez Michelsen, Luis Lopez de Mesa, Brasilia a y b se encuentran en EJECUCION, Bosanova ABANDONADO. La localidad presenta retrasos en 5 colegios, los colegios presentados por el Arquitecto Edwin Santana están totalmente diagnosticados. Se espera cumplir con las fechas correspondientes a cada colegio en cuestión.

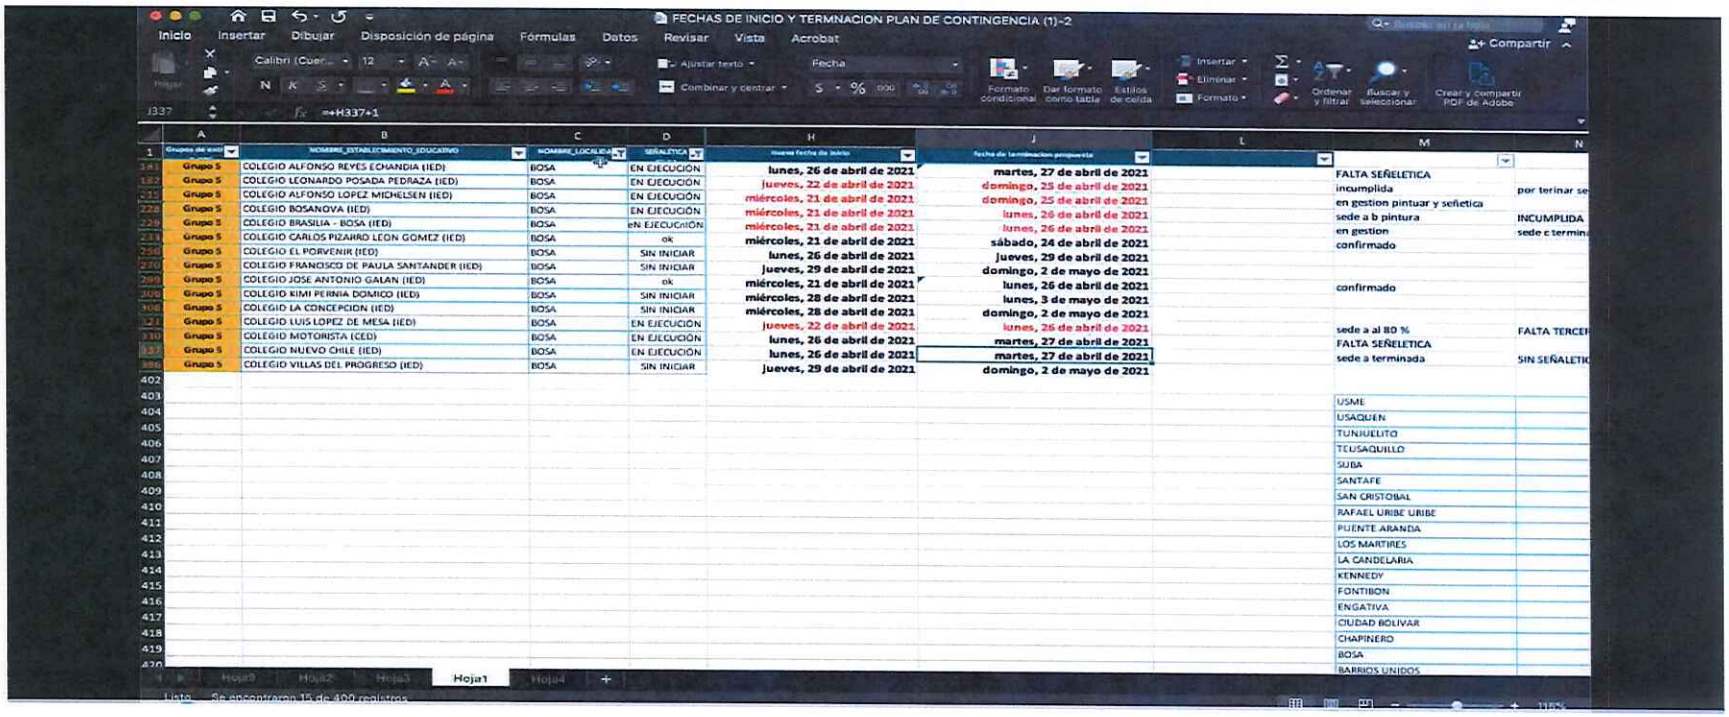

FECHAS DE INICIO Y TERMNACION PLAN DE CONTINGENCIA (1)-2

	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALETICA	Nueva fecha de inicio	Fecha de terminacion propuesta
Grupo 5	COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	lunes, 26 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	jueves, 22 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	miércoles, 21 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO BOSANOVA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	miércoles, 21 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	miércoles, 21 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	BOSA	ok	miércoles, 21 de abril de 2021	sábado, 24 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO EL PORVENIR (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 29 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021
Grupo 5	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED)	BOSA	ok	miércoles, 21 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021
Grupo 5	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	BOSA	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021
Grupo 5	COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	jueves, 22 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO MOTORISTA (CED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	lunes, 26 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	lunes, 26 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 29 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021

	FALTA SEÑELETICA	
	incumplida	por terinar se
	en gestion pintuar y señetica	
	sede a b pintura	INCUMPLIDA
	en gestion	sede c termin
	confirmado	
	confirmado	
	sede a al 80 %	FALTA TERCEI
	FALTA SEÑELETICA	
	sede a terminada	SIN SEÑALETI

USME
USAQUEN
TUNJUELITO
TEUSAQUILLO
SUBA
SANTAFE
SAN CRISTOBAL
RAFAEL URIBE URIBE
PUENTE ARANDA
LOS MARTIRES
LA CANDELARIA
KENNEDY
FONTIBON
ENGATIVA
CIUDAD BOLIVAR
CHAPINERO
BOSA
BARRIOS UNIDOS


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

Se continua en la localidad de Ciudad Bolivar la cual corresponde al interventor Anderson Cely, en los siguientes colegios se verifican avances; Acacias, Guillermo Cano Isaza, Estrella del Sur, Nicolas Gomez Davila están TERMINADOS; Cundinamarca, Maria Mercedez Carranza, Republica de Mexico, Arborizadora Baja, Union Europea, Se encuentran en EJECUCION; De los colegios presentados por el Arquitecto Santana hacen falta por DIAGNOSTICAR el colegio San Francisco debido a que no dieron ingreso.

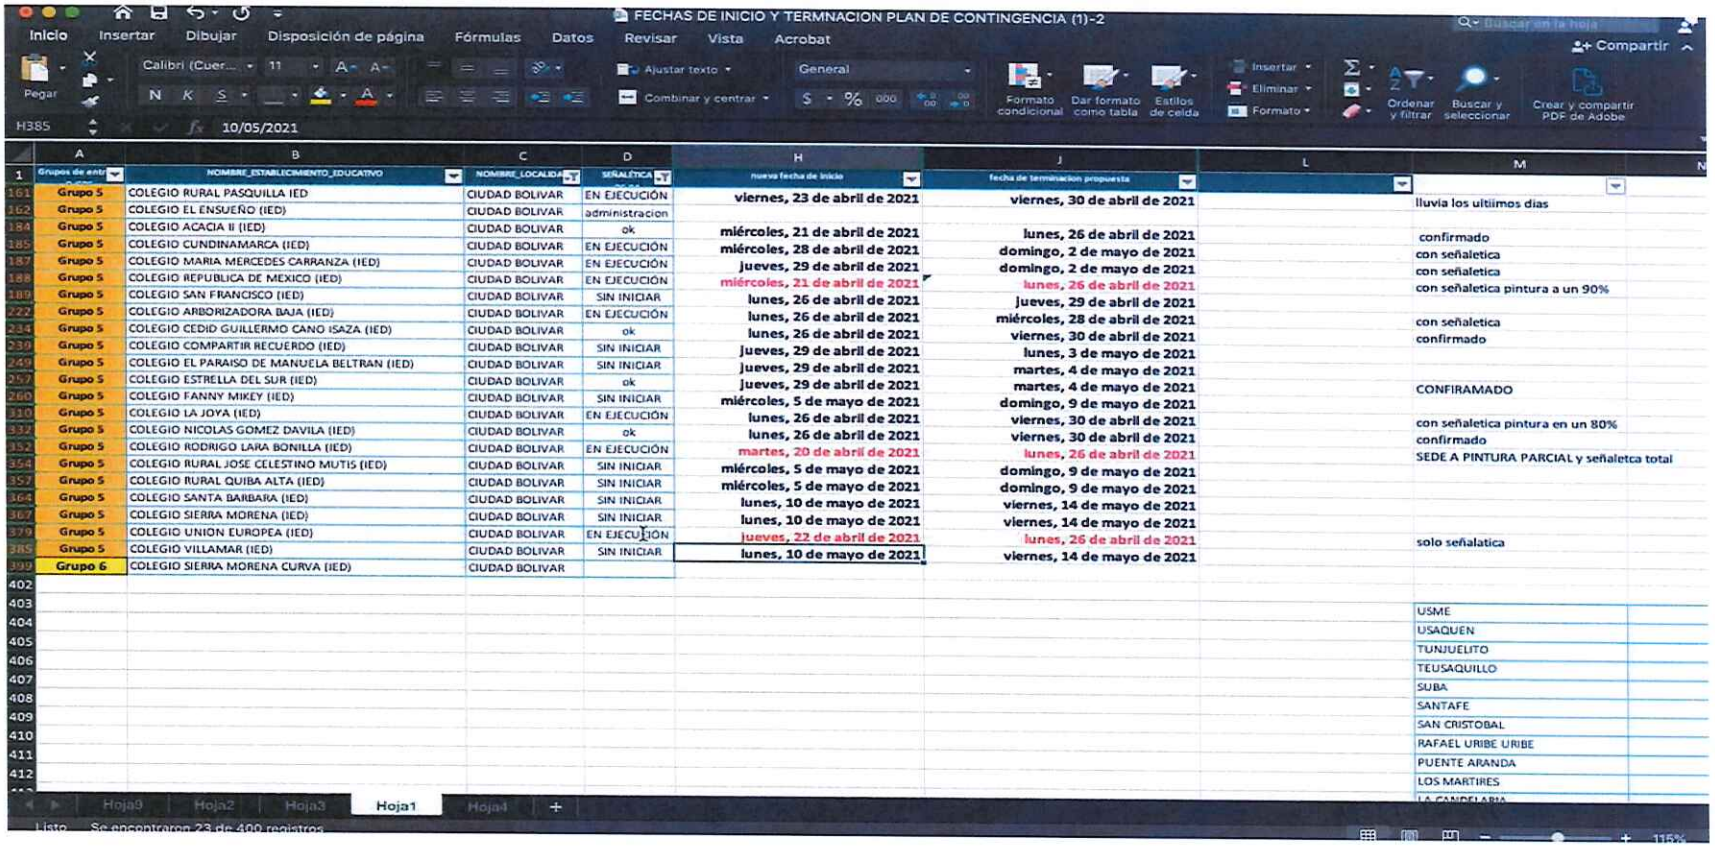

FECHAS DE INICIO Y TERMNACION PLAN DE CONTINGENCIA (1)-2

	A	B	C	D	H	J	L	M
1	Grupos de entr	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDA	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta		
161	Grupo 5	COLEGIO RURAL PASQUILLA IED	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	viernes, 23 de abril de 2021	viernes, 30 de abril de 2021		lluvia los ultiimos dias
162	Grupo 5	COLEGIO EL ENSUEÑO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	administracion				
184	Grupo 5	COLEGIO ACACIA II (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok	miércoles, 21 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021		
185	Grupo 5	COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 28 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021		confirmado
187	Grupo 5	COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	jueves, 29 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021		con señaletica
188	Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 21 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021		con señaletica
189	Grupo 5	COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021		con señaletica pintura a un 90%
222	Grupo 5	COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	lunes, 26 de abril de 2021	miércoles, 28 de abril de 2021		
234	Grupo 5	COLEGIO CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok	lunes, 26 de abril de 2021	viernes, 30 de abril de 2021		con señaletica
239	Grupo 5	COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 29 de abril de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021		confirmado
249	Grupo 5	COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 29 de abril de 2021	martes, 4 de mayo de 2021		
257	Grupo 5	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok	jueves, 29 de abril de 2021	martes, 4 de mayo de 2021		
260	Grupo 5	COLEGIO FANNY MIKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	miércoles, 5 de mayo de 2021	domingo, 9 de mayo de 2021		CONFIRAMADO
310	Grupo 5	COLEGIO LA JOYA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	lunes, 26 de abril de 2021	viernes, 30 de abril de 2021		
332	Grupo 5	COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	ok	lunes, 26 de abril de 2021	viernes, 30 de abril de 2021		con señaletica pintura en un 80%
352	Grupo 5	COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	martes, 20 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021		confirmado
354	Grupo 5	COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	miércoles, 5 de mayo de 2021	domingo, 9 de mayo de 2021		SEDE A PINTURA PARCIAL y señaletca total
357	Grupo 5	COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	miércoles, 5 de mayo de 2021	domingo, 9 de mayo de 2021		
364	Grupo 5	COLEGIO SANTA BARBARA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	lunes, 10 de mayo de 2021	viernes, 14 de mayo de 2021		
367	Grupo 5	COLEGIO SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	lunes, 10 de mayo de 2021	viernes, 14 de mayo de 2021		
379	Grupo 5	COLEGIO UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	jueves, 22 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021		solo señalatica
385	Grupo 5	COLEGIO VILLAMAR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	lunes, 10 de mayo de 2021	viernes, 14 de mayo de 2021		
399	Grupo 6	COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED)	CIUDAD BOLIVAR					
402								
403								USME
404								USAQUEN
405								TUNJUELITO
406								TEUSAQUILLO
407								SUBA
408								SANTAFE
409								SAN CRISTOBAL
410								RAFAEL URIBE URIBE
411								PUENTE ARANDA
412								LOS MARTIRES
								LA CANDELARIA

Hoja9 Hoja2 Hoja3 Hoja1 Hoja4

Listo Se encontraron 23 de 400 registros

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


8182

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

Se procede a pasar a la siguiente localidad que es Engativa, la cual esta asignada al inspector Daniel Ramirez, los siguientes colegios se verifico un avance; General Santander, Miguel Antonio Caro, Charry, Garces Navas se encuentran en EJECUCION; se acuerda cita con el arquitecto santana para el día 28 de abril a las 8 am en el colegio juan del corral sede a para inspección con la señora rectora.

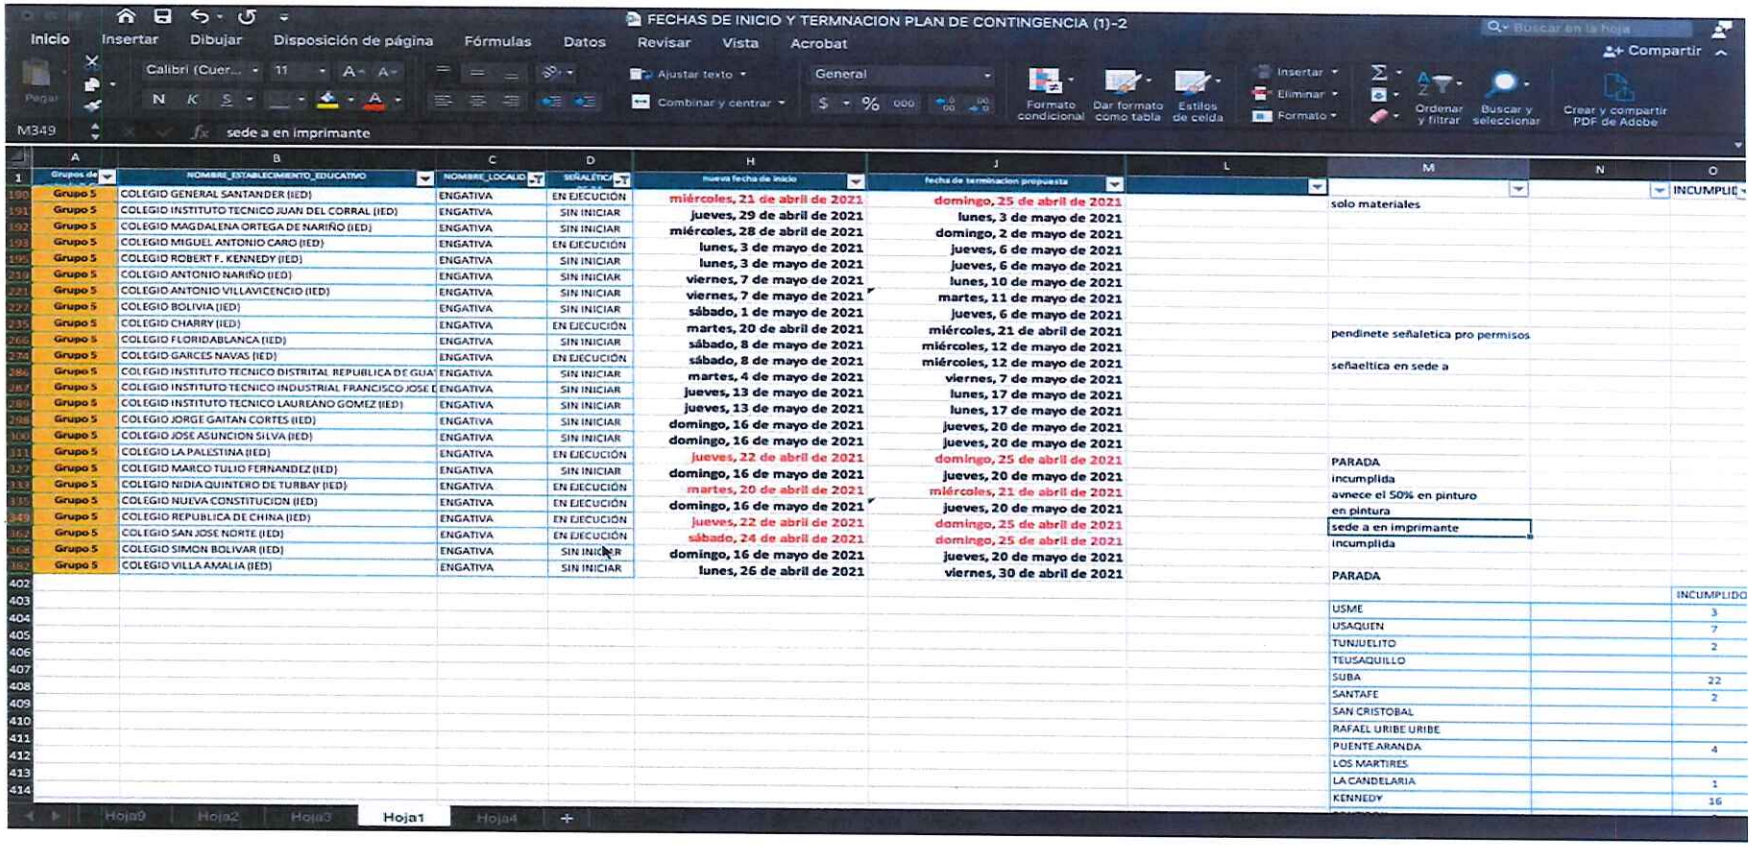

Grupos de	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALID	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta		INCUMPLIE
Grupo 5	COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	miércoles, 21 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021	solo materiales	
Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 29 de abril de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 7 de mayo de 2021	lunes, 10 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 7 de mayo de 2021	martes, 11 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO BOLIVIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	sábado, 1 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO CHARRY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	martes, 20 de abril de 2021	miércoles, 21 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	sábado, 8 de mayo de 2021	miércoles, 12 de mayo de 2021	pendinete señaletica pro permisos	
Grupo 5	COLEGIO GARCES NAVAS (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	sábado, 8 de mayo de 2021	miércoles, 12 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUA	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 4 de mayo de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021	señaeltica en sede a	
Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE D	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 13 de mayo de 2021	lunes, 17 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 13 de mayo de 2021	lunes, 17 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 16 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 16 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	jueves, 22 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021	PARADA	
Grupo 5	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 16 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021	incumplida	
Grupo 5	COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	martes, 20 de abril de 2021	miércoles, 21 de abril de 2021	avnece el 50% en pinturo	
Grupo 5	COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	domingo, 16 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021	en pintura	
Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	jueves, 22 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021	sede a en imprimante	
Grupo 5	COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	sábado, 24 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021	incumplida	
Grupo 5	COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 16 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO VILLA AMALIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	viernes, 30 de abril de 2021	PARADA	

	INCUMPLIDO
USME	3
USAQUEN	7
TUNJUELITO	2
TEUSAQUILLO	
SUBA	22
SANTAFE	2
SAN CRISTOBAL	
RAFAEL URIBE URIBE	
PUENTE ARANDA	4
LOS MARTIRES	
LA CANDELARIA	1
KENNEDY	16


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

AC2R Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

Se continua con la localidad de Fontibon que le corresponde al inspector Oscar Salamanca la cual indica que no hubo un reporte de algún avance, indica que las cuadrillas del señor gustavo no están trabajando.

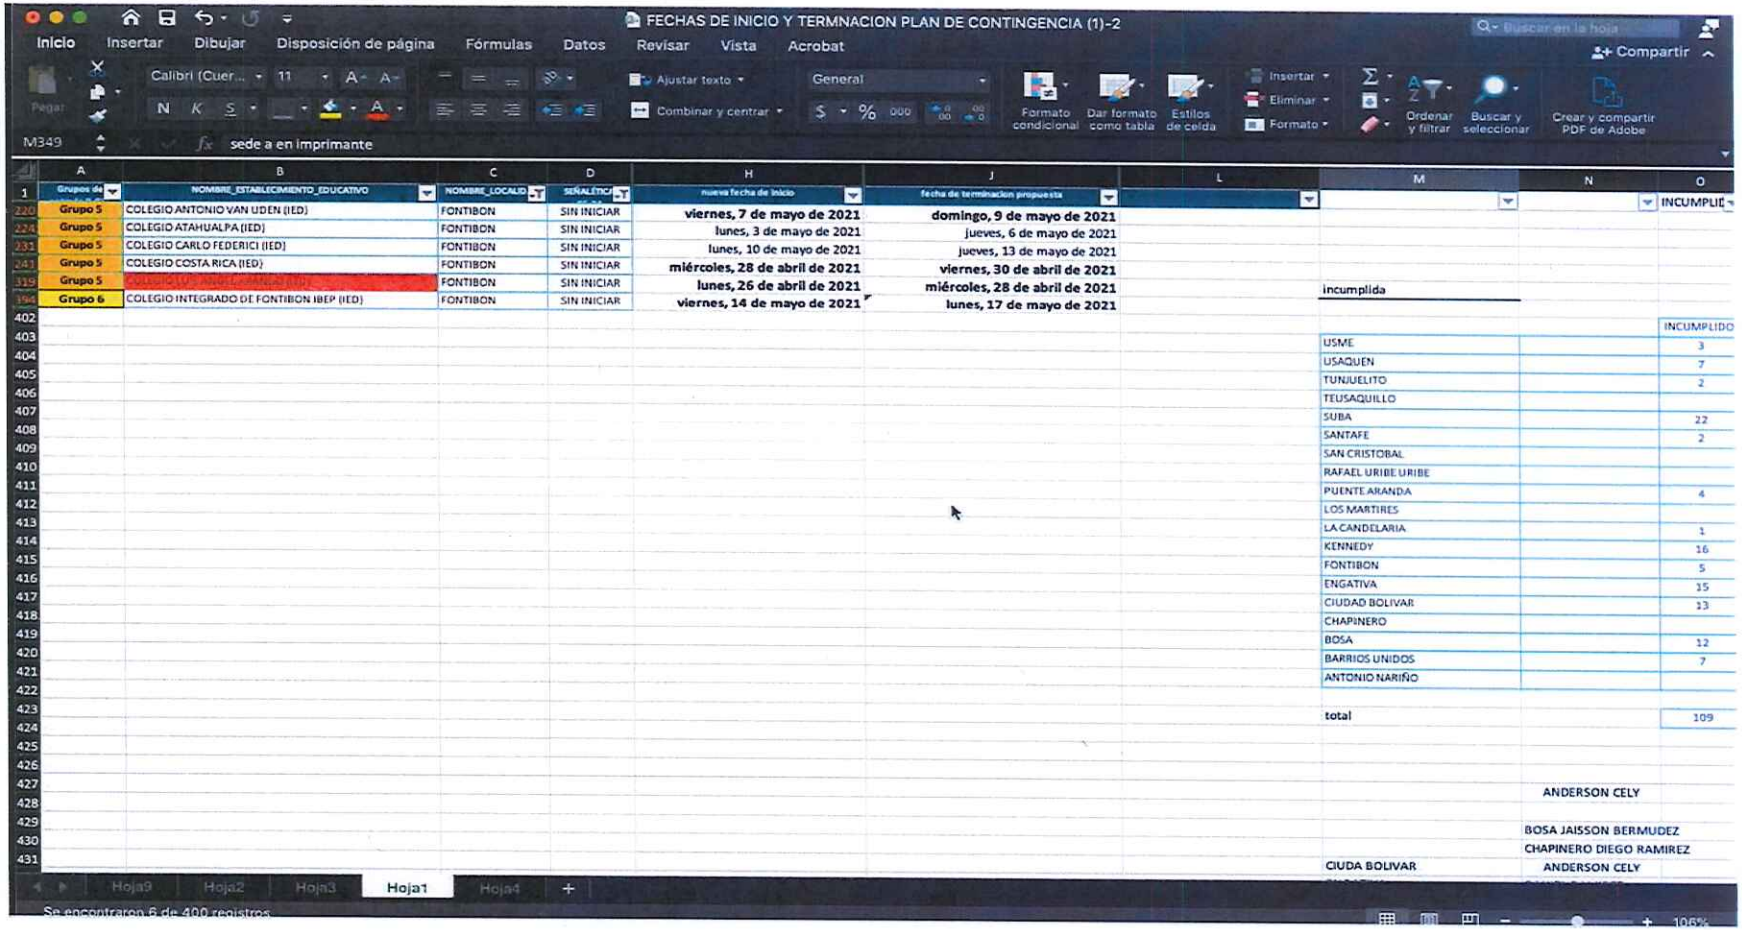

FECHAS DE INICIO Y TERMNACION PLAN DE CONTINGENCIA (1)-2

Grupos de	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALID	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
Grupo 5	COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	viernes, 7 de mayo de 2021	domingo, 9 de mayo de 2021
Grupo 5	COLEGIO ATAHUALPA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021
Grupo 5	COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	lunes, 10 de mayo de 2021	jueves, 13 de mayo de 2021
Grupo 5	COLEGIO COSTA RICA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	viernes, 30 de abril de 2021
Grupo 5	[illegible]	FONTIBON	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	miércoles, 28 de abril de 2021
Grupo 6	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	viernes, 14 de mayo de 2021	lunes, 17 de mayo de 2021

	INCUMPLIDO
USME	3
USAQUEN	7
TUNJUELITO	2
TEUSAQUILLO	
SUBA	22
SANTAFE	2
SAN CRISTOBAL	
RAFAEL URIBE URIBE	
PUENTE ARANDA	4
LOS MARTIRES	
LA CANDELARIA	1
KENNEDY	16
FONTIBON	5
ENGATIVA	15
CIUDAD BOLIVAR	13
CHAPINERO	
BOSA	12
BARRIOS UNIDOS	7
ANTONIO NARIÑO	
total	109

incumplida

ANDERSON CELY
BOSA JAISSON BERMUDEZ
CHAPINERO DIEGO RAMIREZ
CIUDA BOLIVAR ANDERSON CELY


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

Se continua en la localida de Kennedy que le corresponde a la inspectora Alejandra Olarte , los siguientes colegios son colegios los cuales se intervinieron y se verifico un avance; Codema, se encuentran en EJECUCION; indica que todos los colegios de esta localidad ya se encuentran en su mayoria diagnosticados, faltando Eduardo Umaña Luna, que no fue posible el ingreso y Ciudad de Techo que se encuentra en obra.

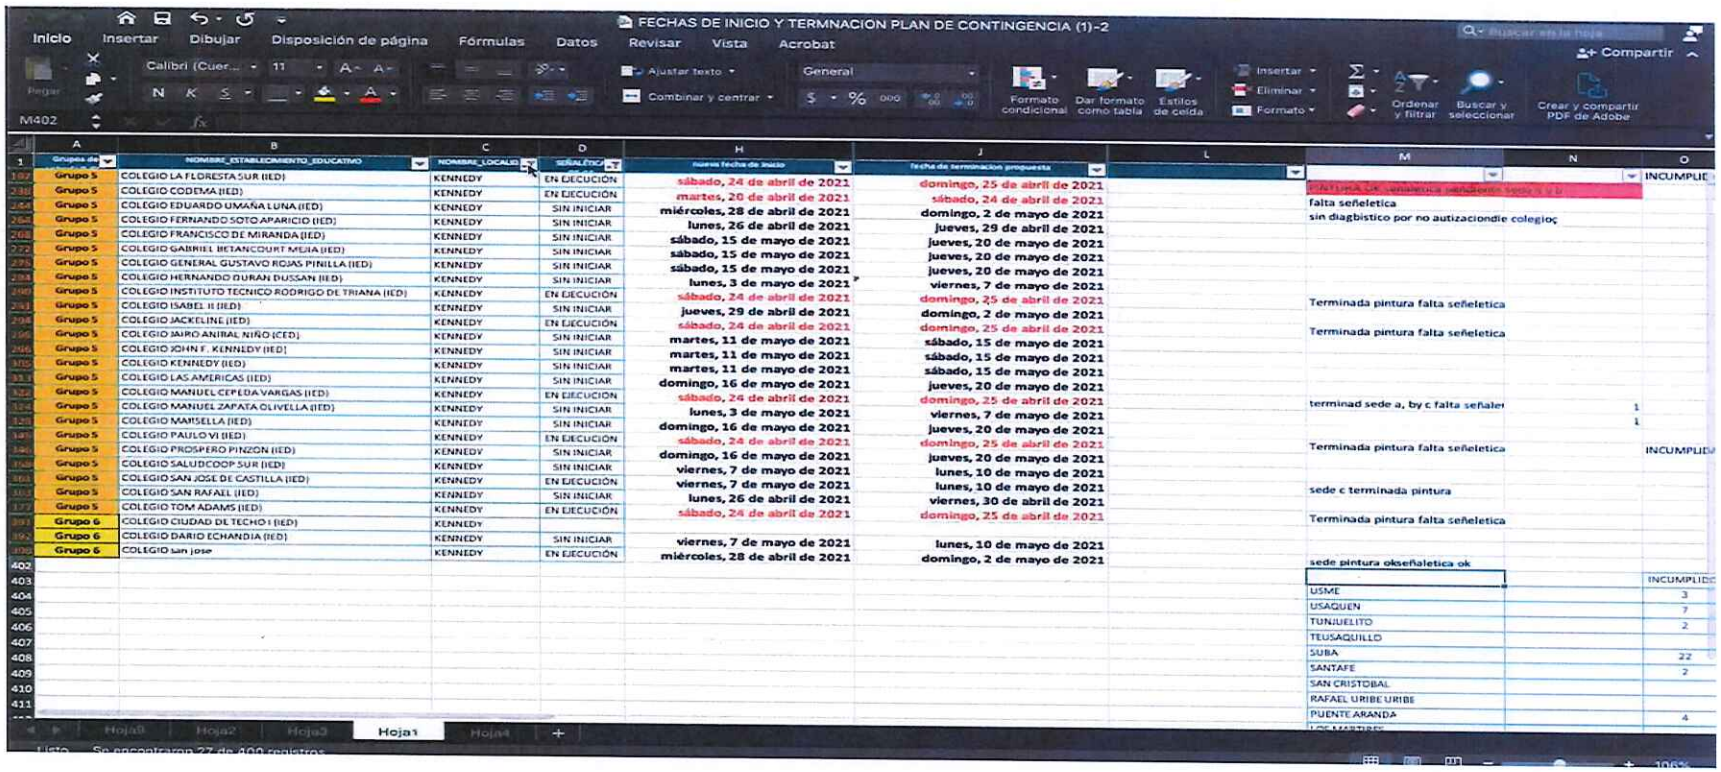


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

Se continua en la localidad de la candelaria en la cual se encuentra el inspector Oscar Salamanca, no hubo avance en el colegio Escuela Nacional de Comercio.

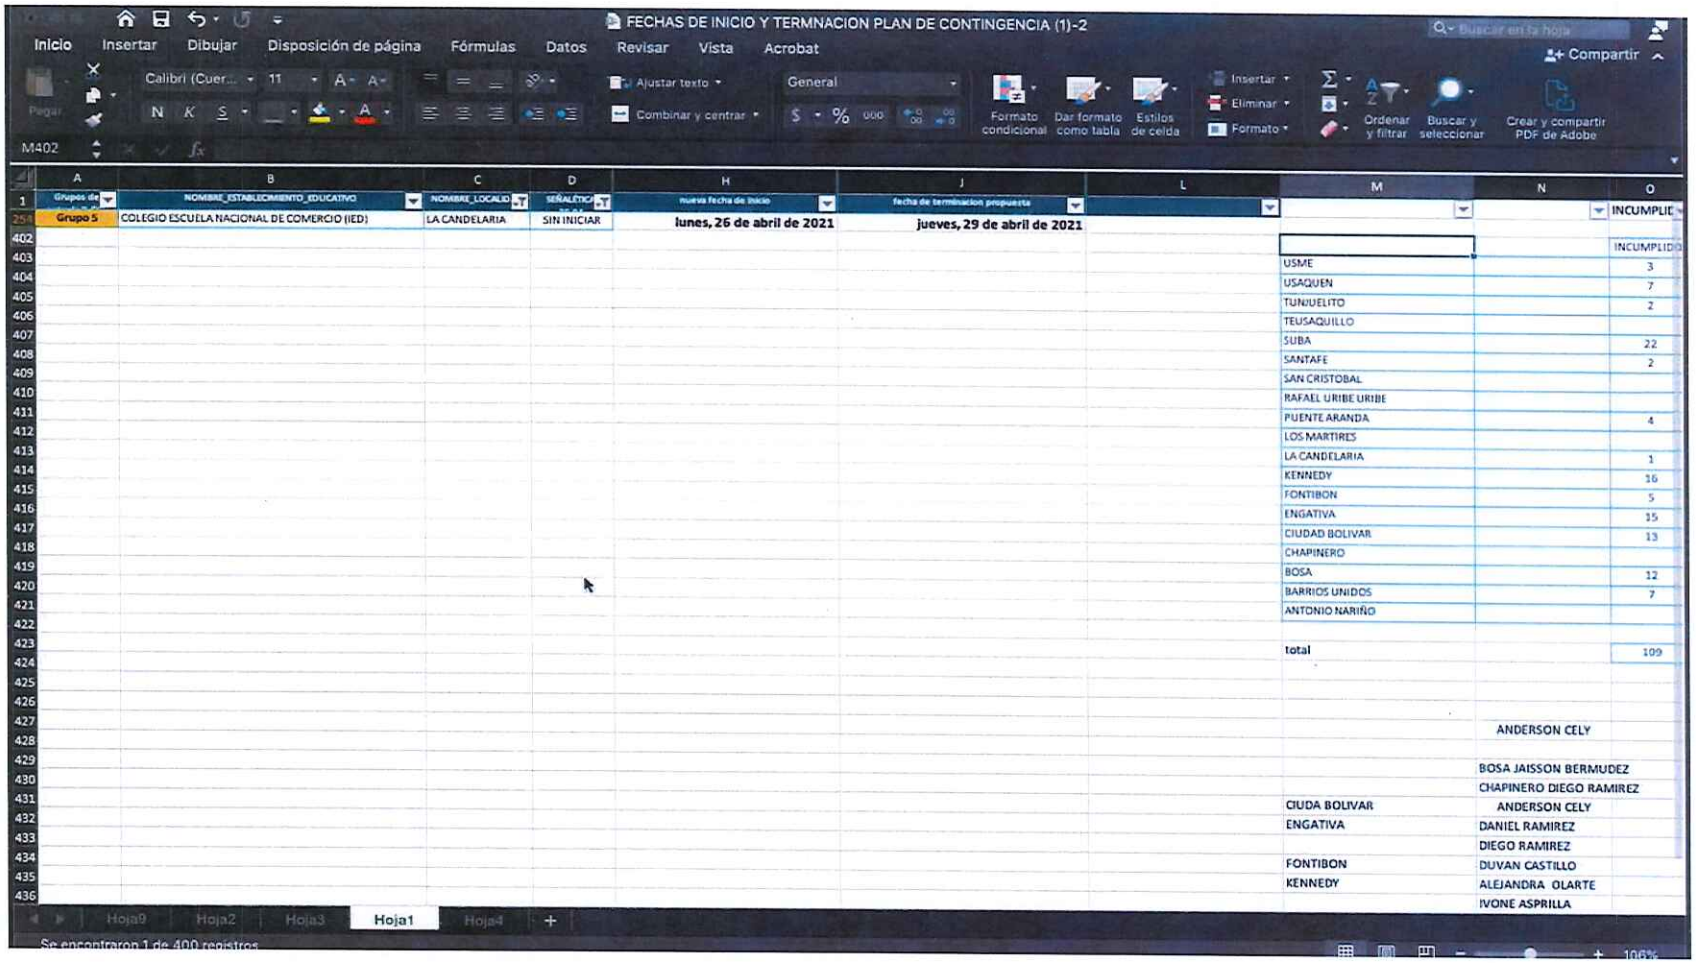


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

Se continua en la localidad de Puente Aranda en la cual se encuentra el inspector Oscar Salamanca que indica que las cuadrillas no se presentan a trabajar y esto retrasa la operación en cuanto a tiempos de ejecución.

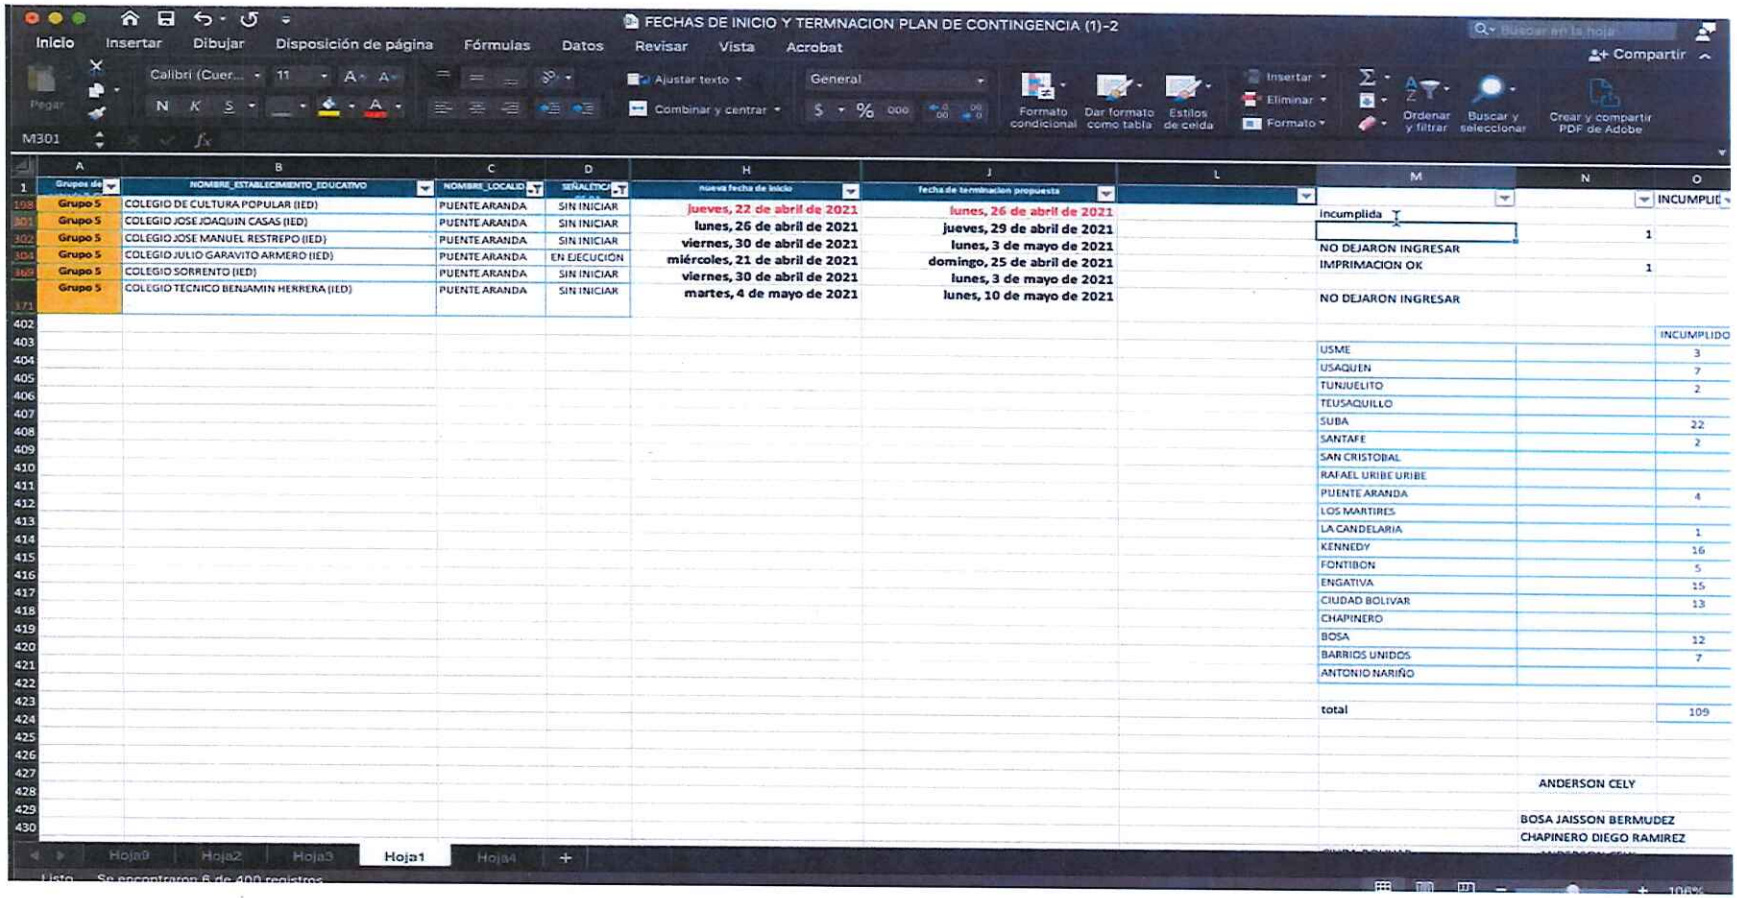

FECHAS DE INICIO Y TERMNACION PLAN DE CONTINGENCIA (1)-2


	A	B	C	D	H	J
1	Grupos de	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALID	SEÑALETICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
198	Grupo 5	COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021
301	Grupo 5	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021
302	Grupo 5	COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021
304	Grupo 5	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	EN EJECUCION	miércoles, 21 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021
369	Grupo 5	COLEGIO SORRENTO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021
371	Grupo 5	COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	martes, 4 de mayo de 2021	lunes, 10 de mayo de 2021

M	N	O
		INCUMPLIC
incumplida		
	1	
NO DEJARON INGRESAR		
IMPRIMACION OK	1	
NO DEJARON INGRESAR		
		INCUMPLIDO
USME		3
USAQUEN		7
TUNJUELITO		2
TEUSAQUILLO		
SUBA		22
SANTAFE		2
SAN CRISTOBAL		
RAFAEL URIBE URIBE		
PUENTE ARANDA		4
LOS MARTIRES		
LA CANDELARIA		1
KENNEDY		16
FONTIBON		5
ENGATIVA		15
CIUDAD BOLIVAR		13
CHAPINERO		
BOSA		12
BARRIOS UNIDOS		7
ANTONIO NARIÑO		
total		109
	ANDERSON CELY	
	BOSA JAISSON BERMUDEZ	
	CHAPINERO DIEGO RAMIREZ	

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

Se continua en la localidad de Suba la cual esta a cargo del inspector Oscar Salamanca, infiere sobre los avances de los colegios a continuación;Ramon de Zubiria, Manuel Zapata Olivella, Gerardo Molina, Gustavo Morales, se encuentran en EJECUCION; Gerardo Paredes, Alvaro Gomez Hurtado, Gonzalo Arango, Juan Lozano Lozano, Virginia Gutierrez de Pineda, se encuentran TERMINADOS; se encuentran 6 colegios atrasados de ejecución.

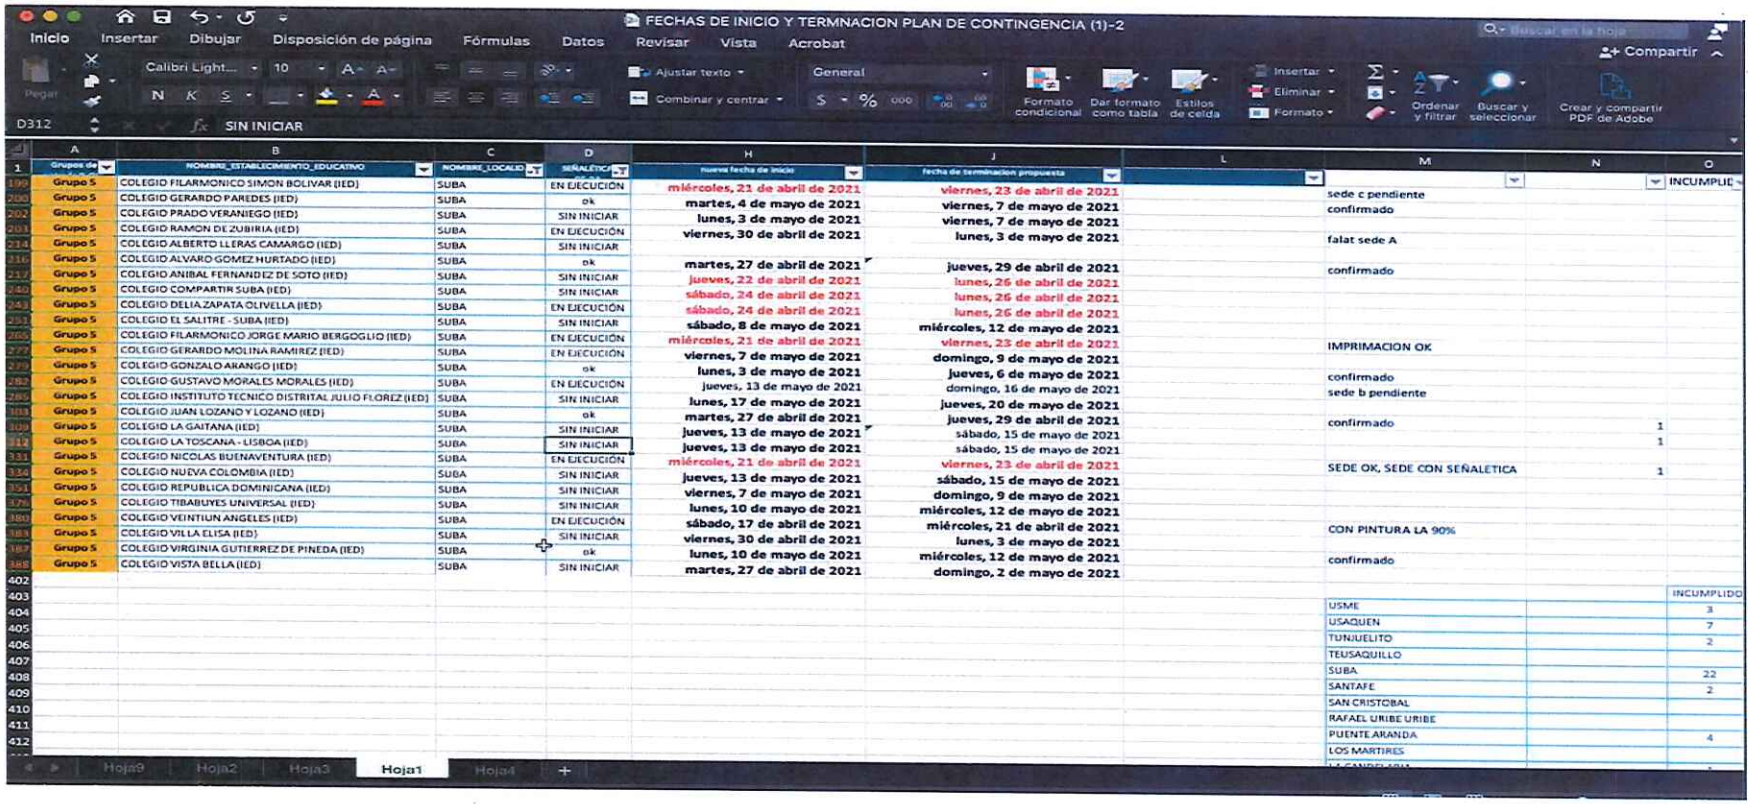

FECHAS DE INICIO Y TERMNACION PLAN DE CONTINGENCIA (1)-2

Grupos de	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALID	SEÑALETICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta	L	M	N	O
Grupo 5	COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	SUBA	EN EJECUCION	miércoles, 21 de abril de 2021	viernes, 23 de abril de 2021		sede c pendiente		INCUMPLIE
Grupo 5	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	SUBA	ok	martes, 4 de mayo de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021		confirmado		
Grupo 5	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021				
Grupo 5	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	SUBA	EN EJECUCION	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021		falat sede A		
Grupo 5	COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR						
Grupo 5	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	SUBA	ok	martes, 27 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021		confirmado		
Grupo 5	COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021				
Grupo 5	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021				
Grupo 5	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SUBA	EN EJECUCION	sábado, 24 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021				
Grupo 5	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 8 de mayo de 2021	miércoles, 12 de mayo de 2021				
Grupo 5	COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	SUBA	EN EJECUCION	miércoles, 21 de abril de 2021	viernes, 23 de abril de 2021				
Grupo 5	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	SUBA	EN EJECUCION	viernes, 7 de mayo de 2021	domingo, 9 de mayo de 2021		IMPRIMACION OK		
Grupo 5	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	SUBA	ok	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021				
Grupo 5	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	SUBA	EN EJECUCION	jueves, 13 de mayo de 2021	domingo, 16 de mayo de 2021		confirmado		
Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR	lunes, 17 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021		sede b pendiente		
Grupo 5	COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	SUBA	ok	martes, 27 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021				
Grupo 5	COLEGIO LA GAITANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	jueves, 13 de mayo de 2021	sábado, 15 de mayo de 2021		confirmado	1	
Grupo 5	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	jueves, 13 de mayo de 2021	sábado, 15 de mayo de 2021			1	
Grupo 5	COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	SUBA	EN EJECUCION	miércoles, 21 de abril de 2021	viernes, 23 de abril de 2021		SEDE OK, SEDE CON SEÑALETICA	1	
Grupo 5	COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	jueves, 13 de mayo de 2021	sábado, 15 de mayo de 2021				
Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	viernes, 7 de mayo de 2021	domingo, 9 de mayo de 2021				
Grupo 5	COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	SUBA	SIN INICIAR	lunes, 10 de mayo de 2021	miércoles, 12 de mayo de 2021				
Grupo 5	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	SUBA	EN EJECUCION	sábado, 17 de abril de 2021	miércoles, 21 de abril de 2021		CON PINTURA LA 90%		
Grupo 5	COLEGIO VILLA ELISA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021				
Grupo 5	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)	SUBA	ok	lunes, 10 de mayo de 2021	miércoles, 12 de mayo de 2021		confirmado		
Grupo 5	COLEGIO VISTA BELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 27 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021				


	INCUMPLIDO
USME	3
USAQUEN	7
TUNJUELITO	2
TEUSAQUILLO	
SUBA	22
SANTAFE	2
SAN CRISTOBAL	
RAFAEL URIBE URIBE	
PUENTE ARANDA	4
LOS MARTIRES	

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

Se continua en la localidad de Tunjuelito la cual esta representada por el inspector Oscar Salamanca el cual infiere que no se ha intervenido.

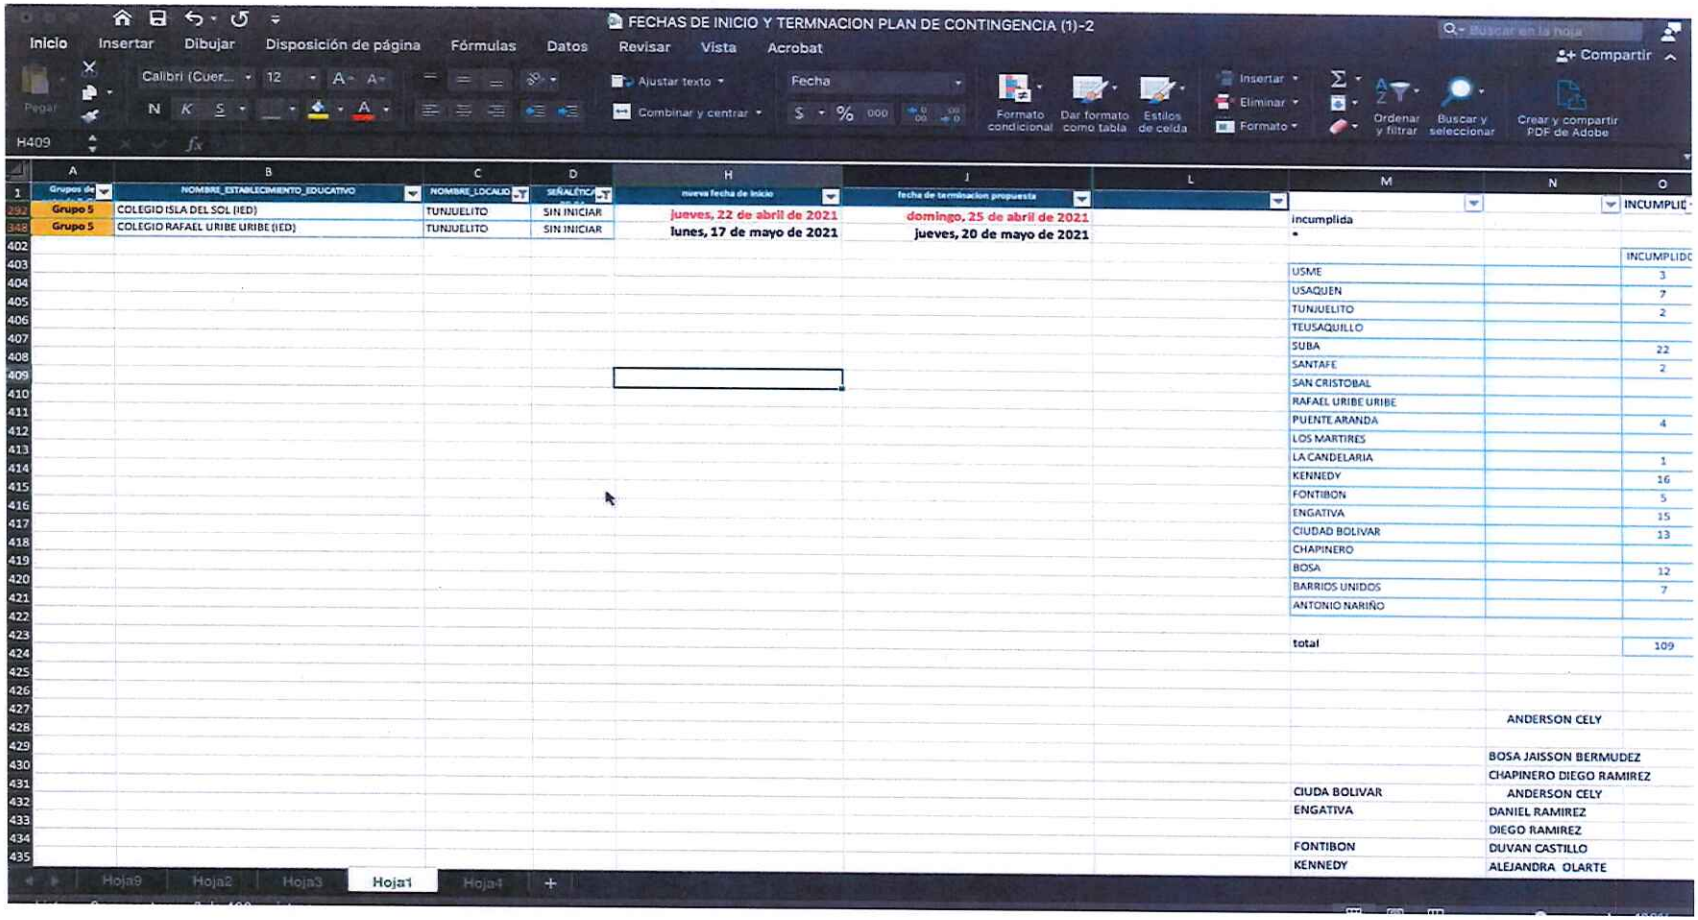

Grupo de	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALID	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
Grupo 5	COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	lunes, 17 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021

		INCUMPLIDO
incumplida		
-		
		INCUMPLIDO
USME		3
USAQUEN		7
TUNJUELITO		2
TEUSAQUILLO		
SUBA		22
SANTAFE		2
SAN CRISTOBAL		
RAFAEL URIBE URIBE		
PUENTE ARANDA		4
LOS MARTIRES		
LA CANDELARIA		1
KENNEDY		16
FONTIBON		5
ENGATIVA		15
CIUDAD BOLIVAR		13
CHAPINERO		
BOSA		12
BARRIOS UNIDOS		7
ANTONIO NARIÑO		
total		109
	ANDERSON CELY	
	BOSA JAISSON BERMUDEZ	
	CHAPINERO DIEGO RAMIREZ	
CIUDA BOLIVAR	ANDERSON CELY	
ENGATIVA	DANIEL RAMIREZ	
	DIEGO RAMIREZ	
FONTIBON	DUVAN CASTILLO	
KENNEDY	ALEJANDRA OLARTE	


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

Se continua en la localidad de Usaquen la cual esta representada por el inspector Oscar Salamanca el cual infiere que los colegios citados a continuación están verificas con algún tipo de avance; Cristobal Colon se encuentra en EJECUCION; Los demás colegios no presentan ningún tipo de avance.

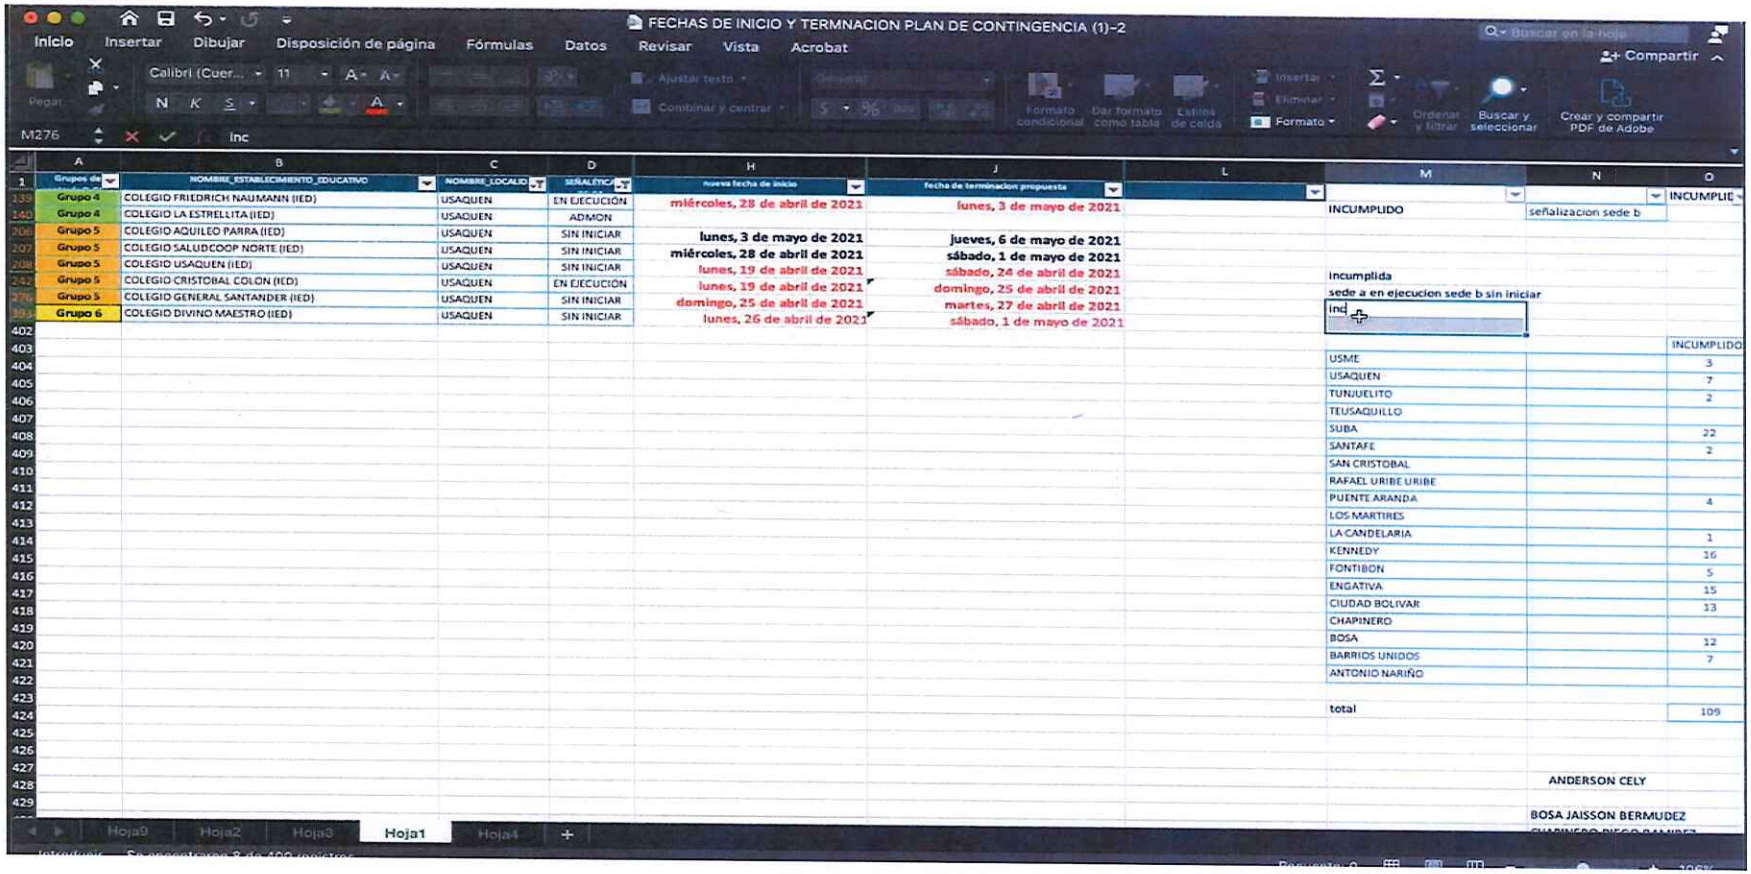

FECHAS DE INICIO Y TERMNACION PLAN DE CONTINGENCIA (1)-2

Grupos de	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALID	SEÑALETICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
Grupo 4	COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	miércoles, 28 de abril de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021
Grupo 4	COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)	USAQUEN	ADMON		
Grupo 5	COLEGIO AQUILEO PARRA (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021
Grupo 5	COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	sábado, 1 de mayo de 2021
Grupo 5	COLEGIO USAQUEN (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	sábado, 24 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	lunes, 19 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021
Grupo 5	COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021
Grupo 6	COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	sábado, 1 de mayo de 2021

INCUMPLIDO	señalizacion sede b	INCUMPLIE
Incumplida		
sede a en ejecucion sede b sin iniciar		
inc		
		INCUMPLIDO
USME		3
USAQUEN		7
TUNJUELITO		2
TEUSAQUILLO		
SUBA		22
SANTAFE		2
SAN CRISTOBAL		
RAFAEL URIBE URIBE		
PUENTE ARANDA		4
LOS MARTIRES		
LA CANDELARIA		1
KENNEDY		16
FONTIBON		5
ENGATIVA		15
CIUDAD BOLIVAR		13
CHAPINERO		
BOSA		12
BARRIOS UNIDOS		7
ANTONIO NARIÑO		
total		109
	ANDERSON CELY	
	BOSA JAISSON BERMUDEZ	


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

Se continua en la localidad de Barrios Unidos la cual esta representada por el inspector Diego Ramirez, infiere que los colegios nombrados a continuacion tiene algún tipo de avance; Republica de Panama, Tomas Carrasquilla, se encuentran en EJECUCION. Los demás colegios no tienen ningún avance.

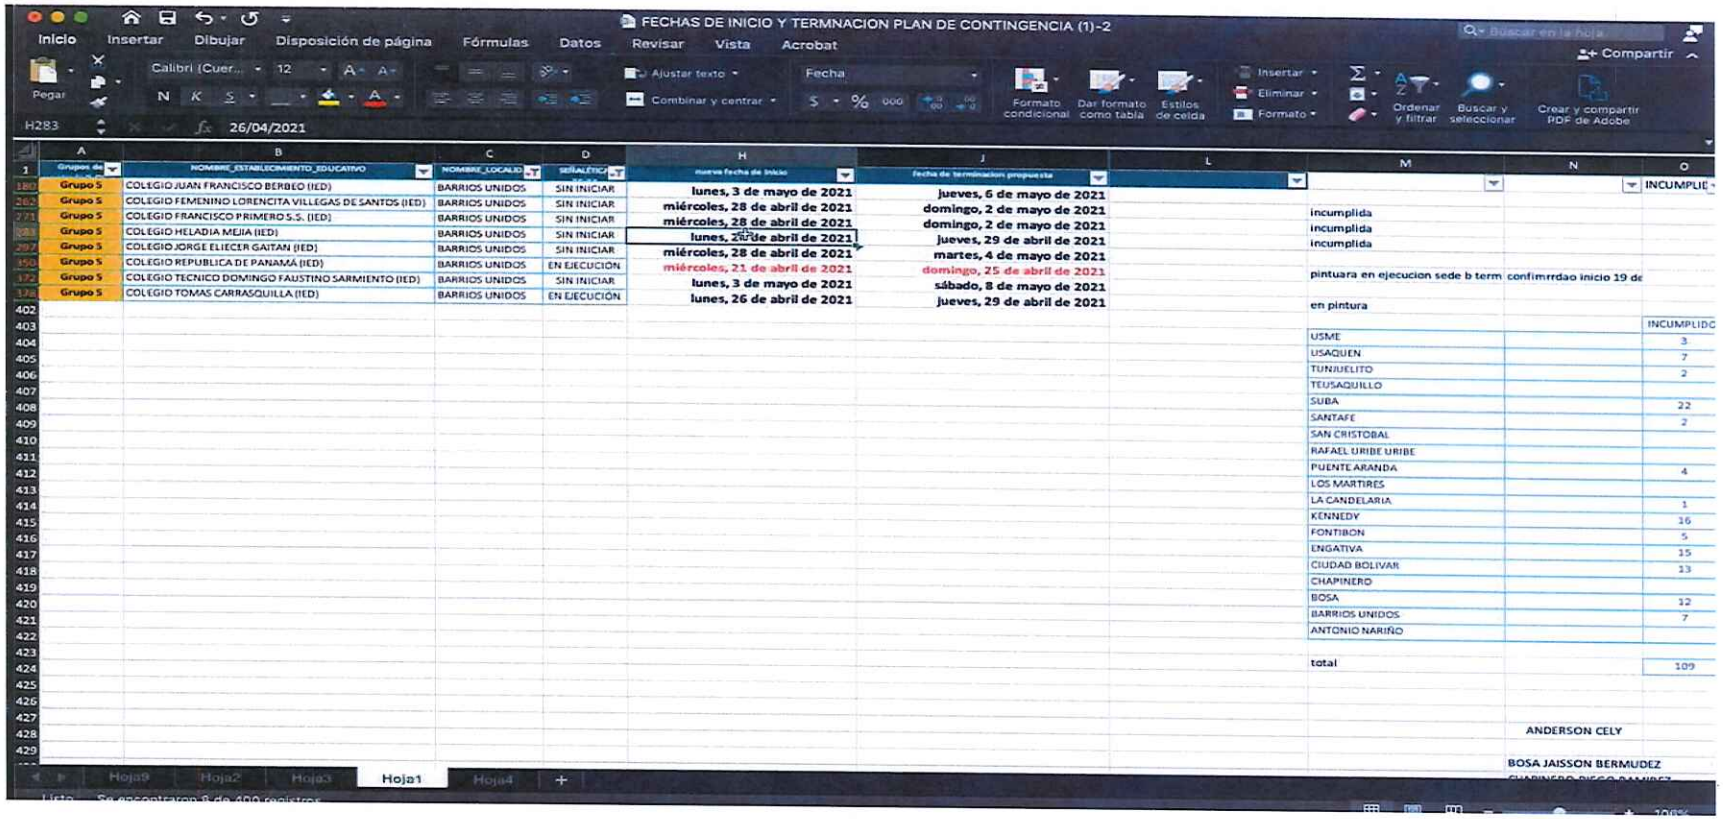

FECHAS DE INICIO Y TERMNACION PLAN DE CONTINGENCIA (1)-2

	Grupos de	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALID	SEÑALETICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
180	Grupo 5	COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021
262	Grupo 5	COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021
271	Grupo 5	COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021
283	Grupo 5	COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021
297	Grupo 5	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	martes, 4 de mayo de 2021
350	Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ (IED)	BARRIOS UNIDOS	EN EJECUCION	miércoles, 21 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021
372	Grupo 5	COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	sábado, 8 de mayo de 2021
378	Grupo 5	COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	BARRIOS UNIDOS	EN EJECUCION	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021

	M	N	O
1			INCUMPLIC
180	incumplida		
262	incumplida		
271	incumplida		
283			
297			
350	pintuara en ejecucion sede b term	confimrdao inicio 19 de	
372			
378	en pintura		
403			INCUMPLIDO
404	USME		3
405	USAQUEN		7
406	TUNJUELITO		2
407	TEUSAQUILLO		
408	SUBA		22
409	SANTAFE		2
410	SAN CRISTOBAL		
411	RAFAEL URIBE URIBE		
412	PUENTE ARANDA		4
413	LOS MARTIRES		
414	LA CANDELARIA		1
415	KENNEDY		16
416	FONTIBON		5
417	ENGATIVA		15
418	CIUDAD BOLIVAR		13
419	CHAPINERO		
420	BOSA		12
421	BARRIOS UNIDOS		7
422	ANTONIO NARIÑO		
423			
424	total		109
425			
426			
427			
428		ANDERSON CELY	
429			
		BOSA JAISSON BERMUDEZ	

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°10

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Realizar el respectivo seguimiento a los colegios que no se han intervenido y que se encuentran como prioridad según el arquitecto santan en las localidades criticas	Juan Rincon	27/04/2021
2. Realizar el respectivo seguimiento a los colegios que no se han intervenido y que se encuentran como prioridad según el arquitecto santan en las localidades criticas	Osacar Salamanca	27/04/2021

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES: Se realizo la actualización de la matriz de los colegio en donde se evaluo el estado de ejecución de los colegio marcando los que ya se habían ejecutado completamente, los que están en ejecución y los que no han empezado trabajo para saber cuales de estos están incumpliendo las fechas asignadas en la programación inicial y de esta menera hacer la gestión para su pronta ejecución.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: 30/04/2021
HORA: 8:30 pm
LUGAR: Microsoft Teams

8192

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

FECHA: 30 Abril 2021 **HORA: 8 : 38 pm** **LUGAR: Microsoft Teams**

SEGUIMIENTO PROGRAMACION SEÑALIZACION Y SEÑALETICA

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Edwin Alexander Santana Rodriguez	Profesional especialista, supervisor del contrato.	SED	
2. Karen Julieth Rivera Suarez	Aux. Ing. SED	SED	
3. Juan Carlos Rincon	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
4. Oscar Salamanca	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
5. Jesus Ramirez	Residente contratista	Construsocial	
6. Jeisson Bermudez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
7. Diego Alejandro Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
8. Anderson Cely	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
9. Brayan Calderon	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
10. Daniel Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
11. Duvan Guanumen	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
12. Alejandra Olarte	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
13. Fabian Lopez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
14. Yecid Torres	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
15. Ivonne Asprilla	Inspector de Interventoria	INterventoria AC2R	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos


AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

DESARROLLO:

Se da inico a la reunión la cual en primera instancia se verifica la localidad de Barrios Unidos la cual corresponde al inspector Diego Alejandro Ramirez, en los colegios acontinuacion se obtienen los datos de avances; Republica de panama sede A y C terminan actividades de señalizacion el día de hoy, sigue igual, Republica de Panama sede B.

Se menciona que hay un colegio con retraso en iniciar labores heladia Mejia debió iniciar labores el día 28 de abril y los colegios que deben iniciar labores en día 30 de abril Lorencita Villegas de Santos, Francisco primero SS y Jorge Eliecer Gaitan

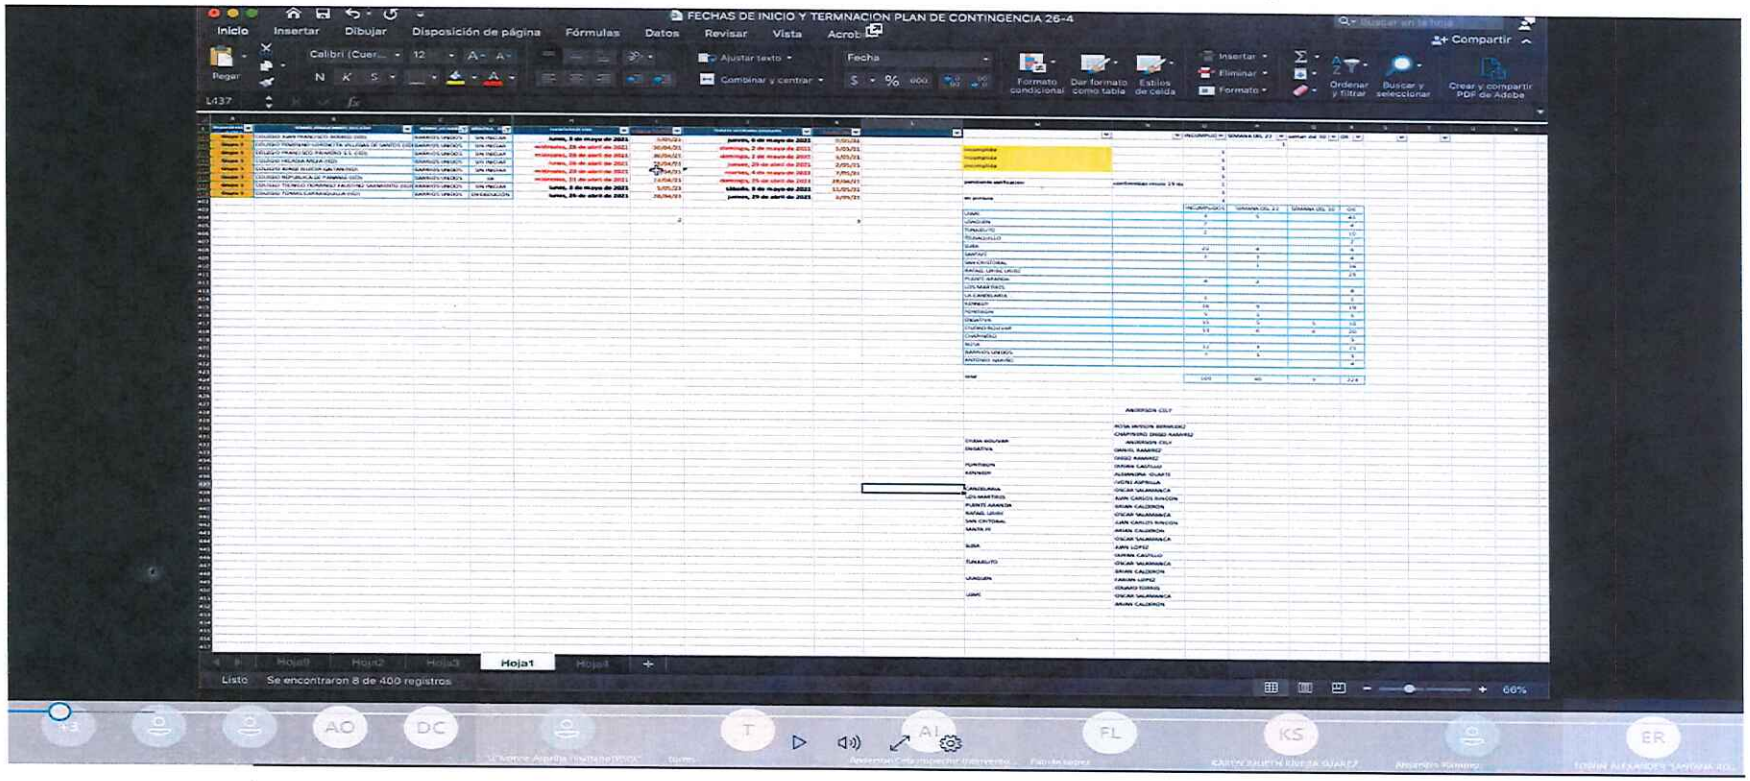

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

8194


Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

Se continua en la localidad de Bosa la cual corresponde al inspector Jeison Bermudez, en los colegios acontinuacion se obtienen los datos de avances; Jose Antonio Galan esta terminado pero hace falta señaletica de los baños, Bosanova sede A termiando en pintura pendiente señaletica, Brasilia sede A y C terminadas,

Brasilia sede B se encuentra en ejecucion, Los colegios que no se han terminado se proyecta una fecha de posible finalizacion por parte del contratista. Y quedarian 13 colegios pendientes por ejecucion en esta localidad.

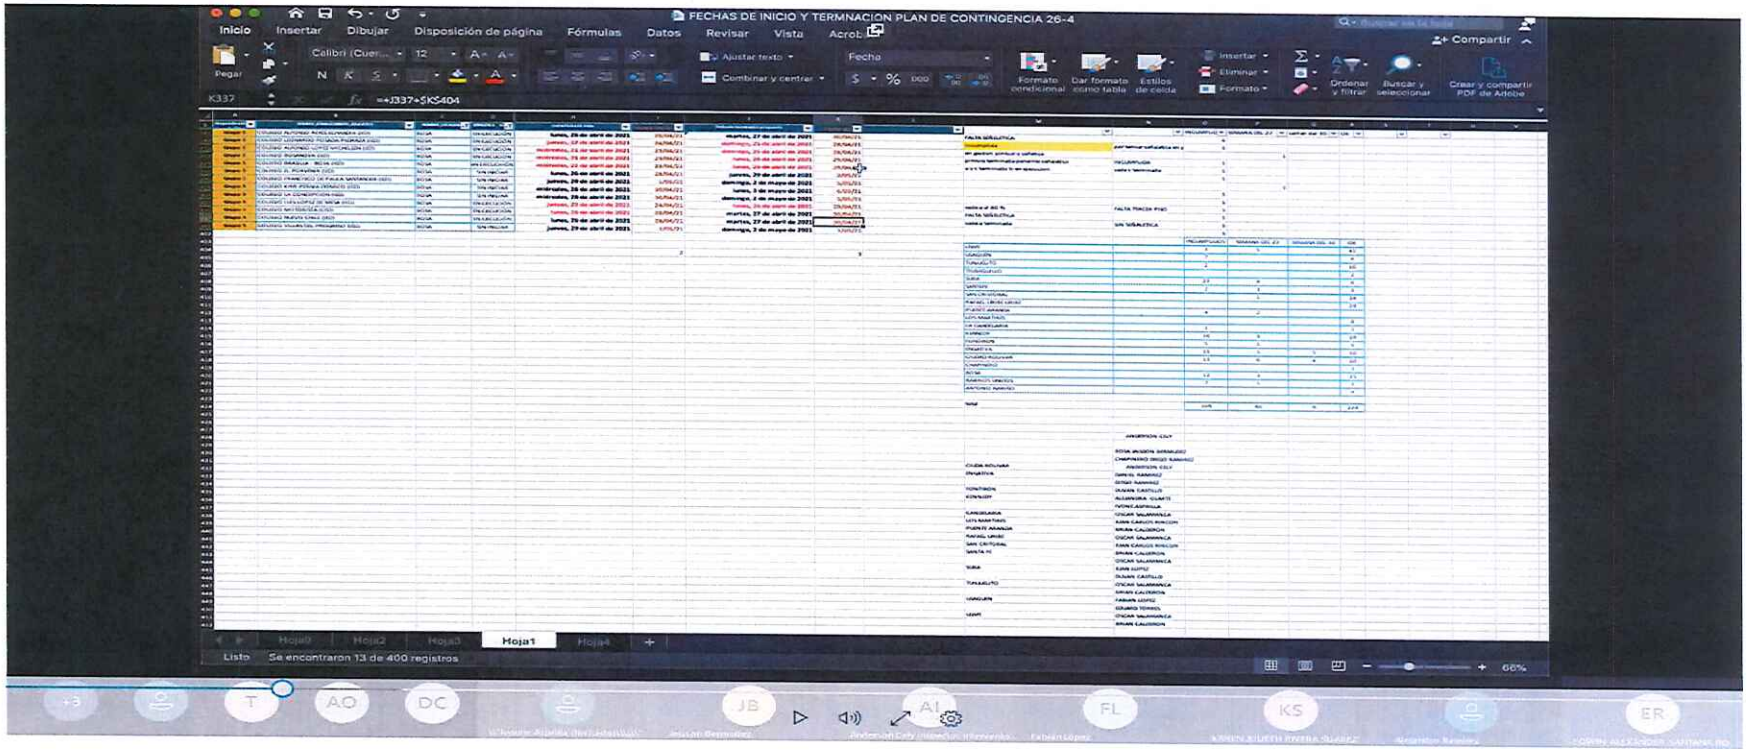

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


8195

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

Se continua con la localidad de Ciudad Bolivar la cual esta asignada al inspector Anderson Cely, en los colegios acontinuacion se obtienen los datos de avances; republica de Mexico sede A termianda, La Joya Terminada. Republica de Mexico sede B es en arriendo y se esta a la espera de la carta de autorizacion para intervenir Y se estan ejecutando; San Francisco sede A y B, Rodrigo Lara Bonilla sede A.

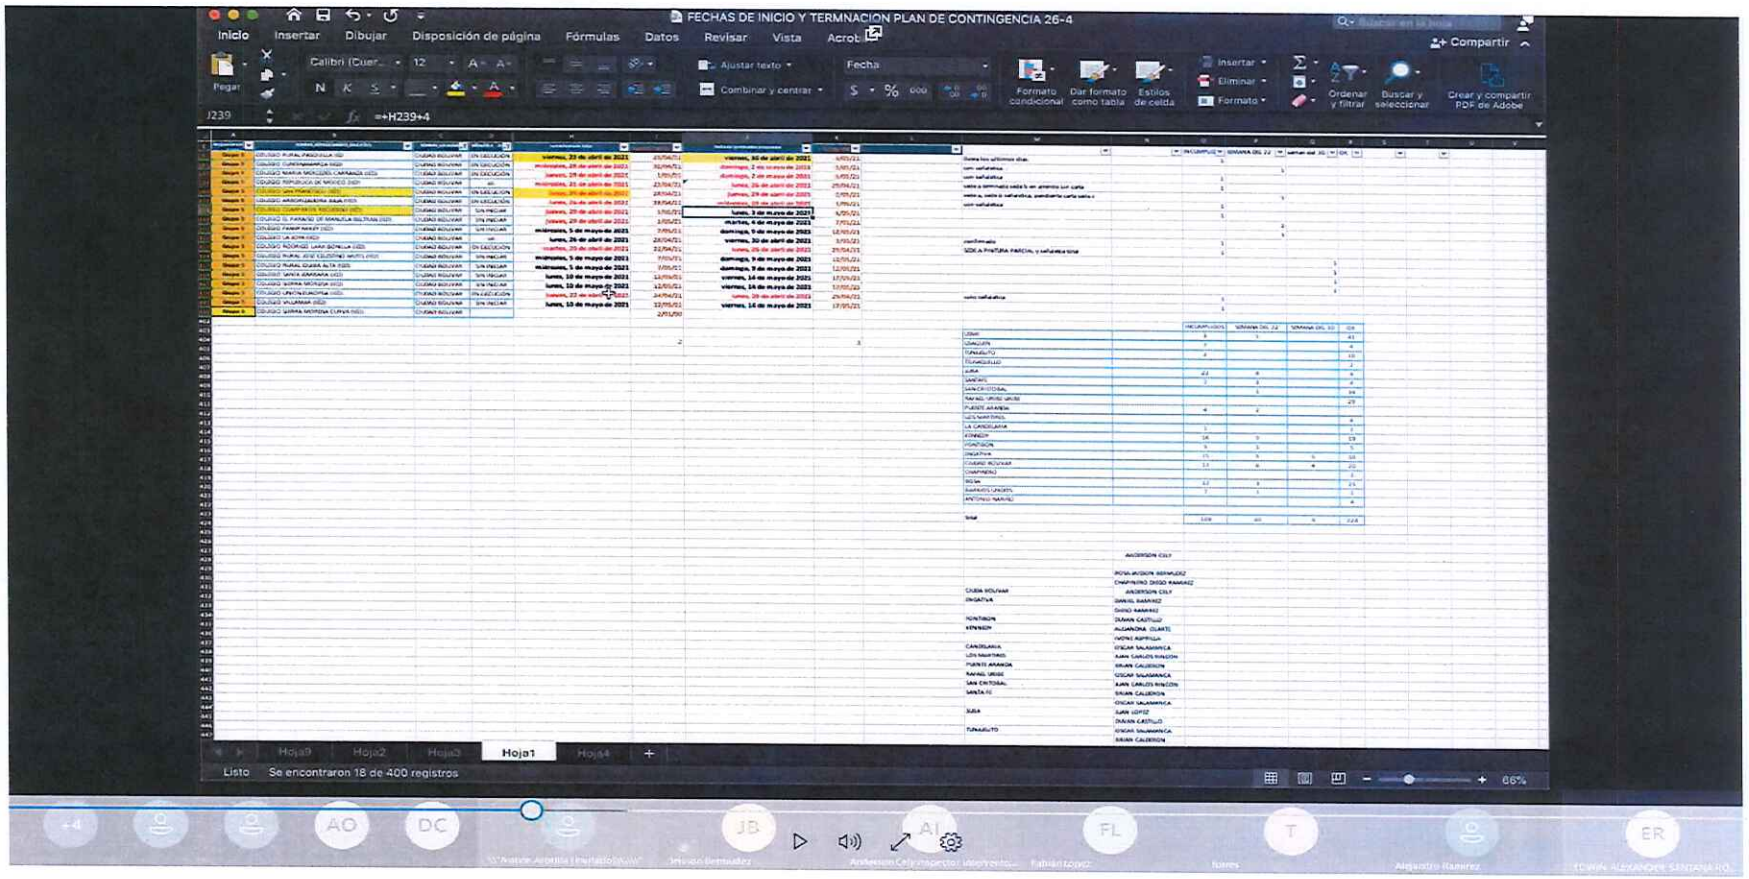

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


8196

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

Se continua con la localidad de Engativa la cual esta asignada a los inspectores Daniel Ramirez y Anderson Diego Ramirez, en los colegios acontinuacion se obtienen los datos de avances; Garces Navas Sede A termianda, Nidia Quintero de Turbay Terminada, republica de Mexico sede A termianda, La Joya Terminada, San Jose Norte terminada la señalizacion, se estan ejecutando; General Santander en ejecucion, La Palestina en ejcucion, Nueva Constitucion señalizacion con pintura, republica de China sede A falta señaletica, en la institucion Robert F. Kennedy no se va ejecutar ya que van a realizar actividades de obra civil.

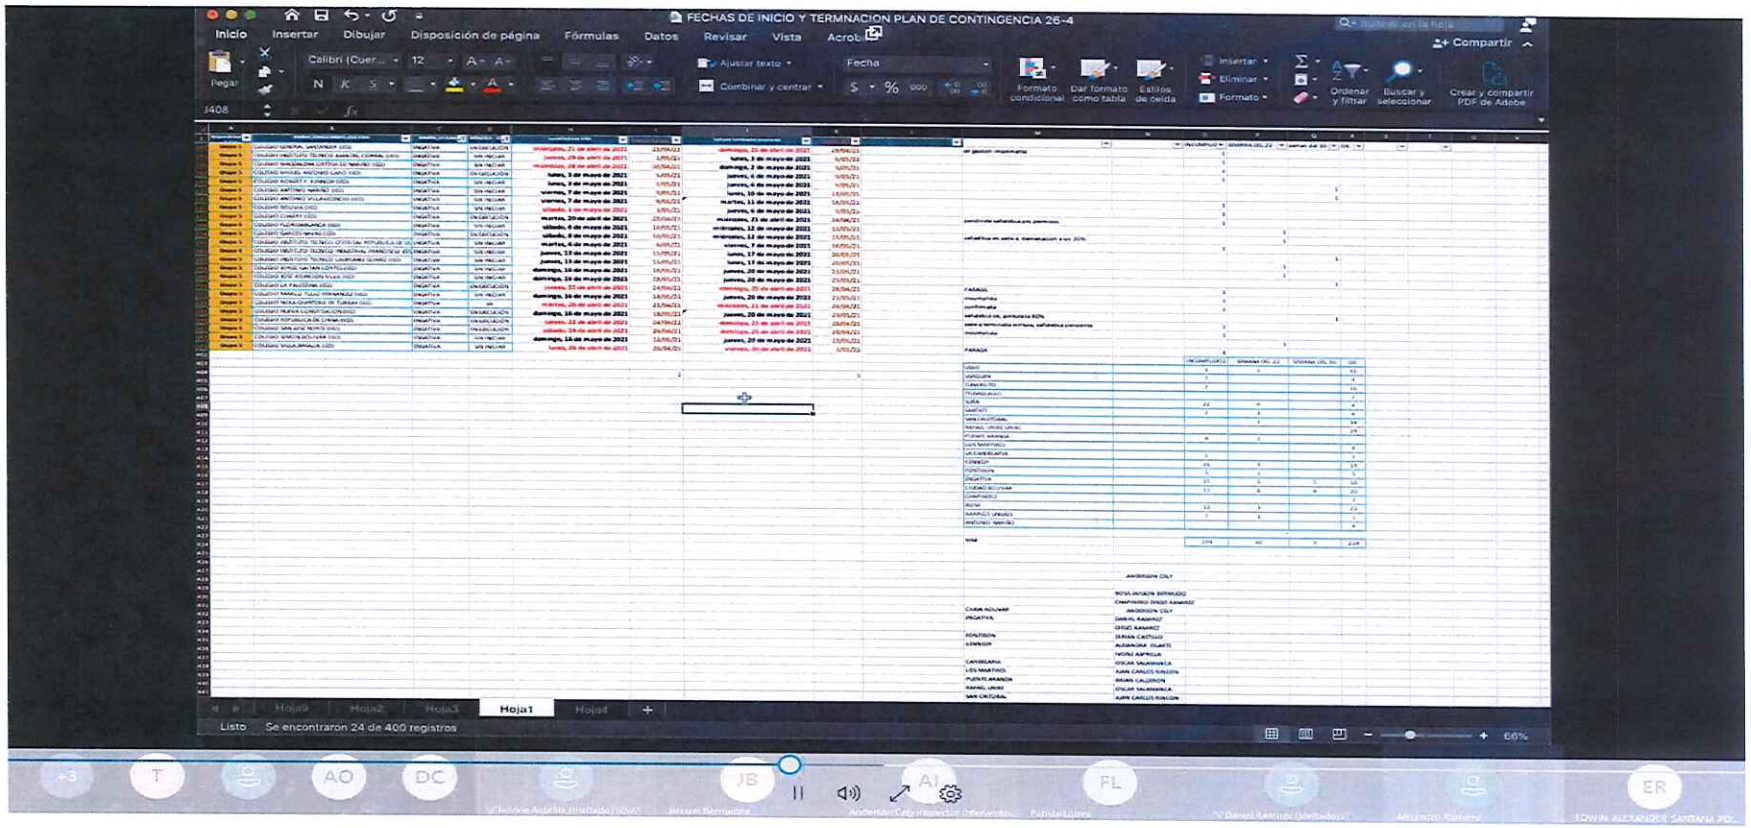


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

Se continua con la localidad de Kennedy la cual esta asignada a la inspectora Alejandra Olarte, en los colegios acontinuacion se obtienen los datos de avances; Manuel Cepeda Vargas termiando, Rodrigo de Triana sede A, B y C terminadas, Pablo VI termiando, Toms Adams sede A terminada, Codema ejecucion de señaletica, Fernando Soto Aparicio en ejecucion falta pintura en parte exterior por lluvias en el sector pendiente señaletica, Jakeline colegio pendiente por instalar señaletica, Toms Adams sede B pendiente señaletica, San Jose pendiente señaletica, dificulta de ingreso en el colegio Eduardo Umaña,

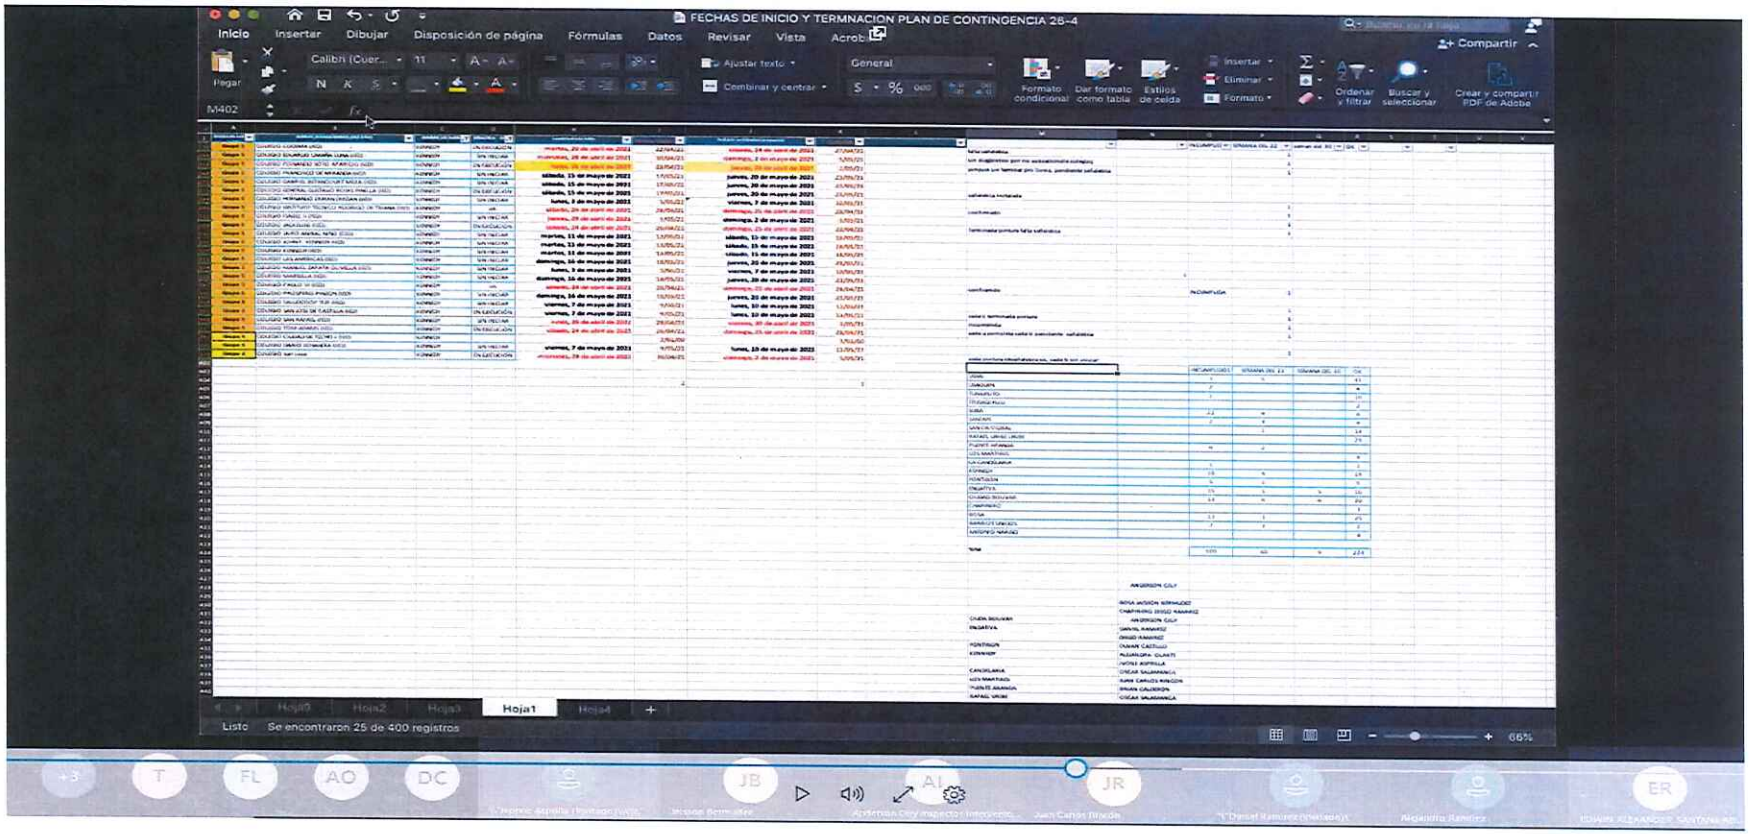


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

Se continua con la localidad de Puente Aranda la cual esta asignada a la inspectora Alejandra Olarte, en los colegios acontinuacion se obtienen los datos de avances; Culrura Polular inicain labores el dia 30 de abril, Jose Joaquin Casas inicia labores el dia 30 de abril, Julio Garavito sede A termina, B y C en gestion.

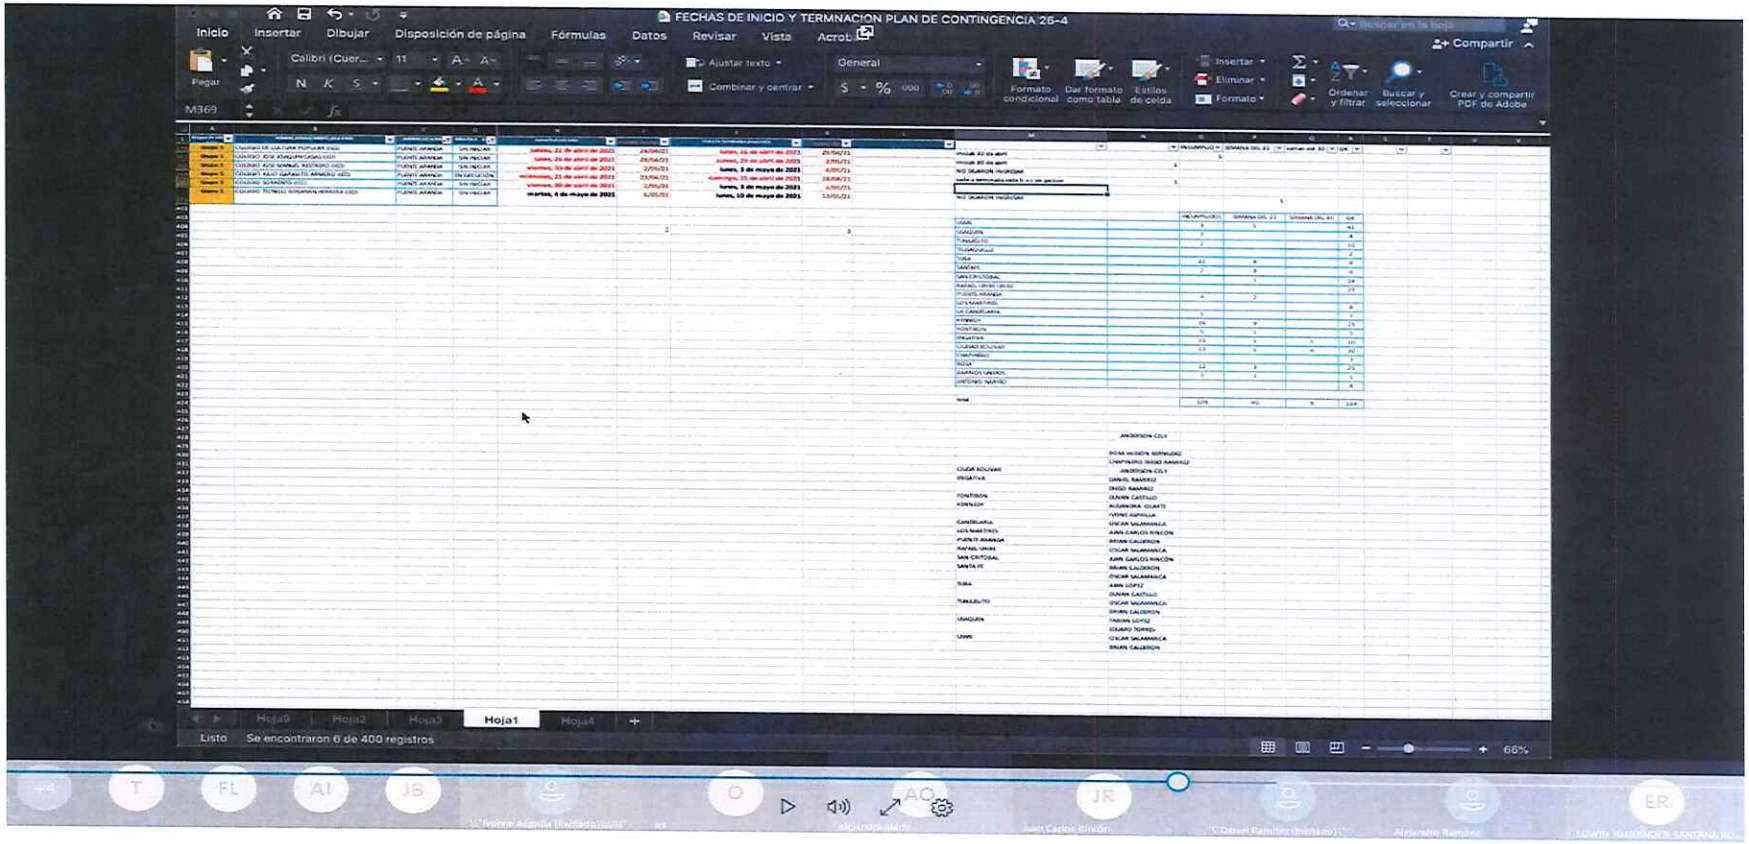

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


8199

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

Se continua con la localidad de Suba la cual esta asignada al residente Oscar Salamanca, en los colegios acontinuacion se obtienen los datos de avances; Ramon de Subiria pintura terminada falta señaletica, Telia Zapata terminada pintura falta señaletica, Filarmonico Jorge Mario Vergolio falta señaletica avanzo pintura, Nicolas Buenaventura no ha termiando señalizacion, Ventiun Angeles pintura terminada falta señaletica.

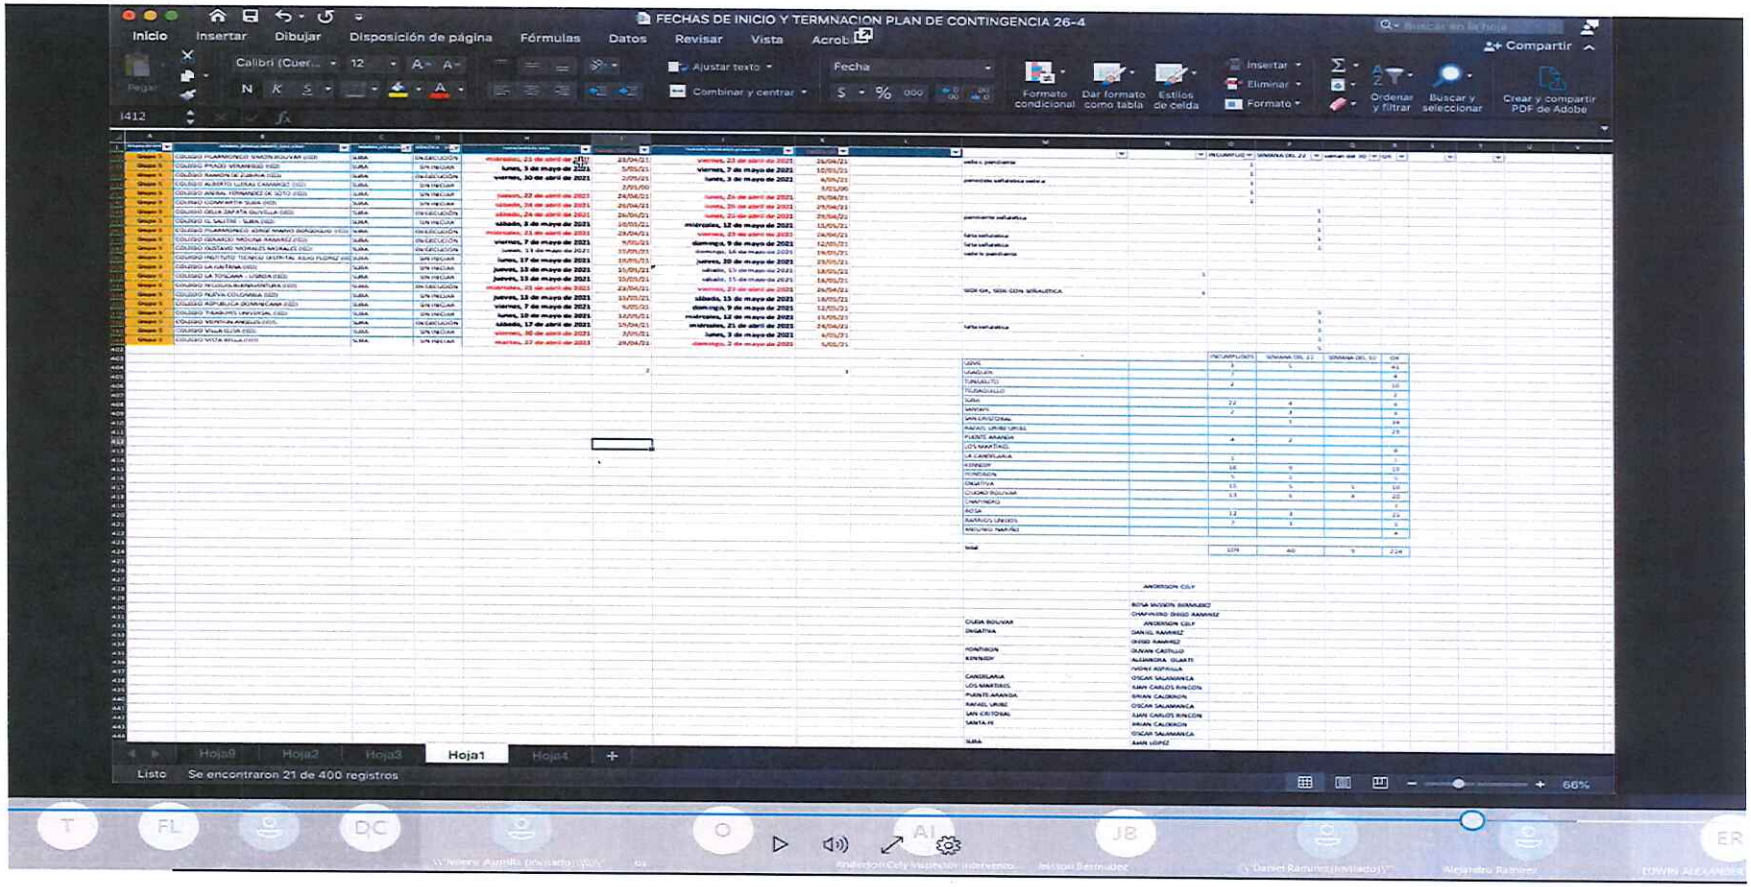


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

Se continua con la localidad de Tunjuelito la cual esta asignada al residente Oscar Salamanca, en los colegios acontinuacion se obtienen los datos de avances; colegio Isla del sol no se ha podido intervenir.

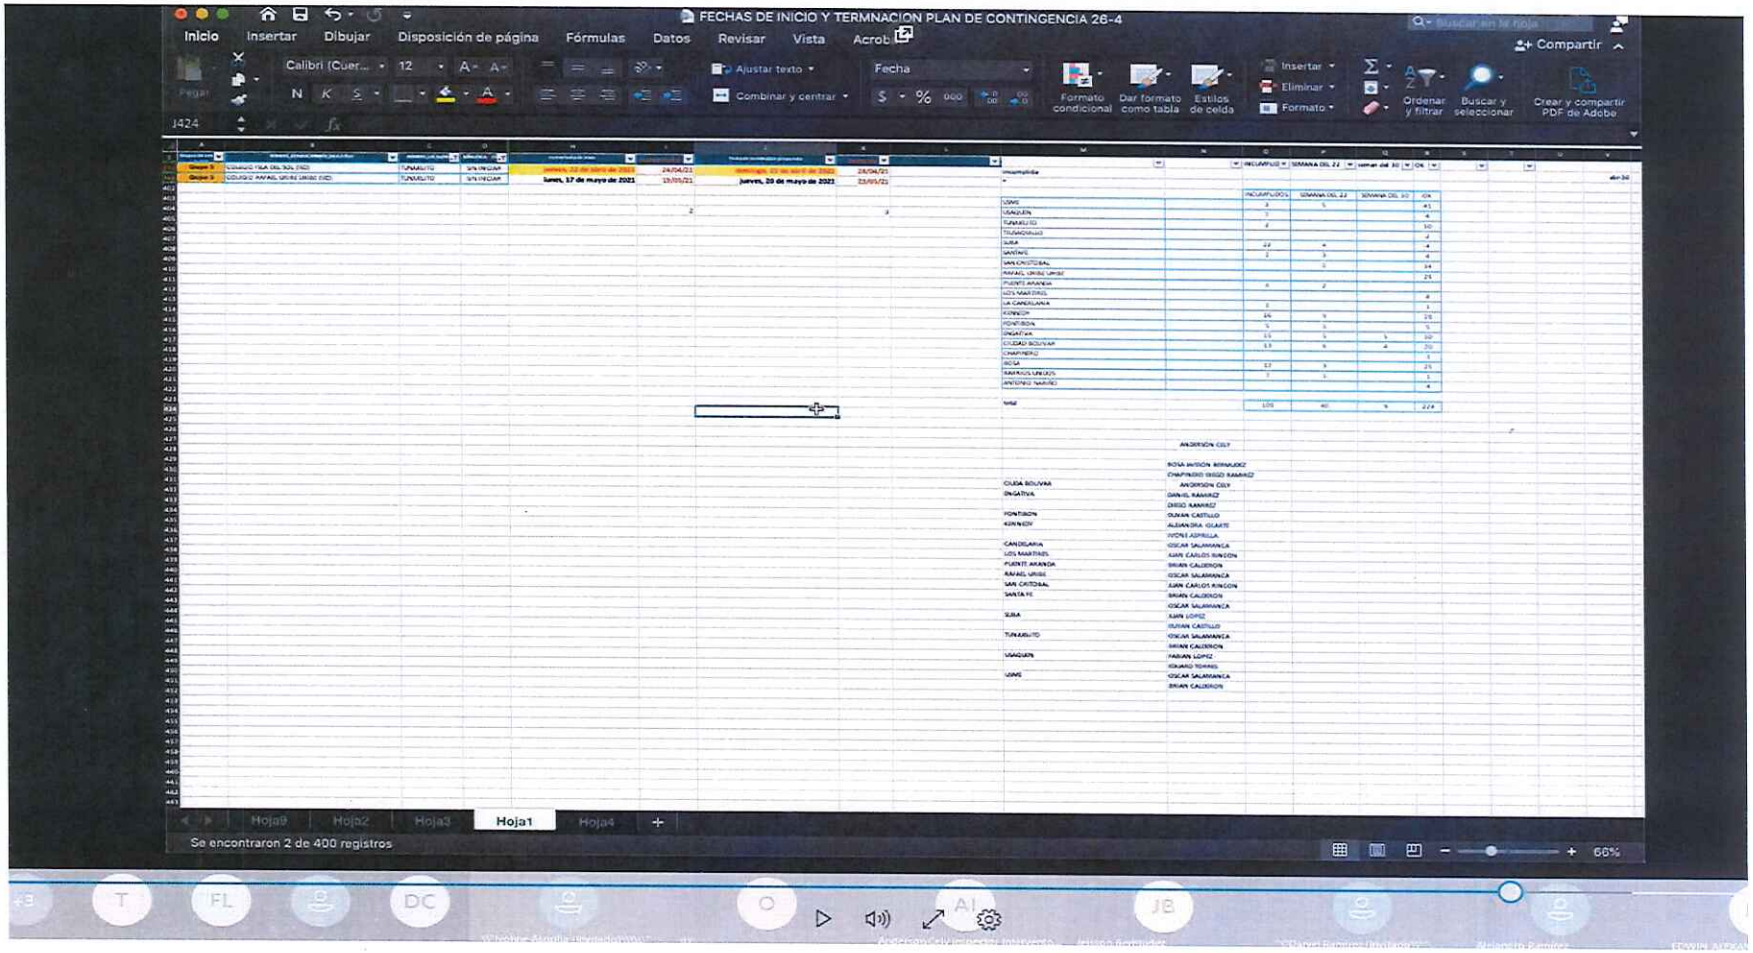


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

Se continua con la localidad de Usaquen la cual esta asignada al inspector Fabian Lopez, en los colegios acontinuacion se obtienen los datos de avances; colegio Isla del sol no se ha podido intervenir, Cristobal Colon sede A y C se esta interviniendo aun no cuenta con señaletica.

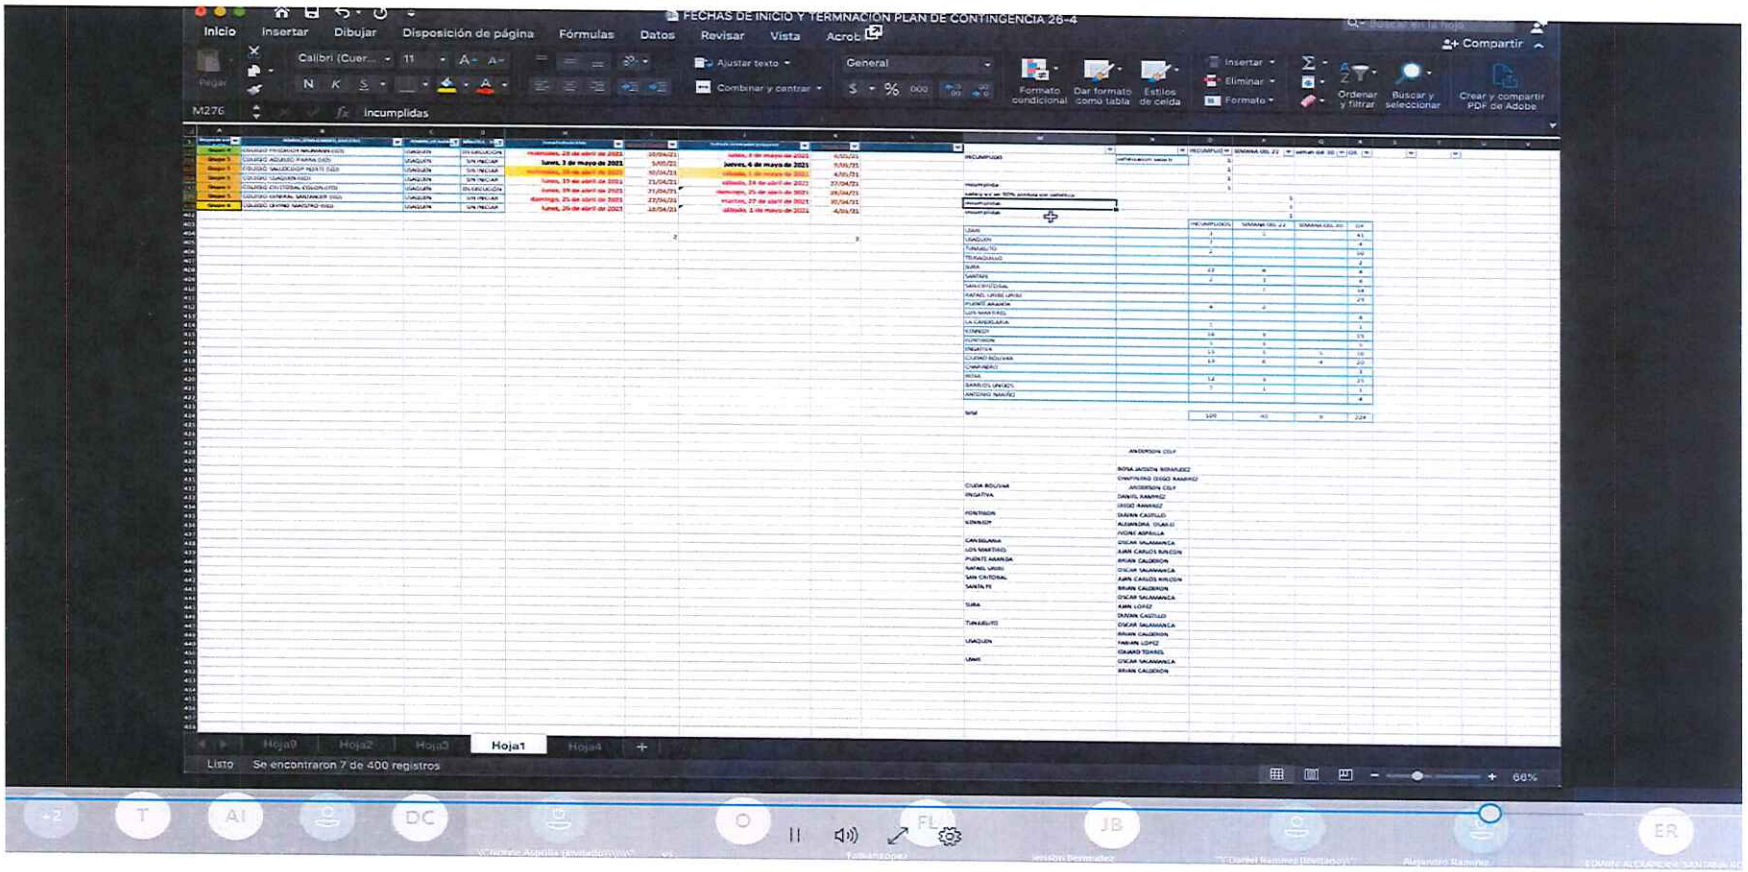


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

Se continua con la localidad de Usme la cual esta asignada al residente Oscar Salamanca, donde se menciona por parte del arquitecto que se debe intervenir porntamente la localidad y de esta manera terminarla.

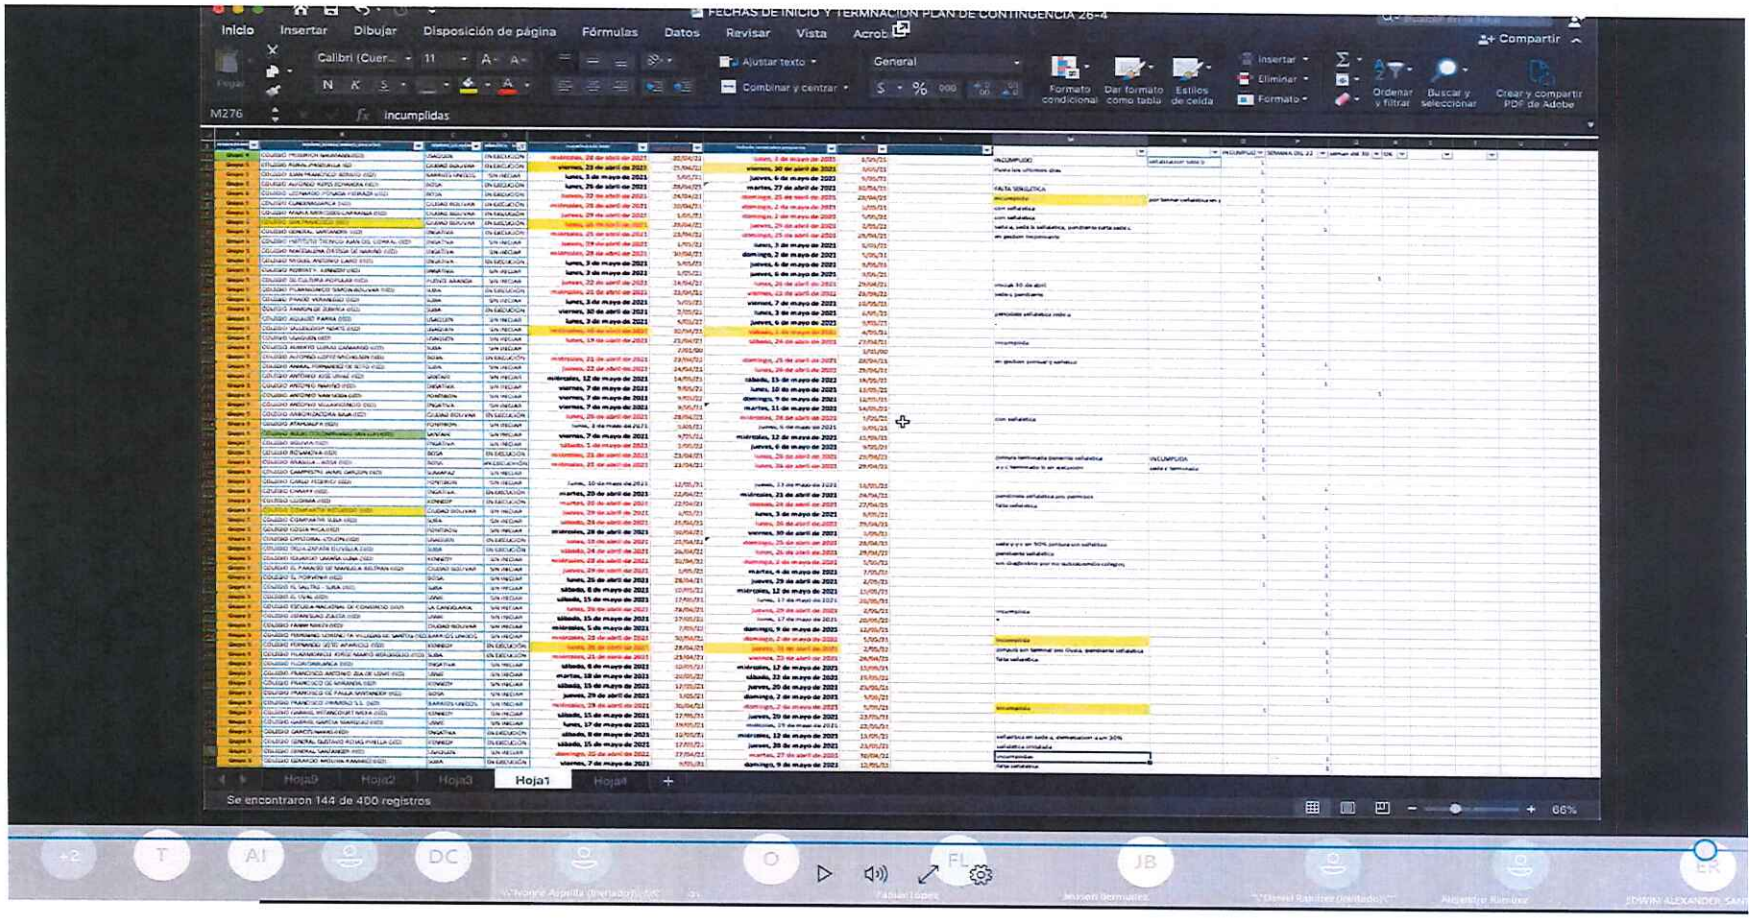

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

8203

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°11

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Reunión el día 30 de abril de 2021 para realizar el costeo pendiente.	AC2R Residente Juan Rincon	30 de Abril del 2021

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES:

Se realizo la actualización de la matriz de los colegio en donde se evaluo el estado de ejecución de los colegio marcando los que ya se habían ejecutado completamente, los que están en ejecución y los que no han empezado trabajo para saber cuales de estos están incumpliendo las fechas asignadas en la programación inicial y de esta menera hacer la gestión para su pronta ejecución.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: 2 de Mayo del 2021
HORA: 8 :30 PM
LUGAR: Microsoft Teams

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

8209

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

FECHA:04 Mayo 2021 **HORA: 8 : 36 pm** **LUGAR: Microsoft Teams**

SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AVANCES SEÑALIZACION Y SEÑALETICA

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Edwin Alexander Santana Rodriguez	Profesional especialista, supervisor del contrato.	SED	
2. Karen Julieth Rivera Suarez	Aux. Ing. SED	SED	
3. Oscar Salamanca	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
4. Juan Carlos Rincon	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
5. Jesus Ramirez	Residente contratista	Construsocial	
6. Dayron Caro	Contratista	Construsocial	
7. Duvan Guanumen	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
8. Braya Calderon	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
9. Ivone Asprilla	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
10. Fabian Lopez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
11. Daniel Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
12. Anderson Cely	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
13. Diego Alejandro Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
14. Jeison Bermudez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
15. Alejandra Olarte	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

DESARROLLO:

Se da inico a la reunión la cual en primera instancia se verifica la localidad de Barrios Unidos la cual corresponde al inspector Diego Ramirez, e informa que los colegios Panama se terminaron, Tomas carrasquilla se acaba el dia 5 de mayo del 2021 y se inicia a intervenir el colegio Heladia Mejia junto Francisco Primero el dia 5 de mayo del 2021.

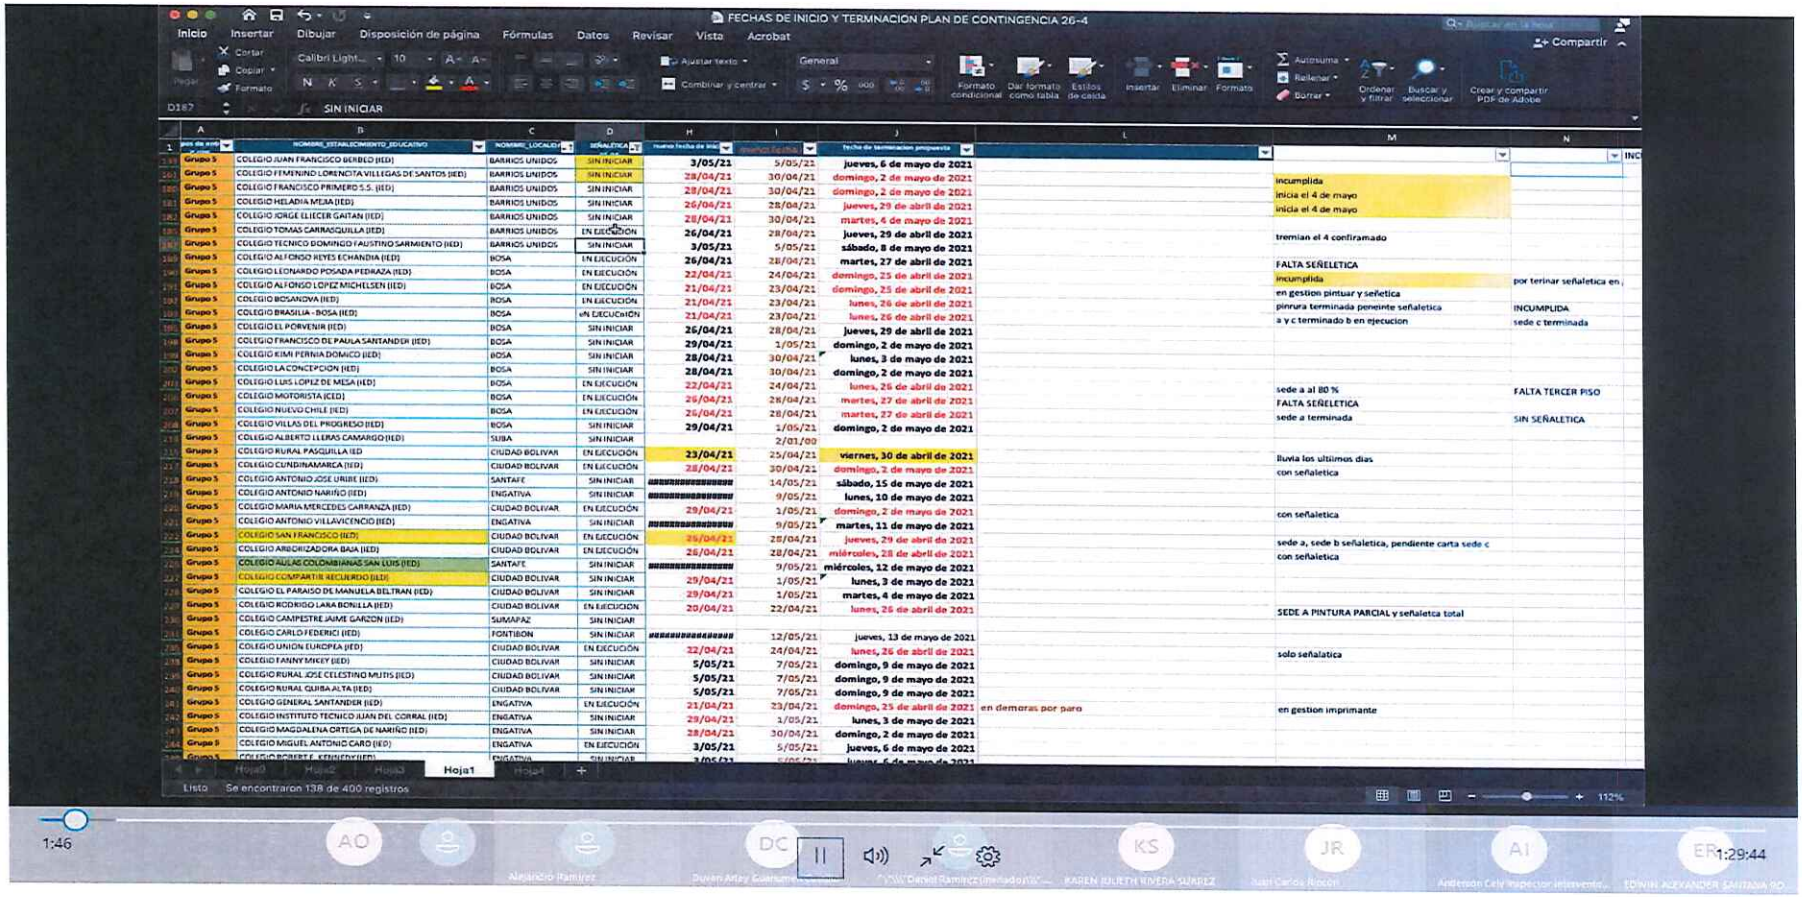


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

Se continua con la localidad de Ciudad Bolivar la cual corresponde al inspector Anderson Cely y el reporta que en el colegio San Francisco sede B el grupo de aseo inicio con labores y cuando llegaron las cuadrillas a demarcar no se pudo ya que la superficie se encontraba mojada, colegio Union Europea se inicia ejecucion de demarcacion ya cuenta con señaletica y no se realizan mas avances en esta localidad. Y se programa para realizar la ejecucion de Leon de Greiff en esta misma semana.

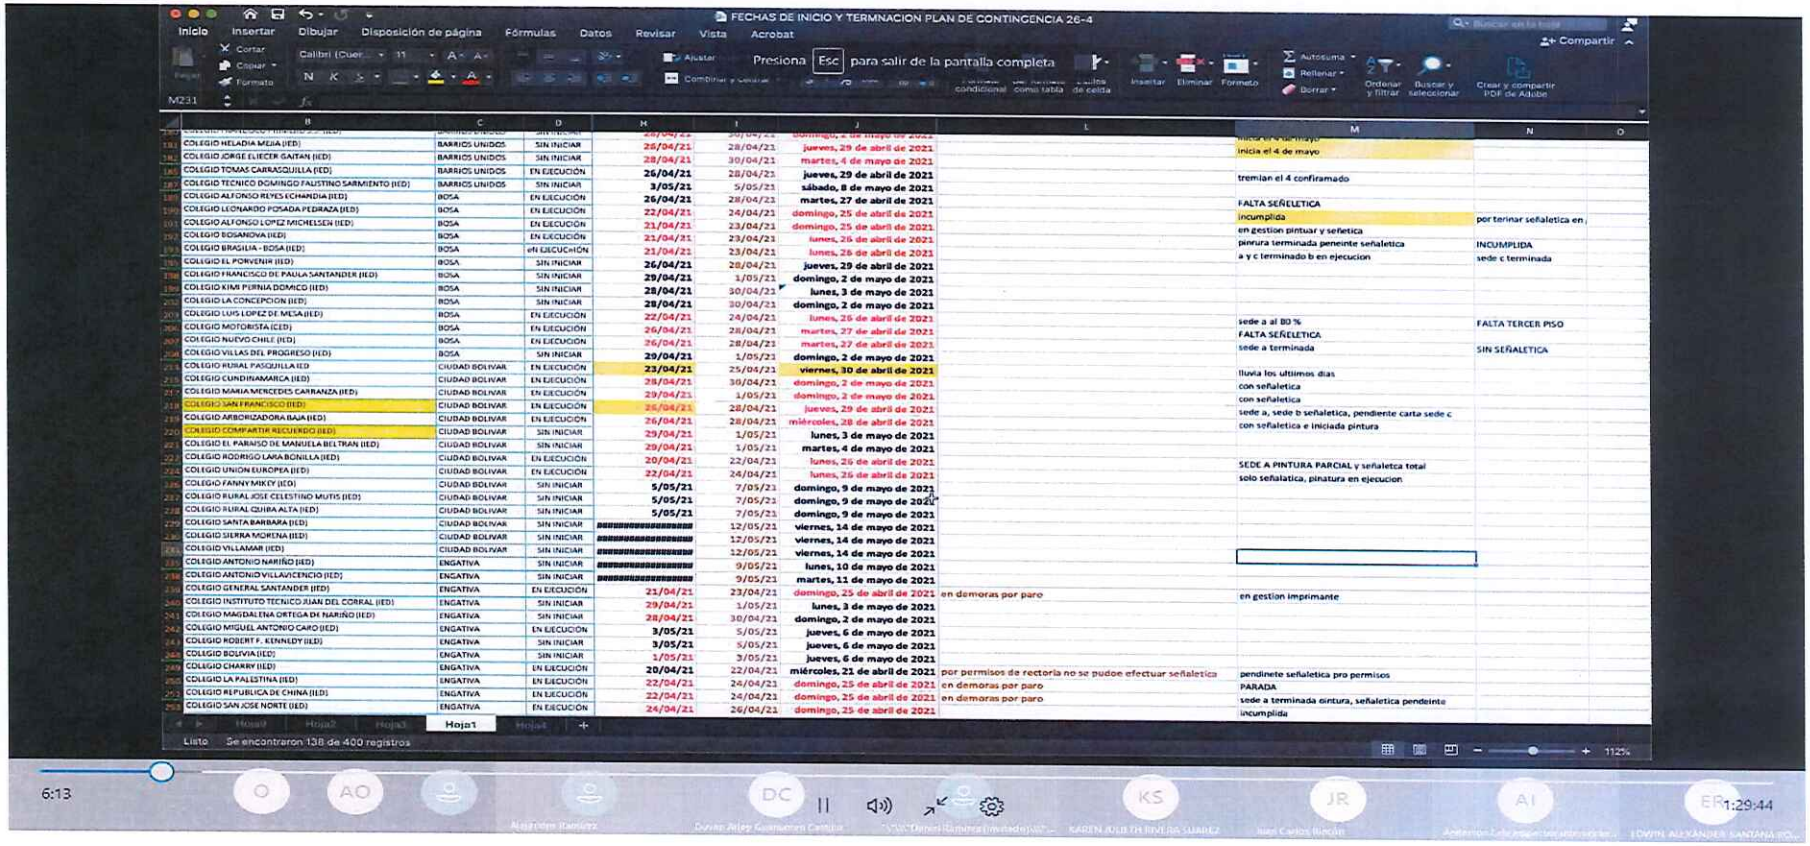


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

Los colegios que se ven subrayados y de color amarillo oscuro a continuacion son colegios que en el momento no se han terminado y se encuentran como prioridad ya que no estan cumpliendo las fechas estipuladas. El contratista se compromete a ingresar mas personal como plan de contingencia ya que por temas covid no dan abasto con el personal que en este momento cuentan.

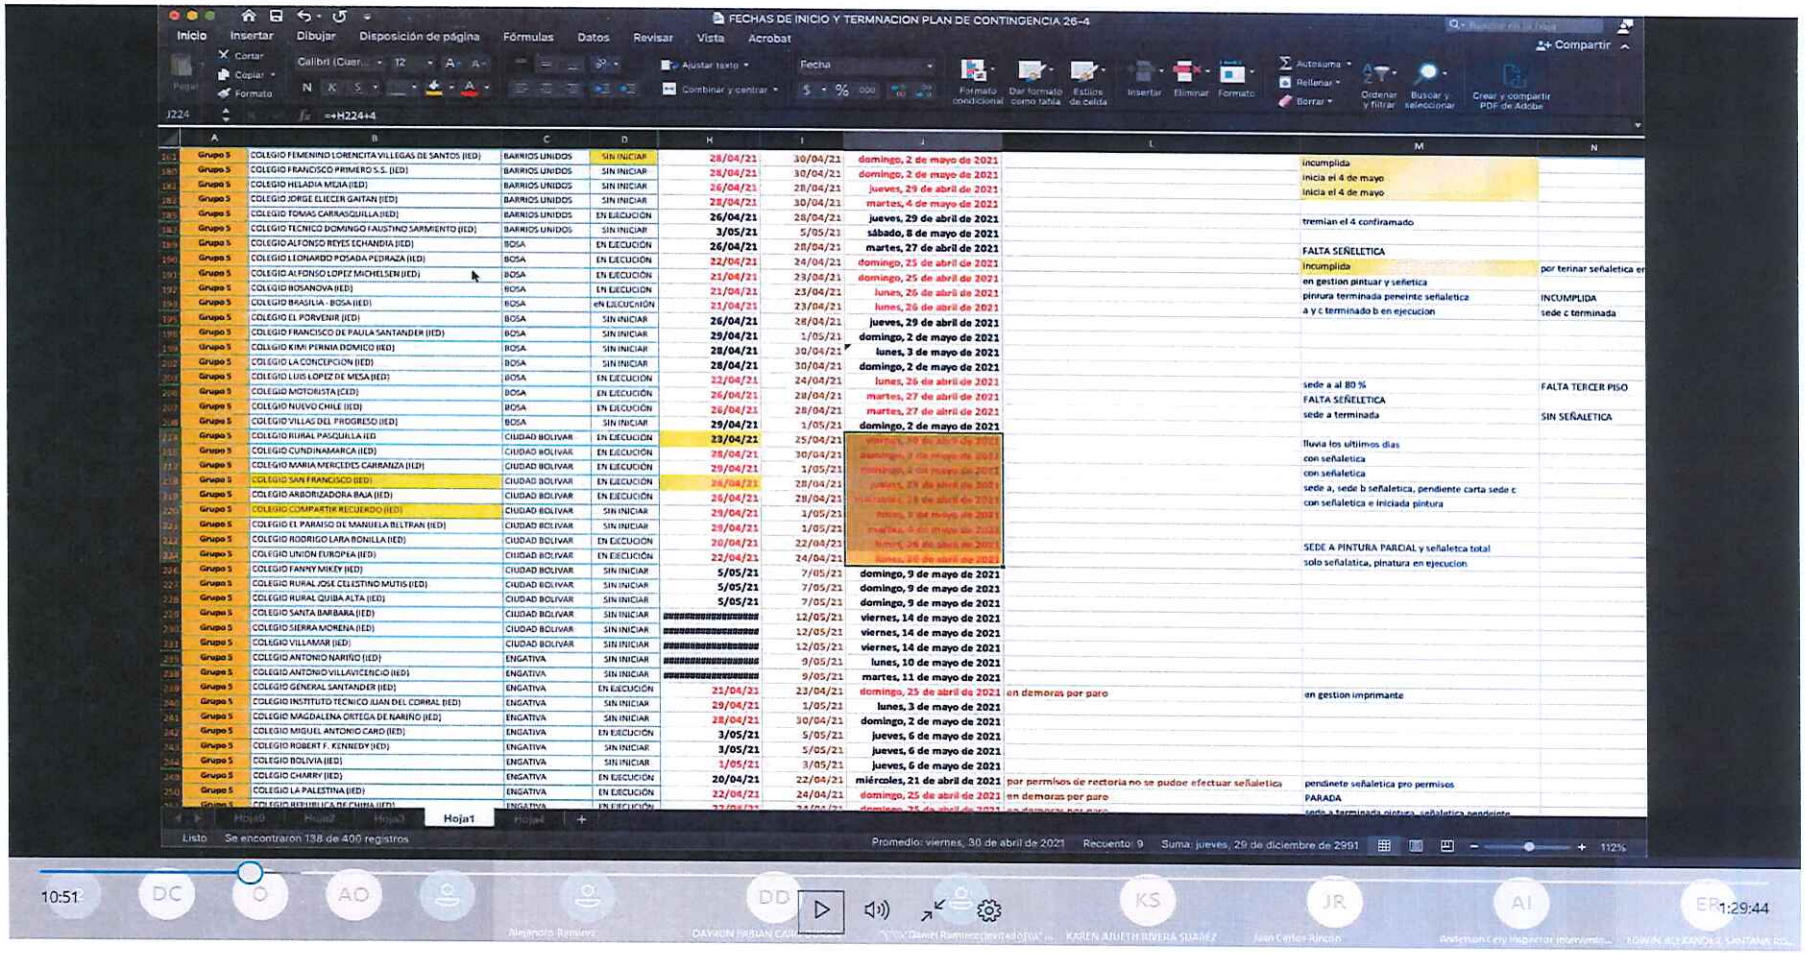


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

Se continua con la localidad de Bosa que corresponde al inspector Jeison Bermudez y reporta que los colegios alfonso Lopez Michelsen tienen retraso por falta de material, el colegio Luis Lopez de mesa terminado.

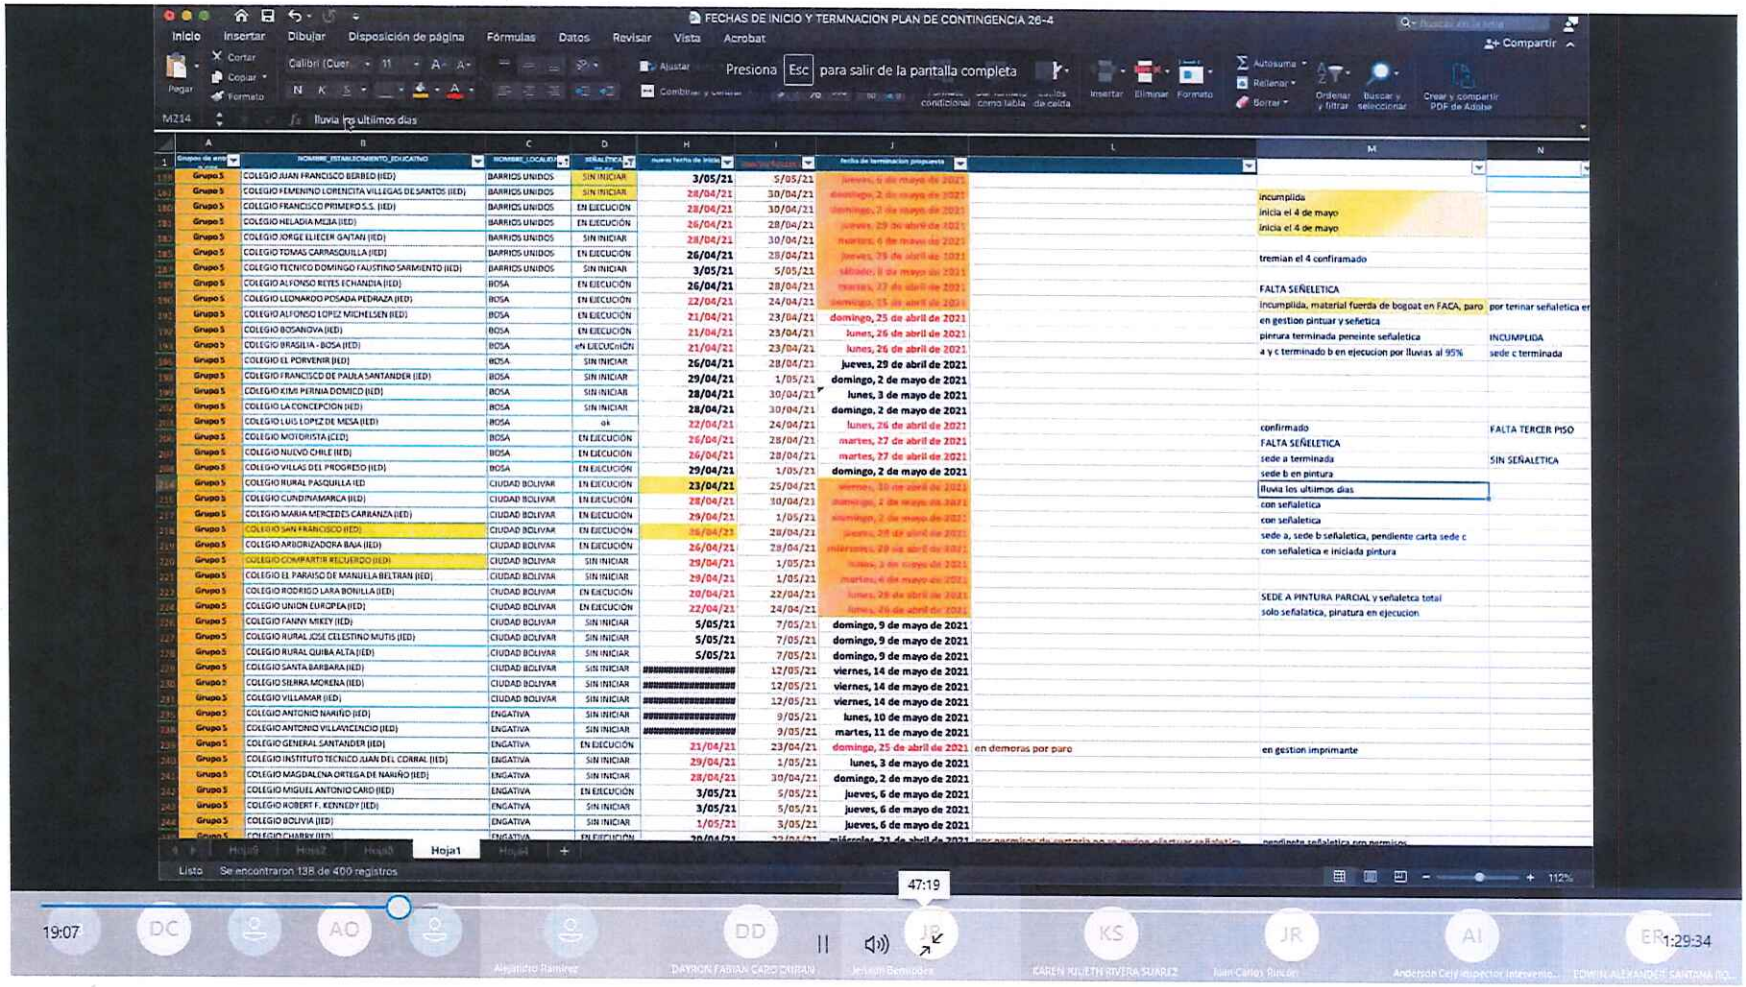

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


8209

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

En la localidad de Engativa se reporta colegio Juan del Corral en ejecucion con señaletica al 100 % falta pintura, colwgio Miguel Antonio Caro en ejecucion con señaletica al 100 % falta pintura, colegio Robert F Kennedy no se realizara demarcacion ya que el piso de ese colegio se le va a realizar obra civil, y se realizan unas notas a colegios que ya contaban con señaletica.

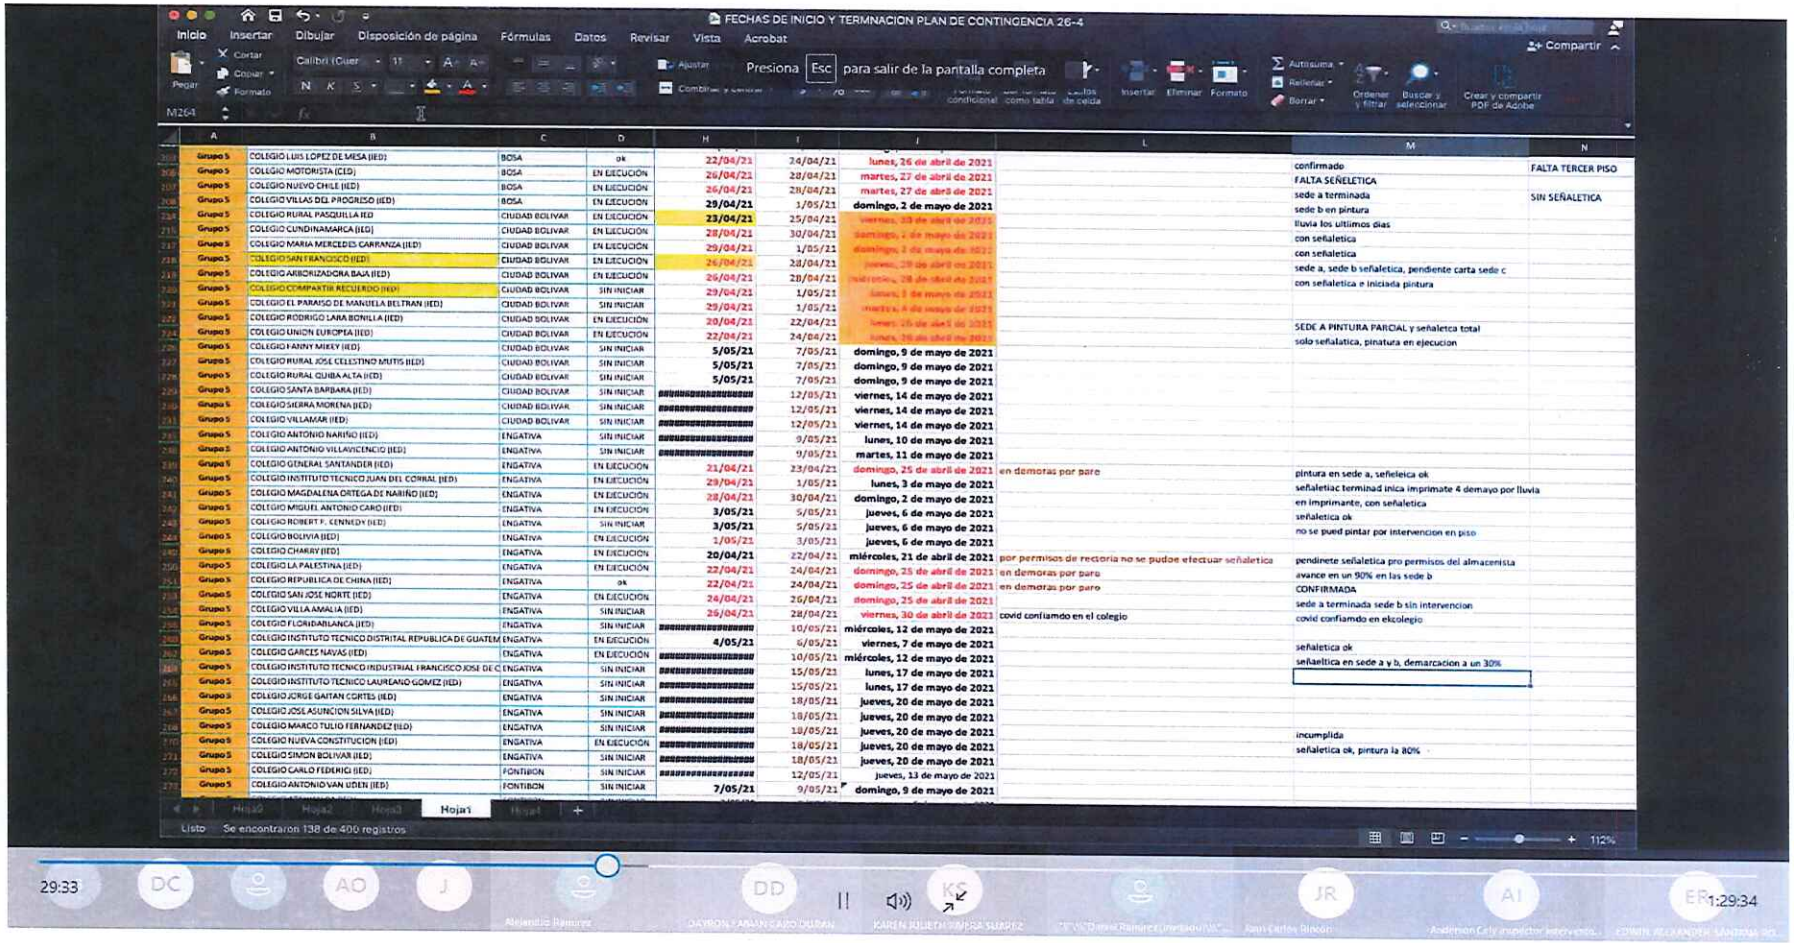


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

Se continua con la localidad de Kennedy que corresponde a la inspectora Alejandra Olartese y reporta que el colegio fernando Soto Aparicio terminado, colegio Isabel II no se a podido iniciar por lluvia, colegio San Jose sede B terminado, colegio Manuel Zapata Olivella en ejecucion.

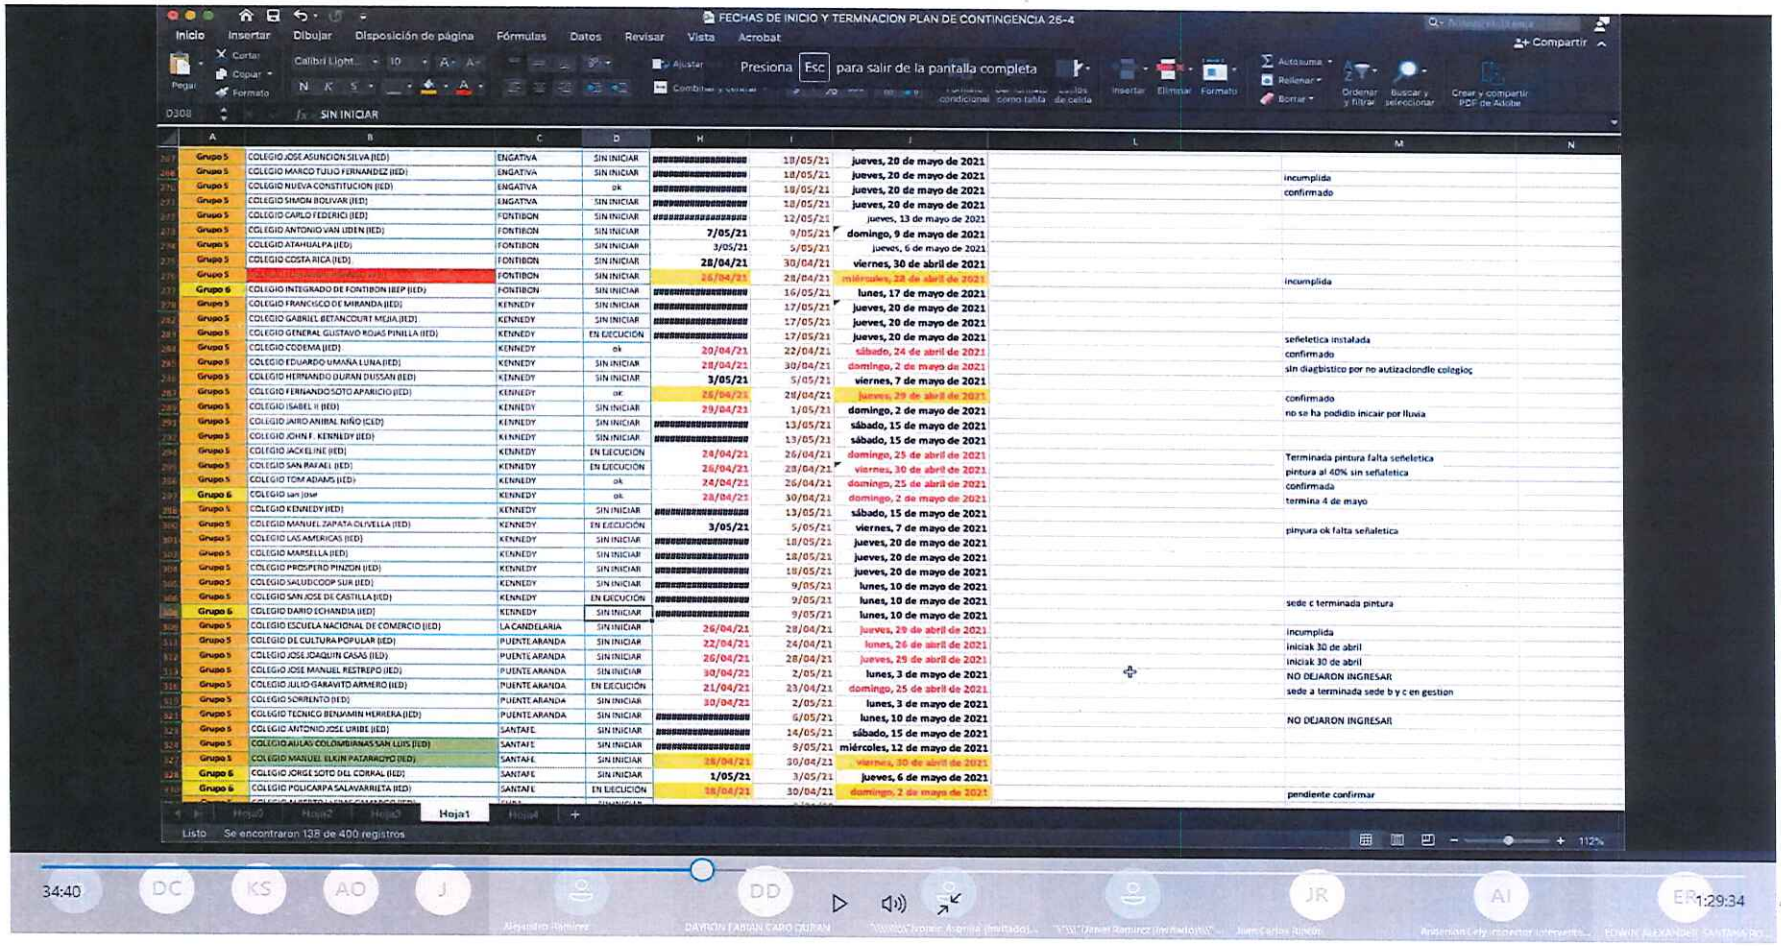


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12


En la localidad de Candelaria el colegio Escuela Nacional de Comercio no se ha podido realizar por orden publico cerca a la institucion.

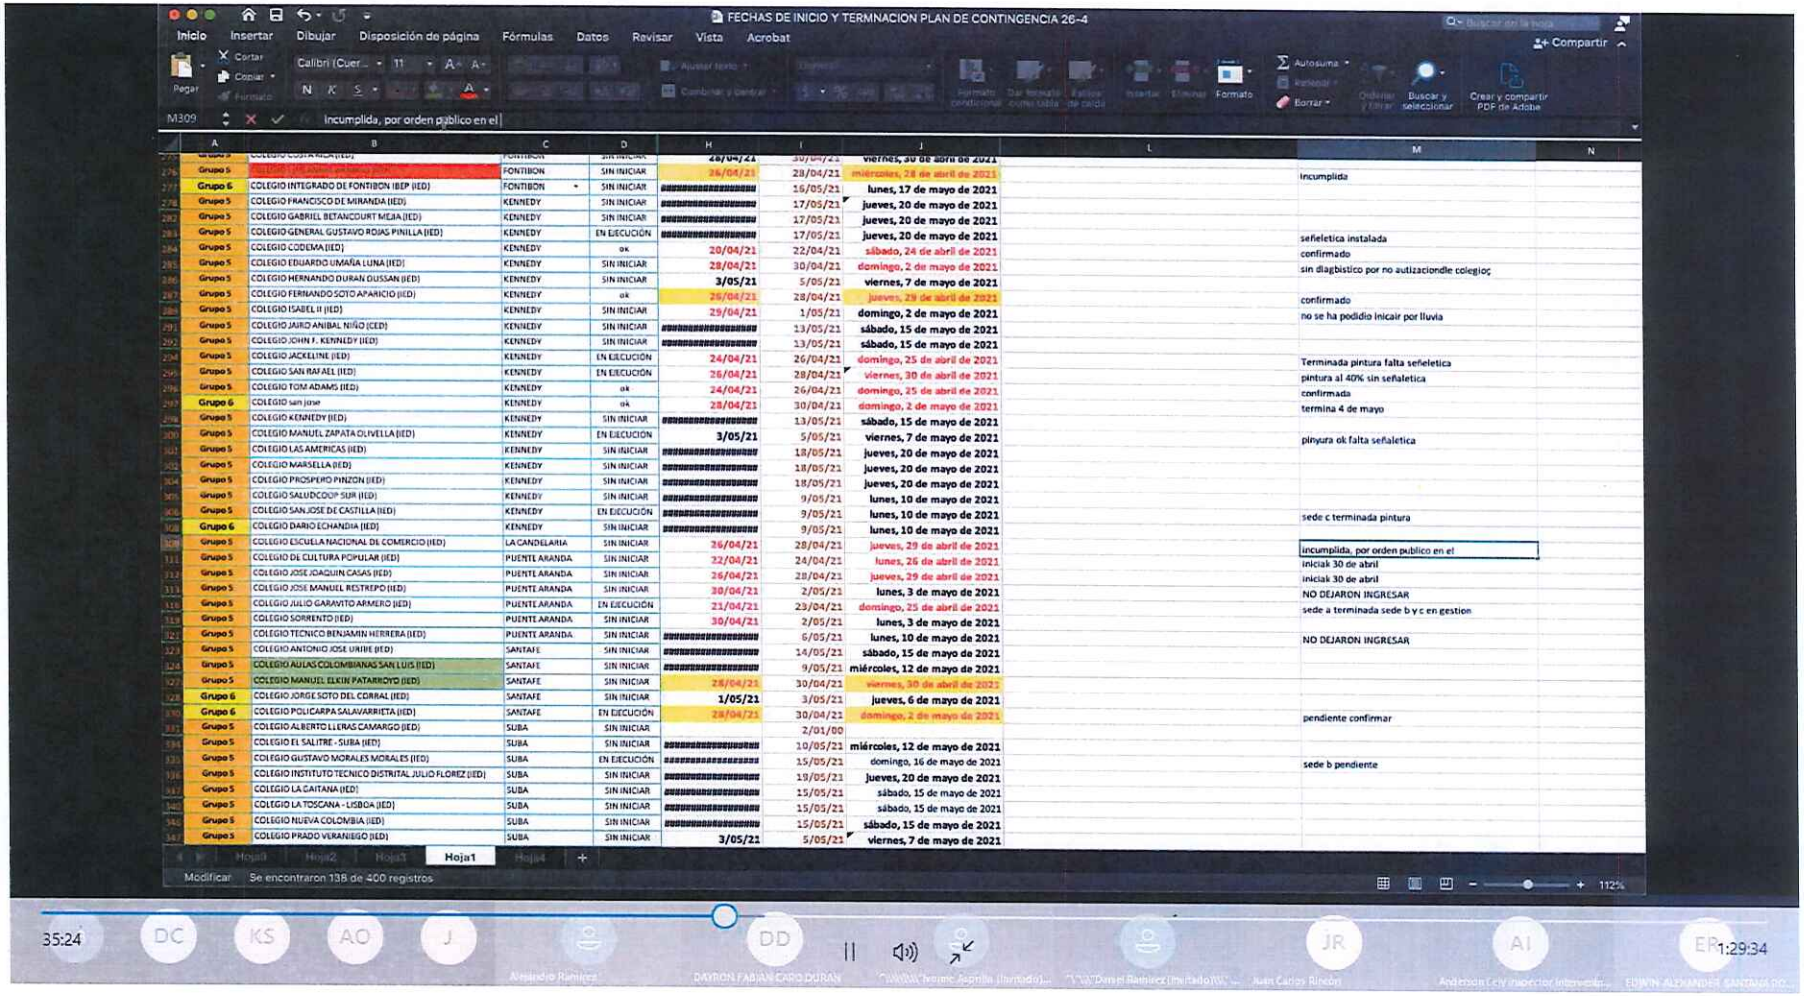

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

Continuando con la localidad de Puente Aranda no se obtienen modificacion alguna en la matriz ya que en esta localidad no se intervino.

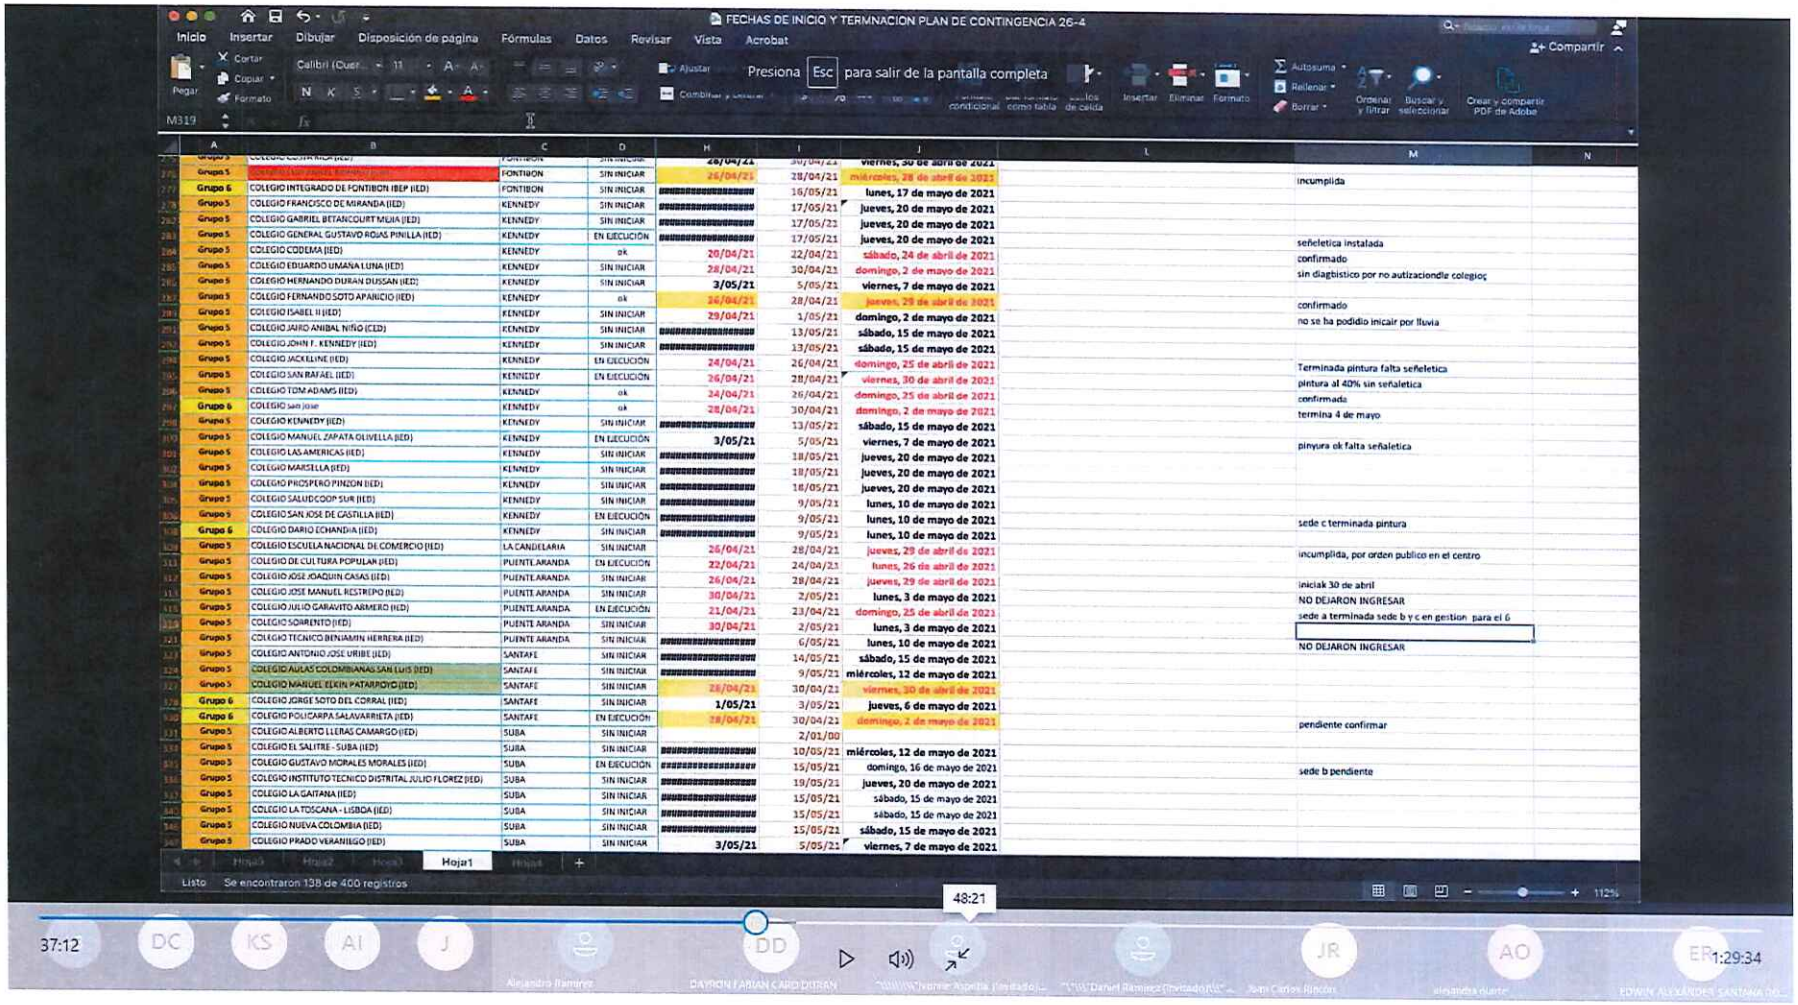


Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

En la localidad de Santa Fe no se pudo iniciar los colegios por lluvia y por orden publico en esta localidad.

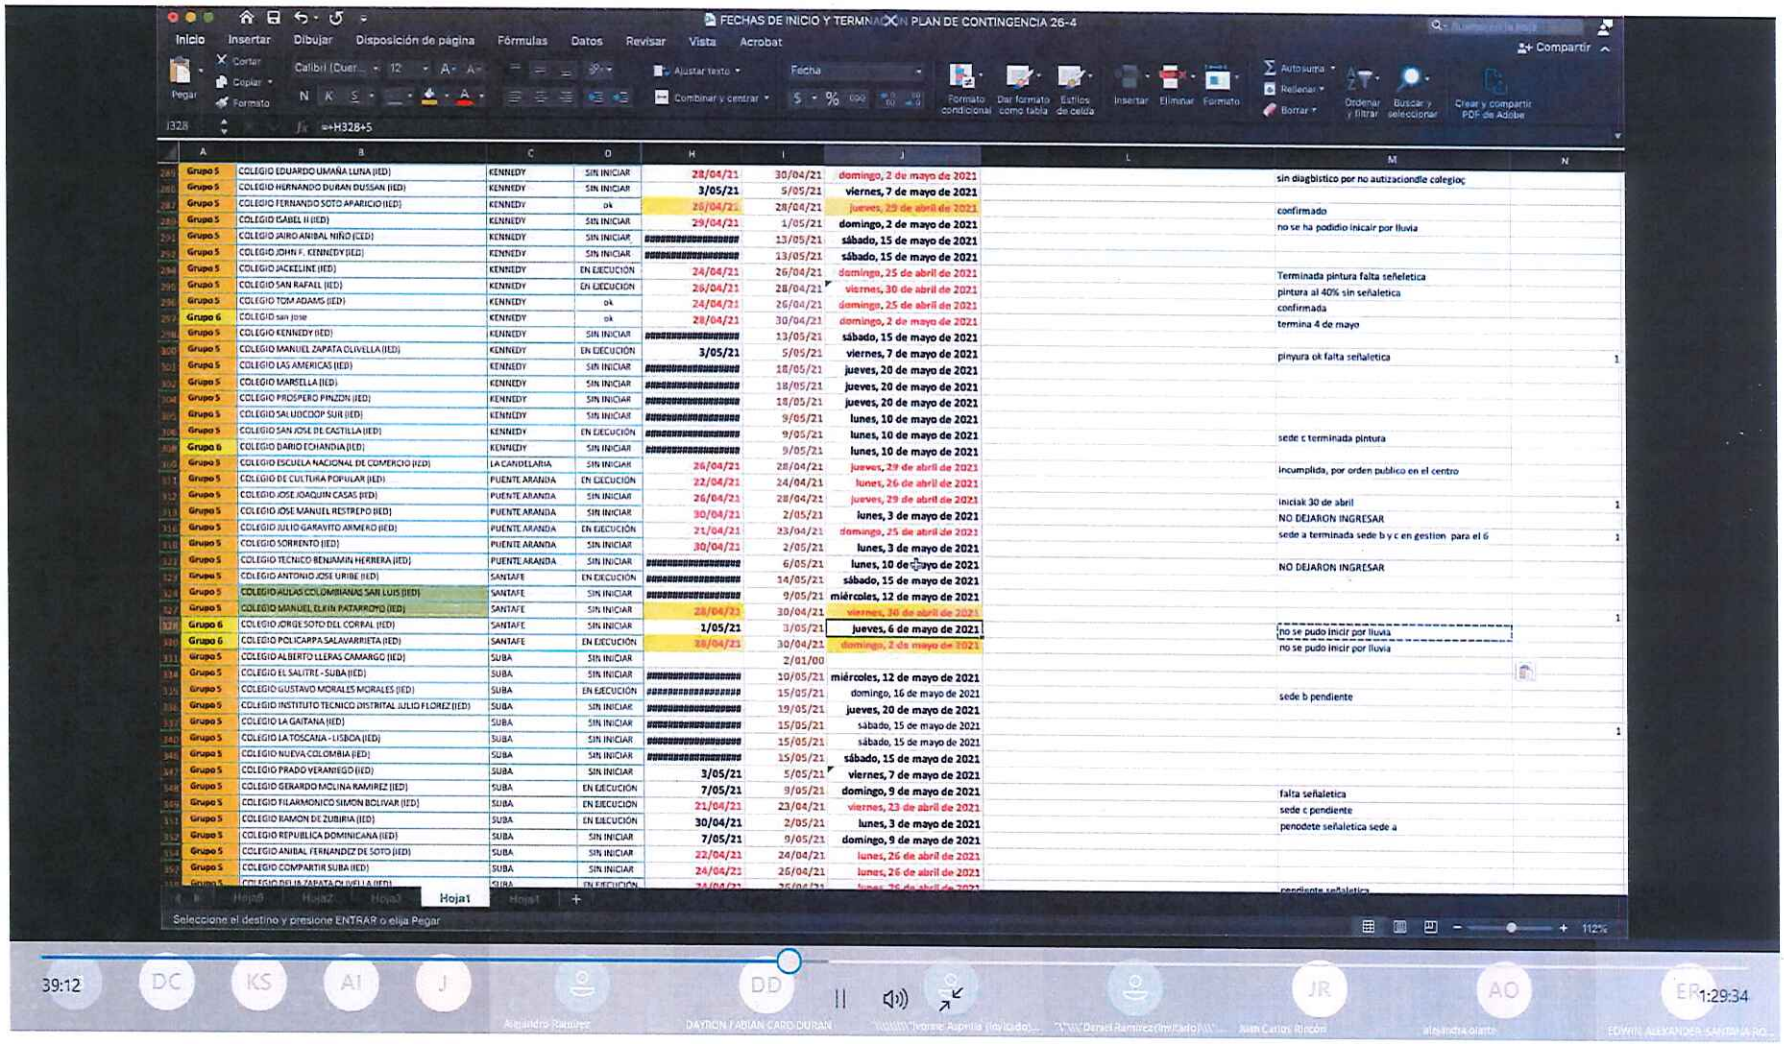


Grupo 5	COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	28/04/21	30/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021	sin diagbistico por no autizacion de colegioç	
Grupo 5	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	3/05/21	5/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	KENNEDY	ok	26/04/21	28/04/21	jueves, 29 de abril de 2021	confirmado	
Grupo 5	COLEGIO ISABEL II (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	29/04/21	1/05/21	domingo, 2 de mayo de 2021	no se ha podidio inicair por lluvia	
Grupo 5	COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)	KENNEDY	SIN INICIAR	##########	13/05/21	sábado, 15 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	##########	13/05/21	sábado, 15 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO JACKELINE (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	24/04/21	26/04/21	domingo, 25 de abril de 2021	Terminada pintura falta señaletica	
Grupo 5	COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	26/04/21	28/04/21	viernes, 30 de abril de 2021	pintura al 40% sin señaletica	
Grupo 5	COLEGIO TOM ADAMS (IED)	KENNEDY	ok	24/04/21	26/04/21	domingo, 25 de abril de 2021	confirmada	
Grupo 6	COLEGIO san jose	KENNEDY	ok	28/04/21	30/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021	termina 4 de mayo	
Grupo 5	COLEGIO KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	##########	13/05/21	sábado, 15 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	3/05/21	5/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021	pinyura ok falta señaletica	1
Grupo 5	COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	##########	18/05/21	jueves, 20 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO MARSELLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	##########	18/05/21	jueves, 20 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	##########	18/05/21	jueves, 20 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	##########	9/05/21	lunes, 10 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	##########	9/05/21	lunes, 10 de mayo de 2021		
Grupo 6	COLEGIO DARIO ECHANDIA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	##########	9/05/21	lunes, 10 de mayo de 2021	sede c terminada pintura	
Grupo 5	COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED)	LA CANDELARIA	SIN INICIAR	26/04/21	28/04/21	jueves, 29 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	EN EJECUCION	22/04/21	24/04/21	lunes, 26 de abril de 2021	incumplida, por orden publico en el centro	
Grupo 5	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	26/04/21	28/04/21	jueves, 29 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	30/04/21	2/05/21	lunes, 3 de mayo de 2021	inicialk 30 de abril	1
Grupo 5	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	EN EJECUCION	21/04/21	23/04/21	domingo, 25 de abril de 2021	NO DEJARON INGRESAR	
Grupo 5	COLEGIO SORRENTO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	30/04/21	2/05/21	lunes, 3 de mayo de 2021	sede a terminada sede b y c en gestion para el 6	1
Grupo 5	COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	##########	6/05/21	lunes, 10 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	SANTAFE	EN EJECUCION	##########	14/05/21	sábado, 15 de mayo de 2021	NO DEJARON INGRESAR	
Grupo 5	COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	##########	9/05/21	miércoles, 12 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	28/04/21	30/04/21	viernes, 30 de abril de 2021		
Grupo 6	COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	1/05/21	3/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021		1
Grupo 6	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	SANTAFE	EN EJECUCION	28/04/21	30/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021	no se pudo inicir por lluvia	
Grupo 5	COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR		2/01/00		no se pudo inicir por lluvia	
Grupo 5	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	##########	10/05/21	miércoles, 12 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	SUBA	EN EJECUCION	##########	15/05/21	domingo, 16 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR	##########	19/05/21	jueves, 20 de mayo de 2021	sede b pendiente	
Grupo 5	COLEGIO LA GAITANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	##########	15/05/21	sábado, 15 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	##########	15/05/21	sábado, 15 de mayo de 2021		1
Grupo 5	COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	##########	15/05/21	sábado, 15 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	3/05/21	5/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	SUBA	EN EJECUCION	7/05/21	9/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	SUBA	EN EJECUCION	21/04/21	23/04/21	viernes, 23 de abril de 2021	falta señaletica	
Grupo 5	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	SUBA	EN EJECUCION	30/04/21	2/05/21	lunes, 3 de mayo de 2021	sede c pendiente	
Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	7/05/21	9/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021	penodete señaletica sede a	
Grupo 5	COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	22/04/21	24/04/21	lunes, 26 de abril de 2021		
Grupo 5	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	24/04/21	26/04/21	lunes, 26 de abril de 2021		

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

Se realiza una aclaracion haciendo enfasis que el contratista no esta siendo responsable en el cobro de los colegios y asi es imposible que la interventoria pague sin actas de cobro que debe realizar el contratista.

Se continua con la localidad de Fontibon la cual no se ha intervenido.

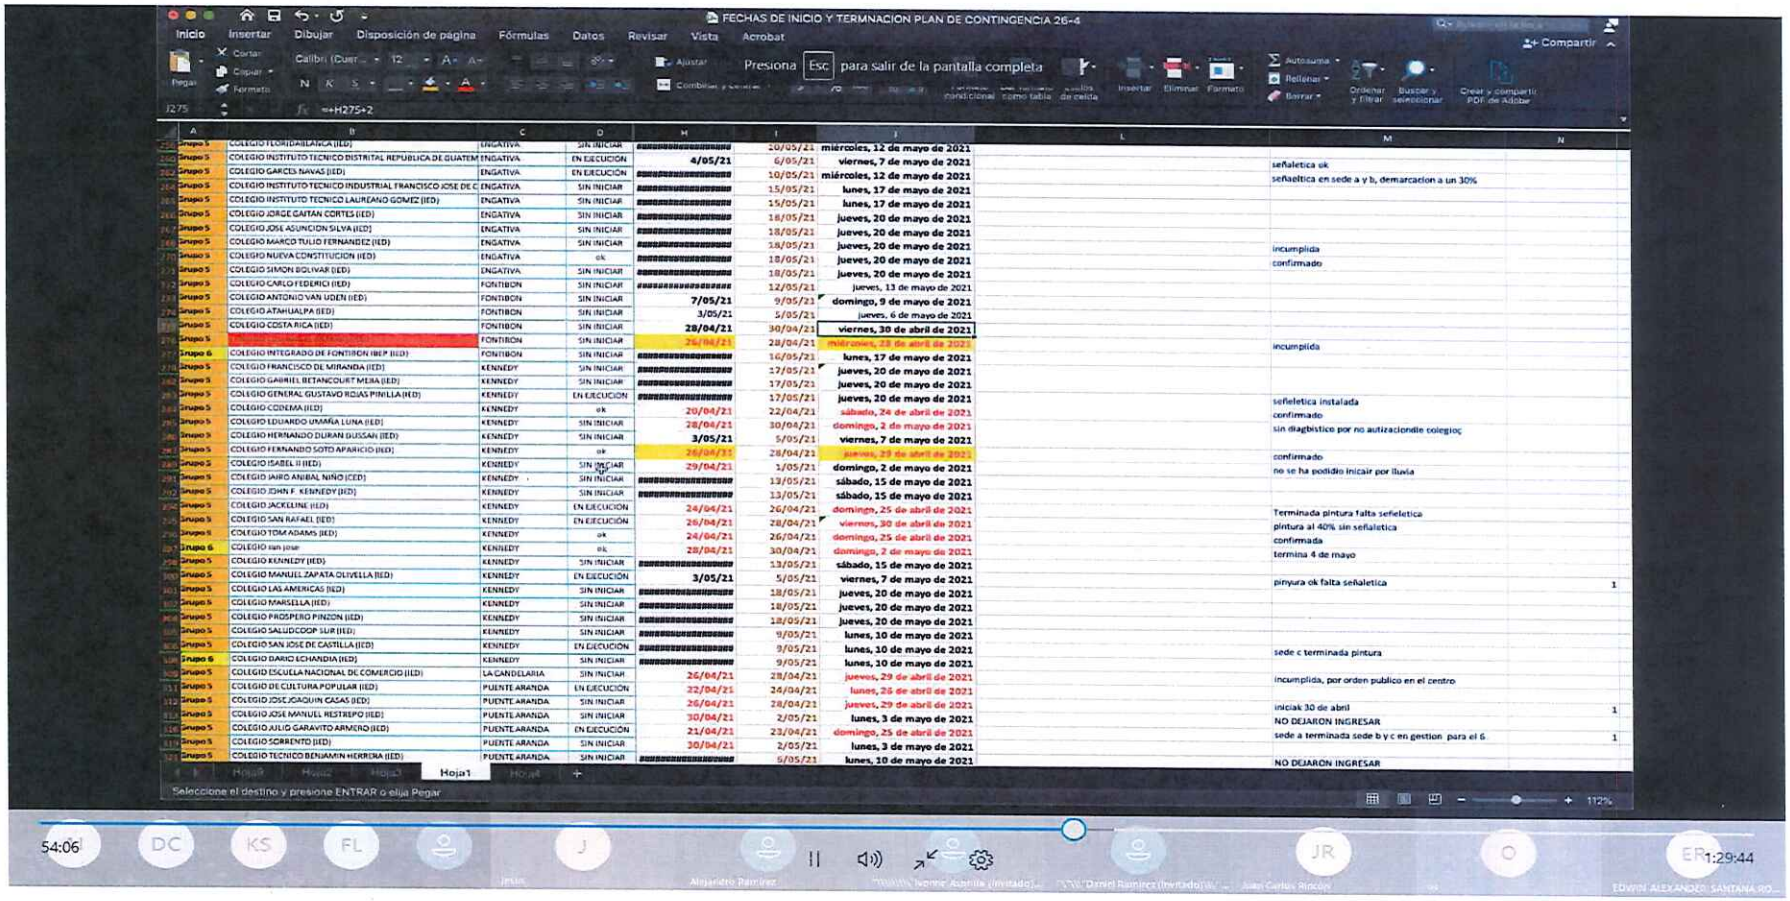


Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

En la localidad de Suba que corresponde al inspector Duvan Guanumen se reporta que el colegio Alberto Lleras Camargo terminado, colegio La Gaitana en ejecucion, colegio La Toscana Lisboa en ejecucion, colegio Republica Dominicana en ejecucion, colegio Compartir de Suba en ejecucion, colegio Tibabuyes Universal terminado, colegio Ventiun Angeles terminado, colegio Villa Elisa en ejecucion,

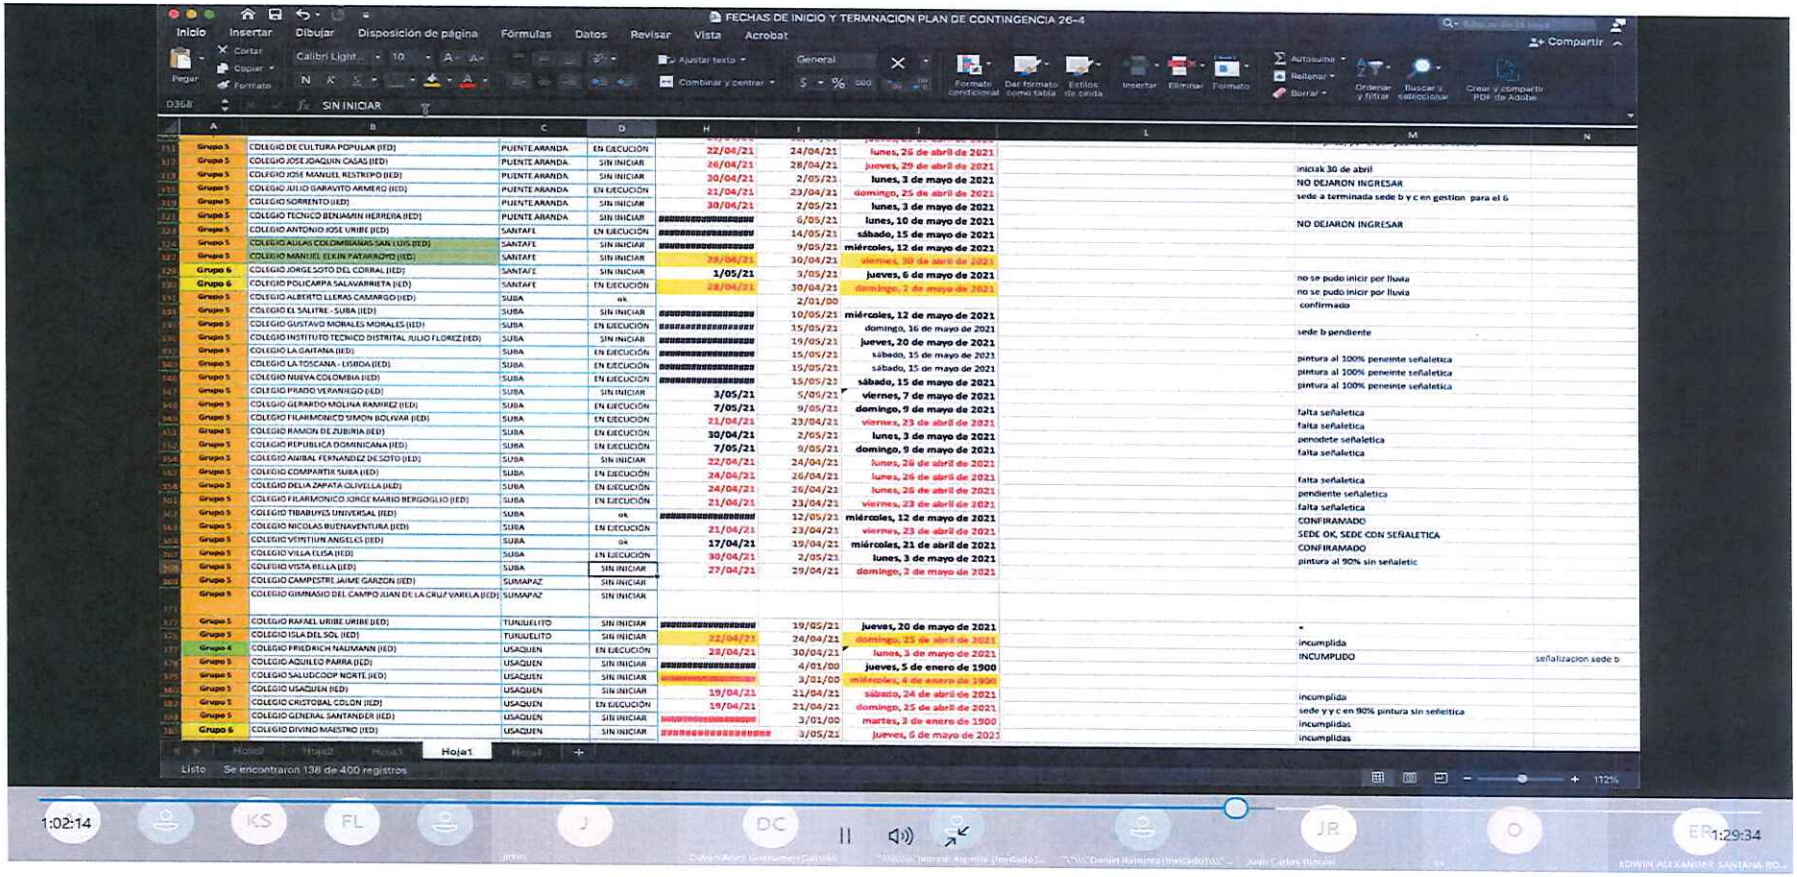

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


8216

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

Se continua con la localidad de Tunjuelito la cual tiene el colegio Isla del Sol como prioridad y no se ha intervenido, pero es bastante dificil intervenirlo por orden publico. No se da ingreso al inspector Duvan Guanumen en el colegio Jose Maria Cordoba.

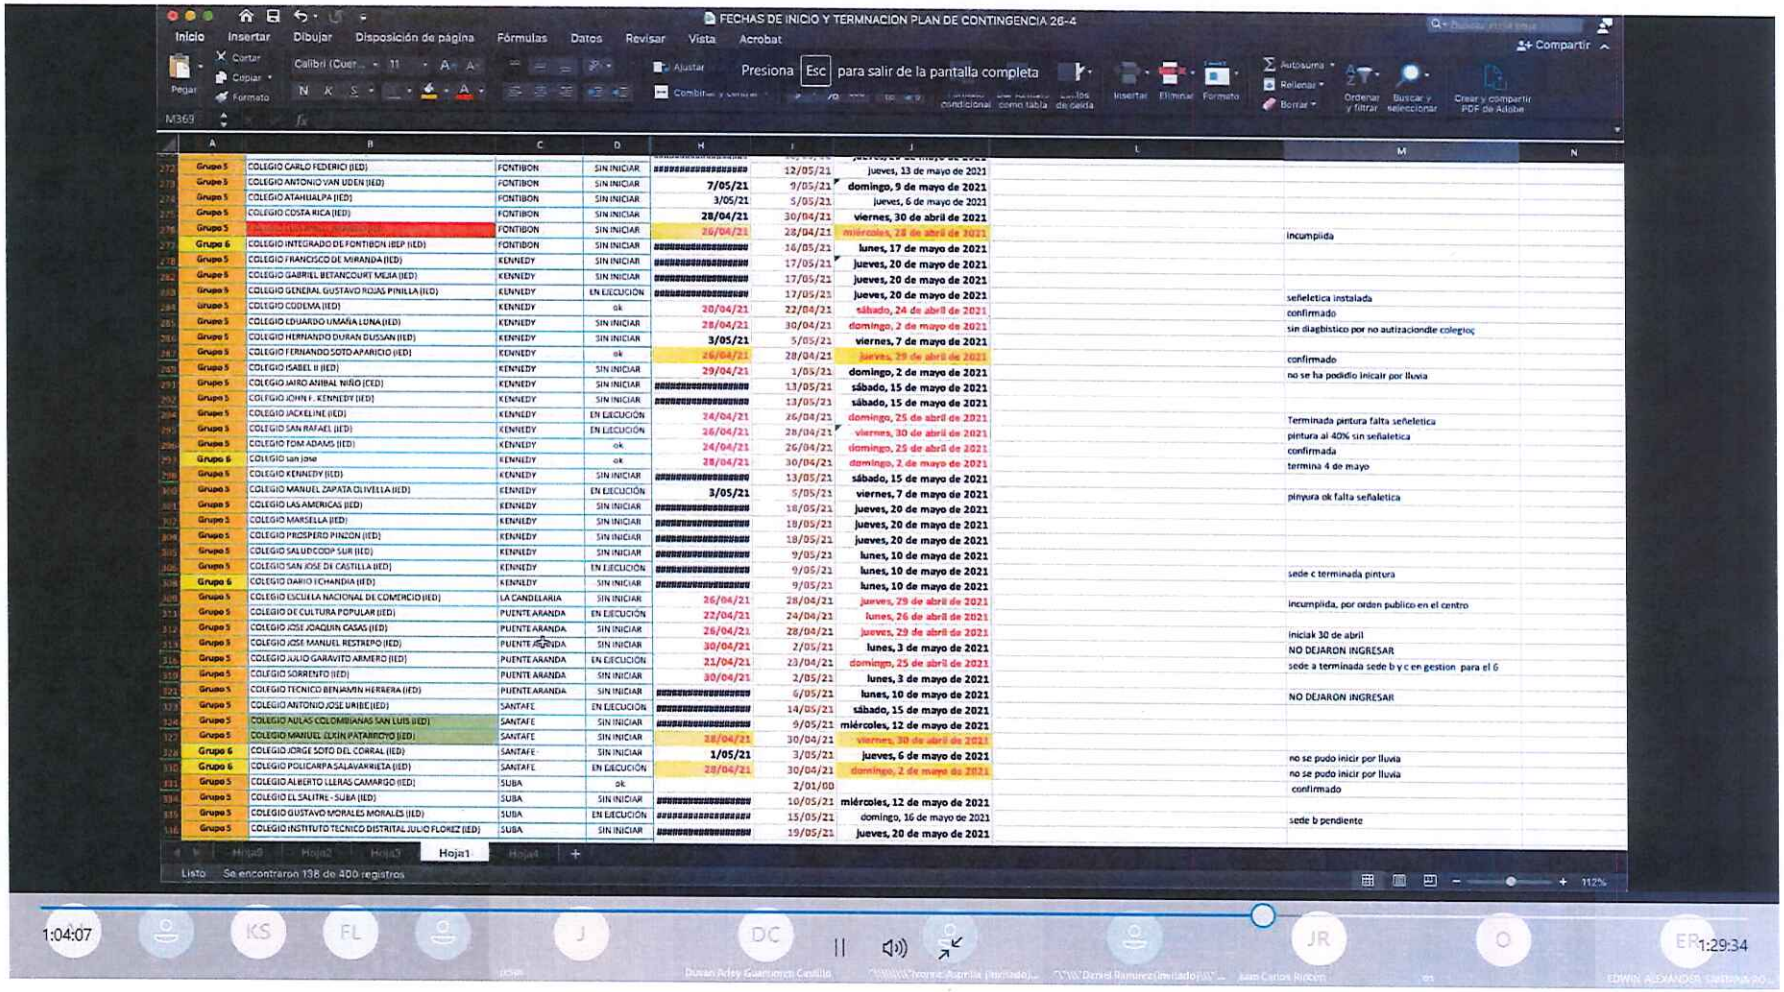

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°12

En la localidad de Usaquen no se reporta avances nuevos en la localidad, el responsdable de esta localidad es el inspector Fabian Lopez y el informa que el contratista nuevo ingresara mas cuadrillas porque no da resultados con el personal actual.

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Realizar segumiento a los colegios que son prioridad y se tienen que ejecutar el dia 8 de mayo del 2021	Ingeniero Residente Oscar Salamanca	8 de mayo del 2021
2. Realizar segumiento a los colegios que son prioridad y se tienen que ejecutar el dia 8 de mayo del 2021	Ingeniero Residente Juan Carlos Rincon	8 de mayo del 2021
3. Realizar seguimiento al colegio Isla del Sol de Tunjuelito el cual es prioridad y no se ha intervenido.	Ingeniero Residente Oscar Salamanca	6 de mayo del 2021
4.		
5.		

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES:

Se realizo la actualización de la matriz de los colegio en donde se evaluo el estado de ejecución de los colegio marcando los que ya se habían ejecutado completamente, los que están en ejecución y los que no han empezado trabajo para saber cuales de estos están incumpliendo las fechas asignadas en la programación inicial y de esta menera hacer la gestión para su pronta ejecución.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: 9 de Mayo del 2021
HORA: 8 :30 PM
LUGAR: Microsoft Teams

8218

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°13

FECHA: 07 Mayo 2021 **HORA: 1 : 35 pm** **LUGAR: Microsoft Teams**

SEGUIMIENTO AVANCES SEÑALIZACION Y SEÑALETICA

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Edwin Alexander Santana Rodriguez	Profesional especialista, supervisor del contrato.	SED	
2. Karen Julieth Rivera Suarez	Aux. Ing. SED	SED	
3. Juan Carlos Rincon	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
4. Oscar Salamanca	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
5. Jesus Ramirez	Residente contratista	Construsocial	
6. Jeison Bermudez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
7. Diego Alejandro Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
8. Anderson Cely	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
9. Duvan Guanumen	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
10. Alejandra Olarte	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
11. Fabian Lopez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
12.	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
13.	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

8219


Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°13

DESARROLLO:

Se da inico a la reunión, interviene el inspector Duvan Guanumen para verificar la localidad de Suba, en los colegios a continuacion se obtienen como datos de avances los siguientes: IED Gustavo Morales en ejecución y se aclara que no cuenta con señalética; IED Julio Flores Sede A terminado, Sede B pendiente áreas a la interperie; IED Gerardo Molina terminado; IED Republica Dominicana Sede B terminado; IED Anibal Fernandez de Soto sede A terminada y Sede B pendiente áreas a la interperie;IED Delia Zapata Olivella terminado.

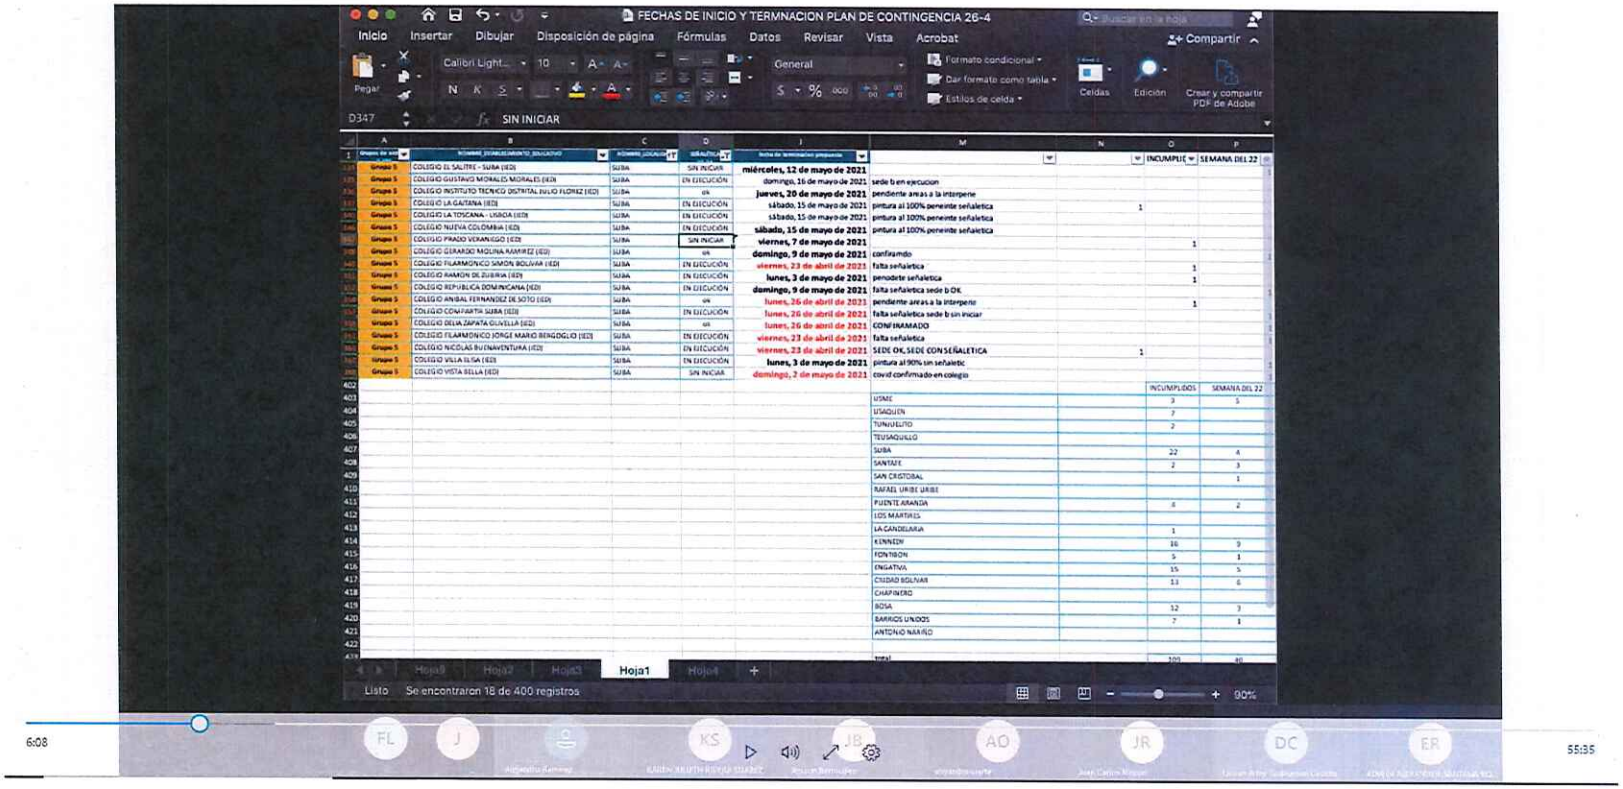

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


8220

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°13

El ingeniero Juan Rincon, indica que con el fin de verificar la ejecución del Colegio Prado Veraniego es necesario que el inspector Duvan se dirija a las instalaciones e informe sus avances. El inspector validara internamente los avances de obra durante el transcurso de la reunión para dar alguna información.

Se continua en la localidad de Usaquen, el Inspector Diego Alejandro Ramirez indica que las sedes de IED Friedrich Naumann se encuentran en ejecucion aun, indica que no se realizan activiades de señalizacion o señaletica actualmente. El arquitecto Edwin Santana solcita informacion sobre el inicio de obra del IED Aquileo Parra, indica que durante el transcurso de la reunion se valide por interno si efectivamente se dio el inicio de actividades por temas climaticos.

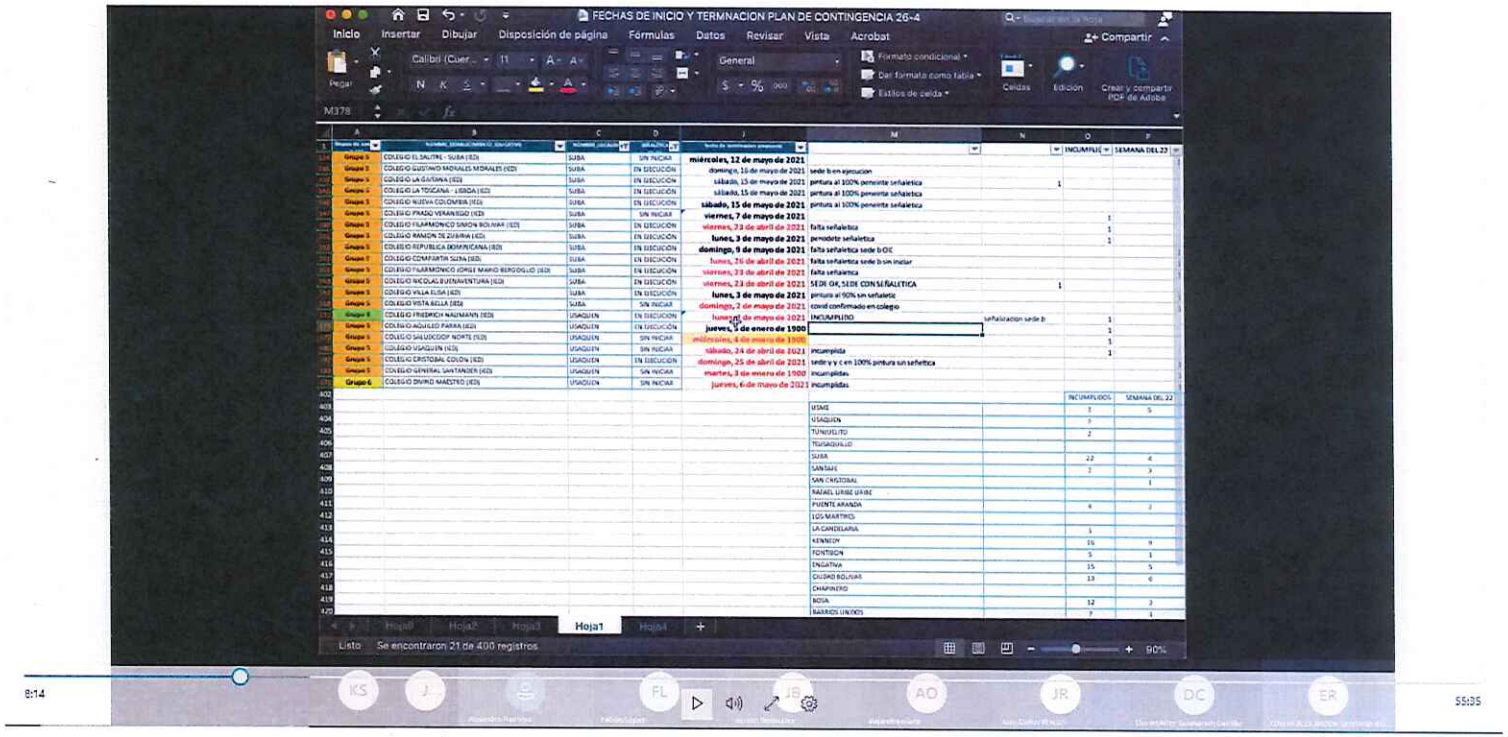


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

8221

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°13

Se continua con la localidad de Engativa, los inspectores Fabian Lopez y Diego Alejandro Ramirez informan los avances en los colegios de la localidad, indican que IED Miguel Antonio Caro esta terminado; IED Charry terminado; ITI Frnacisco Jose de Caldas Sede A en Ejecucion Sede B terminada.

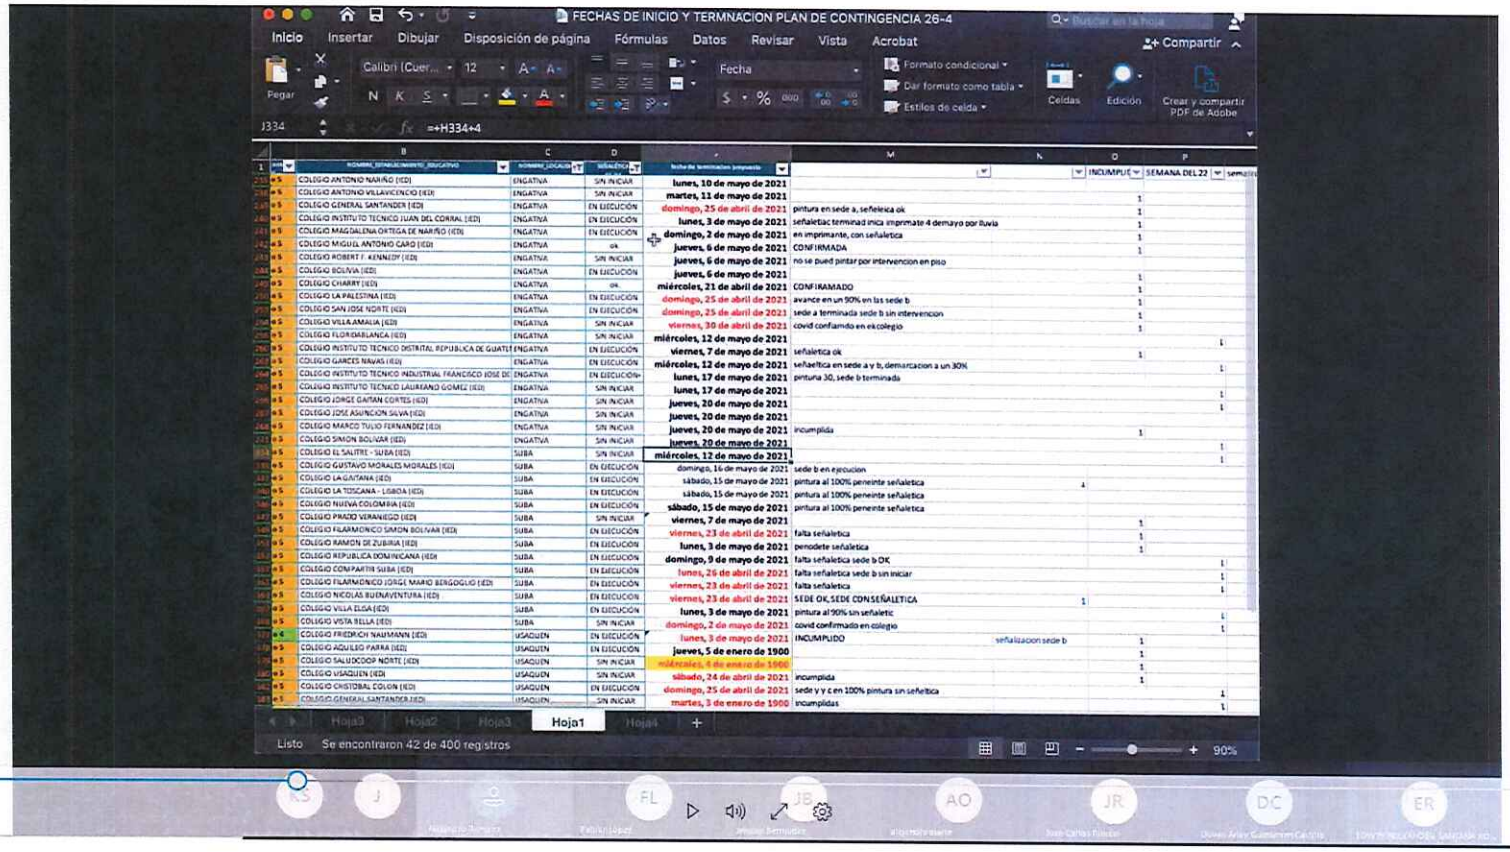


Se continua con la localidad de Barrios Unidos, IED Tomas Carrasquilla sede A terminada y sede B en ejecucion, las demas sedes se encuentran en el mismo estado.

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°13

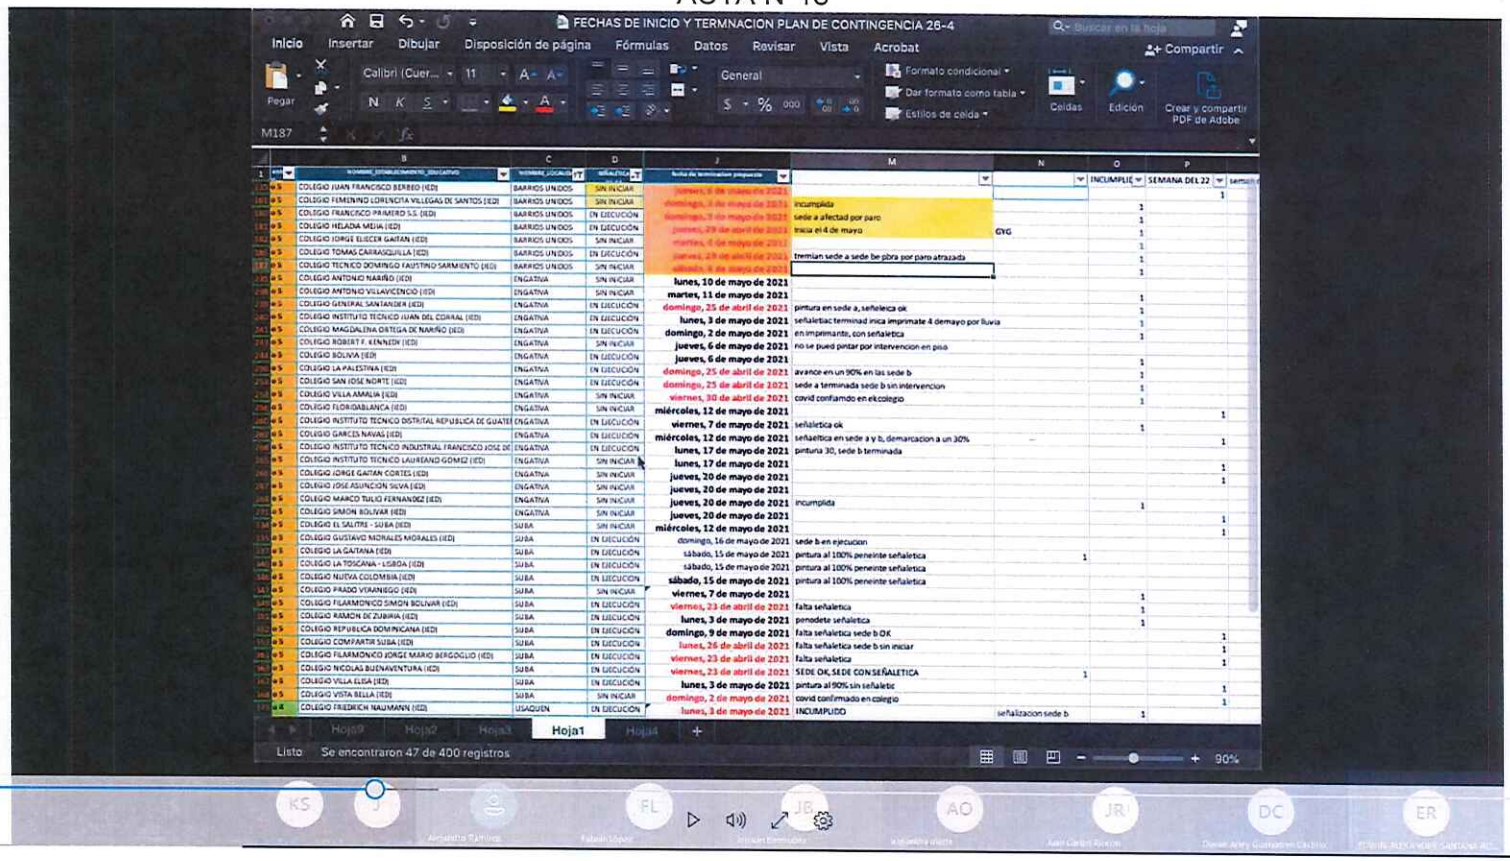


Se continua con la localidad de Kennedy, la informacion es brindada por la inspectora Alejandra Olarte indica IED Hernando Duran Dussan informa que inicia el dia 08 de mayo de 2021, queda registrado estado En Ejecucion; IED Isabel II esta en ejecucion con pintura al 30%; IED Jackeline terminado; IED San Rafael, sede A en ejecucion falta instalar señaletica y Sede B terminada; IED Manuel Zapata Olivella terminado; IED Las Americas en ejecucion de pintura al 90 % y esta pendiente la señaletica.

8223

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°13

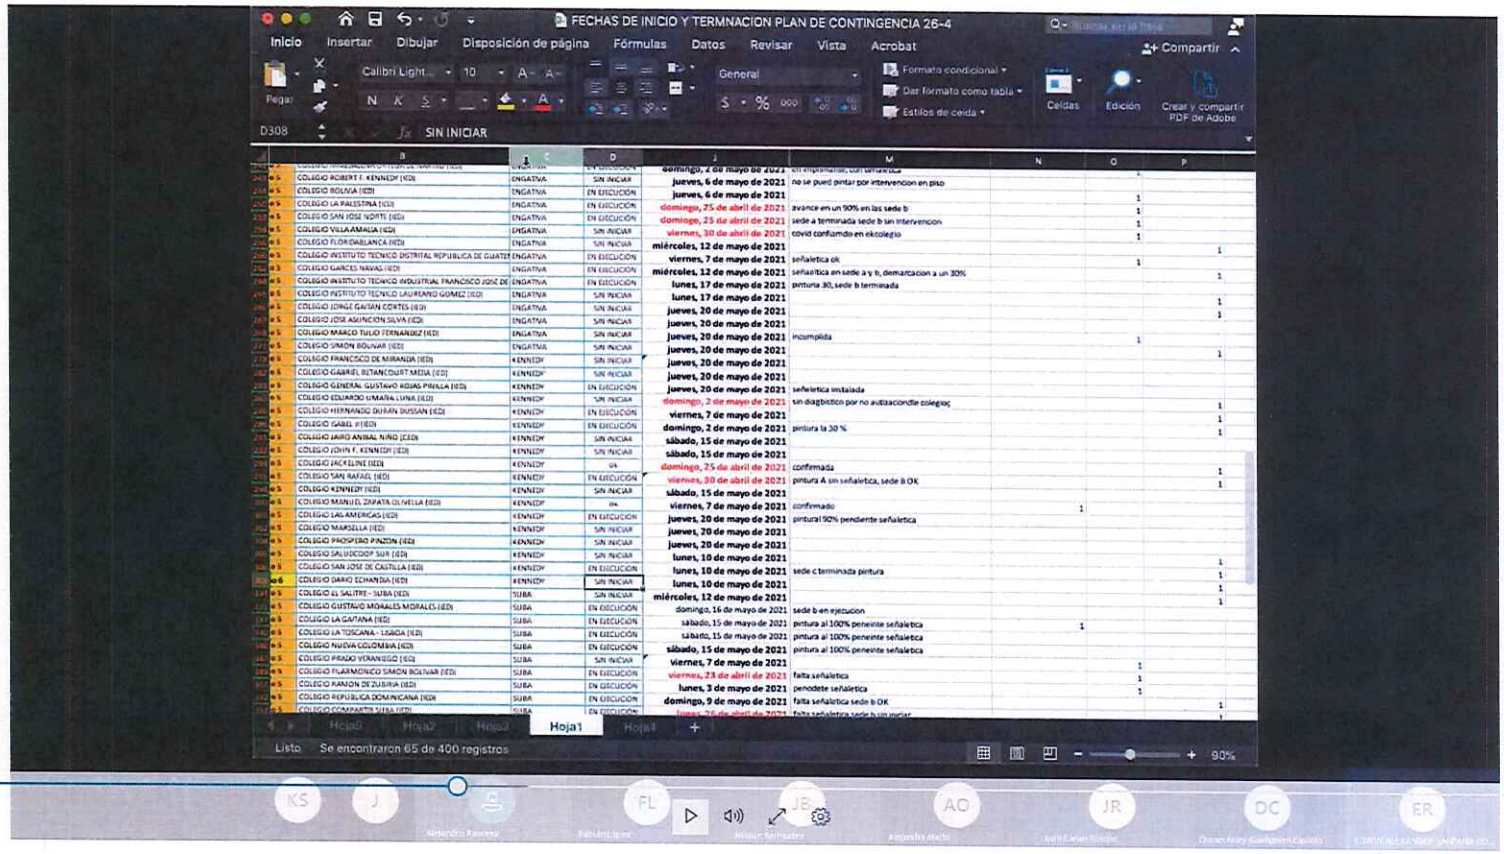

Se continua con la localidad de Puente Aranda, la informacion es brindada por la inspectora Alejandra Olarte indica IED Cultura Popular Sede A En Ejecucion en 80 % de pintura; IED Jose Joaquin Casas no se inicio debido la contingencia del Paro Nacional;


8224

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°13

IED Julio Garavito Armero Sede A y B terminada, Sede C terminada con observacion de pendiente pintura en areas abiertas debido a la lluvia.

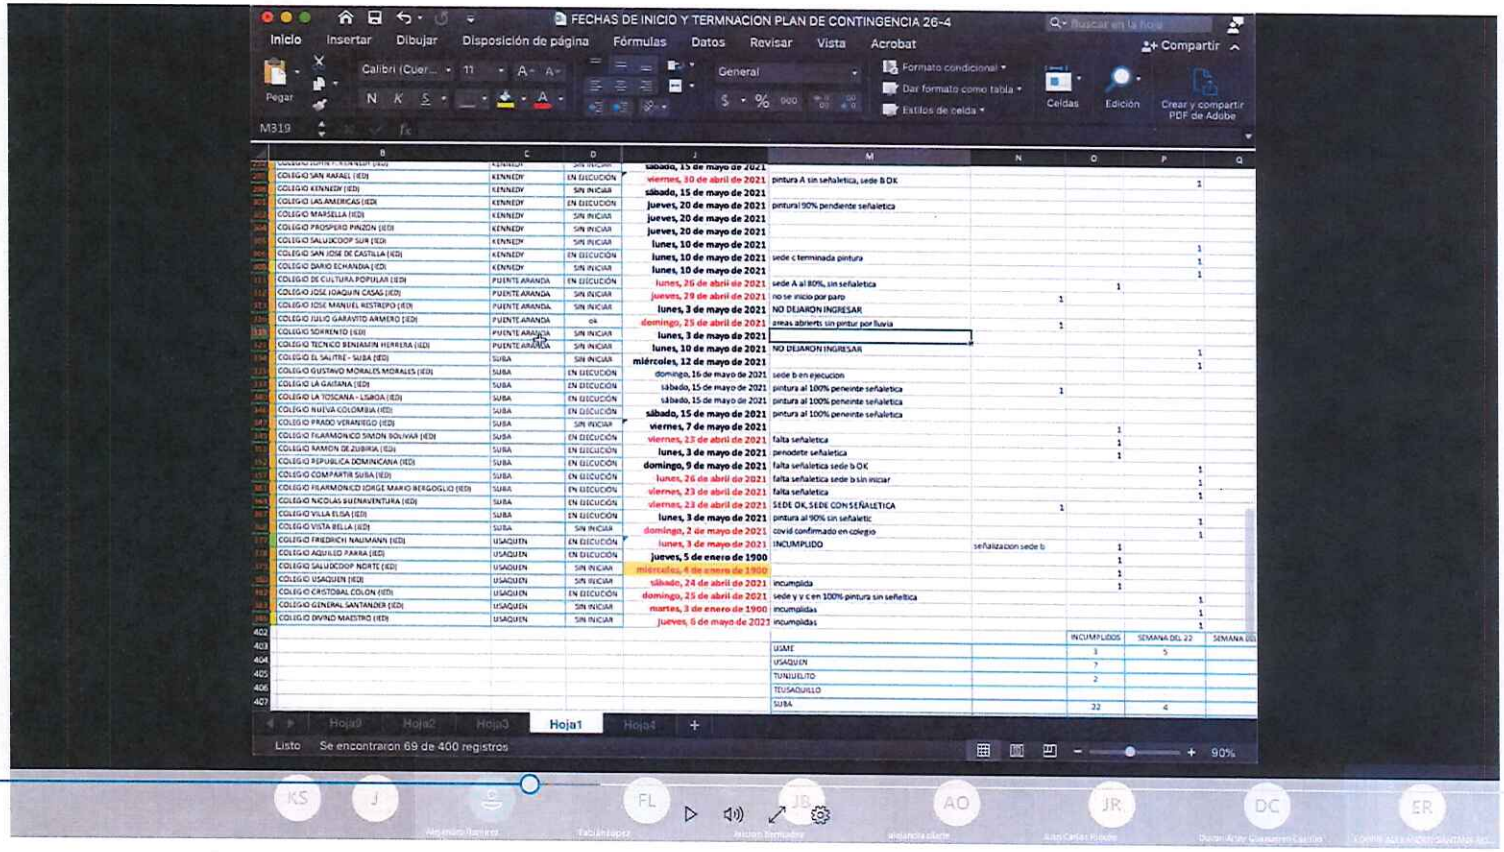

Se continua con la localidad de Bosa, esta asignado el inspector Jeison Bermudez, quien indica IED Alfonso Reyes Echandia terminada con observacion de confirmar la instalación de la señalética; IED Leonardo Posada Pedraza reporta un estado de En

8225

ACTA DE COMITE
ACTA N°13

Ejecución al 80 % con retrasos por lluvia y filtraciones en las instalaciones, señalética instalada; IED Alfonso Lopez Michelsen avance de ejecución al 70 %; IED Bosanova terminado; IED Francisco de Paula Santander En Gestion con pintura terminada y señalética pendiente; IED Kimi Pernia Domico En ejecución de imprimante; IED Motorista terminado; IED Nuevo Chile terminado; IED El Progreso avance en señalética;

El Inspector Duvan Guanumen indica que de acuerdo a la informacion que recolectaria puede afirmar que IED Aquileo Parra se encuentra terminado. El inspector Diego Alejandro Ramirez informa que IED Heladio Mejia por lluvias se inicia ejecucion el 08 de Mayo de 2021. El ingeniero Juan Rincon indica que no se tiene informacion sobre avances adicionales en la localidad de Santa Fe y de Tunjuelito.

Se continua con la localidad de Ciudad Bolivar, la informacion es brindada por el inspector Anderson Cely indica para IED San Francisco Sede A terminada, sede B con dificultades para el ingreso y la sede C no se ejecutara y IED Arborizadora Baja terminada. El arquitecto Edwin Santana solicta informacion sobre el ingreso de las cuadrillas en la noche para los colegios de la localidad de Usaquen y el residente de Construsocial Jesus Ramirez indica que no ingresaron por la humedad debido al clima. Adicionalmente el Inspector Fabian Lopez indica que el colegio Saludcoop Norte ubicado en la localidad de Usaquen inicio ejecución y aclara las condiciones bajo als cuales se realizo el ingreso a las instalaciones del colegio a petición del Arquitecto Edwin Santana. Seguido a esto, interviene el Residente Oscar Salamanca brindando información sobre el IED Heladio Mejia indicando que aun no se ha intervenido, adicionalmente con respecto a la localidad de Suba indica que IED Prado Veraniego ya cuenta con pintura y esta pendiente de señalética; IED Laureano Gomez se encuentra en ejecución.

El arquitecto Edwin santana valida información de IED Villas del progreso y resalta la importancia de ejecutar, le informan adicionalmente que en Localidad de Ciudad Bolivar IED Leon de Greiff, sede en arriendo esta en ejecución.

Finaliza la reunion con los inspectores y se continua solamente con los residentes de obra Juan Rincon y Oscar Salamanca con el fin de aclarar dudas sobre la oferta economica para el modificatorio dentro de las que se realizan las siguientes observaciones:

ACTA DE COMITE
ACTA N°13

- El item "Equipos tecnologicos para actividades de corte" no fue aprobado, por tal razon debe modificarse el documento.
- El item "Personal administrativo, papeleria, informes, fotocopias, gastos de oficina y todos lo que se requieran para la correcta ejecucion del contrato" debe ser uno solo.
- El item de ocupacion del director de obra esta registrado al 100% y anteriormente se habia manejado al 50 %.
- Se validan los valores correspondientes a los especialistas que estan registrados en la oferta economica.

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Rectificar las observaciones que se realizaron al formato de oferta económica.	AC2R Residente Juan Rincon	8 de Mayo del 2021 8:00 AM

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES:

Se realizo la actualización de la matriz de los colegio en donde se evaluo el estado de ejecución de los colegio marcando los que ya se habían ejecutado completamente, los que están en ejecución y los que no han empezado trabajo para saber cuales de estos están incumpliendo las fechas asignadas en la programación inicial y de esta menera hacer la gestión para su pronta ejecución.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: 8 de Mayo del 2021
HORA: Por confirmar
LUGAR: Microsoft Teams

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°14

FECHA: 11 Mayo 2021 **HORA: 8 : 33 pm** **LUGAR: Microsoft Teams**

SEGUIMIENTO PROGRAMACION SEÑALIZACION Y SEÑALETICA

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Edwin Alexander Santana Rodriguez	Profesional especialista, supervisor del contrato.	SED	
2. Karen Julieth Rivera Suarez	Aux. Ing. SED	SED	
3. Oscar Salamanca	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
4. Juan Carlos Rincon	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
5. Jesus Ramirez	Residente contratista	Construsocial	
6. Duvan Guanumen	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
7. Braya Calderon	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
8. Ivone Asprilla	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
9. Fabian Lopez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
10. Daniel Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
11. Anderson Cely	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
12. Diego Alejandro Ramirez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
13. Jeison Bermudez	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
14. Alejandra Olarte	Inspector de interventoria	Interventoria AC2R	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


8228

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°14

DESARROLLO:

La reunion se inicia con el estado de la localidad de engativa,se manifiesta que las sedes A Y B del colegio laureano gomez esta terminado, de igual manera la sede a y b del colegio simon bolivar, se manifiesta que la sede a del colegio tecnico juan del corral esta terminada y falta pintura sede B, el colegio magdalena ortega de nariño se encuentra en un 60% de ejecucion.

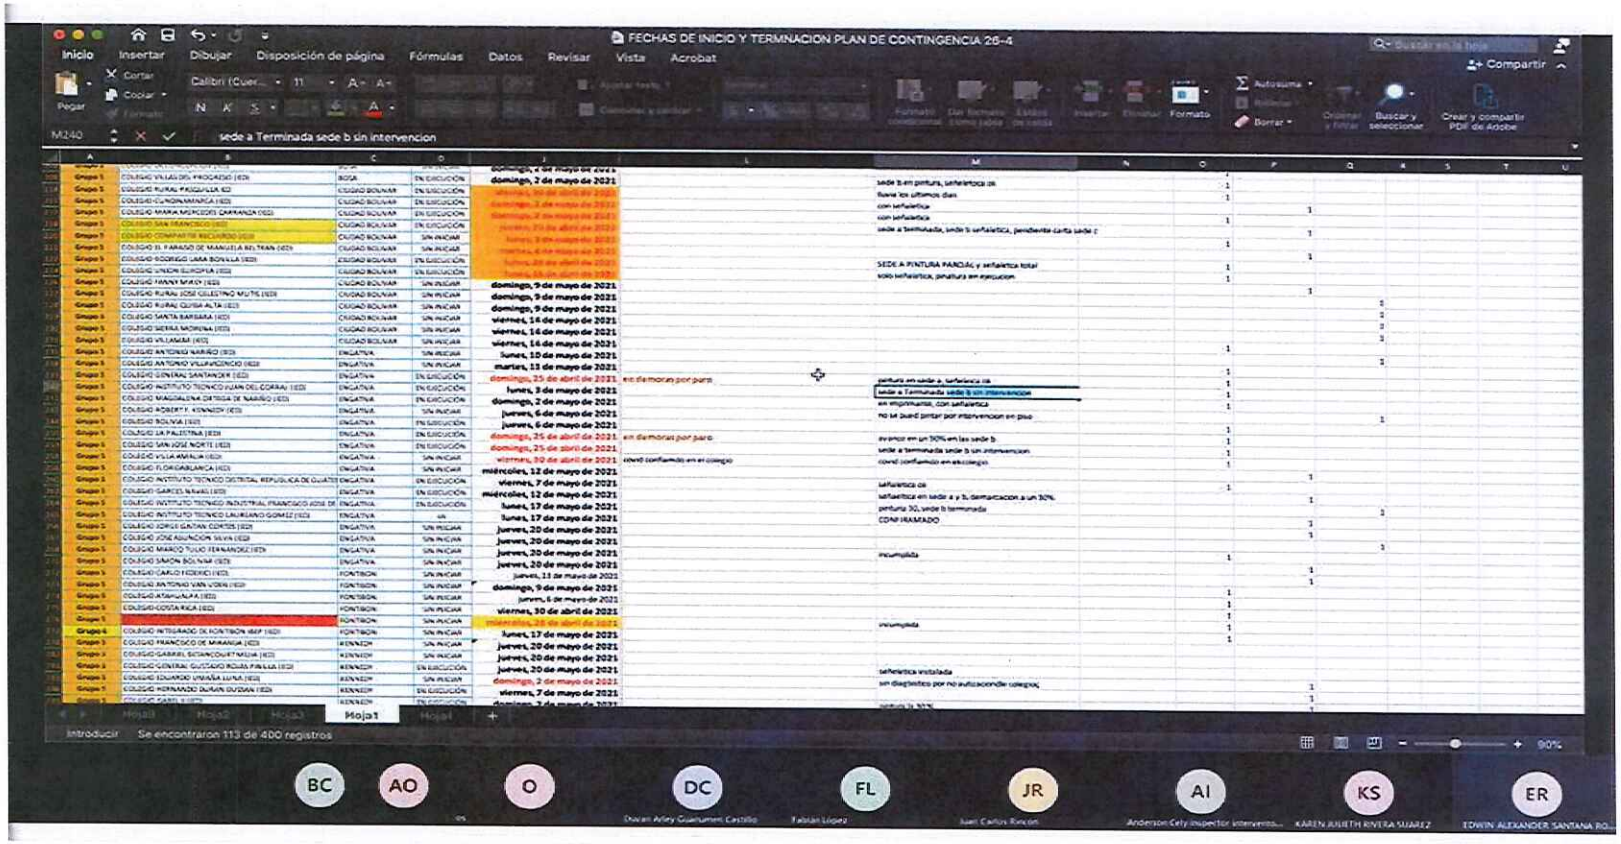


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°14

Se continua con la localidad de fontibon, se inicia manifestando que el colegio carlos federicci se encuentra en ejecucion, el colegio atahualpa ya se encuentran pintadas las sedes Ay B mañana se instala la señaletica, el colegio costarica por temas de lluvia no se ha podido terminar la pintura sin embargo va en un 90% de ejecucion, la señaletica se instala en esta semana, el colegio luis angel arango la sede A y B ya se encuentran pintadas, y falta instalacion de señaletica se solicito realizar la sede C.

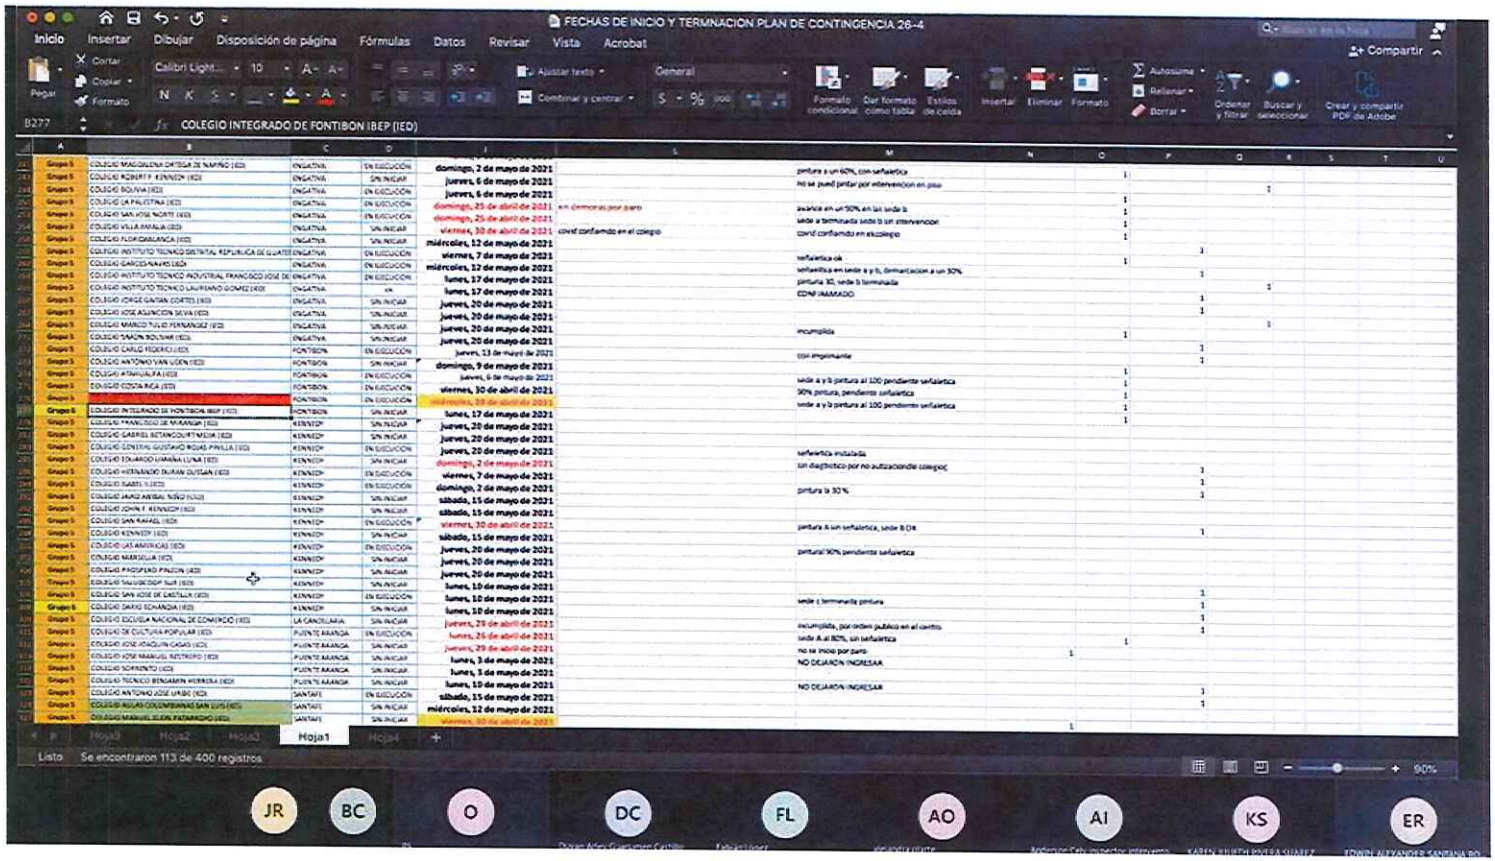

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


8230

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°14

Al colegio integrado de fontibon se le deja una nota manifestando, que el director local manifiesta que no se puede ejecutar.

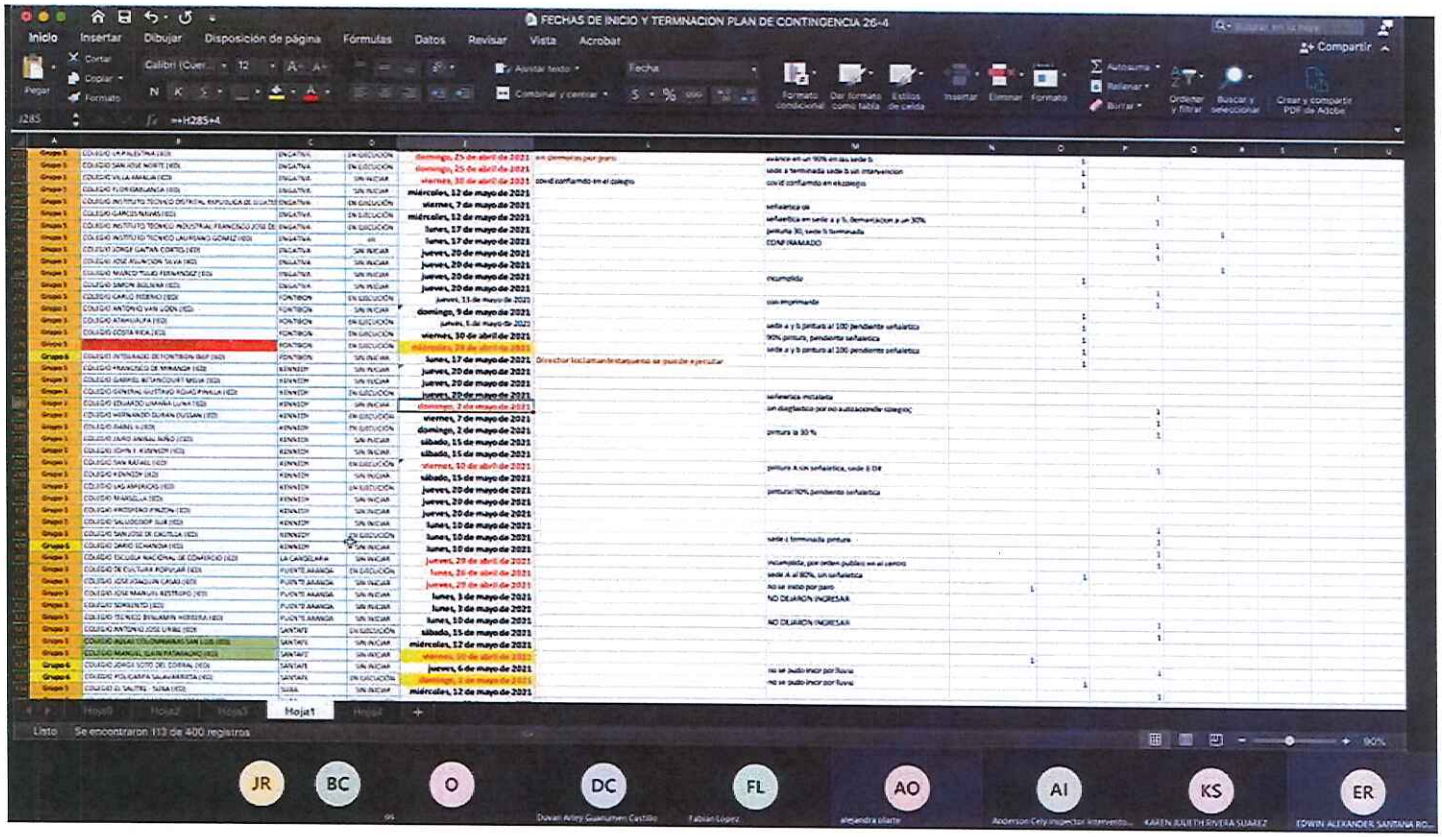


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°14

Se continua con la localidad de kennedy el colegio hernando duran dussan presenta un 50% de ejecucion en pintura, falta señaletica, el colegio isabel II ya se encuentra pintada y señalizada la sede A la sede B esta en ejecucion, en un 30% de pintura, el colegio jhon F kennedy se encuentra en ejecucion con imprimante.

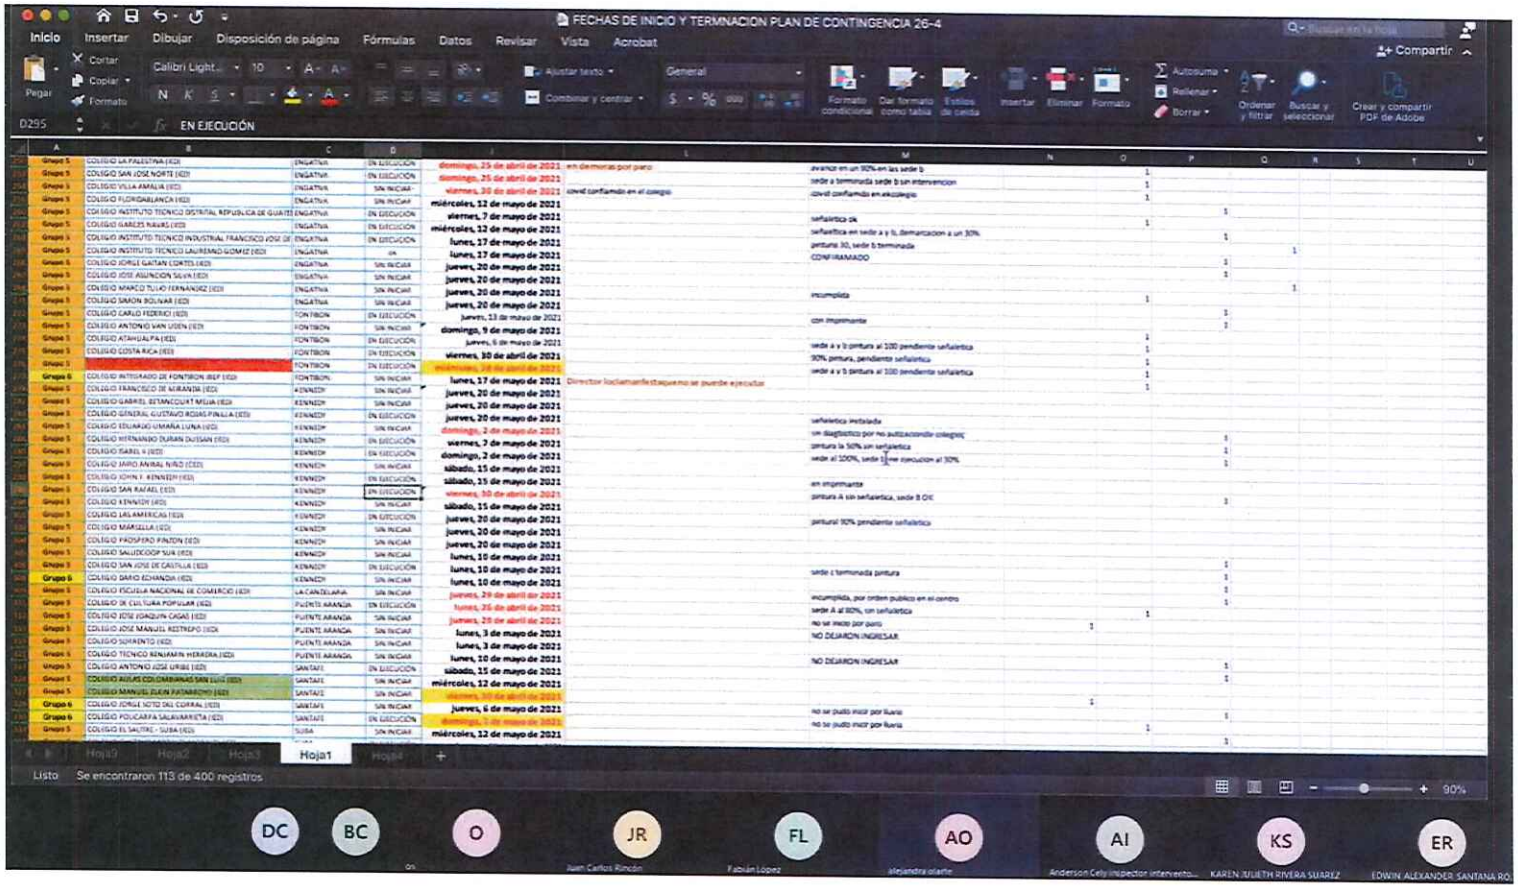


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°14

De igual manera se manifiesta que el colegio las americas ya se encuentra finalizado, el colegio la marseklla se inicio el dia de hoy, el colegio san jose de castilla la sede A esta terminada, la sede B aun esta sin iniciar, l colegio echandia ya se encuentra terminado.

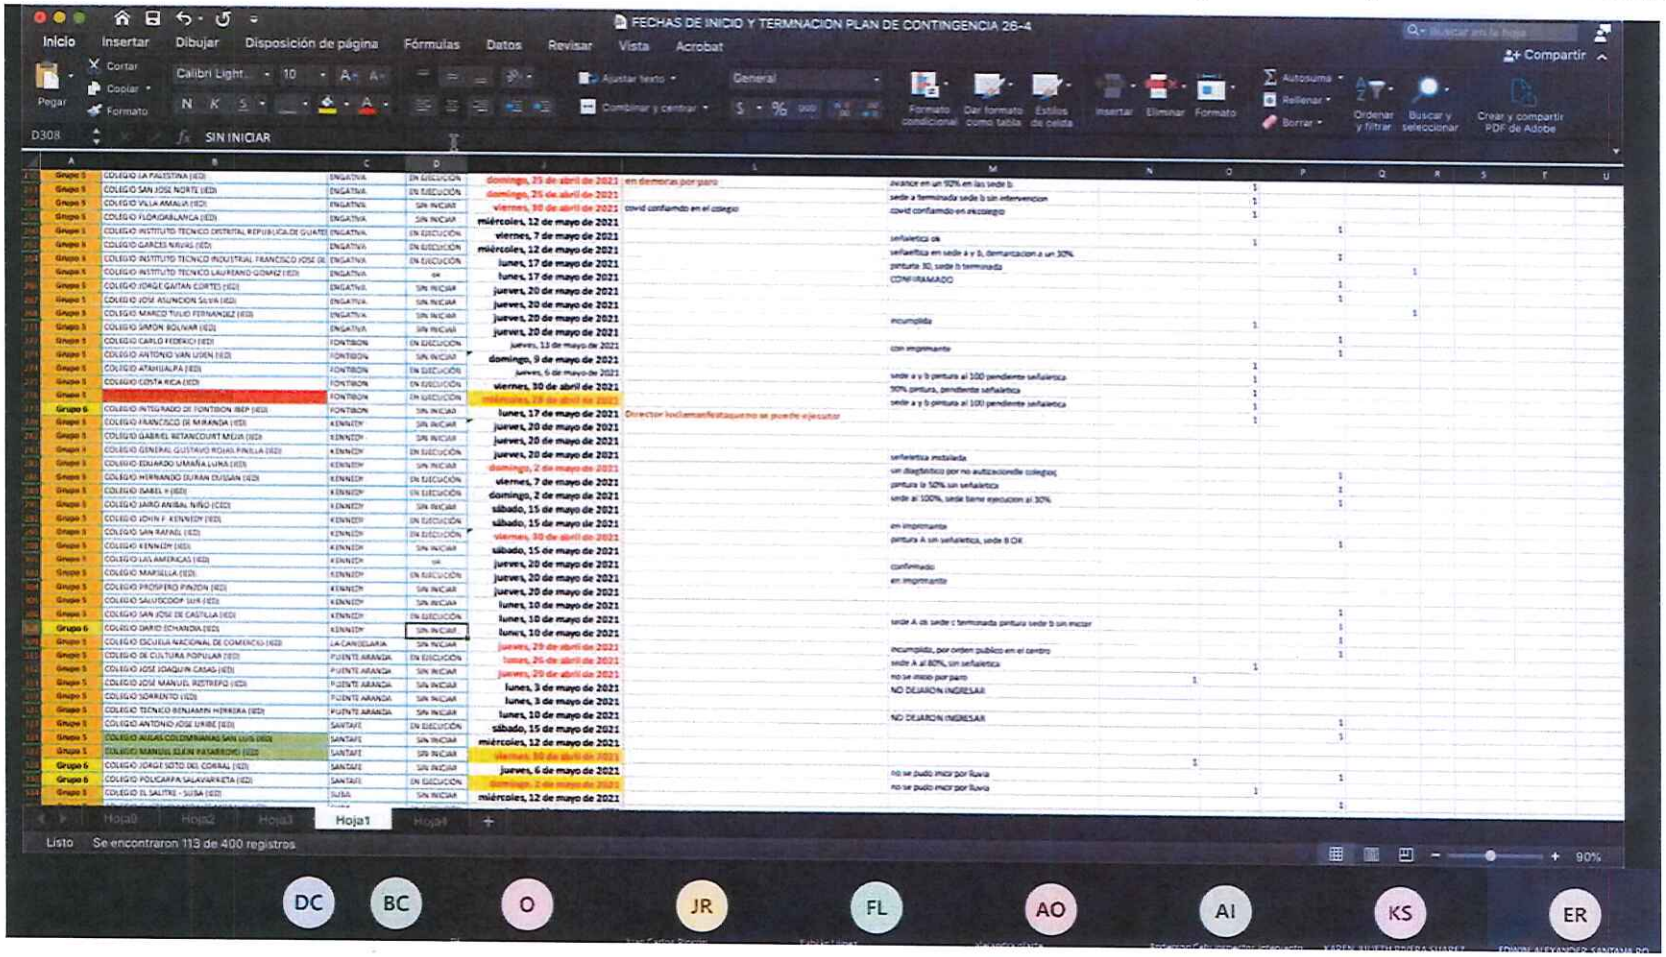

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia


Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE

ACTA N°14

El colegio escuela nacional de comercio se encuentra para posible inicio el jueves,

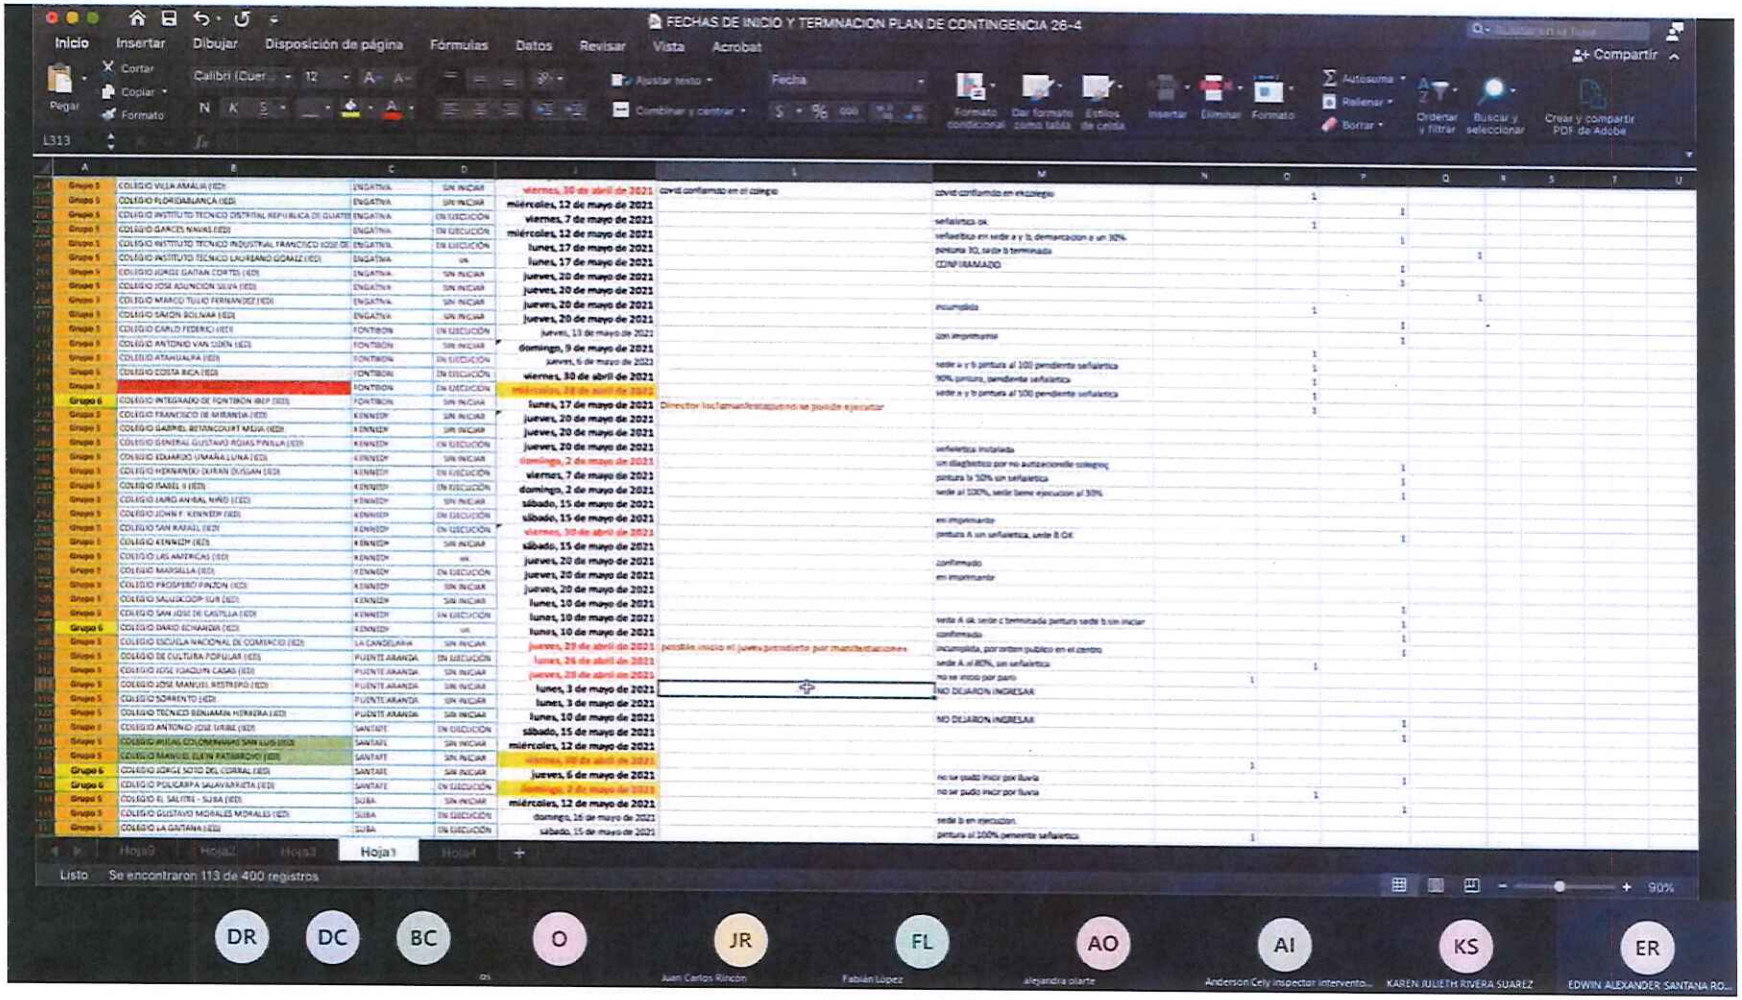


CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°14

En la localidad de puente aranda el colegio jose joaquin de casas ya se encuentra terminado en pintura, el colegio sorrento no fue posible ingresar para la ejecucion de actividades, el dia de malñana se dara el acceso.

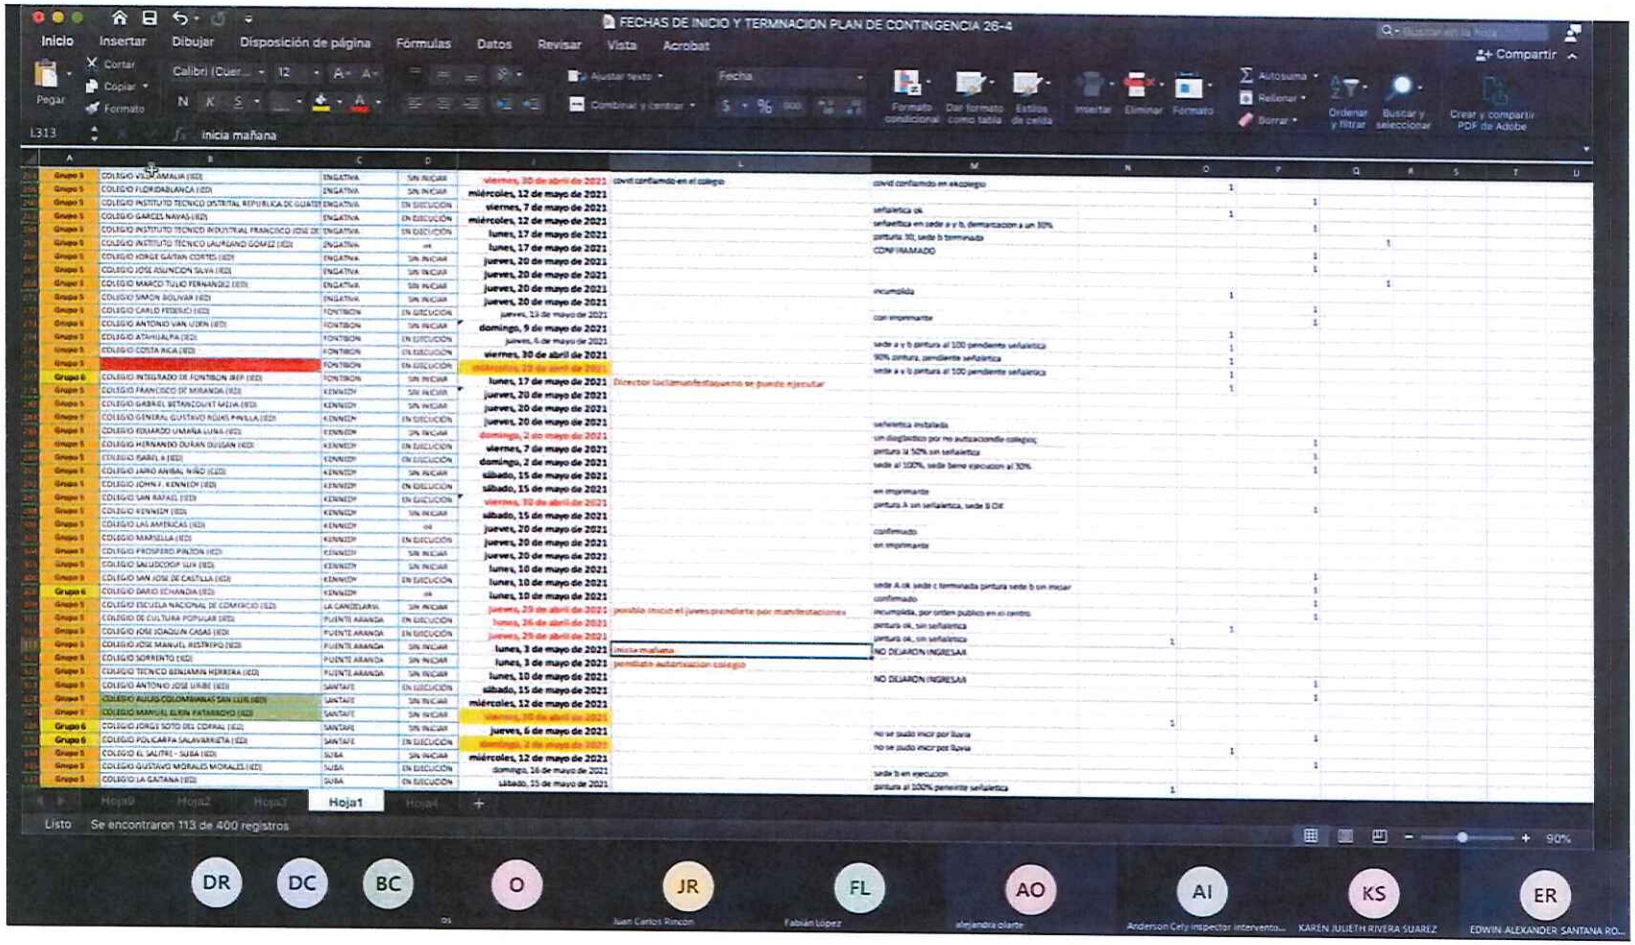

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia
