SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1014	INSTITUCION:	82. IED GARCES NAVAS - SEDE B	LOCALIDAD: ENGATIVA

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	13/08/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	AULAS
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	22,5 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 21.442.187,00

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:


Desmonte, traslado e instalcion de aulas - casetas

- Desmonte y demolicion de construccion existente
- Demolicion de placa
- Construccion de cimentacion
- Instalacion de estructura metalica
- Instalacion de muros de cerramiento
- Resane y pintura de muros
- Desmonte de cubierta
- Desmonte de puertas y ventanas
- Construccion de Placa en concreto con malla electrosoldada
- Instalacion de Cubierta
- Instalacion de puertas y ventanas
- Instalacion de piso interno

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			$ -	$ -
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -	$ -
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)		90,00	$ 53.722,00	$ 4.834.980,00
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)		90,00	$ 10.009,00	$ 900.810,00
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)		90,00	$ 30.326,00	$ 2.729.340,00
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS		90,00	$ 32.886,00	$ 2.941.740,00
2	CIMENTACION			$ -	$ -
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -	$ -
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	61,74	$ 70.409,00	$ 4.347.052,00
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	29,05	$ 105.289,00	$ 3.058.645,00
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS	D		$ -	$ -
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	92,11	$ 3.187,00	$ 293.555,00
18	PINTURA	D		$ -	$ -
18.2	PINTURA SOBRE METAL	D		$ -	$ -
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M	63,53	$ 7.081,00	$ 449.856,00
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2	120,34	$ 15.874,00	$ 1.686.209,00
				SUBTOTAL	$ 21.442.187,00
			ADMINISTRACION	21,0%	
			IMPREVISTOS	2,0%	$ 428.844,00
			UTILIDAD	5,0%	$ 1.072.109,00
			TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 1.500.953,00
			TOTAL OFERTA		$ 22.943.140,00

PROGRAMACION INICIAL

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pr
1	GARCES NAVA	25,75 días	jue 13/08/20	sáb 12/09/20	
2	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	jue 13/08/20	vie 14/08/20	
3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	sáb 15/08/20	mar 18/08/20	2
4	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	mar 18/08/20	jue 20/08/20	3
5	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS	5 días	jue 20/08/20	mié 26/08/20	4
6	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y	4 días	mié 26/08/20	mar 1/09/20	5
7	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y	2 días	mar 1/09/20	jue 3/09/20	6
8	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	2 días	jue 3/09/20	sáb 5/09/20	7
9	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	3 días	sáb 5/09/20	mié 9/09/20	8
10	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	3 días	mié 9/09/20	sáb 12/09/20	9

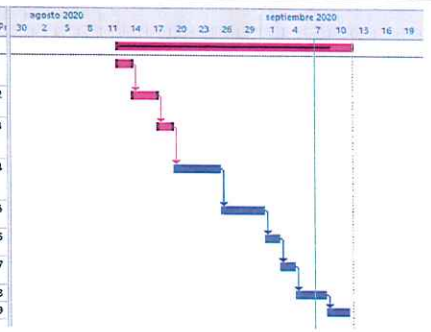

NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la Institucion

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9384

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	INSTITUCION:	83. IED LA PALESTINA - SEDE A	LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE VISITA: 18/08/2020	DIRECCION: CRA. 76 No.79-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	REGISTRO FOTOGRAFICO:
Debido al riesgo desde el punto de vista estructural en el que se encuentra el bloque antiguo, se hace necesaria la adecuacion de un espacio que garantice la seguridad de la poblacion estudiantil una vez que se dé el retorno a las clases	  
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	
De acuerdo a la visita realizada en la sede, se evidencia que las aulas reportadas, presentan elementos estructurales que estan en riesgo. Algunos muros presentan fisuras lo que puede ocasionar colapso de la estructura y de la cubierta. De esta manera se hace necesario el reforzamiento estructural de las areas afectadas desde las bases de cimentacion hasta la estructura de cubierta.	

RECOMENDACIONES	El contratista de obra debera realizar la instalacion de elementos que seran desmontados y trasladados desde otra sede y que han sido recuperados de otros proyectos. Realizar refuerzo de la placa en concreto. Reemplazo de muros. reforzamiento de la estructura y reconstruccion de la cubierta. Asi mismo se debera realizar los respectivos acabados internos y externos para dejar el area en excelentes condiciones y sin riesgo alguno. Se debera contemplar actividades adicionales segun el avance de ejecucion. Entregar areas completamente aseadas.	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	INSTITUCION:	83. IED LA PALESTINA - SEDE A	LOCALIDAD: ENGATIVA

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	20/08/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	AULAS
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	29,13 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 34.389.622,00

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:


- Desmonte, traslado e Instalcion de aulas - casetas
- Replanteo de areas
- Construccion de cimentacion
- Construccion de vigas perimetrales para cimentacion
- Instalacion de estructura metalica
- Instalacion de muros de cerramiento
- Resane y pintura de muros
- Cerramiento de areas
- Descapote y excavacion de terreno
- Recebo compactado
- Construccion de Placa en concreto
- Instalacion de Cubierta
- Instalacion de puertas y ventanas
- Instalacion de piso interno

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			$ -	$ -
1.1	ORIBAL PRELIMINARES			$ -	$ -
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts		86,11	$ 9.909,00	$ 771.458,00
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -	$ -
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)		86,11	$ 53.722,00	$ 4.626.001,00
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)		86,11	$ 10.009,00	$ 861.875,00
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)		86,11	$ 30.328,00	$ 2.611.372,00
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS		86,11	$ 32.686,00	$ 2.814.591,00
2	CIMENTACION			$ -	$ -
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -	$ -
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)		8,85	$ 41.817,00	$ 242.874,00
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -	$ -
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	4,63	$ 637.838,00	$ 3.659.044,00
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	4,87	$ 629.926,00	$ 3.053.130,00
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	86,11	$ 70.409,00	$ 6.062.919,00
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -	$ -
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	86,02	$ 3.187,00	$ 274.146,00
5	MAMPOSTERIA			$ -	$ -
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -	$ -
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2	118,11	$ 82.356,00	$ 9.727.355,00
18	PINTURA			$ -	$ -
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -	$ -
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M	63,63	$ 7.081,00	$ 449.050,00
				SUBTOTAL	$ 30.703.815,00
				ADMINISTRACION 21,0%	
				IMPREVISTOS 7,0%	$ 687.760,00
				UTILIDAD 6,0%	$ 1.710.461,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 3.685.806,00
				TOTAL OFERTA	$ 34.389.622,00

NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

PROGRAMACION INICIAL

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pr
1	PALESTINA SEDE A	29,13 días	jue 13/08/20	jue 17/09/20	
2	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	2 días	jue 13/08/20	vie 14/08/20	
3	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	sáb 15/08/20	mar 18/08/20	2
4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	mar 18/08/20	jue 20/08/20	3
5	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	5 días	jue 20/08/20	mié 26/08/20	4
6	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS	4 días	mié 26/08/20	mar 1/09/20	5
7	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	2 días	mar 1/09/20	jue 3/09/20	6
8	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	2 días	jue 3/09/20	sáb 5/09/20	7
9	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	3 días	sáb 5/09/20	mié 9/09/20	8
10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	3 días	mié 9/09/20	sáb 12/09/20	9
11	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	1 día?	sáb 12/09/20	lun 14/09/20	10
12	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO	1 día?	lun 14/09/20	mar 15/09/20	11

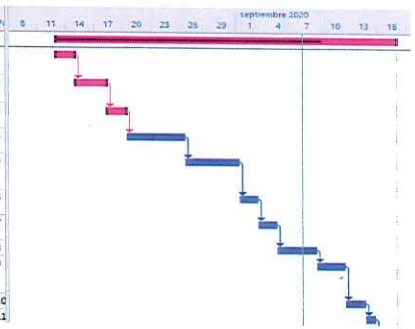

NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la institucion

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9386

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 408	INSTITUCION:	136. IED MONTEBELLO	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	22/10/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	AULAS
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	35,75 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 47.116.054,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			$ -	$ -
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -	$ -
1.3.46	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES		176,21	$ 10.019,00	$ 1.765.272,00
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)		176,21	$ 10.009,00	$ 1.763.590,00
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)		176,21	$ 41.380,00	$ 7.291.670,00
2	CIMENTACION			$ -	$ -
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -	$ -
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	176,21	$ 70.409,00	$ 12.406.770,00
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -	$ -
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	93,11	$ 3.167,00	$ 293.565,00
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -	$ -
11.2	CUBIERTAS			$ -	$ -
11.2.23	DESMONTE CANALETA 43/90	M2	176,21	$ 12.721,00	$ 2.241.567,00
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			$ -	$ -
17.1	CIELOS RASOS			$ -	$ -
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2	132,45	$ 112.926,00	$ 14.957.040,00
18	PINTURA			$ -	$ -
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -	$ -
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	132,45	$ 13.740,00	$ 1.819.863,00
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -	$ -
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M	62,53	$ 6.748,00	$ 421.962,00
25	GENERICOS Y OTROS			$ -	$ -
25.1	MANO DE OBRA			$ -	$ -
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR	62,00	$ 17.667,00	$ 1.095.654,00
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR	48,00	$ 18.500,00	$ 888.000,00
NP F	REINSTALCION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA EXISTENTE	M2	176,21	$ 12.344,00	$ 2.175.136,00
				SUBTOTAL	$ 39.652.619,00
			ADMINISTRACION	21,0%	
			IMPREVISTOS	2,0%	$ 942.321,88
			UTILIDAD	5,0%	$ 2.355.803,00
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 43.950.743,88
			TOTAL OFERTA		$ 47.116.054,00

NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Desmonte, traslado e Instalcion de aulas - casetas

Desmonte y demolicion de construccion existente

Desmonte de cubierta

Demolicion de placa

Desmonte de puertas y ventanas

Construccion de cimentacion

Construccion de Placa en concreto con malla electrosoldada

Instalacion de estructura metalica

Instalacion de Cubierta

Instalacion de muros de cerramiento

Instalacion de puertas y ventanas


Resane y pintura de muros

Instalacion de piso interno

Aseo y limpieza de areas intervenidas

PROGRAMACION INICIAL

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
MONTE BELLO	35,75 días	mar 20/10/20	mié 02/12/20
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO Ó SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2,00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD ó CADENA Y CANDADO.	4 días	mar 20/10/20	vie 23/10/20
DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	4 días	vie 23/10/20	mié 28/10/20
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	3 días	mié 28/10/20	vie 30/10/20
RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	4 días	vie 30/10/20	mié 04/11/20
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	5 días	mié 04/11/20	mar 10/11/20
PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	7 días	mar 10/11/20	mié 18/11/20
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	2 días	mié 18/11/20	jue 19/11/20
MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	3 días	jue 19/11/20	lun 23/11/20
TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	1 día?	lun 23/11/20	lun 23/11/20
CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	3 días	lun 23/11/20	mié 25/11/20
COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	6 días	mié 25/11/20	mié 02/12/20
ACOMETIDA PVC Ø 1/2" - 6 MT	1 día?	mié 02/12/20	mié 02/12/20
RED GENERAL DE AGUA FRIA	1 día?	mié 02/12/20	mié 02/12/20
REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	1 día?	mié 02/12/20	mié 02/12/20
REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	1 día?	mié 02/12/20	mié 02/12/20
TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	1 día?	mié 02/12/20	mié 02/12/20

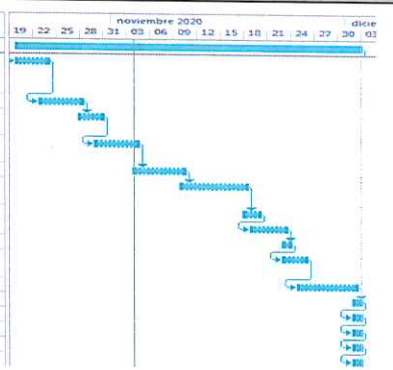

NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la institucion

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9387

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 408	INSTITUCION:	136. IED MONTEBELLO	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE VISITA:	DIRECCION: Calle 26 sur No.1A-44 este	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

De acuerdo a la visita realizada en la sede, se evidencia que las aulas en reportadas, presentan elementos que estan con riesgo de colapsar. Los muros se encuentran fisurados y desplomados. Cubierta en cnaleta 90, con riesgo de desplome debido a que esta soportada sobre los muros. No tiene soportes independientes y con unidades en mal estado. Lla placa base del piso se encuentra fracturada y desnivelada. Carpinteria metalica desplomada y con riesgo de caida

REGISTRO FOTOGRAFICO:









RECOMENDACIONES	El contratista de obra debera realizar como primera instancia, cerramiento de toda el area afectada. Instalacion de elementos que seran desmontados y traslados desde otra sede y que han sido recuperados de otros proyectos. Realizar reconstruccion y reforzamiento de la placa en concreto. Reemplazo de muros, reforzamiento de la estructura y reconstrucion de la cubierta. Asi mismo se debera realizar los respectivos acabados internos y externos para dejar el area en excelentes condiciones y sin riesgo alguno. Se debera contemplar actividades adicionales segun el avance de ejecucion. Entregar areas completamente aseadas.	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9388

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1621	INSTITUCION:	63. IED BENJAMIN HERRERA - SEDE A	LOCALIDAD: PUENTE ARANDA
FECHA DE VISITA: 06/07/2020	DIRECCION: CARRERA 51 A No. 26-38 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: INUNDACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: SÓTANO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presento inundación en el sótano del colegio por altas precipitaciones presentadas en el sector, así como la falta de mantenimiento preventivo y predictivo, recurrente a cargo de las directivas del colegio, generando daños a las redes eléctricas externas de la subestación y planta eléctrica.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

De acuerdo a la soclitud por parte de la SED, se realiza visita a la sede, por falta de mantenimiento a las bombas eyectoras se presenta inundacion en el sotano del colegio y en el cuarto electrico, donde por la cantidad de agua, se presenta riesgo electrico con posibles cortos y descargas electricas al personal presente.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



RECOMENDACIONES	Iniciar con la desenergizar del cuarto electrico, luego proceder con el drenaje del agua que se encuentra en el cuarto electrico y aposada en el sotano. Revisar las bombas eyectoras para ponerlas en funcionamiento nuevamente. Por temas relacionados a la emergencia sanitaria, se debe realizar aseo y limpieza de las areas a diario.	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada electrica asi como tambien hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9389

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1621	INSTITUCION:	63. IED BENJAMIN HERRERA - SEDE A	LOCALIDAD: PUENTE ARANDA

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	07/07/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	HIDRAULICA
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	SÓTANO
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL

$ 2.636.030,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21	ASEO Y VARIOS			$ -	$ -
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -	$ -
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN	2,00	$ 1.318.015,00	$ 2.636.030,00
				SUBTOTAL	$ 2.636.030,00
				ADMINISTRACION 21,0%	$ 553.566,00
				IMPREVISTOS 2,0%	$ 52.721,00
				UTILIDAD 5,0%	$ 131.802,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 738.089,00
				TOTAL OFERTA	$ 3.374.119,00

NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Señalizacion y aislamiento de areas

Desenergizar el cuarto electrico

Drenar agua que se encuentra apozada


Revision de bombas eyectoras y cuarto electrico

Reparacion y puesta en funcionamiento de las bombas eyectoras

Realizar aseo final a las areas intervenidas para ser entregadas al colegio

PROGRAMACION INICIAL

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	BENJAMIN HERRERA	11,25 días	jue 23/07/20	mié 5/08/20
2	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	4 días	mié 22/07/20	lun 27/07/20
3	SUMINITRO E INSTLACION DE BOMBA TRITURADORA EJECTORA	4 días	lun 27/07/20	vie 31/07/20
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO SUMERGIBLE BOMBAS 2 HP CONARRANCADOR DIRECTO DE BOMBAS MARCA MACS INCLUYE 6 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA	4 días	vie 31/07/20	mié 5/08/20

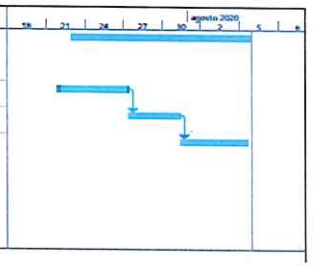

NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: *(*) La atencion de la emergencia y las actividades descritas deberan ser ejecutadas con personal tecnico/hidraulico especialista. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la institucion*

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9390

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 138	INSTITUCION:	124. IED GENERAL SANTANDER	LOCALIDAD: USAQUEN
FECHA DE VISITA: 5/10/2020	DIRECCION:	Cll.159 No.8-56/58	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL / LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula polivalente provisional presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio generando una posible emergencia sanitaria por afectación de vías respiratorias una vez se reinicien las actividades académicas.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







DIAGNOSTICO DE LA VISITA

De acuerdo a la visita realizada en la sede, se evidencia que las aulas en riesgo reportadas, presentan elementos estructurales que estan a punto de colapsar. Algunos muros presentan fisuras. Pisos en mal estado y cubierta obsoletas que estan permitiendo la entrada de agua lluvia al interior de las aulas.

RECOMENDACIONES	El contratista de obra debera realizar la instalacion de elementos que seran desmontados y traslados desde otra sede y que han sido recuperados de otros proyectos. Realizar reconstruccion de placa en concreto. Reemplazo de muros, reforzamiento de la estructura y reconstruccion de la cubierta. Asi mismo se debera realizar los respectivos acabados internos y externos para dejar el area en excelentes condiciones y sin riesgo alguno. Se debera contemplar actividades adicionales segun el avance de ejecucion. Entregar areas completamente aseadas.	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9391

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 138	INSTITUCION:	124. IED GENERAL SANTANDER	LOCALIDAD: USAQUEN

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	06/10/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	AULAS
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	26,13 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 45.430.671,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			$ -	$ -
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -	$ -
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	89,99	$ 53.722,00	$ 4.834.443,00
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	89,99	$ 10.009,00	$ 900.710,00
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	89,99	$ 30.326,00	$ 2.729.037,00
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS	M2	89,99	$ 32.686,00	$ 2.941.413,00
2	CIMENTACION			$ -	$ -
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -	$ -
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	5,00	$ 657.859,00	$ 3.289.295,00
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	6,00	$ 626.926,00	$ 3.761.556,00
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	61,74	$ 70.409,00	$ 4.347.052,00
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	29,05	$ 105.289,00	$ 3.058.645,00
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS	0		$ -	$ -
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	92,11	$ 2.187,00	$ 203.555,00
18	PINTURA	0		$ -	$ -
18.2	PINTURA SOBRE METAL	0		$ -	$ -
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M	63,63	$ 7.081,00	$ 449.856,00
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2	120,34	$ 15.674,00	$ 1.886.209,00
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2	150,00	$ 112.926,00	$ 16.938.900,00
				SUBTOTAL	$ 39.560.671,00
			ADMINISTRACION	21,0%	
			IMPREVISTOS	2,0%	$ 908.613,00
			UTILIDAD	5,0%	$ 2.271.534,00
			TOTAL COSTO (INDIRECTO)		$ 3.180.147,00
			TOTAL OFERTA		$ 45.630.818,00


NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

- Desmonte, traslado e Instalacion de aulas - casetas
- Refuerzo de cimentacion
- Refuerzo de vigas perimetrales para cimentacion
- Refuerzo de estructura metalica
- Refuerzo e Instalacion de muros de cerramiento
- Resane y pintura de muros
- Cerramiento de areas
- Instalacion de Recebo compactado
- Construccion y refuerzo de Placa en concreto
- Instalacion de Cubierta
- Instalacion de puertas y ventanas
- Instalacion de piso interno
- Aseo y limpieza de areas intervenidas

PROGRAMACION INICIAL

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
GENERAL SANTANDER	26,13 días	jue 08/10/20	lun 09/11/20
DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	4 días	jue 08/10/20	mar 13/10/20
DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	4 días	mar 13/10/20	vie 16/10/20
DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	3 días	vie 16/10/20	mar 20/10/20
DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS	4 días	mar 20/10/20	vie 23/10/20
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	5 días	vie 23/10/20	jue 29/10/20
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	7 días	jue 29/10/20	vie 06/11/20
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	2 días	vie 06/11/20	lun 09/11/20
PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	3 días	lun 09/11/20	mié 11/11/20
MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	2 días	mié 11/11/20	jue 12/11/20
ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	3 días	mié 11/11/20	vie 13/11/20
ESMALTE S/ LAMINA LLENA	4 días	vie 13/11/20	mié 18/11/20
LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	4 días	vie 20/11/20	mié 25/11/20

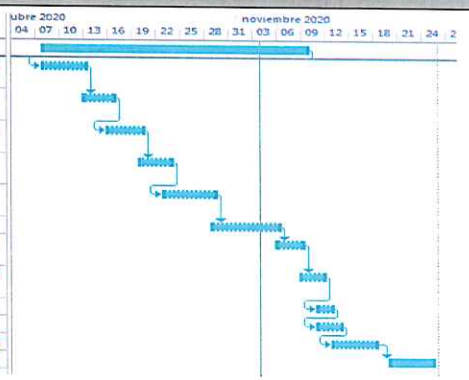

NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la institucion

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9392

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 305	INSTITUCION:	49. IED VERJON BAJO	LOCALIDAD: SANTA FE
FECHA DE VISITA: 06/06/2020	DIRECCION: Colegio distrital el verjon	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICA - BAÑOS	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BAÑOS

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia sanitaria debido a la ausencia de sistemas sanitarios permanentes. En la actualidad la institución educativa hace uso de baños portatiles, cuyo manejo necesita constantemente la ejecución de aseo y recogida de desechos generados.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

El colegio tiene problemas por no tener baterias sanitarias para el alumnado. Se define en visita realizada la construccion de baterias de baños en zona verde externa con material prefabricado, debido a la ausencia del sistema en la sede. Se le define al constructor que debera construir un conjunto de baterias de uso separado para niños y niñas y un baño para personal discapacitado.

REGISTRO FOTOGRAFICO:









RECOMENDACIONES	Para la construccion de los espacios se utilizaran algunos materiales usados pero en perfectas condiocnes, que tiene la SED almacenados en otra sede. Deberan ser trasladados desde alli por el constructor. Los baños estaran sobre una estructura metalica elevada del piso. Construccion de bases o zapatas en concreto para anclar las columnas metalicas. Realizar conexiones sanitarias e hidraulicas. Instalacion de piso con laminas en fribrocemento. Levantar muros en sistema liviano con aislamiento y acabados interiores enchapados y con rejillas de ventilacion. Cubierta con estructura metalica y en teja liviana. Instalacion de aparatos sanitarios (lavamanos, orinales e inodoros con sus respectivos accesorios). Mesones para lavamanos y divisiones metalicas o en acero inox. Instalacion de red electrica para iluminacion con todos sus accesorios. Instalacion de carpinteria metalica. Suministro e instalacion de pozo septico. Adecuacion de placa para area externa de juegos con su respectivo acabado.	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de cuadrillas especiales en hidraulica y de obra civil. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio e instalacion de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9393

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL


OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No.	INSTITUCION:	162. DIRECCION LOCAL DE SUBA	LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE VISITA: 05/02/2021	DIRECCION:	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CAPILLA

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita con especialista de la SED en conjunto con interventoria y contratista de obra a la sede donde se evidencia que la cubierta de la capilla presenta riesgo de colapso por el considerable peso que en este momento tiene entre las tejas y su estructura. Se evidencia material de adobe y barro que ya se ha caido y se presentan secciones y elementos en madera pandeados.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

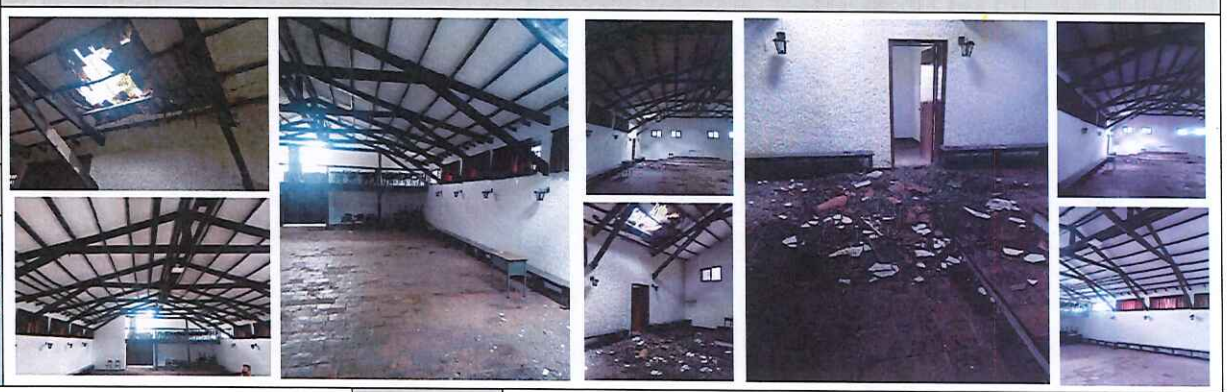

RECOMENDACIONES	Se le sugiere al contratista realizar la mitigacion de la emergencia con el cubrimiento de la seccion colapsada con material provisional. Instalacion de parales en madera como apuntalamiento y apoyo vertical, los cuales deberan ir sostenidos en barriles de concreto instalados en cada pata. Asi mismo se deberan instalar refuerzos horizontales (planchones) en madera, bajo cada seccion de la cubierta para ser anclados a cada elemento vertical. Ninguno de estos elementos instalados deberan afectar la estructura original de la construccion	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial de obra civil para trabajo en alturas. Asi mismo el personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

93941

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 474	INSTITUCION:	164. IED JOSE FELIX RESTREPO - SEDE D	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE VISITA: 19/01/2021	DIRECCION: Calle 17A sur #4-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS - SEDE D

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se declaro la amenaza de ruina por parte de la alcaldia local de San Cristobal de la edificacion ubicada en la calle 17A sur No. 4-40 chip AAA0001DOFT Barrio Velodromo de la localidad de San Cristobal y, en consecuencia, ordenar a la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITITO la demolicion total de la edificacion alli existente.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita al predio donde se evidencia una construccion con alto riesgo de colapso por el estado en que se encuentra. Placas y muros agrietados, cubierta con riesgo de caida. Columnetas desplomadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



RECOMENDACIONES	El contratista de obra debera realizar inicialmente proteccion y cerramiento para aislar la construccion y el area a intervenir. Realizar demolicion de toda la estructura (desmonte de cubierta, demolicion de muros, columnas, muros y placas). Desmonte de carpinteria metalica. Retiro y disposicion de residuos y escombros generados por la actividad y finalmente dejar cerramiento rigido.
OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo de demolicion. Realizar retiro y disposicion de escombros. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9395

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1859	INSTITUCION:	133. IED MARIA CANO	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE
FECHA DE VISITA: 21/10/2020	DIRECCION: Transversal 5U #48J-30 sur	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: COMEDOR

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta sobre el hall principal y circulaciones presenta fallas en su impermeabilización evidenciada por humedades en su cara inferior generando filtración de aguas lluvias a este espacio y por ende el contacto de estas con el acabado de piso generando encharcamientos y la posibilidad de que cualquier persona sea de aseo, vigilancia, alumnos o docentes se resbalen y sufran lesiones.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita al colegio en donde se evidencia una caida de agua por la placa superior de la cubierta sobre la enetrada principal del colegio, lo que esta ocasionando riesgo por inundacion de la zona y posible accidente del personal que por alli transita. Asi mismo se identifican goteras por la zona del comedor que al parecer provienen de la placa de la cubierta o terraza.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







RECOMENDACIONES	De acuerdo a la visita, se le sugiere al contratista, realizar inicialmente exploracion y pruebas de estanqueidad para verificar los puntos exactos por donde se esta generando la filtracion y las posibles causas. Asi mismo, y una vez identificados las causas, se debera proceder a realizar levantamiento de los acabados existentes en las placas de la cubierta, para realizar un correcto y efectivo proceso de impermeabilzacion, ya sea con emulsion, manto asfaltico o algun tipo de acabo epoxico o permeable, resistente a los factores climaticos. Adicional a ello, se debera revisar el estado de sifones y bajantes y garantizar su sellado y correcto funcionamiento	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y trabajos de impermeabilizacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9396

3.2 ACTAS DE SEGUIMIENTO A FRENTES DE OBRA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y SEÑALÉTICA

Las actas relacionadas a continuación corresponden a las sedes cobradas en el acta parcial N° 17, con el fin de realizar un reporte de interventoría detallado por cada una de las sedes, se adjunta:

1. Acta de diagnóstico.
2. Acta de inicio.
3. El acta final no se adjunta al informe N° 14, debido a que por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, en cuanto las observaciones sean atendidas se adjuntaran al informe final.
4. El Informe final no se adjunta al informe N° 14, debido a que por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, en cuanto las observaciones sean atendidas se adjuntaran al informe final.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1221	INSTITUCIÓN:	JORGE ELIECER GAITAN SEDE B	LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS
FECHA DE VISITA: 10/05/2021	DIRECCIÓN: KR 58 # 71 - 89	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones de la sede, evidenciando que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura esns su mayoria son en tableta encerada y concreto

REGISTRO FOTOGRÁFICO:






RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

9398

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1221	INSTITUCIÓN:	JORGE ELIECER GAITAN SEDE B	LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	11/05/2021
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	11 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 6.627.355,36

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	1,000.00	$ 3,793.00	$ 4,216,320.00
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	60.00	$ 3,784.00	$ 227,040.00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	205.00	$ 3,945.00	$ 650,925.00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1.00	$ 8,256.00	$ 8,256.00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	62.00	$ 8,256.00	$ 511,872.00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	33.00	$ 3,845.00	$ 126,885.00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	2.00	$ 3,845.00	$ 7,690.00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	12.00	$ 13,327.00	$ 159,924.00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN EC PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	233.00	$ 3,925.92	$ 718,443.36
			-		
			-		
				SUBTOTAL	$ 6,627,355.36
				ADMINISTRACION 21.00%	$ 1,391,745.00
				IMPREVISTOS 2.00%	$ 132,547.00
				UTILIDAD 5.00%	$ 331,368.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 1,855,660.00
				TOTAL OFERTA	$ 8,483,015.36

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.


Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1221	JORGE ELIECER GAITAN SEDE B - MANUEL MURILLO TORO	11	11-05-21	21-05-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML)	7	11-05-21	17-05-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	16-05-21	16-05-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	7	12-05-21	18-05-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	2	20-05-21	21-05-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	2	20-05-21	21-05-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	2	20-05-21	21-05-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	2	20-05-21	21-05-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	2	20-05-21	21-05-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	7	12-05-21	18-05-21

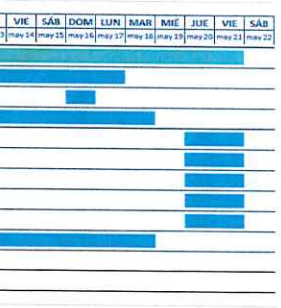

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

9399

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 579	INSTITUCIÓN:	GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE A	LOCALIDAD: USME

FECHA DE VISITA: 12/04/2021	DIRECCIÓN:	CL 83 SUR # 13 - 33 ESTE	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza el diagnosticoa a las instalaciones del colegio, evidenciando que esta cuenta con 3 puntos de acceso, se observan dos edificaciones y doce modulos, las superficies para la demarcacion es en concreto, baldosa y adoquin en su mayoria, tambien cuenta con una escalera metalica, se establece que la sede cuenta con las condiciones para dar inicio a la demarcacion.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA- Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

9400

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 579	INSTITUCIÓN:	GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE A	LOCALIDAD: USME

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 17.485.111,40

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	2,653.00	$ 3,904.00	$ 10,279,232.00
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	100.00	$ 3,784.00	$ 378,400.00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	720.00	$ 3,945.00	$ 2,840,400.00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	2.00	$ 8,256.00	$ 16,512.00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	48.00	$ 8,256.00	$ 396,288.00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	34.00	$ 3,845.00	$ 130,730.00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1.00	$ 3,845.00	$ 3,845.00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	46.00	$ 13,327.00	$ 613,042.00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	720.00	$ 3,925.92	$ 2,826,662.40
				SUBTOTAL	$ 17,485,111.40
				ADMINISTRACION 21.00%	$ 3,671,873.00
				IMPREVISTOS 2.00%	$ 349,702.00
				UTILIDAD 5.00%	$ 874,256.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4,895,831.00
				TOTAL OFERTA	$ 22,380,942.40

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.


Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
579	GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE A - GABRIEL GARCIA MARQUEZ	14	15-04-21	28-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	8	15-04-21	22-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	20-04-21	20-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	8	16-04-21	23-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	3	26-04-21	28-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	3	26-04-21	28-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	3	26-04-21	28-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	3	26-04-21	28-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	3	26-04-21	28-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	8	16-04-21	23-04-21

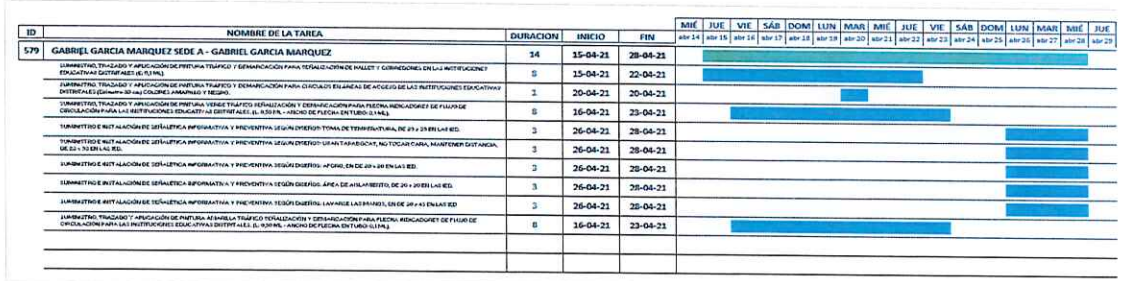

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

9401

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 120	INSTITUCIÓN:	DIVINO MAESTRO SEDE B	LOCALIDAD: USAQUÉN
FECHA DE VISITA: 26/01/2021	DIRECCIÓN: CL 164 # 7 F - 08	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la inspeccion de las instalaciones del colegio, evidenciando que este cuenta con 3 porterias, 2 vehiculares y 1 de acceso peatonal, dispone de doble jornada escolar, la superficie a demarcar es en adoquin y concreto en su mayoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

9402

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 120	INSTITUCIÓN:	DIVINO MAESTRO SEDE B	LOCALIDAD: USAQUÉN

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 4.178.386,00

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
Nº	ITEMS ISO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	453.00	$ 3,734.00	$ 1,690,432.00
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO	UN	90.00	$ 3,784.00	$ 340,560.00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	173.00	$ 3,945.00	$ 682,485.00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	3.00	$ 8,256.00	$ 24,768.00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN	44.00	$ 8,256.00	$ 363,264.00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	23.00	$ 5,825.00	$ 134,575.00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	4.00	$ 3,845.00	$ 15,380.00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	18.00	$ 13,327.00	$ 239,886.00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML)	UN	175.00	$ 3,925.92	$ 687,036.00
			-		
			-		
				SUBTOTAL	$ 4,178,386.00
				ADMINISTRACION 21.00%	$ 877,461.00
				IMPREVISTOS 2.00%	$ 83,568.00
				UTILIDAD 5.00%	$ 208,919.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 1,169,948.00
				TOTAL OFERTA	$ 5,348,334.00

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
120	DIVINO MAESTRO SEDE B - DIVINO MAESTRO	8	20-02-21	27-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	5	20-02-21	24-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO	1	23-02-21	23-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	5	21-02-21	25-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	2	26-02-21	27-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED	2	26-02-21	27-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	2	26-02-21	27-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	2	26-02-21	27-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	2	26-02-21	27-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	5	21-02-21	25-02-21



NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

9403

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 109	INSTITUCIÓN:	DIVINO MAESTRO SEDE C	LOCALIDAD: USAQUÉN

FECHA DE VISITA:	26/01/2021	DIRECCIÓN:	KR 7 D # 163 A - 56	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la inspeccion a las instalaciones del colegio, el colegio cuenta con dos puntos de usados para el ingreso y salida del personal relacionado con las actividades escolares, tambien dispone de doble jornada escolar, la superficie para demarcar es en su mayoria en concreto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:











RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

9404

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 109	INSTITUCIÓN:	DIVINO MAESTRO SEDE C	LOCALIDAD: USAQUÉN

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 1.967.329,20

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				-
NP	ITEMS NO PREVISTOS				-
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	169.70	$ 3,904.00	$ 662,508.80
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (DIÁMETRO 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	70.00	$ 3,784.00	$ 264,880.00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	68.00	$ 3,945.00	$ 268,260.00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN	2.00	$ 8,256.00	$ 16,512.00
NPS60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN	29.00	$ 8,256.00	$ 239,424.00
NPS61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	25.00	$ 3,845.00	$ 96,125.00
NPS62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED	UN	3.00	$ 3,845.00	$ 11,535.00
NPS63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	10.00	$ 13,327.00	$ 133,270.00
NPS64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	70.80	$ 3,925.92	$ 274,814.40
			-		
			-		
				SUBTOTAL	$ 1,967,329.20
				ADMINISTRACION 21.00%	$ 413,139.00
				IMPREVISTOS 2.00%	$ 39,347.00
				UTILIDAD 5.00%	$ 98,366.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 550,852.00
				TOTAL OFERTA	$ 2,518,181.20

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.


Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
109	DIVINO MAESTRO SEDE C - SAN CRISTOBAL NORTE	5	02-02-21	06-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	3	02-02-21	04-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	04-02-21	04-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	3	03-02-21	05-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	06-02-21	06-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	06-02-21	06-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	06-02-21	06-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	06-02-21	06-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	06-02-21	06-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	3	03-02-21	05-02-21

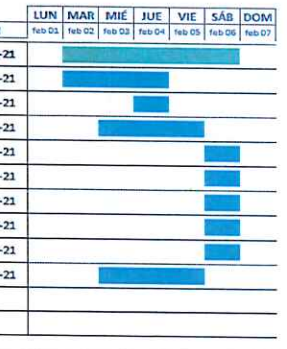

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

9405

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 131	INSTITUCIÓN:	DIVINO MAESTRO SEDE A	LOCALIDAD: USAQUÉN
FECHA DE VISITA: 25/01/2021	DIRECCIÓN: KR 8 C # 163 B - 20	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones de la sede, evidencianto que tiene una puerta de acceso, cuenta con doble jornada escolar, la superficie dispuesta para la demarcacion es principalmente en adoquin.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:









RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 131	INSTITUCIÓN:	DIVINO MAESTRO SEDE A	LOCALIDAD: USAQUÉN

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 3.344.033,36

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (I: 0,1 ML).	ML	327.00	$ 3,896.00	$ 1,276,608.00
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diametro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	75.00	$ 3,784.00	$ 283,800.00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	155.00	$ 3,545.00	$ 532,575.00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1.00	$ 8,256.00	$ 8,256.00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	41.00	$ 8,256.00	$ 338,496.00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	35.00	$ 3,845.00	$ 134,575.00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	2.00	$ 3,845.00	$ 7,690.00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	18.00	$ 13,327.00	$ 239,886.00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	183.00	$ 2,925.92	$ 522,147.36
			-		
			-		
				SUBTOTAL	$ 3,344,033.36
				ADMINISTRACION 21.00%	$ 702,247.00
				IMPREVISTOS 2.00%	$ 66,881.00
				UTILIDAD 5.00%	$ 167,202.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 936,330.00
				TOTAL OFERTA	$ 4,280,363.36

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
131	DIVINO MAESTRO SEDE A - PILOTO BAVARIA	7	23-02-21	01-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	4	23-02-21	26-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	26-02-21	26-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	4	24-02-21	27-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	01-03-21	01-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	01-03-21	01-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	01-03-21	01-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	01-03-21	01-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	01-03-21	01-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	4	24-02-21	27-02-21



NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES:	**(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

9407

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 710	INSTITUCIÓN:	RURAL LA CONCEPCION SEDE A	LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE VISITA: 6/04/2021	DIRECCIÓN: KR 87 K # 69 - 40 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de giagnostico a las instalaciones de la institucion educativa distrital, evidenciando que la sede dispone de doble jornada escolar, cuenta con una porteria peatonal, la superficie a demarcar en su mayoria es bladosa y concreto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:












RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la limpieza de las superficies y punto a intervenir con productos desengrazantes, tanto en paredes como en pisos para garantizar la adherencia de la señales informativas en acrilico y la demarcacion con pintura respectivamente.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA- Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

9408

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 710	INSTITUCIÓN:	RURAL LA CONCEPCION SEDE A	LOCALIDAD: BOSA

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 1.347.916,44

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	103.18	$ 3,904.00	$ 402,814.72
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diametro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	60.00	$ 3,784.00	$ 227,040.00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	43.00	$ 3,945.00	$ 169,635.00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1.00	$ 8,256.00	$ 8,256.00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN	26.00	$ 8,256.00	$ 214,656.00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	20.00	$ 3,845.00	$ 76,900.00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	2.00	$ 3,845.00	$ 7,690.00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	6.00	$ 13,327.00	$ 79,962.00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	41.00	$ 3,925.92	$ 160,962.72
			-		
			-		
				SUBTOTAL	$ 1,347,916.44
				ADMINISTRACION 21.00%	$ 283,062.60
				IMPREVISTOS 2.00%	$ 26,958.00
				UTILIDAD 5.00%	$ 67,396.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 377,416.60
				TOTAL OFERTA	$ 1,725,332.44

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
710	RURAL LA CONCEPCION SEDE A - LA CONCEPCION	3	15-04-21	17-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	2	15-04-21	16-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	16-04-21	16-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	16-04-21	17-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	17-04-21	17-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	17-04-21	17-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	17-04-21	17-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	17-04-21	17-04-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	17-04-21	17-04-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	16-04-21	17-04-21

MIÉ abr 14	JUE abr 15	VIE abr 16	SÁB abr 17	DOM abr 18

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

9409

4. RELACIÓN ANEXOS INFORME MENSUAL N°14

Los anexos entregados al presente informe se relacionan en el siguiente cuadro:

ANEXO 1. INFORME S.I.S.O.M.A. INTERVENTORÍA.
ANEXO 2. ACTAS DE COMITÉ.
ANEXO 3. INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA.
ANEXO 4. ACTA PARCIAL 17.
ANEXO 5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO 6. CORRESPONDENCIA ENVIADA
ANEXO 7. PROGRAMACIÓN DE OBRA
ANEXO 8. RELACIÓN DE TRANSPORTE

ANEXO 1. INFORME S.I.S.O.M.A. INTERVENTORÍA

Proyecto:	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".		
Contratista:	CONSTRUSOCIAL S.A.S	Interventoría:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Contrato:	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646
Informe No.:	14	Periodo:	23 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2021

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X				*Oficio AC2R-SSTMA-SED-XX-2020 Aprobación informe SST N°14*
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X			La documentación de seguridad y salud en el trabajo original y actualizada reposa en las instalaciones de la interventoria AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S Ubicada en Cra 71ª No 52ª-17 Barrio Normandía.	*Carpeta SST del contrato No. CO1.PCCNTR. 1440646*
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	X				*Informe componente SST N° 14 correspondiente al periodo de 23 de Mayo 2020 al 30 de Mayo de 2021*
	1.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X	Oficio enviados al contratista aprobando la documentación SST	*Anexo 6. Oficios SST Numeral 10.*
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	X			La interventoria realiza verificación de seguridad social del personal del contratista mediante muestreo aleatorio de acuerdo a listado semanal. La interventoria verifica el pago de la seguridad social del personal de AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	*Planillas de seguridad social interventoria Anexo 7*
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	X			La interventoria solicita semanalmente el listado de personal del contratista	*Tabla con listado de personal del contratista Numeral 10.*
	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.			X	La interventoria realiza seguimiento a la realización de examen médico ocupacional del personal del contratista y del personal de interventoria al ser contratos de prestación de servicios se aplica la siguiente normatividad. Decreto 1072 de 2015, sección 2.2.4.2.2 ARTÍCULO 2.2.4.2.2.18. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES. A partir del 15 de Mayo de 2013, las personas que tengan contrato formal de prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo de seis (6) meses para practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre ocupacionales será asumido por el contratista..." "Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los contratos". También se indica que en el caso de que el trabajador pierda su condición de contratista por un periodo superior a los seis (6) meses continuos, debe realizarse los exámenes médicos nuevamente para volver a trabajar.	
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.	X			Durante el periodo comprendido entre el 23 de Mayo al 30 de Mayo de 2021 la interventoria solicito los paz y salvos del personal retirado.	*Anexo 9. Paz y Salvos*
	2.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X			La interventoria realiza seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones de SST presentadas en el SG-SST del contratista.	*Registro fotográfico - Numeral 12 Capacitaciones SST Anexo 8*
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.			X	La interventoria realizo notificación de riesgos a su nuevo personal en la inducción del SG-SST. De igual manera, hizo seguimiento a la notificación de riesgos del nuevo personal del Contratista Construsocial.	
	3.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X	De acuerdo a las caracteristicas del contrato de emergencias no se cuenta con campamento	
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X	De acuerdo a las caracteristicas del contrato de emergencias no se requiere maquinaria para la ejecución de las actividades.	
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X			Las intervenciones se realizan dentro de los Colegios Distritales y no es viable la instalación de señalización adicional a la yá instalada en el colegio.	
	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoria.	X			El contratista realiza la demarcación de los frentes de obra para evitar la el ingreso de personal ajeno.	*Registro fotografico Numeral 13.*
	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.	X			Las intervenciones se realizan dentro de los Colegios Distritales y el contratista utiliza las áreas de circulación señalizadas por el colegio, la interventoria realiza seguimiento para que las áreas de circulación mantengan libres de obstaculos.	*Registro fotográfico Numeral 14*
	4.6.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X			La interventoria realiza revisión al contratista sobre el uso de los elementos de protección personal en los frentes de trabajo.	*Registro fotográfico Numeral 15*
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	X			La interventoria realiza revisión al contratista sobre el uso de la dotación en los frentes de trabajo.	*Registro fotográfico Numeral 15*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.			X	Durante el período comprendido entre el 23 de Mayo al 30 de Mayo de 2021 el contratista NO realizo actualización de la matriz de peligros. .	
	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.			X	Durante el período comprendido entre el 23 de Mayo al 30 de Mayo de 2021 no se realizaron actividades de alto riesgo.	
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.			X	Durante el período comprendido entre el 23 de Mayo al 30 de Mayo de 2021 no se realizaron actividades de alto riesgo.	

	6.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.	X			La interventoria evidencia el cumplimiento por parte del contratista frente a la documentación de los vehículos e idoneidad de quien los opera.	*Documentos vehiculos utilizados por el contratista* *Anexo 4*

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.			X	Para el periodo comprendido entre el 23 de Mayo al 30 de Mayo del 2021 no se realizaron mantenimientos de maquinaria.	
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría oportunamente.	X			La interventoría evidencia cumplimiento por parte del contratista frente al control de las preoperacionales de la volqueta utilizada por el contratista	*Documentos de vehículos - Anexo 4.*
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.	X			Durante el periodo comprendio entre el 23 de Mayo al 30 de Mayo, el contratista desarrolló las actividades dentro del horario establecido por la alcaldia de Bogotá para el sector de la Construcción 10: am - 7: 00 pm. En caso de requerir realizar intervenciones nocturnas tendran como unico objeto mitigar la emergencia.	
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.			X	Durante el periodo comprendio entre el 23 Mayo al 30 de Mayo 2021, el contratista no utilizó maquinaria	
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.			X	De acuerdo a las caracteristicas del contrato de emergencias, no se requiere autorización por parte de la interventoria porque el contratista atiende la solicitud por demanda.	
	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.	X			El contratista realiza inspección de vehículos y verifica que los conductores cuenten con la licencia de conducción. No se utilizan maquinaria especializada dentro del contrato de emergencias. .	*Documentos vehiculos utilizados por el contratista Anexo 4*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	X			El contratista presenta las planillas de pago del personal dentro del informe mensual, la interventoria verifica que se encuentren al dia en los pagos.	*Planillas de seguridad social Anexo 9.*
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X			La interventoria solicita semanalmente el listado de personal del contratista y verifica que se encuentren cubiertos por ARL, AFP y EPS.	*Tabla con listado de personal del contratista e interventoria. Numeral 11.*
	8.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
9. EMERGENCIAS	9.1.	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.	X			La interventoria realiza seguimiento a los recursos definidos por el contratista dentro del plan de emergencias aprobado.	
	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	X			El contratista realiza conformación de una brigada para atender las emergencias que se presenten dentro del contrato.	
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.			X	Durante el periodo de 23 de Mayo al 30 de Mayo 2021 no se realizaron simulacros.	
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en forma inmediata.			X	Durante el periodo de 23 de Mayo al 30 de Mayo 2021 no se presentaron emergencias en la obra.	
	9.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.			X	De acuerdo a las caracteristicas del contrato de emergencias, no se cuenta con campamento para que el contratista instale los vestieres.	
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	X			El colegio destina un baño para el personal y contratista se encarga de realizar la limpieza y mantenimiento una vez concluida la atención de la emergencia.	*Registro fotográfico Numeral 16*
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X			El contratista suministro a cada trabajador un recipiente para el consumo de bebidas hidrantes en los frentes de obra.	

	10.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.	X			La interventoria realiza seguimiento al orden y aseo de los frentes de trabajo ejecutados por el contratista.	*Inspección de orden y aseo Anexo 5.*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.			X	El contratista realiza divulgación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo en la inducción.	
	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.	X			El contratista da cumplimiento al protocolo de bioseguridad como mecanismo de prevención del covid - 19. La interventoria realiza seguimiento al cumplimiento del protocolo.	*Registro fotografico Numeral 17*
	12.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X			Para el periodo comprendido entre el 23 de Mayo al 30 de Mayo del 2021 no se realizó reunión del COPASST	
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X			Para el periodo comprendido entre el 23 de Mayo al 30 de Mayo 2021 NO se realizó reunión trimestral del Comité de Convivencia Laboral.	
	13.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	X			La interventoria lleva control de los indicadores de SST del personal del contrato.	
	14.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadistico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.	X			Para el periodo comprendido entre el 23 de Mayo al 30 de Mayo 2021 no se presentan accidentes laborales.	
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.			X	Para el periodo comprendido entre el 23 de Mayo al 30 de Mayo 2021 no se presentan accidentes laborales.	
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.			X	Para el periodo comprendido entre el 23 de Mayo al 30 de Mayo 2021 no se presentan accidentes laborales.	
	15.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ:

NOMBRE: LUZ STELLA PIENDA BUSTOS
CARGO: RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EMPRESA: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
FECHA:

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646

del 2 de Abril de 2020

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá, Junio de 2021

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1436286 del 16 de Marzo de 2020.

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.** NIT: 819.002.637-3 German Villanueva Calderon CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA- MAGDALENA 4231714 / 3188430358 villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de abril de 2020
PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses. Hasta el 22 de febrero de 2020 y/o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra
FECHA DE INICIO	23 de abril de 2020
VALOR	$ 3.571.094.800,00 COP
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR. 1440646 del 16 de Marzo de 2020

INTERVENTORIA	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.** NIT. 830.123.577-7 Camilo Andrés Rosario Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandía (+57 1) 2109456 / 311 353 13 84 ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de abril de 2020
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato de interventoría es de diez meses (10), dividido en dos etapas así: 1).Ejecución de la interventoría a la obra hasta el 22 de marzo de 2021 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	23 de abril de 2020
VALOR	$ 428.828.400,00 COP
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 22 de Marzo de 2021 o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Arq. Edwin Santana Rodríguez Profesional Especializado 311 5899777 esantana@educacionbogota.gov.co

COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

1. Relación de oficios Gestión ambiental

N° OFICIO	FECHA	CONCEPTO	QUIEN LO EMITE	QUIEN LO RECIBE
CORREO ELECTRÓNICO	24 de Mayo de 2021	Informes SST – GA	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S
CORREO ELECTRÓNICO	28 de Mayo de 2021	Incumplimiento entrega informe N° 13 SST – GA	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S
CORREO ELECTRÓNICO	29 de Mayo de 2021	Observaciones informe N° 12 SST – GA	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S
AC2R–SST MA –SED–70-2021	29 de Mayo de 2021	Observaciones informe N° 12 SST – GA - Seguimiento	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S
CORREO ELECTRÓNICO	29 de Mayo de 2021	Incumplimiento entrega informe N° 13 SST – GA - Revisión	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S
AC2R–SST MA –SED–71-2021	29 de Mayo de 2021	Observaciones informe SST-GA N° 13	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

2. Almacenamiento de materiales

La interventoría realiza seguimiento al almacenamiento de materiales, de tal manera que se dé cumplimiento a lo establecido en el PMA.



Ilustración 1. Colegio



Ilustración 2. Colegio

3. Desde interventoría se realiza seguimiento a las zonas verdes de las instituciones educativas para verificar que se encuentren libres de materiales de construcción, escombros o residuos generados por los tratamientos a la vegetación.



Ilustración 3. Colegio



Ilustración 4.

4. Permisos ambientales y mineros de los proveedores de materiales

TIPO DE MATERIAL	PROVEEDOR	PERMISO AMBIENTAL O MINERO
Cemento, Mixto, Arena	Compañía Minera JM	Contrato de Concesión (D 2655) expedido por la ANM.

5. Listado de sustancias químicas utilizadas por el contratista.

NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUIMICA	CUENTA CON LA HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON LA NTC 4435	LOS COLABORADORES CUENTAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS
PINTURA BASE SOLVENTE	SI	SI
PINTURA DE TRÀFICO ACRILICA	SI	SI
IMPRIMANTE PARA TRÀFICO	SI	SI
DISOLVENTE	SI	SI
SOLVENTE	SI	SI
GASOLINA	SI	SI
THINNER	SI	SI
XILOL	SI	SI

6. Vehículos transporte de sustancias químicas

PLACA	TIPO DE VEHICULO	TECNICO MECÁNICA	VIGENCIA TECNICO MECANICA	SOAT	VIGENCIA SOAT
GUU 266	CAMION	N/A	N/A	1523005269601	30/01/2021 al 30/01/2022

PLACA	TIPO DE VEHICULO	TECNICO MECÁNICA	VIGENCIA TECNICO MECANICA	SOAT	VIGENCIA SOAT
WER 677	CARGA	149529551	Del 21/10/2020 al 21/10/2021	13886500056550	01/08/2020 al 01/08/2021
SLJ 686	CAMION	149705569	Del 27/10/2020 al 27/10/2021	13675500017310	25/10/2020 al 24/10/2021
GES 751	CAMIONETA	152710207	26/04/2021 al 26/04/2022	26429673	25/04/2021 al 24/04/2022
SPN 131	CAMIONETA	47317948	Del 13/06/2020 al 13/06/2021	79093303	01/09/2020 al 31/08/2021
VAK 034	CAMIÓN	148925266	Del 17/09/2020 al 17/09/2021	1523004471801	10/08/2020 al 09/08/2021
ICK 227	CAMIONETA	47317954	Del 13/06/2020 al 13/06/2021	80974699 – 604414902	Del 23/04/2021al 22/042022
GET 028	CAMIONETA	152758486	Del 08/05/2021 al 08/05/2022	26527971	Del 10/05/2021 al 09/05/2022
UPP 881	CAMIONETA	151712785	07/02/2021 al 07/02/2022	13652800006090	Del 09/02/2021 al 08/02/2022

7. Actividades de capacitación ambiental realizadas por la interventoría

INTERVENTORIA	
FECHA	TEMA
04/05/2021	Producción más limpia

8. Actividades de orden y aseo ejecutadas por el contratista.



Ilustración 7. *Colegio Paraíso Manuela Beltrán*



Ilustración 8. *Colegio Paraíso Manuela Beltrán*

COMPONENTE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniería & Proyectos S.A.S

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

9. Relación de oficios Seguridad y Salud en el Trabajo

N° OFICIO	FECHA	CONCEPTO	QUIEN LO EMITE	QUIEN LO RECIBE
CORREO ELECTRÓNICO	24 de Mayo de 2021	Informes SST – GA	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S
CORREO ELECTRÓNICO	28 de Mayo de 2021	Incumplimiento entrega informe N° 13 SST – GA	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S
CORREO ELECTRÓNICO	29 de Mayo de 2021	Observaciones informe N° 12 SST – GA	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S
AC2R–SST MA –SED–70-2021	29 de Mayo de 2021	Observaciones informe N° 12 SST – GA - Seguimiento	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S
CORREO ELECTRÓNICO	29 de Mayo de 2021	Incumplimiento entrega informe N° 13 SST – GA - Revisión	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S
AC2R–SST MA –SED–71-2021	29 de Mayo de 2021	Observaciones informe SST-GA N° 13	INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL S.A.S

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

10. Listado de personal de interventoría

INTERVENTORIA OBRA CIVIL PERSONAL AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S						
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	% DEDICACIÓN	ARL	EPS	AFP
Melisa Janez Gómez Palacios	1.077.425.387	Residente	100%	Seguros Bolívar	Famisanar	Protección
Nelson Riviera	19.465.978	Inspector 1	100%	Seguros Bolívar	Famisanar	Colfondos
Luz Stella Pineda Bustos	1.026.260.474	Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo	5%	Seguros Bolívar	Sanitas	Protección

INTERVENTORIA SEÑALIZACIÓN PERSONAL AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S						
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	% DEDICACIÓN	ARL	EPS	AFP
Juan Felipe Uribe Gómez	16.072.632	Director de interventoría	50%	Seguros Bolívar	Sura	Colpensiones
Juan Carlos Rincón	1.023.873.559	Residente	100%	Seguros Bolívar	Salud Total	Porvenir
Oscar Iván Salamanca	74.082.212	Residente	100%	Seguros Bolívar	Famisanar	Porvenir
Jeisson Javier Bermúdez Jara	1.073.164.894	Inspector 1	100%	Seguros Bolívar	Famisanar	Protección
Anderson Fabián Cely Izaquita	19.465.978	Inspector 2	100%	Seguros Bolívar	Coomeva	Porvenir
Diego Alejandro Ramírez Poveda	13.460.203	Inspector 3	100%	Seguros Bolívar	Famisanar	Porvenir
Edwin Fernando Marroquín Bustos	11.810.445	Inspector 4	100%	Seguros Bolívar	Compensar	Porvenir
Luz Stella Pineda Bustos	1.026.260.474	SISO 1	100%	Seguros Bolívar	Sanitas	Protección

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

INTERVENTORIA SEÑALIZACIÓN PERSONAL AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S						
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	% DEDICACIÓN	ARL	EPS	AFP
John Eduard Aros Rodríguez	1.032.483.095	Ambiental	50%	Seguros Bolívar	Salud Total	Protección
Brayan Fernando Calderón Osma	1.010.208.109	Inspector 5	100%	Seguros Bolívar	Sanitas	Protección
Duvan Arley Guanumen Castillo	1.023.966.874	Inspector 6	100%	Seguros Bolívar	Sura	Protección
Fabian Estiwar López Vanegas	1.014.281.123	Inspector 7	100%	Seguros Bolívar	Capital Salud	Porvenir
Mabel Alejandra Olarte Velandia	1.000.001.825	Inspector 8	100%	Seguros Bolívar	Capital Salud	Protección

11. Listado de personal de Contratista

CONTRATISTA PERSONAL ADMINISTRTIVO - CONSTRUSOCIAL					
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP
Ana María Corchuelo Mora	1.023.918.863	SST - Ambiental	Sanitas	Positiva	Protección
Diego Alejandro Fernández	10.304.300	Director	Sanitas	Colmena	Protección
Orlando Santiago Hernández	1.013.628.995	Residente	Sanitas	Positiva	Porvenir
Brandon Cuan	1.000.830.642	Auxiliar	Sura	Positiva	Protección
Jessica Daniela Tavera Reyes	1.233.498.710	Auxiliar	Sanitas	Colmena	Porvenir

CONTRATISTA PERSONAL OPERATIVO - CONSTRUSOCIAL					
TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP
Víctor Manuel Reyes Caro	7.164.000	Especialista	Seguros Bolívar	Sanitas	Colpensiones

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

CONTRATISTA PERSONAL OPERATIVO - CONSTRUSOCIAL					
TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP
Dayron Fabian Caro Duran	1.056.955.474	Coordinador	Seguros Bolívar	Famisanar	Colpensiones
Ossman Gildardo Oviedo Reyes	7.187.580	Inspector	Seguros Bolívar	Famisanar	Porvenir
Edinson Gallardo Muñoz	6.423.197	Inspector	Seguros Bolívar	Famisanar	Colpensiones
Jaime Alfredo Quintero Diaz	17.975.643	Inspector	Seguros Bolívar	Suramérica	Porvenir
Roberto Soler Franco	80.232.616	Conductor	Seguros Bolívar	Famisanar	Protección
Eduard Yovany Parrado Vega	1.024.518.230	Conductor	Seguros Bolívar	Nueva EPS	Porvenir
Miguel Angel Fonseca Pinilla	1.032.455.068	Conductor	Sura	Colsubsidio	Colpensiones
Bladimir Flor López	1.123.141.385	Operario	Seguros Bolívar	Suramericana	Porvenir
Orlado Alexander Padilla Campos	80.762.581	Operario	Seguros Bolívar	Compensar	Protección
Jhon Jairo Betancur Sánchez	10.107.697	Operario	Seguros Bolívar	Salud Total	Colfondos
John Freddy Castro González	1.014.207.108	Operario	Seguros Bolívar	Famisanar	Protección
Camilo Eduardo Arias Acosta	1.016.072.356	Operario	Seguros Bolívar	Famisanar	Porvenir
Leonardo Suarez Gamba	1.072.661.229	Operario	Seguros Bolívar	Compensar	Protección
Edwin Fernando López Otalora	7.184.770	Operario	Seguros Bolívar	Sanitas	Porvenir
José Miguel Suesca Nevá	1.049.652.059	Operario	Seguros Bolívar	Nueva EPS	Porvenir
Ricardo Rojas Sánchez	83.089.837	Operario	Seguros Bolívar	Compensar	Protección
Weimar González Mora	80.232.283	Operario	Seguros Bolívar	Famisanar	Colfondos
Wilson Acosta Fagua	1.056.957.399	Inspector	Seguros Bolívar	Famisanar	Porvenir
Samuel Mora Rueda	1.018.470.733	Operario	Sura	Famisanar	Porvenir
John Elmer Murillo	80.231.609	Operario	Sura	Salud Total	Colpensiones
Miguel Alfredo Ocampo Rodríguez	80.259.111	Operario	Sura	Famisanar	Protección
Duván Fernando Ramírez Sandoval	1.005.482.891	Operario	Sura	Famisanar	Porvenir
Junior José Coral Montilla	1.016.076.984	Operario	Positiva	Salud Total	Porvenir

CONTRATISTA PERSONAL OPERATIVO - CONSTRUSOCIAL					
TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP
Luis Alfonso Ibáñez Gil	1.033.734.369	Operario	Positiva	Salud Total	Porvenir
Henrry Kissinger Reyes García	19.880.067	Operario	Positiva	Nueva EPS	Protección
Wilson Javier Montenegro Duarte	4.047.362	Operario	Positiva	Famisanar	Protección
Jesús Yovanny Coral Montilla	98.136.713	Operario	Positiva	Sanitas	Porvenir
Diego Fernando Carrillo Calderón	80.803.786	Operario	Positiva	Compensar	Porvenir
Jorge Alirio Porras Parra	79.831.939	Operario	Positiva	Salud Total	Porvenir
Edwin Gonzalo García Angulo	80.739.892	Gerente	Sura	Compensar	Porvenir
David Ricardo Sánchez Ruíz	1.014.240.634	Ingeniero	Sura	Nueva EPS	Colpensiones
Jorge Armando Robayo Martínez	80.770.031	Ingeniero	Sura	Famisanar	Porvenir
James Humberto Bedoya Ramírez	1.024.496.549	Oficial	Sura	Salud Total	Colfondos
José Luis Hoyos Utieles	1.002.444.481	Operario	Sura	Nueva EPS	Protección
Luis Alfredo Hoyos Utieles	1.002.444.563	Oficial	Sura	Sanitas	Protección
Jaider Farith Pérez Rayo	1.003.777.836	Oficial	Sura	Capital Salud	Protección
Alexis Yesid Vargas Soler	1.020.789.946	Operario	Sura	Sura	Protección
Adrián Useche Lozano	80.032.500	Oficial	Sura	Medimas	Colfondos
Kevin Yesid Pérez Rayo	1.003.778.054	Operario	Sura	Nueva EPS	Protección
Yhon Geldis Valencia Ortega	1.043.842.534	Operario	Sura	Salud Total	Porvenir
Richard Dean Martínez Villa	1.043.849.111	Operario	Sura	Salud Total	Porvenir
Nicolas Mateo Díaz Mercado	1.024.486.040	Operario	Sura	Salud Total	Colfondos
Jesús Alberto Urango Jiménez	1.096.244.058	Operario	Sura	Nueva EPS	Porvenir

12. Capacitaciones ejecutadas por la interventoría durante el periodo

INTERVENTORIA	
FECHA	TEMA
25 – 05 – 2021	Seguridad Vial

13. Señalización prohibitiva



Ilustración 9. *Colegio Alfonso Reyes Echandía*



Ilustración 10. *Colegio Alfonso Reyes Echandía*

14. Áreas destinadas para la movilidad.



Ilustración 11. *Alfonso Reyes Echandía*



Ilustración 12. *Colegio Alfonso Reyes Echandía*

15. Uso de elementos de protección personal



Ilustración 13. *Alfonso Reyes Echandía*

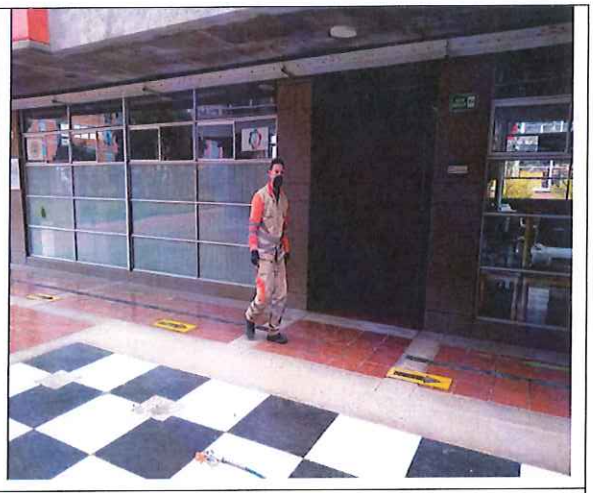


Ilustración 14. *Alfonso Reyes Echandía*

16. Baños asignados al contratista




Ilustración 15. *Colegio Alfonso Reyes Echandía*




Ilustración 16. *Colegio Paraíso Manuela Beltrán*

17. Actividades de promoción y prevención

LAVADO DE MANOS

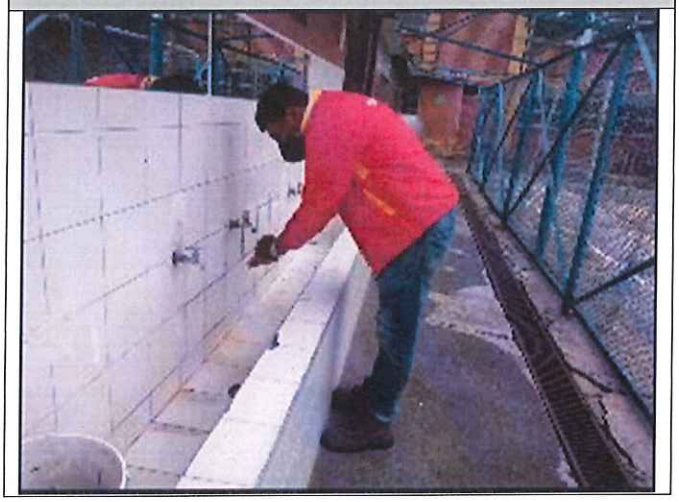

DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

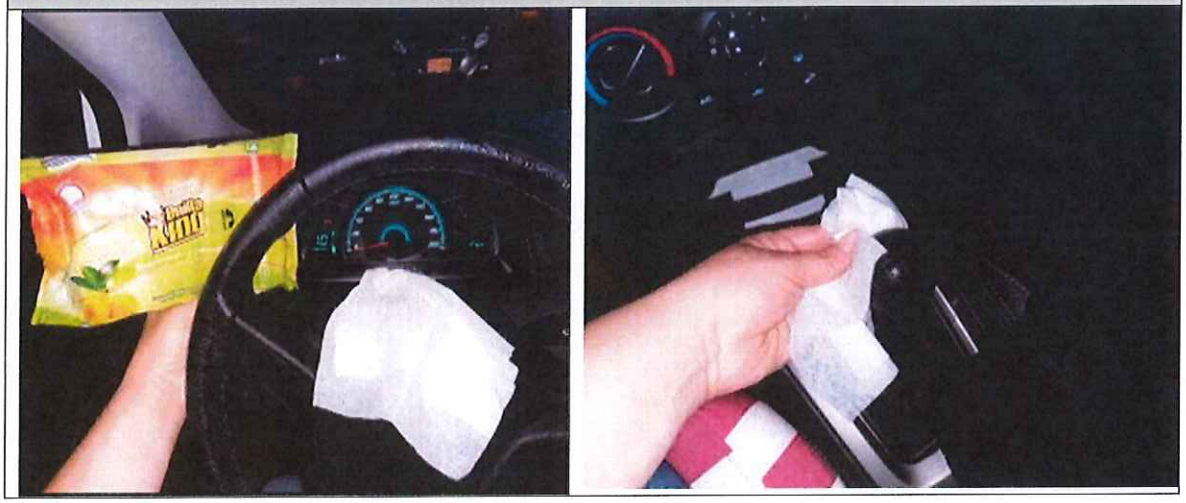

Gmail

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>

INFORMES SST - GA

1 mensaje

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com> 24 de mayo de 2021, 10:42
Para: Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>, auxsisosed@outlook.es, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>
CCO: camrr453@gmail.com, luz stella pineda bustos <pinedabustos@gmail.com>

Cordial saludo Ana María,

Mediante el presente correo se les solicita al contratista enviar los informes pendientes del componente ambiental y SST.

*Informe 11: Del 23 de febrero al 22 de marzo. NO SE HAN SUBSANADO LOS HALLAZGOS
*Informe 12: Del 23 de marzo al 22 de abril. NO SE HA RECIBIDO, UN MES DE ATRASO
* informe 13: Del 23 de abril al 22 de mayo. PLAZO DE ENTREGA VIGENTE.

Loa informes deben ser enviados máximo el día 27 de mayo del 2021.

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

LUZ STELLA PINEDA BUSTOS
INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA

9435

Gmail

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>

Incumplimiento entrega informe N° 13 - SST GA

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com> 28 de mayo de 2021, 22:21
Para: Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>, auxsisosed@outlook.es, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>, Jessica Tavera <jessicatavera98@gmail.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>
CCO: camrr453@gmail.com, "Arq. Edwin Santana" <Esantana@educacionbogota.gov.co>, luz stella pineda bustos <pinedabustos@gmail.com>

Cordial saludo Ana María,

Mediante el presente le informo que NO se recibió el informe N° 13 del componente SST - GA, el cual usted se comprometió a entregar hoy 28 de mayo antes de las 14:00 horas.
Este compromiso fue adquirido en la reunión del día 25 de mayo. Le solicitó este sea enviado el día de mañana a primera hora para poder hacer la respectiva revisión.

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

LUZ STELLA PINEDA BUSTOS
JOHN EDUARD AROS RODRÍGUEZ
INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA

9436

Gmail **AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>**

Observaciones Informe N° 12 - SST GA

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com> 29 de mayo de 2021, 10:03
Para: ANA MARIA CORCHUELO <anamaria0930@outlook.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>, auxsisosed@outlook.es, Jessica Tavera <jessicatavera98@gmail.com>
CCO: camrr453@gmail.com, "Arq. Edwin Santana" <Esantana@educacionbogota.gov.co>, luz stella pineda bustos <pinedabustos@gmail.com>

Cordial saludo Ana María,

Envió oficio N° AC2R-SSTMA-SED-70-2021 que tiene como asunto: Seguimiento observaciones Informe SST – GA N° 12.
Al lado de cada observación, encontrará si fue subsanada o no, para el caso de las observaciones que NO fueron corregidas en la parte inferior encontrará una explicación detallada del motivo por el cual no se da el respectivo cierre.

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

LUZ STELLA PINEDA BUSTOS
JOHN EDUARD AROS RODRÍGUEZ
INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA

El sáb, 29 de may. de 2021 a la(s) 06:10, ANA MARIA CORCHUELO (anamaria0930@outlook.com) escribió:

> ANA MARIA CORCHUELO ha compartido un archivo de OneDrive con usted. Para verlo, haga clic en el vínculo siguiente.
>
> CORRECCIONES INFORME 12.rar
>
> Buen dia Stella.
> Anexo envío respuesta a las observaciones realizadas al informe No 12 bajo oficio No *"OFICIO No AC2R- SSTMA -SED-67-2020".*
>
> Quedamos atentos a sus comentarios.
>
> Ana María Corchuelo
> Tel. 3208208361
>
> **De:** AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>
> **Enviado:** jueves, 27 de mayo de 2021 4:52 p. m.
> **Para:** ANA MARIA CORCHUELO <anamaria0930@outlook.com>; auxsisosed@outlook.es <auxsisosed@outlook.es>; Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>; DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>
> **Asunto:** Observaciones Informe N° 12 - SST GA
>
> Cordial Saludo Ana María,
>
> Después de revisar el informe N° 12 se solicita se subsanen las siguientes observaciones, Oficio N° AC2R-SSTMA-SED-67-2021: 9437
>
> | N° | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CORREGIDO |
> |---|---|---|---|

N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORREGIDO	
			SI	NO
1	**Sistema de Seguridad Social**	Adjuntan la planilla de seguridad social del Ing. Santiago Hernández, pero este no esta incluido en el listado del personal activo. Por favor **incluirlo.**		
2	**Sistema de Seguridad Social**	Planilla de Seguridad Social del Ing. Diego Alejandro y de Jessica Tavera **NO** incluyen el pago de ARL, por favor **enviar** la planilla de ARL.		
3	**Sistema de Seguridad Social**	En listado de personal se incluye a Jesús Ramírez y Brandon Cuan pero no anexaron las respectivas planillas de seguridad social, por favor **Incluir.**		
4	**Sistema de Seguridad Social**	**Bosque & Ciudad:** El listado de **personal** reportado en el informe NO corresponde con el que ejecuto las actividades: • Marco Antonio Baylon - C.C 18.205.577 • Luis Enrique Hernández Chabata - C.C 79.603.421 • Hernán Darío Mendoza Jimenes - C.C 1.041.261 • Helver Humberto Pedraza Salcedo - C.C 80.799.003 • Deimer David Diaz Mendoza - C.C 1.041.255.656 • Daniel Alexis De pablos Ortiz - C.C 1.094.839.080 • Luis Aníbal Cañas Rey - C.C 3.186.388 • Edilberto Cubides Maldonado - C.C 80.001.629 • Jhorman Gómez - C.C. 1.033.714.398 • Yeisson Chacón Hernández - C.C. 26.767.607 • Nelson Enrique Caballero - C.C. 1.232.390.102 • Jair Fernando Hincapié – C.C. 80.873.310 Las respectivas afiliaciones fueron enviadas previo al inicio de actividades, sin embargo, se debe anexar la planilla de seguridad social. Por favor **solicitar** a Allison. En caso de que el personal incluido en el informe ya no tengo un vincula laboral con la empresa subcontratista, remitir los respectivos paz y salvos. Puede ser uno general en que diga que la empresa Bosque y ciudad se encuentra paz y salvo con ese personal.		
5	**Sistema de Seguridad Social**	**VRC Ingeniería** Adjuntan la planilla general de la empresa, sin embargo, en esta el único personal relacionado en el informe es "Jorge Alirio Parra". Falta todo el personal, incluso el Ing. Victor Reyes y Dayron Caro De igual manera, no se adjunta la seguridad social de las cuadrillas subcontratadas por VRC de empresas como: M&M Señalización vial, Ingevial.		

9438

N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORREGIDO	
			SI	NO
6	**Sistema de Seguridad Social**	**G&G** Falta la seguridad social del siguiente personal: • Gustavo Andrés Sánchez Ruíz • Mauricio Díaz García • Victor Alfonso Gamba Sánchez • Juan Rafael Díaz Mercado		
7	**Sistema de Seguridad Social**	Incluir la cuadrilla de Energías del putumayo, y enviar los respectivos soportes de afiliación social. A este caso se le está haciendo seguimiento, se debe responder el oficio **No AC2R-SSTMA -SED-62-2021**		
8	**Sistema de Seguridad Social**	No se incluye el listado de personal de obra civil, ni se anexan las planillas de seguridad social respectivas.		
9	**Ingreso de personal** **Ítem 2.3.**	Se siguen anexando los mismos exámenes médicos desde el corte 9. En ese ítem pueden incluir los exámenes enviados por Bosque y Ciudad y los demás eliminarlos dado que se reportaron con anterioridad.		
10	**Ingreso de personal** **Ítem 2.4**	Este punto en el informe tiene mal las fechas, corregir.		
11	**Inducciones y capacitaciones** **Ítem 3.1.**	En el formato anexado, aparece como temas los dados en la inducción, sin embargo, NO se reporta ningún ingreso de personal. He de recordar que una capacitación SST es **diferente** a la inducción.		
12	**Inducciones y capacitaciones** **Ítem 3.2.**	La notificación de riesgos se realiza previo al ingreso. Si no se reportaron nuevos ingresos, no deben anexar notificación. De igual manera, el archivo esta nombrado incorrectamente, e incluye actividad de pausas activas.		
13	**Elementos de protección personal** **Ítem 5.1.**	Los formatos del Anexo 2 se encuentran sin fecha de entrega, se debe poder identificar que corresponde al corte del informe: Del 23 de Marzo al 22 de Abril. De igual manera, se incluyen formatos en blanco, y no está la totalidad del personal.		
14	**Elementos de protección personal** **Ítem 5.2.**	El registro fotográfico anexado es similar al del informe 11. Lo único que hacen es recortar la foto. Por favor, incluir un registro fotográfico diferente. Dado que están realizando visitas a los frentes de trabajo deben tener fotografías suficientes que puedan utilizar.		

9439

N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORREGIDO	
			SI	NO
15	**Administración de los riesgos** **Ítem 6.1.**	En el informe dice que la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se incluye en el Anexo 3, pero esta vacío. Si se realizó alguna actualización SI se debe incluir, de lo contrario pueden decir que se presento con anterioridad y no se ha actualizado.		
16	**Administración de los riesgos** **Ítem 6.2.**	El anexo N° 4 ya fue presentado. Si no se han realizado nuevos procedimientos de trabajo seguro, para actividades como demolición o trabajo en alturas. No incluir, y decir que, fueron entregados previamente.		
17	**Administración de los riesgos** **Ítem 6.3.**	En el informe dice que el Anexo 17 corresponde a los permisos de trabajo, sin embargo, se encuentra vacío. Por favor incluir los permisos de trabajo de alturas de los tratamientos silviculturales. Solicitar a Allison.		
18	**Maquinaria, equipos y vehículos** **Ítem 7.1.**	En los documentos del vehículo de G&G placas BGK 591 no se anexa el SOAT.		
19	**Maquinaria, equipos y vehículos** **Ítem 7.1.**	**VRC** Se debe incluir la documentación de la totalidad de los vehículos, faltan los siguientes: • WER 677 – Camión • WNZ 097 – Camión • ICK 227 – Camioneta • GET 028 - Camioneta • UPP 881 – Camioneta		
20	**Maquinaria, equipos y vehículos** **Ítem 7.3.**	Se reportan 8 vehículos, pero solo anexan la inspección preoperacional de uno.		
21	**Maquinaria, equipos y vehículos** **Ítem 7.7.**	En la documentación de algunos vehículos NO se anexa la licencia de conducción, por favor incluir.		
22	**Divulgación** **Ítem 12.2.**	El anexo 12 no tiene fechas, es decir, no se puede constatar que correspondan al corte N° 12 del 23 de Marzo al 22 de Abril.		
23	**Copasst y Comité de Convivencia Laboral** **Ítem 13.1.**	En el anexo 13 tienen que corresponde al informe N° 11. De igual manera, el acta de COPASST del informe 11 dice que una de las actividades pendientes para este mes es "primeros auxilios". No se evidencia ningún anexo ... ¿era una actividad de capacitación, formación?		

9440

N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORREGIDO	
			SI	NO
24	Copasst y Comité de Convivencia Laboral Ítem 13.2.	Para el mes de Abril se debía realizar la reunión trimestral del CCL. Tal y como dice en informe. Por favor incluir la respectiva acta, se debe incluir el acta de reunión y el plan de acción de la queja presentada en el Colegio Orlando Higuita.		

N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORREGIDO	
			SI	NO
1	Manejo de materiales Ítem 2.1.	El registro fotográfico es el mismo del informe N° 11.		
2	Manejo de materiales Ítem 2.2.	El registro fotográfico es el mismo del informe N° 11.		
3	Manejo de RCD Ítem 4.6.	Dentro de los certificados de disposición, se evidencia que también se utilizó la volqueta de placas SCF 903. Por favor incluir la respectiva documentación y verificación del pin de transportador.		
4	Manejo de sustancias químicas Ítem 6.1.	En el informe dicen que hicieron disposición de sustancias químicas, y que los respectivos soportes se encuentran en el Anexo 14. Sin embargo, esta carpeta está vacía. Por favor incluir.		
5	Manejo y control de emisión atmosféricos Ítem 8.1.	El registro fotográfico es el mismo del informe N° 11.		
6	Manejo y control de emisión atmosféricos Ítem 8.3.	El registro fotográfico es el mismo del informe N° 11.		
7	Manejo de flora, fauna y paisaje Ítem 9.4.	Durante el corte N° 12 se realizaron los siguientes tratamientos silviculturales: • Dile Alfonso Jaramillo • Colegio Francisco José de Caldas • Colegio 20 de Julio • Bodega de tizas En el informe se debe incluir las respectivas fichas de atención, geolocalización y certificados de residuos.		

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA

El jue, 27 de may. de 2021 a la(s) 11:12, ANA MARIA CORCHUELO (anamaria0930@outlook.com) escribió:

9441

ANA MARIA CORCHUELO ha compartido archivos de OneDrive con usted. Para verlos, haga clic en los vínculos siguientes.

INFORME MENSUAL SST - MA CORTE 11.rar INFORME MENSUAL SST - MA CORTE 12.rar

Buen dia Stella.
Anexo envio informes correspondientes a los cortes 11 y 12 correspondiente al contrato de emergencias de la SED.

Quedo atenta, gracias.

Ana Maria Corchuelo
Tel. 3208208361

De: AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>
Enviado: miércoles, 26 de mayo de 2021 3:43 p. m.
Para: Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>; DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>; Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>; auxsisosed@outlook.es <auxsisosed@outlook.es>
Asunto: Informes 11 y 12 - Componente SST-GA

Cordial Saludo,

Mediante el presente correo le informo que aun no se han recibido los informes N° 11 y 12 del componente SST-GA. De acuerdo con la reunión del día de ayer 25 de mayo, estos serían enviados el día de hoy antes del mediodía.

Le solicito amablemente se envíen para poder realizar la respectiva revisión y aprobación dentro de los plazos contractuales.

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

LUZ STELLA PINEDA BUSTOS
INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA

AC2R-SSTMA-SED-70-2021.pdf
270K

9442

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No AC2R- SSTMA -SED-70-2020

Bogotá D.C. mayo 29 2021

Señores:
CONSTRUSOCIAL
Atn. Ana María Corchuelo
Profesional ambiental y SST
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**
Asunto: Seguimiento observaciones Informe SST – GA N° 12

Por medio de presente la interventoría AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S, da a conocer al contratista **CONSTRUSOCIAL** el seguimiento de los hallazgos del informe N° 12 correspondientes al componente de SST y GA.

OBSERVACIONES INFORME N° 12

N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORREGIDO	
			SI	NO
1	**Sistema de Seguridad Social**	Adjuntan la planilla de seguridad social del Ing. Santiago Hernández, pero este no esta incluido en el listado del personal activo. Por favor **incluirlo.**	X	
2	**Sistema de Seguridad Social**	Planilla de Seguridad Social del Ing. Diego Alejandro y de Jessica Tavera **NO** incluyen el pago de ARL, por favor **enviar** la planilla de ARL.	X	
3	**Sistema de Seguridad Social**	En listado de personal se incluye a Jesús Ramírez y Brandon Cuan pero no anexaron las respectivas planillas de seguridad social, por favor **Incluir.**		X
EXPLICACIÓN: Se adjunto la planilla de seguridad social de Brandon Cuan, pero **NO** se adjunto la planilla de Jesus Ramírez. El aparece en el listado como "Residente" del proyecto, es importante que cuente con seguridad social.				

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
