SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		**RL: German Villanueva Calderon**		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**PLAZO INICIAL**	Diez (10) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 3.571.094.800,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Diez (10) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 5.285.220.304,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/02/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Doce (12) Meses	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de abril de 2021	**$ 5.285.220.304,00 COP**
INTERVENTOR		**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		**RL: Camilo Andres Rosario**		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**PLAZO INICIAL**	Once (11) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 428.828.400,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Once (11) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 611.779.000,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/03/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Trece (13) Meses y ocho (8) dias	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	30 de Mayo de 2021	**$ 973.005.880,00 COP**

SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	IED TOBERIN SEDE C	SEÑALIZACIÓN	29/04/2021	30/04/2021
2	IED TOBERIN SEDE A	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	30/04/2021
3	IED CAMPESTRE MONTE VERDE SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	29/04/2021
4	IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE B	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	27/04/2021
5	IED EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES SEDE A	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	1/05/2021
6	IED NUEVO CHILE SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	29/04/2021
7	IED JOSE ANTONIO GALAN SEDE A	SEÑALIZACIÓN	3/05/2021	2/05/2021
8	IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS SEDE B	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	29/04/2021
9	IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	29/04/2021
10	IED NUEVO CHILE SEDE B	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	29/04/2021
11	IED CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	2/05/2021
12	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	29/04/2021	1/05/2021
13	IED CARLOS ARTURO TORRES SEDE B	SEÑALIZACIÓN	29/04/2021	30/04/2021
14	IED ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE B	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	27/04/2021
15	IED MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	28/04/2021
16	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA SEDE C	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	27/04/2021
17	IED TOM ADAMS SEDE A	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	29/04/2021
18	IED MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE B	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	28/04/2021
19	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA SEDE B	SEÑALIZACIÓN	28/04/2021	29/04/2021
20	IED SAN JOSE SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	2/05/2021
21	IED CARLOS ARTURO TORRES SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	29/04/2021
22	IED PAULO VI SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	30/04/2021
23	IED NUEVA CONSTITUCION SEDE A	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	30/04/2021
24	IED REPUBLICA DE CHINA SEDE B	SEÑALIZACIÓN	30/04/2021	30/04/2021
25	IED REPUBLICA DE CHINA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	29/04/2021	1/05/2021

26	IED NIDIA QUINTERO DE TURBAY SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	1/05/2021
27	IED CHARRY SEDE A	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	29/04/2021
28	IED ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	28/04/2021
29	IED VENTIUN ANGELES SEDE C	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	28/04/2021
30	IED FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A	SEÑALIZACIÓN	28/04/2021	30/04/2021
31	IED TIBABUYES UNIVERSAL SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	28/04/2021
32	IED VENTIUN ANGELES SEDE A	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	30/04/2021
33	IED ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	28/04/2021
34	IED ALBERTO LLERAS CAMARGO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	29/04/2021
35	IED GERARDO PAREDES SEDE A	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	30/04/2021
36	IED JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	30/04/2021	1/05/2021
37	IED VENTIUN ANGELES SEDE A	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	30/04/2021
38	IED GERARDO MOLINA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	30/04/2021
39	IED GONZALO ARANGO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	28/04/2021	1/05/2021
40	IED DELIA ZAPATA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	1/05/2021
41	IED VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA - TTES DE COLOMBIA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	29/04/2021
42	IED ANTONIA SANTOS SEDE A	SEÑALIZACIÓN	28/04/2021	1/05/2021
43	IED GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	28/04/2021
44	IED GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE B	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	28/04/2021
45	IED GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE C	SEÑALIZACIÓN	30/04/2021	1/05/2021
46	IED MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	28/04/2021
47	IED LUIS VARGAS TEJADA SEDE B	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	29/04/2021
48	IED EL JAZMIN SEDE B	SEÑALIZACIÓN	28/04/2021	29/04/2021
49	IED MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE C	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	27/04/2021
50	IED MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE B	SEÑALIZACIÓN	23/04/2021	25/04/2021
51	IED CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	28/04/2021	30/04/2021
52	IED ACACIA II SEDE B	SEÑALIZACIÓN	29/04/2021	30/04/2021
53	IED ACACIA II SEDE A	SEÑALIZACIÓN	28/04/2021	1/05/2021
54	IED ESTRELLA DEL SUR SEDE C	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	29/04/2021
55	IED ISMAEL PERDOMO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	29/04/2021
56	IED EL TESORO DE LA CUMBRE SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	28/04/2021
57	IED MOCHUELO ALTO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	27/04/2021
58	IED REPUBLICA DE MEXICO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	28/04/2021	30/04/2021
59	IED ESTRELLA DEL SUR SEDE D	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	28/04/2021
60	IED PARAISO MIRADOR SEDE D	SEÑALIZACIÓN	01/012021	26/04/2021
61	TOM ADAMS SEDE B	SEÑALIZACIÓN	27/04/2021	29/04/2021
62	CODEMA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	30/04/2021
63	JULIO FLORES SEDE B	SEÑALIZACIÓN	26/05/2021	29/04/2021
64	LUIS VARGAS TEJADA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	26/04/2021	29/04/2021
OBSERVACIONES:				

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 29/04/2021	**INSTITUCION:** **TOBERIN SEDE C**		**LOCALIDAD:** **USAQUÉN**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 106	**DIRECCION:** KR 17 # 163 A - 22	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 670.999,48**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

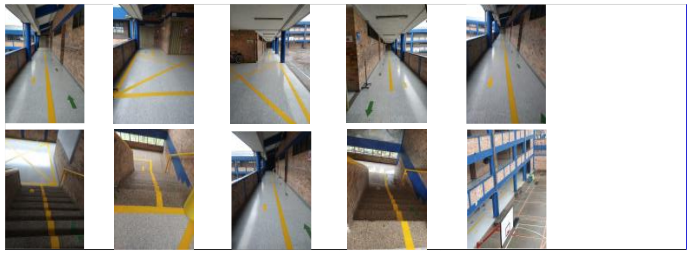
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **TOBERIN SEDE A**		**LOCALIDAD:** **USAQUÉN**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 122	**DIRECCION:** CL 166 # 16 C - 15	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 4.039.072,08**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

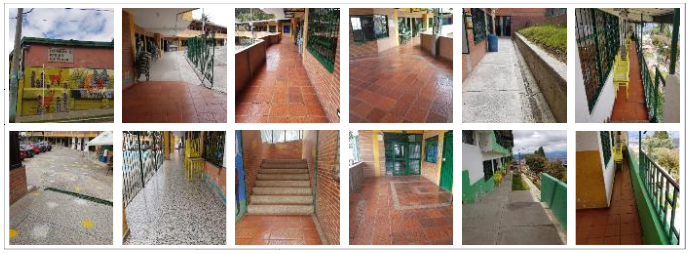
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **CAMPESTRE MONTE VERDE SEDE A**		**LOCALIDAD:** **CHAPINERO**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 208	**DIRECCION:** KR 5 C ESTE # 98 A - 55	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de inspeccion a las instalaciones del colegio, donde se observa que este no cuenta con la demarcacion requerida por la SED, el parqueadero cuenta con circulos de espera, posee una porteria peatonal y una vehicular, dispone de dolbe jornada, las superficies a intervenir son en concreto y baldosa.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 4.426.778,60**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA


Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **RUFINO JOSE CUERVO SEDE B**		**LOCALIDAD:** **TUNJUELITO**
FECHA DE TERMINACION: 27/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**610**	**DIRECCION:**	**KR 8 # 53 A - 40 SUR**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.	   
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	         
Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y accesos en concreto		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**	**$ 1.259.729,00**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

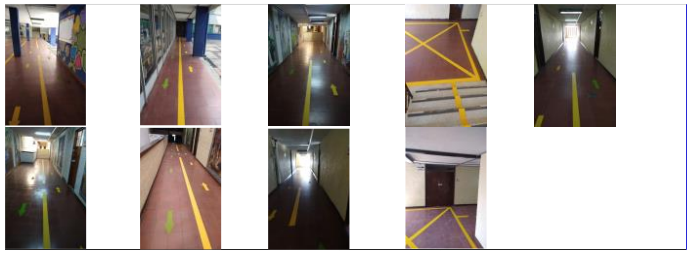
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SANTA FE**
FECHA DE TERMINACION: 1/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 319	**DIRECCION:** KR 7 # 33 - 64	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta se realiza recorrido sin acompañamiento por parte del contratista	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 13.428.169,92**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **NUEVO CHILE SEDE A**		**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 703	**DIRECCION:** CL 56 SUR # 72 G - 20	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA se realiza inspeccion de la institucion, se observa que no cuenta con ningun tipo de señalizacion, tiene dos porterias peatonales, dos vehiculares y se encuentra en buen estado para ser intervenido.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 6.652.168,20**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

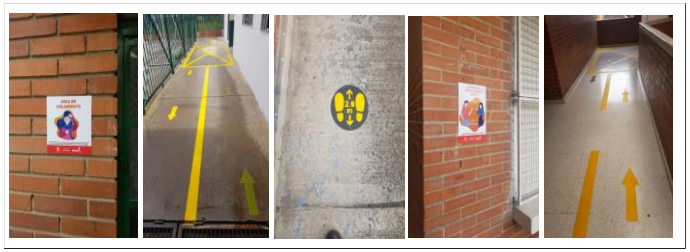
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 3/05/2021	**INSTITUCION:**	**JOSE ANTONIO GALAN SEDE A**	**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: 2/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 707	**DIRECCION:**	**KR 78 J # 58 M - 22 SUR**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA se realiza inspeccion del colegio sin acompañamiento por parte del contratista, el colegio no cuenta con ningun tipo de señalizacion, tiene tres porterías peatonales, es doble jornada y se encuantra en buen estado para ser intervenido.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 3.039.421,64**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **FERNANDO MAZUERA VILLEGAS SEDE B**	**LOCALIDAD:**	**BOSA**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 715	**DIRECCION:**	**DG 66 SUR # 80 C - 20**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	
Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 1.985.454,24

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

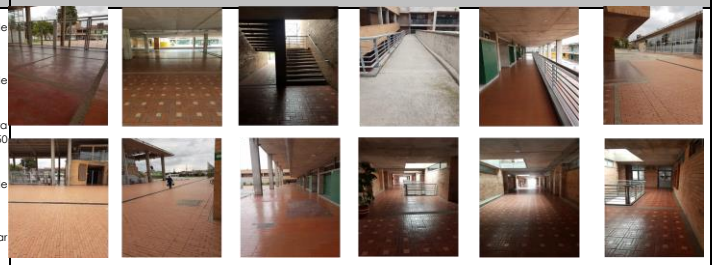
Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **FERNANDO MAZUERA VILLEGAS SEDE A**		**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 722	**DIRECCION:** CL 68 A SUR # 80 H - 05	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	
"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta, granito, adoquin y concreto		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 12.924.184,68**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **NUEVO CHILE SEDE B**		**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 726	**DIRECCION:** CL 56 A SUR # 72 A - 54	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

se realiza inspeccion inicial de la institucion, se observa que no cuenta con ningun tipo de señalizacion, tiene tres porterias peatonales y se encuentra en buen estado para ser intervenido.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.543.493,48

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A**		**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: 2/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 746	**DIRECCION:** CL 72 SUR # 100 A - 71	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en adoquin y en concreto		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 11.851.760,92**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

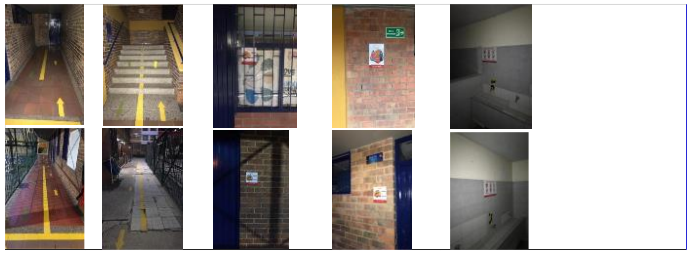
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 29/04/2021	**INSTITUCION:**	**INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA SEDE A**	**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 1/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 802	**DIRECCION:**	**CL 38 SUR # 89 - 81**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta encerada y escaleras en concreto y adoquin	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 3.717.812,72**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

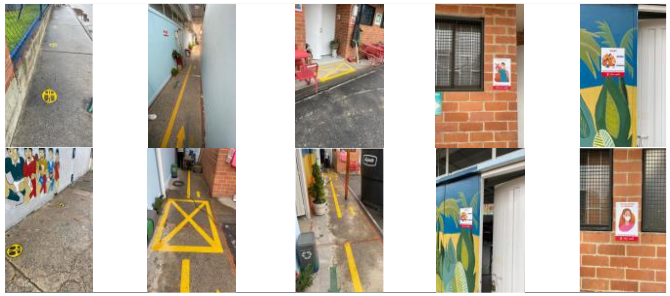
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
44.197,00	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 29/04/2021	**INSTITUCION:**	**CARLOS ARTURO TORRES SEDE B**	**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 803	**DIRECCION:**	**TV 72 B # 44 C - 08 SUR**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria son en concreto	Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 663.901,44**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA


Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE B**	**LOCALIDAD:**	**KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 27/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**804**	**DIRECCION:**	**KR 68 I # 39 C - 14 SUR**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, la sede dispone de una puerta usada para el ingreso y salida de estudiantes y personal relacionado con las actividades de la institucion, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada, las cuales estan compuestas por concreto, granito y ceramica	Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.382.377,20**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C**		**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 28/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**809**	**DIRECCION:**	**KR 83 # 46 B - 16 SUR**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO















OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 970.962,88**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

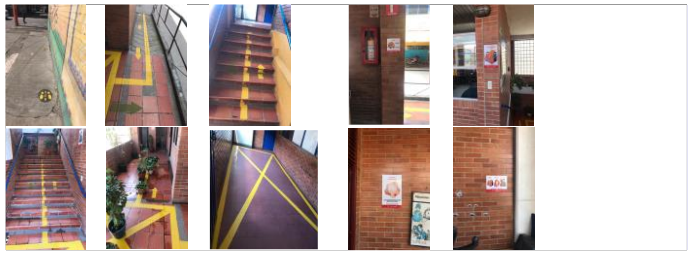
Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:**	**INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**	**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 27/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 810	**DIRECCION:**	**CL 35 B SUR # 88 D - 15**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta encerada y escaleras en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 979.729,00**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **TOM ADAMS SEDE A**		**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 820	**DIRECCION:** CL 40 J SUR # 78 - 08	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

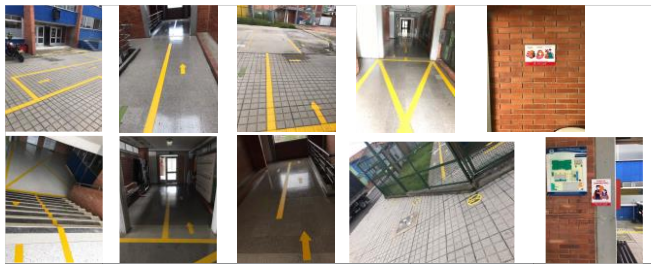
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.840.271,64

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE B**		**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 28/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 824	**DIRECCION:**	**CL 47 A SUR # 82 - 99**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	
Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en adoquin		

OBSERVACIONES TECNICAS:		**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**$ 2.575.729,80**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

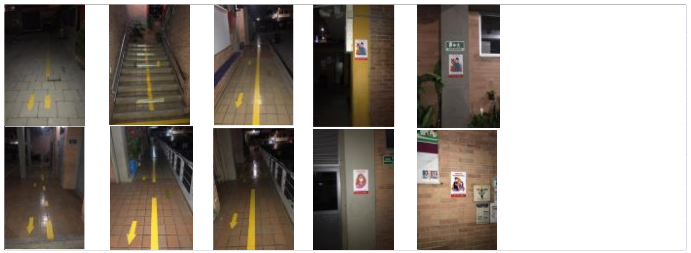
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 28/04/2021	**INSTITUCION:**	**INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA SEDE B**	**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**830**	**DIRECCION:**	**KR 90 A # 39 - 12 SUR**	**TIPO DE EMERGENCIA:** **SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.616.150,16**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **SAN JOSE SEDE A**	**LOCALIDAD:**	**KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 2/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 841	**DIRECCION:** Cl. 42a Sur # 79f - 1	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto□		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 12.136.818,16**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

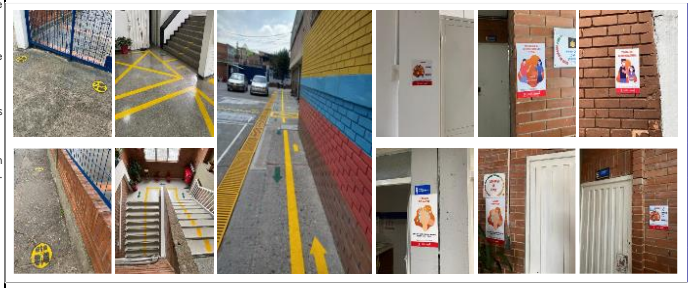
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:**	**CARLOS ARTURO TORRES SEDE A**	**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 849	**DIRECCION:**	**TV 72 B # 44 C - 19 SUR**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml). Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).	
Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, cuenta con pisos en ceramica, granito y adoquin, dispone de doble jornada escolar, las instalaciones tienen una puerta de ingreso y una de salida		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 4.738.144,80**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

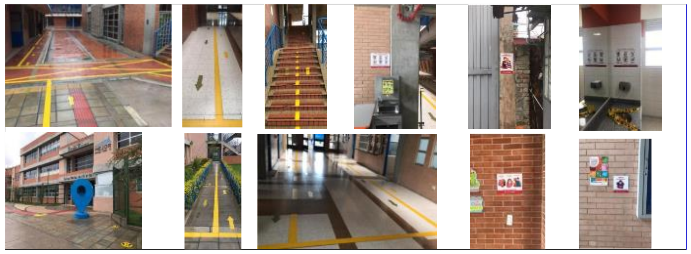
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **PAULO VI SEDE A**	**LOCALIDAD:**	**KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 855	**DIRECCION:**	**KR 78 P # 41 - 20 SUR**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta encerada, baldosa y concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 13.017.803,92**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

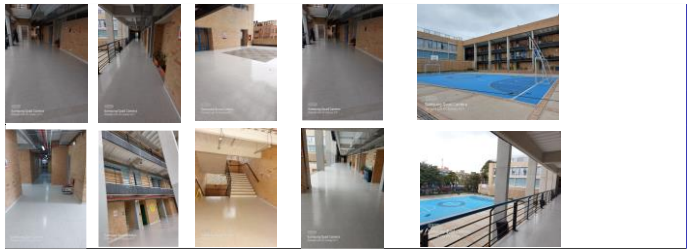
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **NUEVA CONSTITUCION SEDE A**		**LOCALIDAD:** **ENGATIVÁ**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1011	**DIRECCION:** **KR 107 B # 74 B - 31**	**TIPO DE EMERGENCIA:** **SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, en donde se observa que en las zonas de transito y pasillos de la institucion educativa distrital, no se evidencia la demarcacion requeridad por la SED para el regreso seguro y progresivo a clases.		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 6.434.445,60**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

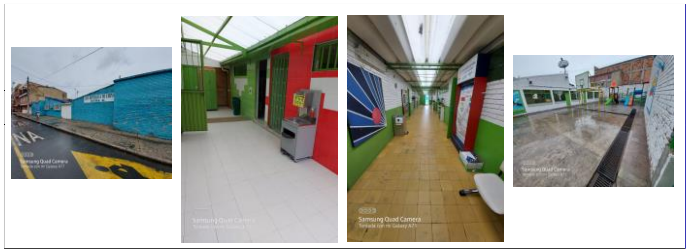
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 30/04/2021	**INSTITUCION:** **REPUBLICA DE CHINA SEDE B**		**LOCALIDAD:** **ENGATIVÁ**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1029	**DIRECCION:** CL 78 # 92 - 39 -- CL 80 B # 92 - 39	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA se realiza inspeccion de la institucion se observa que no cuenta con ningun tipo de señalizacion, se encuentra en buen estado para ser intervenido.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 583.905,44**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 29/04/2021	**INSTITUCION:** **REPUBLICA DE CHINA SEDE A**		**LOCALIDAD:** **ENGATIVÁ**
FECHA DE TERMINACION: 1/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1033	**DIRECCION:**	**KR 92 # 82 - 20**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA se realiza inspeccion de la institucion se observa que no cuenta con ningun tipo de señalizacion y se encuentra en buen estado para ser intervenido.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 5.588.892,44**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

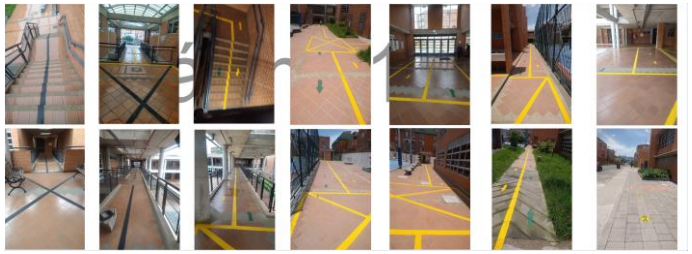
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **NIDIA QUINTERO DE TURBAY SEDE A**		**LOCALIDAD:** **ENGATIVÁ**
FECHA DE TERMINACION: 1/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1053	**DIRECCION:** CL 75 # 90 - 75	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta encerada y granito.		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 12.258.785,00**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

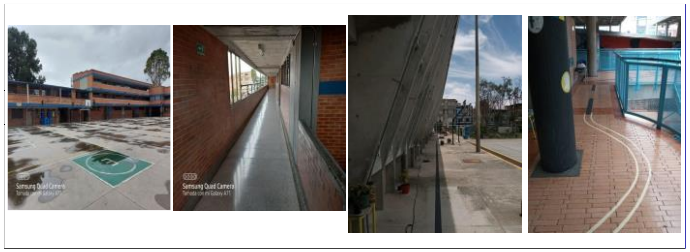
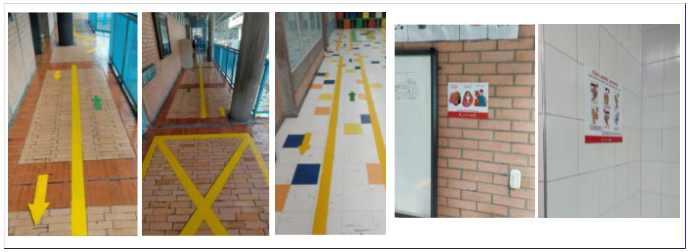
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **CHARRY SEDE A**		**LOCALIDAD:** **ENGATIVÁ**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1074	**DIRECCION:**	**KR 104 A # 76 B - 09**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA se realiza inspeccion de la institucion se observa que no cuenta con ningun tipo de señalizacion y se enceuntra en buen estado para ser intervenida.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 4.970.912,76**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

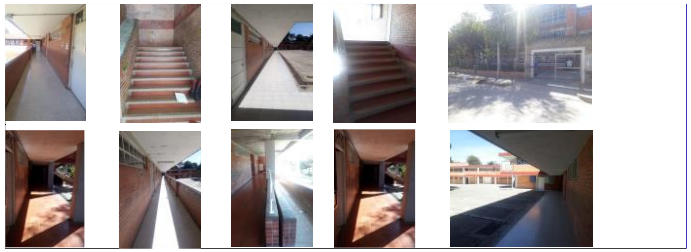
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 28/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1101	**DIRECCION:** KR 100 A # 130 - 18	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta, accesos y rampa en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 5.583.461,48**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **VENTIUN ANGELES SEDE C**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 28/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1102	**DIRECCION:** CL 146 B # 78 - 51	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa y granito y rampas en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.324.459,56**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

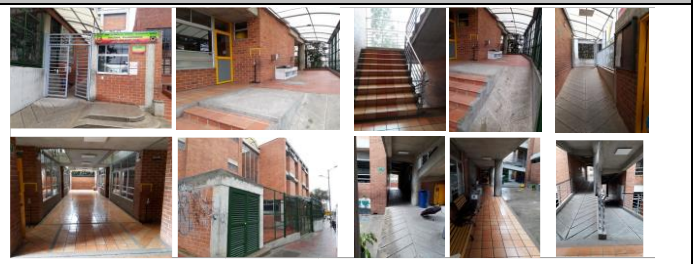
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 28/04/2021	**INSTITUCION:** **FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1130	**DIRECCION:** KR 91 # 146 C - 63 -- / KRA 92 # 146 C - 38	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	
"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa y granito, rampas en concreto		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 3.411.059,56**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

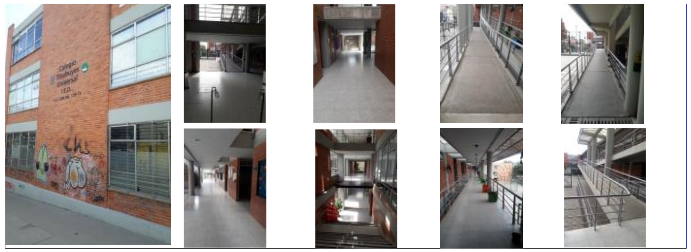
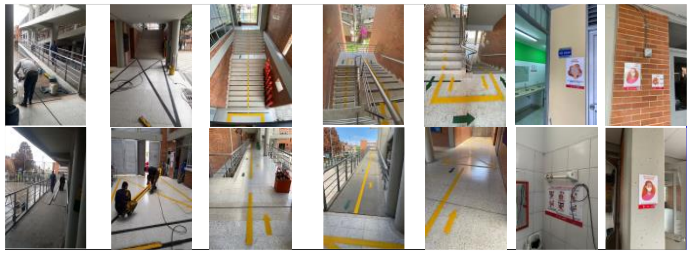
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **TIBABUYES UNIVERSAL SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 28/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1132	**DIRECCION:** **KR 128 A # 139 - 13**	**TIPO DE EMERGENCIA:** **SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa y granito, escalera en baldosa y rampa en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 3.723.614,24**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **VENTIUN ANGELES SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1133	**DIRECCION:** CL 155 A # 88 - 05 -- CL 155 # 88 - 11	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 12.639.930,04**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

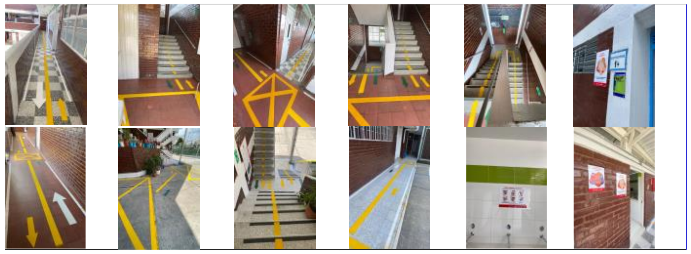
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 28/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1137	**DIRECCION:** Cra. 53 #13 - 51, Bogotá	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa y concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.975.484,48**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **ALBERTO LLERAS CAMARGO SEDE A**	**LOCALIDAD:**	**SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**1138**	**DIRECCION:**	**KR 111 A # 139 - 88**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa de encerar, granito y concreto. Rampa en baldosa y granito se observa demarcacion en la rampa

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

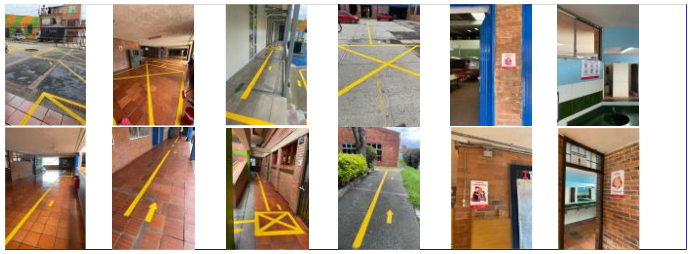
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 10.954.608,72

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

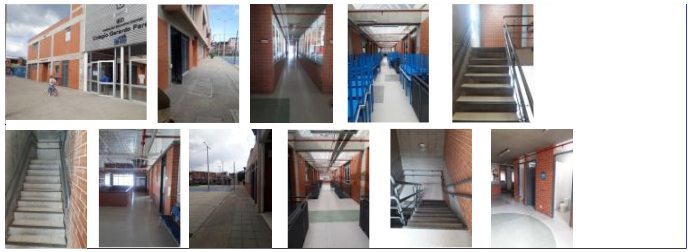
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **GERARDO PAREDES SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1140	**DIRECCION:**	**KR 94 C # 129 A - 04**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 10.156.538,32**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 30/04/2021	**INSTITUCION:** **JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 1/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1142	**DIRECCION:** CL 140 A # 100 - 30	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa y accesos en concreto		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 2.566.935,28**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **VENTIUN ANGELES SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1133	**DIRECCION:** CL 155 A # 88 - 05 -- CL 155 # 88 - 11	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 12.639.930,04**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **GERARDO MOLINA SEDE A**	**LOCALIDAD:**	**SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1154	**DIRECCION:**	**KR 143 # 142 A - 62**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA se realiza inspeccion inicial de la institucion se observo que no cuenta con ningun tipo de señalizacion, se encuentra en buen estado para ser intervenida.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 9.130.102,28**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 28/04/2021	**INSTITUCION:** **GONZALO ARANGO SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 1/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1156	**DIRECCION:** CL 130 C # 97 - 71 -- CL 130 A # 98 - 71	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa, adoquin, accesos y escaleras en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

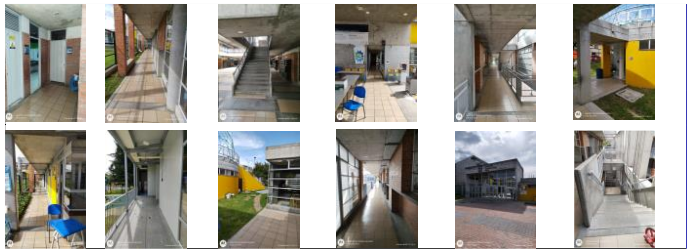
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





Pagina 1

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 10.955.861,28**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

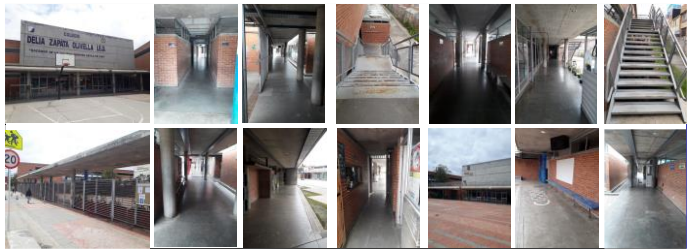
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **DELIA ZAPATA SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 1/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1157	**DIRECCION:**	**CL 144 C # 141 A - 51**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en concreto y en ladrillo, tiene escaleras metalicas		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**	**$ 10.900.386,36**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

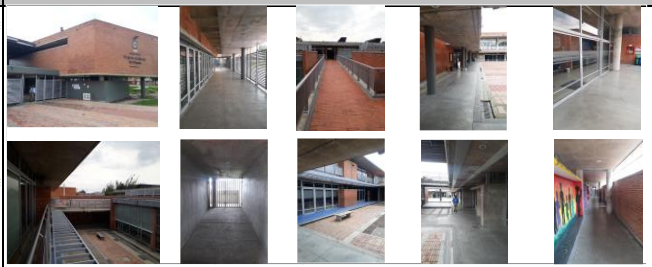
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA - TTES DE COLOMBIA SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1160	**DIRECCION:**	**CL 131 B # 94 F - 31**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en placa de concreto y en adoquin	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 12.612.888,24**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

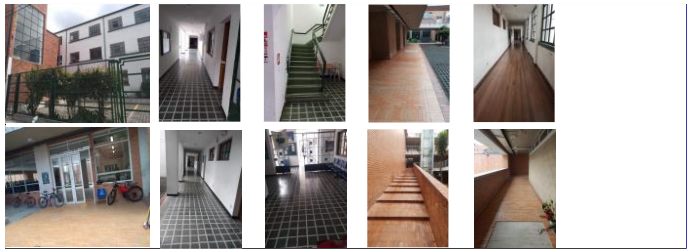
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 28/04/2021	**INSTITUCION:** **ANTONIA SANTOS SEDE A**		**LOCALIDAD:** **LOS MÁRTIRES**
FECHA DE TERMINACION: 1/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1414	**DIRECCION:** KR 22 # 12 - 49	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta, concreto y madera	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 6.335.426,44**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE A**		**LOCALIDAD:** **ANTONIO NARIÑO**
FECHA DE TERMINACION: 28/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1507	**DIRECCION:**	**KR 22 # 16 - 03 SUR**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto escaleras en adoquin y granito		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 3.011.269,08**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE B**		**LOCALIDAD:** **ANTONIO NARIÑO**
FECHA DE TERMINACION: 28/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1509	**DIRECCION:** DG 16 SUR # 23 - 53 -- DG 16 A SUR # 24 C - 79	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos y escalera en tableta.		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 807.166,16**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 30/04/2021	**INSTITUCION:**	**GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE C**	**LOCALIDAD:** **ANTONIO NARIÑO**
FECHA DE TERMINACION: 1/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1511	**DIRECCION:**	**CL 12 SUR # 16 - 01**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	
"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa y accesos en concreto		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.381.388,92**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA


Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE A**		**LOCALIDAD:** **PUENTE ARANDA**
FECHA DE TERMINACION: 28/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1605	**DIRECCION:**	**CL 17 B SUR # 34 A - 21**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaicones de la sede, evidenciando que este cuenta con una demarcacion previa, la cual se puede complementar, en algunas zonas se requiere el retiro por deterioro y en otros sectores se debe retirar debido a que esta no cumple con los requerimientos de la SED	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 3.396.535,56**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **LUIS VARGAS TEJADA SEDE B**		**LOCALIDAD:** **PUENTE ARANDA**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1607	**DIRECCION:** KR 52 D # 24 - 50 SUR	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en concreto y baldosa	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.540.686,64**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 28/04/2021	**INSTITUCION:** **EL JAZMIN SEDE B**		**LOCALIDAD:** **PUENTE ARANDA**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1612	**DIRECCION:** KR 41 B # 4 C - 27	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.627.414,84**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE C**		**LOCALIDAD:** **PUENTE ARANDA**
FECHA DE TERMINACION: 27/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**1628**	**DIRECCION:**	**KR 32 C # 1 D - 10**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza al visita de diagnostico, evidenciando que la sede no cuenta con la demarcacion requerida por la SED, tiene una sola puerta de acceso, tiene dos tipos de piso (ceramica y concreto), tiene doble jornada y que encuentra en condiciones ideales para iniciar las actividades de demarcacion	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.910.994,80**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA



Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 23/04/2021	**INSTITUCION:** **MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE B**		**LOCALIDAD:** **PUENTE ARANDA**
FECHA DE TERMINACION: 25/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1632	**DIRECCION:** CL 1 # 34 B - 20	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 2.503.790,48**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 28/04/2021	**INSTITUCION:** **CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA SEDE A**		**LOCALIDAD:** **RAFAEL URIBE URIBE**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1807	**DIRECCION:**	**CL 30 SUR # 18 - 25**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 6.267.245,76**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 29/04/2021	**INSTITUCION:** **ACACIA II SEDE B**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLÍVAR**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1901	**DIRECCION:** DG 62 D SUR # 19 A - 55	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en concreto, baldosa y adoquin.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	**$ 1.077.159,92**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

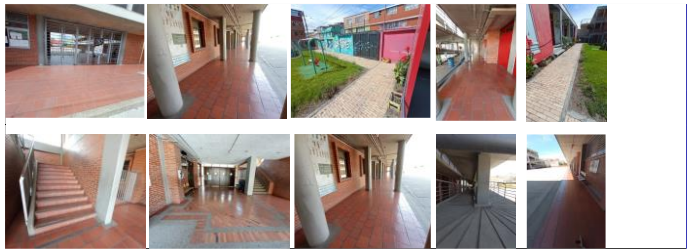
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 28/04/2021	**INSTITUCION:** **ACACIA II SEDE A**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLÍVAR**
FECHA DE TERMINACION: 1/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1902	**DIRECCION:**	**CL 62 SUR # 19 B - 42**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 7.366.919,92**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **ESTRELLA DEL SUR SEDE C**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLÍVAR**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1919	**DIRECCION:**	**CL 74 A SUR # 18 - 23**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.767.468,60**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **ISMAEL PERDOMO SEDE A**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLÍVAR**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1920	**DIRECCION:**	**CL 64 SUR # 71 F - 18**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 5.399.241,16**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

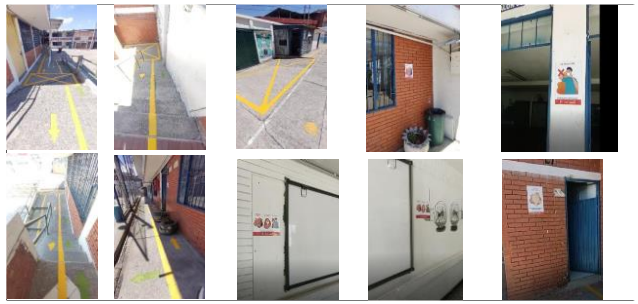
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **EL TESORO DE LA CUMBRE SEDE A**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLÍVAR**
FECHA DE TERMINACION: 28/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**1925**	**DIRECCION:**	**CL 78 D BIS SUR # 18 N - 23**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.474.160,88**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **MOCHUELO ALTO SEDE A**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLÍVAR**
FECHA DE TERMINACION: 27/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1932	**DIRECCION:**	**KM 24 VIA PASQUILLA**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	
"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta, granito y concreto	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 3.021.514,24**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

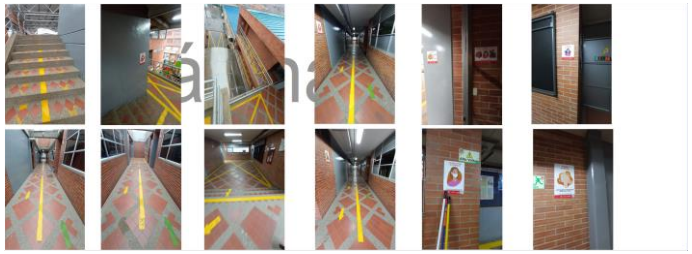
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 28/04/2021	**INSTITUCION:** **REPUBLICA DE MEXICO SEDE A**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLÍVAR**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1944	**DIRECCION:** CL 64 SUR # 16 D - 50	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA "Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa y granito		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 4.142.141,04**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **ESTRELLA DEL SUR SEDE D**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLÍVAR**
FECHA DE TERMINACION: 28/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**1962**	**DIRECCION:**	**KR 18 D # 73 - 50 SUR**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.597.242,08**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **PARAISO MIRADOR SEDE D**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLÍVAR**
FECHA DE TERMINACION: 27/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1982	**DIRECCION:** 0	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

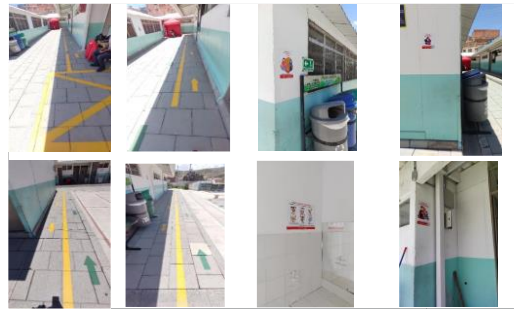
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 937.301,04

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 27/04/2021	**INSTITUCION:** **TOM ADAMS SEDE B**		**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 840	**DIRECCION:**	**CL 40 A SUR # 79 C - 08**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	
Se identifica unica puerta como principal para acceso y salida, se observa pisos encerados en ladrillo, no se evidencia ningun tipo de señalizacion se entrega al contratista para la ejecucion de las activades de demarcacion y señaletica	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 4.739.572,88**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

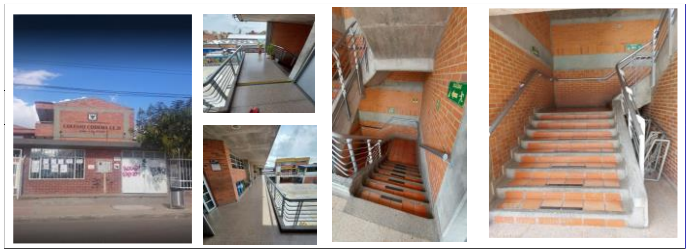
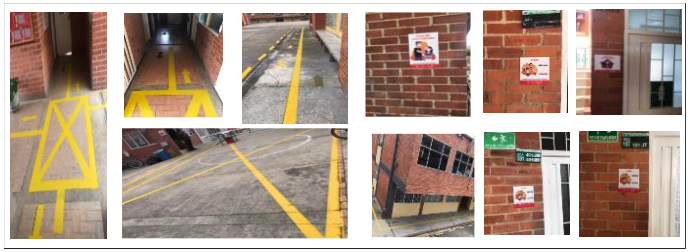
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **CODEMA SEDE A**		**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 884	**DIRECCION:** 0	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se identifica unica puerta como principal para acceso y salida, se observa pisos encerados en ladrillo, no se evidencia ningun tipo de señalizacion se entrega al contratista para la ejecucion de las activades de demarcacion y señaletica	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 7.037.911,16**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/05/2021	**INSTITUCION:** **JULIO FLORES - SANTA ROSA SEDE B**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1109	**DIRECCION:** KR 68 B # 94 - 12	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	
Se identifica unica puerta como principal para acceso y salida, se observa pisos encerados en ladrillo, no se evidencia ningun tipo de señalizacion se entrega al contratista para la ejecucion de las activades de demarcacion y señaletica	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 4.384.414,89**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

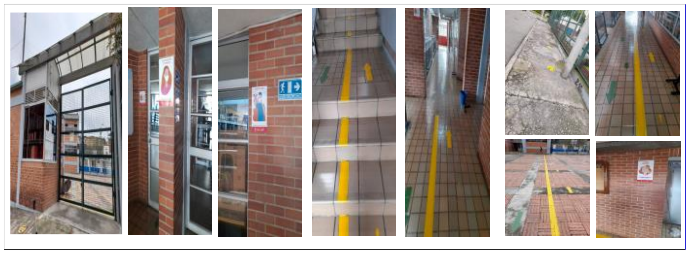
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 53 (ABRIL 26 - MAYO 02)**		
FECHA DE INICIO: 26/04/2021	**INSTITUCION:** **LUIS VARGAS TEJADA SEDE A**		**LOCALIDAD:** **PUENTE ARANDA**
FECHA DE TERMINACION: 29/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1613	**DIRECCION:** KR 52 C # 19 A - 76 SUR	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se identifica unica puerta como principal para acceso y salida, se observa pisos encerados en ladrillo, no se evidencia ningun tipo de señalizacion se entrega al contratista para la ejecucion de las activades de demarcacion y señaletica	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 3.096.860,48**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R
