SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		**RL: German Villanueva Calderon**		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**PLAZO INICIAL**	Diez (10) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 3.571.094.800,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Diez (10) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 5.285.220.304,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/02/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Doce (12) Meses	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de abril de 2021	**$ 5.285.220.304,00 COP**
INTERVENTOR		**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		**RL: Camilo Andres Rosario**		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**PLAZO INICIAL**	Once (11) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 428.828.400,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Once (11) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 611.779.000,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/03/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Trece (13) Meses y ocho (8) dias	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	30 de Mayo de 2021	**$ 973.005.880,00 COP**

SEMANA 56.1 (MAYO 17 - MAYO 22)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	SALUDCOOP NORTE SEDE A	SEÑALIZACIÓN	18/05/2021	20/05/2021
2	CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	18/05/2021	19/02/2021
3	ISABEL II SEDE B	SEÑALIZACIÓN	21/05/2021	22/05/2021
4	LA GAITANA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	18/05/2021	22/05/2021
5	REPUBLICA DOMINICANA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	18/05/2021	22/05/2021
6	TIBABUYES SEDE B	SEÑALIZACIÓN	18/05/2021	20/05/2021
7	DOMINGO FAUSTINO ASPRILLA SEDE D	SEÑALIZACIÓN	18/05/2021	19/05/2021
8	DOMINGO FAUSTINO ASPRILLA SEDE B	SEÑALIZACIÓN	18/05/2021	21/05/2021
9	BENJAMIN HERRERA SEDE C	SEÑALIZACIÓN	19/05/2021	21/05/2021
10	JOSE MANUEL RESTREPO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	19/05/2021	21/05/20213
OBSERVACIONES:				

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 56.1 (MAYO 17 - MAYO 22)**		
FECHA DE INICIO: 18/05/2021	**INSTITUCION:** **SALUDCOOP NORTE SEDE A**		**LOCALIDAD:** **USAQUÉN**
FECHA DE TERMINACION: 20/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 137	**DIRECCION:** CL 181 # 18 B - 83	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 10.526.053,12**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 56.1 (MAYO 17 - MAYO 22)**		
FECHA DE INICIO: 18/05/2021	**INSTITUCION:** **CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA SEDE A**		**LOCALIDAD:** **TUNJUELITO**
FECHA DE TERMINACION: 22/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 601	**DIRECCION:**	**DG 48 B SUR # 24 B - 73**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

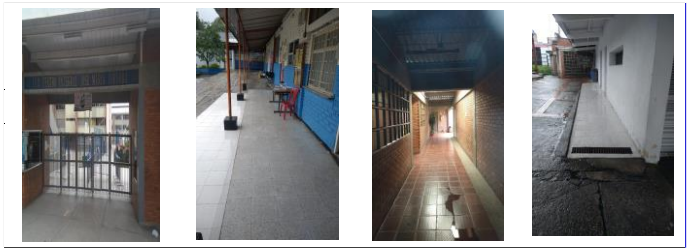
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 14.786.433,36

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 56.1 (MAYO 17 - MAYO 22)**		
FECHA DE INICIO: 21/05/2021	**INSTITUCION:** **ISABEL II SEDE B**		**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 22/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 838	**DIRECCION:** KR 79 D # 6 - 15	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura en concreto□

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.621.581,60

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 56.1 (MAYO 17 - MAYO 22)**		
FECHA DE INICIO: 18/05/2021	**INSTITUCION:** **LA GAITANA SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 22/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1113	**DIRECCION:** **TV 126 # 134 - 88**	**TIPO DE EMERGENCIA:** **SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**
---	---	---	---

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

se hace recorrido de inspeccion inicial para verificar cantidades iniciales, donde se encuentra que el colegio no cuenta con demarcacion, tinen pisos en concreto y ceramica

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

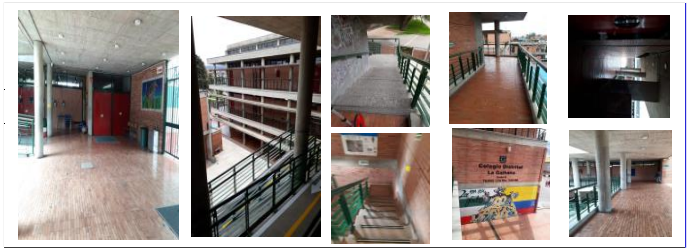
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

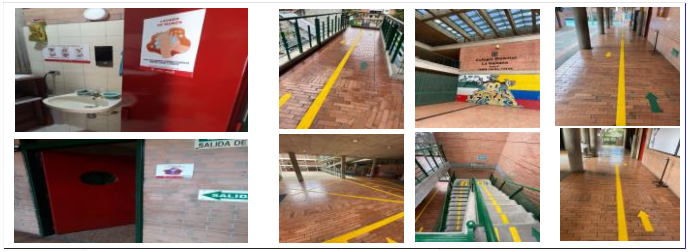
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 6.839.929,16

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

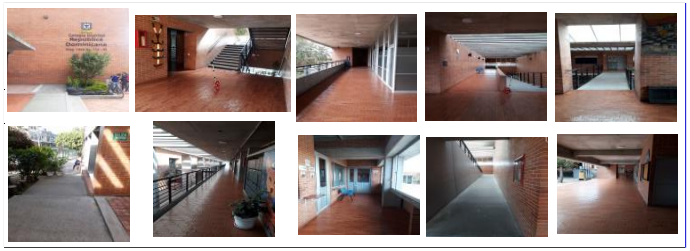
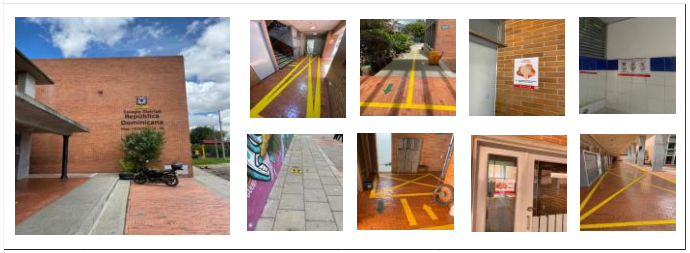
Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 56.1 (MAYO 17 - MAYO 22)**		
FECHA DE INICIO: 18/05/2021	**INSTITUCION:** **REPUBLICA DOMINICANA SEDE A**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 22/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1114	**DIRECCION:**	**CL 131 A # 125 - 43**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA se realiza inpeccion inicial de la institucion de observo que no pose n ingun tipo de señaletica, se encuentra en buen estado para ser intervenida.		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. □ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 12.798.500,16**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 56.1 (MAYO 17 - MAYO 22)**		
FECHA DE INICIO: 18/05/2021	**INSTITUCION:** **TIBABUYES UNIVERSAL SEDE B**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: 20/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1167	**DIRECCION:** 0	**TIPO DE EMERGENCIA:** SEÑALIZACIÓN	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.053.689,28

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

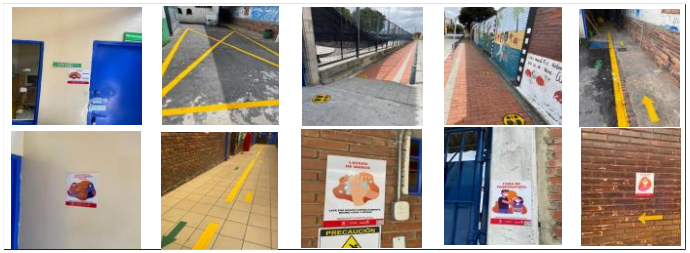
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 56.1 (MAYO 17 - MAYO 22)**		
FECHA DE INICIO: 18/05/2021	**INSTITUCION:** **DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D**		**LOCALIDAD:** **BARRIOS UNIDOS**
FECHA DE TERMINACION: 19/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1203	**DIRECCION:** **KR 56 # 94 - 02**	**TIPO DE EMERGENCIA:** **SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies (pisos en concreto y baldosa en gran porcentaje) en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.681.420,64**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 56.1 (MAYO 17 - MAYO 22)**		
FECHA DE INICIO: 18/05/2021	**INSTITUCION:** **DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE B**		**LOCALIDAD:** **BARRIOS UNIDOS**
FECHA DE TERMINACION: 21/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1207	**DIRECCION:**	**CL 91 A # 60 - 01**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, la sede cuenta con 1 planta, 13 salones, 4 baños y dispone de una puerta usada para el ingreso y salida de estudiantes y personal relacionado con las actividades de la institucion, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada, las cuales estan compuestas por concreto y baldosa		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.734.728,12**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 56.1 (MAYO 17 - MAYO 22)**		
FECHA DE INICIO: 19/05/2021	**INSTITUCION:** **IED BENJAMIN HERRERA SEDE C**		**LOCALIDAD:** **PUENTE ARANDA**
FECHA DE TERMINACION: 21/05/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**1619**	**DIRECCION:**	**CL 29 SUR # 41 A - 42**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta		

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**	**$ 3.817.850,00**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA


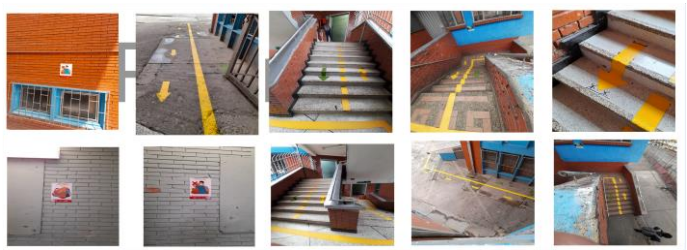
Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	**SEMANA 56.1 (MAYO 17 - MAYO 22)**		
FECHA DE INICIO: 19/05/2021	**INSTITUCION:** **JOSE MANUEL RESTREPO SEDE A**		**LOCALIDAD:** **PUENTE ARANDA**
FECHA DE TERMINACION: 21/05/20213			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1623	**DIRECCION:**	**CL 2 BIS # 56 A - 67**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**SEÑALIZACIÓN**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. ◘ (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°14, 15 y 16 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 5.225.929,20**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing, Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R
