que este compromiso se cumplió, se radicó a la interventoría la atención a las observaciones el día 08/06/21. La interventoría el día 09/06/21 radico ante la SDM la respuesta al incumplimiento.
El Director de la interventoria reitera la importancia de cumplir con el seguimiento a este PMT para no tener inconvenientes en lo que resta de contrato.
2.4 Radicación de PMT que contemplara la zona del SITP (contratista): Se informa que este compromiso se cumplió, se radicó el día 10/06/21 y salió la aprobación contemplando la zona del SITP.
2.5 Propuesta de grafitis en murales (Contratista): Se informa que se tiene propuesta de mural con observaciones, una vez se tenga se informará a la interventoría para la revisión.
2.6 Proceso de revalidación de diseño electrico (contratista): Se informa por parte del contratista que se radicó mediante #1688 1469 que corresponde a la revalidación de la factibilidad.
3. Seguimiento componentes
3.1 Componente social: Se informa que:
- El día 8 de Junio de 2021, se realizó convocatoria a reunión de inicio de obra de las intervenciones de la calle 163a entre carreras 5 y 5a, convocatoria a reunión de avance de obra y se hizo entrega de volantes informativos para la actividad levantamiento actas de vecindad de inicio obras calle 163a realizar los día 10-11 de Junio de 2021.
- El día 09/06/21, se realizó revisión de los ajustes solicitados y aprobación de la presentación para reunión de inicio de obra de las intervenciones de la calle 163 a realizar el día 11/06/21
- Los días 10/06/21 y 11/06/21 se realizó actividad de levantamiento actas de vecindad de inicio en los predios involucrados con las intervenciones de la calle 163a entre las carreras 5 y 5a correspondiente al frente de sendero ecológico y canalización pluvial, en las jornadas se logró realizar 4 actas de vecindad internas de los predios de la calle 163a #5-05, 5-15, 5-21, 5-29 y una de fachada de la carrera 5 #162a-54.
- El día 11/06/21 se realizó reunión de avance con la comunidad de la zona de influencia directa del proyecto ejercicio en el cual con la participación de 10 habitantes se informo del avance del proyecto en los componentes tecnico, social, ambiental, SST y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato.
- El día 11/06/21 se realizó reunión de inicio de los obras relacionada con las intervenciones de la calle 163a entre calle 5 y 5a ejercicio en el cual se informó a los habitantes y/o encargados de los predios involucrados el alcance de las obras, proceso constructivo y se aclararon dudas frente a su ejecución. En la actividad se entregó adicionalmente volante informativo de inicio de las obras con recomendaciones.

- El día 11/06/21 se realizo revisión, aprobación y envio a la entidad del informe semanal # 22 y programación semanal del 15 al 19 de junio de 2021 del contratista e informe semanal de interventoría.

La profesional social del contratista informa que enviara el actas de vecindad a la interventoria para firmas correspondientes.

3.2 componente SST-MA:

Para el componente SST la profesional de la interventoria informa que se tiene en cuanto a personal (02) operadores, (01 de minicargador y 01 vibrocompactador) (03) maestros, (04) oficiales, (10) Ayudantes, (02) boals, (03) instaladores de L&D (04) Soldadores, (01) inspector para un total de 29 personas operativas.

Se informa que el contratista tiene 0 casos covid reportados, y para la interventoría se tiene 1 caso recuperado que es el ing Raul Delgado Director de interventoria y 2 casos activos que son el Arq Jairo Torres, residente y Carmen Lucia profesional social.

Para el componente Ambiental se informa que el Jueves 10/06/21 se aprobó el #23 a la fecha no se ha implementado. se informa que se implementara entre los dias 15-16/06/21. La interventoría reitera solicitud de cumplir con la implementacion de este PMT a cabalidad, para no generar incumplimientos.

Se le reitera la importancia de los contenedores para las árboles que se trataron en el recorrido.

3.3 COMPONENTE TECNICO:

Se informa que el porcentaje de programado 66,18%. y ejecutado 68,95%. con un adelanto del 2,77%.

El Director de (obra) de interventoría solicita se avance en las obras del Parque, porque se recuerdo que la obra se acaba a finales del mes de Julio.

El contratista informa que la semana pasada se realizó la cimentación - zapatas corridas y muro, para fundir los placas, para poder hacer espacio publico de la plazoleta. Se informa que la ornamentacion se acaba esta semana,

El contratista manifiesta que pasara APU - NP de bomba estacionaria para el concreto de la calle 162a, para mejorar rendimientos, de esta actividad.

Para el tema de cauchos, se informa que se tiene el SBR según espesores y se tiene el diseño del EPDM aprobado.

Se informa que los gaviones se acaban hasta el dia sabado 19/06/21.

El contratista manifiesta que la entidad de ETB no ha dado respuesta acerca del poste que queda 6g acerca del traslado de la Red. Se le solicita a la contratista que le haga seguimiento a esta entidad. y se termine la obra civil correspondiente a este tema para que ellos procedan como entidad.

Se informa que la comunidad pregunto acerca del muro de la calle 163 en donde quieren una estructura mas robusta, o elaborado, pero se le dio la claridad que se

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT


ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

va hacer muro en treira armada,
Para el tema eléctrico se informa que se trabajará en la excavación de la zona de la subestación. En donde se resolvera tema de tuberias que se cruzan. Se le reitera al contratista que para el PMT no se puede excavar más de lo permitido. El consultor manifiesta que el equipo de subestación ya se solicitó. Se informa que las luminarias ya estan pero se tiene acoprados por el tema de inseguridad. se solicita se contemple la instalación de antivandalicos.
Se recomienda por parte de la interventoría que se avance con cableado y lumnarias y soldadura de las mismas cajas.
la ing Electrica de la interventoría pregunta que tramite sea hecho ante la UAESP, el consultor manifiesta que consultara con el profesional electrico
Se solicita se programe primera visita RETIE y RETILAP, en donde el contratista manifiesta que la programara y revisará estas visitas
Anticipo: se da la siguiente información con corte a los 12/06/21.
Se aprobó ordenes de giro 59, 61 y 62 correspondientes a materiales.
Se tiene un valor desembolsado de $868.858.657 correspondientes al 85% y un saldo del 15% que equivale al $154.225.351.
se tiene en revisión por parte de la interventoria la orden de giro #60.
4. Temas a tratar:
La interventoría manifiesta que se tendra reemplazo del Arq Residente y la profesional social de la interventoría, por el Arq Jhon Cuellar y Rosario Cardenas correspondientemente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

Observaciones y/o conclusiones: Se programa comite de seguimiento el próximo martes 22/06/21 a las 9:00 am

Registro fotográfico (si aplica):

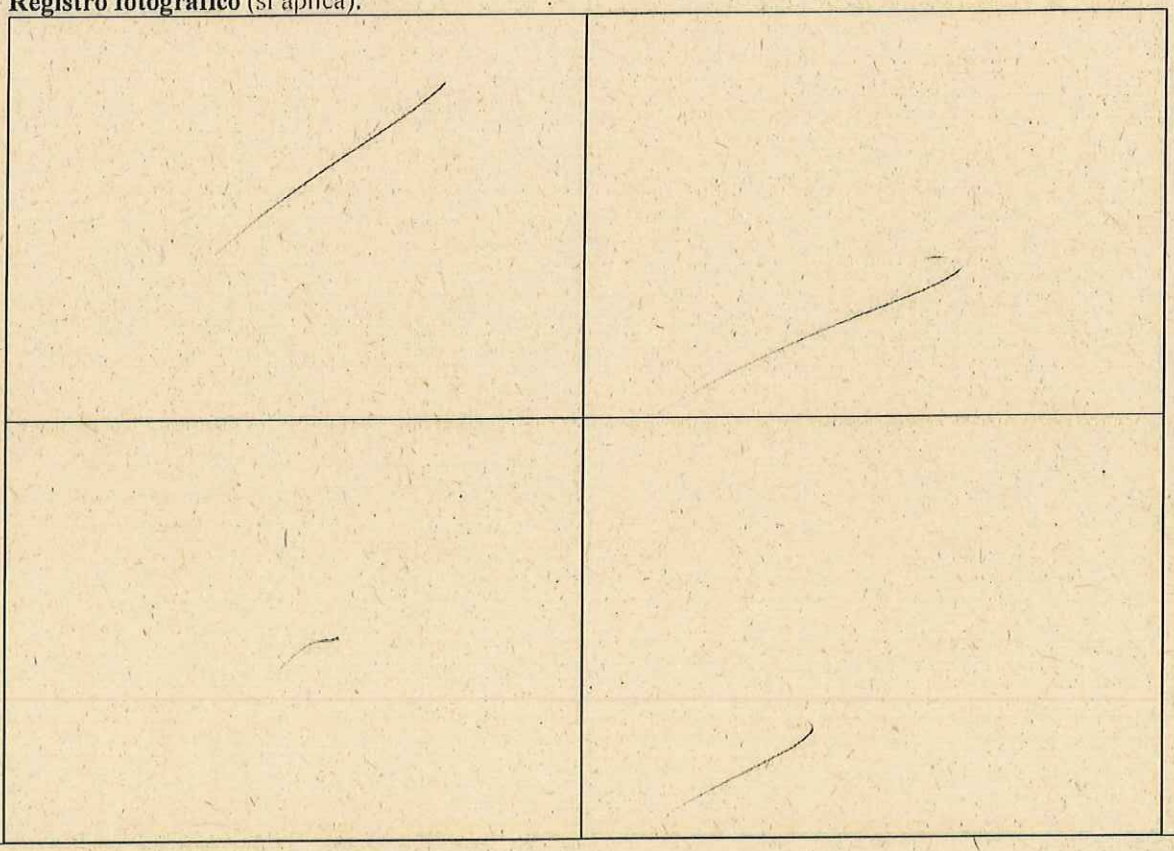

Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Revisión de Subsanación de NP's	Interventoría	16/06/21
Programación de reunión con el JBB	contratista	16/06/21
Definición de propuesta Grafitis mural	Contratista	21/06/21
Implementación PMT COI #23	Contratista	16/06/21
Seguimiento a tramite a UAESP	contratista	21/06/21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Programacion visita PETIE y PETILAP	Contratista	21/06/21

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELÉFONO	FIRMA
Johanna Ussate (1)	SST_MA (int)	Proyectos@soliunsas.com	3152666926	
Juan Carlos Ramirez S	Topografo	proyectos@soliunsas.com	3152267795	
Carolina Guarin R	Resid. Social	laperlasocial006@gmail.com	3103291114	
Diego A Callejas R.	R. Obra.	interventoria@gmail.com	3175023771	
Javier L. Rodriguez	Residente Obra.	" " "	3184824023	
Pastor López	Director de obra	" " "	3182685816	
Julia Bunuels	SSTMA	sstdinuteq.com.co	3002535394	
Raul Delgado C	Director Interventb.	raul.delgado@soliunsas.com	3213980386	
Pablo Reyes	Ingeniero Electricista	byco.ingenieria@gmail.com	3144727412	
Laura Jiménez	Ing. Auxiliar Interventoria	Proyectos@soliunsas.com	7653010	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

Anexo: N/A

ELABORÓ: Interventoría Consorcio San Juan 003
REVISÓ:
APROBÓ:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día): 22	(Mes): 06	(Año): 2021	9:30 am	12:00 pm

CONVOCADO POR: Interventoría CONSORCIO SAN JUAN 003 y secretaria de Habitat

DIRECCIÓN: La reunión se realizó de manera presencial en el Parque La perla

OBJETIVO:
Esta reunión se realiza entre la interventoría con el contrato 780 de 2020 por el CONSORCIO SAN JUAN 003, contratista del contrato 796 de 2020 por INCITECO SAS, con el fin de dar cumplimiento con el comité de la etapa de obra de seguimiento semanal y seguimiento del proyecto adelantado el día 22 de junio de 2021.

TEMAS A TRATAR:

1.Aprobación del acta anterior.
2.Lectura de compromisos
3.Seguimiento a Componentes
4.Temas a tratar

DESARROLLO:

1 Aprobación del acta anterior: Se informa que por parte del contratista INCITECO SAS se aprueba el acta anterior.

2.Lectura de compromisos:

2.1 Revisión de Subsanación de ítems Nps (interventoría): Se informa que este compromiso se cumplió, la interventoría mediante comunicado SDHT-780-2021-155 envió observaciones correspondientes por parte del contratista.

El día de hoy 22/06/2021 se realizará mesa de trabajo eléctrico, para la subsanación de las observaciones de los NPS.
Se da la claridad que estos nps conformaran el acta de Nps #4, que seria la ultima del proyecto. Se solicita al contratista se revise los Nps necesarios para lo que falta de ejecución del contrato.
Se le recuerda al contratista pasar la propuesta del material del sendero para la revisión correspondiente.

2.2 Programación de reunión con el JBB(Contratista): Se informa que este compromiso se cumplió, se programó reunión el día 21/06/2021 en horas de la tarde. En donde la entidad JBB solicita e informa que el acta de WR 919 y resolución ante la SDA, se tiene para todo el Nodo comercial La Mariposa, por lo cual toda modificación que se realice debe contemplar todo el Nodo comercial.

El contratista e interventoría manifiesta que el alcance del contrato no contempla estas actividades fueras del polígono y del componente forestal.

Por parte de la interventoría no se tiene la información de los datos de tala, traslado y de siembra del desarenador por lo cual no se puede entregar esa información ante el JBB.

La SDHT da la claridad que cuando se firma el acta por el JBB esta entidad tiene responsabilidad al recibir lo que se proyecto en los estudios y diseños.

Por parte de la SDHT recuerda que la resolución tiene vigencia hasta el mes de octubre, así mismo se solicita por parte del la SDHT que se siembre las especies arbóreas que se tienen dentro del polígono ubicadas que son 22 que cumplen con el espaciado y ubicación de las 28 que quedaron dentro de la resolución.

Se informa que se debe hacer claridad en el momento de entregar las especies al JBB que la resolución no se ha vencido, en donde se mencione la cantidad de 7 especies taladas, sembradas 22 y por la ubicación de diseño faltaron la siembra de 6 especies arbóreas.

Se programará una nueva reunión con la entidad para mostrar la situación dentro del Nodo comercial en donde se especifique la situación de la división de los proyectos. Sin embargo, se dejará la plata correspondiente a la compensación en el presupuesto.

2.3. Definición de propuesta grafitis mural (Contratista): El contratista informa que el artista no ha cumplido con la entrega de propuesta y presupuestos, por lo cual se mirara otra propuesta de otro artista que sea de la localidad y que plasme lo que la comunidad quiera en esos espacios.

3.4 Implementación PMT COI#23 (Contratista): Se informa que este compromiso se cumplió, el COI #23 del 10 de junio, se informa que como no se han iniciado las obras de la calle 163ª no se ha implementado por eso se encuentra pendiente. Sin embargo, las demás zonas que contempla el PMT ya se encuentran implementadas.

3.5 Seguimiento a trámite a UAESP (Contratista): Se informa que este compromiso se esta realizando, se informa que la factibilidad radicada ante ENEL CODENSA se tiene respuesta el viernes 25/06/2021. El profesional eléctrico del contratista manifiesta que primero se presentara a CODENSA y después a UAESP.

La profesional eléctrica de la interventoría manifiesta que lo que se presenta ala UAESP es los diseños de iluminación, cantidad de luminarias, según diseño fotométrico. Entonces se solicita se radique al tiempo a las dos entidades.
El contratista manifiesta que a finales de la otra semana se encontraría todo radicado en las dos entidades de servicios públicos para la revalidación correspondiente.

Se le solicita al apoyo de la supervisión la revisión y posterior entrega de las cartas de autorización a INCITECO para los trámites ante CODENSA y UAESP para continuar con los tramites.

3.6 Programación visita RETIE y RETILAP. (Contratista): Se informa que este compromiso se tiene pendiente para el próximo comité, en donde se tendrá el nombre del ente certificador de estos dos dictámenes y la programación de las visitas correspondientes en obra y documentales del Proyecto.

4.Seguimiento a componentes:

4.1 Componente Social: La profesional de la interventoría manifiesta lo siguiente:

1. El día 16 de junio de 2021 se recibió derecho de petición de la señora María Etelvina Pedraza Pedraza propietaria del predio ubicado en la calle 162a Nro. 5-02 quien solicita cambio de acabado de los andenes de adoquín a concreto y sean instalados bolardos al ingreso de la vía para evitar a futuro parqueo de vehículos. Al respecto con el apoyo del contratista se entregará respuesta al derecho de petición el día de hoy 22/06/2021.

   Se informa que se realizaran la adecuación de bolardos de concretos por seguridad en las calles y carreras en donde sean necesarias para impedir el ingreso de vehículos.

2. El día 16 de junio de 2021 se realizó revisión a las actas de reunión de inicio de obras de la calle 163a entre carreras 5 y 5a, reunión de avance y proyección respuesta derecho de petición señora Maria Pedraza.

3. El día 17 de junio de 2021 Se realizó jornada de socialización del PMT COI 23 del 10 de junio de 2021 relacionado con el inicio de las obras de la calle 163a entre carreras 5 y 5a actividad en la cual se informó del horario de los trabajos, andenes libres para circulación peatonal, cierre total de la vía para estacionamiento temporal de 1 volqueta y cargue y descargue de material y cierre total de la vía durante las actividades de obra en la calle 163 a, así como también presencia de auxiliar de tráfico y limpieza permanente de la vía durante la ejecución de las obras. En la actividad participaron 13 propietarios y/o encargados de los predios de la carrera 5a y calle 162a.

4. El día 17 de junio de 2021 se atendió visita de seguimiento de la SDHT y se realizó recorrido con el profesional social de la entidad Hugo Rúa, ejercicio en el cual se le informó del avance de las obras en cada uno de los frentes del parque. De ello realizó registro fotográfico del avance físico de la obra.

5. El día 17 de junio de 2021 Se realizó revisión de 5 actas de vecindad de inicio relacionadas con las intervenciones de la calle 163a entre carreras 5 y 5a y enviadas observaciones al contratista para su respectiva subsanación.

6. El día 18 de junio de 2021 Se realizó revisión y aprobación de informe semanal Nro. 23 y programación semanal del 21 al 26 de junio de 2021.

La profesional social del contratista manifiesta que el día de hoy se entregaron volantes de cuidado del concreto estampado realizado en la carrera 5a

4.2 Componente SST-MA: : La profesional de la interventoría manifiesta lo siguiente:

Respecto a maquinaria se tienen un (01) minicargadores,, y, respecto al personal en obra es de: (01) operadores de maquinaria, (02) Boals, (03) Maestros, (04) Oficiales, (11) ayudantes y (03) instaladores, (02) soldadores, (01) topografía.

Se realizaron recorridos de obra diarios: Se subsanaron algunas observaciones pendientes
Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Señalizar y demarcar acopios

-Mantenimiento e Instalación del cerramiento en la CRA 5, dado que no se está dando cumplimiento al PMT vigente
- Arreglar protección de los sumideros
- Realizar actividades de orden y aseo de todo el frente de obra
- Entregar dotación al trabajador Edgar Hueso, ya que tiene el pantalón roto
- Realizar aseo de baños
- Realizar aseo del todo el primer piso del salón comunal (mesas de ingreso, de punto de hidratación, pisos, área de almacenamiento de herramientas y demás)
- Poner bolsas de basura a las canecas del punto ecológico
- Retirar escombro zona gateadores
- Arreglar cerramiento de arboles
- Retirar de la ZMPA el material de excavación generado por la realización de gaviones
- Continuar con la implementación del PMT aprobado y poner la señalización que se ha retirado (la señalización de sendero peatonal de la cra 4C)
- Realizar mantenimiento a los cerramientos y senderos peatonales

El contratista realizo:
- Entrega de Dotación al trabajador Edgar Hueso

Durante toda la semana se realiza seguimiento a la implementación del protocolo de Bioseguridad, el contratista mantiene en buenas condiciones el campamento de personal usado como zona de vestier y alimentación.

Para el caso de Interventoría, el residente de obra continua en aislamiento preventivo (incapacidad)

4.3: Componente Técnico:

Se informa que se realiza seguimiento semanal con presentación por parte de la interventoría según programación Versión 3
Se informa que se tiene un % programado de 81,64%, versus 82,30% ejecutado, el contrato está presentando un avance de 0,68%
Se informa que las actividades realizadas son:

- Instalación de tabletas ingresó a gimnasio.
- Se realiza demolición de sumideros existentes en callé 162B carrera 4 C.
- Se continúa con remates de pinturas en barandas M81 y M83.
- Se realiza mampostería para pozos de conexión en calle 163.
- Cortes de dilatación en placas de circulación.
- Se realiza instalación de luminarias.
- Se realiza instalación de caucho EPDM en zona de gimnasio.
- Se realiza retiro de RCD.
- Se inicia actividades de excavación en calle 163 para instalación de tubería.
- Se realiza instalación de bordillos en plazoleta frente al salón comunal.
- Se realiza instalación de caucho EPDM en zona de juegos infantiles.
- Se realiza excavación para contenedor de raíces.

Quedan programadas las entregas de las primeras versiones para el día 25/06/2021 de los informes para revisión dela interventoría y la entrega del cuenta parcial el día 02/07/2021 para la revisión de la interventoría. Con el fin del cumplimiento dentro de las fechas de entrega ante la SDHT

Se menciona por parte de la interventoría el reporte del anticipo de la siguiente manera:
Con corte al 19 de junio de 2021, se menciona lo siguiente:

Ordenes de operación:

- **Orden de giro 63:** Revisión y firma por valor de $ 55.795.897 del rubro de materiales e insumos, correspondiente al 8%, desembolsado a LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS.
- **Orden de giro 64:** Revisión y firma por valor de $ 2.363.996 del rubro de materiales e insumos, correspondiente al 0,3%, desembolsado a MANUFACTURAS DE CEMENTO SA.

CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE	VALOR DESEMBOLSADO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
Compra de materiales e insumos	$ 740.926.708,00	72%	$ 644.861.250	39%	$ 96.065.458	61%
Transporte y/o alquiler de equipo	$ 194.005.608,00	19%	$ 194.005.608	30%	$ -	70%
Pago de mano de obra	$ 88.151.692,00	9%	$ 88.151.692	100%	$ -	0%
Total	**$ 1.023.084.008,00**	**100%**	**$ 927.018.550**	**91%**	**$ 96.065.458**	**9%**

VALOR ANTICIPO	**$**	**1.023.084.008**
TOTAL GIRADO	**$**	**927.018.550**
TOTAL SALDO	**$**	**96.065.458**
VALOR AMORTIZADO	**$**	**501.480.693**
SALDO POR AMORTIZAR	**$**	**521.603.315**

Observaciones y/o conclusiones:

Comité próximo 22/06/2021 de manera presencial a las 9:00 am para realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos y avance del contrato.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

Registro fotográfico (si aplica):





Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Subsanación de observaciones Nps	Contratista	22/06/2021
Solicitar reunión con el JBB	Contratista	28/06/2021
Definición de propuesta de grafitis en murales	Contratista	28/06/2021
Seguimiento de revalidación ante UAESP y CODENSA	Contratista	29/06/2021
Programación visita RETIE y RETILAP	Contratista	29/06/2021
Entrega de informes mensuales	Contratista	25/06/2021
Entrega de acta parcialNo.5	Contratista	02/07/2021
Ubicación de mobiliario a instalar	Contratista-Interventoria	29/06/2021
Seguimiento a respuesta de ETB	Contratista-Interventoria	29/06/2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELÉFONO	FIRMA
Johanna Urrutia D.	Int. SST-MA	Proyectos@solunsas.com	3152669926	Johanna Urrutia D.
Raul De Pablo C.	Director Interventor.	raul.delegado@solunsas.com	3213980306	
Jonny L. Cuellar	Residente Interventoria	jcuellars@outlook.com	3203690897	
Nellissa Pachon	ASX Ingeniera	incitecolaperla@gmail.com	3006666036	
Diego Pallejas	R. Obra.	incitecolaperla@gmail.com	3187502377	
Patricia Rodriguez	Electrico.	Patricia.rodriguez@electrolevan	3506[illegible]	
Pedro Reyes	Ing Elec Residente.	—	3194729102	
Javier L. Rodriguez	Residente Obra	incitecolaperla@gmail.com	3184824023	
PASTOR LÓPEZ	Director Obra	11 11	3182685816	
Carolina Guarín	Resid. Social	laperlasocial2006@gmail.	3103291114	
Carmen Lucía Vélez	R. Social Contratista Interventoría	social.solun003@gmail.com	3204054970	
Hugo Renato Rios Rodriguez	Apoyo a la supervisión SDHT	hugo.rios@habitatbogota.gov.co	3213975547	
Natalia Jimenez A.	Apoyo a la supervisión SDHT	natalia.jimenez@habitatbogota.gov.co	3138989462	
Laura Jimenez Arias	Apoyo Tecnico Interventoría	Proyectos@solunsas.com	7653076	

ANEXO 7

REGISTRO FOTOGRAFICO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**


REGISTRO FOTOGRÁFICO



1. VISITA AEREA EN GENERAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**

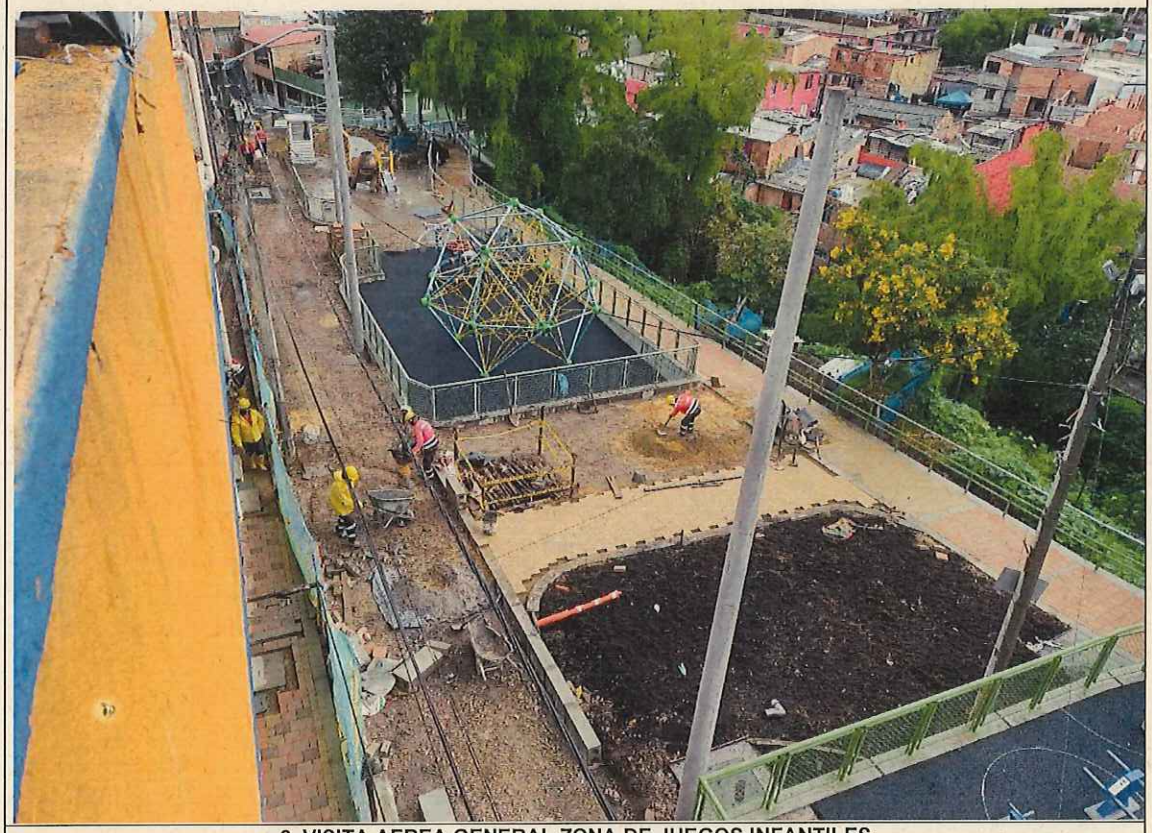

2. VISITA AEREA GENERAL ZONA DE JUEGOS INFANTILES

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



3. VISITA AEREA PLACA DE GIMNASIO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



4. VISTA AEREA ZONA ORIENTAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



5. AVANCE CAJAS Y BARANDA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



6. SUBBASE EN SENDERO NORTE

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



7. BARANDA EN ZONA DE GIMNASIOS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



8. BARANDA GIMNASIO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**

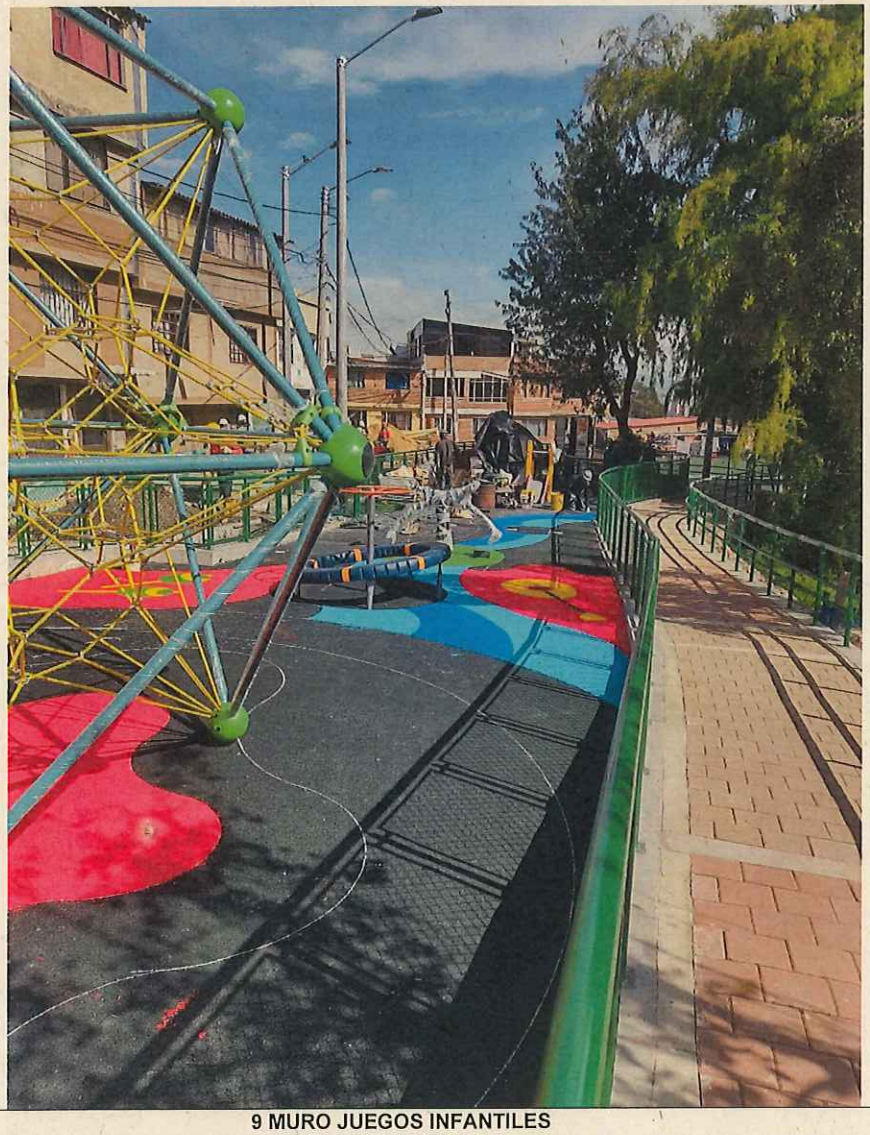

9 MURO JUEGOS INFANTILES

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



10. CAUCHO EPDM JUEGOS INFANTILES

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**

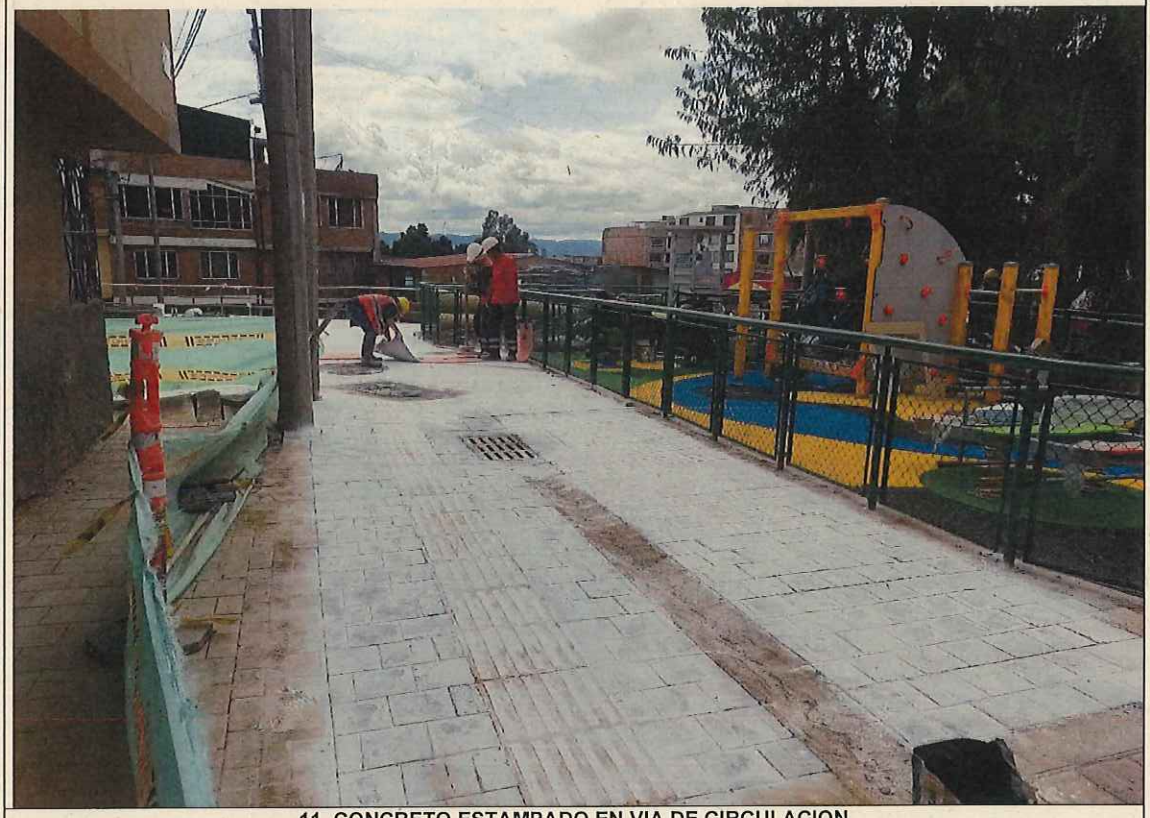

11. CONCRETO ESTAMPADO EN VIA DE CIRCULACION

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



12. EXCAVACION PARA SUBESTACION ELECTRICA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**

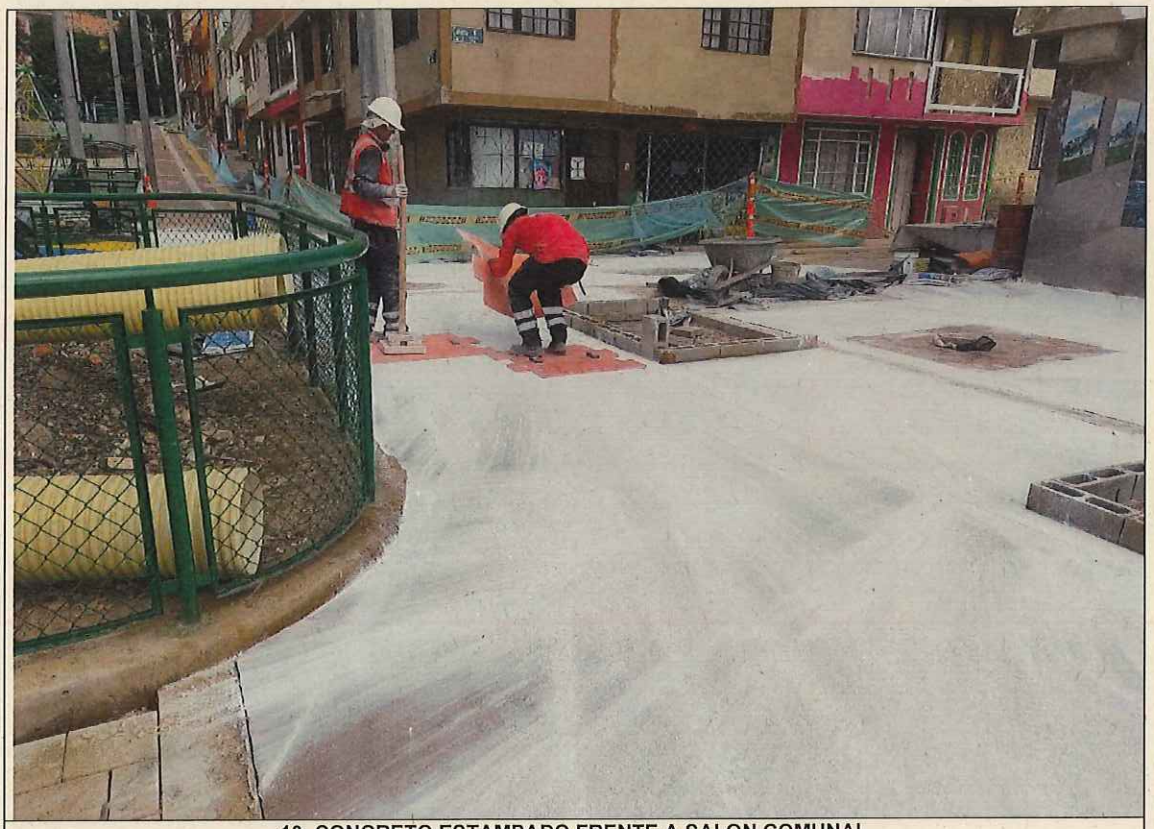

13. CONCRETO ESTAMPADO FRENTE A SALON COMUNAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



14. AVANCE CARRERA 4C

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



15. FUNDIDA DE CONCTRETO ESTAMPADO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



16. VISTA AEREA GENERAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



17. CAUCHO EPDM GIMNASIO Y ACABADOS EN BARANDA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



18. CAMBIO DE TUBERIA CALLE 163

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



19. IZAJE DE POSTES PARA LUMINARIAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



20. FUNDIDA DE PLACA PARA CAJA SC280

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



21. CONCRETO ESTAMPADO CARRERA 5

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**

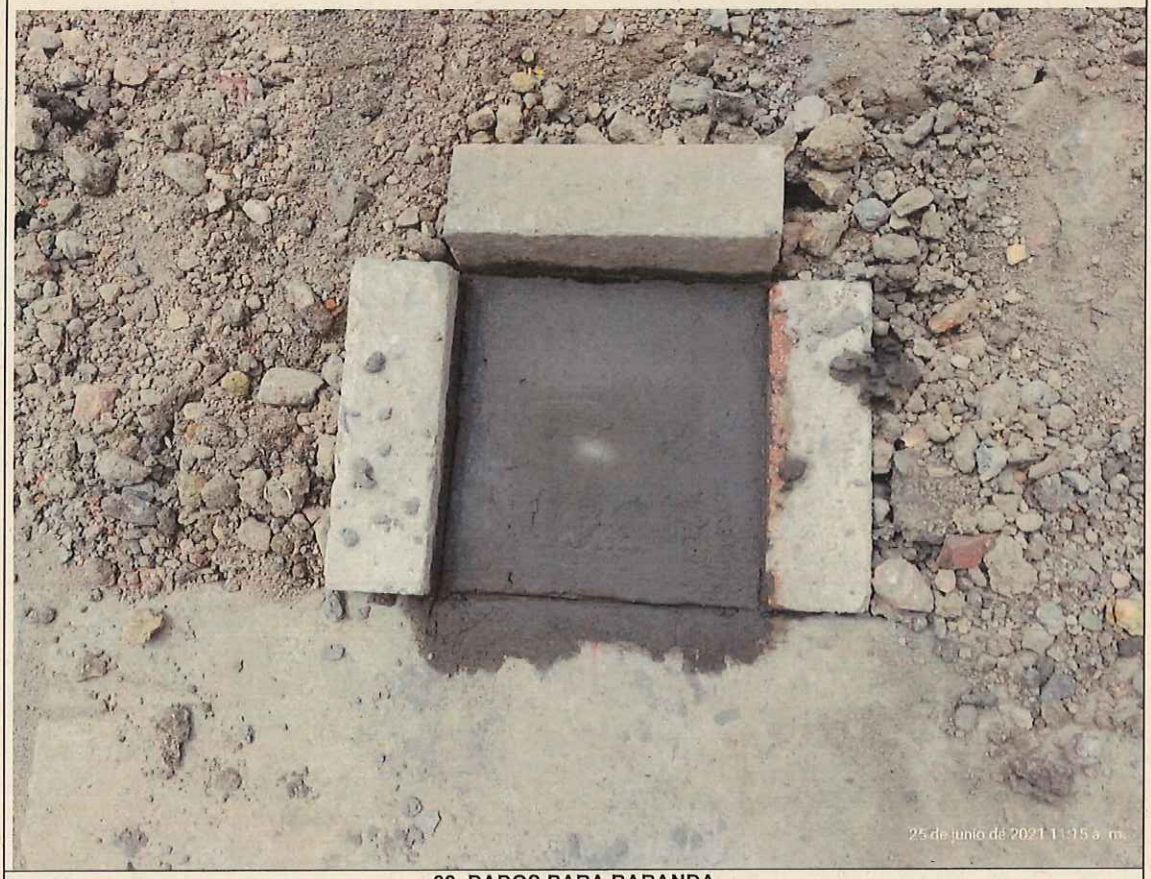

22. DADOS PARA BARANDA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



23. INSTALACION DE TABLETA EN SENDEROS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**

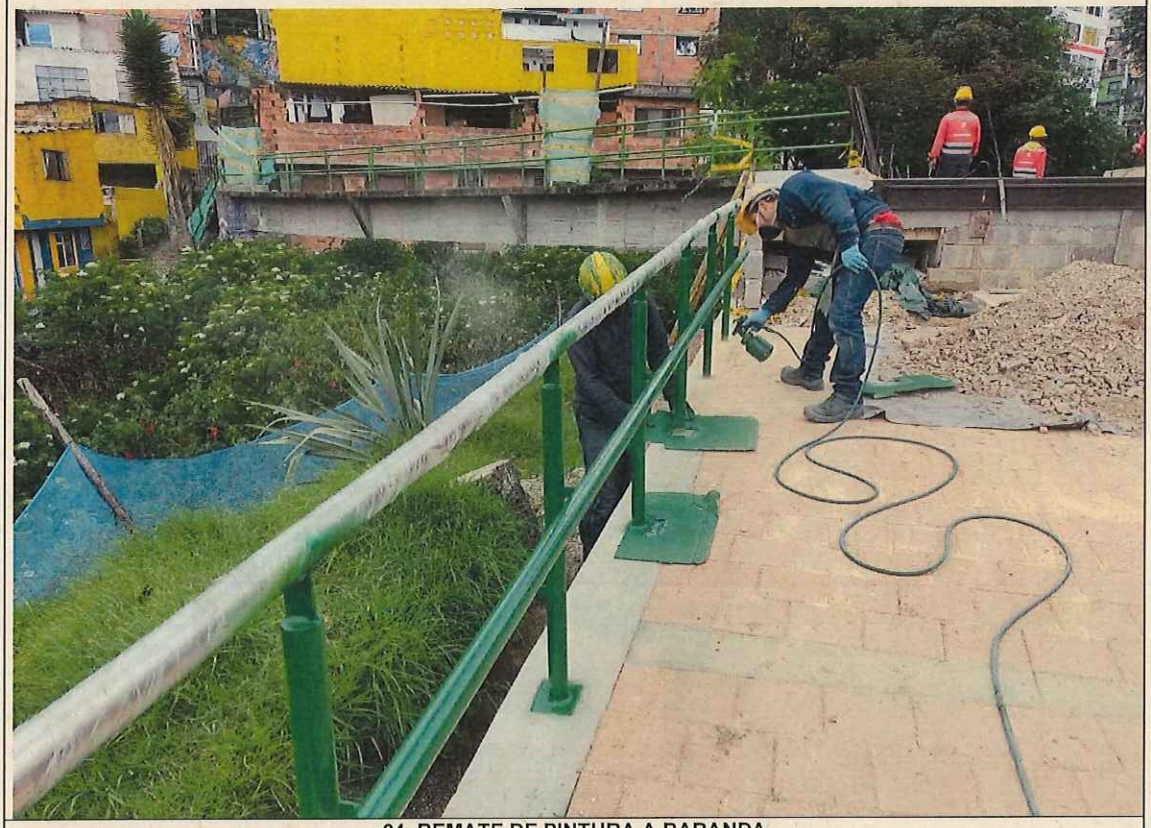

24. REMATE DE PINTURA A BARANDA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



25. INSTALCION DE LUMINARIAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



26. INSTALACION DE BORDILLO FRENTE A SALON COMUNAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



27. CONFORMACION DE CONTENEDORES DE RAICES

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



28. CONFORMACION DE GAVCIONES PERIMETRAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**

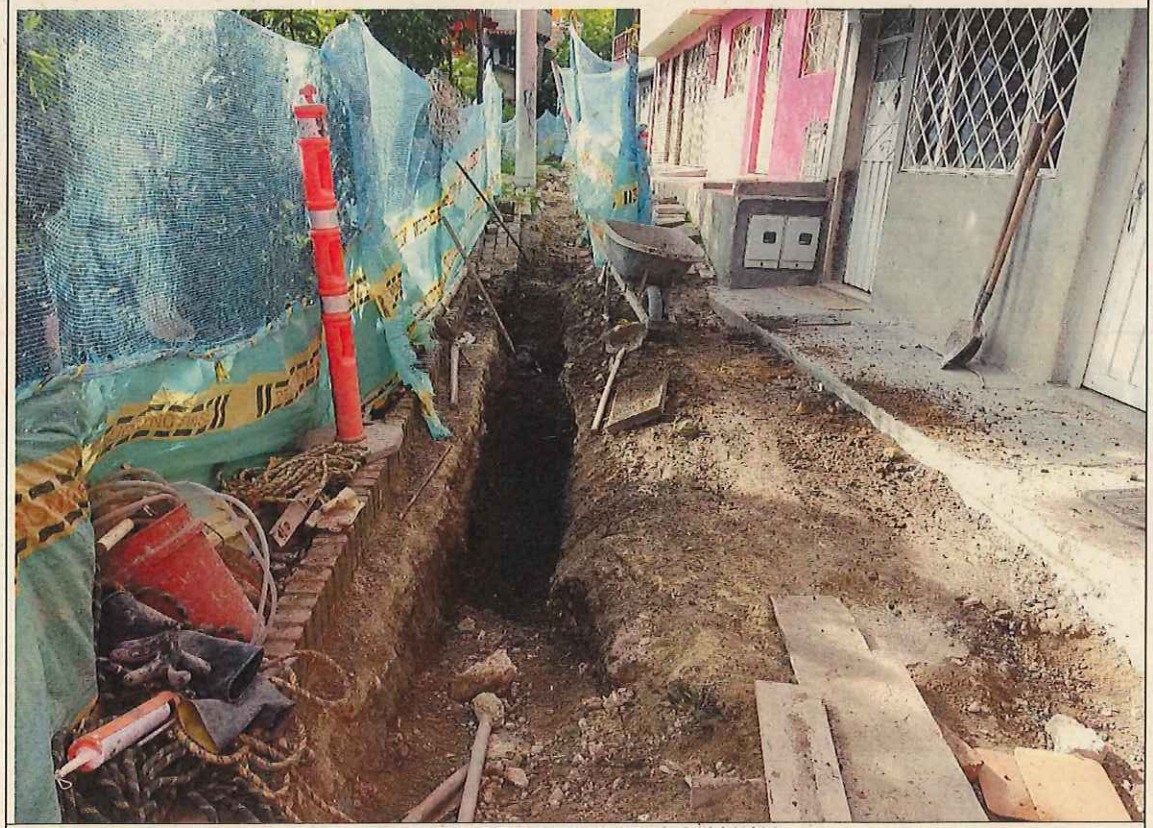

29. AVANCE DE ACTIVIDADES CALLE163

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**

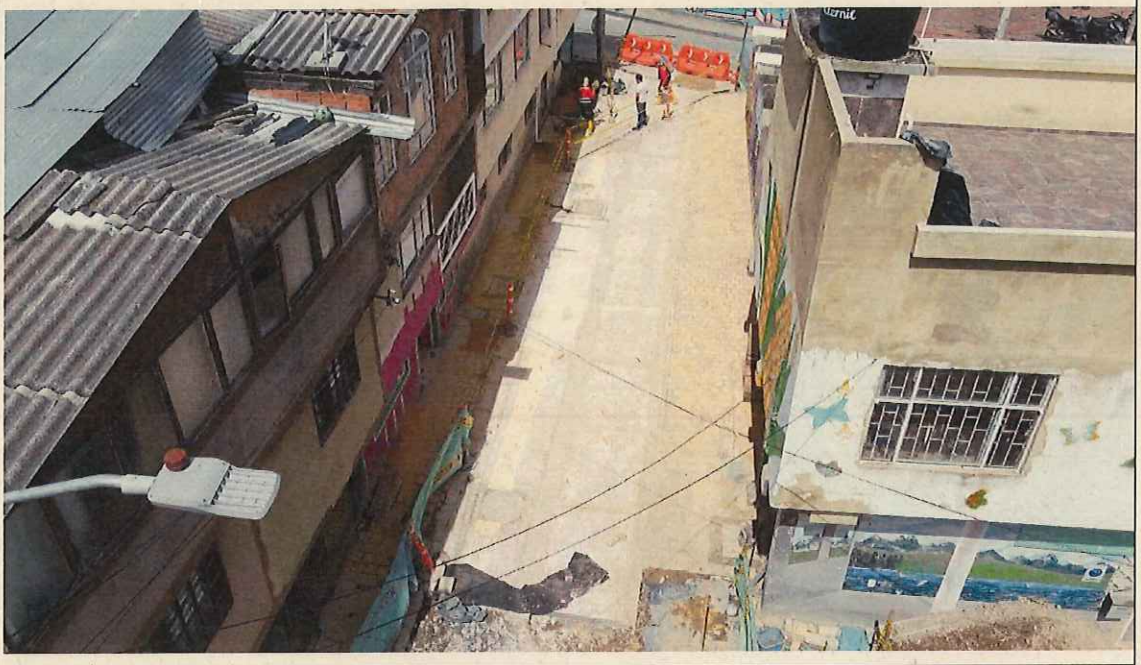

30. VISTA AEREA CARRERA 4C

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



31. VISTA AEREA CONSTADO ORIENTAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



32. VISTA AEREA GENERAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



33. ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**

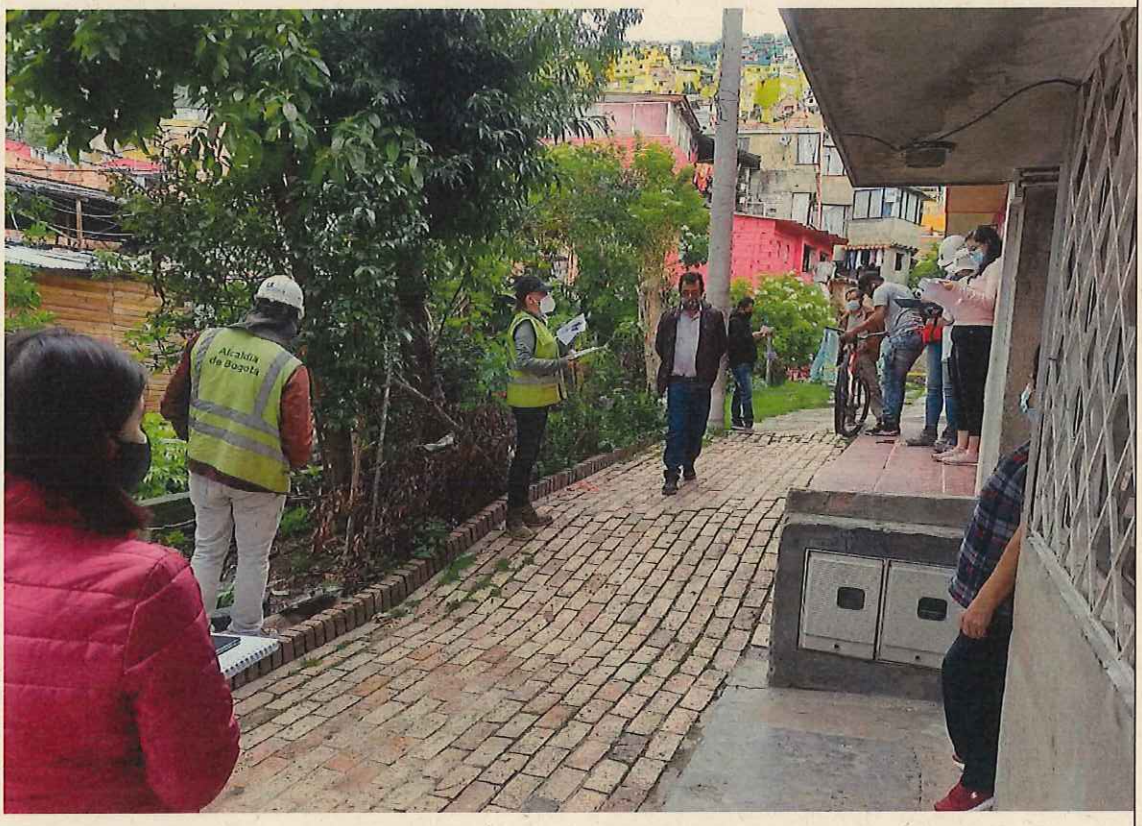

34. INFORMACION DE INICIO DE ACTIVIDADES CALLE163

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**

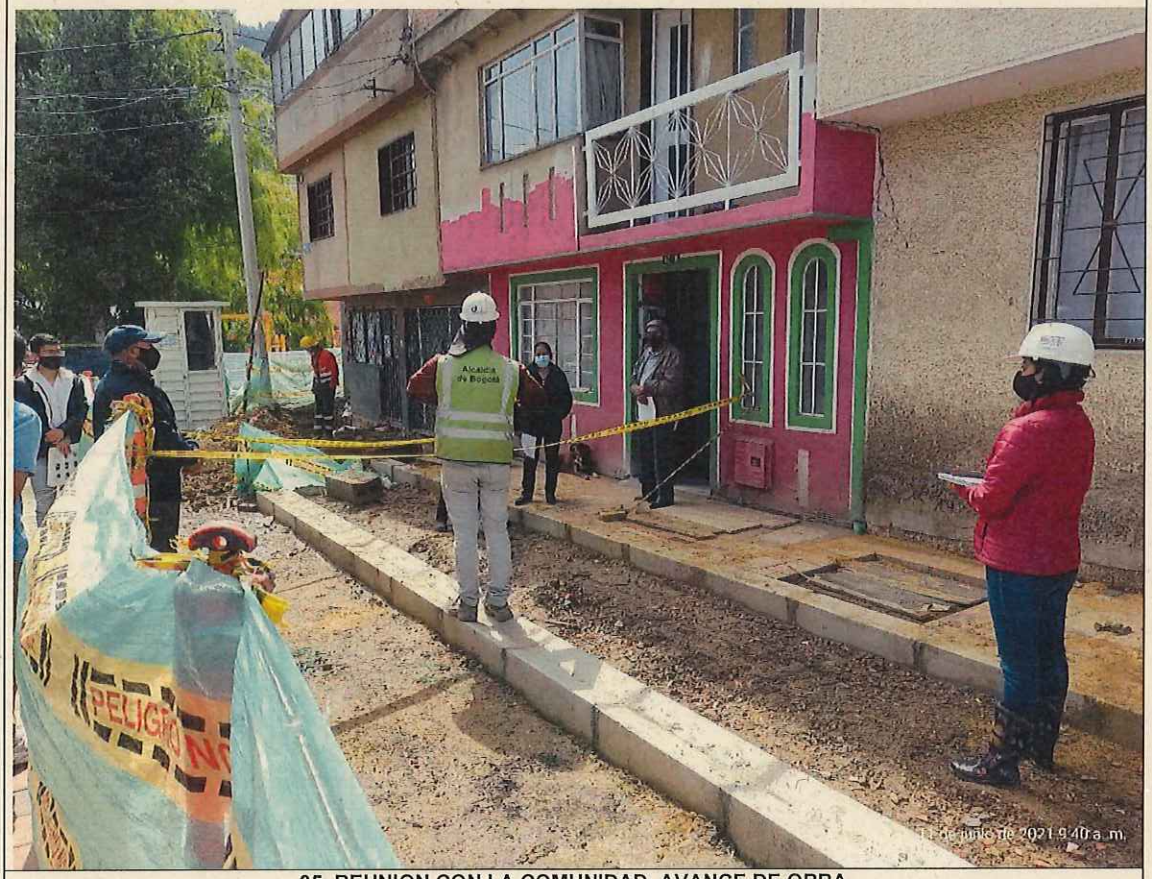

35. REUNION CON LA COMUNIDAD, AVANCE DE OBRA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



36. MAMPOSTERIA PARA RAMPA DE PUENTE PEATONAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



37. REMATE DE CAJAS ELECTRICAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



38. TABLETA EN SEDERO COSTADO NORTE

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



39. RECORRIDO DE OBRA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003


OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



40. SENDERO COSTADO NORTE

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**

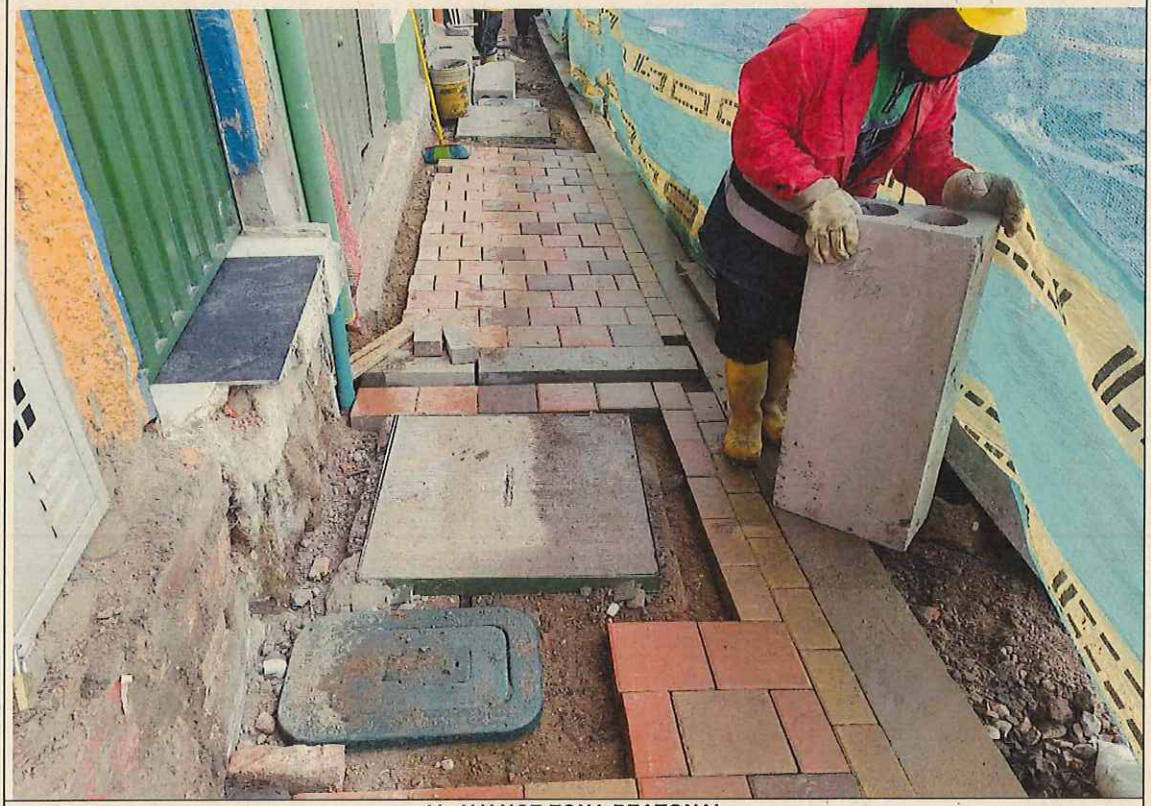

41. AVANCE ZONA PEATONAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



42. COMPACTACION DESUB-BASE

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



43. FUNDIDA DE CONCRETO ESTAMPADO CALLE 162B

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



44. VISTA AEREA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



45. CONFORMACION DE ZONAS VERDES

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



46. ACTIVIDADES CALLE 163

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



47. CONCRETO ESTAPADO PLAZOLETA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



48. AVANCE RAMPA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



49. CONCRETO ESTAMPADO CALLE 162

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SAN JUAN 003

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PARQUE VECINAL LA PERLA ORIENTAL**
CONTRATISTA:	**INCITECO SAS**
CONTRATO No.:	**796 DE 2020**
MES DEL REPORTE:	**JUNIO DE 2021**



50. VISTA GENERAL

ANEXO 8

BITACORA DE OBRA

las certificaciones de calidad de los insumos: malla electrosoldada, tuberia 10", ladrillos, Acero 4, certificacrón juegos y gimnasios. res. interv jairo torres

Nota 581 El día de hoy, el personal de interventoría es el siguiente: 1 residente interventt, 1 Profesional Social, 1 profesional SST-MA, 1 Inspector de interventoría res cont jairo t

Nota 582 Martes 1 de Junio de 2021
Clima: Soleado
Personal: (3) Maestros - (6) Ayudantes - (3) Oficiales
(2) Boal - (1) Inspectores - (1) Topografo
(3) Instaladores Gimnasios - (2) Instaladores juegos - (3) Soldadores - (2) Operarios Elec (2)
Personal de interventoría: (1) Residente interv.
(1) Profesional Social - (1) Profesional SST-MA
(1) Inspector de interventoría.
Maquinaria: (2) 1 Minicargador - 1 V. brocompactador

Nota 583 Se requiere al contratista, informar lo correspondiente al movimiento a realizar de la señal de ruta SITP ubicada en la calle 162 A con cra 5, al igual de informar del trámite ante la entidad competente. res inter jairo to

Nota 584 Se requiere al contratista verificar el estado en que reciben tanto juegos infantiles como aparatos de gimnasio, verificar que no tengan manchas, rayones, fisuras etc; para que no se presenten inconvenientes en la entrega de los mismos a la entidad. res jair

Nota 586 Se requiere al contratista continuar con el tema de accesos en la zona de baranda M-81 en el costado oriental; el residente de interventoría no ve viable continuar con sendero despues de la baranda, y requiere se deje puerta de acceso acorde con res interv jairo torres

Nota 587 Se ha evidenciado que la población infantil en los alrededores del parque es alta; por lo que se requiere tener en cuenta esta condición en obra, para garantizar la seguridad en todos los espacios que están en proceso de construcción (Parque la Perla). res. interv jairo torres

Nota 588 Se requiere al contratista, estar verificando de manera permanente el personal que se encuentra en obra; los cuales, deben contar con todos los elementos de protección personal y solo debe ser personal autorizado. res int jairo torres

Nota 589 Se avanza con la instalación de grano caucho negro, acorde con las especificaciones de altura de los juegos (altura de caida) en la zona de juegos infantiles. res int jairo torres

Nota 590 Se requiere al contratista, adecuar y realizar mantenimiento a la caseta realizada para los cortes de prefabricados frente al salón comunal res. interv jairo torres

Nota 591, Se avanza con izaje de postes en costado oriental, al igual que con la excavación para la cimentación de la rampa de acceso al puente peatonal. res interv jairo torres

Nota 592 Se requiere al contratista colocar las rejillas de los sumideros y las tapas a las cajas, para minimizar accidentalidad en obra; así sea de manera provisional, mientras se adelantan los respectivos acabados; de igual forma seguir implementando y aplicando los res. interv

146

Nota 593 Miercoles 2 de junio de 2021
Clima: Se registran lluvias en hora de la tarde.
Personal: (3) Maestros, (9) Ayudantes, (2) ayudantes Boal (4) Oficiales (1) Inspectores, (1) Topografos, (2) instaladores gimnasio, (2) instaladores piso en caucho. (2) operadores, (6) instaladores eléctricos

Nota 594 Dando alcance a la nota 592 esta actividad fue ejecutada conforme a lo Solicitado. #res contratista Diego callejas.

Nota 595 Dando alcance a la nota 590 se realiza la actividad requerida #res contratista

Nota 596 Se solicita a la interventoria nos ayude a definir el Color de la vía del costado occidental al salón comunal. #res contratista diego callejas.

Nota 597. Se Solicita a la interventoria nos ayude a definir las ubicaciones de los contenedores de raices distribuidos en el parque la perla. #res contratista diego callejas.

Nota 598 Se realiza instalación de piso en caucho en la zona de gimnasio con los espesores acordados, Se realiza excavación para la zona de rampa peatonal para la construcción de zapata. #res contratista diego callejas.
se realiza instalación de Cuneta Sobre la cra 5ta e instalación de rejilla de Sumidero, Sobre la cra 4c Se realiza conformación de andenes e instalación de bordillo #res contratista diego callejas.

Nota 599 Sobre la calle 162B se realiza instalación de loseta en el andén frente a las casas, adecuación de cajas con hechas instalación de tubería de "½" para acometidas. Sobre el costado norte de la zona de juegos infantiles realiza instalación de Loseta. #res contratista diego callejas


Clima: se registran lluvias en horas de la tarde.
Personal: (3) Maestros, (5) oficiales, (9) ayudantes, (2) Boal, (2) operadores, (3) instaladores piso en caucho, (1) inspectora (1) Residentes, (1) Topografos.

Nota 601 Se solicita a la interventoría nos ayude a definir la entrada de la zona de gimnasio. #res contratista Diego Calleyas.

Nota 602 se continua con la instalación de piso en caucho en la zona de gimnasio, instalación de cenefa en la Cra 5ta, instalación de Loseta en: Cra 4C, Calle 162B, Costado norte zona juego Infantil. #res contratista Diego calleyas.


Nota 603 se realiza construcción de sumideros sobre la Cra 4C y Calle 162B #res contratista Diego Calleyas.


Nota 604 Se presentan opciones de diseño color para el grano caucho en la zona de gimnasios; se realiza verificación de estas propuestas y se consulta con el apoyo a la supervisión ela ing: Natalia Jimenez aprobandose el siguiente diseño:

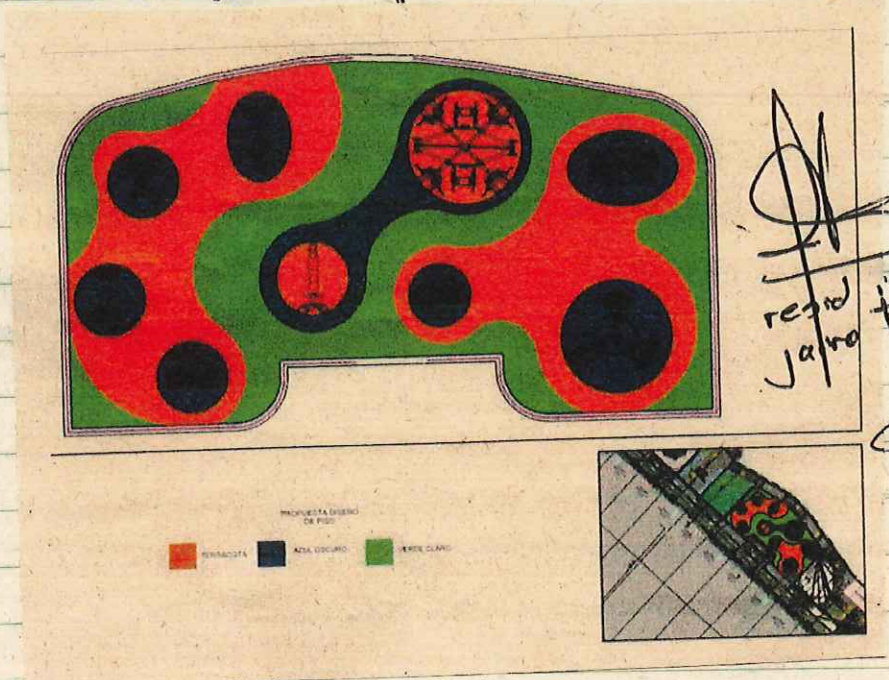


Nota 605 teniendo en cuenta la configuración del terreno; la interventoría aprueba la conformación de terreno en zonas donde

manera:

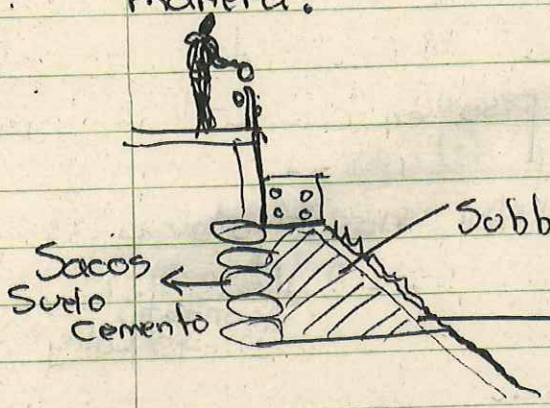

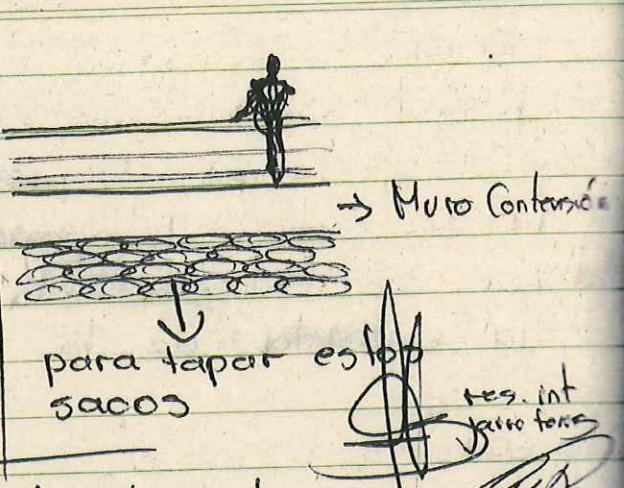


Nota 606 Se reitera al contratista tramitar todo lo correspondiente a lo requerido ante la empresa ENEL CODENSA,




Nota 607 Viernes 4 de Junio de 2021
Clima: mañana nublado
Personal: Maestros (3) - Oficiales (5) - Ayudant (8)
Boal (2) - (2) Operarios - instalador caucho. (3)
Topografía (1) - Inspector (01)
Personal interventoría: (1) Resid Interv. - (1) Prof Social
(1) Prof. SST-MA - (1) Inspector de interv.
Maquinaria (1) Minicargador - (1) Vibro

Nota 608 El contratista radica corte de obra Nº 4 el cual se revisa por parte de interventoría para poder continuar con el tramite pertinente



Nota 609 Se requiere al contratista dar respuesta al requerimiento realizado por la secretaria de movilidad respecto al PMT implementado en obra.



Nota 610 - El dia de hoy se realiza verificación de hierro en sumideros sobre calle 16 2D con 4C y rampa para puente en costado Nor-oriental los cuales cumplen segun

actividad para realizar su respectiva fundida

Nota 611 · se continua con instalación de tableta sobre sendero peatonal en carrera 4C costado oriental, calle 162D entre abscisas Km 65 a Km 75, y costado Norte sendero entre abscisas Km 35 a Km 45, se continua con remate de cajas electricas, nivelación, paneles y fundida de cinta e instalación de tapas, se continua con compactación de via en Cra 5 a nivel de sub-base, se realiza demarcación para aplicación de caucho EPDM. de color en zona de gimnasio

Ing. Jotted Cuellar.

Nota 612 Sabado 5 de Junio de 2021

Clima: Soleado

Personal: (03) Maestros, (05) oficiales, (08) Ayudantes, (02) Boal, (02) operadores, (03) Instaladores, (01) Inspector.

Personal Interventoria: (01) Residente Interventoria, (01) prof. social. (01) Prof. SST-MA, (01) Inspector Interventoria.

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) Minicargador (01) vibrocompactador.

Nota 613 - Se continua con instalación de tableta en calle 162D costado sur, en Carrera 4C costado oriental, se realiza paneles de cajas electricas, se continua con nivelación y compactacion de sub-base para fundida de concreto en carrera 5. en via y anden.

Nota 614. llega a obra 10 m³ de concreto de 3.000 PSI de la concretera Comex con un asentamiento de 4" para fundir sumideros en calle 162D carrera 4C y rampa de puente peatonal costado nor-oriental para fundida de zapatas y vigas., se realiza prueba de asentamiento el cual cumple segun remisión y se autoriza el vaciado de este, se realiza toma de cilindros,

la Cra 5ta dejando a nivel de placa en Concreto.

Nota 616 - Lunes 07 de junio de 2021
Clima : Lluvias en horas de la mañana.
Personal : ( ) Maestro, ( ) oficiales, ( ) inspectores, ( ) ayudantes.
Maquinaria y Equipos : Herramienta Menor.

Nota 617 En este día se realiza conformación de gavión e muro de concreto de la ABS-47 a ABS-59 1, Se rea instalación de Loseta en la plazoleta que se encuentra en La zona de juego infantil y zona de gimnasio.

Nota 618 Se realiza instalación de loseta de los andenes peatonal de la calle 162 B, adecuación de puntos hidraulicos en los pa intervenidos.

Nota 619 Se realiza instalación de Bordillo sobre Plazoleta Central confinando la Vía de la calle 162 B.

Nota 620 Martes 08 de junio de 2021
Clima : Registro de fuertes lluvias en horas de la tarde.
Personal : (3) Maestros, (5) Oficiales, (1) inspectores, (12) ayudantes, (1) residentes, (3) Instaladores piso en caucho, (02) ope
Maquinaria y Equipos : Minicargador (1), Vibrocompactador. (1).

Nota 621 Se continua con la Construcción de gaviones paralelo muro del costado norte, se realiza instalación de Loseta la Carrera 5ta, Alistado de Sub-base granular para fund de Concreto en Vía.

Nota 622 Se realiza excavación y construcción de caja electri Sobre la Cra 4C, se realiza instalación de cañuela so 4C sobre la Calle 162 B se realiza instalación de Loset

Plazoleta central ubicada entre la zona juego Infantil, y zona de gimnasio. Ires contratista calle 23. Diego

Insp. Interventoria.

Nota 623 Dando alcance a la nota 609 se Informa que se están adelantando los tramites pertinentes ante Secretaría de movilidad para refrendar el PMT ya aprobado. Ires contratista calle 23. Diego

Nota 624 Dando alcance a la nota 571 informamos que esta actividad se dió inicio el día 07 de junio con los materiales descritos y exigidos. Ires contratista calle 23. Diego

Nota 625. Se reitera al contratista entrega de certificados de calidad, se solicita mantener acopios señalados y protegidos y senderos en condiciones optimas para su respectiva circulación. Insp. Interventoría.

Nota 626. Miercoles 09 de Junio de 2021.
Clima: lluvias Intermitentes.
Personal: (03) Maestros, (05) oficiales, (01) Inspector, (10) Ayudantes, (02) Boal, (02) operadores, Instaladores caucho (02), Topografia (01).
Maquinaria y Equipo: herramienta menor, Minicargador (01) (01) vibrocompactador.

Nota 627. Se evidencia avance en construcción de Cauron costado Norte de muro perimetral, se continua con instalación de tableta en calle 162B costado sur, se aplica caucho SBR en zona de gimnasio, se realiza amarre e instalación de hierro para continuar con viga perimetral en zona de juegos infantiles. Insp. Interventor.

Nota 628. Se realiza replanteo de subestación electrica en la calle 162A, entre interventoria y contratista, se solicita al contratista dar cumplimiento al PMT vigente para dar inicio a esta actividad, toda actividad fuera de estos parametros sera asumida a cuenta y riesgo del contra-

152

Nota 629 - Se solicita al contratista continuar con baranda en zona de juegos y gimnasio y continuar con pintura de baranda perimetral ya que en el trascurso de la semana no se evidencia avance en esta actividad

Insp. Interv.

Nota 630 - Se realiza demolicion de placa en zona de subestacion electrica dejando la zona con su respectivo cerramiento y demarcacion.

Insp. Interv.

Nota 631 (Viernes) 10 de Junio 2021. Jueves.
Clima: soleado en la mañana, Nublado en la tarde, con lluvia
Personal: (03) Maestros, (05) oficiales, (10) Ayudantes, (02) Bood, (02) operadores, (03) Instaladores de Caucho (01) Inspector.
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, Minicargador (01) vibrocompactador (01).

Nota 632 - Se realiza mamposteria para conformacion de rampa en acceso puente en el costado Nor-oriental, se continua con Instalacion de tableta en sendero costado oriental de la carrera 4C, se continua con instalacion de canuela en carrera 4C, se realizo excavacion para caja de aguas negras carrera 4C, se realizo instalacion de tuberia electrica costado sur del salon comunal, se continuo con excavacion manual para elaboracion de pozos y conexion de agua lluvias por la calle 163.

Insp. Interv.

Nota 633 - Se solicita al contratista la entrega del PMT de la calle 163 y realizar su respectiva implementacion. antes de dar inicio a las actividades en esta zona.

Nota 634 - Se solicita al contratista continuar con la actividad del gaviion en la zona del muro perimetral implementando lo descrito en la nota de bitac

Nota 635. Viernes 11 de Junio 2021.
Clima: Soleado.
Personal: (03) Maestro, (05) oficiales, (11) Ayudantes, (02) Boal, (02) operadores, (02) Instaladores de Caucho, (01) Inspector.
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) Minicargador, (01) vibrocompactador.

Nota 636- El dia de hoy se realiza comite avance sobre las 9:30 A con presencia de la comunidad, contratista e interventoria donde se muestra avance a la fecha de las actividades y reunión de inicio de intervencion de la calle 163 sobre las 11:00 de la mañana. Insp. Interventor.

Nota 637- Se realiza fundida de placa para (Pozo) Cajo C-280 en la plazoleta central entre juegos infantiles y gimnasio, se continua con antas de ajuste sobre sendero calle 162 D costado sur, se realiza instalación de bordillo sobre calle 162 se instala bordillo en el costado sur del salon comunal, se continua con mamposteria para rampa de puente peatonal en costado nor-oriental. Insp. Interventoria.

Nota 638 Sábado 12 de junio de 2021
Clima: Registro de lluvia 10:00 am 12:00 pm.
Personal: (3) Maestro, (5) oficiales, (11) ayudantes, (2) Boal, operador (2), (2) Instaladores, (1) Inspector.
Maquinaria y Equipos: Herramienta menor, (01) minicargador. (01) Vibro compactador.

Nota 639 Se realiza instalación de cuneta sobre calle 162B, instalación bordillo, instalación de Loseta sobre el andén Abs+035, instalación de Loseta en plazoleta central entre zona de gimnasio y juegos Infa
Residente contratista Diego Callejas.

Nota 640 Se realiza sobre la cra 5ta la instalación de tubería eléctrica de caja SC-274 a caja de SC-275 y se realiza constru
Residente contratista Diego Callejas.

154

Nota 641 Sobre la carrera 4c se realiza Construcción de caja CPD intersectando con la calle 162B esta para la red de ETB de igual forma construcción de caja red sanitaria, Instalación de marco y tapa caja CPS red ETB. #res contratista Diego Gallego

Nota 642 Martes 15 de junio de 2021
Clima: Se registran fuertes lluvias en horas de la tarde 3:00pm-4:3
Personal: (3) Maestros, (4) oficiales, (2) ayudantes, (2) operadores, (2) Boo
(3) instaladores, (7) residentes, (7) inspectores. SOLDADORES (4)

Nota 643 El día de hoy se realizó Comité de obra en horas de la mañana con la presencia de interventoria y contratista adicional a ello se realizó recorrido de obra. #res contratista Diego Gallego

Nota 644 Se continua con instalación de bordillo y cuneta sobre la calle 162B para la conformación de la vía. instalación de loseta en la parte sur de la rampa peatonal, se realiza construcción de caja SG-274 sobre el andén. #res contratista Diego Gallego

Nota 645 se realiza fundida de placa para pozos en el tramo que conecta de la zona alta hasta la calle 163, Se realiza instalación de tubería 12" para agua lluvia. #res contratista Diego Gallego

Nota 646 Sobre la era 5ta se realiza Cereo de la sub-base granular para fundida de la vía con concreto MR43 y continuación de construcción #res contratista Diego Gallego

Nota 647 se realiza instalación de loseta sobre el costado sur del Salón Comunal. Instalación de Sardinel #res contratista Diego Gallego

Nota 648 Miercoles 16 de junio de 2021
Clima: SOLEADO

(2) BOAL, (3) INSTALADORES, (1) RESIDENTE, (1) INSPECTOS, (1) TOPOGR
(3) SOLDADORES.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, 1 MINICARGADO

NOTA 648 SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA RETOMAR LAS ACTIVIDA EN LA RAMPA DE ACCESO AL PUENTE PEATONAL, Y QUE LLEVA APROXIMADAMENTE UNA SEMANA SIN TRABAJAR EN ESTA ZONA, ACTIVIDADES QUE PUEDEN AFECTAR EL CRONOGRAMA DE LA OBRA INCURRIENDO EN UN ATRAS

Impl. Inter.

NOTA 650 SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LAS OBRA DE CONTENCIÓN SOBRE LAS ALETAS DEL CABEZOTE DE LA ALCANTARILLA EXISTENTE, HABLADA EN EL COMI DE OBRA DEL DIA ANTES 15 DE JUNIO, PARA PODER DESPEJAR LA SALIDA DEL AGUA Y REALIZAR LA LIMPIEZA Y RETIRO DEL TRINCHO ARTESANAL QUE SE ENCUENTRA OBSTRUYENTO TAL SALIDA.

Interventor Inter.

NOTA 651 SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA, REALIZAR LAS CUNAS DE LA BARANDA EN LA ZONA DE GATEADORES YA QUE ESTA QUEDANDO CON QUIEBRES EN LAS ZONAS QUE DEBEN QUEDAR LAS CURVAS.

Impl. Inter.

NOTA 652 SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA, LA REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DE LA CANALETA CENTRAL EN LA ZONA DEL SENDERO VEHICULAR YA QUE ESTAN QUEDANDO QUIEBRES, SE DESE MEJORAR EL ALINEAMIENTO DE ESTA ANTES DE FUNDIR LAS PLACAS ADYACENTES A ESTO.

Impl. Inter.

Nota 653 Jueves 17 de Junio de 2021
clima: Soleado
Personal: (02) Maestros, (01) oficiales, (11) Ayudantes, (01) operadores, (02) Boal, (03) Instaladores de cano (01) Inspector, (01) topografia, (02) soldadores,

156

Nota 654. Se solicita al contratista implementar PMT en su totalidad ya que durante actividades de obra se realizo el retiro de una señal la cual debe ser instalada en el menor tiempo posible y mantener lo requerido en el PMT en optimas condiciones.

Nota 655. Se inicia instalacion de caucho de color EPDM en zona de gimnasio, se solicita al contratista dar cumplimiento a los diseños aprobados. y especificaciones teanicas, Se continua con actividad de baranda peri-metral en zona de juegos infantiles, se inicia con instalacion de formaleta y laminas para fundida de placa en rampa de puente costado oriental, se realiza cerco de sub-base sobre Carrera 5, se solicita al contratista tomar densidades en esta zona antes de realizar fundida e instalacion de tableta

Insp. Interventoria

Nota 656. se solicita al contratista realizar el cambio de prefabricados como cañuelas, bordillos y otros elementos que se encuentren desportillados o en mal estado antes de realizar la fundida, de lo cual se identificaron elementos prefabricados en estas condiciones sobre la calle 16CTS carrera 5, de esta forma no presentar retrocesos en las actividades.

Insp. Interventoria.

Nota 657. Se realiza toma de densidades a nivel de sub-base en la carrera 4C. por parte del contratista con resultados de 98,56 % y 98,20 %, de esta forma se libera esta zona ya que cumple con los parametros establecidos en el plan de inspeccion y ensayos y se continue con actividad de fundida.

Insp. Interventoria.

Nota 658. Llega a obra concreto de la concretera Cemex con un asentamiento de 4" verificado en obra el cual cumple segun remision y con un total de 12 m³ de concreto

4C y se realiza el estampado respectivo y aplicación de color. Impl. Interventoría.

Nota 659. Se realiza toma de densidades sobre calle 162B con densidades mayores al 95%, en abscisa K0+100 98,72%, K0+185 99,72% y K0+70 95,28% lo cual cumple segun inspección y ensayos. y se libera esta zona para realizar fundida Interventoría

Nota 660. llega a obra sobre las 3:00 PM. bordillo A-80 y cañuela A-120 con remision Nro 30381 con una cantidad de 41 bordillos y 13 cañuelas. Insp. Interv.

Nota 661. Se realiza toma de densidades en carrera 5 con una compactación de 98,68% y 99% a nivel de sub-base de esta forma se libera esta zona ya que cumple segun plan de inspecaión y ensayos. Insp. Interventora.

Nota 662. Se solicita al contratista continuar con la actividad de excavaciones y conformación de terreno segun Nota 605 y nota 650, para que esta actividad no afecte el desarrollo de la obra. Insp. Interventora.

Nota 663. Viernes 18 de Junio 2021.
Clima: Soleado.
Personal: (03) Maestro, (05) oficiales, (10) Ayudantes, (01) operadores, (02) Boal, (03) Instaladores de Caucho., (01) Inspector (01) Topografia, (02) soldadores.
Maquinaria y Equipos: Herramienta menor, (01) minicargador.

Nota 664. Se continua con aplicación de pintura para baranda de zona de gimnasio y Juegos infantiles, se inicia mamposteria para elaboración de contenedor de raices en plazoleta central entre gimnasio y zona de juegos, se realiza demolición de sumideros existentes en carrera 4C y calle 162B., se instala malla electrosoldada en rampa de punto peatonal, se libera esta actividad para fundida

fundida ya que cumple segun especificaciones tecnicas y de diseño. Imp. Intento.

Nota 665 - Llega a obra concreto MR 43 para fundida de concreto estampado y de color de la concretera cemex con una cantidad de 30 M³ y un asentamiento de 6" 15cm., actividad que se realiza toma de cilindros y vigueta por parte de contratista. Imp - Intento.

Nota 666 - se solicita al contratista la protección de bordillos cañuelos y tabletas instaladas para que estas no se manchen con concreto o que se realice limpieza de estos elementos, para que no se afecten, de igual forma proteger las fachadas aledañas a la fundida todo arreglo o afectación es por cuenta y riesgo del contratista. Imp. Intento.

Nota 667 - Se retira al contratista realizar entrega de calidad contemplado en el plan de inspección y ensayos con sus respectivos soportes y certificados.

Nota 668 - Sabado 19 de Junio 2021
clima: soleado
Personal: (03) Maestros, (05) oficiales, (10) Ayudantes, (01) operadores, (02) Boal, (03) Instaladores de caucho (01) Inspector, (02) Soldadores.
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) Minicargador.

Nota 669 - Se continua con instalación de caucho de color en zona de Gimnasio segun diseño aprobado Nota 604, se continua con pintura en baranda perimetral, se continua con elaboración de gaviones., se realiza emboquillado tableta en anden calle 162D y en el costado oriental del salón comunal.

Nota 670 - llega a obra concreto MR 43 para fundido en

los cuales son verificados en obra en conjunto contratista e interventoria, se realiza toma de viguetas y cilindros para sus respectivos ensayos, la actividad de fundida se realiza con bomba de concreto estacionaria, Insp. Interventoria

671. Lunes 21 de Junio 2021.
Clima: Soleado.
Personal: (03) Maestros, (03) oficiales, (06) Ayudantes, (01) operadores, (02) Dual, (03) Instaladores de caucho, (01) Inspector, (02) soldadores, (01) topografia.
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) Minicargador.

672 - Se solicita al contratista realizar retiro de RCD que se encuentran en obra y realizar orden y aseo general y mantener la obra en estas condiciones Insp. Interventoria

673 - Se solicita al contratista realizar la implementacion del PMT en su totalidad ya que se evidencia falta de señales y cerramiento carrera 5, estas deben ser instaladas en el menor tiempo posible. Insp. Interventoria.

674. Se solicita al contratista realizar la ubicacion de los mojones retirados y realizar georeferenciacion para instalacion de las nuevas placas. Insp. Interventoria

675. Se solicita al contratista realizar retiro constante de los RCD ubicados en la calle 162A con carrera 5., donde se adelantan trabajos de excavacion para subestacion electrica. Insp. Interventoria.

676. Se evidencia avance en la aplicacion de caucho EPDM en zona de gimnasio, se realiza instalacion de tableta en acceso a zona gimnasio, se continua con demolicion de sumideros en calle 162B con carrera 4C, se realiza apiques para verificar tuberia existente en zona de subestacion electrica, se continua con remates de andenes

conexión de tubería aguas lluvias hacia calle 163, se realiza corte con dilatación profunda en placa de concreto dilación en carrera 5. Insp. Interv.

Nota 677 · Martes 22 de Junio 2021.
Clima: soleado
Personal: (03) Maestros, (04) oficiales, (09) Ayudantes, (03) Ba
(01) operadores, (03) Instaladores de caucho, (01) Inspector
(02) Soldadores, (01) Topografo.
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) Minicargador.

Nota 678 · Se solicita al contratista realizar en la zona donde queda expuesto los sacos de suelo cemento, un paisajismo en tierra negra y realizar siembra de hiedra miami perimetralmente a muro y gaviones. Insp.

Nota 679 · Se realiza comité de obra en conjunto, secretaria del habitat, contratista e interventoria, se realiza recorrido de obra y se dejan compromisos y temas tratos en acta de comite. Insp. Interv.

Nota 680 · Se inicia instalación de luminarias, se realiza excavación mecanica y manual en zona de subestación electrica, se continua con elaboración de gaviones en zona perimetral de muro, se continua con instalación de caucho EPDM en zona de gimnasio, se realiza pañete en pozos de aguas lluvias, se realiza retiro de material RCD en zona de galeadores. Insp. Interv.

Nota 681 · Se solicita al contratista realizar las actividades de empradización en zonas verdes segun especificaciones tecnicas y de diseño. Insp. Interv.

Nota 682 · Se reitera al contratista realizar entrega de certificados de calidad de materiales, los cuales se entran en obra, certificados y ensayos segun plan de inspección y ensayos. Insp. Interv.

Nota 683 · Se solicita al contratista iniciar remates con fachadas y presentar propuesta de accesos a predios los cuales se presentan escalones para el in

da 684- Miercoles 23 de Junio 2021.
Clima: Soleado
Personal: (03) Maestro, (04) oficiales, (09) Ayudantes, (02) Dool a
(01) operador, (03) Instaladores de caucho, (01) Inspector. n
(00) Soladadores, (01) Topografo.
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) Minicargador.
da 685- se reitera al contratista el retiro constante de material de RCD proveniente de la excavacion de la subestacion y esto no afecte el correcto manejo de el PMT. Insp Interventor.
ha 686. Se solicita al contratista la implementacion en su totalidad del PMT. en la calle 163. para dar inicio a las actividades pertinentes. Insp. Interventor. l
da 687- Se inician actividades de excavacion en calle 163, donde se evidencia que las tuberias de aguas lluvias y aguas negras pasan a diferente nivel, pero por la misma linea., por lo cual esta interventoria solicita concepto tecnico por parte de especialista y empresa del acueducto para el manejo y elaboracion de pozos e instalacion de tuberia, de igual forma se evidencia tuberia de Gas natural y tuberia de agua potable, se requiere realizar el respectivo traslado de las tuberias que afecten en esta zona Int. 1.
ha 688- Se realiza instalacion de bordillo en plazoleta frente al salon comunal, se inicia aplicacion de caucho EPDM en zona de juegos Infantiles, Se realiza replanteo de sendero ecologico en conjunto interventoria y contratista, se continua con demolicion de sumideros en calle 162D con carrera 41C-, se continua con pintura de barandas, se inicio con (dd) (2) aral excavacion para elaboracion de contenedor de raices frente a zona de juegos Infantiles. Insp. Int.
ha 689- Se solicita al contratista iniciar la actividad de siembra de especies arboreas para dar cumplimiento con el manual de silvicultura contemplado por el jardin botanico.

Nota 690. Jueves 24 de Junio 2021

Clima: Soleado.

Personal: (03) Maestros, (04) Oficiales, (09) Ayudantes, (02) Boa (01) operador, (03) Instaladores, (01) Inspector, (a) Topografo.

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) Minicargador.

Herramienta y Equipos: Minicargador, Herramienta menor.

Nota 691 Se realiza pintura a baranda M-83 de la zona de juego Infantil, Se realiza instalación de piso en caucho en la misma zona, en este acceso se realiza Construcción de Contenedor de raices por Cll 162B. Ayres contra diego callejas.

Nota 692 Por la Calle 163 se realiza excavación de pozo para red Sanitaria con limites de primera fase sector la maria Paso seguido se realiza figurado de acero, instalación de fondo nivelación de estas. Ayres contra diego callejas.

Nota 693 Se realiza instalación de bordillo frente a entrada Principal Salón comunal, Por la calle 162B se realiza demolición del carcamo existente, en la intersección de la Calle 162A con Cra 5ta se realiza excavación para caja estación electrica. Ayres contra diego callejas.

Nota 694 se realiza instalación de loseta en la esquina de la 162A con Cra 4ta, Para llegar al nivel de nuestro proyecto. Ayres contra diego callejas.

Nota 695 Viernes 25 de junio de 2021

Clima: Soleado., Lluvias en horas de la tarde.

Personal: (4) Maestros, (5) oficiales, (8) ayudantes, (2) Boal, (6) Operador, (3) instaladores, (1) Inspector, (1) residentes.

Maquinaria y equipos: Minicargador. Herramienta menor.

Nota 696 Se continua con instalación de Piso en caucho

Construcción de contenedores en la entrada.

Nota 697. Se evidencia la excavación y fundida de dados para (fun) instalación de baranda sobre carrera 5., se realiza remate de viga en rampa de puente costado nor-oriental, se continua con instalación de bordillo frente a plazoleta de salón comunal, se continua con instalación de gavión perimetral en muro y se continua con excavación de subestación electrica. Inst. Interventoría.

Nota 698. Sabado 26 de junio 2021
Clima: Soleado.
Personal: (04) Maestros, (05) oficiales, (08) Ayudantes, (02) Boal (01) operador, (01) Instaladores., (01) Inspector,
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) Mini cargador.

Nota 699. Se continua con la instalación de piso caucho EPDM. en zona de juegos Infantiles, se realiza remate de cajas electricas, se continua con compactación de subbase frente al salón comunal, se solicita al contratista toma de densidades para liberar esta zona y realizar la respectiva fundida.

Nota 700. se realiza mamposteria para pozo de aguas negras en calle 163, se reitera al contratista segun Nota 687 la visita por parte del supervisor de la empresa de acueducto para dar concepto al manejo de tuberias y elaboracion de pozos. Impl. Interventoría, Interventoría

Nota 701 Lunes 28 de junio 2021.
Clima: Soleado.
Personal: (04) Maestros, (05) oficiales, (07) Ayudantes, (02) Boal (01) operador, (04) Instaladores, (01) Inspector, (03) Soldadores.
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) mini cargador.

Nota 702 - Se realiza toma de densidades frente al salon comunal, con un porcentaje de compactación del 97,87% y 98,10% entrada via costado oriental salón comunal con un porcentaje de compactacion del 98,25% y en la calle 162D

del 96,52% ensayos tomados por el contratista los cuales cumplen segun plan de inspeccion y ensayos de esta forma se libera esta actividad para realizar fundida de concreto [illegible] Inst Lubo.

Nota 703 - Se reitera al contratista dar inicio a las actividades de empradizacion, sembrado de hiedra miami en la zona donde se instalo el gavion todo esto cumpliendo con las especificaciones tecnicas y de diseno [illegible]

Nota 704 - Se solicito al contratista realizar la proteccion pertinente a los gimnasios y juegos ya instalados para que personas ajenas a la obra ingresen y hagan uso de estos y se presenten daños en los inmuebles, todo gasto y costo adicional sera asumido por el contratista [illegible]

Nota 705 - se realiza lavado y aplicacion de sello en concreto estampado, Instalacion de baranda perimetral en la carrera 5, se continua con instalacion de tuberia y excavacion en calle 163, se realiza remates de cajas electricas y ETD, se continua con aplicacion de caucho SDR en zona de juegos infantiles, se continua con excavacion para elaboracion de subestacion electrica [illegible] Inst.

Nota 706 - Martes 29 de Junio 2021
Clima: soleado
Personal: (04) Maestro, (06) oficiales, (07) Ayudantes, (02) Boal (01) operador, (05) Instaladores, (01) Inspector, (03) soldadores.
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) Minicargador.

Nota 707. Se solicita al contratista dar terminacion a las bocanas después del puente y de una vez aseo a toda la zona de la ronda o zona de ensayo dejando libre comunicacion para la hidra miami, Se solicita diametro cuando montes los remates al concreto de la rampa puente y realizar los pasos que le faltan para la reubicando y aislar obra del costado oriental para abajo. Se reitera el compromiso que tiene el contratista para legalizar con el acueducto la

Se solicita revisar el terminado del piso de concreto estampado de la carrera 5a (se ver manchado en las dilataciones.)
Se aprueba el sendero ecologico para que inicien a fabricarlo y se solicita su respectivo replanteo en sitio con coordenadas topograficas conjuntas.
Se recomiendan fabricar filtro A-C. Carrera 5a en la zona verde que rodea la via principal

Ing interventoria.

Nota 708- Se continua con excavacion para instalacion y cambio de tuberia en calle 163, se realiza ubicacion de contenedores de raices, se continua con soldadura e instalacion de baranda en carrera 5 costado oriental, se realiza instalacion de cono y cargue para conexion de tuberia aguas negras en calle 163 y se realiza lleno a nivel en sub-base, se continua con excavacion manual para subestacion electrica, se continua con aplicacion de caucho EPDM en zona de juegos infantiles. Ing Interventor

Nota 709- llega a obra 17 unidades de Banca MC Gris. las cuales se dejan en acopio temporal, se solicita al contratista realizar la instalacion en el menor tiempo posible.

Nota 710- Miercoles. 30 de Junio 2021
Personal: (04) Maestro, (06) oficiales, (07) Ayudante, (02) Boo
(01) operador, (03) Instaladores, (01) Inspector, (02) Soldadore
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) Minicargador.
Clima: Soleado, lluvias expontaneas en la tarde.

Nota 711- llega a obra 12,50 m³ de concreto de la concretera cemex, con un asentamiento de 10 cm (4") verificado en obra, con una resistencia de 3.000 PSI para fundido de plazoleta frente al salon comunal, y 13,75 m³ de concreto MR 43. de la concretera cemex con un asentamiento de 10 cm verificados en obra, para fundido de zona de circulacion costado occidental salon comunal

Nota 712 - SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LAS AREAS, DE ZONAS VERDES Y PLACAS TANTO DE GIMNASIO COMO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES, POR PARTE DE LA TOPOGRAFIA DE LA INTENDENTORIA; DICHA ACTIVIDAD PARA LA REVISIÒN DE CANTIDADES DE ESTAS ZONAS Y ACTUALIZACIÒN DE ALCANCE Y ACTA DE CANTIDADES.

Supervisor.

TOPOGRAFO INTENDENTORIA

Nota 713 - Se realiza instalación, soldadora de baranda en rampa de puente costado Nor-oriental, se realiza pañete de muros de rampa, se continua con excavación para instalación de tubería en calle 163, se realiza instalación de tubería en calle 163.

Supervisor Inter.

Nota 714 - Se solicita al contratista retirar RCD y material que se encuentre en zona de rampa., de igual forma los RCD que se encuentran en zona soldadores y dar inicio a empradización de zonas verdes adjuntadas que ya tienen que dar inicio para que esto no afecte el tiempo de entrega segun programación y incrementar el personal en zonas de remates, y realizar los tramites pertinentes ante las empresas de servicios publicos.

Nota 715 - Jueves 01 de Julio de 2021

Clima: Soleado.

Personal: (03) Maestros, (06) oficiales, (07) Ayudantes, (02) Dob (01) operador, (02) Instaladores, (01) Inspector, (03) Soldadores.


Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, (01) Minicargador.

Nota 716 - Se continua con elaboración de baranda en rampa, se realiza remates de cajas electricas, se continua con excavación para subestación electrica, se realizan dilataciones en concreto estampado, se continua con elaboración de aceiones, se continua con ins

ANEXO 9

PROGRAMACION DE OBRA VERSION 3


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**Realizar la construcción de las obras del Parque La Perla Oriental en el nodo comercial del territorio con oportunidad "Cerros Orientales".**	**167 días**	**mié 23/12/20**	**jue 22/07/21**
2		INICIO PROYECTO	0 días	mié 23/12/20	mié 23/12/20
3		**A) PARQUE LA PERLA**	**167 días**	**mié 23/12/20**	**jue 22/07/21**
4		**PRELIMINARES**	**24 días**	**mié 23/12/20**	**sáb 23/01/21**
5		REPLANTEO GENERAL	17 días	mié 23/12/20	vie 15/01/21
6		CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: Cortadora de concreto incluye operario y combustible incluyendo disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	1 día	vie 15/01/21	sáb 16/01/21
7		DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (incluye cargue): No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	7 días	vie 15/01/21	sáb 23/01/21
8		DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue): No incluye transporte y disposición final de sobrantes	7 días	vie 15/01/21	sáb 23/01/21
9		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	7 días	vie 15/01/21	sáb 23/01/21
10		**PAVIMENTOS**	**107 días**	**vie 15/01/21**	**jue 27/05/21**
11		NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mié 20/01/21	vie 22/01/21
12		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	4 días	vie 15/01/21	mié 20/01/21
13		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	4 días	sáb 16/01/21	jue 21/01/21
14		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	5 días	vie 22/01/21	jue 28/01/21
15		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	100 días	sáb 23/01/21	jue 27/05/21
16		**ESPACIO PÚBLICO**	**149 días**	**vie 15/01/21**	**mié 21/07/21**
17		EXCAVACIÓN MECANICA PARA MATERIAL COMUN (Incluye cargue)	105 días	vie 15/01/21	mar 25/05/21
18		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	98 días	sáb 16/01/21	mar 18/05/21
19		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	98 días	jue 21/01/21	sáb 22/05/21
20		BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm. Mortero de Nivelación 2000 PSI)	63 días	jue 25/03/21	sáb 12/06/21
21		PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TACTIL ALERTA O A56 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4 cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	29 días	sáb 12/06/21	mié 21/07/21
22		FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e=10 CM ANCHO ENTRE 12-20 CM	29 días	sáb 12/06/21	mié 21/07/21
23		CONCRETO 4000 PSI PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL REFUERZO, CURADO)	20 días	lun 24/05/21	vie 18/06/21
24		**MOBILIARIO**	**41 días**	**jue 20/05/21**	**lun 12/07/21**
25		BARANDA METALICA M81	25 días	jue 20/05/21	lun 21/06/21
26		CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	2 días	jue 8/07/21	lun 12/07/21
27		CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6m, L=2m, A=0.6m, incluye suministro e instalacion. No incluye bases)	2 días	jue 8/07/21	lun 12/07/21
28		JUEGO CARRUSEL 5-12 años Cap:40 niños H=4.5 (Sum+Inst)	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
29		Juego balancin doble 5-12 años Cap: 2 niños	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
30		Juego Muelle 2 + años Capacidad:6 niños	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
31		Juegocuerdaspoliedro	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
32		Modulo Escalador - Gimnasio al aire libre	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
33		Modulo flexionesTriceps senci- Gimnasio al aire li	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
34		Modulo Sky - Gimnasio al aire libre	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
35		Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit.	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21

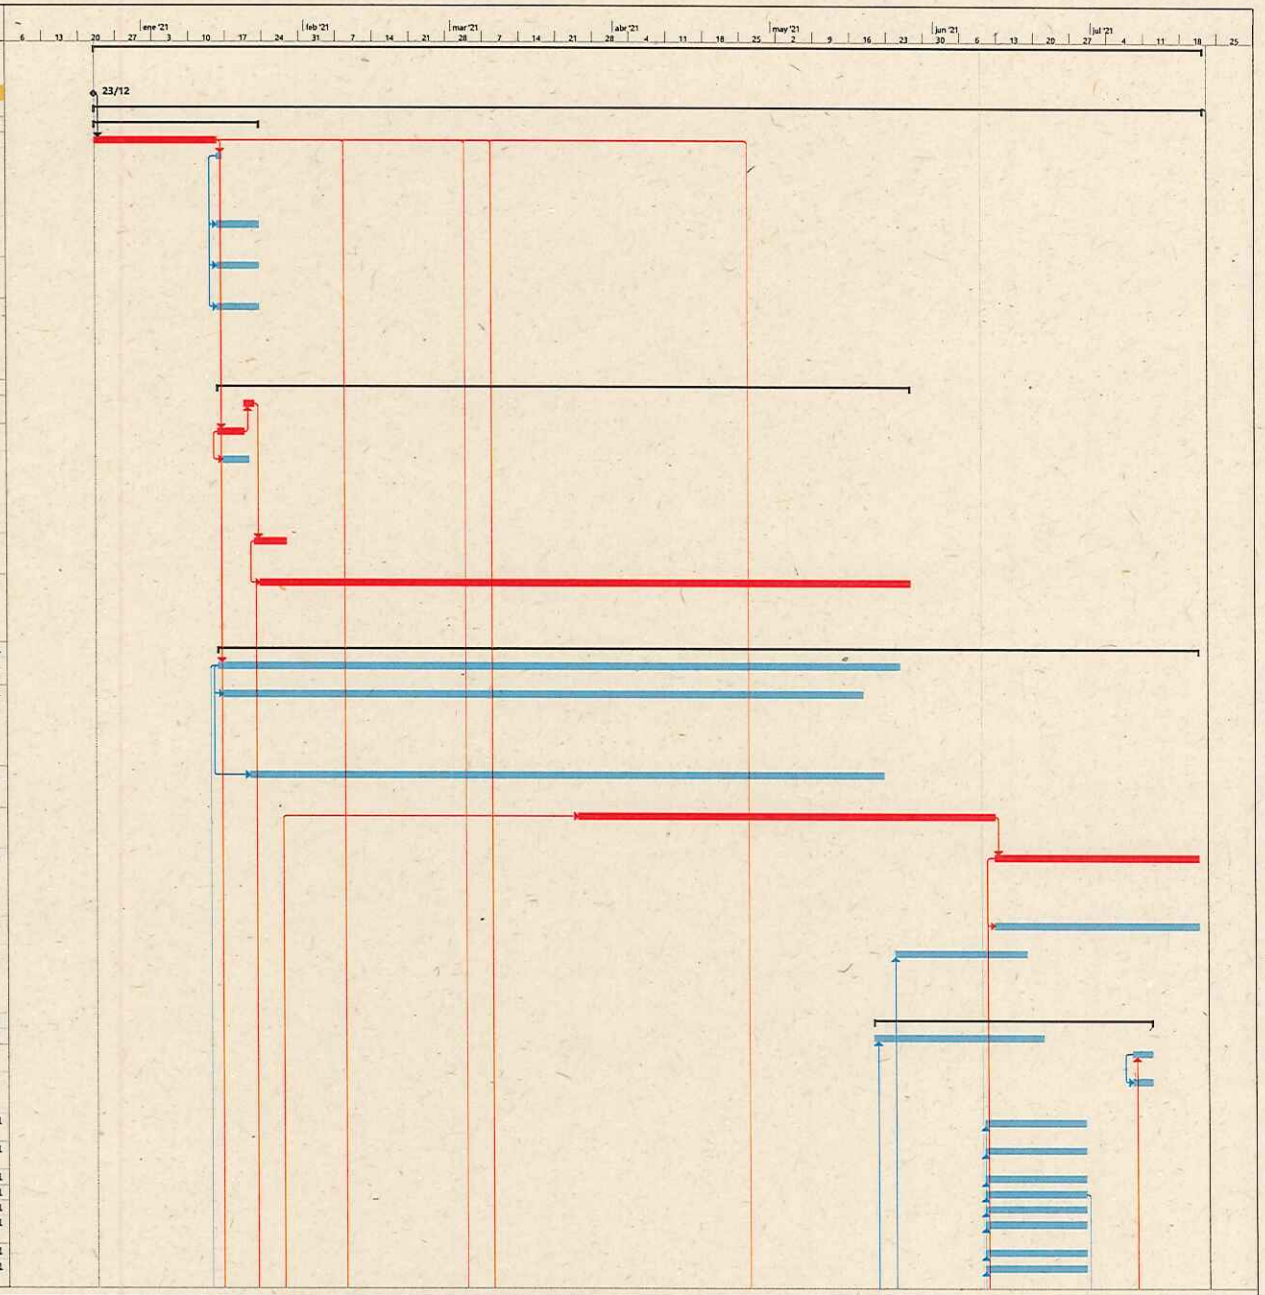

Proyecto: ProyectoPARQUE
Fecha: jue 10/06/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
36		GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
37		Modulo Banca Abd. Cronch Incl - Gimnasio aire libr	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
38		Juego muro escalar trepar	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
39		GIMNASIO PRENSA DE PECHO JALON	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
40		GIMNASIO TRIPLE PECHO ESPALDA PIERNAS	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
41		**PAISAJISMO**	**150 días**	**vie 15/01/21**	**jue 22/07/21**
42		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	10 días	vie 15/01/21	mié 27/01/21
43		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)..A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	10 días	sáb 16/01/21	jue 28/01/21
44		CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40m. Inc. Suministro, Construccion y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)	15 días	sáb 19/06/21	jue 8/07/21
45		BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
46		SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e Instalacion. Incluye 10 cm de Tierra negra)	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
47		NOGAL H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
48		EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
49		ALISO H=1.5mt (Incluye excavacion manual, siembra, caja, tierra, abono,tutor, transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
50		ARRAYAN H=1.3mt (Incluye tierra, abono,tutor, transporte y disposicion final de escombros a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
51		CEDRO H=2.5mt (Incluye siembra, caja, tierra negra, abono, tutor, transporte y disposicion final de escombros a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
52		GUAMO H=1.5mt (Incluye excavacion manual, siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
53		HIEDRA MIAMI (Incluye 12 unidades por m2 y transporte y disposicion final de escombros a 28 Km). SUMINISTRO Y PLANTACION	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
54		**ESTRUCTURAS**	**116 días**	**vie 15/01/21**	**mar 8/06/21**
55		CONCRETO 4000 PSI PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado, Inclu Sumin, Formaleteo, bombeo y colocacion, No Incluye refuerzo, Curado)	70 días	sáb 20/02/21	jue 20/05/21
56		ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	75 días	vie 12/02/21	mar 18/05/21
57		DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=01.m. Incluye cargue)	3 días	vie 15/01/21	mar 19/01/21
58		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue)	65 días	mar 19/01/21	vie 9/04/21
59		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	65 días	mié 20/01/21	sáb 10/04/21
60		CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado)	75 días	jue 11/02/21	sáb 15/05/21
61		GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 - T5, RESSTENCIA ULTIMA > 75 KN/m). SUMINISTRO E INSTALACION	85 días	jue 28/01/21	jue 13/05/21
62		GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACION	85 días	mié 3/02/21	jue 20/05/21

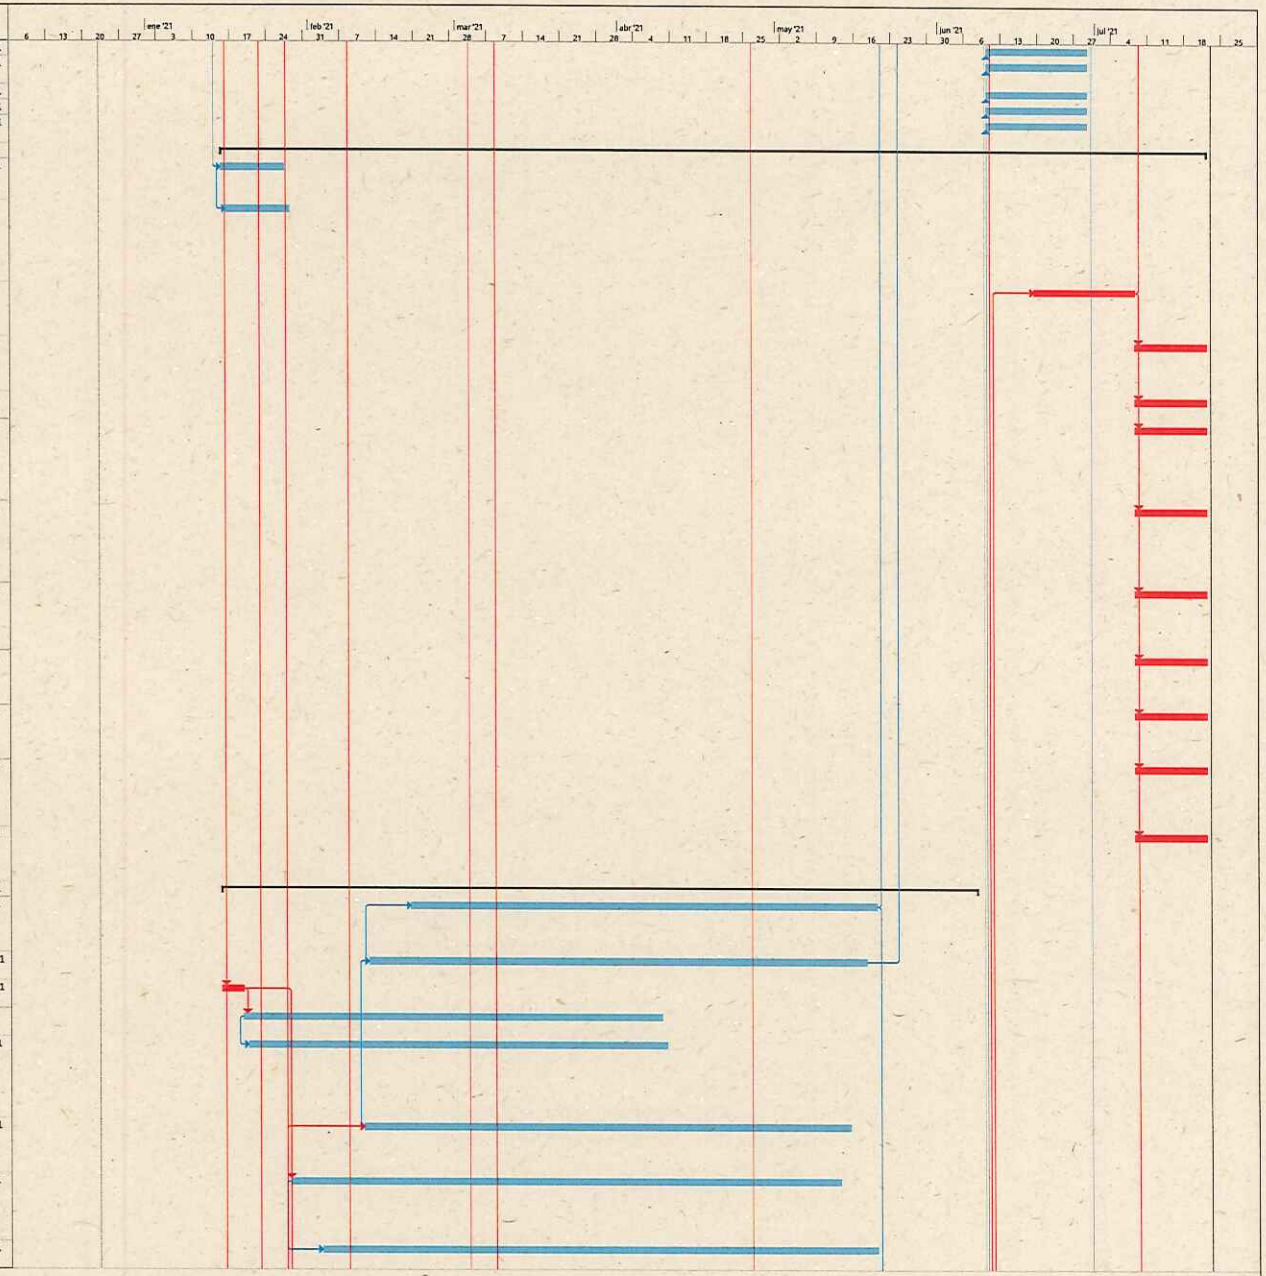

Proyecto: ProyectoPARQUE
Fecha: jue 10/06/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
63		GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalacion)	85 días	mié 3/02/21	jue 20/05/21
64		SACOS DE SUELO CEMENTO (Incluye suministro de material, transporte y colocacion)	85 días	mié 3/02/21	jue 20/05/21
65		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	105 días	jue 28/01/21	mar 8/06/21
66		**REDES HUMEDAS**	**54 días**	**mar 20/04/21**	**sáb 26/06/21**
67		**ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**54 días**	**mar 20/04/21**	**sáb 26/06/21**
68		TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO/INTERIOR LISO U.M, Norma NTC 3722-1, D=12" (Incluye suministro e instalación).	35 días	lun 26/04/21	mié 9/06/21
69		PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)	35 días	lun 26/04/21	mié 9/06/21
70		CILINDRO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D=1,20 m, H=0,5 m, e=0,10m (Incluye suministro e instalación, no incluye aro de ajuste.	35 días	mié 28/04/21	vie 11/06/21
71		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	35 días	mié 5/05/21	vie 18/06/21
72		EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0 m - 3.5 m (Incluye cargue)	35 días	mar 20/04/21	mié 2/06/21
73		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 km). A distancia mayor del acarreo libre (90m),en sitio autorizado por la entidad ambiental competente.	35 días	mié 21/04/21	jue 3/06/21
74		RELLENO EN ARENA DE PEÑA (Incluye transporte, suministro, extendido manual, y compactación)	35 días	lun 26/04/21	mié 9/06/21
75		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	35 días	jue 29/04/21	sáb 12/06/21
76		GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. Incluye rajón, malla para gaviones y alambre recocido.	30 días	jue 20/05/21	sáb 26/06/21
77		**REDES SECAS**	**106 días**	**lun 8/03/21**	**jue 22/07/21**
78		**RED ENERGIA ELECTRICA**	**93 días**	**jue 25/03/21**	**jue 22/07/21**
79		SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE RED BT SUBTERRANEA 3X2 + 1X4(T) CU PARA AP. (INCLUYE CABLE, CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR)	15 días	lun 28/06/21	vie 16/07/21
80		CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NORMA RS1-011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDE	47 días	jue 25/03/21	lun 24/05/21
81		CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC TDP, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye suministro e instalación)	47 días	jue 25/03/21	lun 24/05/21
82		POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)	15 días	lun 28/06/21	vie 16/07/21
83		CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.	55 días	jue 25/03/21	mié 2/06/21
84		CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.	55 días	jue 25/03/21	mié 2/06/21
85		CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.	55 días	jue 25/03/21	mié 2/06/21
86		CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)	60 días	jue 25/03/21	mié 9/06/21

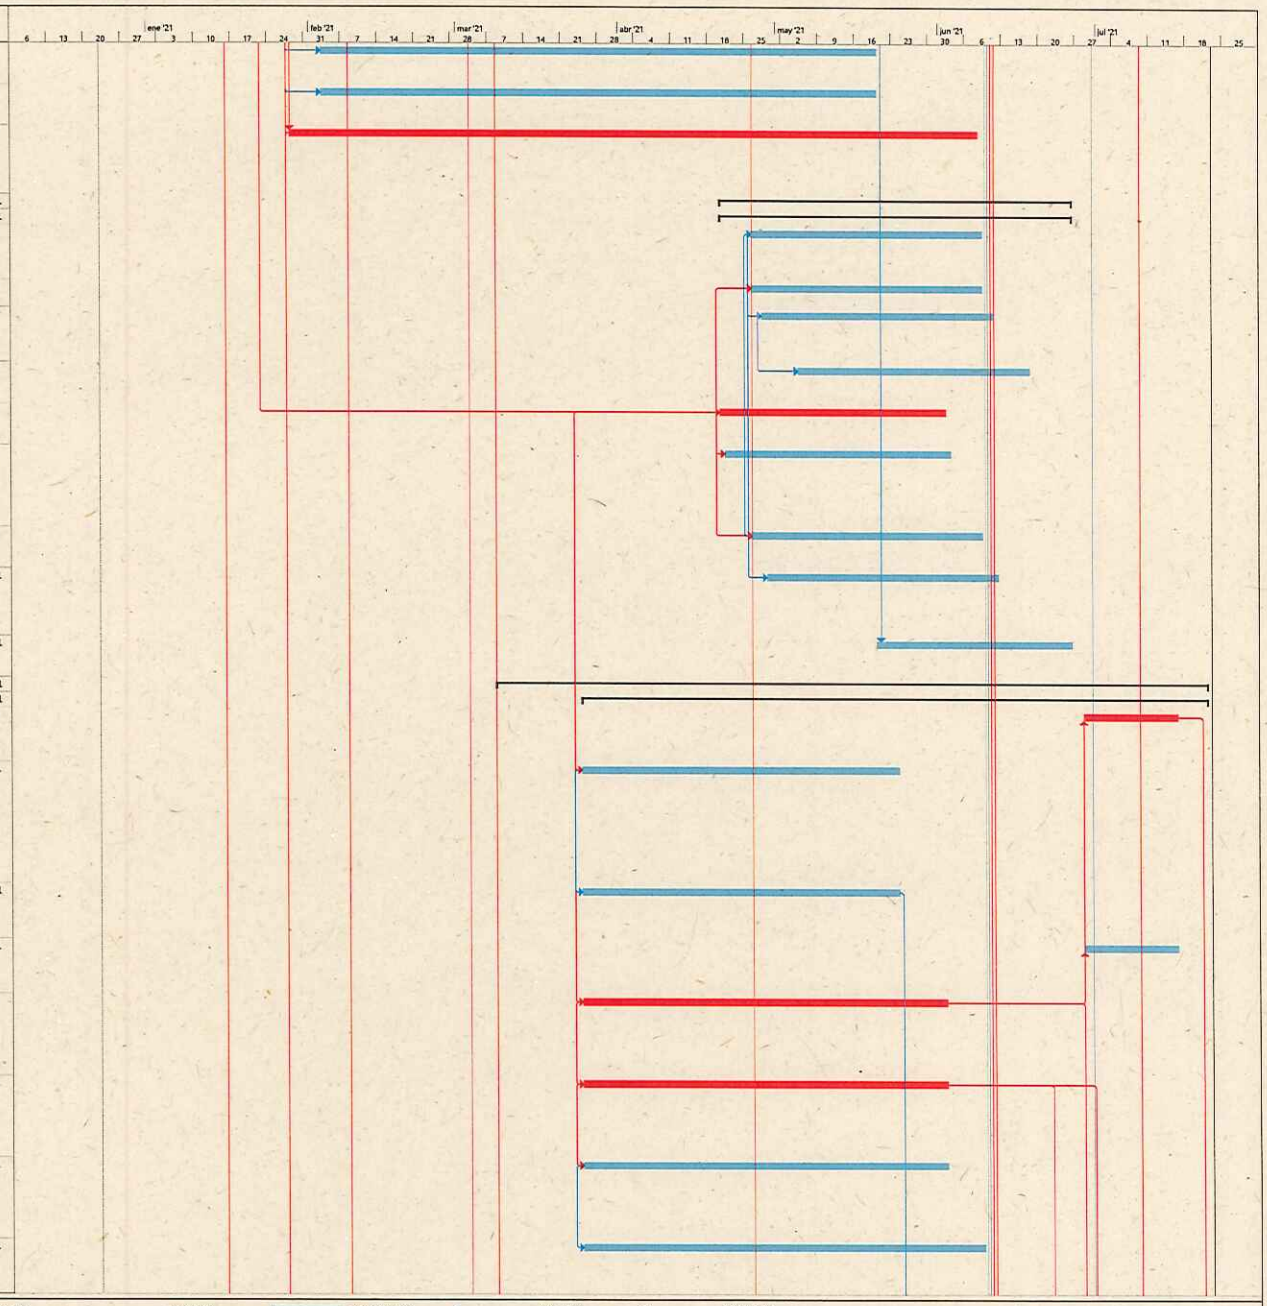

Proyecto: ProyectoPARQUE
Fecha: jue 10/06/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
87		BARRAJE PREFORMADO BT DE 6 SALIDAS PARA AP INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCION DE CABLE 175 AMP (Incluye suministro e instalación)	15 días	lun 28/06/21	vie 16/07/21
88		RETIRO DE RED AÉREA (Incluye transporte y disposición de sobrantes)	15 días	lun 28/06/21	vie 16/07/21
89		RETIRO DE POSTES DE MT (Incluye Traslado a Sitio de Acopio, retiro de poste, retenidas, estructuras de amarre y soporte de red aérea).	15 días	lun 28/06/21	vie 16/07/21
90		CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN RETILAP - INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO. Zona Estacionamiento del Patio del Portal AMÉRICAS	1 día	mié 21/07/21	jue 22/07/21
91		COSTO CERTIFICADO RETIE	1 día	mié 21/07/21	jue 22/07/21
92		**RED GAS NATURAL**	**69,13 días**	**lun 8/03/21**	**jue 3/06/21**
93		EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	30 días	lun 8/03/21	lun 31/05/21
94		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	30 días	mié 10/03/21	jue 3/06/21
95		TRASLADO RED DE POLIETILENO D= 3/4" (GN EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS). Las obras corresponden a traslado, protecciones o reubicación de tuberías y/o activos de la infraestructura de Gas Natural	30 días	mié 10/03/21	mié 2/06/21
96		**RED ETB**	**55 días**	**lun 26/04/21**	**mar 6/07/21**
97		1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	25 días	lun 3/05/21	mié 2/06/21
98		CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas 1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.06 x 0.60m. Altura: 0.96m.	25 días	mié 2/06/21	mar 6/07/21
99		CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura: 0.96m.	25 días	mié 2/06/21	mar 6/07/21
100		RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (Incluye grua).	30 días	lun 26/04/21	mié 2/06/21
101		RETIRO DE RED AÉREA (Incluye transporte y disposición de sobrantes)	40 días	lun 26/04/21	mié 16/06/21
102		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	25 días	lun 3/05/21	mié 2/06/21
103		**NO PREVISTOS**	**150 días**	**vie 15/01/21**	**jue 22/07/21**
104		ADOQUIN CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A-26 (20X10X6). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4 cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA	30 días	sáb 12/06/21	jue 22/07/21
105		Demol muro mamposteria	7 días	vie 15/01/21	sáb 23/01/21
106		Desmonte malla eslabonada	7 días	vie 15/01/21	sáb 23/01/21
107		DESMONTE JUEGO INFANTIL EN MADERA	7 días	vie 15/01/21	sáb 23/01/21
108		DESMONTE ESTACION 12- POSTE ABDOMINALES	7 días	vie 15/01/21	sáb 23/01/21
109		DESMONTE ESTACION 7- BARRAS PARALELAS	7 días	vie 15/01/21	sáb 23/01/21
110		BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	20 días	lun 10/05/21	jue 3/06/21
111		PLACA DE CONTRAPISO e=0,10 3000 PSI + MALLA ELECTROSOLDADA 4mm	20 días	mar 4/05/21	vie 28/05/21
112		Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	16 días	mar 29/06/21	mié 21/07/21
113		Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	16 días	mar 29/06/21	mié 21/07/21
114		Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	16 días	mar 29/06/21	mié 21/07/21
115		Piso Caucho recicl 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)	16 días	mar 29/06/21	mié 21/07/21
116		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño (SUM+INST)	9 días	jue 8/07/21	mié 21/07/21
117		Desmonte y retiro adoquin **	7 días	vie 15/01/21	sáb 23/01/21
118		PISO EN LOSETA PREFABRICADA A20. Suministro e Instalación. Incluye Base 4 cm mortero 1:5 y Arena de Sello)	29 días	sáb 12/06/21	mié 21/07/21
119		Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD) NO INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO.	35 días	vie 23/04/21	sáb 5/06/21

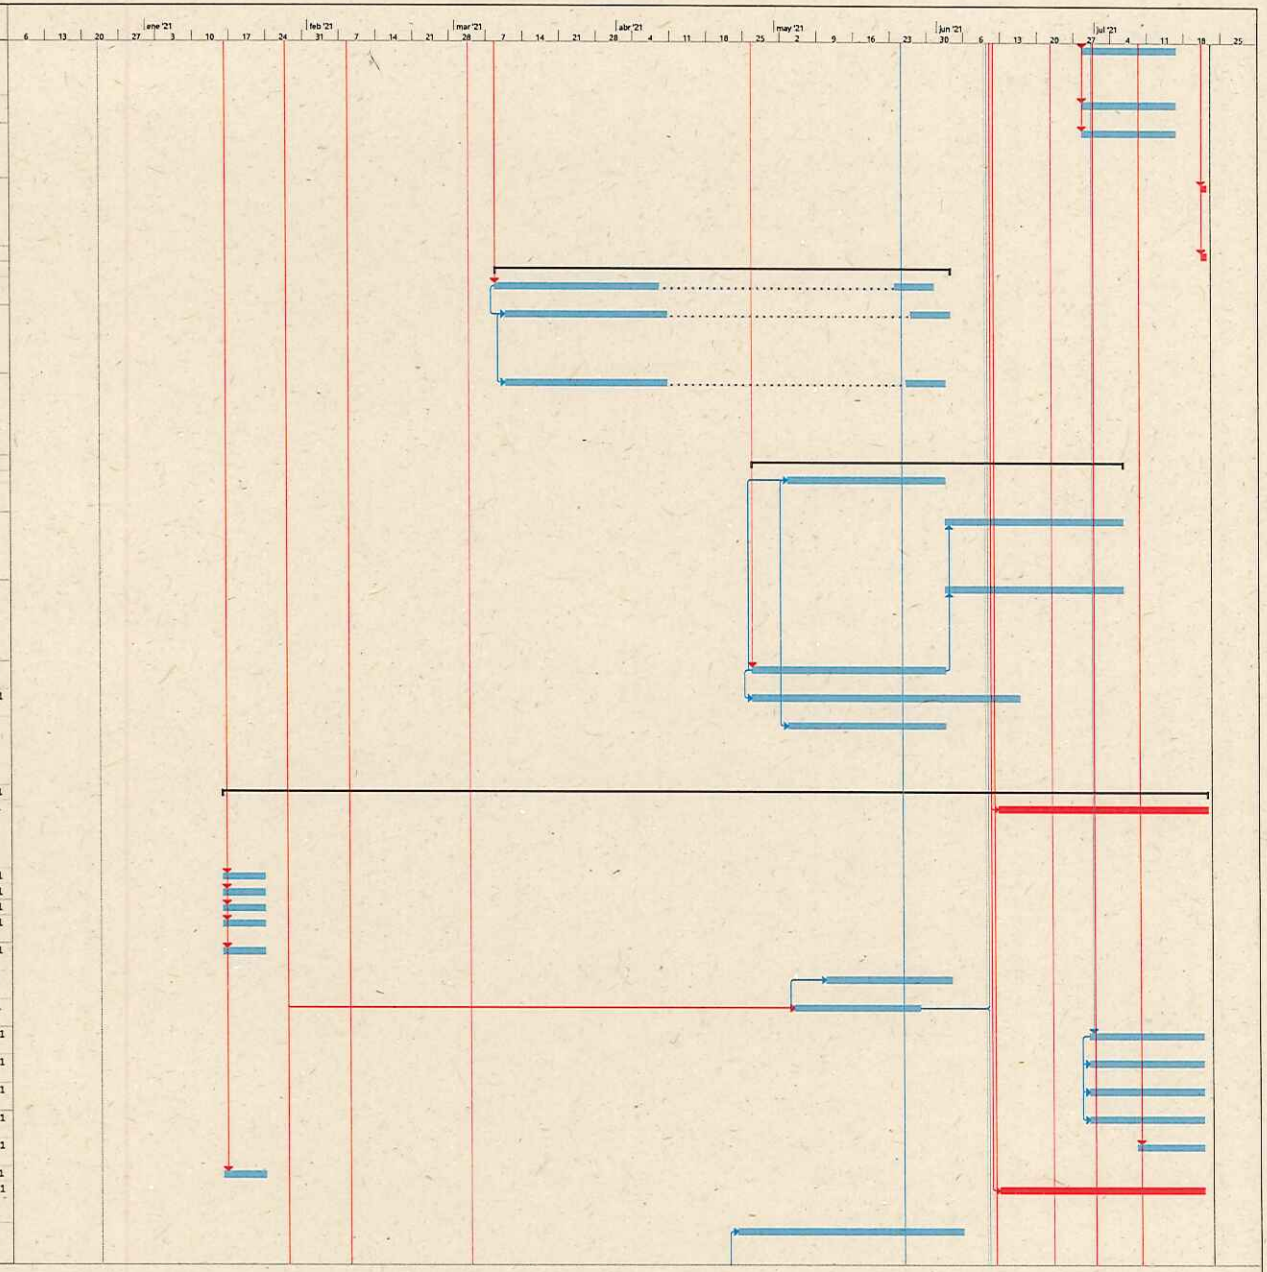

Proyecto: ProyectoPARQUE
Fecha: jue 10/06/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
120		SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
121		SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
122		SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60cm). CON PLAQUETA INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
123		Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.80. NO INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO	10 días	jue 8/07/21	jue 22/07/21
124		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2.44. NO INCLUYE CABLE	20 días	mar 22/06/21	vie 16/07/21
125		Aforamiento Media Tension Ø 6" Galvanizada IMC X 6 METROS	15 días	mar 22/06/21	lun 12/07/21
126		Empalme Resina 91B1(1*4) Suministro e Intalación	20 días	mar 22/06/21	vie 16/07/21
127		BRAZO SENCILLO LUMINARIA SUM.MONT E INST.	15 días	mar 22/06/21	lun 12/07/21
128		Suministro e instalacion de Fotocelda	15 días	mar 22/06/21	lun 12/07/21
129		CONECTOR DE PERFORACIÓN (SUM+INT)	20 días	mar 22/06/21	vie 16/07/21
130		CABLE 2#12 AWG COBRE, ALIMENTACION POSTES (SUM+INSTAL)	15 días	mar 22/06/21	lun 12/07/21
131		FUSIBLE NH CON SOPORTE (SUM+INSTAL)	20 días	mar 22/06/21	vie 16/07/21
132		Conectores bimetalicos para transicion de aluminio	20 días	mar 22/06/21	vie 16/07/21
133		Tuberia PVC Ø 3/4" Conduit + Accesorios**	20 días	mar 22/06/21	vie 16/07/21
134		LUMINARIA S1 MB - MAXIMO M 25 V14 NW 48 LEDS 60W 700mA 8.900 lm	15 días	mié 30/06/21	mié 21/07/21
135		LUMINARIA SLC S 5 NW 24 LED 32W 150 Ma 4.400 lm	15 días	mié 30/06/21	mié 21/07/21
136		LUMINARIA SLC S 5 NW 24 LED 32W 150 Ma 5.300 lm	15 días	mié 30/06/21	mié 21/07/21
137		LUMINARIA SLC S 5 NW 24 LED 32W 150 Ma 5.800 lm	15 días	mié 30/06/21	mié 21/07/21
138		LUMINARIA SLCS V25 NW 24 4000 K 56W	15 días	mié 30/06/21	mié 21/07/21
139		SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE RED BT SUBTERRANEA 3X185mm2 + 1X120mm2 AL PARA REDES BT. (INCLUYE CABLE, CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR)	15 días	mié 30/06/21	mié 21/07/21
140		SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE RED BT SUBTERRANEA 3X120mm2 + 1X120mm2 AL PARA REDES DE BT. (INCLUYE CABLE, CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR)	15 días	mié 30/06/21	mié 21/07/21
141		SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE RED BT SUBTERRANEA 3X25mm2 (6AWG Cu) AL PARA AP. (INCLUYE CABLE, CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR)	15 días	mié 30/06/21	mié 21/07/21
142		FUSIBLE RAPIDO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN BARRAJE DE BAJA TENSIÓN	16 días	mié 30/06/21	jue 22/07/21
143		TUBERIA PVC 1/2" PARA ACOMETIDAS SUBTERRANEAS A CASA	16 días	mié 30/06/21	jue 22/07/21
144		CABLE 3X8 +1 X#10 AWG Cu PARA ACOMETIDAS SUBTERRANEAS A CASA	16 días	mié 30/06/21	jue 22/07/21
145		tuberia conduí 6 de 6	40 días	lun 24/05/21	mié 14/07/21
146		TRANSFORMADOR EVENTUALMENTE SUMERGIBLE 75kVA, CAJA DE MANIOBRAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10 días	mié 7/07/21	mié 21/07/21
147		SEÑALETICA Y PLACAS MOJONES	7 días	lun 12/07/21	mié 21/07/21
148		JUEGOS RESORTADOS ADICIONALES	15 días	jue 10/06/21	mar 29/06/21
149		**B) ACCESO_LA_PERLA**	**127,13 días**	**lun 8/02/21**	**vie 16/07/21**
150		**PAVIMENTOS**	**119,13 días**	**lun 8/02/21**	**jue 8/07/21**
151		NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	65 días	sáb 13/02/21	mié 26/05/21
152		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	65 días	lun 8/02/21	jue 13/05/21
153		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	65 días	lun 8/02/21	jue 13/05/21
154		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	65 días	sáb 13/02/21	mié 26/05/21
155		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	65 días	jue 18/02/21	lun 31/05/21
156		LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No incluye Acero, Curado, Juntas)	10 días	mié 23/06/21	mié 7/07/21
157		CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	10 días	mié 23/06/21	mié 7/07/21

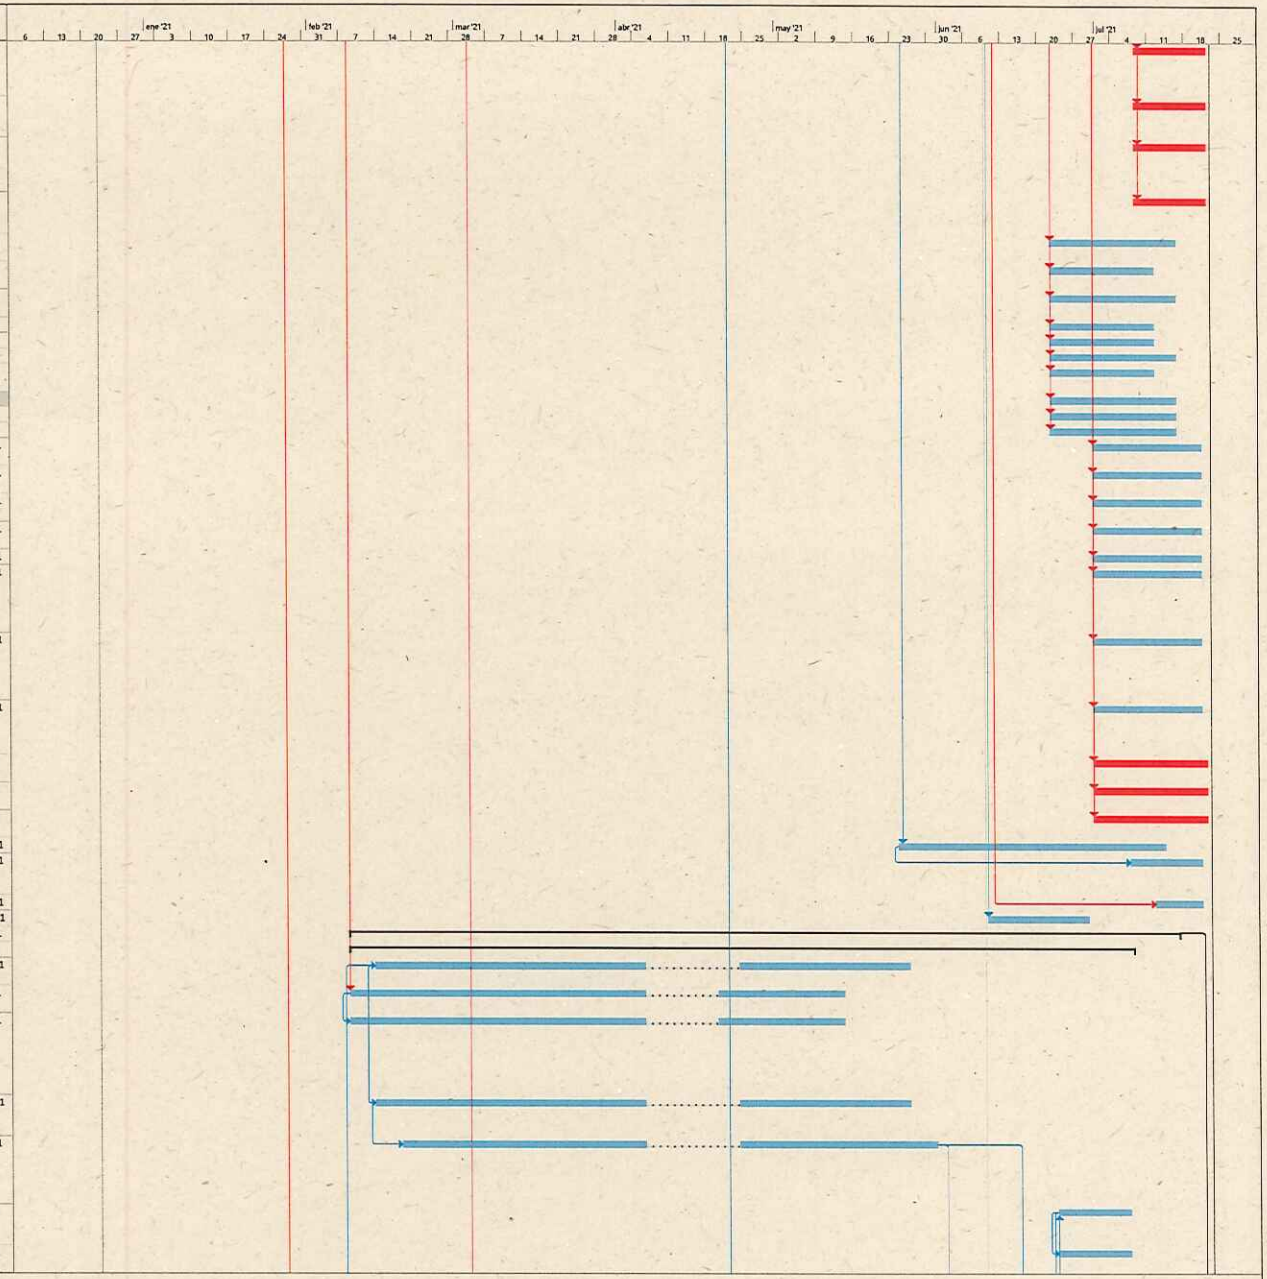

Proyecto: ProyectoPARQUE
Fecha: jue 10/06/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
158		CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	10 días	jue 24/06/21	jue 8/07/21
159		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	10 días	jue 24/06/21	jue 8/07/21
160		ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	10 días	jue 24/06/21	jue 8/07/21
161		CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	5 días	mié 16/06/21	mar 22/06/21
162		CAÑUELA TIPO A 120 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI)	15 días	mié 2/06/21	mar 22/06/21
163		**ESPACIO PÚBLICO**	**35 días**	**mié 2/06/21**	**vie 16/07/21**
164		BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm. Mortero de Nivelación 2000 PSI)	15 días	mié 2/06/21	mar 22/06/21
165		PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TACTIL ALERTA O A56 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4 cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	20 días	mar 22/06/21	vie 16/07/21
166		ESCALERA PARA ANDEN ACABADO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO ANCHO HUELLA 0.35M X LARGO VARIABLE (Suministro e instalación. Incluye concreto 3000 PSI, formaleta y refuerzo)	20 días	mar 22/06/21	vie 16/07/21
167		FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e=10 CM ANCHO ENTRE 12-20 CM	20 días	mar 22/06/21	vie 16/07/21
168		**REDES HUMEDAS**	**71 días**	**lun 19/04/21**	**vie 16/07/21**
169		**REDES DE ACUEDUCTO**	**15 días**	**vie 23/04/21**	**mié 12/05/21**
170		ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESOBIOS. LONGITUD PROMEDIO =6.5MT).	15 días	vie 23/04/21	mié 12/05/21
171		**ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**71 días**	**lun 19/04/21**	**vie 16/07/21**
172		SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB	25 días	mié 16/06/21	vie 16/07/21
173		TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO/INTERIOR LISO U.M, Norma NTC 3722-1, D=10" (incluye suministro e instalación).	15 días	vie 14/05/21	mié 2/06/21
174		EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0 m - 3.5 m (Incluye cargue)	25 días	lun 19/04/21	jue 20/05/21
175		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBF	25 días	lun 19/04/21	jue 20/05/21
176		RELLENO EN ARENA DE PEÑA (Incluye transporte, suministro, extendido manual, y compactación)	15 días	jue 13/05/21	mar 1/06/21
177		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECI	25 días	vie 14/05/21	mié 16/06/21
178		**E) RED PLUVIAL**	**73 días**	**lun 19/04/21**	**mié 21/07/21**
179		**REDES HUMEDAS**	**47 días**	**lun 19/04/21**	**jue 17/06/21**
180		**ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**47 días**	**lun 19/04/21**	**jue 17/06/21**
181		TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO/INTERIOR L	35 días	vie 23/04/21	sáb 5/06/21
182		PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabri	35 días	vie 23/04/21	sáb 5/06/21
183		CILINDRO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D=1,20 m, H=0,5 m, e=0,10m (Incluye suministro e instalación, no incluye aro de ajuste.	35 días	mar 27/04/21	jue 10/06/21
184		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	35 días	mar 4/05/21	jue 17/06/21
185		EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0 m - 3.5 m (Incluye cargue)	35 días	lun 19/04/21	mar 1/06/21
186		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBF	35 días	lun 19/04/21	mar 1/06/21
187		RELLENO EN ARENA DE PEÑA (Incluye transporte, suministro, extendido manual, y compactación)	35 días	jue 22/04/21	vie 4/06/21
188		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECI	35 días	vie 23/04/21	sáb 5/06/21
189		**REDES SECAS**	**11 días**	**mié 7/07/21**	**mié 21/07/21**
190		**NO PREVISTOS**	**11 días**	**mié 7/07/21**	**mié 21/07/21**
191		LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	11 días	mié 7/07/21	mié 21/07/21

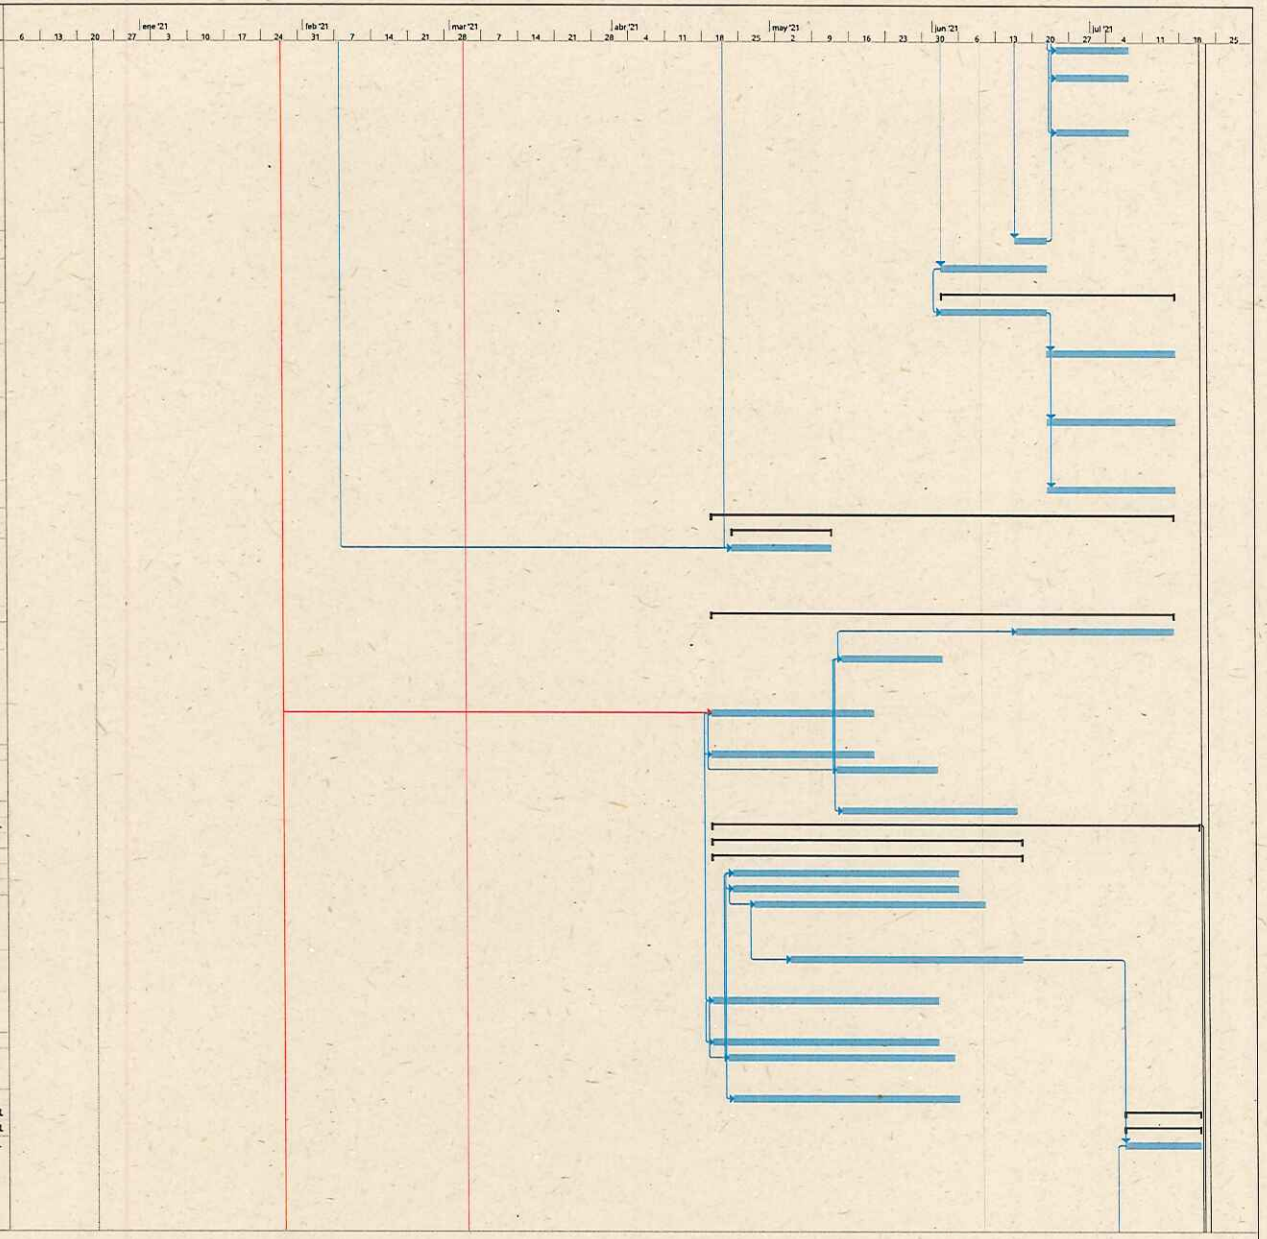

Proyecto: ProyectoPARQUE
Fecha: jue 10/06/21

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
192		INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	11 días	mié 7/07/21	mié 21/07/21
193		**C) ACCESO CR 5**	**109 días**	**mié 3/03/21**	**mié 21/07/21**
194		**PRELIMINARES**	**9 días**	**mié 3/03/21**	**lun 15/03/21**
195		REPLANTEO GENERAL	3 días	mié 3/03/21	sáb 6/03/21
196		CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: Cortadora de concreto incluye operario y combustible incluyendo disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	4 días	lun 8/03/21	jue 11/03/21
197		DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (incluye cargue): No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	4 días	lun 8/03/21	jue 11/03/21
198		DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue): No incluye transporte y disposición final de sobrantes	4 días	lun 8/03/21	jue 11/03/21
199		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	5 días	lun 8/03/21	lun 15/03/21
200		**PAVIMENTOS**	**76 días**	**lun 15/03/21**	**sáb 19/06/21**
201		NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	8 días	mié 17/03/21	lun 29/03/21
202		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	8 días	lun 15/03/21	mié 24/03/21
203		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	8 días	mar 16/03/21	jue 25/03/21
204		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	8 días	vie 19/03/21	mié 31/03/21
205		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	45 días	jue 25/03/21	vie 21/05/21
206		LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	3 días	mié 9/06/21	sáb 12/06/21
207		CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	5 días	sáb 12/06/21	sáb 19/06/21
208		CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	3 días	sáb 12/06/21	jue 17/06/21
209		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	3 días	sáb 12/06/21	jue 17/06/21
210		ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	3 días	mié 9/06/21	sáb 12/06/21
211		ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	5 días	mié 2/06/21	mié 9/06/21
212		CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	5 días	mié 2/06/21	mié 9/06/21
213		CAÑUELA TIPO A 120 (Suministro e instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI)	7 días	mar 25/05/21	mié 2/06/21
214		**ESPACIO PÚBLICO**	**63 días**	**jue 25/03/21**	**mar 15/06/21**
215		EXCAVACIÓN MECANICA PARA MATERIAL COMUN (Incluye cargue)	8 días	jue 25/03/21	mié 7/04/21
216		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	8 días	jue 25/03/21	mié 7/04/21
217		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	8 días	vie 26/03/21	jue 8/04/21
218		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	8 días	mar 30/03/21	sáb 10/04/21
219		BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm. Mortero de Nivelación 2000 PSI)	18 días	sáb 3/04/21	sáb 24/04/21

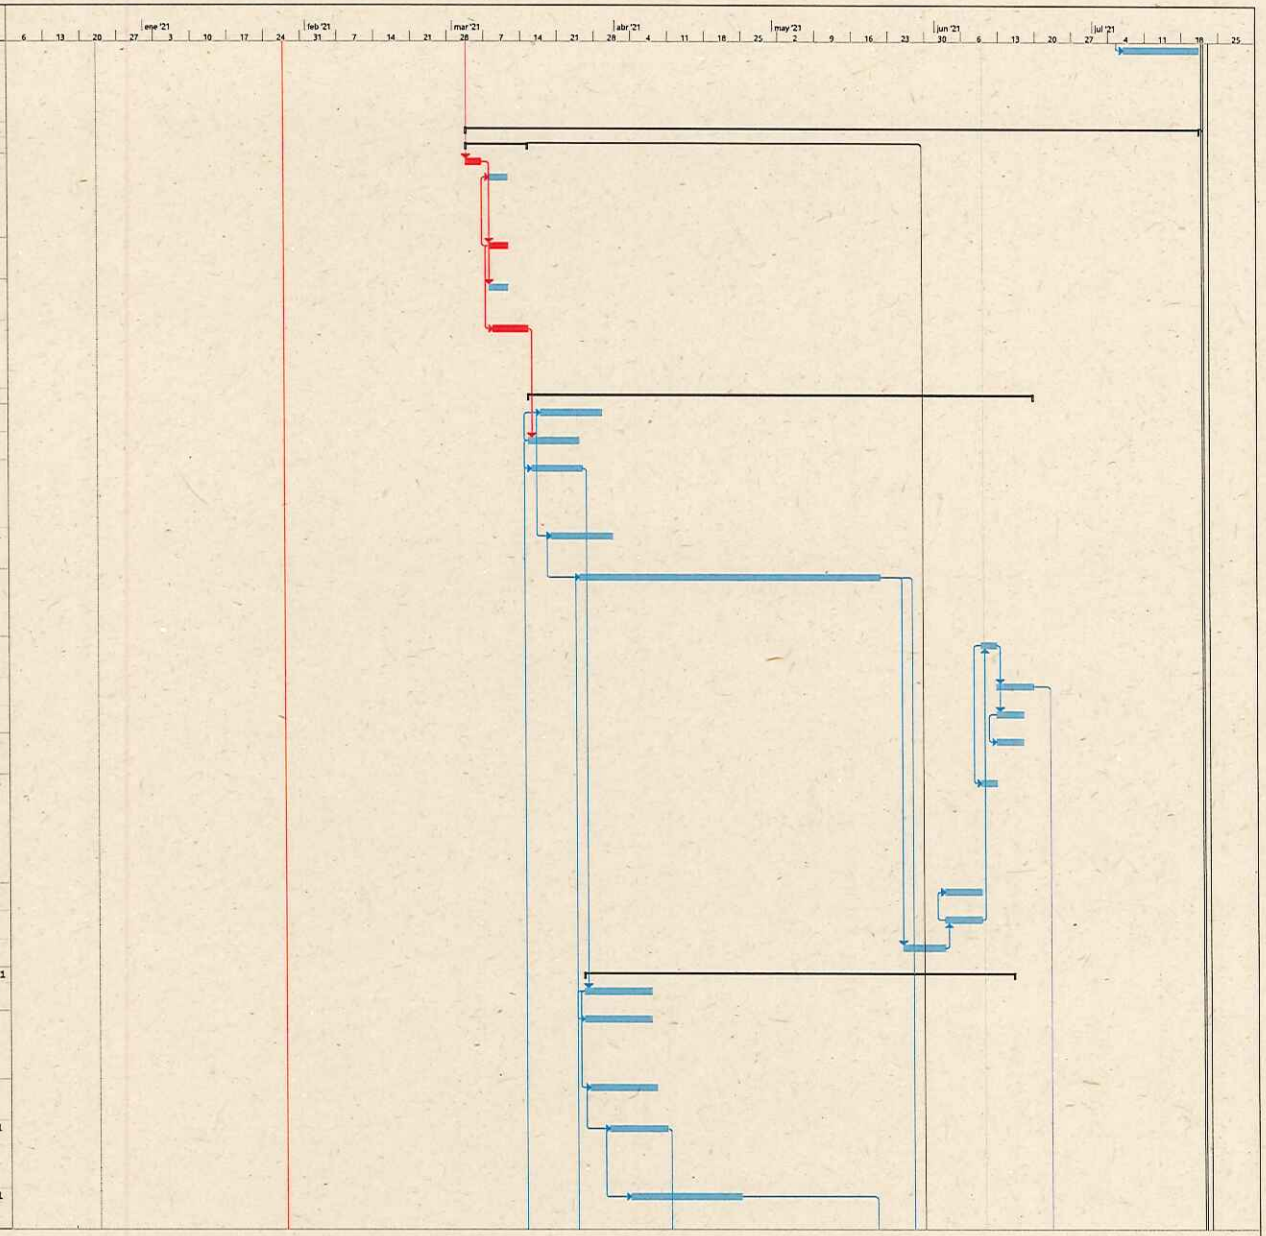


Proyecto: ProyectoPARQUE
Fecha: jue 10/06/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

396


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
220		PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TACTIL ALERTA O A56 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4 cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	20 días	jue 20/05/21	mar 15/06/21
221		FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e=10 CM ANCHO ENTRE 12-20 CM	20 días	jue 20/05/21	mar 15/06/21
222		MOBILIARIO	15 días	mar 22/06/21	lun 12/07/21
223		BARANDA METALICA M81	15 días	mar 22/06/21	lun 12/07/21
224		REDES HUMEDAS	30 días	sáb 8/05/21	mié 16/06/21
225		ALCANTARILLADO PLUVIAL	30 días	sáb 8/05/21	mié 16/06/21
226		SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB	22 días	mié 19/05/21	mié 16/06/21
227		TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO/INTERIOR LISO U.M, Norma NTC 3722-1, D=10" (incluye suministro e instalación).	4 días	lun 10/05/21	vie 14/05/21
228		EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0 m - 3.5 m (Incluye cargue)	7 días	sáb 8/05/21	mar 18/05/21
229		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 km). A distancia mayor del acarreo libre (90m),en sitio autorizado por la entidad ambiental competente.	7 días	sáb 8/05/21	mar 18/05/21
230		RELLENO EN ARENA DE PEÑA (Incluye transporte, suministro, extendido manual, y compactación)	4 días	lun 10/05/21	vie 14/05/21
231		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	4 días	lun 10/05/21	vie 14/05/21
232		REDES SECAS	45 días	lun 26/04/21	mar 22/06/21
233		RED ENERGIA ELECTRICA	15 días	lun 26/04/21	vie 14/05/21
234		CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.	15 días	lun 26/04/21	vie 14/05/21
235		CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m.	15 días	lun 26/04/21	vie 14/05/21
236		RED ETB	20 días	jue 27/05/21	mar 22/06/21
237		1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	10 días	jue 27/05/21	mié 9/06/21
238		RETIRO DE RED AÉREA (Incluye transporte y disposición de sobrantes)	20 días	jue 27/05/21	mar 22/06/21
239		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	10 días	jue 27/05/21	mié 9/06/21
240		NO PREVISTOS	80 días	sáb 10/04/21	mié 21/07/21
241		ADOQUIN CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A-26 (20X10X6). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4 cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA	15 días	mar 22/06/21	lun 12/07/21
242		PISO EN LOSETA PREFABRICADA A20. Suministro e Instalación. Incluye Base 4 cm mortero 1:5 y Arena de Sello)	15 días	mar 22/06/21	lun 12/07/21
243		Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD) NO INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO.	30 días	sáb 10/04/21	mar 18/05/21
244		SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	3 días	lun 12/07/21	mié 14/07/21
245		LUMINARIA SLCS 11 V25 NW 24 LEDS 55W 150mA 7,400 lm	7 días	lun 12/07/21	mié 21/07/21
246		LUMINARIA S1 MB - MAXIMO M 25 V14 NW 48 LEDS 60W 700mA 8.900 lm	7 días	lun 12/07/21	mié 21/07/21
247		D) SENDERO PEATONAL CALLE 163	41 días	sáb 29/05/21	jue 22/07/21
248		PRELIMINARES	15 días	sáb 29/05/21	vie 18/06/21
249		REPLANTEO GENERAL	3 días	sáb 29/05/21	mié 2/06/21
250		DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Incluye cargue)	12 días	mié 2/06/21	vie 18/06/21
251		DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Inclu	12 días	mié 2/06/21	vie 18/06/21
252		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO	12 días	mié 2/06/21	vie 18/06/21
253		ESPACIO PÚBLICO	34 días	mié 2/06/21	jue 15/07/21
254		EXCAVACIÓN MECANICA PARA MATERIAL COMUN (Incluye cargue)	12 días	mié 2/06/21	vie 18/06/21
255		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO	12 días	mié 2/06/21	vie 18/06/21
256		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	4 días	vie 18/06/21	mié 23/06/21

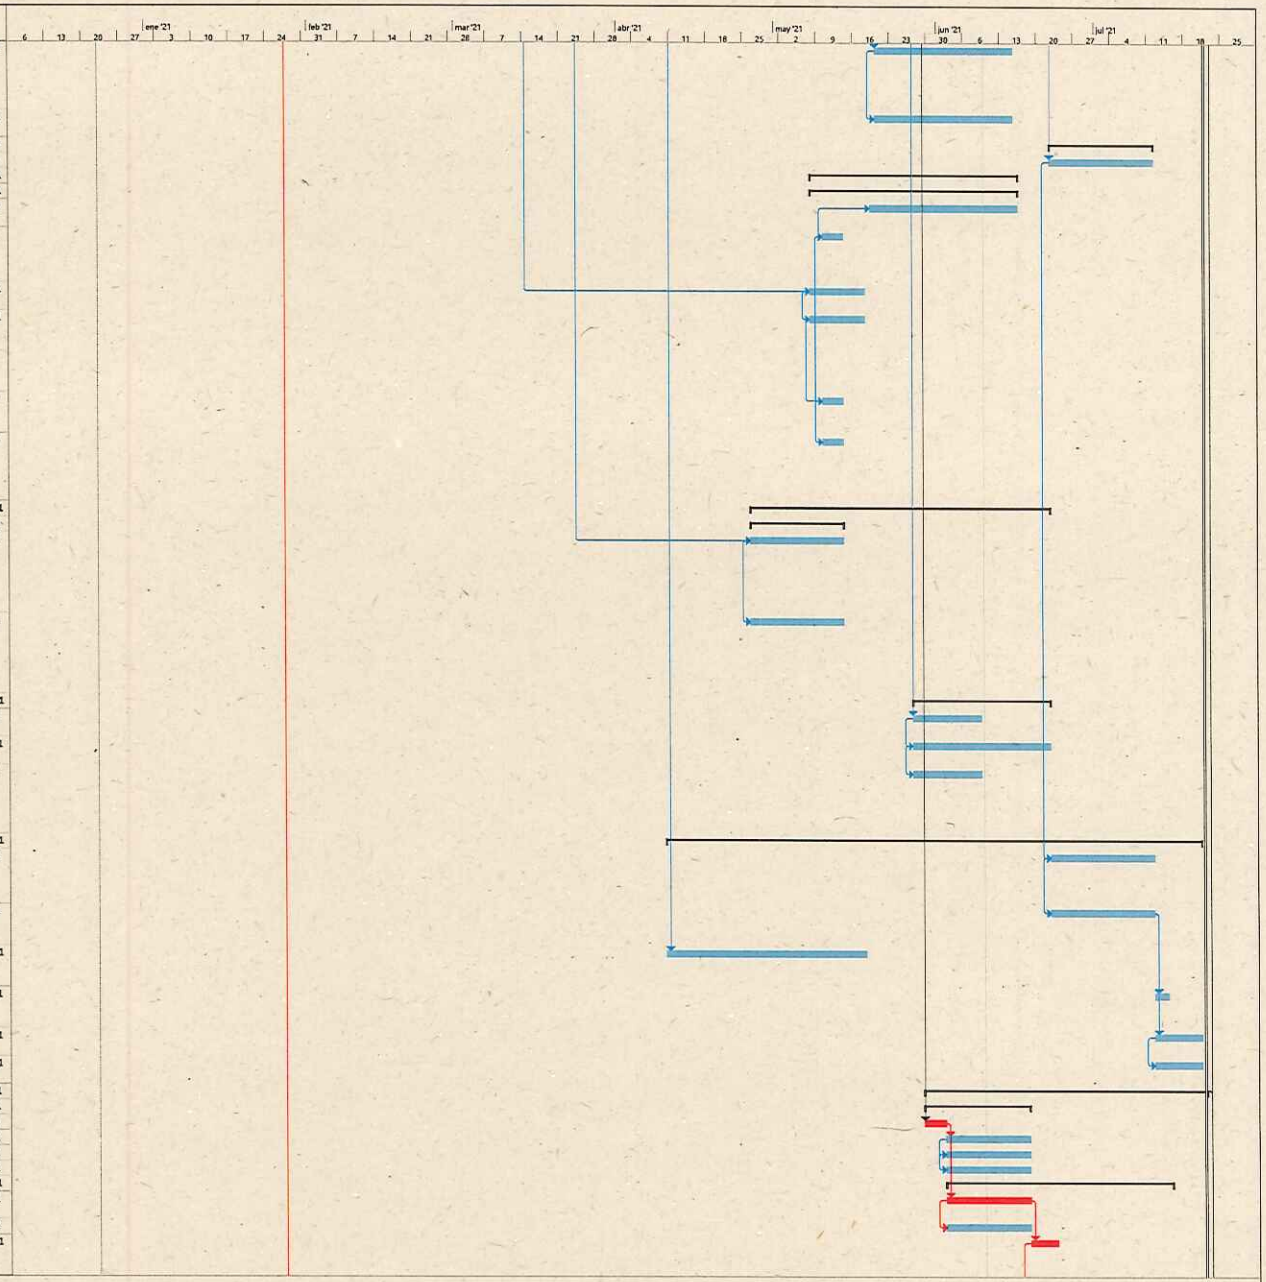

Proyecto: ProyectoPARQUE
Fecha: jue 10/06/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
257		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	5 días	vie 18/06/21	jue 24/06/21
258		BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm. Mortero de Nivelación 2000 PSI)	7 días	jue 24/06/21	vie 2/07/21
259		PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TACTIL ALERTA O A56 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4 cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	10 días	vie 2/07/21	jue 15/07/21
260		FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e=10 Cr	10 días	vie 2/07/21	jue 15/07/21
261		MOBILIARIO	10 días	vie 2/07/21	jue 15/07/21
262		BARANDA METALICA M81	10 días	vie 2/07/21	jue 15/07/21
263		NO PREVISTOS	14 días	vie 2/07/21	jue 22/07/21
264		ADOQUIN CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A-26 (20X10X6). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4 cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA	13 días	vie 2/07/21	mié 21/07/21
265		PISO EN LOSETA PREFABRICADA A20. Suministro e Instalación. Incluye Base 4 cm mortero 1:5 y Arena de Sello)	14 días	vie 2/07/21	jue 22/07/21
266		F) RED SANITARIA	83 días	mié 7/04/21	mié 21/07/21
267		REDES HUMEDAS	57 días	mié 7/04/21	jue 17/06/21
268		ALCANTARILLADO SANITARIO	57 días	mié 7/04/21	jue 17/06/21
269		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (incluye cargue, transporte y disposición final).	45 días	mié 7/04/21	mar 1/06/21
270		Tubería PVC U.M EXT CORRUGADO/INTERIOR LISO U.M, Norma NTC 3722-1, D=6" (Incluye suministro e instalación).	45 días	vie 9/04/21	jue 3/06/21
271		PLACA DE FONDO D=1,70 m, POZO DE INSPEC (Fundida en sitio, Incluye Suministro, Formaleta, Refuerzo, Instalación, Incluye concreto 2000 psi de base)	45 días	vie 16/04/21	vie 11/06/21
272		CILINDRO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D=1,20 m, H=0,5 m, e=0,10m (Incluye suministro e instalación, no incluye aro de	45 días	lun 19/04/21	mar 15/06/21
273		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	45 días	mié 21/04/21	jue 17/06/21
274		DEMOLICIÓN DE POZOS, CAJAS Y CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (Incluye martillo neumático de 60 lb, compresor y cargue)	45 días	sáb 10/04/21	vie 4/06/21
275		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 km). A distancia mayor del acarreo libre (90m),en sitio autorizado por la entidad ambiental competente.	45 días	sáb 10/04/21	vie 4/06/21
276		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	45 días	sáb 10/04/21	vie 4/06/21
277		NO PREVISTOS	81 días	vie 9/04/21	mié 21/07/21
278		Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	45 días	sáb 10/04/21	vie 4/06/21
279		Tubería d=8" 200MM NOVAFORT (SIN EXCAVAC)**	45 días	vie 9/04/21	jue 3/06/21
280		KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC	37 días	vie 9/04/21	mar 25/05/21
281		RETIRO TUBERIA EXISTENTE	37 días	sáb 10/04/21	mié 26/05/21
282		LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	6 días	mar 13/07/21	mié 21/07/21
283		INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	6 días	mar 13/07/21	mié 21/07/21
284		FIN DEL PROYECTO	0 días	jue 22/07/21	jue 22/07/21

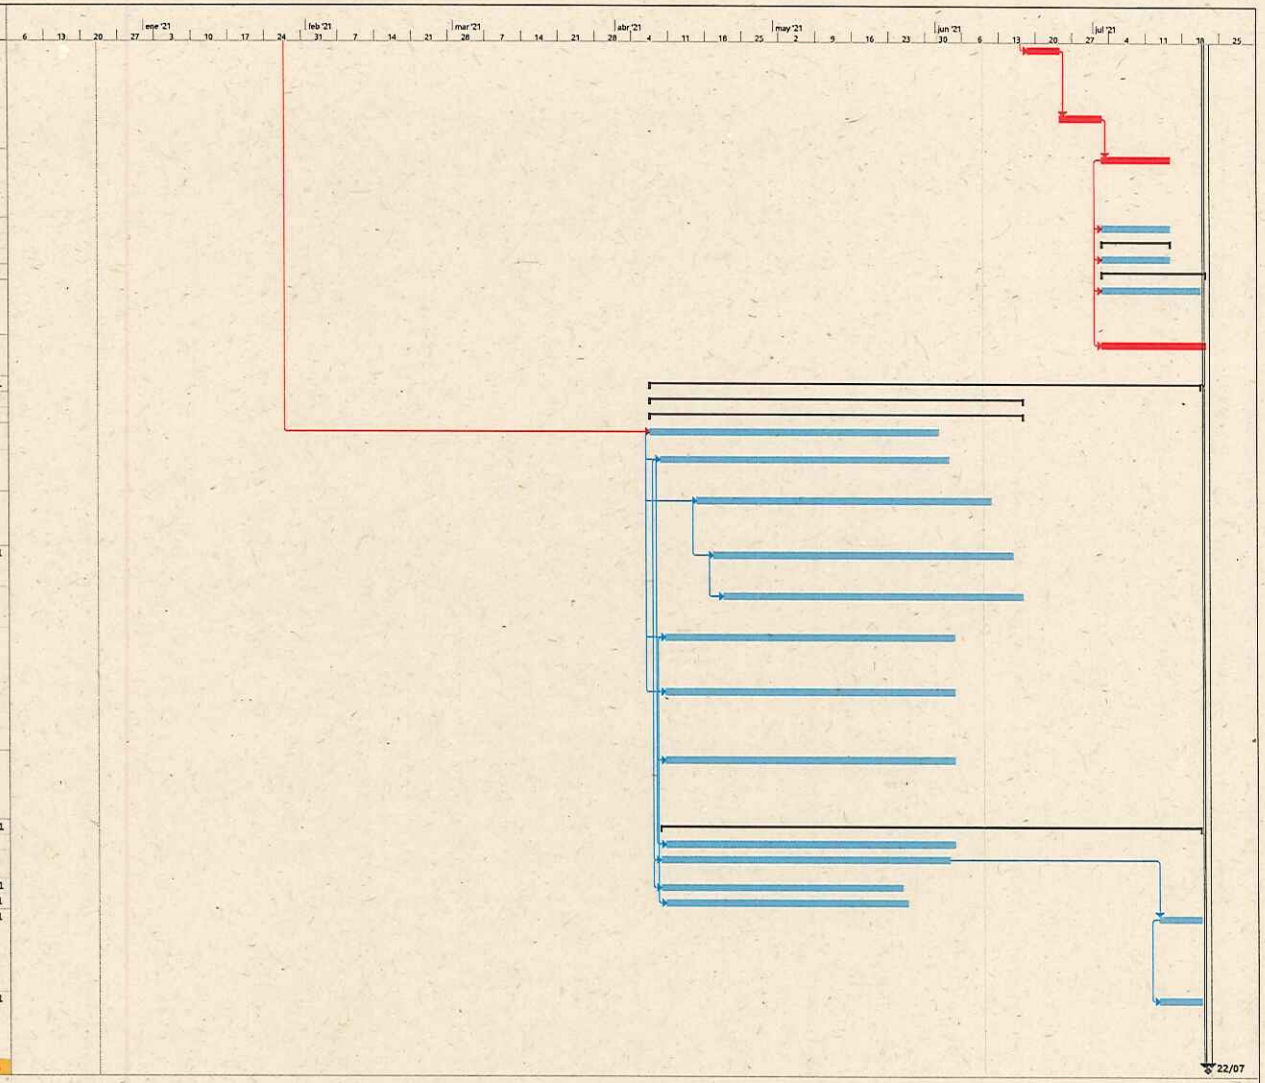

Proyecto: ProyectoPARQUE
Fecha: jue 10/06/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

ANEXO 10

TRAZABILIDAD DE MATERIALES GENERALES

	CONSORCIO SAN JUAN 003		TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020	CONTRATISTA:	Inditeco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No:	780 de 2020	CONTRATISTA:	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :			1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021

Remisión	Fecha de ingreso	Tipo de material	Unidad	Cantidad	Disposición		Lote/Trazabilidad	Peso aproximado kg/mt	Proveedor	Nota bitacora
					Almacenado	Ubicación de instalado				
SA-21-0097	1/06/2021	MALLA TRIPLE TORSION	UND	45	acopio	parque la perla	SA-21-0097	N/A	INCOLMALLAS SAS	N/A
SA-21-0097	1/06/2021	ALAMBRE NEGRO	KG	50	acopio	parque la perla	SA-21-0097	N/A	INCOLMALLAS SAS	N/A
23879	5/06/2021	CINTA AMARILLA	ROLLO	3	acopio	parque la perla	23879	N/A	N/A	N/A
511	8/06/2021	JUEGO 30X30	UND	1	acopio	parque la perla	511	N/A	POSTES METALICOS TEQUENDAMA	N/A
10182853	9/06/2021	BLOQUE DE CEMENTO CT12	UND	625	acopio	parque la perla	10182853	N/A	TITAN	N/A
512	10/06/2021	JUEGO AP 280	UND	3	acopio	parque la perla	512	N/A	POSTES METALICOS TEQUENDAMA	N/A
512	10/06/2021	JUEGO TELEFORMAR DOBLE	UND	2	acopio	parque la perla	512	N/A	POSTES METALICOS TEQUENDAMA	N/A
512	10/06/2021	JUEGO TELEFORMAR SENCILLO	UND	5	acopio	parque la perla	512	N/A	POSTES METALICOS TEQUENDAMA	N/A
00023893	11/06/2021	BARRERA	UND	12	acopio	parque la perla	00023893	N/A	PLASTEMPACK	N/A
00023893	11/06/2021	TELA AZUL 2MT	ROLLO	1	acopio	parque la perla	00023893	N/A	PLASTEMPACK	N/A
195987734	12/06/2021	CEMENTO	KG	5000	acopio	parque la perla	195987734	N/A	CEMEX	N/A
1574	15/06/2021	TAPA POZO D:70	UND	5	acopio	parque la perla	1574	N/A	REFRAPLAS	N/A
1083929	16/06/2021	SUPERDECK 2"	UND	9	acopio	parque la perla	1083929	N/A	METAZA	N/A
67157	16/06/2021	TUBO ALCANTARILLADO 8"	UND	3	acopio	parque la perla	67157	N/A	ALIATUBOS SAS	N/A
