HOSPITAL MILITAR CENTRAL

**FORMATO**
**INFORME SEMANAL OBRA CIVIL**

**AERA DE INFRAESTRUCTURA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA N°** | 1 | **DEL:** | 31/05/2021 (dd/mm/yyyy) | **AL:** | 3/06/2021 (dd/mm/yyyy) |
| **CONTRATO Nº** | 102-2021 | **CONTRATISTA:** | INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS | | |
| **OBJETO:** | ADECUACION E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA AREAS DE FACTURACION TRIANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL | | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 26/05/2021 (dd/mm/yyyy) | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 10/07/2021 (dd/mm/yyyy) | | |

**1- ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ejecución** | x | **Prorroga** | | **Aclaraciones técnicas** | |
| **Suspendido** | | **Adición** | | **Cambio de especificación** | |

**Observaciones:** NINGUNA

**2- RECURSOS DEL CONTRATISTA**

| Ensayos, Diseños y Otros | | Materiales en Obra | | Equipos en Obra | | Personal en la Obra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | Obs/Resultado | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad |
| Diseño divisiones en vidrio preliminar | | | | | | Ingeniero | 1 |
| | | | | | | Mestro de Obra | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 2 |

**3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN**

| EJECUCIÓN SEMANAL | EJECUTADO ACUMULADO | PROGRAMADO SEMANAL | PROGRAMADO ACUMULADO | ATRASO (-) ADELANTO | DIAS Atraso/Adelanto | VALOR ATRASO/ADELANTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,000 | $ 0,00 |

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA


| AVANCE | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**4- PLAZO (DÍAS)**

| CANT. DÍAS | Total | Transcurrido | Faltantes |
|---|---|---|---|
| Contractual | 60 | 4,00 | 56,00 |

**5- REGISTRO FOTOGRAFICO**



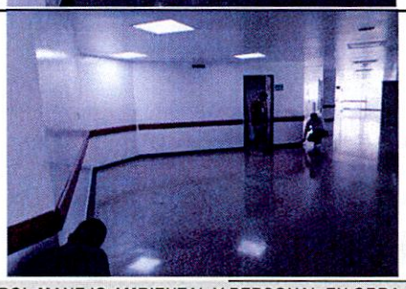

**6- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

ANALISIS DE DISEÑOS PREVIOS Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO, REALIZACION DE PLANOS Y RENDER PRELIMINARES PREVISTOS PARA LA APROBACION.

**7- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO**

| Actividad atrasada | Atribuible al contratista? | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SI | | NO | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**8- JUSTIFICACIÓN: ATRASO O ADELANTO DE ACTIVIDADES:**

**9- CONTROL DE COSTOS**

| Detalle | Presupuesto | |
|---|---|---|
| | INICIAL | ACTUAL |
| Directos+AIU+IVA | $ 94.512.393,00 | $ 94.512.393,00 |
| Obras Adicionales | | |
| TOTAL | | 94.512.393,0 |

**10- CONTROL MANEJO AMBIENTAL Y PERSONAL EN OBRA**

| Actividad | Observaciones |
|---|---|
| Manejo ambiental | SIN OBSERVACION |
| Seguridad industrial | SE ESTUDIARON LOS EPPS MATERIALES Y SEÑALIZACION |
| Programa de salud ocupacional | SE ENVIA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD |
| Plan de Calidad | NO APLICA |

**11- EL CLIMA DURANTE EL PERIODO FUE ASI:** SIN NOVEDAD

**12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

SE ESPECIFICAN EN LOS DISEÑOS PLANTEADOS LAS DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA FABRICACION DEL VIDRIO.

| Elaboró: | Revisó: |
|---|---|
| **JUAN MANUEL NOVOA**<br>**Representante Legal**<br>Firma y posfirma | **MAYOR NELSON MOSSOS CHAVEZ**<br>**Supervisor HOMIL/JEFE DE UNIDAD APOYO LOGISTICO**<br>Firma y posfirma |
