HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO
INFORME SEMANAL OBRA CIVIL

AERA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA Nº 5 **DEL:** 25/06/2021 dd/mm/yyyy **AL:** 1/07/2021 dd/mm/yyyy

CONTRATO Nº 102-2021 **CONTRATISTA:** INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS

OBJETO: ADECUACION E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA AREAS DE FACTURACION TRIANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FECHA DE INICIACIÓN: 26/05/2021 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** 10/07/2021 dd/mm/yyyy

1- ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Ejecución	X	Prorroga		Aclaraciones técnicas	
Suspendido		Adición		Cambio de especificación	

Observaciones: NINGUNA

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
Diseño	Puestos de trabajo	Tub. Electrica	8	Herramienta menor	3	TECNICO ELECT.	1
		Tub. Electrica	7	Taladro Percutor	1	INSPECTORA SISO	1
		cable #12	900	Sonda eléctrica	2	ING RESIDENTE	2
		cable utp	500			AYUDANTE ELECT.	1
						TOTAL	5

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO	DIAS Atraso/Adelanto	VALOR ATRASO/ADELANTO
10,00%	30,00%	5,00%	30,00%	0,00%	0,00	$ 0,00

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					
EJECUTADO																					

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	60	25,00	35,00

5- REGISTRO FOTOGRAFICO










6- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE REALIZA LA CORRECTA INSTALACION DE CAJAS DE PASO INDEPENDIENTES, LA INSTALACION DEL CABLE LIBRE DE ALOGENO # 12 EN LA EN LOS PISOS 3 Y 5 (TABLERO REGULADO PISO 3) , PISO 6 Y 7 (TABLERO REGULADO PISO 7) , PISOS 9 Y 10 (TABLERO REGULADO PISO 7). ADEMAS SE REALIZA LA INSTALACION DEL CABLE UTP CAT6A LSZH VOZ Y DATOS EN EL PISO 6 Y 7 (SERVIDOR PISO 7), PISO 3 Y 5 (SERVIDOR PISO 3), PISO 9 Y 10 (SERVIDOR PISO 9 EN DESARROLLO) LO ANTERIOR SE REALIZA BAJO LAS INDICACIONES DADAS POR PARTE DEL INGENIERO JORGE PUERTO ENCARGADO DE INFORMATICA Y EL INGENIERO JOHAN ENCARGADO DE LA PARTE ELECTRICA.

7- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	

8- JUSTIFICACIÓN: ATRASO O ADELANTO DE ACTIVIDADES:

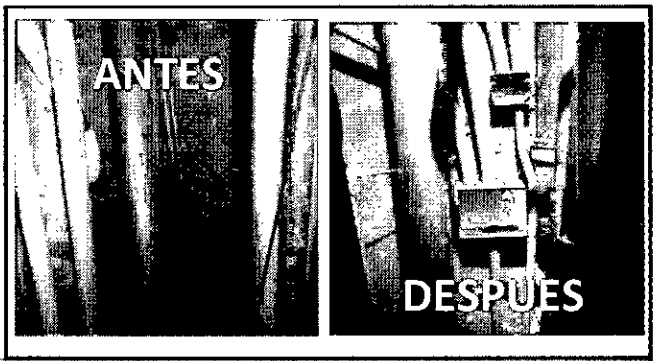

9- CONTROL DE COSTOS			10- CONTROL MANEJO AMBIENTAL Y PERSONAL EN OBRA	
Detalle	Presupuesto		Actividad	Observaciones
	INICIAL	ACTUAL	Manejo ambiental	SIN OBSERVACION
Directos+AIU+IVA	$ 94.512.393,00	$ 94.512.393,00	Seguridad industrial	SE PROGRAMA CHARLA DE BIOSIGURIDAD EN CONJUNTO CON LOS INSPECTORES SISO MIEMBROS DEL HOSPITAL MILITAR EN EL PISO 3 PARA EL VIERNES 2 DE JUNIO 9:00 AM.
Obras Adicionales			Programa institucional de las 5 S - órden y aseo	DE ACUERDO A LAS 5S ESTANDARISADAS SE REALIZA DIARIO UNA ORGANIZACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO.
TOTAL		94.512.393,0		
			Plan de Calidad	NO APLICA
11- EL CLIMA DURANTE EL PERIODO FUE ASI:			SIN NOVEDAD	

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REDEFINIÓ LA ENERGIA REGULADA DE LOS PISOS 9 Y 10 DESDE EL PISO 7 DADA LAS CONDICIONES PRESENTES EN EL PISO 9, LO ANTERIOR EN ACUERDO CON EL ING JHOHAN. SE TIENEN EN CUENTA LAS DIMENSIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SERÁN UBICADOS DENTRO DE LOS TRIANGULOS CENTRALES ASÍ COMO LA DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS. SE PREVEE LA INTERVENCION DE LOS PISOS 11 Y 12 EL LUNES 5 DE JULIO YA QUE SE CUENTA CON EL PERMISO DE INGRESO Y LA CHARLA DE BIOSEGURIDAD IMPARTIDA POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL PROGRAMADA PARA EL VIERNES 9:00 AM EN PRESENCIA DE LA INSPECTORA SISO.

Elaboró:	Revisó:
JUAN MANUEL NOVOA **Representante Legal** Firma y posfirma	**MAYOR NELSON MOSSOS CHAVEZ** **Supervisor HOMIL/JEFE DE UNIDAD APOYO LOGISTICO** Firma y posfirma
