HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO
INFORME SEMANAL OBRA CIVIL

AERA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N° 6 **DEL:** 2/07/2021 dd/mm/yyyy **AL:** 8/07/2021 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 102-2021 **CONTRATISTA:** INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS

OBJETO: ADECUACION E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA AREAS DE FACTURACION TRIANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FECHA DE INICIACIÓN: 26/05/2021 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** 10/07/2021 dd/mm/yyyy

1- ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Ejecución	x	Prorroga	x	Aclaraciones técnicas	
Suspendido		Adición		Cambio de especificación	

Observaciones: NINGUNA

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		cable utp	500	Herramienta menor	5	TECNICO ELECT.	1
		Perfileria Aluminio	35	Taladro Percutor	2	INSPECTORA SISO	1
		Siliconas	5	Sonda eléctrica	2	ING RESIDENTE	2
		Tornilleria	6	Cortadora Aluminio	1	AYUDANTE ELECT.	1
				Taladro Electrico	3	INSTALADOR VIDRIO	2
				Laser	1		
						TOTAL	7

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO	DIAS Atraso/Adelanto	VALOR ATRASO/ADELANTO
21,00%	51,00%	15,00%	45,00%	6,00%	3,60	$ 5.670.743,58

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA


AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					
EJECUTADO																					

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	60	25,00	35,00

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



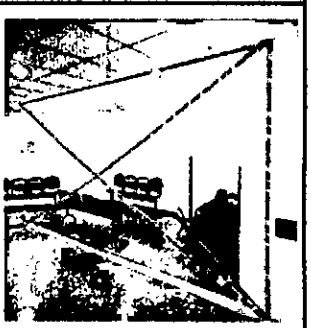





6- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE PROCEDE A REALIZAR EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE LAS DIVISIONES DE VIDRIO PARA LOS PISOS 3, 5 , 6 Y 7. PARA LO CUAL SE UTILIZARON LOS EQUIPOS PERTINENTES PARA SU CORRECTA INSTALACION, TALES COMO LASER Y NIVELES DE PRESICION, SE DISPUSO ADEMAS UN LUGAR DE TRABAJO PARA EL CORTE DE LOS PERFILES Y ESCUADRAS EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO POR ORDEN DEL SARGENTO PRIMERO ARLES RIOS CON EL FIN DE GENERAR EL MENOR RUIDO DENTRO DE LA TORRE CENTRAL EL CUAL AFECTE AL PERSONAL Y PACIENTES DENTRO DEL MISMO. SE REALIZARON ADEMAS LABORES PARACOMPLETAR EL CABLEADO DE DATOS DEL PISO 3 A 5 Y 9 Y 10.

7- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	

8- JUSTIFICACIÓN: ATRASO O ADELANTO DE ACTIVIDADES:





9- CONTROL DE COSTOS			10- CONTROL MANEJO AMBIENTAL Y PERSONAL EN OBRA	
Detalle	Presupuesto		Actividad	Observaciones
	INICIAL	ACTUAL	Manejo ambiental	SIN OBSERVACION
Directos+AIU+IVA	$ 94.512.393,00	$ 94.512.393,00	Seguridad industrial	Se realizó inspección locativa en el área de trabajo, pausas activas, charlas de 5 minutos cómo uso adecuado de las herramientas eléctricas con el objetivo de evitar cualquier situacion de riesgo al personal de trabajo durante sus labores. Señalizacion de los pisos donde se instaló la estructura del vidrio.
Obras Adicionales			Programa institucional de las 5 S - orden y aseo	relacionado con la fase 2 de las 5S se realiza una limpieza de material restante en las areas de trabajo.
TOTAL		94.512.393,0	Plan de Calidad	NO APLICA
11- EL CLIMA DURANTE EL PERIODO FUE ASI:			SIN NOVEDAD	

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE AVANCE DE CORTE Y ESTRUCTURACIÓN DE MONTAJE DURANTE EL PUENTE FESTIVO CON EL PERMISO OTORGADO POR EL MAYOR MOSSOS CON EL FIN DE ADELANTAR LABORES, LO CUAL FAVORECIÓ EN GRAN PARTE A AVENCE DE OBRA DEBIDO A QUE EL FLUJO DE PERSONAS Y DE PACIENTES EN LOS PISOS INTERVENIDOS FUE MUCHO MENOR AL QUE SE PRESENTA DURANTE LA SEMANA.

Elaboró:

JUAN MANUEL NOVOA
Representante Legal
Firma y posfirma

Revisó:

MAYOR NELSON MOSSOS CHAVEZ
Supervisor HOMIL/JEFE DE UNIDAD APOYO LOGISTICO
Firma y posfirma
