Villanueva de Todos	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación **No. 1002 de 2021**, MUNICIPIO DE **VILLANUEVA – LA GUAJIRA**

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO DE 2021

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA (LA GUAJIRA)			
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	CRA 15A #2-25 – ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA.			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.250.000.000,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 1.250.000.000,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	06-May-2021			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	28-Feb-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	28-Feb-2022	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	**OSCAR MARTINEZ CUADRADO**		**DESDE:** 31-May-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
	N/A	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA	
	N/A	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
	RAFAEL EDUARDO SALAS RODRÍGUEZ	31-May-2021		
	N/A	DD-MES-AAAA		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	DD-MES-AAAA		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3014874	24-May-2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31-May-2021			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	N/A	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	N/A	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	N/A	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
	N/A	**FECHA:** DD/MM/AAAA		
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	**FECHA:** 24/05/2021-CUMPLIMIENTO			

Escaneado con CamScanner

(Vigencia nueva del amparo)	**N/A**	
	N/A	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	83.333.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$	0
VALOR DE OBRA	$	1.041.667.000
VALOR INTERVENTORÍA	$	83.333.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$	0

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: 2. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO 3. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto, en la cual el Municipio se compromete, con sustento en lo socializado, a entregar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseño y Ejecución de obra, así como el de interventoría.	NO APLICA	30/06/2021	$ 300.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI), junto con la presentación de 2. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio interadministrativo. 3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la	NO APLICA	NO HA SIDO PAGADO	$ 250.000.000,00

Escaneado con CamScanner

	ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario.			
TERCER DESEMBOLSO	**1.** previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de ejecución de la obra, la cual debe incluir. **2.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. **3.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. **4.** Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	90%	NO HA SIDO PAGADO	$ 500.000.000,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	1. previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de.	100%	NO HA SIDO PAGADO	$ 200.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 300.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3014874	Cumplimiento	$ 250.000.000,00	14/05/2021	31/08/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra (Adjudicado)***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato:	N/A		
Link de Consulta:	N/A		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		N/A
	PRÓRROGA	N/A	

Escaneado con CamScanner

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha Inicial de terminación del contrato	N/A	**Fecha Actual de terminación del contrato**	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$
COMPAÑÍA ASEGURADORA	N/A		
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra (Adjudicado)***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato:	N/A		$
Link de Consulta:			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	N/A		NIT
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		N/A
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha Inicial de terminación del contrato	N/A	**Fecha Actual de terminación del contrato**	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO:			N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	N/A		
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A		
	N/A		

5. INFORME TECNICO

INTRODUCCION	Se firma un convenio interadministrativo celebrado entre la nación-Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Villanueva (La Guajira), cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA (LA GUAJIRA)", de este convenio de derivan dos contratos, el de estudio, diseño y obra y

Escaneado con CamScanner

	el de interventoría, posterior a la adjudicación de los contratos derivados viene la etapa de ejecución, esta tiene dos partes, la primera corresponde al estudio y diseño, al hacer entrega de los documentos requeridos viene la ejecución de la obra, en las dos etapas están integradas con la interventoría respectiva.
GENERALIDADES	- Se dio acta de inicio el 31 de mayo de 2021 - Se inicio el proceso precontractual de los estudios, diseño y obra el día 18 de junio de 2021 - Se recibió el primer desembolso el 30 de junio de 2021.

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra (sin contratar)***

CONTRATO DE OBRA N° XXX de 20XX	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO EJECUTADO:	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	
OBSERVACIONES:	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra (sin contratar)***

CONTRATO DE OBRA N° XXX de 20XX	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO EJECUTADO:	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	
OBSERVACIONES:	

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE

- ***Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***


NOMBRE	CARGO

Escaneado con CamScanner

- ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

ACTA N°	% EJECUCION	EGRESO N°	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO		ACUMULADO
					AMORTIZADO	SALDO	
TOTALES							

GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

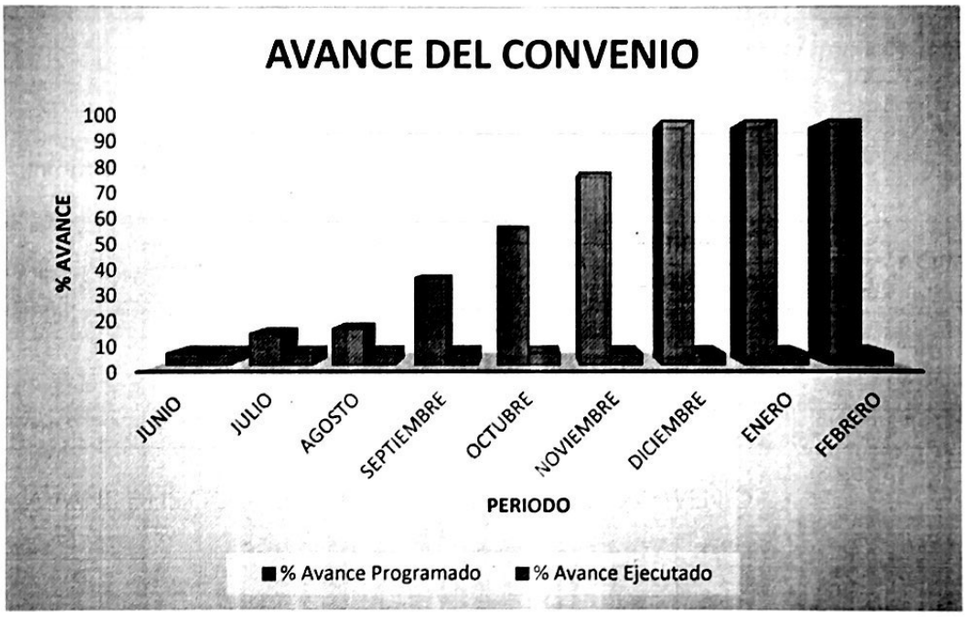

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	**VISITAS TECNICAS**	**EJECUTADO**	**%**
	N/A		
	OBSERVACIONES:		

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	N/A

Escaneado con CamScanner

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

N/A					

8. SUPERVISOR

OSCAR MARTINEZ CUADRADO Supervisor del Convenio Secretario de Planeación e Infraestructura	**RAFAEL EDUARDO SALAS RODRÍGUEZ** Apoyo a la Supervisión

Escaneado con CamScanner
