Folio 2

76 Folios

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 - CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021 de 2021-02-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

Yopal, 03 de Agosto del 2021.

Doctor(a)
BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTOR(A) TECNICO DE CONSTRUCCIONES
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 - CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021 de 2021-02-24.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 26/05/2021 hasta 25/06/2021.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (5) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2021-02-26

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2021-07-25

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-07-25

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $25.132.800,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $25.132.800,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 25/06/2021, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 presenta una ejecución del 80% contra una programada del 100%.

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 - CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021 de 2021-02-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$25.132.800,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$25.132.800,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 2	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 3	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
PRESENTE INFORME	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
POR EJECUTAR	$5.026.560,00		
TOTAL	$25.132.800,00	$0,00	$20.106.240,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: $5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1 Realizar la revisión y verificación de las especificaciones técnicas de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE

2. Realizar evaluación en campo y cuantificación de cantidades en planos y memorias de cálculo de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

3. Realizar visitas técnicas a los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

4. Conceptualizar sobre el análisis de todas las acciones técnicas desarrolladas en vigencia de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

5. Participar en los comités técnicos que adelante el Supervisor a los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE

6. Las demás que considere el supervisor que sean inherentes al objeto contractual.

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 - CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021 de 2021-02-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
1. Realizar la revisión y verificación de las especificaciones técnicas de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. ACTIVIDAD PERMANENTE	80	3.1
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Se revisó las especificaciones tecnicas concernientes al Acta de Ampliación No 1 a la Suspension No 2 de fecha 18 de junio de 2021 del contrato de obra No 2225 de 2019 y contrato de consultoria 2153 de 2019 por un tiempo de un (1) mes.	80	3.1
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. Se devolvio el informe para recibo y liquidacion de obra para poder dar entrega al Municipio de Tauramena, se estan esperando correcciones y aclaraciones.	80	3.1
2. Realizar evaluación en campo y cuantificación de cantidades en planos y memorias de cálculo de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACION AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EOUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. ACTIVIDAD PERMANENTE	80	3.2
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Se realizo evaluación en campo el dia 04 de mayo de 2021, donde se llevo a cabo revisión de la planimetria del diseño y las memorias de calculo entregadas en el informe para acta parcial No 1.	80	3.2
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. Se espera recibir el informe de recibo y liquidación corregido para hacer la evaluacion en campo a la obra respectiva con los planos record y memorias de calculo finales y revisar que la dotación este completa.	80	3.2
3. Realizar visitas técnicas a los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. ACTIVIDAD PERMANENTE.	80	3.3
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA No se realizó visita tecnica a la obra, una vez se reinicie se llevara de acuerdo con la planimetria del diseño.	80	3.3
4. Conceptualizar sobre el análisis de todas las acciones técnicas desarrolladas en vigencia de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN	80	3.4

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 - CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021 de 2021-02-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EOUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. ACTIVIDAD PERMANENTE		
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Se esta recopilando toda la informacion existente para conceptualizar sobre las acciones tecnicas que se han desarrollado y que se desarrollara para la adecuada ejecucion de los trabajos y se esta solicitando la informacion que falta a la interventoria, una vez se reinicie la obra.	80	3.4
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. Una vez la interventoria entregue el informe de recibo de obra corregido se hara la conceptualización tecnica a que hubiere lugar de acuerdo con el informe, planimetria, memorias que sean entregadas.	80	3.4
5. Participar en los comités técnicos que adelante el Supervisor a los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACTÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE. derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. ACTIVIDAD PERMANENTE	80	3.5
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Se hace acompañamiento a 1 comite de obra virtual, donde se define ampliar la suspension que radicaron oficialmente.	80	3.5
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. No se ha hecho acompañamiento a comites de obra.	80	3.5
6. Las demás que considere el supervisor que sean inherentes al objeto contractual. ACTIVIDAD PERMANENTE	80	3.6

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 - CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021 de 2021-02-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

Aprobó:

BRENDA RORAIMA BARRERA
Supervisor(a)

V.ºB.º:

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

FO-AB-55
21-02-2014
V.01

El presente Informe corresponde al periodo de veintiseis (26) de mayo al veinticinco (25) de junio del año 2021

1. DATOS GENERALES CONTRATO PSP No No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021-Y NUMERO INTERNO 0385 DE 2021

Información del Contrato	PSP No. 0385 DE 2021	Plazo Inicial	Cinco (5) meses
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Plazo actual	Cinco (5) meses
Objeto Contractual	Realizar la revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el ánalisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.	Fecha suscripción del contrato	24/02/2021
Valor Contractual	$ 25.132.800,00	Fecha Acta de Inicio	26/02/2021
Valor Inicial	$ 25,132,800.00	Fecha de Terminación inicial	25/07/2021
Aporte Dpto.	$ 25,132,800.00	Fecha Actual de Terminación	25/07/2021
Aporte Ejecutor	$ -	Estado actual del contrato	En ejecución
Valor Adicional	$ -		
Valor Final	$ 25,132,800.00		

2. DATOS TÉCNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☐	RED ALC. SAN / PLUV		ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	PUENTE / ALC / BOX		UN
☐	INFRAESTRUCTURA		SEDE
☐	INTERVENTORIA		UN
☑	OTRO. CUAL?		
	Profesional Contratado	1	UN

RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL

el objeto del proyecto es: Realizar la revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el ánalisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.

DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:

Revision y verificacón y conceptualización proyectos de inversion del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. ACTA DE INICIO	26/02/2021	5 MESES		
2.				

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

		DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE	Contratante	
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Contratista:	
Rep. Legal:		Rep. Legal:	
Contrato No.	0385-2021	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 25,132,800.00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo (0%):	$ -	Valor Anticipo (%):	
Valor Adicionado:	$ -	Valor Adicionado:	
Valor Total:	$ 25,132,800.00	Valor Total:	
Valor Ejecutado:	$ 20,106,240.00	Valor Ejecutado:	
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	
Prorrogas:	N/A	Prorrogas:	
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	
Suspensiones:	N/A	Suspensiones:	
Fecha de Iniciación:	VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE 2021	Fecha de Iniciación:	
Terminación Inicial:	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2021	Terminación Inicial:	
Terminación Actual:	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2021	Terminación Actual:	
Estado Actual Contrato:	EN EJECUCION	Estado Actual Contrato:	

5. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DEL SECTORIAL EQUIPAMIENTO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 2153 DE 2019-11-25 según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
5.1. ACTA DE INICIO	24/01/2020	7 MESES		

3

6

5.2. ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	30/06/2020	2 MESES		*CAUSAS DE SUSPENSION*: SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No 2225 de 2019
5.3. ACTA DE REINICIO No 1	31/08/2020			
5.4 ACTA PARCIAL No 1	2/10/2020		$ 29,471,186	PAGO ETAPA PRECONSTRUCTIVA
5.5. PRORROGA No 1	23/10/2020	2 MESES Y 5 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA*: CONTINUAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019
5.6. PRORROGA No 2	22/12/2020	4 MESES Y 15 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA*: CONTINUAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019
5.7. ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	7/05/2021	45 DIAS		CAUSAS DE SUSPENSION: SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No 2225 de 2019
5.8. ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2	18/06/2021	1 MES		CAUSAS DE AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2: AMPLIACION A LA SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No 2225 de 2019

6. INFORMACION DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 2153 DE 2019, según el caso si aplica.

Tipo de Proceso	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No Proceso	CAS-OPAJ-CMA-033-2019
Tipo de Contrato	CONSULTORIA
Fuentes Financiación:	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
Codigo BPIN:	20180005850005
Registro Presupuestal:	192153 - 02/12/2019 - $ 521,170,434 212153 - 09/03/2021 - $ 491,699,248
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO PLAZA DE MERCADO 2019
Nit No:	901342294-4
Rep. Legal:	DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
Cedula No:	9.431.291 DE YOPAL
Contrato No.	2153 DE 2019-11-25
Objeto:	Interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica a la construcción del Centro de Comercialización Agroempresarial en el Municipio de Villanueva.
Valor Inicial:	$ 521,170,434.00
Valor Anticipo (0 %):	$ -
Valor Adicionado:	$ -
Valor Total:	$ 521,170,434.00
Valor Ejecutado:	$ 29,471,186.00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Prorrogas:	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Plazo Actualizado:	TRECE (13) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Suspensiones:	SIETE (7) MAYO DE 2021
Tiempo Suspensión:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2020
Terminación Inicial:	VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Reiniciación:	
Terminación Actual:	VEINTESIETE (27) DE JUNIO DE 2021
Estado Actual Contrato:	SUSPENDIDO

CAS-OPAJ-CMA-033-2019

7. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
7.1. ACTA DE INICIO	12/03/2020	6 MESES		
7.2. ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	30/06/2020	2 MESES		*CAUSAS DE SUSPENSION*: COVID-19, TRABAJOS EN VIA TRONCAL DEL LLANO, CARENCIA DE FORMALETA EN LA REGION.
7.3. ACTA DE REINICIO No 1	31/08/2020			
7.4. PRORROGA No 1	11/11/2020	1 MES Y 15 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA*: COVID-19, TRANCONES EN LA VIA MARGINAL DEL LLANO, CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AEREAS Y LOSAS AEREAS Y NO DAN LOS TIEMPOS DEL FRAGUADO.

7.5. PRORROGA No 2	22/12/2020	4 MESES Y 15 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA:* INCONVENIENTES DE TIPO LOGISTICO QUE HAN GENERADO RETRASOS Y DEMORAS, DEMORA EN ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS POR PARTE DE LAS FERRETERIAS, DISPONIBILIDAD DE FORMALETA DE ENTREPISO.
7.6. ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1	4/01/2021			SE INCORPORARON AL PROYECTO 23 NUEVOS ITEMS NO PREVISTOS.
7.7. ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 1	11/01/2021			SE INCORPORARON LOS ITEMS NUEVOS Y SE BALANCEO EL CONTRATO.
7.8. OTROSÍ MODIFICATORIO No 1	9/03/2021			
7.9. ACTA DE SUSPENSION No 2	7/05/2021	45 DIAS		*CAUSAS DE SUSPENSION:* ESCASEZ DE MATERIALES Y TIEMPOS DE ENTREGA, MATERIAL PETREO, PARO NACIONAL
7.9. ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2	18/06/2021	1 MES		*CAUSAS DE AMPLIACION A LA SUSPENSION:* ESCASEZ DE MATERIALES Y TIEMPOS DE ENTREGA, MATERIAL PETREO, INICIO DE OTROS FRENTES DE TRABAJO (EN GENERAL NO SEAN SUPERAO LAS CAUSALES QUE MOTIVARON LA SUSPENSION No 2).

8. INFORMACION DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019-12-11, según el caso si aplica.

Tipo de Proceso	LICITACIÓN OBRA PÚBLICA
No Proceso	CAS-OAJ-LP-034-2019
Tipo de Contrato	OBRA
Fuentes Financiación:	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR
Codigo BPIN:	2018005850005
Registro Presupuestal:	192225 13/12/2019 $ 6,340,387,359 212225 09/03/2021 $ 3,170,193,679
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO AGROCENTRO VILLANUEVA
Nit No:	901347418-3
Rep. Legal:	ANDRES HERLIMAN TRIANA BLANCO
Cedula No:	74,857,606 de Yopal
Contrato No.	2225 DE 2019
Objeto:	Construcción del Centro de Comercialización Agroempresarial en el Municipio de Villanueva.
Valor Inicial:	$ 6,340,387,359.00
Valor Anticipo (50 %):	$ 3,170,193,679.50
Valor Adicionado:	$ -
Valor Total:	$ 6,340,387,359.00
Valor Ejecutado:	$ -
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Prorrogas:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	DOCE (12) MESES
Suspensiones:	SIETE (7) DE MAYO DE 2021
Tiempo Suspensión:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	12 DE MARZO DE 2020
Terminación Inicial:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Fecha de Reiniciación:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2020
Terminación Actual:	VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2021
Estado Actual Contrato:	SUSPENDIDO

CAS-OAJ-LP-034-2019

9.PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA : 36.39% % PROGRAMACION OBRA: 95.26%

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Durante el periodo 26 de mayo al 25 de junio de 2021 se llevo a cabo por parte del profesional contratado las siguientes actividades:

El dia 18 de junio de 2021 se suscribio el Acta de Ampliación a la Suspension No 2 del contrato de obra No 2225 de 2019 y del 2153 de 2019, estó debido a que aun no se han solucionado la mayoria de causales que ocasionaron la Suspension No 2 y quedaron establecidas las siguientes causales: ***escasez de materiales y tiempos de entrega:*** ya que las ferreterias no pueden dar cumplimiento con las entregas de los pedidos. ***Material Petreo:*** las graveras con las que cuenta la obra para materiales como arenas, triturados, base, sub base entre otros. ***Inicio de otros frentes de trabajo:*** debido a que los frentes de trabajo requieren para sus actividades material petreo no es posible tener frentes en otras actividades
esperando que esto se subsane se suspende por 1 mes, con fecha de reiniciacion estimada para el dia 20 de julio de 2021.

se evidencia un atraso del 58,87% el cual una vez se reinicie se solicitara a la interventoria CONSORCIO PLAZA MERCADO 2019 exija al contratista de obra CONSORCIO AGROCENTRO VILLANUEVA, un ***PLan de Contigencia,*** con el fin de llevar a cabo la ejecucion del objeto contratado: Construcción del Centro de Comercialización Agroempresarial en el Municipio de Villanueva.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

FO-AB-55
21-02-2014
V.01



11. REGISTRO FOTOGRÁFICO (Estado en el que quedaron las estructuras ejecutadas) (DESCRIPCION).



Foto 1 vista panoramica plaza



Foto 2 Vista panoramica Plaza muros, vigas y pisos



Foto 3 vista panoramica plaza



Foto 4 Vista panoramica Plaza muros, vigas y pisos

12. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☐ NO ☐
CUALES? : _____
HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐

CAUSALES?: _____

SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☐ NO ☐
PORQUE? la obra esta en ejecución
REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐
PORQUE?

11. OBSERVACIONES

EL CONTRATO DE OBRA Y DE CONSULTORIA ESTAN EN EJECUCIÓN.

12. FIRMAS

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
APOYO A LA SUPERVISION
C.P.S Nro. 0385-2021

Vo.Bo. SUPERVISOR
BRENDA RORAIMA BARRERA
Directora Técnica de Construcciones

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

FO-AB-55
21-02-2014
V.01

El presente Informe corresponde al periodo de veintiseis (26) de mayo al veinticinco (25) de junio del año 2021

1. DATOS GENERALES CONTRATO PSP No No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021-Y NUMERO INTERNO 0385 DE 2021

Información del Contrato	PSP No. 0385 DE 2021	Plazo Inicial	Cinco (5) meses
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Plazo actual	Cinco (5) meses
Objeto Contractual	Realizar la revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el ánalisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.	Fecha suscripción del contrato	24/02/2021
Valor Contractual	$ 25.132.800,00	Fecha Acta de Inicio	26/02/2021
Valor Inicial	$ 25,132,800.00	Fecha de Terminación inicial	25/07/2021
Aporte Dpto.	$ 25,132,800.00	Fecha Actual de Terminación	25/07/2021
Aporte Ejecutor	$ -	Estado actual del contrato	En ejecución
Valor Adicional	$ -		
Valor Final	$ 25,132,800.00		

2. DATOS TÉCNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☐	RED ALC. SAN / PLUV		ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	PUENTE / ALC / BOX		UN
☐	INFRAESTRUCTUR		SEDE
☐	INTERVENTORIA		UN
☑	OTRO. CUAL?		
	Profesional Contrata	1	UN

RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL

el objeto del proyecto es: Realizar la revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el ánalisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.

DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:

Revision y verificacón y conceptualización proyectos de inversion del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. ACTA DE INICIO	26/02/2021	5 MESES		
2.				

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

		DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE	Contratante	
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Contratista:	
Rep. Legal:		Rep. Legal:	
Contrato No.	0385-2021	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 25,132,800.00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo (0%):	$ -	Valor Anticipo (%):	
Valor Adicionado:	$ -	Valor Adicionado:	
Valor Total:	$ 25,132,800.00	Valor Total:	
Valor Ejecutado:	$ 20,106,240.00	Valor Ejecutado:	
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	
Prorrogas:	N/A	Prorrogas:	
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	
Suspensiones:	N/A	Suspensiones:	
Fecha de Iniciación:	VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE 2021	Fecha de Iniciación:	
Terminación Inicial:	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2021	Terminación Inicial:	
Terminación Actual:	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2021	Terminación Actual:	
Estado Actual Contrato:	EN EJECUCION	Estado Actual Contrato:	

5. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DEL SECTORIAL EQUIPAMIENTO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 2681 DE 2017-12-26 según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
5.1. ACTA DE INICIO	1/02/2018	8 MESES		
5.2. PRORROGA No 1	31/08/2018	2 MESES		
5.3. PRORROGA No 2	14/11/2018	2 MESES		
5.4. PRORROGA No 3	15/01/2019	2 MESES		
5.5. PRORROGA No 4	20/03/2019	2 MESES		
5.6. PRORROGA No 5	29/05/2019	15 DIAS		
5.7. PRORROGA No 6 Y ADICIONAL No 1	14/06/2019	5 MESES	$ 190,327,709	
5.8. PRORROGA No 7	13/11/2019	3 MESES		
5.9. PRORROGA No 8	11/02/2020	4 MESES		
5.10 ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	24/03/2020	1 MES		
5.11 ACTA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	24/04/2020	1 MES		
5.12 ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	24/05/2020	1 MES		
5.13 ACTA DE AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSION No 1	24/06/2020	15 DIAS		
5.14 ACTA DE AMPLIACION No 4 A LA SUSPENSION No 1	10/07/2020	2 MESES		
5.15 ACTA DE REINICIO No 1	10/09/2020			
5.16 PRORROGA No 9	27/11/2020	2 MESES		
5.17 ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	22/12/2020	1 MES		
5.18 ACTA DE REINICIO No 2	21/01/2021			
5.19 PRORROGA No 10	25/01/2021	1 MES		
5.20 ACTA DE TERMINACION	26/03/2021			
5.21.				

6. INFORMACION DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 2681 DE 2017, según el caso si aplica.

Tipo de Proceso	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No Proceso	CAS-OAJ-CMA-040-2017
Tipo de Contrato	CONSULTORIA
Fuentes Financiación:	OTROS RECUSRSOS SFFa
Codigo BPIN:	N.A.
Registro Presupuestal:	1702681 - 28/12/2017 - $ 190,518,227 192681 - 14/06/2019 - $ 190,327,709
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Nit No:	79.799.614-9
Rep. Legal:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Cedula No:	79.799.614 DE BOGOTA
Contrato No.	2681 DE 2017-12-26
Objeto:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental para la adecuación y dotación de la planta de beneficio animal del Municipio de Tauramena, Casanare.
Valor Inicial:	$ 381,036,454.00
Valor Anticipo (50 %):	$ 190,518,227.00
Valor Adicionado:	$ 190,327,709.00
Valor Anticipo (50 %):	$ 95,163,854.50
Valor Total:	$ 571,364,163.00
Valor Anticipo (50 %):	$ 285,682,081.50
Valor Ejecutado:	$ -
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Prorrogas:	VEINTITRES (23) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	TREINTA Y UN (31) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Ultima Suspension:	22 DE DICIEMBRE DE 2020
Tiempo Suspensión:	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	01 DE FEBRERO DE 2018
Terminación Inicial:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Fecha de Reiniciación:	21 DE ENERO DE 2021

CAS-OAJ-CMA-040-2017

Terminación Actual:	26 DE MARZO DE 2021
Estado Actual Contrato:	TERMINADO

7. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE OBRA No 2691 DE 2017-12-27, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
7.1. ACTA DE INICIO	2/04/2018	7 MESES		
7.2. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No 1	17/09/2018			
7.3. PRORROGA No 1	8/10/2018	2 MESES		
7.4. ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 1	22/10/2018			
7.5. OTROSÍ MODIFICATORIO No 1	23/11/2018			
7.6. PRORROGA No 2	10/12/2018	2 MESES		
7.7. PRORROGA No 3	19/02/2019	2 MESES		
7.8. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No 2	21/02/2019			
7.9. PRORROGA No 4	30/04/2019	45 DIAS		
7.10 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 2	27/05/2019			
7.11 ACTA PARCIAL No 1	7/06/2019		$ 2,303,015,121	
7.12 OTROSÍ MODIFICATORIO No 2 PRORROGA No 5 Y ADICIONAL No 1	13/06/2019	4 MESES	$ 2,355,541,640	
7.13 PRORROGA No 6	15/10/2019	3 MESES		
7.14 ACTA PARCIAL No 2	23/12/2019		$ 1,589,509,650	
7.15 PRORROGA No 7	10/01/2020	4 MESES		
7.16 ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	24/03/2020	1 MES		
7.17 ACTA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	24/04/2020	1 MES		
7.18 ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	24/05/2020	1 MES		
7.19 ACTA DE AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSION No 1	24/06/2020	15 DIAS		
7.20 ACTA DE AMPLIACION No 4 A LA SUSPENSION No 1	10/07/2020	2 MESES		
7.21 ACTA DE REINICIO No 1	10/09/2020			
7.22 ACTA PARCIAL No 3	11/09/2020		$ 1,304,804,517	
7.23 PRORROGA No 8	30/10/2020	2 MESES		
7.24 ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	22/12/2020	1 MES		
7.25 ACTA DE REINICIO No 2	21/01/2021			
7.26 PRORROGA No 9	25/01/2021	1 MES		
7.27 ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No 3	9/02/2021			
7.28 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 3	11/02/2021			
7.29 OTROSÍ MODIFICATORIO No 3	17/02/2021			
7.30 ACTA DE TERMINACION	27/02/2021			
7.31.				

Tipo de Proceso	LICITACIÓN OBRA PÚBLICA	
No Proceso	CAS-OAJ-LP-025-2017	
Tipo de Contrato	OBRA	
Fuentes Financiación:	OTROS RECURSOS SFFa	
Codigo BPIN:	N.A.	
Registro Presupuestal:	1702691 29/12/2017 $ 2,357,738,483 17002691 02/01/2018 $ 2,357,738,483	
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE	
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO TAURAMENA 2017	
Nit No:	901141402-0	
Rep. Legal:	LUIS MANUEL ROJAS GIL	
Cedula No:	7,177,539 DE TUNJA	
Contrato No.	2691 DE 2017	
Objeto:	Adecuación y dotación de la planta de beneficio animal del Municipio de Tauramena, Casanare.	
Valor Inicial:	$	4,715,476,966.00
Valor Anticipo (50 %):	$	2,357,738,483.00
Valor Adicionado:	$	2,355,541,640.00
Valor Total:	$	7,071,018,606.00
Valor Ejecutado:	$	5,197,329,288.00
Valor Amortizado:	$	2,598,664,644.00

CAS-OAJ-LP-025-2017

12

Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Prorrogas:	VENTIUN (21) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	VEINTINUEVE (29) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Ultima Suspension:	22 DE DICIEMBRE DE 2020
Tiempo Suspensión:	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	02 DE ABRIL DE 2018
Terminación Inicial:	01 DE NOVIEMBRE DE 2018
Fecha de Reiniciación:	21 DE ENERO DE 2021
Terminación Actual:	27 DE FEBRERO DE 2021
Estado Actual Contrato:	TERMINADO

9.PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA : 86.33% % PROGRAMACION OBRA: 100.00%

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Durante el periodo 26 de mayo al 25 de junio de 2021 se llevo a cabo por parte del profesional contratado las siguientes actividades:

Se esta revisando el informe de Recibo final de obra de la interventoria, con el fin de realizar la Entrega Institucional a la Alcaldia Municipal de Tauramena, asi como dar inicio al recibo de la Adecuacion y Dotacion de la planta de beneficio Animal, se conceptua sobre el informe y se solicita realizar algunas correcciones.







11. REGISTRO FOTOGRÁFICO (Estado en el que quedaron las estructuras ejecutadas) (DESCRIPCION).

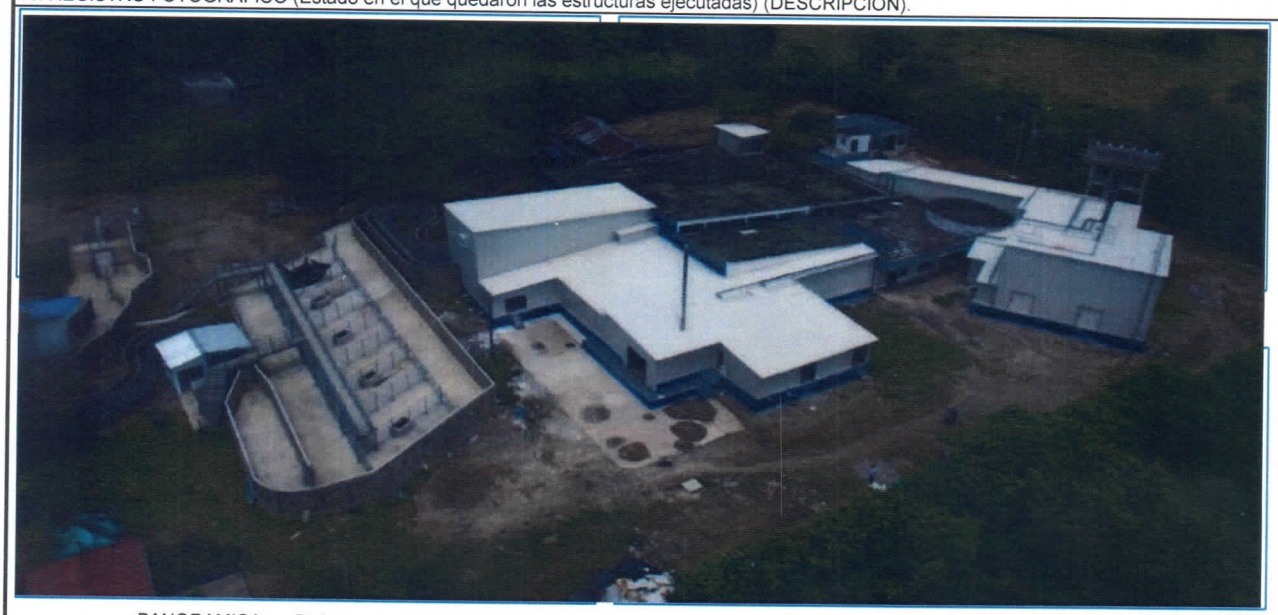


Foto 1 PANORAMICA PLANTA BENEFICIO ANIMAL TAURAMENA (IMAGEN INTERNET)

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

FO-AB-55
21-02-2014
V.01

12. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☐ NO ☐ CUALES? : _____ HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐ CAUSALES?: _____	SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐ PORQUE? _____ REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____ EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐ PORQUE? SE ESTA EPERANDO EL RECIBO DE LA OBRA

11. OBSERVACIONES	12. FIRMAS	
EL CONTRATO DE OBRA Y DE CONSULTORIA ESTAN TERMINADOS.		
	ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES APOYO A LA SUPERVISION C.P.S Nro. 0385-2021	Vo.Bo. SUPERVISOR BRENDA RORAIMA BARRERA Directora Técnica de Construcciones

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79743593
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16	TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7801030744**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1059559316

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 321.700
SUBTOTAL:			1	**$ 321.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 251.400
SUBTOTAL:			1	**$ 251.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 21.000
SUBTOTAL:			1	**$ 21.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 594.100**

15

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79743593
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16	TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7801030744	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021-07-14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1059559316

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 321.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.700	$ 0	$ 321.700
SUBTOTALES:										**$ 321.700**	**$ 0**	**$ 321.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 251.400
SUBTOTALES:													**$ 251.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 251.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.000	$ 21.000	$ 0	$ 0	$ 21.000
SUBTOTALES:									**$ 21.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 21.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79743593	ROJAS ARGUELLES CARLOS MAURICIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.010.624				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.010.624	$ 321.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 321.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.010.624	$ 251.400	$ 0	$ 251.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.010.624	$ 79743593	$ 21.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 594.100**

Planilla Pagada
