
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1058	**1.4.5**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE C**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
1188	**1.4.6**	**INEM SANTIAGO PEREZ SEDE B**	**51 días**	**jue 25/02/21**	**lun 10/05/21**
1309	1.5	DIVISIONES	0 días?	dom 28/03/21	dom 28/03/21
1310	1.6	FIN OBRAS CONTRATADAS	0 días	jue 10/06/21	jue 10/06/21




Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

SEGUIMIENTO A PROGRAMACION DE OBRA MES 3 ITIP


ACUMULADO ANTERIOR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	6,63%	0,66%	-5,97%
PERIODO ACTUAL	4,14%	3,18%	-0,95%
ACUMULADO ACTUAL	10,68%	7,58%	-3,10%

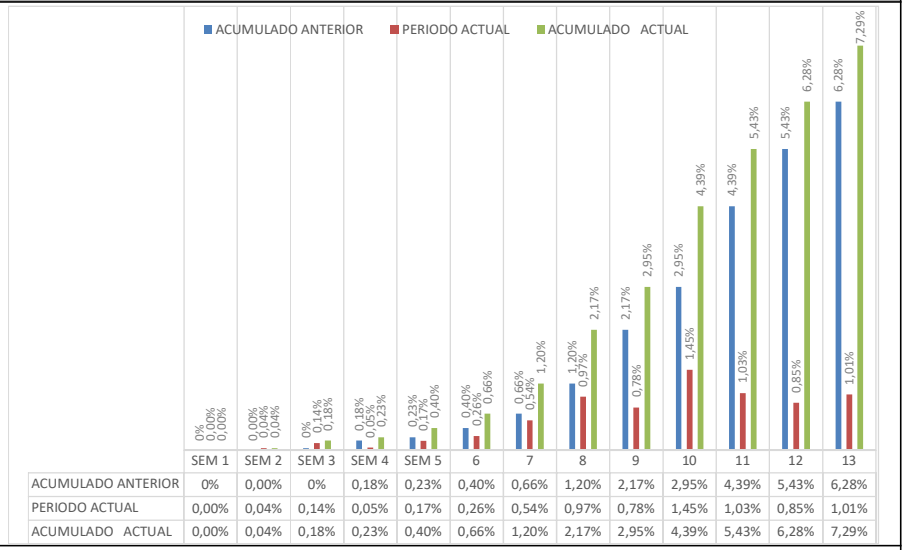

	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACUMULADO ANTERIOR	0%	0,00%	0%	0,18%	0,23%	0,40%	0,66%	1,20%	2,17%	2,95%	4,39%	5,43%	6,28%
PERIODO ACTUAL	0,00%	0,04%	0,14%	0,05%	0,17%	0,26%	0,54%	0,97%	0,78%	1,45%	1,03%	0,85%	1,01%
ACUMULADO ACTUAL	0,00%	0,04%	0,18%	0,23%	0,40%	0,66%	1,20%	2,17%	2,95%	4,39%	5,43%	6,28%	7,29%

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA MES 3


SEMANA	ACUMULADO PROGRAMADO		ACUMULADO EJECUTADO
1	$ 447.296,00		$ 608.104,50
2	$ 2.379.035,00		$ 2.500.246,00
3	$ 3.148.781,00		$ 3.258.900,00
4	$ 5.158.750,00		$ 5.631.258,00
5	$ 9.380.214,00		$ 9.250.799,00
6	$ 16.478.905,00		$ 16.789.523,00
7	$ 37.405.639,00		$ 30.268.714,00
8	$ 64.020.420,00		$ 41.083.335,00
9	$ 92.453.476,00		$ 61.289.752,00
10	$ 123.980.096,00		$ 75.689.437,00
11	$ 143.639.828,00		$ 87.611.005,00
12	$ 148.966.546,00		$ 101.675.128,00
13	$ 150.152.037,00		$ 105.675.128,00

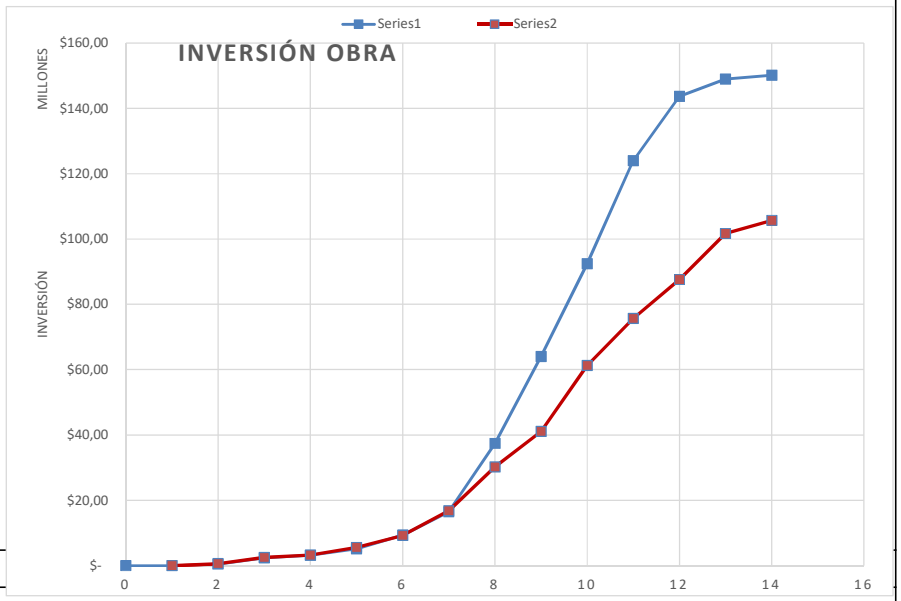

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE	DIFERENCIA
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 148.966.546	10,68%	-3,10%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 105.675.128	7,58%	

NOTA: PARAEL PRESENTE PERIODO SE TENIAN PREVISTAS ENTREGAS DE MATERIALES PARA FABRICACION DE VENTANAS, REJAS Y PISOS AL CIERRE DEL MES DE ABRIL, SI EMABARGO PERSISTE EL PARO NACIONAL QUE GENERO BLOUQEOS DE VIAS IMPIDIENDO DICHAS ENTREGAS, QUE SE ESPERA SE PUEDAN DAR EN LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO, SIN EMBARGO SE ACLARA QUE LAS REJAS QUE YA ESTAN FABRICADAS E INSTALADAS AUN NO SE CONTABILIZAN EN EL AVANCE REPORTADO, TODA VEZ QUE SU PRECIO UNITARIO SE ENECUENTRA EN PROCESO DE PACTACION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**208 días?**	**lun 10/08/20**	**jue 10/06/21**
2	**1.1**	**PRECONSTRUCCION**	**15 días**	**lun 10/08/20**	**lun 31/08/20**
3	1.1.1	VERIFICACION ATERRIZAJE PRESUPUESTAL	15 días	lun 10/08/20	lun 31/08/20
4	**1.2**	**ACTA DE INICIO DE OBRA**	**0 días**	**lun 31/08/20**	**lun 31/08/20**
5	**1.3**	**FASE 1 DE EJECUCION**	**135 días**	**lun 10/08/20**	**mié 24/02/21**
744	**1.4**	**FASE 2 DE EJECUCION (Adicion presupuestal)**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
745	**1.4.1**	**INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO**	**60 días**	**jue 25/02/21**	**lun 24/05/21**
839	**1.4.2**	**IED RAFAEL URIBE URIBE**	**60 días**	**jue 25/02/21**	**lun 24/05/21**
840	1.4.2.1	ADECUACION DE AREAS POR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	7 días	jue 25/02/21	vie 5/03/21
841	1.4.2.2	INICIO DE OBRA - RAFAEL URIBE URIBE	0 días	vie 5/03/21	vie 5/03/21
842	**1.4.2.3**	**OBRAS PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 8/03/21**	**mar 9/03/21**
843	1.4.2.3.	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	2 días	lun 8/03/21	mar 9/03/21
844	**1.4.2.4**	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**	**14 días**	**mié 10/03/21**	**mar 30/03/21**
845	1.4.2.4.	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	4 días	mié 10/03/21	lun 15/03/21
846	1.4.2.4.	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	4 días	mié 10/03/21	lun 15/03/21
847	1.4.2.4.	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	3 días	mar 16/03/21	jue 18/03/21
848	1.4.2.4.	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	3 días	jue 11/03/21	lun 15/03/21
849	1.4.2.4.	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	2 días	mié 10/03/21	jue 11/03/21
850	1.4.2.4.	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	3 días	vie 19/03/21	mié 24/03/21
851	1.4.2.4.	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	lun 29/03/21	mar 30/03/21
852	1.4.2.4.	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	lun 29/03/21	mar 30/03/21
853	1.4.2.4.	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	4 días	mar 23/03/21	vie 26/03/21
854	**1.4.2.5**	**VARIOS - PRELIMINARES**	**3 días**	**lun 29/03/21**	**mié 31/03/21**
855	1.4.2.5.	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	3 días	lun 29/03/21	mié 31/03/21
856	1.4.2.5.	FIN PRELIMINARES	0 días	mié 31/03/21	mié 31/03/21
857	**1.4.2.6**	**CIMENTACION**	**2 días**	**vie 16/04/21**	**lun 19/04/21**
858	**1.4.2.6.**	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**	**2 días**	**vie 16/04/21**	**lun 19/04/21**
859	1.4.2.6.	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	2 días	vie 16/04/21	lun 19/04/21
860	1.4.2.6.	FIN CIMENTACION	0 días	lun 19/04/21	lun 19/04/21
861	**1.4.2.7**	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**	**1 día**	**jue 15/04/21**	**jue 15/04/21**
862	1.4.2.7.	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	1 día	jue 15/04/21	jue 15/04/21

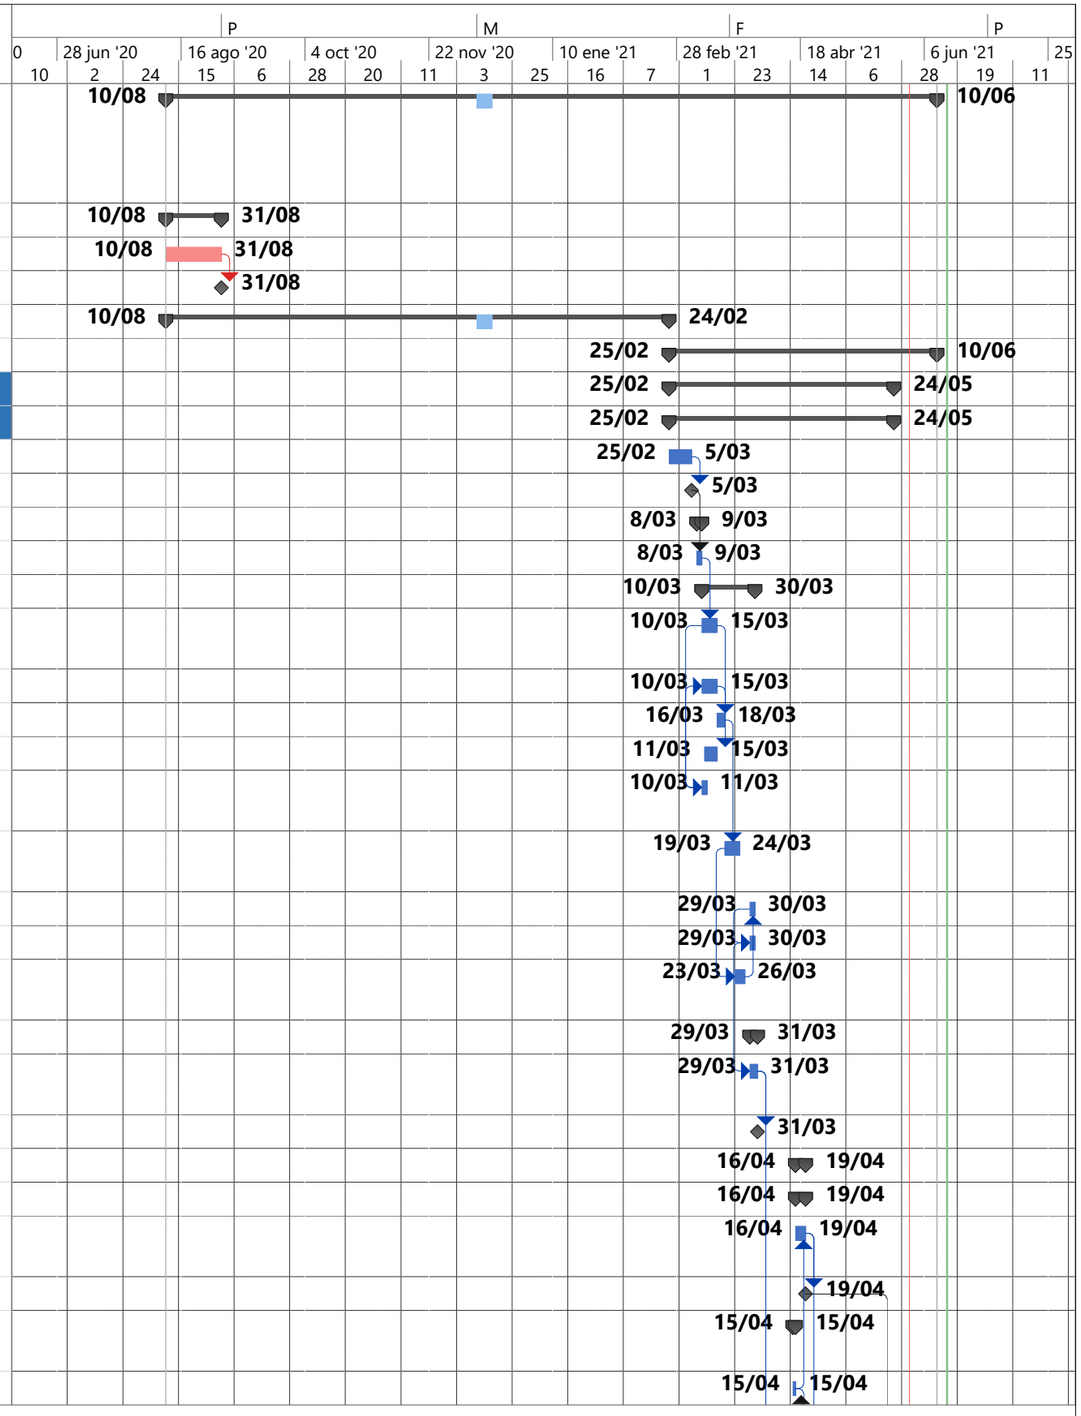

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
863	1.4.2.7..	FIN ACERO DE REFUERZO	0 días	jue 15/04/21	jue 15/04/21
864	**1.4.2.8**	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**	**3 días**	**vie 2/04/21**	**mar 6/04/21**
865	1.4.2.8.	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	3 días	vie 2/04/21	mar 6/04/21
866	1.4.2.8..	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	3 días	vie 2/04/21	mar 6/04/21
867	1.4.2.8..	FIN DESAGUES	0 días	mar 6/04/21	mar 6/04/21
868	**1.4.2.9**	**MAMPOSTERIA**	**2 días**	**mar 20/04/21**	**mié 21/04/21**
869	**1.4.2.9.**	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**	**2 días**	**mar 20/04/21**	**mié 21/04/21**
870	1.4.2.9.	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	2 días	mar 20/04/21	mié 21/04/21
871	1.4.2.9.	FIN MAMPOSTERIA	0 días	mié 21/04/21	mié 21/04/21
872	**1.4.2.1(**	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**	**8 días**	**jue 22/04/21**	**lun 3/05/21**
873	**1.4.2.1(**	**ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO**	**8 días**	**jue 22/04/21**	**lun 3/05/21**
874	1.4.2.1(	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	8 días	jue 22/04/21	lun 3/05/21
875	1.4.2.1(	FIN PREFABRICADOS	0 días	lun 3/05/21	lun 3/05/21
876	**1.4.2.11**	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**	**12 días**	**mié 7/04/21**	**jue 22/04/21**
877	**1.4.2.11**	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**	**7 días**	**mié 7/04/21**	**jue 15/04/21**
878	1.4.2.11	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	2 días	mié 7/04/21	jue 8/04/21
879	1.4.2.11	TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4"	7 días	mié 7/04/21	jue 15/04/21
880	**1.4.2.11**	**PUNTOS HIDRAULICOS**	**10 días**	**vie 9/04/21**	**jue 22/04/21**
881	1.4.2.11	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	10 días	vie 9/04/21	jue 22/04/21
882	**1.4.2.11**	**SALIDAS SANITARIAS**	**6 días**	**mié 7/04/21**	**mié 14/04/21**
883	1.4.2.11	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	6 días	mié 7/04/21	mié 14/04/21
884	1.4.2.11	FIN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0 días	mié 14/04/21	mié 14/04/21
885	**1.4.2.12**	**PAÑETES**	**4 días**	**jue 22/04/21**	**mar 27/04/21**
886	**1.4.2.12**	**PAÑETES SOBRE MUROS**	**4 días**	**jue 22/04/21**	**mar 27/04/21**
887	1.4.2.12	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	4 días	jue 22/04/21	mar 27/04/21
888	1.4.2.12	FIN PAÑETES	0 días	mar 27/04/21	mar 27/04/21
889	**1.4.2.13**	**PISOS**	**20 días**	**lun 26/04/21**	**lun 24/05/21**
890	**1.4.2.13**	**ACABADOS PISOS**	**20 días**	**lun 26/04/21**	**lun 24/05/21**
891	1.4.2.13	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	7 días	lun 26/04/21	mar 4/05/21
892	1.4.2.13	PULIDA Y BRILLO GRANITO	9 días	mar 11/05/21	lun 24/05/21
893	**1.4.2.13**	**GUARDAESCOBAS**	**12 días**	**jue 6/05/21**	**lun 24/05/21**
894	1.4.2.13	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	8 días	jue 6/05/21	mar 18/05/21
895	1.4.2.13	FIN PISOS	0 días	lun 24/05/21	lun 24/05/21
896	**1.4.2.14**	**CARPINTERIA DE METÁLICA**	**10 días**	**jue 29/04/21**	**mié 12/05/21**
897	**1.4.2.14**	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**	**10 días**	**jue 29/04/21**	**mié 12/05/21**
898	1.4.2.14	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	10 días	jue 29/04/21	mié 12/05/21
899	1.4.2.14	FIN CARPINTERIA EN ALUMNIO	0 días	mié 12/05/21	mié 12/05/21
900	**1.4.2.15**	**ENCHAPES**	**13 días**	**mié 28/04/21**	**vie 14/05/21**
901	**1.4.2.15**	**ENCHAPE SOBRE MUROS**	**6 días**	**mié 28/04/21**	**mié 5/05/21**



Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
902	1.4.2.15	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	6 días	mié 28/04/21	mié 5/05/21
903	**1.4.2.15**	**ENCHAPE SOBRE MESONES**	**12 días**	**jue 29/04/21**	**vie 14/05/21**
904	1.4.2.15	GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 60 cm.	12 días	jue 29/04/21	vie 14/05/21
905	1.4.2.15	FIN ENCHAPES	0 días	vie 14/05/21	vie 14/05/21
906	**1.4.2.16**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**10 días**	**lun 26/04/21**	**vie 7/05/21**
907	**1.4.2.16**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)**	**10 días**	**lun 26/04/21**	**vie 7/05/21**
908	1.4.2.16	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR	2 días	jue 6/05/21	vie 7/05/21
909	1.4.2.16	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL Ó SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR)	2 días	lun 26/04/21	mar 27/04/21
910	1.4.2.16	LAVAMANOS REDONDO EN ACERO INOX 304 PULIDO, INT 34 CM - EXT 38 CM - H 15 CM, 43-AA-94106 TRAMONTINA Ó SIMILAR.	2 días	mar 4/05/21	mié 5/05/21
911	1.4.2.16	GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR	2 días	lun 26/04/21	mar 27/04/21
912	1.4.2.16	FIN APARATOS SANITARIOS	0 días	mar 27/04/21	mar 27/04/21
913	**1.4.2.17**	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**	**1 día**	**jue 6/05/21**	**jue 6/05/21**
914	**1.4.2.17**	**DIVISIONES**	**1 día**	**jue 6/05/21**	**jue 6/05/21**
915	1.4.2.17	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	1 día	jue 6/05/21	jue 6/05/21
916	1.4.2.17	FIN DIVISIONES	0 días	jue 6/05/21	jue 6/05/21
917	**1.4.2.18**	**ASEO Y VARIOS**	**3 días**	**jue 20/05/21**	**lun 24/05/21**
918	**1.4.2.18**	**ASEO Y LIMPIEZA**	**3 días**	**jue 20/05/21**	**lun 24/05/21**
919	1.4.2.18	ASEO GENERAL	3 días	jue 20/05/21	lun 24/05/21
920	1.4.2.18	FIN ASEO Y LIMPIEZA	0 días	lun 24/05/21	lun 24/05/21
921	1.4.2.18	FIN COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE	0 días	lun 24/05/21	lun 24/05/21
922	**1.4.3**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE D**	**48 días**	**lun 15/03/21**	**lun 24/05/21**
943	**1.4.4**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE B**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
1058	**1.4.5**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE C**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
1188	**1.4.6**	**INEM SANTIAGO PEREZ SEDE B**	**51 días**	**jue 25/02/21**	**lun 10/05/21**
1309	1.5	DIVISIONES	0 días?	dom 28/03/21	dom 28/03/21
1310	1.6	FIN OBRAS CONTRATADAS	0 días	jue 10/06/21	jue 10/06/21

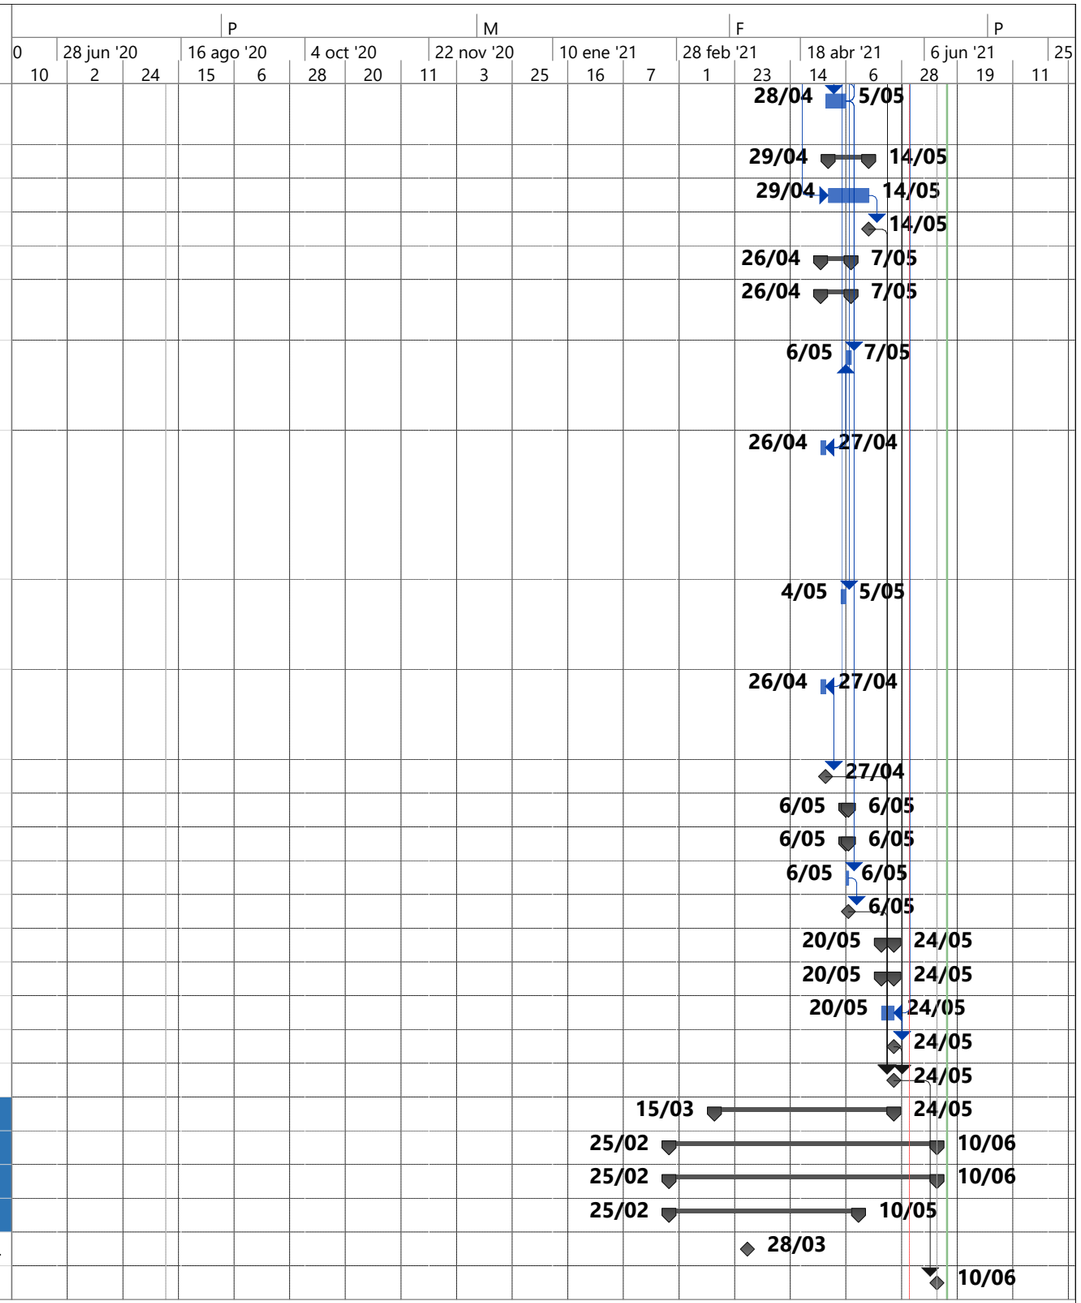


Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

SEGUIMIENTO A PROGRAMACION DE OBRA MES 3 RAFAEL URIBE URIBE


ACUMULADO ANTERIOR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	2,31%	2,05%	-0,26%
PERIODO ACTUAL	44,07%	32,44%	-11,63%
ACUMULADO ACTUAL	4,13%	3,40%	-0,74%

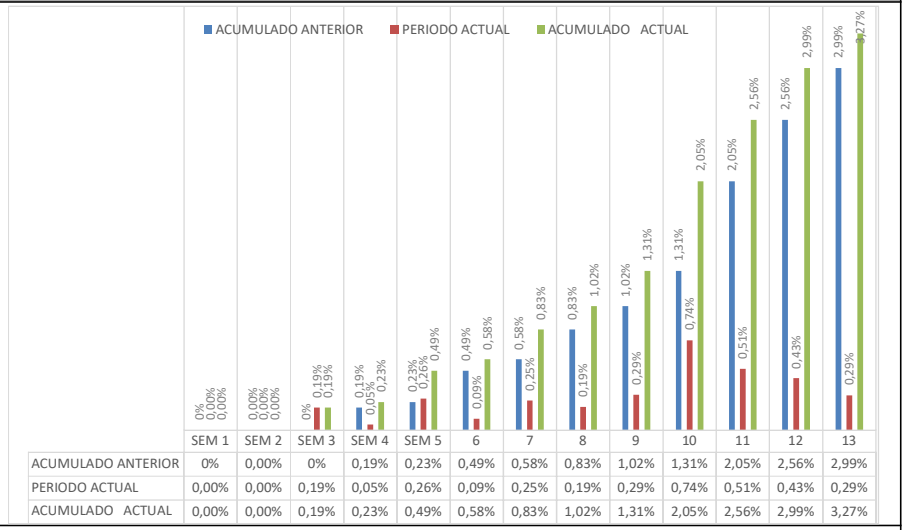

	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACUMULADO ANTERIOR	0%	0,00%	0%	0,19%	0,23%	0,49%	0,58%	0,83%	1,02%	1,31%	2,05%	2,56%	2,99%
PERIODO ACTUAL	0,00%	0,00%	0,19%	0,05%	0,26%	0,09%	0,25%	0,19%	0,29%	0,74%	0,51%	0,43%	0,29%
ACUMULADO ACTUAL	0,00%	0,00%	0,19%	0,23%	0,49%	0,58%	0,83%	1,02%	1,31%	2,05%	2,56%	2,99%	3,27%

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA MES 3


SEMANA	ACUMULADO PROGRAMADO		ACUMULADO EJECUTADO
1	$ -		$ -
2	$ 4.215.638,00		$ 2.590.216,00
3	$ 5.868.642,00		$ 3.228.540,00
4	$ 7.026.209,00		$ 6.837.258,00
5	$ 9.238.323,00		$ 8.150.799,00
6	$ 12.037.251,00		$ 11.567.931,00
7	$ 15.687.739,00		$ 14.258.711,00
8	$ 19.325.728,00		$ 18.321.680,00
9	$ 32.224.690,00		$ 28.658.009,00
10	$ 48.229.884,00		$ 35.709.832,00
11	$ 56.443.008,00		$ 41.678.200,00
12	$ 57.432.600,00		$ 45.672.351,00
13	$ 57.618.637,00		$ 47.352.077,00

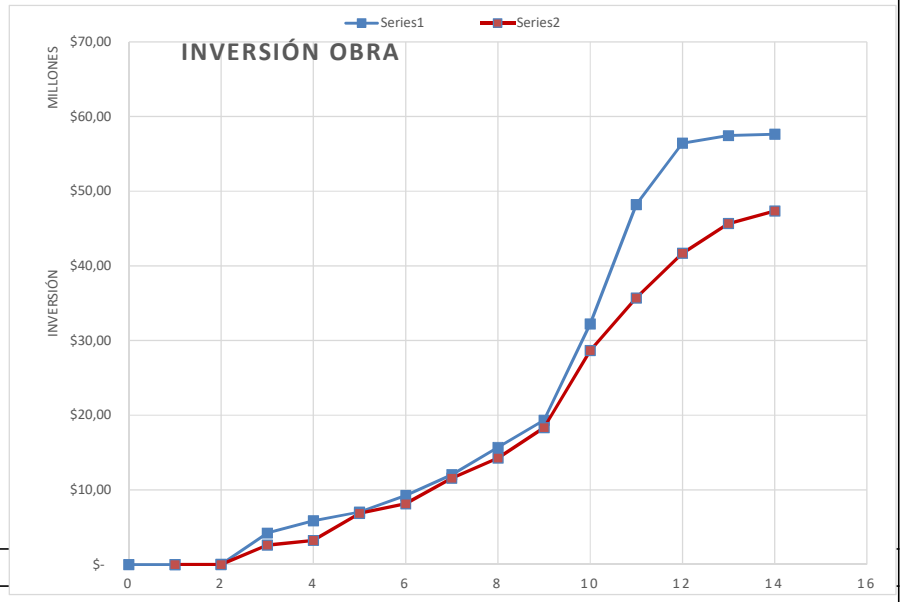

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE	DIFERENCIA
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 57.618.637	4,13%	-0,74%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 47.352.077	3,40%	

NOTA: **PARAEL PRESENTE PERIODO SE TENIAN PREVISTAS ENTREGAS DE MATERIALES PARA FABRICACION DE VENTANAS, REJAS Y PISOS AL CIERRE DEL MES DE ABRIL, SI EMABARGO PERSISTE EL PARO NACIONAL QUE GENERO BLOUQEOS DE VIAS IMPIDIENDO DICHAS ENTREGAS, QUE SE ESPERA SE PUEDAN DAR EN LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO**


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**208 días?**	**lun 10/08/20**	**jue 10/06/21**
2	**1.1**	**PRECONSTRUCCION**	**15 días**	**lun 10/08/20**	**lun 31/08/20**
3	1.1.1	VERIFICACION ATERRIZAJE PRESUPUESTAL	15 días	lun 10/08/20	lun 31/08/20
4	**1.2**	**ACTA DE INICIO DE OBRA**	**0 días**	**lun 31/08/20**	**lun 31/08/20**
5	**1.3**	**FASE 1 DE EJECUCION**	**135 días**	**lun 10/08/20**	**mié 24/02/21**
744	**1.4**	**FASE 2 DE EJECUCION (Adicion presupuestal)**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
745	**1.4.1**	**INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO**	**60 días**	**jue 25/02/21**	**lun 24/05/21**
839	**1.4.2**	**IED RAFAEL URIBE URIBE**	**60 días**	**jue 25/02/21**	**lun 24/05/21**
922	**1.4.3**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE D**	**48 días**	**lun 15/03/21**	**lun 24/05/21**
943	**1.4.4**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE B**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
944	1.4.4.1	ADECUACION DE AREAS POR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	7 días	jue 25/02/21	vie 5/03/21
945	1.4.4.2	INICIO DE OBRA - RAFAEL URIBE URIBE	0 días	vie 5/03/21	vie 5/03/21
946	**1.4.4.3**	**OBRAS PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 8/03/21**	**mar 9/03/21**
947	1.4.4.3.	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	2 días	lun 8/03/21	mar 9/03/21
948	**1.4.4.4**	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**	**14 días**	**jue 11/03/21**	**mié 31/03/21**
949	1.4.4.4.	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	vie 12/03/21	lun 15/03/21
950	1.4.4.4.	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	3 días	jue 11/03/21	lun 15/03/21
951	1.4.4.4.	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	mié 17/03/21	jue 18/03/21
952	1.4.4.4.	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	vie 12/03/21	lun 15/03/21
953	1.4.4.4.	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	1 día	mar 16/03/21	mar 16/03/21
954	1.4.4.4.	DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS	2 días	mar 16/03/21	mié 17/03/21
955	1.4.4.4.	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	2 días	mar 23/03/21	mié 24/03/21
956	1.4.4.4.	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	lun 29/03/21	mar 30/03/21
957	1.4.4.4.	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	lun 29/03/21	mar 30/03/21
958	1.4.4.4.	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	3 días	mié 24/03/21	vie 26/03/21
959	1.4.4.4.	FIN PRELIMINARES	0 días	mié 31/03/21	mié 31/03/21
960	**1.4.4.5**	**CIMENTACION**	**27 días**	**lun 29/03/21**	**mié 5/05/21**
961	**1.4.4.5.**	**CIMENTACION**	**25 días**	**lun 29/03/21**	**lun 3/05/21**
962	**1.4.4.5.**	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**	**25 días**	**lun 29/03/21**	**lun 3/05/21**

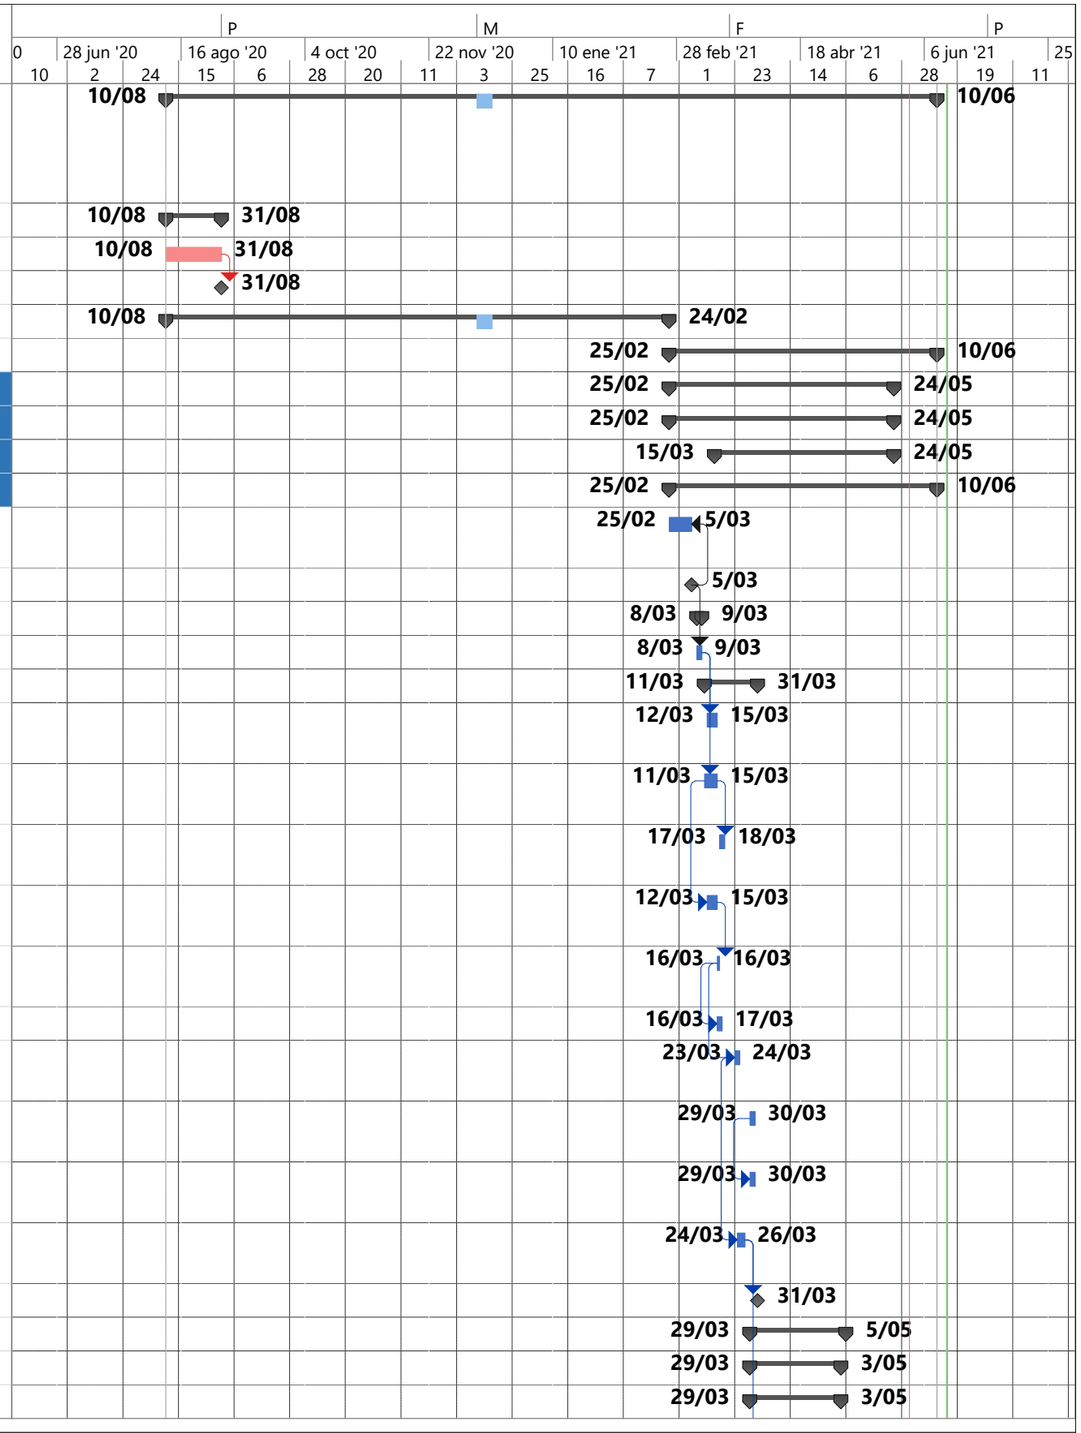

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
963	1.4.4.5.	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	4 días	lun 29/03/21	vie 2/04/21
964	1.4.4.5.	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	6 días	lun 26/04/21	lun 3/05/21
965	**1.4.4.5.**	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**	**12 días**	**lun 19/04/21**	**mié 5/05/21**
966	1.4.4.5.	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	1 día	mié 5/05/21	mié 5/05/21
967	1.4.4.5.	FIN CIMENTACION	0 días	lun 19/04/21	lun 19/04/21
968	**1.4.4.6**	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**	**14 días**	**jue 15/04/21**	**mié 5/05/21**
969	1.4.4.6.	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	2 días	mar 4/05/21	mié 5/05/21
970	1.4.4.6.	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	1 día	mar 4/05/21	mar 4/05/21
971	1.4.4.6.	FIN ACERO DE REFUERZO	0 días	jue 15/04/21	jue 15/04/21
972	**1.4.4.7**	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**	**15 días**	**lun 5/04/21**	**vie 23/04/21**
973	**1.4.4.7.**	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**	**12 días**	**lun 5/04/21**	**mar 20/04/21**
974	1.4.4.7.	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	3 días	lun 5/04/21	mié 7/04/21
975	1.4.4.7.	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	2 días	vie 9/04/21	lun 12/04/21
976	1.4.4.7.	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	3 días	vie 9/04/21	mar 13/04/21
977	1.4.4.7.	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	4 días	lun 5/04/21	jue 8/04/21
978	1.4.4.7.	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	4 días	vie 9/04/21	mié 14/04/21
979	1.4.4.7.	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	4 días	vie 9/04/21	mié 14/04/21
980	1.4.4.7.	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	4 días	jue 15/04/21	mar 20/04/21
981	**CONSTF**	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**	**7 días**	**jue 15/04/21**	**vie 23/04/21**
982	CAJA INSPEC(	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	7 días	jue 15/04/21	vie 23/04/21
983	1.4.4.7.	FIN DESAGUES	0 días	vie 23/04/21	vie 23/04/21
984	**1.4.4.8**	**MAMPOSTERIA**	**4 días**	**jue 6/05/21**	**mar 11/05/21**
985	**1.4.4.8.**	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**	**1 día**	**jue 6/05/21**	**jue 6/05/21**
986	1.4.4.8.	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	1 día	jue 6/05/21	jue 6/05/21
987	**1.4.4.8.**	**VARIOS - MAMPOSTERIA**	**3 días**	**vie 7/05/21**	**mar 11/05/21**
988	1.4.4.8.	BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M	2 días	vie 7/05/21	lun 10/05/21
989	1.4.4.8.	MESONES EN CONCRETO	3 días	vie 7/05/21	mar 11/05/21
990	**1.4.4.9**	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**	**11 días**	**lun 5/04/21**	**lun 19/04/21**
991	**1.4.4.9.**	**ACOMETIDA**	**11 días**	**lun 5/04/21**	**lun 19/04/21**
992	**1.4.4.9.**	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**	**11 días**	**lun 5/04/21**	**lun 19/04/21**
993	1.4.4.9.	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	4 días	lun 5/04/21	jue 8/04/21

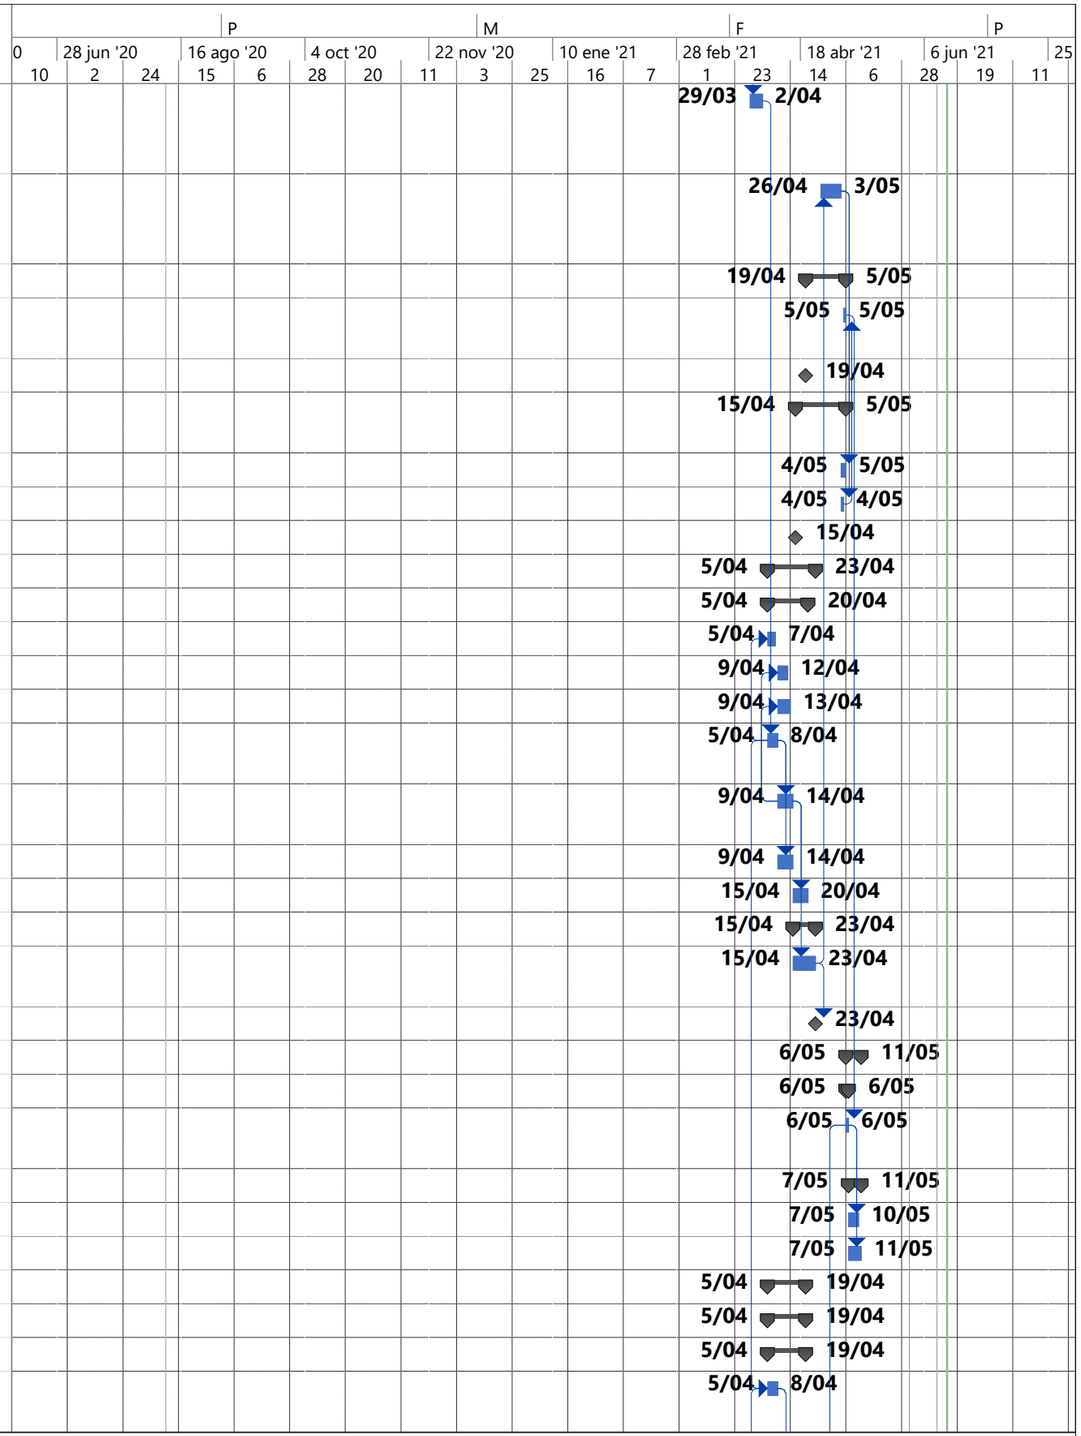

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
994	1.4.4.9.	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	7 días	vie 9/04/21	lun 19/04/21
995	1.4.4.9.	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	8 días	lun 5/04/21	mié 14/04/21
996	**1.4.4.9.**	**PUNTOS HIDRAULICOS**	**6 días**	**vie 9/04/21**	**vie 16/04/21**
997	1.4.4.9.	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	6 días	vie 9/04/21	vie 16/04/21
998	**1.4.4.1(**	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**	**5 días**	**jue 6/05/21**	**mié 12/05/21**
999	**1.4.4.1(**	**SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS**	**4 días**	**jue 6/05/21**	**mar 11/05/21**
1000	1.4.4.1(	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	2 días	jue 6/05/21	vie 7/05/21
1001	1.4.4.1(	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	2 días	lun 10/05/21	mar 11/05/21
1002	**1.4.4.1(**	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**	**5 días**	**jue 6/05/21**	**mié 12/05/21**
1003	1.4.4.1(	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	4 días	jue 6/05/21	mar 11/05/21
1004	1.4.4.1(	CABLEADO 1#12	1 día	mié 12/05/21	mié 12/05/21
1005	1.4.4.1(	CABLEADO 2#12	1 día	mié 12/05/21	mié 12/05/21
1006	**1.4.4.11**	**PAÑETES**	**6 días**	**vie 14/05/21**	**lun 24/05/21**
1007	**1.4.4.11**	**PAÑETES SOBRE MUROS**	**6 días**	**vie 14/05/21**	**lun 24/05/21**
1008	1.4.4.11	FILOS Y DILATACIONES	5 días	vie 14/05/21	vie 21/05/21
1009	1.4.4.11	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4.	6 días	vie 14/05/21	lun 24/05/21
1010	**1.4.4.12**	**PISOS**	**13 días**	**mar 25/05/21**	**jue 10/06/21**
1011	**1.4.4.12**	**ACABADOS PISOS**	**13 días**	**mar 25/05/21**	**jue 10/06/21**
1012	1.4.4.12	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	3 días	mar 25/05/21	jue 27/05/21
1013	1.4.4.12	PULIDA Y BRILLO GRANITO	5 días	vie 4/06/21	jue 10/06/21
1014	**1.4.4.12**	**GUARDAESCOBAS**	**5 días**	**vie 28/05/21**	**jue 3/06/21**
1015	1.4.4.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	5 días	vie 28/05/21	jue 3/06/21
1016	**1.4.4.13**	**CARPINTERIA DE METÁLICA**	**8 días**	**mié 19/05/21**	**vie 28/05/21**
1017	**1.4.4.13**	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**	**4 días**	**mié 19/05/21**	**lun 24/05/21**
1018	1.4.4.13	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	4 días	mié 19/05/21	lun 24/05/21
1019	**1.4.4.13**	**CARPINTERIA EN LAMINA**	**8 días**	**mié 19/05/21**	**vie 28/05/21**
1020	1.4.4.13	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	8 días	mié 19/05/21	vie 28/05/21
1021	1.4.4.13	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	8 días	mié 19/05/21	vie 28/05/21
1022	**1.4.4.14**	**ENCHAPES**	**7 días**	**mié 19/05/21**	**jue 27/05/21**
1023	**1.4.4.14**	**ENCHAPE SOBRE MUROS**	**7 días**	**mié 19/05/21**	**jue 27/05/21**
1024	1.4.4.14	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	7 días	mié 19/05/21	jue 27/05/21
1025	**1.4.4.14**	**ENCHAPE SOBRE MESONES**	**5 días**	**vie 21/05/21**	**jue 27/05/21**

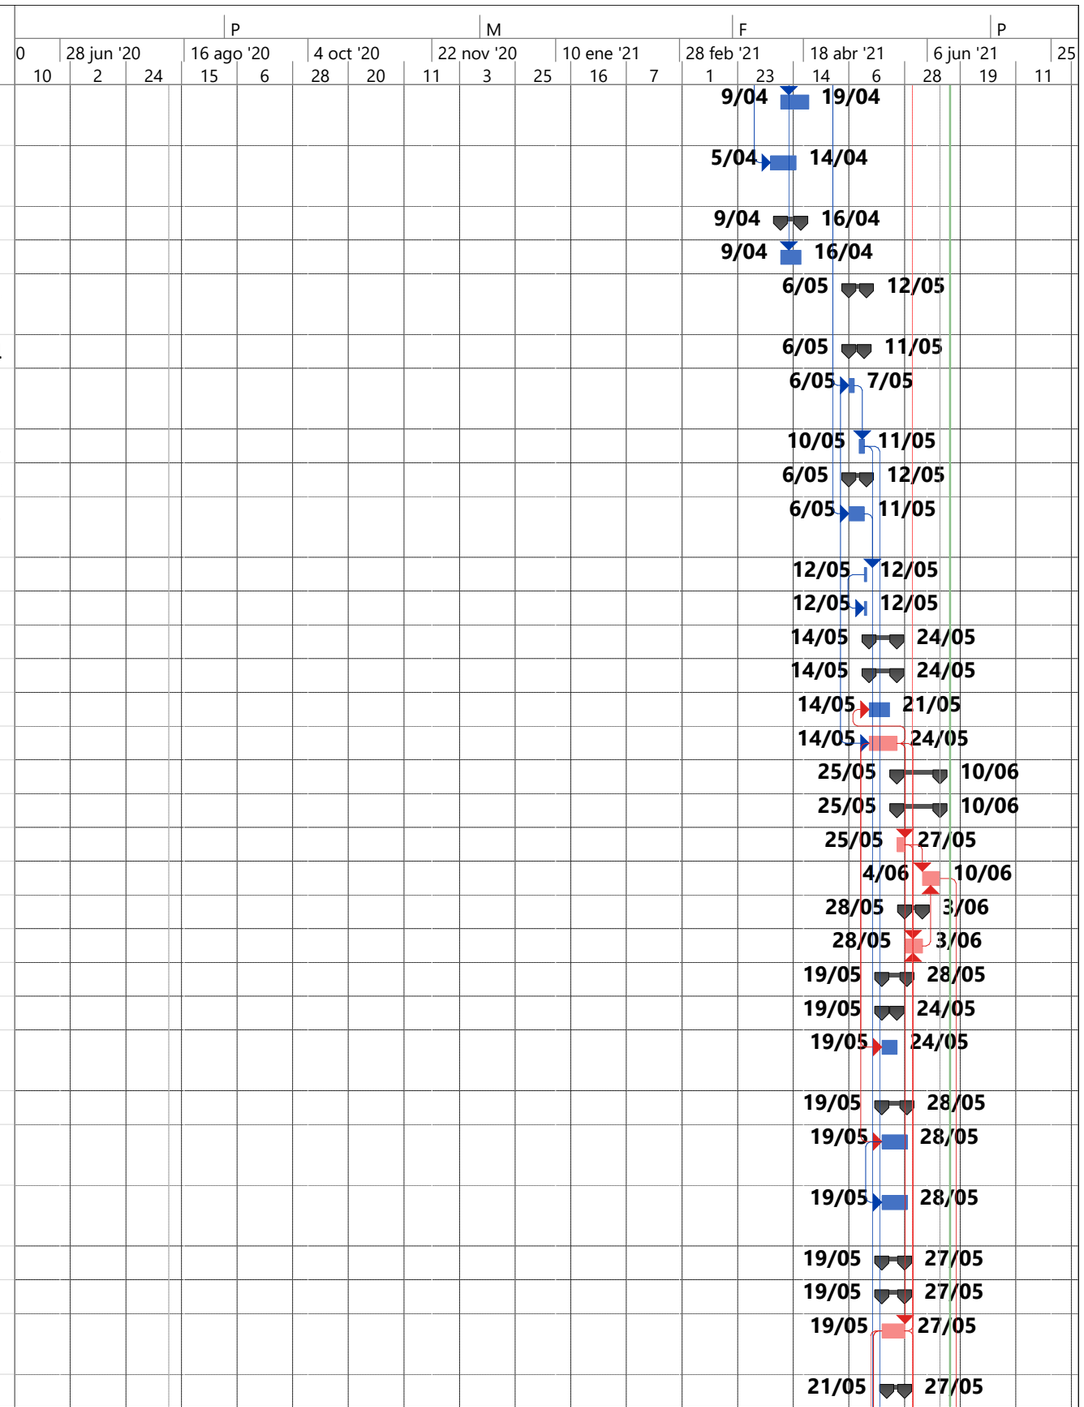

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1026	1.4.4.14	ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20	2 días	mié 26/05/21	jue 27/05/21
1027	1.4.4.14	GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 60 cm.	2 días	vie 21/05/21	lun 24/05/21
1028	**1.4.4.15**	**ILUMINACION**	**1 día**	**mié 12/05/21**	**mié 12/05/21**
1029	**1.4.4.15**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**	**1 día**	**mié 12/05/21**	**mié 12/05/21**
1030	1.4.4.15	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	1 día	mié 12/05/21	mié 12/05/21
1031	**1.4.4.16**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**7 días**	**vie 21/05/21**	**lun 31/05/21**
1032	**1.4.4.16**	**APARATOS SANITARIOS**	**7 días**	**vie 21/05/21**	**lun 31/05/21**
1033	1.4.4.16	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR.	2 días	vie 21/05/21	lun 24/05/21
1034	1.4.4.16	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21
1035	1.4.4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21
1036	1.4.4.16	SANITARIO INFANTIL MANCESA O SIMILAR + GRIFERIA (SUMINISTRO E INSTALACION).	1 día	lun 31/05/21	lun 31/05/21
1037	1.4.4.16	POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	2 días	mar 25/05/21	mié 26/05/21
1038	**1.4.4.16**	**ACCESORIOS**	**1 día**	**vie 28/05/21**	**vie 28/05/21**
1039	1.4.4.16	DISPENSADOR DE PAPEL A. INOXIDABLE.	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21
1040	1.4.4.16	DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21
1041	1.4.4.16	TAPARREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACION)	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21
1042	**1.4.4.16**	**OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**1 día**	**vie 28/05/21**	**vie 28/05/21**
1043	1.4.4.16	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21
1044	**1.4.4.17**	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**	**10 días**	**mié 26/05/21**	**mar 8/06/21**
1045	**1.4.4.17**	**DIVISIONES**	**10 días**	**mié 26/05/21**	**mar 8/06/21**
1046	1.4.4.17	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	10 días	mié 26/05/21	mar 8/06/21
1047	**1.4.4.18**	**PINTURA**	**8 días**	**vie 28/05/21**	**mar 8/06/21**
1048	**1.4.4.18**	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**	**8 días**	**vie 28/05/21**	**mar 8/06/21**
1049	1.4.4.18	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	3 días	vie 4/06/21	mar 8/06/21
1050	1.4.4.18	ESTUCO	5 días	vie 28/05/21	jue 3/06/21
1051	**1.4.4.19**	**CERRADURAS Y VIDRIOS**	**1 día**	**mié 9/06/21**	**mié 9/06/21**
1052	**1.4.4.19**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**1 día**	**mié 9/06/21**	**mié 9/06/21**
1053	1.4.4.19	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	1 día	mié 9/06/21	mié 9/06/21
1054	**1.4.4.20**	**ASEO Y VARIOS**	**4 días**	**lun 7/06/21**	**jue 10/06/21**

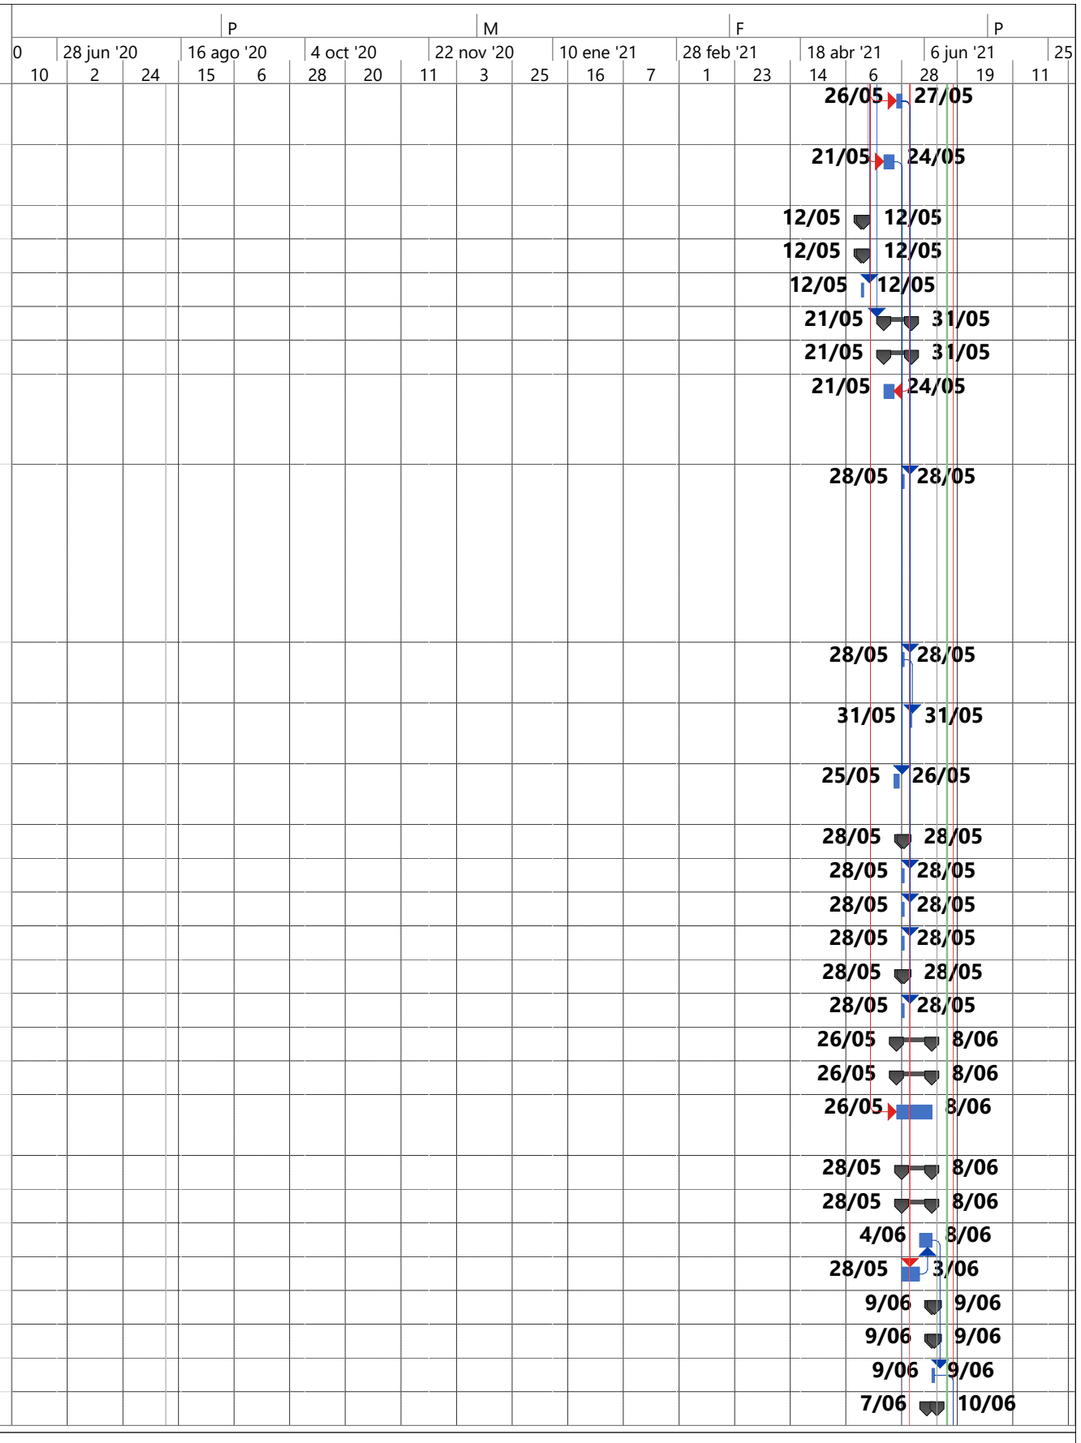

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1055	**1.4.4.2(**	**ASEO Y LIMPIEZA**	**4 días**	**lun 7/06/21**	**jue 10/06/21**
1056	1.4.4.2(	ASEO GENERAL	4 días	lun 7/06/21	jue 10/06/21
1057	1.4.4.2(	FIN RUFINO JOSE CUERVO SEDE B	0 días	jue 10/06/21	jue 10/06/21
1058	**1.4.5**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE C**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
1188	**1.4.6**	**INEM SANTIAGO PEREZ SEDE B**	**51 días**	**jue 25/02/21**	**lun 10/05/21**
1309	1.5	DIVISIONES	0 días?	dom 28/03/21	dom 28/03/21
1310	1.6	FIN OBRAS CONTRATADAS	0 días	jue 10/06/21	jue 10/06/21

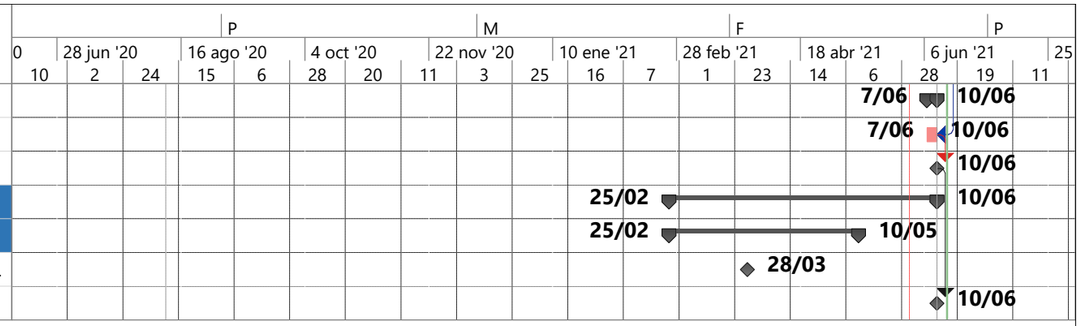


Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

SEGUIMIENTO A PROGRAMACION DE OBRA MES 3 RUFINO JOSE CUERVO SEDE B


ACUMULADO ANTERIOR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	1,37%	1,36%	-0,003%
PERIODO ACTUAL	1,02%	1,00%	-0,02%
ACUMULADO ACTUAL	2,39%	2,37%	-0,021%

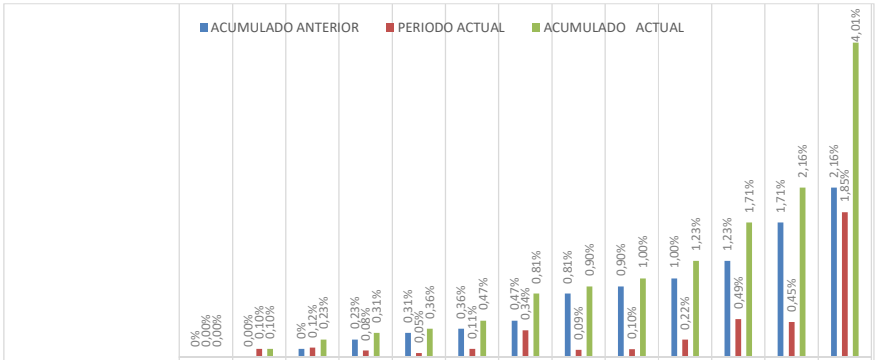

	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACUMULADO ANTERIOR	0%	0,00%	0%	0,23%	0,31%	0,36%	0,47%	0,81%	0,90%	1,00%	1,23%	1,71%	2,16%
PERIODO ACTUAL	0,00%	0,10%	0,12%	0,08%	0,05%	0,11%	0,34%	0,09%	0,10%	0,22%	0,49%	0,45%	1,85%
ACUMULADO ACTUAL	0,00%	0,10%	0,23%	0,31%	0,36%	0,47%	0,81%	0,90%	1,00%	1,23%	1,71%	2,16%	4,01%


INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA MES 3

SEMANA	ACUMULADO PROGRAMADO		ACUMULADO EJECUTADO
1	$ -		$ -
2	$ 1.610.594,00		$ 1.450.000,00
3	$ 3.597.866,00		$ 3.150.658,00
4	$ 4.058.648,00		$ 4.325.006,00
5	$ 4.824.435,00		$ 5.025.987,00
6	$ 7.682.727,00		$ 6.500.123,00
7	$ 12.742.011,00		$ 11.287.143,00
8	$ 13.798.066,00		$ 12.587.991,00
9	$ 14.245.191,00		$ 13.998.741,00
10	$ 17.984.272,00		$ 17.100.894,00
11	$ 21.481.149,00		$ 23.876.541,00
12	$ 31.773.116,00		$ 30.118.279,00
13	$ 62.495.709,00		$ 55.872.008,00
14	$ 82.660.753,00		$ -
15	$ 90.377.593,00		$ -

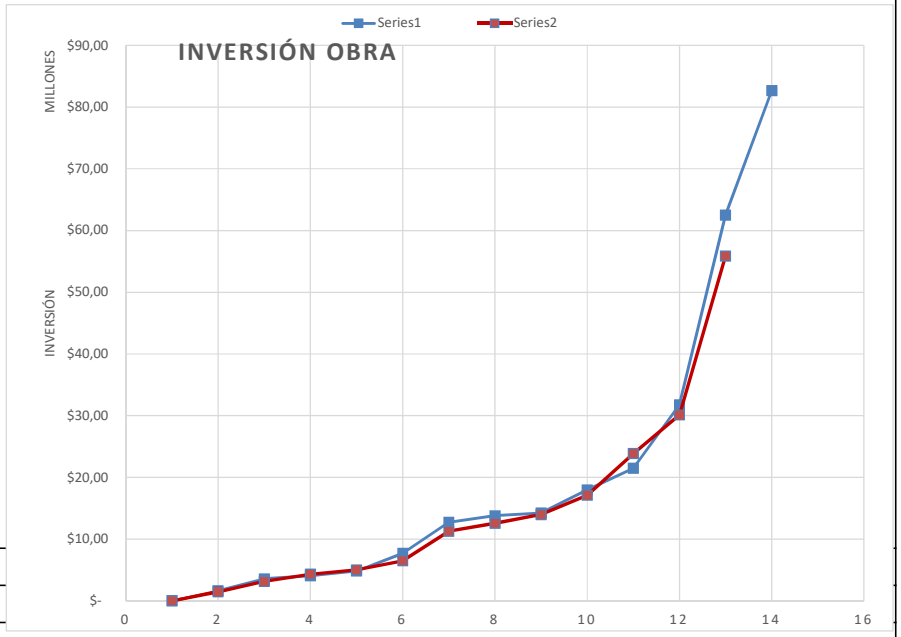

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE	DIFERENCIA
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 14.245.191	1,02%	-0,02%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 13.998.741	1,00%	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**208 días?**	**lun 10/08/20**	**jue 10/06/21**
2	**1.1**	**PRECONSTRUCCION**	**15 días**	**lun 10/08/20**	**lun 31/08/20**
3	1.1.1	VERIFICACION ATERRIZAJE PRESUPUESTAL	15 días	lun 10/08/20	lun 31/08/20
4	**1.2**	**ACTA DE INICIO DE OBRA**	**0 días**	**lun 31/08/20**	**lun 31/08/20**
5	**1.3**	**FASE 1 DE EJECUCION**	**135 días**	**lun 10/08/20**	**mié 24/02/21**
744	**1.4**	**FASE 2 DE EJECUCION (Adicion presupuestal)**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
745	**1.4.1**	**INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO**	**60 días**	**jue 25/02/21**	**lun 24/05/21**
839	**1.4.2**	**IED RAFAEL URIBE URIBE**	**60 días**	**jue 25/02/21**	**lun 24/05/21**
922	**1.4.3**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE D**	**48 días**	**lun 15/03/21**	**lun 24/05/21**
943	**1.4.4**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE B**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
1058	**1.4.5**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE C**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
1059	1.4.5.1	ADECUACION DE AREAS POR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	7 días	jue 25/02/21	vie 5/03/21
1060	1.4.5.2	INICIO DE OBRA - RUFINO JOSE CUERVO SEDE C	0 días	vie 5/03/21	vie 5/03/21
1061	**1.4.5.3**	**OBRAS PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 8/03/21**	**mar 9/03/21**
1062	1.4.5.3.	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	2 días	lun 8/03/21	mar 9/03/21
1063	1.4.5.3.	FIN PRELIMINARES	0 días	mar 9/03/21	mar 9/03/21
1064	**1.4.5.4**	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**	**13 días**	**mié 10/03/21**	**lun 29/03/21**
1065	1.4.5.4.	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	mié 10/03/21	jue 11/03/21
1066	1.4.5.4.	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	vie 12/03/21	lun 15/03/21
1067	1.4.5.4.	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	vie 12/03/21	lun 15/03/21
1068	1.4.5.4.	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	mar 16/03/21	mié 17/03/21
1069	1.4.5.4.	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	mié 10/03/21	jue 11/03/21
1070	1.4.5.4.	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	4 días	vie 12/03/21	mié 17/03/21
1071	1.4.5.4.	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	1 día	jue 18/03/21	jue 18/03/21
1072	1.4.5.4.	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO,	2 días	jue 18/03/21	vie 19/03/21
1073	1.4.5.4.	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	vie 26/03/21	lun 29/03/21
1074	1.4.5.4.	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	vie 26/03/21	lun 29/03/21
1075	1.4.5.4.	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES	3 días	mar 23/03/21	jue 25/03/21
1076	1.4.5.4.	FIN DEMOLICIONES	0 días	lun 29/03/21	lun 29/03/21
1077	**1.4.5.5**	**CIMENTACION**	**21 días**	**mar 30/03/21**	**mié 28/04/21**
1078	**1.4.5.5.**	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**	**10 días**	**mar 30/03/21**	**mar 13/04/21**
1079	1.4.5.5.	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE,	4 días	jue 8/04/21	mar 13/04/21
1080	1.4.5.5.	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-600 (Suministro, Extenc	6 días	mar 30/03/21	mié 7/04/21
1081	**1.4.5.5.**	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**	**2 días**	**mar 27/04/21**	**mié 28/04/21**
1082	1.4.5.5.	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CO	2 días	mar 27/04/21	mié 28/04/21

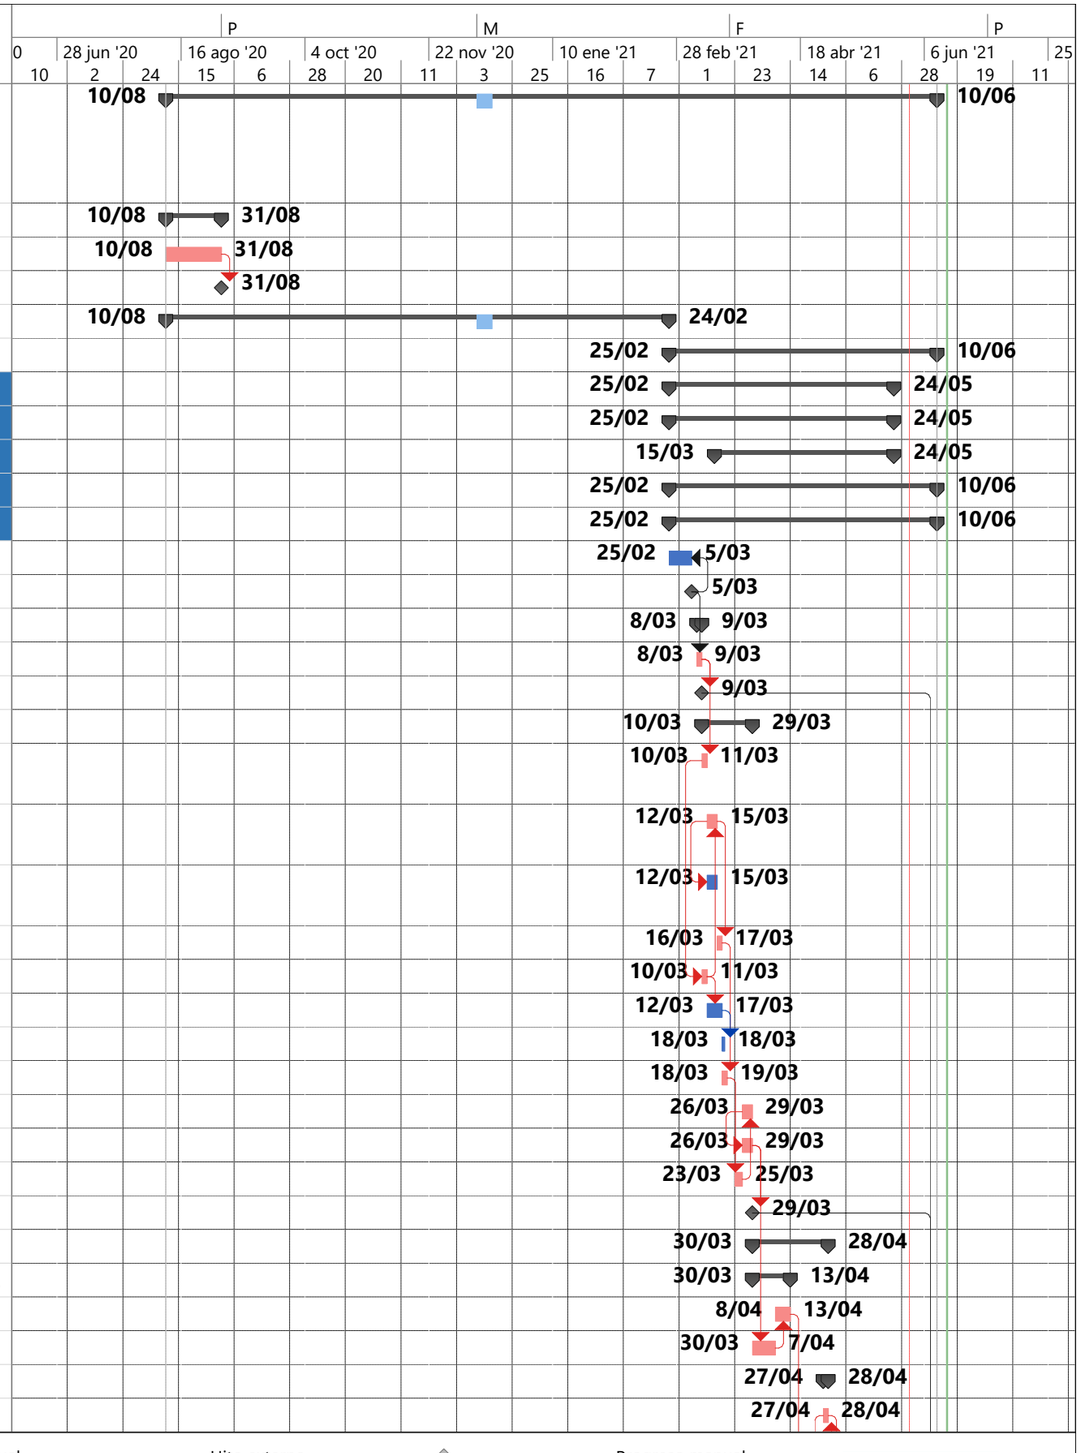

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1083	**1.4.5.5.**	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMP**	**2 días**	**lun 26/04/21**	**mar 27/04/21**
1084	1.4.5.5..	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	2 días	lun 26/04/21	mar 27/04/21
1085	1.4.5.5..	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	1 día	lun 26/04/21	lun 26/04/21
1086	1.4.5.5..	FIN CIMENTACION	0 días	mié 28/04/21	mié 28/04/21
1087	**1.4.5.6**	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**	**16 días**	**mié 14/04/21**	**mié 5/05/21**
1088	**1.4.5.6.**	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**	**12 días**	**mié 14/04/21**	**jue 29/04/21**
1089	1.4.5.6.	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	3 días	mié 14/04/21	vie 16/04/21
1090	1.4.5.6.	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	3 días	mié 14/04/21	vie 16/04/21
1091	1.4.5.6.	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	3 días	mar 20/04/21	jue 22/04/21
1092	1.4.5.6.	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	4 días	mié 14/04/21	lun 19/04/21
1093	1.4.5.6.	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	4 días	mar 20/04/21	vie 23/04/21
1094	1.4.5.6.	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	4 días	mar 20/04/21	vie 23/04/21
1095	1.4.5.6.	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	4 días	lun 26/04/21	jue 29/04/21
1096	**1.4.5.6.**	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**	**8 días**	**lun 26/04/21**	**mié 5/05/21**
1097	1.4.5.6..	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA C	8 días	lun 26/04/21	mié 5/05/21
1098	1.4.5.6..	FIN DESAGUES	0 días	mié 5/05/21	mié 5/05/21
1099	**1.4.5.7**	**MAMPOSTERIA**	**3 días**	**lun 3/05/21**	**mié 5/05/21**
1100	**1.4.5.7.**	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**	**1 día**	**lun 3/05/21**	**lun 3/05/21**
1101	1.4.5.7.	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	1 día	lun 3/05/21	lun 3/05/21
1102	**1.4.5.7.**	**VARIOS - MAMPOSTERIA**	**3 días**	**lun 3/05/21**	**mié 5/05/21**
1103	1.4.5.7..	BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M	2 días	mar 4/05/21	mié 5/05/21
1104	1.4.5.7..	MESONES EN CONCRETO	3 días	lun 3/05/21	mié 5/05/21
1105	1.4.5.7..	FIN MAMPOSTERIA	0 días	mié 5/05/21	mié 5/05/21
1106	**1.4.5.8**	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**	**12 días**	**mié 14/04/21**	**jue 29/04/21**
1107	**1.4.5.8.**	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**	**12 días**	**mié 14/04/21**	**jue 29/04/21**
1108	1.4.5.8.	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	4 días	mié 14/04/21	lun 19/04/21
1109	1.4.5.8.	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	8 días	mar 20/04/21	jue 29/04/21
1110	1.4.5.8.	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	8 días	mar 20/04/21	jue 29/04/21
1111	**1.4.5.8.**	**PUNTOS HIDRAULICOS**	**6 días**	**mar 20/04/21**	**mar 27/04/21**
1112	1.4.5.8..	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	6 días	mar 20/04/21	mar 27/04/21
1113	1.4.5.8..	FIN INSTALACION HIRAULICA	0 días	jue 29/04/21	jue 29/04/21
1114	**1.4.5.9**	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**	**8 días**	**lun 3/05/21**	**mié 12/05/21**
1115	**1.4.5.9.**	**SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS**	**8 días**	**lun 3/05/21**	**mié 12/05/21**
1116	1.4.5.9.	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	2 días	lun 3/05/21	mar 4/05/21
1117	1.4.5.9.	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	2 días	mar 11/05/21	mié 12/05/21
1118	**1.4.5.9.**	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**	**5 días**	**mié 5/05/21**	**mar 11/05/21**
1119	1.4.5.9..	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	4 días	mié 5/05/21	lun 10/05/21
1120	1.4.5.9..	CABLEADO 1#12	1 día	mar 11/05/21	mar 11/05/21
1121	1.4.5.9..	CABLEADO 2#12	1 día	mar 11/05/21	mar 11/05/21



Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1122	1.4.5.9..	FIN INSTALACION ELECTRICA	0 días	mar 11/05/21	mar 11/05/21
1123	**1.4.5.1(**	**PAÑETES**	**10 días**	**lun 3/05/21**	**vie 14/05/21**
1124	**1.4.5.1(**	**PAÑETES SOBRE MUROS**	**10 días**	**lun 3/05/21**	**vie 14/05/21**
1125	1.4.5.1(	FILOS Y DILATACIONES	6 días	lun 3/05/21	lun 10/05/21
1126	1.4.5.1(	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4.	7 días	lun 3/05/21	mar 11/05/21
1127	1.4.5.1(	RESANES GENERALES	3 días	mié 12/05/21	vie 14/05/21
1128	1.4.5.1(	FIN PAÑETES	0 días	vie 14/05/21	vie 14/05/21
1129	**1.4.5.11**	**PISOS**	**16 días**	**mié 12/05/21**	**jue 3/06/21**
1130	**1.4.5.11**	**ACABADOS PISOS**	**16 días**	**mié 12/05/21**	**jue 3/06/21**
1131	1.4.5.11	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	5 días	mié 12/05/21	mié 19/05/21
1132	1.4.5.11	PULIDA Y BRILLO GRANITO	4 días	lun 31/05/21	jue 3/06/21
1133	**1.4.5.11**	**GUARDAESCOBAS**	**6 días**	**vie 21/05/21**	**vie 28/05/21**
1134	1.4.5.11	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	6 días	vie 21/05/21	vie 28/05/21
1135	**1.4.5.11**	**GRADAS**	**2 días**	**jue 20/05/21**	**vie 21/05/21**
1136	1.4.5.11	GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30	2 días	jue 20/05/21	vie 21/05/21
1137	1.4.5.11	FIN PISOS	0 días	jue 3/06/21	jue 3/06/21
1138	**1.4.5.12**	**CARPINTERIA DE METÁLICA**	**16 días**	**mié 5/05/21**	**jue 27/05/21**
1139	**1.4.5.12**	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**	**4 días**	**mié 5/05/21**	**lun 10/05/21**
1140	1.4.5.12	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	4 días	mié 5/05/21	lun 10/05/21
1141	**1.4.5.12**	**CARPINTERIA EN LAMINA**	**16 días**	**mié 5/05/21**	**jue 27/05/21**
1142	1.4.5.12	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	8 días	mié 5/05/21	vie 14/05/21
1143	1.4.5.12	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	8 días	mar 18/05/21	jue 27/05/21
1144	1.4.5.12	FIN CARPINTERIA METALICA	0 días	jue 27/05/21	jue 27/05/21
1145	**1.4.5.13**	**ENCHAPES**	**10 días**	**jue 6/05/21**	**jue 20/05/21**
1146	**1.4.5.13**	**ENCHAPE SOBRE MUROS**	**10 días**	**jue 6/05/21**	**jue 20/05/21**
1147	1.4.5.13	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	10 días	jue 6/05/21	jue 20/05/21
1148	**1.4.5.13**	**ENCHAPE SOBRE MESONES**	**4 días**	**mar 11/05/21**	**vie 14/05/21**
1149	1.4.5.13	ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20	2 días	jue 13/05/21	vie 14/05/21
1150	1.4.5.13	GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 60 cm.	2 días	mar 11/05/21	mié 12/05/21
1151	1.4.5.13	FIN ENCHAPES	0 días	jue 20/05/21	jue 20/05/21
1152	**1.4.5.14**	**ILUMINACION**	**1 día**	**jue 13/05/21**	**jue 13/05/21**
1153	**1.4.5.14**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**	**1 día**	**jue 13/05/21**	**jue 13/05/21**
1154	1.4.5.14	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	1 día	jue 13/05/21	jue 13/05/21
1155	1.4.5.14	FIN ILUMINACION	0 días	jue 13/05/21	jue 13/05/21
1156	**1.4.5.15**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**11 días**	**lun 10/05/21**	**mar 25/05/21**
1157	**1.4.5.15**	**APARATOS SANITARIOS**	**11 días**	**lun 10/05/21**	**mar 25/05/21**
1158	1.4.5.15	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO P	2 días	lun 10/05/21	mar 11/05/21
1159	1.4.5.15	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PA	1 día	vie 21/05/21	vie 21/05/21
1160	1.4.5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI	1 día	vie 21/05/21	vie 21/05/21



Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1161	1.4.5.15	SANITARIO INFANTIL MANCESA O SIMILAR + GRIFERIA (SUMINISTF	2 días	lun 24/05/21	mar 25/05/21
1162	1.4.5.15	POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	2 días	jue 13/05/21	vie 14/05/21
1163	**1.4.5.15**	**ACCESORIOS**	**2 días**	**vie 21/05/21**	**lun 24/05/21**
1164	1.4.5.15	DISPENSADOR DE PAPEL A. INOXIDABLE.	1 día	vie 21/05/21	vie 21/05/21
1165	1.4.5.15	DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX	1 día	vie 21/05/21	vie 21/05/21
1166	1.4.5.15	TAPARREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACION)	2 días	vie 21/05/21	lun 24/05/21
1167	**1.4.5.15**	**OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**1 día**	**vie 21/05/21**	**vie 21/05/21**
1168	1.4.5.15	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	1 día	vie 21/05/21	vie 21/05/21
1169	1.4.5.15	FIN APARATOS SANITARIOS	0 días	mar 25/05/21	mar 25/05/21
1170	**1.4.5.16**	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**	**13 días**	**jue 13/05/21**	**mar 1/06/21**
1171	**1.4.5.16**	**DIVISIONES**	**13 días**	**jue 13/05/21**	**mar 1/06/21**
1172	1.4.5.16	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	13 días	jue 13/05/21	mar 1/06/21
1173	1.4.5.16	FIN DIVISIONES	0 días	mar 1/06/21	mar 1/06/21
1174	**1.4.5.17**	**PINTURA**	**9 días**	**vie 21/05/21**	**mié 2/06/21**
1175	**1.4.5.17**	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**	**9 días**	**vie 21/05/21**	**mié 2/06/21**
1176	1.4.5.17	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	4 días	vie 28/05/21	mié 2/06/21
1177	1.4.5.17	ESTUCO	5 días	vie 21/05/21	jue 27/05/21
1178	1.4.5.17	FIN PINTURA	0 días	mié 2/06/21	mié 2/06/21
1179	**1.4.5.18**	**CERRADURAS Y VIDRIOS**	**1 día**	**jue 3/06/21**	**jue 3/06/21**
1180	**1.4.5.18**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**1 día**	**jue 3/06/21**	**jue 3/06/21**
1181	1.4.5.18	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	1 día	jue 3/06/21	jue 3/06/21
1182	1.4.5.18	FIN VIDRIOS	0 días	jue 3/06/21	jue 3/06/21
1183	**1.4.5.19**	**ASEO Y VARIOS**	**5 días**	**vie 4/06/21**	**jue 10/06/21**
1184	**1.4.5.19**	**ASEO Y LIMPIEZA**	**5 días**	**vie 4/06/21**	**jue 10/06/21**
1185	1.4.5.19	ASEO GENERAL	5 días	vie 4/06/21	jue 10/06/21
1186	1.4.5.19	FIN ASEO	0 días	jue 10/06/21	jue 10/06/21
1187	1.4.5.19	FIN IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE C	0 días	jue 10/06/21	jue 10/06/21
1188	**1.4.6**	**INEM SANTIAGO PEREZ SEDE B**	**51 días**	**jue 25/02/21**	**lun 10/05/21**
1309	1.5	DIVISIONES	0 días?	dom 28/03/21	dom 28/03/21
1310	1.6	FIN OBRAS CONTRATADAS	0 días	jue 10/06/21	jue 10/06/21

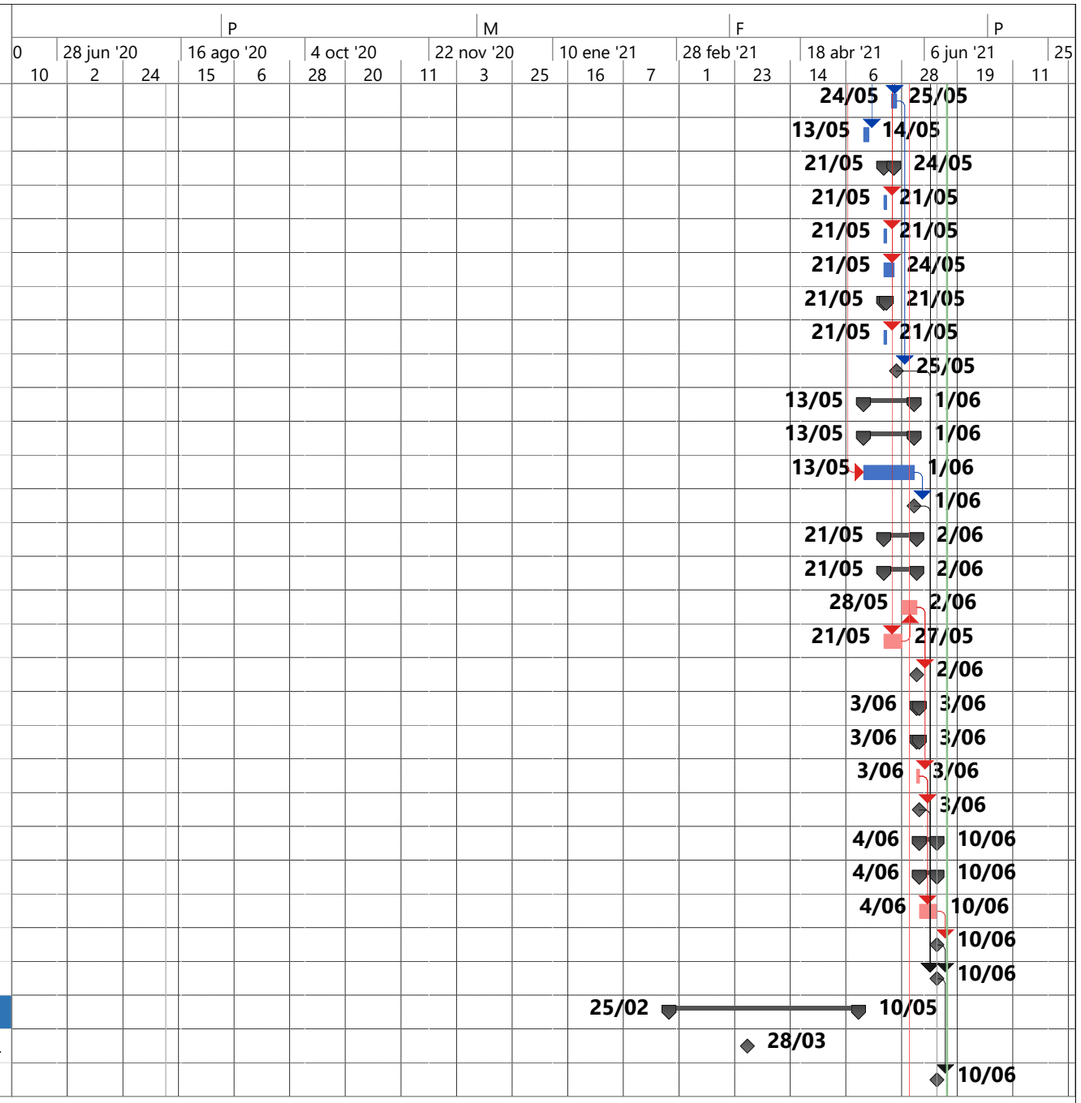


Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

SEGUIMIENTO A PROGRAMACION DE OBRA MES 3 RUFINO JOSE CUERVO SEDE C


ACUMULADO ANTERIOR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	1,97%	1,50%	-0,47%
PERIODO ACTUAL	75,18%	62,53%	-12,65%
ACUMULADO ACTUAL	77,15%	64,03%	-13,12%

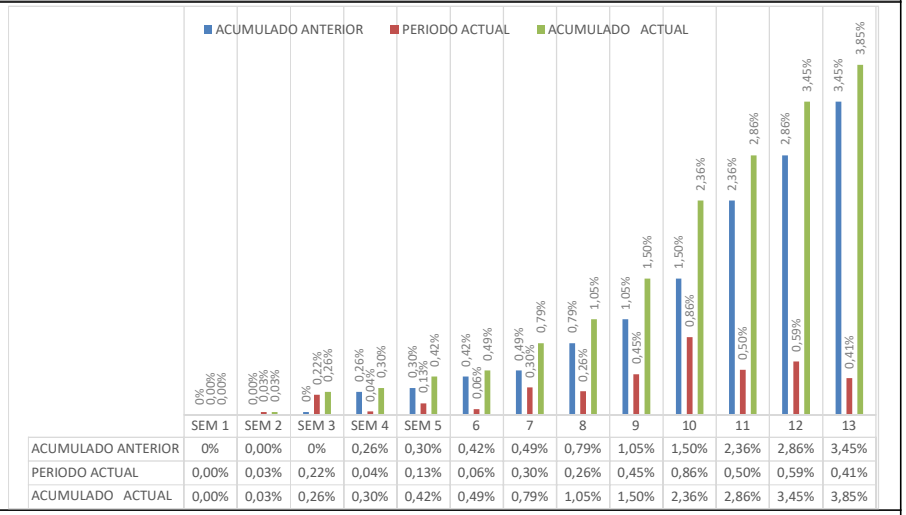

	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACUMULADO ANTERIOR	0%	0,00%	0%	0,26%	0,30%	0,42%	0,49%	0,79%	1,05%	1,50%	2,36%	2,86%	3,45%
PERIODO ACTUAL	0,00%	0,03%	0,22%	0,04%	0,13%	0,06%	0,30%	0,26%	0,45%	0,86%	0,50%	0,59%	0,41%
ACUMULADO ACTUAL	0,00%	0,03%	0,26%	0,30%	0,42%	0,49%	0,79%	1,05%	1,50%	2,36%	2,86%	3,45%	3,85%

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA MES 3


SEMANA	ACUMULADO PROGRAMADO		ACUMULADO EJECUTADO
1	$ -		$ -
2	$ 2.395.227,00		$ 450.000,00
3	$ 3.657.480,00		$ 3.580.688,00
4	$ 4.536.211,00		$ 4.125.006,00
5	$ 5.060.686,00		$ 5.925.879,00
6	$ 6.787.078,00		$ 6.821.308,00
7	$ 11.134.769,00		$ 11.050.321,00
8	$ 15.327.598,00		$ 14.689.712,00
9	$ 22.436.997,00		$ 20.951.754,00
10	$ 44.132.452,00		$ 32.910.654,00
11	$ 63.072.660,00		$ 39.875.200,00
12	$ 79.963.108,00		$ 48.110.062,00
13	$ 85.903.700,00		$ 53.760.456,00
14	$ 85.973.939,00		$ -

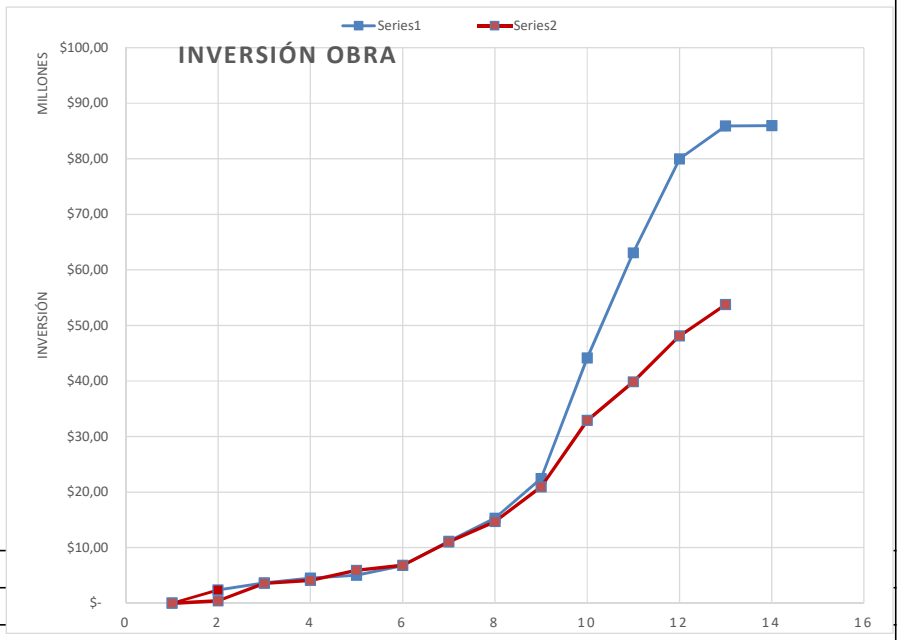

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE	DIFERENCIA
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 22.436.997	1,61%	-0,11%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 20.951.754	1,50%	

NOTA PARA EL PRESENTE PERIODO SE TENIAN PREVISTAS ENTREGAS DE DICVIOSNES DE ACERO INXIDABLE, APARATOSA SANITARIOS Y PISOS AL CIERRE DEL MES DE MAYO, SIN EMBARGO PERSISTE PARO NACIONAL QUE GENERO BLOQUEOS DE VIAS IMPIDIENDO DICHAS ENTREGAS, QUE SE ESPERA SE PUEDAN DAR EN LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**208 días?**	**lun 10/08/20**	**jue 10/06/21**
2	**1.1**	**PRECONSTRUCCION**	**15 días**	**lun 10/08/20**	**lun 31/08/20**
3	1.1.1	VERIFICACION ATERRIZAJE PRESUPUESTAL	15 días	lun 10/08/20	lun 31/08/20
4	**1.2**	**ACTA DE INICIO DE OBRA**	**0 días**	**lun 31/08/20**	**lun 31/08/20**
5	**1.3**	**FASE 1 DE EJECUCION**	**135 días**	**lun 10/08/20**	**mié 24/02/21**
744	**1.4**	**FASE 2 DE EJECUCION (Adicion presupuestal)**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
745	**1.4.1**	**INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO**	**60 días**	**jue 25/02/21**	**lun 24/05/21**
839	**1.4.2**	**IED RAFAEL URIBE URIBE**	**60 días**	**jue 25/02/21**	**lun 24/05/21**
922	**1.4.3**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE D**	**48 días**	**lun 15/03/21**	**lun 24/05/21**
923	1.4.3.1	ADECUACION DE AREAS POR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	7 días	lun 15/03/21	mié 24/03/21
924	1.4.3.2	INICIO DE OBRA - RAFAEL URIBE URIBE	0 días	mié 24/03/21	mié 24/03/21
925	**1.4.3.3**	**OBRAS PRELIMINARES**	**1 día**	**jue 25/03/21**	**jue 25/03/21**
926	1.4.3.3.	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	1 día	jue 25/03/21	jue 25/03/21
927	**1.4.3.4**	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**	**11 días**	**vie 26/03/21**	**lun 12/04/21**
928	1.4.3.4.	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOI	3 días	vie 26/03/21	mar 30/03/21
929	1.4.3.4.	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	4 días	mié 31/03/21	mar 6/04/21
930	1.4.3.4.	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	4 días	mié 7/04/21	lun 12/04/21
931	**1.4.3.5**	**VARIOS - PRELIMINARES**	**2 días**	**mar 13/04/21**	**mié 14/04/21**
932	1.4.3.5.	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	2 días	mar 13/04/21	mié 14/04/21
933	**1.4.3.6**	**PAÑETES**	**12 días**	**jue 15/04/21**	**vie 30/04/21**
934	**1.4.3.6.**	**PAÑETES SOBRE MUROS**	**12 días**	**jue 15/04/21**	**vie 30/04/21**
935	1.4.3.6.	FILOS Y DILATACIONES	12 días	jue 15/04/21	vie 30/04/21
936	1.4.3.6.	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	12 días	jue 15/04/21	vie 30/04/21
937	**1.4.3.7**	**CARPINTERIA DE METÁLICA**	**15 días**	**lun 3/05/21**	**lun 24/05/21**
938	**1.4.3.7.**	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**	**15 días**	**lun 3/05/21**	**lun 24/05/21**
939	1.4.3.7.	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MA	15 días	lun 3/05/21	lun 24/05/21
940	**1.4.3.7.**	**CARPINTERIA EN LAMINA**	**15 días**	**lun 3/05/21**	**lun 24/05/21**
941	1.4.3.7.	VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)	15 días	lun 3/05/21	lun 24/05/21
942	1.4.3.7.	FIN RUFINO JOSE CUERVO SEDE D	0 días	lun 24/05/21	lun 24/05/21
943	**1.4.4**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE B**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
1058	**1.4.5**	**IED RUFINO JOSE CUERVO SEDE C**	**73 días**	**jue 25/02/21**	**jue 10/06/21**
1188	**1.4.6**	**INEM SANTIAGO PEREZ SEDE B**	**51 días**	**jue 25/02/21**	**lun 10/05/21**
1309	1.5	DIVISIONES	0 días?	dom 28/03/21	dom 28/03/21
1310	1.6	FIN OBRAS CONTRATADAS	0 días	jue 10/06/21	jue 10/06/21

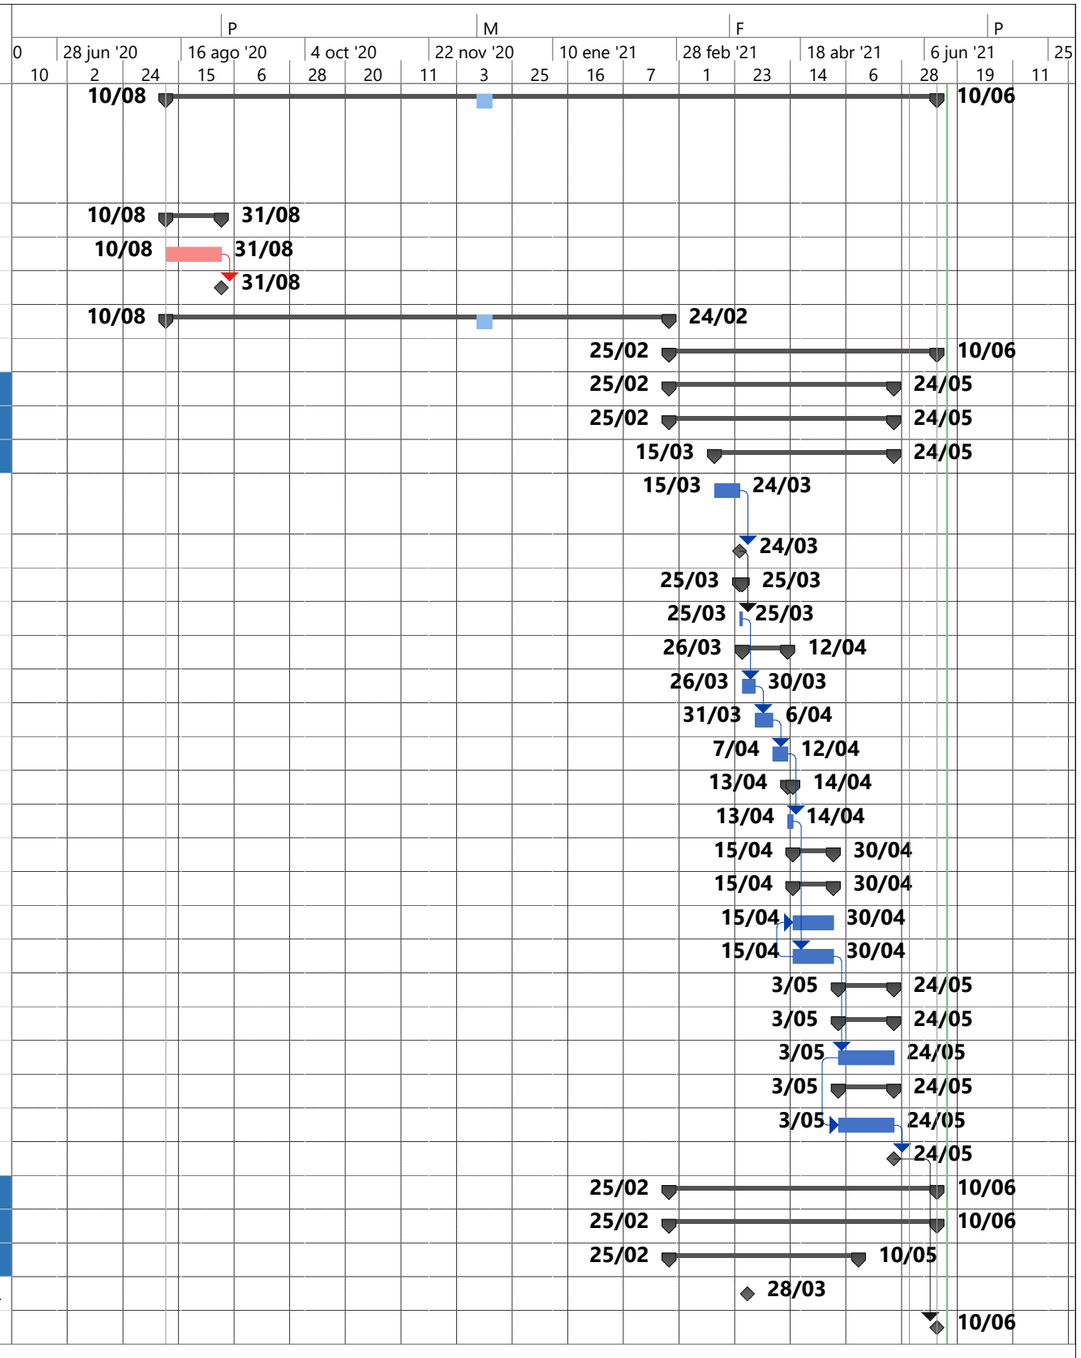


Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 15/06/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		

SEGUIMIENTO A PROGRAMACION DE OBRA MES 3 RUFINO JOSE CUERVO SEDE D


ACUMULADO ANTERIOR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	0,08%	0,00%	-0,08%
PERIODO ACTUAL	87,00%	70,81%	-16,19%
ACUMULADO ACTUAL	2,63%	2,33%	-0,30%

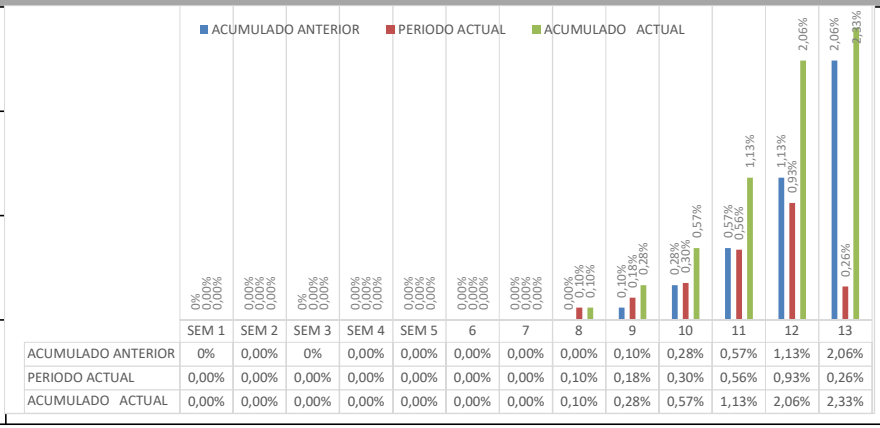

	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACUMULADO ANTERIOR	0%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,28%	0,57%	1,13%	2,06%
PERIODO ACTUAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,18%	0,30%	0,56%	0,93%	0,26%
ACUMULADO ACTUAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,28%	0,57%	1,13%	2,06%	2,33%

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA MES 3

SEMANA	ACUMULADO PROGRAMADO		ACUMULADO EJECUTADO
1	$ -		$ -
2	$ -		$ -
3	$ -		$ -
4	$ 378.645,00		$ -
5	$ 1.162.831,00		$ -
6	$ 1.990.480,00		$ -
7	$ 3.069.188,00		$ -
8	$ 3.919.043,00		$ 1.389.163,00
9	$ 4.768.898,00		$ 3.852.667,00
10	$ 15.408.512,00		$ 7.980.711,00
11	$ 26.048.126,00		$ 15.791.295,00
12	$ 34.559.817,00		$ 28.765.410,00
13	$ 36.687.740,00		$ 32.456.119,00

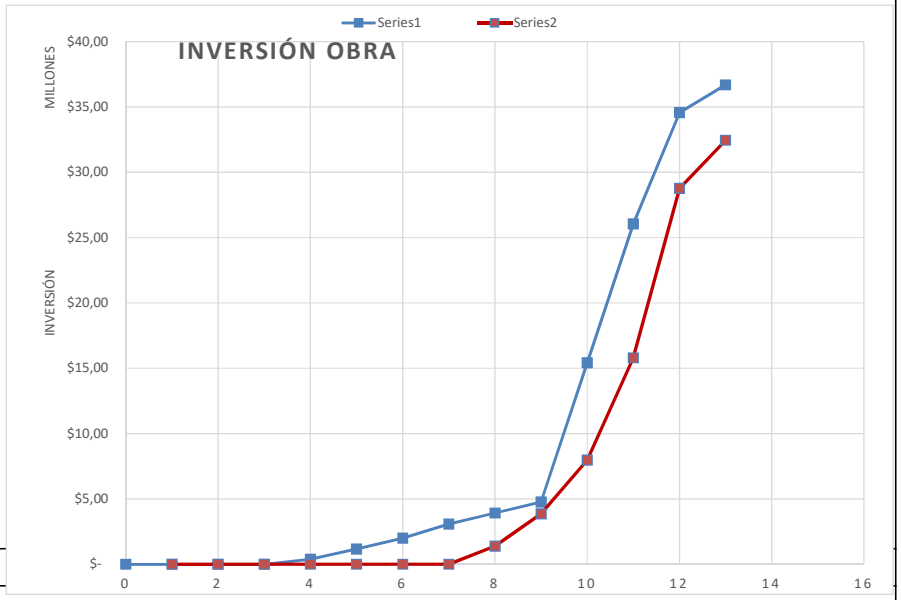

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE	DIFERENCIA
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 36.687.740	2,63%	-0,30%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 32.456.119	2,33%	

NOTA PARA EL PRESENTE PERIODO SE TENIAN PREVISTAS ENTREGAS DE MATERIALES PARA FABRICACION DE VENTANAS, REJAS Y PISOS AL CIERRE DEL MES DE MAYO, SIN EMBARGO PERSISTE PARO NACIONAL QUE GENERO BLOQUEOS DE VIAS IMPIDIENDO DICHAS ENTREGAS, QUE SE ESPERA SE PUEDAN DAR EN LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO
