Barranquilla, 15 de julio de 2021

Ingeniero
JOSE LUIS GARCIA MULFORD
Subsecretario de Vías y Construcción – Secretaría de Infraestructura
Gobernación del Departamento del Atlántico
Supervisor
E.S.D.

De acuerdo con el contrato **202100749**, me permito presentar el informe parcial de actividades realizadas, correspondientes al mes comprendido entre el **15 de junio y el 14 de julio de 2021**, conforme al objeto del contrato: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRTARÍA**.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Visitas de supervisión y seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento y adecuación llevadas a cabo en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Sede Sagrado Corazón, en el Corregimiento de Campeche, Municipio de Baranoa.
- Reunión virtual, con la ingeniera Nury Logreira, mediante la plataforma GOOGLE MEET, para seguimiento a obras de mejora en Instituciones Educativas.
- Visitas de apoyo para el seguimiento para Contraloría a Centros de Desarrollo Infantil, construidos en 21 Municipios del Departamento del Atlántico. Municipio de Galapa.
- Visitas de apoyo para el seguimiento para Contraloría a Centros de Desarrollo Infantil, construidos en 21 Municipios del Departamento del Atlántico. Municipio de Soledad.
- Elaboración y presentación de informes semanales y mensual de visitas de seguimiento y supervisión y actividades.

MARLON ENRIQUE CERRA NOLASCO
C.C. 72.303.708 de Barranquilla.

ANEXO
INFORME MENSUAL

Atlántico para la Gente

Gobernación del Atlántico

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

MEJORAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

El día, martes 16 de junio de 2021, se realizó visita de supervisión y seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento y adecuación llevadas a cabo en la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito, en el Municipio de Usiacurí, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Sede Principal y Sede Sagrado Corazón, en el Corregimiento de Campeche, Municipio de Baranoa y en la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado, en el Municipio de Baranoa.

MUNICIPIO DE USIACURÍ - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Continúan las adecuaciones en lo que será el baño de niñas y el de discapacitados, donde se puedo apreciar el reemplazo de uno de los muros por un levante a media altura con un solo acceso para el baño de niñas.



Internamente se encontró que la red sanitaria ya estaba instalada y el piso con plantilla. Levantes de muros divisorios de cubículos sanitarios iniciados.







En sitio sólo se encontraban dos trabajadores adelantando labores de excavación para conexión de red sanitaria a colector de aguas servidas.

CORREGIMIENTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SEDE PRINCIPAL.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontró una obra bastante atrasada en su ejecución con muy poco personal en obra. En la primera etapa del proyecto que es la adecuación de la batería sanitaria existente, la cubierta ya estaba instalada. La excavación para la zapata de la columna, que soportará el tanque elevado, continúa inundado y lleno de barro, debido a las lluvias, por lo que esta actividad está suspendida.





Al interior se puedo observar que los mesones en granito están terminados y pulidos, pendiente por la instalación de pocetas de lavamanos y respectiva grifería. Pisos con plantillas y paredes resanadas, ambos a la espera de la instalación de enchapes cerámicos.





Cubierta y estructura de cubierta instalada. En el espacio entre la viga y la lamina de cubierta, se contempla, según la comentado en la visita, la colocación de un levante en calados, lo que en mi opinión es acertado pues proporcionaría iluminación y sobre todo ventilación.



Los cubículos sanitarios están pendientes por acabados en cerámicas e instalación de equipos sanitarios.





En sitio sólo dos trabajadores adelantando labores de figurado y armado de acero de refuerzo para las vigas y columnas de la construcción nueva, la cual está bastante atrasada pues sigue, luego de varias semanas, con las zanjas de excavación para cimientos.





CORREGIMIENTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SEDE SAGRADO CORAZÓN.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontró una obra, aparentemente adelantada y sin personal alguno. Pues al revisar en detalle, esta pendiente la instalación de enchape cerámico en paredes.









Falta la instalación y conexión de sanitarios y pocetas de lavamanos, con sus respectivas griferías.





El tanque o alberca de agua no ha sido intervenida aún.



MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO PANTOJA MALDONADO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por el ingeniero residente de la obra Fredy Garzón. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Ya fue construida la rampa de acceso a discapacitados de esa zona y la fundida de las cintas. Están pendientes los remates de loseta en borde de piso y rampa.





Se evidenció personal en obra descargando material de piso loseta que acaba de llegar a la obra.





En algunos sectores está suspendida la fundida de la plantilla en concreto y otro ya se instaló completamente el piso en loseta.





En otra de las secciones del proyecto se continua con la fundida de plantilla en concreto, en la que se puede apreciar cada vez más el diseño de terrazas del urbanismo.









También se iniciaron los trabajos de demolición de andenes en mal estado para dar un acabado homogéneo al diseño general.





En general, las obras visitadas se encuentran con retrasos, debido principalmente a las continuas lluvias que han azotado a estos municipios en los últimos días.

El día, martes 29 de junio de 2021, se realizó visita de supervisión y seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento y adecuación llevadas a cabo en la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito, en el Municipio de Usiacurí, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Sede Sagrado Corazón y Sede Principal, en el Corregimiento de Campeche, Municipio de Baranoa y en la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado, en el Municipio de Baranoa.

MUNICIPIO DE USIACURÍ - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Continúan las adecuaciones en lo que será el baño de niñas y el de discapacitados, donde se puedo apreciar que el acceso al baño ya está terminado, con vano de ventilación y pórtico para puerta.



Igualmente se construyó el registro o colector de aguas servidas y que esta pendiente por conexión a tubería de descarga final.





Al interior del baño, se encontraron muros divisorios de módulos sanitarios totalmente levantados con paredes pañetadas. En proceso de instalación de enchape cerámico sobre muros.









La cubierta y estructura de cubierta aun no ha sido intervenida, la cual, según lo mencionado por la residente de obra, se estará realizando en la próxima semana.



El baño de discapacitados se encontró con muros pañetados y plantilla de piso, pendiente por instalación de enchapes cerámicos.





En la parte posterior de los baños se adelantaban actividades de resanes de muros y pañetes, así como trabajos de amarre de muro existente, el cual se encontraba suelto.





CORREGIMIENTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SEDE SAGRADO CORAZÓN.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontró una obra bastante adelantada y a pinto de ser finalizada, con pintura de acabado exterior. Se sugiere a la residente pintar frente del bordillo, con pintura gris basalto. Lavamanos y grifería instalada en los mesones de granito, pendiente conexión de sifones.





Se encontró personal adelantando labores de toma de detalles como emboquillado de enchape sobre muros y pisos. Pintura de acabado sobre muros.





El tanque de agua, cisterna o alberca ya fue intervenido al cual se le hizo limpieza interna y reparación de la tapa metálica de acceso. Se sugiere a la residente reforzar

los soportes de dicha tapa. Pendiente por reparar la segunda tapa que corresponde al alojamiento del equipo de bombeo.





CORREGIMIENTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SEDE PRINCIPAL.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontró personal en obra en labores o actividades de figurado de acero de refuerzo, relleno de agujero de zapada y pedestal para la columna que soportara la base del tanque elevado de los baños.





En los baños, ya fueron realizados los levantes de muros calados que sirven de cuchilla entre los muros y la cubierta, permitiendo una buena ventilación. También se observaron los muros con enchapes cerámicos instalados. Aun no se ha iniciado el

proceso de instalación de pocetas de lavamanos y grifería sobre los mesones de granito construidos.





Se retomaron los trabajos de cimentación para la construcción del nuevo bloque de batería sanitaria, con la fundida de una cama de concreto ciclópeo para nivelación y estabilización del terreno; y posterior instalación de acero de refuerzo para fundir vigas de cimentación.





La residente de obra me informó de la autorización de actividades adicionales de adecuación de la batería sanitaria en los baños de docentes, obras que fueron iniciadas con el desmonte de todos los aparatos sanitarios y la demolición de pisos.





MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO PANTOJA MALDONADO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por el ingeniero residente de la obra Fredy Garzón. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontró personal en actividades de nivelación de registros, los cuales sobresalen al nivel del piso terminado.



Continua la instalación de piso en loseta.





Fundida de plantillas en concreto e instalación de pisos en loseta para la zona de terraceo y en las diferentes rampas de accesos.





Los trabajos adicionales de andenes peatonales en concretos, solicitados por el rector, fueron iniciados, con algunos tramos ya fundidos y otro en proceso de adecuación de terreno.





El día, jueves 08 de julio de 2021, se realizó visita de supervisión y seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento y adecuación llevadas a cabo en la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito, en el Municipio de Usiacurí, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Sede Sagrado Corazón y Sede Principal, en el Corregimiento de Campeche, Municipio de Baranoa y en la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado, en el Municipio de Baranoa.

MUNICIPIO DE USIACURÍ - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Continúan las adecuaciones en lo que será el baño de niñas y el de discapacitados, donde se puedo apreciar que se inició con el levante de muros media altura que soportaran mesón de lavamanos. La red sanitaria fue conectada y el registro tapado.





Al interior del baño de niñas personal adelantando los trabajos de instalación de enchape cerámico sobre muros y fundida de mesón de lavamanos.





E inició el desmonte de la cubierta en láminas de eternit y estructura de cubierta en madera, esta última totalmente podrida o llena de comején y que será reemplazada, muy probablemente por perfilería metálica.



En la parte posterior del baño, las paredes se encontraron amarradas, resanadas y estucadas.





CORREGIMIENTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SEDE SAGRADO CORAZÓN.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontró la obra completamente finalizada, la cual, de acuerdo con las indicaciones manifestadas por la residente, sería entregada ese día.



Se encontró pisos y enchapes cerámicos instalados, así como toda la batería sanitaria, lavamanos y elementos accesorios.





Puertas metálicas restauradas y pintadas dando uniformidad a las unidades sanitarias.





Mesones en granito pulido, pocetas de lavamanos con grifería y sifones debidamente instalados y funcionales.





Tapas de acceso a la alberca o tanque de almacenamiento de agua y equipos de bombeo restauradas y aseguradas. Sistema de bombeo instalado y operando.







Se hace la observación al contratista acerca del resane de la base corona para la tapa del tanque la cual se encontró partida y el recubrimiento de la tubería de descarga de la motobomba con el fin de protegerla de golpes pues se encuentra totalmente expuesta.

CORREGIMIENTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SEDE PRINCIPAL.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontró la columna de soporte para el tanque elevado fundida.





Personal en obra trabajando en la construcción del nuevo baño, con cimentación fundida (zapatas y vigas de amarre), acero de refuerzo para columnas anclado a zapatas. El personal se encontraba en el proceso de encofrado de columnas para su posterior fundida.

MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO PANTOJA MALDONADO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por el ingeniero residente de la obra Fredy Garzón. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontraron registro nivelados con el piso en loseta, los cuales sobresalían del nivel del piso terminado.





Adecuación del andén lateral y construcción de rampa para discapacitados.

Continúan las actividades de instalación de pisos en loseta y nivelación de registros.





Nivelación y adecuación de andenes con rampas de discapacitados.





Continúan las labores de adecuación para andenes requeridos por el rector con el trazado de dichos senderos, relleno y compactación.





Informe presentado elaborado y presentado por:

Marlon Enrique Cerra Nolasco
Ingeniero Mecánico y Civil.
Profesional de Apoyo - Contratista
Gobernación del Atlántico – Sec. De Infraestructura.
Firmado Electrónicamente. 14-07-2021

INFORME DE SEGUIMIENTO PARA CONTRALORÍA A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL – CDI DE 21 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL(CDI)

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	LAS MERCEDES
COMENTARIOS:	SE EVIDENCIÓ DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE Y ESTUCO POR FILTRACION EN LA CUBIERTA DE PASILLOS Y AULAS.		

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	LAS MERCEDES
COMENTARIOS:	SE EVIDENCIÓ QUE LOS VENTILADORES DE PARED ESTAN SIENDO USADOS SOBRE SILLAS PUES LAS BASES QUE LOS SOPORTAN EN LAS PARDES ESTAN PARTIDAS.		

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	LAS MERCEDES
COMENTARIOS:	PUERTAS EN MADERA DETERIORADAS, MUY PROBABLEMEMENTE POR HUMEDAD O GOLPES.		

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	LAS MERCEDES
COMENTARIOS:	PARQUES INFANTILES CON DETERIORIORS O DESGASTES EN PINTURA Y SIN ELEMENTOS COMO MALLA DE CUERDA. TAMPOCO TENÍA LISTONES DE MADERA EN BARANDAS DE PUENTE.		

FOTO No. 5



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	LAS MERCEDES
COMENTARIOS:	CARPINTERIA METALICA DE DIVISIONES DE BAÑOS CON PINTURA DETERIORADA.		

FOTO No. 6



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	LAS MERCEDES
COMENTARIOS:	ESTACIONES MANUALES DE SISTEMA CONTRA INCENDIO ACCIONADAS Y DETERIORADAS.		

FOTO No. 7



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	LAS MERCEDES
COMENTARIOS:	CONTROLADOR DES SISTEMA CONTRA INCENDIOS FUERA DE SERVICIO.		

FOTO No. 8



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	LAS MERCEDES
COMENTARIOS:	PUNTO ELECTRICOS EN MAL ESTADO Y CON INDICIOS DE HUMEDAD.		

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL(CDI)

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	CASTILLO DE COLORES
COMENTARIOS:	DETERIORO DE LA CUBIERTA INFERIOR CON DESPRENDIMIENTOS DE PAÑETE Y ESTUCO DEBIDO A FILTRACIONES Y HUMEDADES EN LA CUBIERTA SUPERIOR. ESTO SE EVIDENCIÓ SOBRE TODO EN PASILLOS.		

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	CASTILLO DE COLORES
COMENTARIOS:	GRIETAS SOBRE MUROS Y CUBIERTAS.		

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	CASTILLO DE COLORES
COMENTARIOS:	REGISTROS O PUNTOS DE CONTROL DE AGUAS TOTALMENTE DETERIORADOS.		

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	CASTILLO DE COLORES
COMENTARIOS:	CONTROLADOR DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS FUERA DE SERVICIO.		

FOTO No. 5



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	CASTILLO DE COLORES
COMENTARIOS:	ESTACIONES MANUALES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS ACCIONADAS Y DETERIUORADAS CON INDICIOS DE HUMEDAD.		

FOTO No. 6



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	CASTILLO DE COLORES
COMENTARIOS:	CERRADURAS DAÑADAS. PUERTAS CON SISTEMAS DE CERRADO IMPROVISADOS MEDIANTE CADENA Y CANDADO.		

FOTO No. 7



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	CASTILLO DE COLORES
COMENTARIOS:	DESPERNDOIMIENTO DE LOSA HORIZONTAL DE PASILLOS EN LA JUNTA CON EL BLOQUE DEL MODULO.		

FOTO No. 8



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	CASTILLO DE COLORES
COMENTARIOS:	ENCHAPE CERÁMICO EN COCINA BASTANTE DETERIORADO.		

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL(CDI)

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	MUNDO FELIZ
COMENTARIOS:	DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE Y ESTUCO EN CUBIERTA INFERIOR DEBIDO A FILTRACIONES Y HUMEDADES EN CUBIERTA SUPERIOR. ESTO SE EVIDENCIÓ EN PASILLOS Y AULAS.		

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	MUNDO FELIZ
COMENTARIOS:	FILTRACIONES EN CUBIRTA INFERIOR EN PUNTOS DE DRENAJE DE AGUAS DE CUBIERDA SUPERIOS (GARGOLAS), MUY PROBABLEMENTE POR OBSTRUCCIÓN DE ESTAS.		

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	MUNDO FELIZ
COMENTARIOS:	DETERIORO DE LAS DIVISIONES METÁLICAS DE LOS MÓDULOS SANITARIOS EN BAÑOS.		

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	MUNDO FELIZ
COMENTARIOS:	DETERIOROR DE LA ESTRUCTURA METÁLICA POR OXIDACIÓN DE PARQUES INFANTILES.		

FOTO No. 5



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	MUNDO FELIZ
COMENTARIOS:	CERRADURAS DE PUERTAS EN MAL ESTADO CON IMPROVISACIÓN DE SEGURIDAD CON EL USO DE CADENAS Y CANDADOS. TAMBIEN SE EVIDENCIÓ EL DESAJUSTE DE PUESRTAS LAS CUALES ESTABAN AMARRADAS CON ALAMBRES.		

FOTO No. 6



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	MUNDO FELIZ
COMENTARIOS:	DESPRENDIMIENTO DE CRISTANAC EN BASE DE BEBEDEROS.		

FOTO No. 7



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	MUNDO FELIZ
COMENTARIOS:	FALTA DE PLANTILLA Y PISO EN BALDOS DE GRANITO AL PATRECER POR UNA REPARACIÓN SIN TERMINAR.		

FOTO No. 8



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	29/06/2021		
UBICACIÓN:	GALAPA	**SECTOR:**	MUNDO FELIZ
COMENTARIOS:	DETERIORO DE COLUMNAS METÁLICA POR OXIDACIÓN.		

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL(CDI)

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	ALMENDROS
COMENTARIOS:	INSTALACIONES EN MAL ESTADO GENERAL, CON MUCHOS DETERIOROS VISIBLES.		

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	ALMENDROS
COMENTARIOS:	SISTEMA DE BOMBE NO OPERA.		

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	ALMENDROS
COMENTARIOS:	PARQUE INFANTIL DETERIORADO EN PINTURA Y POR OXIDACIÓN.		

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	ALMENDROS
COMENTARIOS:	CERRAMIENTO PERIMETRAL COMPLETAMENTE DETERIORADO, CON GRAN CANTIDAD DE POSTES CAIDOS Y/O PODRIDOS DE LA BASE A PUNTO DE CARESE, SOSTENODOS POR ALAMBRES IMPROVISADOS.		

FOTO No. 5



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	ALMENDROS
COMENTARIOS:	CERRAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DETERIORADO POR OXIDACIÓN Y LE HACEN FALTA ALGUNAS LÁMINAS DE LA CUBIERTA. LA PLNATA COMO TAL NO HA SIDO ENCENDIDA EN MUCHO TIEMPO Y NO CUENTA CON COMBUSTIBLE.		

FOTO No. 6



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	ALMENDROS
COMENTARIOS:	DETERIORO DE CUBIERTA INFERIOR EN PASILLOS Y SOBRE TODO AL INTERIOR DE LAS DIFERENTES AULAS DEBIDO A FILTRACIONES Y HUMEDADES QUE TAMBIEN SE EVIDENCIAN EN PAREDES MUY PARTICULARMENTE EN LAS ZONAS DONDE SE ENCUENTRAN LOS PUNTOS ELECTRICOS COMO TOMAS, INTERRUPTORES Y LAMPARAS.		

FOTO No. 7



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	ALMENDROS
COMENTARIOS:	DETERIOROR DE CUBIERTAS Y MUROS POR FIRLTRACIONES.		


FOTO No. 8



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	ALMENDROS
COMENTARIOS:	DETERIORO DE MUROS DE COCINAS POR FILTRACIONES.		

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL(CDI)

FOTO No. 1

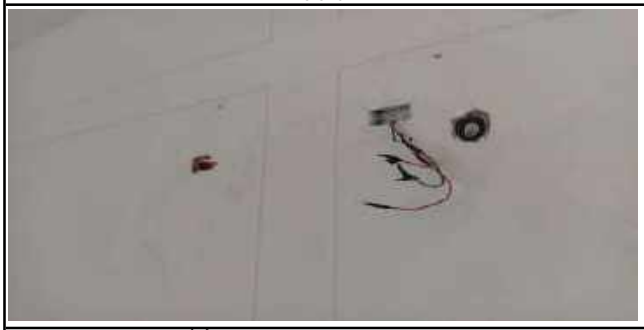

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	LOS ROBLES
COMENTARIOS:	DETERIORO DE PUNTO ELECTRICOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULA MULTIPLE AL PARECER POR UNA MALA DESINSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS. PERFORACIÓN DE MUROS SIN RESANAR.		

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	LOS ROBLES
COMENTARIOS:	DETERIORO DEL CUARTO DE MOTOBOMBAS. EQUIPOS DE BOMBEO SIN OPERACIÓN NO SE SABE LA RAZÓN.		

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	LOS ROBLES
COMENTARIOS:	ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA CON RASGOS DE OXIDACIÓN Y CON GRAN CANTIDAD DE POLVO LO QUE POTENCIALIZA LA GENERACIÓNDE OXIDO.		

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	LOS ROBLES
COMENTARIOS:	DETERIORO DE CIELOS RASOS AL INTERIOR DE AULAS CON DESPRENDIMIENTO DE LÁMINAS DEBIDO A FILTRACIONES.		

FOTO No. 5



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	LOS ROBLES
COMENTARIOS:	DETERIORO DE CIELOS RASOS AL INTERIOR DE AULAS CON DESPRENDIMIENTO DE LÁMINAS DEBIDO A FILTRACIONES.		

FOTO No. 6



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	LOS ROBLES
COMENTARIOS:	DETERIOR DE LAS PAREDES EXTERIORES O FACHADAS CON DESPRENDIMIENTO DE ESTUCO Y EN AGUNOS SECTORES DE PAÑETE, DEBIDO A HUMEDADES.		

FOTO No. 7



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	LOS ROBLES
COMENTARIOS:	SUBESTACIÓN ELECTRICA CON ELEMENTOS OBSTRUCTIVOS QUE NO HACEN PARTE DE ESTA Y SE OBSERVARON TAPAS DE GABINETES SIN PROPOSITO APARENTE. CERRADURAS DE GABINETES SIN LLAVES Y ABIERTAS.		

FOTO No. 8



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	2/07/2021		
UBICACIÓN:	SOLEDAD	**SECTOR:**	LOS ROBLES
COMENTARIOS:	DETERIORO DE MUROS DE CONTENCIÓN CON DESTPRESNDIMIENTO DE ESTUCO DEBIDOD A FILTRACIONES Y HUMEDADES.		
