BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	1.1		**HOJA No.**	1 de	313
UNIDAD	MES	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	1.1.3	ALQUILER BODEGA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	



LOCALIZACION	LARGO	DESCRIPCION	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
CALLE 12 B N 3 - 28		MES 2 DICIEMBRE - 3 ENERO				0,93	0,93

Cantidad pagadas en los cortes	9,50	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	0,93
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	8,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**9,50**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**0,93**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 9,50 MES / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: ,50 MES EJECUTADOS EN OBRA / TOTAL ITEM: 12,0 MES EJECUTADOS Y PENDIENTES POR COBRAR: 2,0 MES.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	1.1		HOJA No.	2 de	313
UNIDAD	MES	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	1.1.3	ALQUILER BODEGA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-2019		
CAPITULO	2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	**HOJA No.**	3	**de**	313
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	Volumen 2		
ITEM No.	2.1.2	DESMONTAR Y RETIRAR PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA	**CORTE No. 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

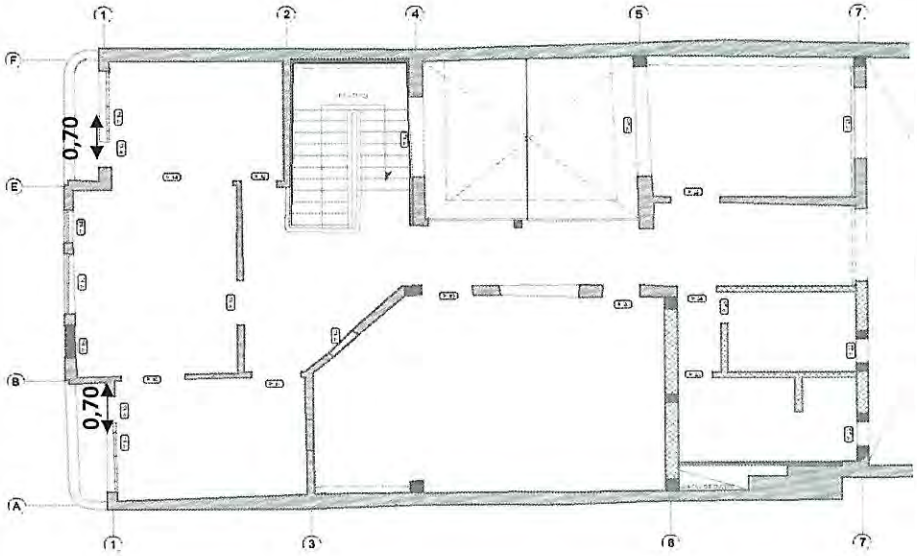

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	%	Cant.	SUB TOTAL
SEGUNDO PISO MAYOR CANTIDADES YA PAGADAS							
PUERTA FACHADA SEGUNDO PISO		0,70	2,220			-1,00	-1,55
PUERTA FACHADA SEGUNDO PISO		0,70	2,22			-1,00	-1,55

Cantidad pagadas en los cortes	18,44	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	-3,11
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	11,12
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	18,44	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	-3,11

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**			VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO(8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-2019	
CAPITULO	2	DESMONTES Y DEMOLICIONES		**HOJA No.**	4	**de**	313
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**		**ZONA**	Volumen 2		
ITEM No.	2.1.2	DESMONTAR Y RETIRAR VENTANAS EN MADERA		**CORTE No. 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2	DEMOLICIONES	**HOJA No.**	5 de 313	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.2.3	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO DE CONTRAPISO (e=0.10m a 0.12m)	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

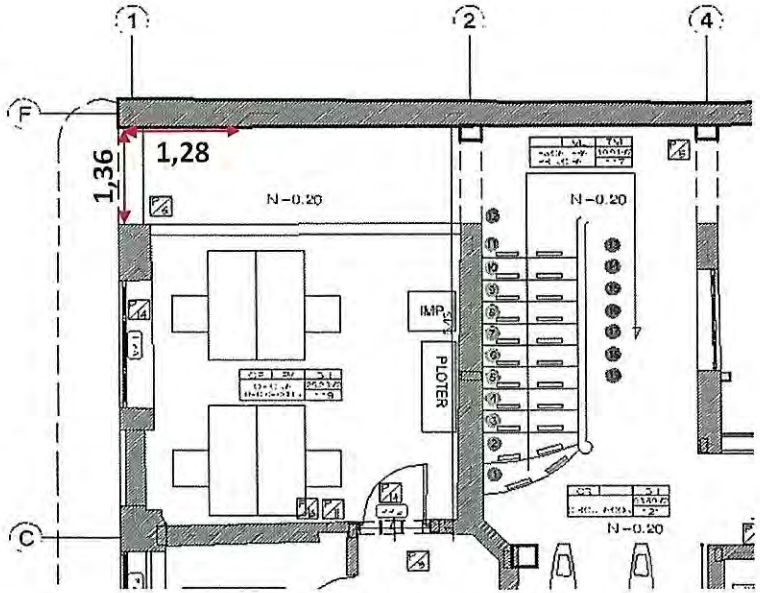

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN UNO ACCESO MOVILIDAD REDUCIDA	DEMOLICION DE PISO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA ACCESO	1,28	1,36		1,0	1,74
VOLUMEN UNO ACCESO MOVILIDAD REDUCIDA	DEMOLICION DE ALISTADO PLACA PARA CONSTRUCCION DE RAMPA ACCESO	1,28	1,36		1,00	1,74

Cantidad pagadas en los cortes	170,51	Cantidad de la Ficha No. 3 / 3	3,48
		Vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	88,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**170,51**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**3,48**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 170,51 M2 / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 3,48 M2 EJECUTADOS EN OBRA PENDIENTES POR COBRAR / TOTAL ITEM: 173,99 M2 EJECUTADOS EN OBRA PENDIENTE POR COBRAR: 3,48 M2..

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		**VIGENCIA DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES**				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		**CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019**	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		**CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019**		
CAPITULO	2.2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	**HOJA No.**		6	de	313
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	VOLUMEN 2			
ITEM No.	2.2.3	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO DE CONTRAPISO (e=0.10m a 0.12m)	**CORTE 11**	Periodo del 10 1/21 al 3/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		**VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES**		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	**HOJA No.**	7 de	313
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.7.1	PROTECCION PARA PISOS CON ESTERILLA DE GUADUA (Circulaciones)	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

SEGUNDA PLANTA

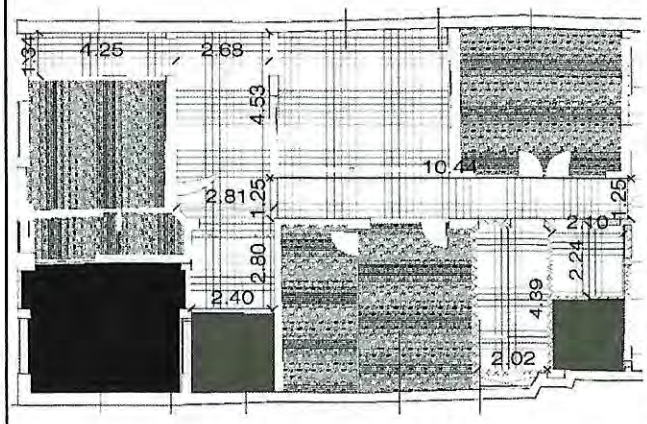

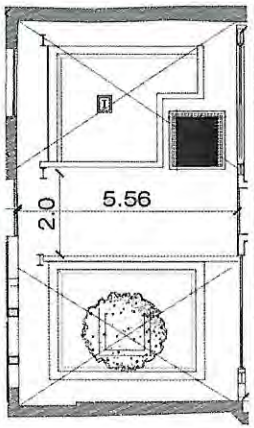

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PASILLO ACCESO	PROTECCION BALDOSIN 20X20	4,25	1,34			1,00	5,70
PASILLO ESCALERAS	PROTECCION BALDOSIN 20X20	4,53	2,68			1,00	12,14
ACCESO ESCALERAS	PROTECCION BALDOSIN 20X20	1,25	2,81			1,00	3,51
ZONA TORNIQUETES	PROTECCION BALDOSIN 20X20	2,80	2,40			1,00	6,72
HALL CIRCULACION	PROTECCION BALDOSIN 20X20	10,44	1,25			1,00	13,05
SEGUNDA PLANTA TRANSICION ENTRE VOLUMEN 1 Y 2							
PUENTE METALICO VOLUMEN 1 - 2	PROTECCION PARA PISOS CON ESTERILLA GUADUA	5,560	2,00			1,00	11,12

Cantidad pagadas en los cortes	110,23	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	52,24
		Vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	107,34
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**110,23**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**52,24**
		CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	**-57,99**

OBSERVACIONES: TOTAL CANTIDAD ADICON 1: 110,23 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 57,99 M2 COBRADOS / CANTIDAD TOTAL ITEM: 52,24 M2 EJECUTADOS CANTIDAD NO EJECUTADA: 57,99 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-2019		
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	HOJA No.	8	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	VOLUMEN 2		
ITEM No.	2.7.1	PROTECCION PARA PISOS CON ESTERILLA DE GUADUA (Circulaciones)	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	HOJA No.	9	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	2.7.3	PROTECCION DE PISOS PARA OFICINAS (Carton corrugado y plastico)	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

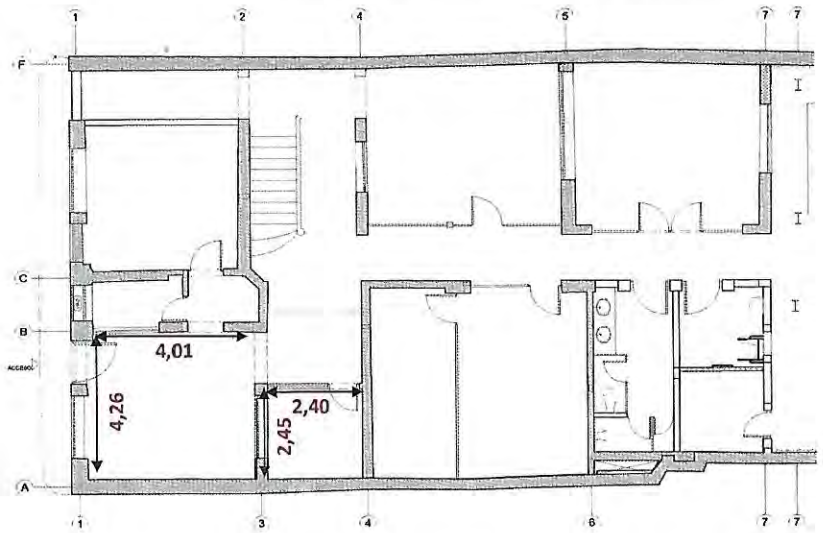

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA							
RECEPCION	PROTECCION SOBRE PISO	4,01	4,26			1,00	17,08
CUARTO ELECTRICO	PROTECCION SOBRE PISO	2,45	2,40			1,00	5,88

Cantidad pagadas en los cortes	343,69	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	22,96
		Vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	386,23
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**343,69**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**22,96**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 386,23 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 19,58 M2 NO EJECUTADOS EN OBRA NI COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES / TOTAL CANTIDAD ITEM: 366,65 M2 EJECUTADOS EN OBRA / PENDIENTE POR COBRAR 22,96 M2 EJECUTADOS EN OBRA.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO


PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	HOJA No.	10	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	2.7.3	PROTECCION DE PISOS PARA OFICINAS (carton corrugado y plastico)	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO







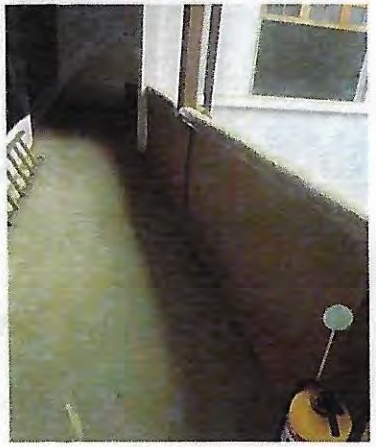

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO MVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	HOJA No.	11	de	313
UNIDAD	KG/MES	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	2.7.4	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

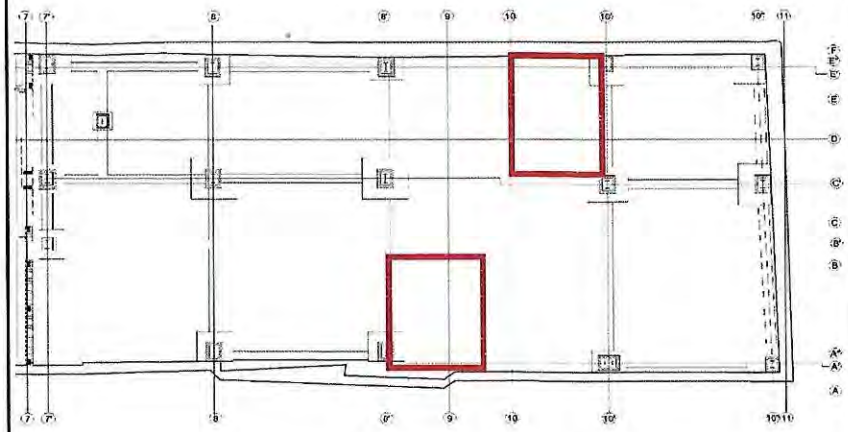

LOCALIZACION	DESCRIPCION	PESO UNITARIO	LARGO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	ANDAMIO CON ESCALERA ACCESO NIVEL 2						
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	HORIZONTAL 3,0 M	8,50	3,00			30,00	255,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	HORIZONTAL 1.40	6,00	1,40			60,00	360,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	DIAGONAL 3.0	11,50	3,00			8,00	92,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	ESCALERA 3 M	64,40				4,00	257,60
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	TORNILLO NIVELADOR	3,50				8,00	28,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PLATAFORMA 1.40 M	12,00	1,40			6,00	72,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	VERTICAL 1 M SIN ESPIGO	4,84				8,00	38,72
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	BASE DE COLLAR	1,60	0,25			8,00	12,80
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PASADOR VERTICAL	0,13	0,25			20,00	2,60
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	VERTICAL 1 MT CON ESPIGO	5,50				16,00	88,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PASAMANOS	2,50				4,00	10,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PASAMANOS EN Z	2,50				8,00	20,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PLATAFORMA 3 MT	21,50				8,00	172,00

Cantidad pagadas en los cortes	15.441,31	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	1.408,72
		Pasan	1408,72
Cantidad pagada Corte No. 10	1980,81	Cantidad Contractual	12.500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**15.441,31**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 15441,31 KG / TOTAL CANTIDAD ITEM: 17777,68 KG EJECUTADOS EN OBRA / PENDIENTES POR COBRAR: 2336,37 KG EN PRESENTE ACTA.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	**HOJA No.**	12 **de**	313
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.7.4	ALQUILER ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	PESO UNITARIO	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
FACHADAS / PATIOS	VERTICAL 2.0 MT CON ESPIGO	11,00				12,00	132,00
FACHADAS / PATIOS	HORIZONTAL DE 0,73 M	3,85				9,00	34,65
FACHADAS / PATIOS	PLATAFORMA DE 2,07*0,32 M	18,20				6,00	109,20
FACHADAS / PATIOS	PLATAFORMA DE 2.07*0,62 CON PUERTA	35,39				6,00	212,34
FACHADAS / PATIOS	VERTICAL DE 1 M SIN ESPIGO	4,84				12,00	58,08
FACHADAS / PATIOS	HORIZONTAL DE 0,73 M	3,85				14,00	53,90
FACHADAS / PATIOS	VERTICAL 2.0 MT CON ESPIGO	11,00				9,00	99,00
FACHADAS / PATIOS	RUEDAS	6,66				28,00	186,48
FACHADAS / PATIOS	RODAPIE 0,65	7,00				6,00	42,00

Cantidad pagadas en los cortes	15.441,31	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	927,65
		Vienen	1408,72
Cantidad pagada Corte No. 10	1980,81	Cantidad Contractual	12.500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**15.441,31**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**2336,37**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 15441,31 KG / TOTAL CANTIDAD ITEM: 17777,68 KG EJECUTADOS EN OBRA / PENDIENTES POR COBRAR: 2336,37 KG EN PRESENTE ACTA.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	IDPC INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2.7	DESMONTES Y DEMOLICIONES	HOJA No.		11	de	313
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	VOLUMEN 2			
ITEM No.	2.7.4	ALQUILER ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2,8	VARIOS	**HOJA No.**	12 **de**	313
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.8.1	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	PESO UNITARIO	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
Volumen 2-3				56,00		1,00	56,00

Cantidad pagadas en los cortes	301,00	Cantidad de la Ficha No. 1	56,00
		Vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	21,00	Cantidad Contractual	420,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**301,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**56,00**

OBSERVACIONES: RETIRO DE ESCOMBRO REALIZADODURANTE EL MES DE ENERO DE 2021

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	IDP INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 510-510-2019		
CAPITULO	2,8	VARIOS	HOJA No.		13	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	2.8.1	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

Link de verificación

Certificación No.: CERT-851-2021

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
NIT: 900.459.311-1

SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTERILES LAS MANAS
(Residuos de construcción y demolición) PIN 8418-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO 1480 DE 2014 ANLA

CERTIFICA QUE

La firma ANGIE KATHERINE ROMERO DUQUINO identificada con NIT. 1020801063-1, ingreso al sitio de recepcionación morfológica Minas las Manas durante el periodo comprendido entre el día 07 de enero de 2021 hasta el día 25 de enero de 2021, ingresando un total de (6) Viajes para un volumen de CINCUENTA Y SEIS M3. (56 M3) sueltos de material, como se relaciona a continuación, provenientes de la obra CONSORCIO CASA TITO. PIN OBRA. 18853

Id	Descripción Viaje	Total M3	Total Viajes
5	Sencillo- Demolición, Concreto, Mamposteria	56.0	6.0

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 20 de abril de 2021

NICOLE STHEFANNY GUZMAN LAVERDE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO

YURY DAYANA OTALORA MUÑOZ
ASISTENTE DE FACTURACION

Bogotá Cra 17 # 162-05
Tel 762 3000
Cel 321-455-8769
gerencia@maquinasamarillas.com
www.maquinasamarillas.com

MÁQUINAS AMARILLAS

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios

www.cdinfra.com

OBSERVACIONES: RETIRO DE ESCOMBRO REALIZADODURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3	CIMENTACION	**HOJA No.**	14	**de**	313	
UNIDAD	M3	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

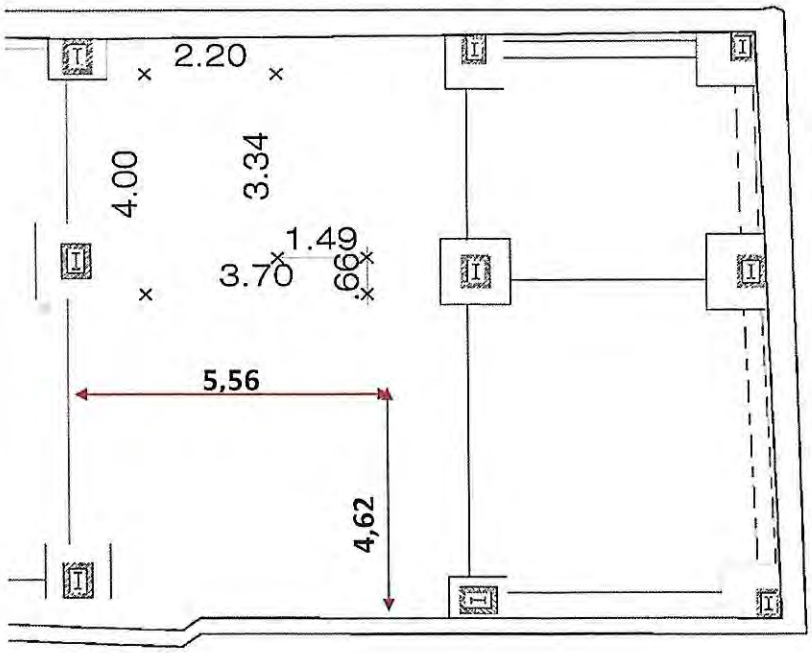

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 3 COSTADO OCCIDENTAL	4,62	5,56	0,45			1,00	11,58
PATIO 3 COSTADO ORIENTAL	2,30	3,70	0,45			1,00	3,83

Cantidad pagadas en los cortes	144,07	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	15,40
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	56,96
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**144,07**	**CANT. A PAGAR EN PRESENTE ACTA**	**15,40**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION #1: 152,1 M3 / TOTAL CANTIDAD ITEM: 159,47 M3 EJECUTADOS EN OBRA Y COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 7.37 M3 EJECUTADOS EN OBRA Y COBRADOS: 144,07 EN ACTAS ANTERIORES / CANTIDD PENDIENTE POR COBRAR EN ACTA 11: 15,40 M3.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	IDPC INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.1	CIMENTACION	HOJA No.		15	de	313
UNIDAD	M3	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	16 de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2	
ITEM No.	3.2.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA CIMENTACION E:3 A 5CM	CORTA 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

ZAPATAS

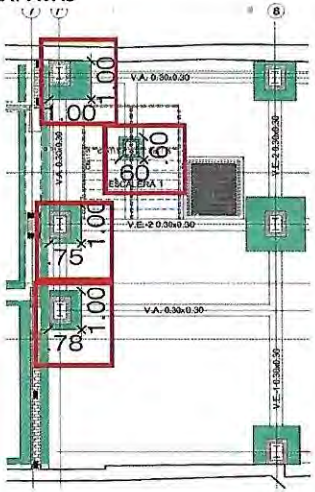

VIGAS

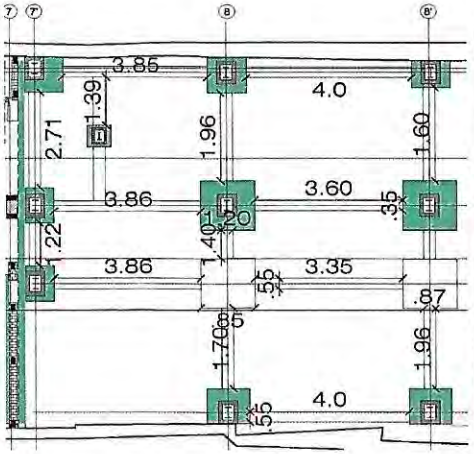

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	%	Cant.	SUB TOTAL
ZAPATA E" (7-7")	1,00	1,00				1,00	1,00
ZAPATA B" (7-7")	0,75	1,00				1,00	0,75
ZAPATA C" (7-7")	0,78	1,00				1,00	0,78
ZAPATA SOPORTE ESCALERA	0,60	0,60				1,00	0,36
SOLDADO SOBRE VIGAS CIMENTACION							
EJE 7" (E-C)	2,71	0,35				1,00	0,95
EJE 7" (C-B)	1,22	0,35				1,00	0,43
EJE ESCALERA	1,39	0,35				1,00	0,49
EJE ESCALERA	1,53	0,35				1,00	0,54
EJE 8 (E-C)	1,96	0,35				1,00	0,69
EJE 8 (C-B)	1,40	1,20				1,00	1,68
EJE 8 (B-A)	1,70	0,85				1,00	1,45
EJE 8" (E-C)	1,60	0,35				1,00	0,56
EJE 8" (C-B)	1,96	0,87				1,00	1,71
EJE E (7-8)	3,85	0,35				1,00	1,35
EJE E (8-9)	4,00	0,35				1,00	1,40
EJE C (7-8)	3,86	0,35				1,00	1,35
EJE C (8-9)	3,60	0,35				1,00	1,26
EJE B (7-8)	3,86	0,35				1,00	1,35
EJE B (8-9	3,35	0,55				1,00	1,84
EJE A (7-8)	4,00	0,55				1,00	2,20

Cantidad pagadas en los cortes	31,97	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	22,12
		Vienen	
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	32,10
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	31,97	CANT. A OAGAR EN PRESENTE CORTE	22,12

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 51,97 M2 / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 2,11 M2 EJECUTADOS EN OBRA PENDIENTES POR COBRAR EN ACTAS ANTERIORES / TOTAL CANTIDAD ITEM: 54,08 M2 EJECUTADOS EN OBRA Y PENDIENTES POR COBRAR EN ACTA 11: 22,11 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019			
CAPITULO	3.2	VARIOS	HOJA No.	17	de	313	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	VOLUMEN 2			
ITEM No.	3.2.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA CIMENTACION E:3 A 5 CM	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3,2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	18	de	313
UNIDAD	M3	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2 Y 3		
ITEM No.	3,2,4	VIGAS DE CIMENTACION. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

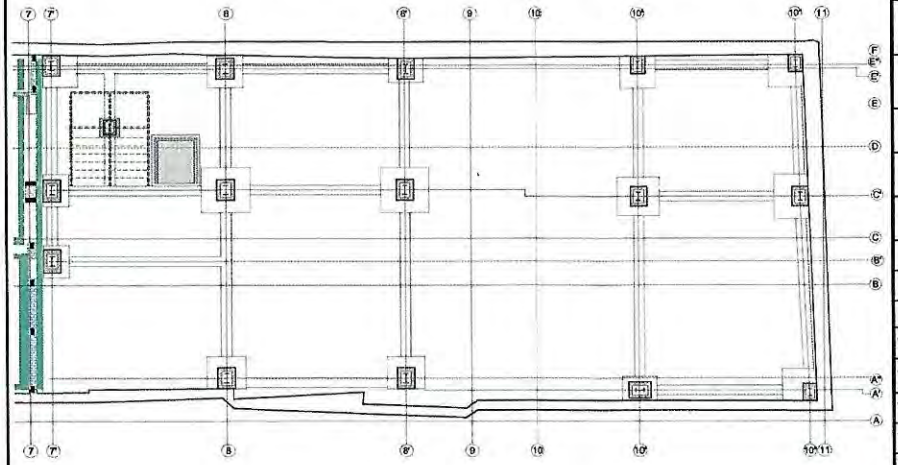



LOCALIZACION	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
VOLUMEN 3						
VIGA 10´E´-10´´ E	1	4,08	0,35	0,35	1,00	0,50
VIGA 10´´E´- 10´´ C´	1	3,48	0,35	0,35	1,00	0,43
VIGA 10´´C´-10´C´	1	4,14	0,35	0,35	1,00	0,51
VIGA 10´C´- 10´E´	1	3,52	0,35	0,35	1,00	0,43
VIGA 10´C´-10´A´	1	5,60	0,35	0,35	1,00	0,69
VIGA 10´A´- 10´´A´	1	4,38	0,35	0,35	1,00	0,54
VIGA 10´´A´- 10´´C´	1	5,62	0,35	0,35	1,00	0,69
VOLUMEN 2						
VIGA 8E´- 8E´´	1	4,71	0,35	0,35	1,00	0,58
VIGA 8E´- 8C´	1	2,91	0,35	0,35	1,00	0,36
VIGA 8C´-8A´	1	5,35	0,35	0,35	1,00	0,66
VIGA 8A´- 8´A´	1	4,76	0,35	0,35	1,00	0,58
VIGA 8´A´8´C´	1	5,40	0,35	0,35	1,00	0,66
VIGA 8´C´-8´E´	1	2,91	0,35	0,35	1,00	0,36

Cantidad pagadas en los cortes	11,24	Cantidad de la Ficha No. 1	6,97
		Pasan / vienen	6,97
Cantidad pagada Corte No. 10	0,79	Cantidad Contractual	6,99
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	11,24	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES: SE PAGARON EN ACTAS ANTERIORES: 11,24 M3 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD EJECUTADA DE: 0,82 M3 NO EJECUTADOS EN OBRA / TOTAL CANTIDAD ITEM: 10,42 M3 EJECUTADOS EN OBRA Y YA COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	19 de	313
UNIDAD	M3	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	3.2.4	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO GRIS - 21 MPA	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

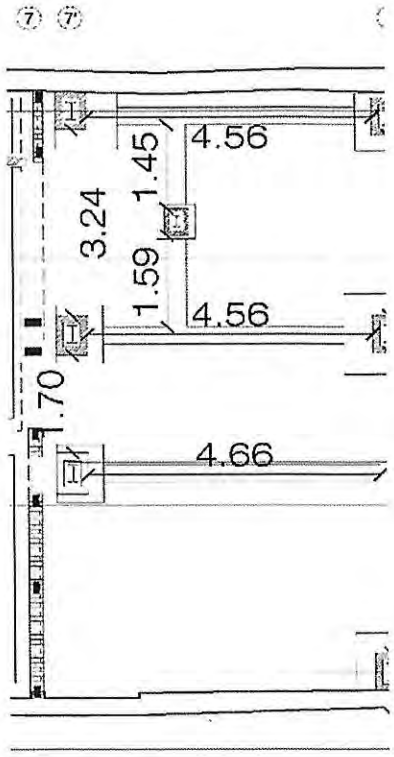

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
EJE E" (7"-8)	4,56	0,35	0,35			1,00	0,56
EJE C`(7"-8)	4,56	0,35	0,35			1,00	0,56
EJE B`(7"-8)	4,66	0,35	0,35			1,00	0,57
EJE ESCALERA (E`-C`)	3,04	0,35	0,35			1,00	0,37
EJE 7" (E`-C`)	3,24	0,35	0,35			1,00	0,40
EJE 7" (C-B)	1,70	0,35	0,35			1,00	0,21

Cantidad pagadas en los cortes	11,24	Cantidad de la Ficha No. 2 /3	2,67
		Pasan / vienen	9,63
Cantidad pagada Corte No. 10	0,79	Cantidad Contractual	6,99
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	11,24	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES: SE PAGARON EN ACTAS ANTERIORES: 11,24 M3 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD EJECUTADA DE: 0,82 M3 NO EJECUTADOS EN OBRA / TOTAL CANTIDAD ITEM: 10,42 M3 EJECUTADOS EN OBRA Y YA COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	**HOJA No.**	20	**de**	313	
UNIDAD	M3	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	3.2.4	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 21 Mpa	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

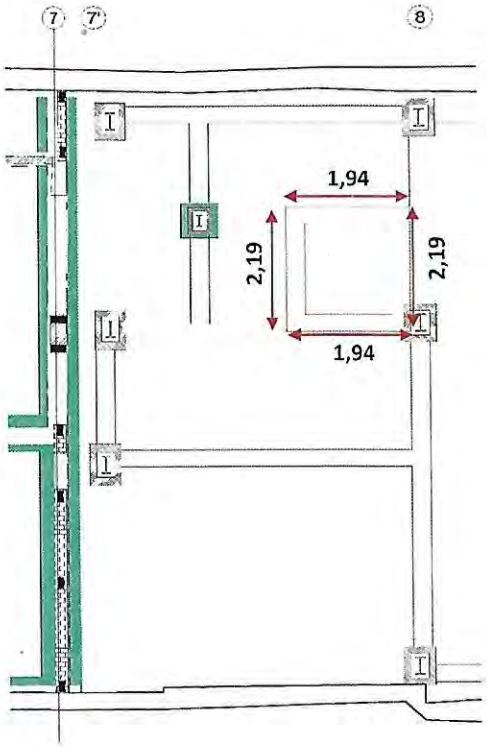

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 / PUNTO FIJO	VIGAS DE CONFINAMIENTO PLATAFORMA ASCENSOR	2,19	0,30	0,32		2,00	0,42
PATIO 2 / PUNTO FIJO	VIGAS DE CONFINAMIENTO PLATAFORMA ASCENSOR	1,94	0,30	0,32		2,00	0,37

Cantidad pagadas en los cortes	11,24	Cantidad de la Ficha No. 3 / 3	0,79
		Vienen	9,63
Cantidad pagada Corte No. 10	0,79	Cantidad Contractual	6,99
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11,24**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**10,42**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	**-0,82**

OBSERVACIONES: SE PAGARON EN ACTAS ANTERIORES: 11,24 M3 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD EJECUTADA DE: 0,82 M3 NO EJECUTADOS EN OBRA / TOTAL CANTIDAD ITEM: 10,42 M3 EJECUTADOS EN OBRA Y YA COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.		22	de	313
UNIDAD	M3	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	3.2.4	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO GRIS - 21 MPA	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.		23	de	313
UNIDAD	M3	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	3.2.4	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 21 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	**HOJA No.**	24	**de**	313
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	Volumen 2		
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

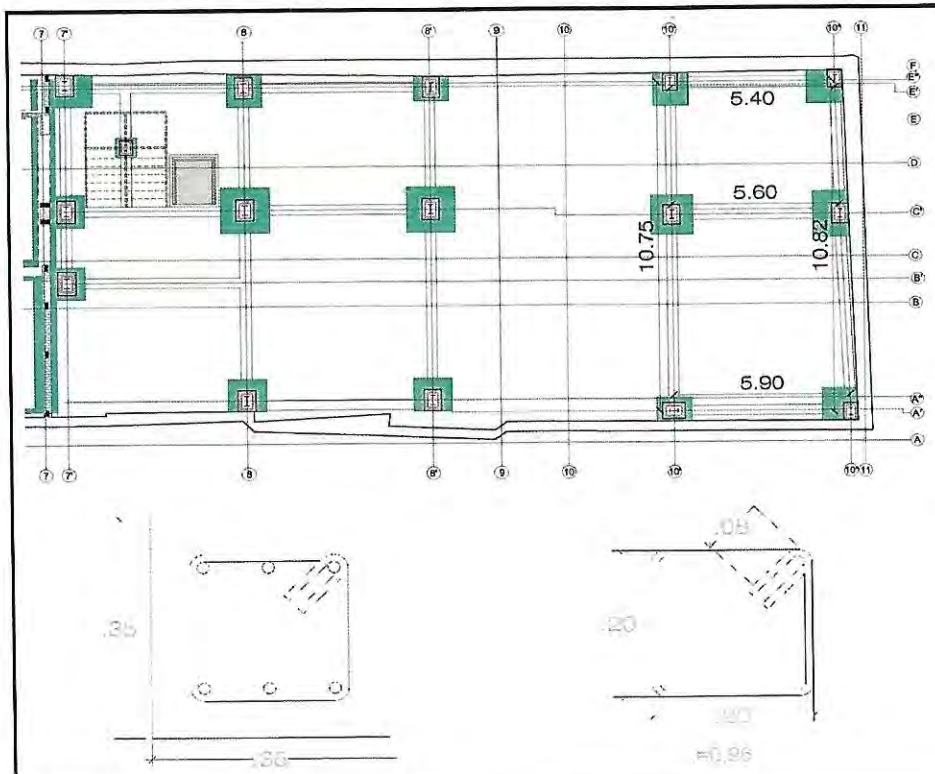
5.40
5.60
10.75
10.82
5.90
.35
.20
.35
.20
.20
.20

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	25 de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	


CORTE

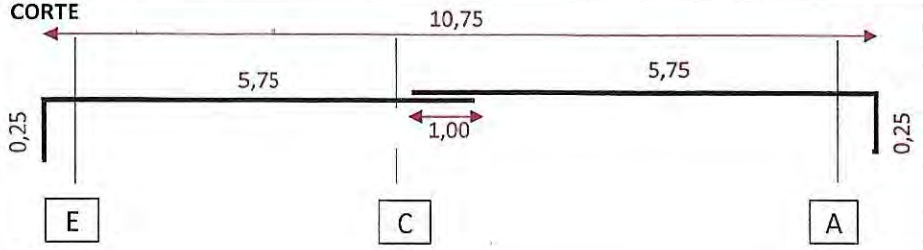

PLANTA



CORTE



PLANTA



LOCALIZACION	LARGO	MEDIDA * M	# VARILLA X TRAMO	# DE VARILLAS	%	Cant.	SUB TOTAL
VARILLA 5/8" VIGA EJE 10` VOLUMEN 3	9,04	6,00	6,00	2,00		12,00	12,00
VARILLA 5/8" VIGA EJE 10" VOLUMEN 3	9,21	6,00	6,00	2,00		12,00	12,00
VARILLA 5/8" VIGA EJE E` VOLUMEN 3	4,17	6,00	3,00	2,00		6,00	6,00
VARILLA 5/8" VIGA EJE C` VOLUMEN 3	4,23	6,00	3,00	2,00		6,00	6,00
VARILLA 5/8" VIGA EJE A` VOLUMEN 3	3,66	6,00	3,00	2,00		6,00	6,00
TOTAL METROS DE VARILLA 5/8" PARA REFUERZO VIGAS VOLUMEN 3							42,00
PESO DE VARILLA 5/8" REFUERZO DE VIGAS X 6M							1,552
TOTAL KILOGRAMOS VARILLA 5/8" PARA VIGAS							65,18
TOTAL PESO VARILLA 3/8" ESTRIBOS DE VIGAS							108,63
TOTAL FINAL ACERO DE REFUERZO VIGAS							173,82
ALAMBRE NEGRO 40 KG X TONELADA							6,95
TOTAL FINAL ACERO DE REFUERZO VIGAS CON ALAMBRE							180,77

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 2 / 5	180,77
		Pasan / vienen	289,40
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES						
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019					
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	26	de				313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2					
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21					

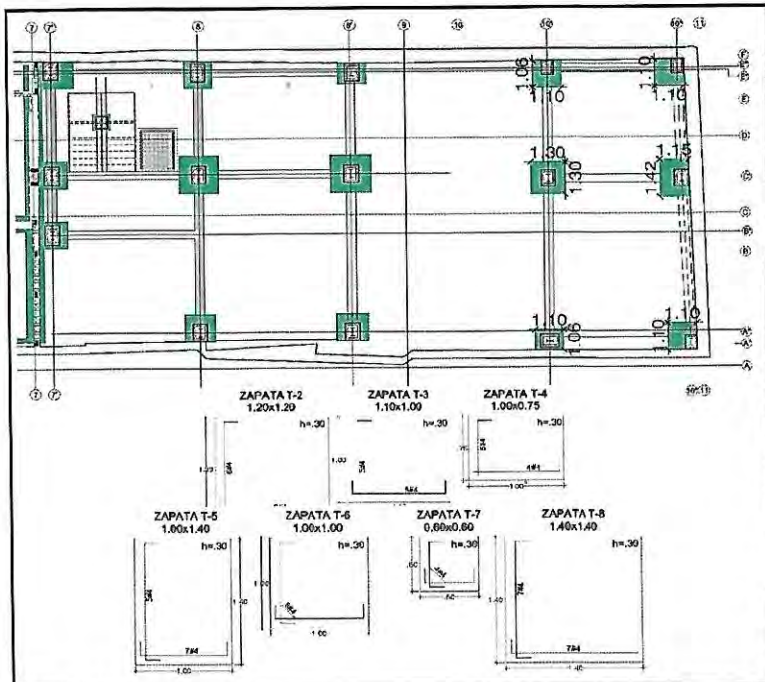

LOCALIZACION	TIPO	SENTIDO EN X	LONGITUD		SENTIDO EN Y			ML X ZAPATAS	CANTIDAD	SUB TOTAL
VARILLA 1/2"ZAPATA 10`E`	TIPO 6	7,00	1,30	9,10	7,00	1,30	9,10	18,20	1,00	18,20
VARILLA 1/2" ZAPATA 10`E`	TIPO 6	7,00	1,30	9,10	7,00	1,30	9,10	18,20	1,00	18,20
VARILLA 1/2" ZAPATA 10C`	TIPO 2	6,00	1,50	9,00	6,00	1,50	9,00	18,00	1,00	18,00
VARILLA 1/2" ZAPATA 10`C`	TIPO 5	7,00	1,70	11,90	9,00	1,40	12,60	24,50	1,00	24,50
VARILLA 1/2" ZAPATA 10A`	TIPO 4	7,00	1,30	9,10	7,00	1,30	9,10	18,20	1,00	18,20
VARILLA 1/2" ZAPATA 10"A`	TIPO 6	7,00	1,30	9,10	7,00	1,30	9,10	18,20	1,00	18,20
TOTAL METROS DE VARILLA 1/2" PARA REFUERZO DE VIGAS VOLUMEN 3										115,30
PESO DE VARILLA 1/2" PARA REFUERZO DE VIGAS VOLUMEN 3										0,99
TOTAL KILOGRAMOS VARILLA DE REFUERZO 1/2" PARA VIGAS VOLUMEN 3										114,15
ALAMBRE NEGRO 40 KG X TONELADA										4,57
TOTAL FINAL KILOGRAMOS VARILLA DE REFUERZO 1/2" PARA ZAPATAS										118,71

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 3 / 5	118,71
		Pasan / vienen	408,11
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	27	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2		
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

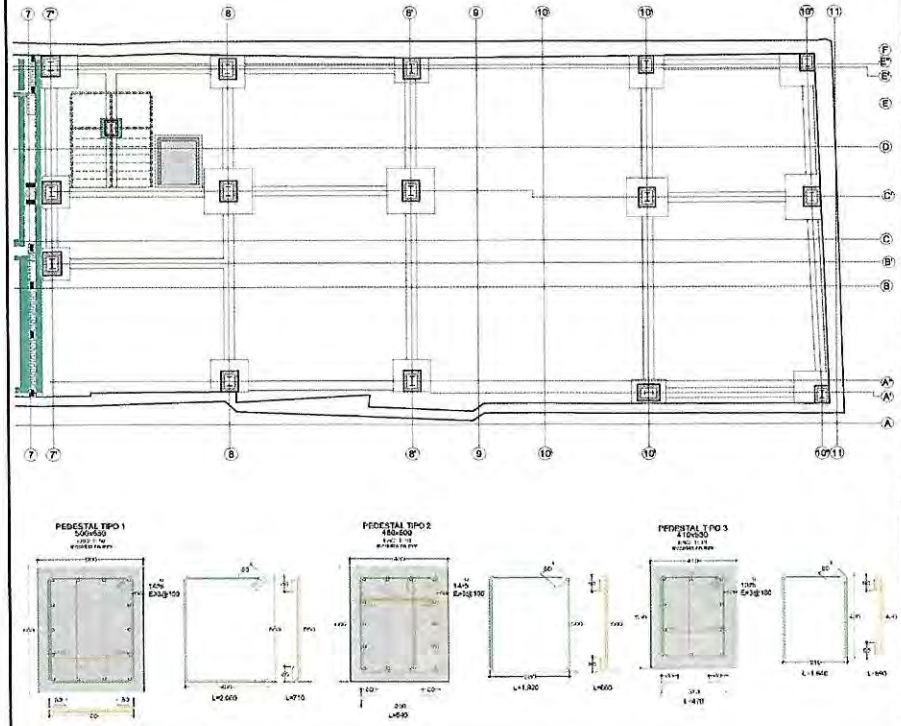

LOCALIZACION	TIPO	LONGITUD	# VARILLAS	ML X UN	CANTIDAD	SUB TOTAL
VARILLA 5/8" PEDESTAL 10E`	1,00	1,40	10,00	14,00	1,00	14,00
VARILLA 5/8" PEDESTAL 10`E`	3,00	1,40	10,00	14,00	1,00	14,00
VARILLA 5/8" PEDESTAL 10C`	2,00	1,40	14,00	19,60	1,00	19,60
VARILLA 5/8" PEDESTAL 10`C`	2,00	1,40	14,00	19,60	1,00	19,60
VARILLA 5/8" PEDESTAL 10A`	1,00	1,40	14,00	19,60	1,00	19,60
VARILLA 5/8" PEDESTAL 10`A`	3,00	1,40	10,00	14,00	1,00	14,00
TOTAL METROS DE VARILLA 5/8" REFUERZO DE PEDESTALES						100,80
PESO DE VARILLA 5/8" PARA REFUERZO DE PEDESTALES						1,55
TOTAL KILOGRAMOS VARILLA 5/8" REFUERZO PEDESTALES						156,44

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 4 / 5	156,44
		Pasan / vienen	564,55
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	28	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

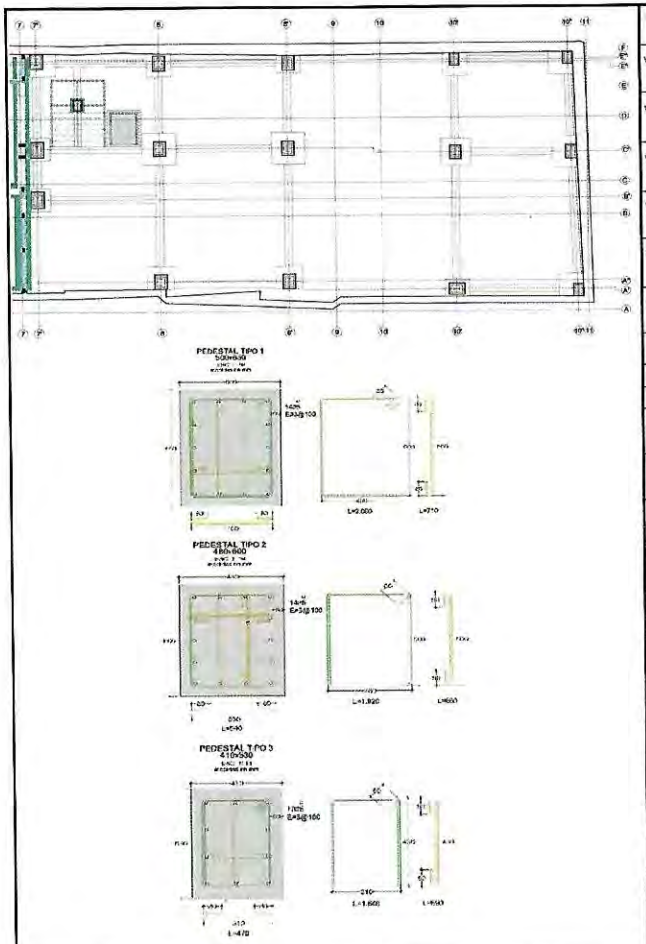

LOCALIZACION	DISTANCIA	SECCIONES	ESTRIBOS	MEDIDA ESTRIBOS	# GANCHOS	TIPO PEDESTAL	SUB TOTAL
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 10'E'	1,00	0,10	10,00	1,64		3	16,40
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 10'E'	1,00	0,10	10,00	1,64		3	16,40
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 10'C'	1,00	0,10	10,00	1,92		2	19,20
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 10'C'	1,00	0,10	10,00	1,92		2	19,20
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 10A'	1,00	0,10	10,00	2,06		1	20,60
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 10'A'	1,00	0,10	10,00	1,64		3	16,40
TOTAL METROS DE VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTALES							108,20
PESO DE VARILLA 3/8" PARA ESTRIBOS PEDESTALES							0,56
TOTAL FINAL KILOGRAMOS VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTALES							60,59
VARILLA 3/8" GANCHOS PEDESTAL 10E'	1,00	0,10	10,00	1,06	1,00	3,00	10,60
VARILLA 3/8" GANCHOS PEDESTAL 10'E'	1,00	0,10	10,00	1,06	1,00	3,00	10,60
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 10C'	1,00	0,10	10,00	2,40	1,00	2,00	24,00
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 10'C'	1,00	0,10	10,00	2,40	2,00	2,00	48,00
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 10A'	1,00	0,10	10,00	2,54	2,00	1,00	50,80
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 10'A'	1,00	0,10	10,00	1,06	1,00	3,00	10,60
TOTAL METROS DE VARILLA 3/8" GANCHOS PEDESTALES							154,60
PESO DE VARILLA 3/8" PARA ESTRIBOS PEDESTALES							0,56
TOTAL FINAL KILOGRAMOS VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTALES							86,58
TOTAL KG ACERO REFUERZO PEDESTALES VOLUMEN 3							156,44
ALAMBRE NEGRO 40KG X TONELADA PARA REFUERZO, GANCHOS Y ESTRIBOS PEDESTALES							92,83
TOTAL FINAL KG ACERO DE REFUERZO PARA PEDESTALES							249,28

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 5 / 5			249,28
		Pasan / vienen			813,83
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual			5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE			

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
			HOJA No.	29 de	313
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	ZONA	Volumen 2	
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN			
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

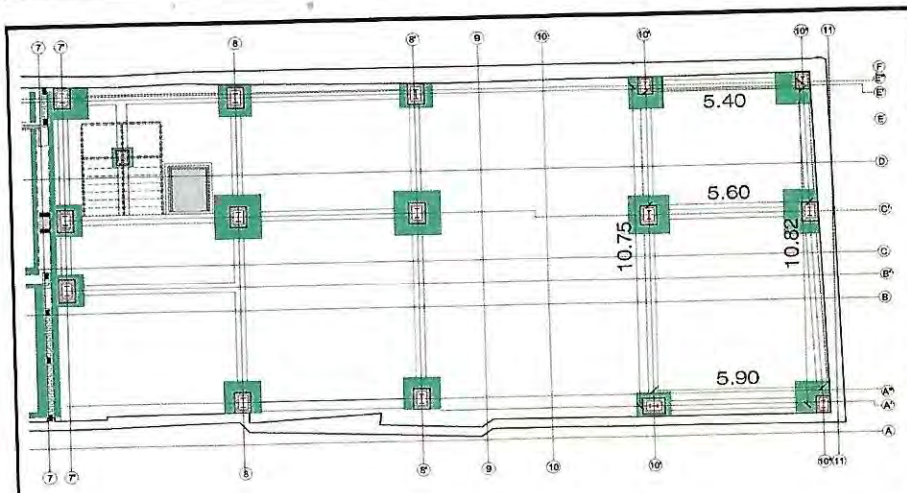

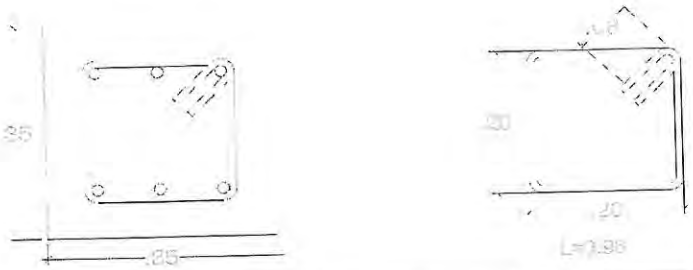

LOCALIZACION	LARGO	SECCIONES	ESTRIBOS	MEDIDA ESTRIBOS	%	Cant.	SUB TOTAL
VOLUMEN 2							
ESTRIBOS VIGA EJE 8E´-8´E´ VARILLA 3/8"	4,85	0,15	32	0,96		1,00	31,04
ESTRIBOS VIGA EJE 8A´-8´A´ VARILLA 3/8"	4,80	0,15	32	0,96		1,00	30,72
ESTRIBOS VIGA EJE 8E´-8C´ VARILLA 3/8"	3,35	0,15	22	0,96		1,00	21,44
ESTRIBOS VIGA EJE 8´E´-8´C´ VARILLA 3/8"	3,35	0,15	22	0,96		1,00	21,44
ESTRIBOS VIGA EJE 8´C´-8´A´ VARILLA 3/8"	5,23	0,15	35	0,96		1,00	33,47
ESTRIBOS VIGA EJE 8C´-8A´ VARILLA 3/8"	5,23	0,15	35	0,96		1,00	33,47
TOTAL METROS DE VARILLA 3/8" PARA ESTRIBOS DE VIGAS VOLUMEN 2							171,58
PESO DE VARILLA 3/8" PARA ESTRIBOS DE VIGAS							0,56
TOTAL KG DE VARILLA 3/8 PARA ESTRIBOS DE VIGAS							96,09

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 1 / 5	96,09
		Pasan / vienen	909,92
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	30	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2		
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		


CORTE

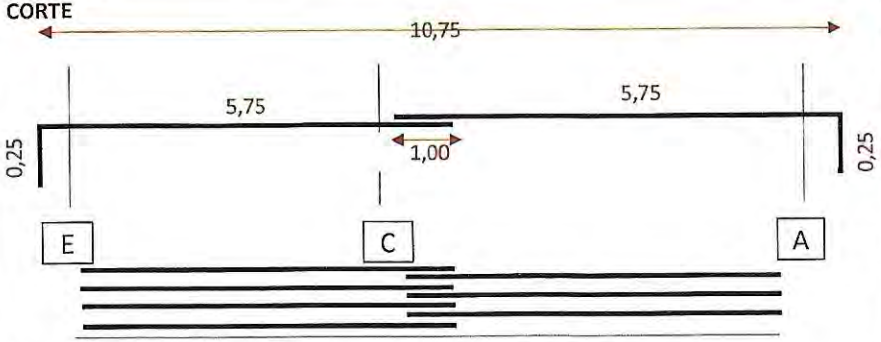

CORTE



PLANTA



LOCALIZACION	LARGO	MEDIDA * M	# VARILLA X TRAMO	# DE VARILLAS	%	Cant.	SUB TOTAL
VOLUMEN 2							
VARILLA 5/8" VIGA 8E´-8´E´ VOLUMEN 2	5,60	6,00	3,00	2,00		12,60	12,60
VARILLA 5/8" VIGA 8A-8´A´ VOLUMEN 2	5,60	6,00	3,00	2,00		12,00	12,00
VARILLA 5/8" VIGA 8E´-8´A´ VOLUMEN 2	10,39	6,00	6,00	2,00		12,00	12,00
VARILLA 5/8" VIGA 8´E´-8´A´ VOLUMEN 2	10,39	6,00	6,00	2,00		12,00	12,00
TOTAL METROS DE VARILLA 5/8" PARA REFUERZO VIGAS VOLUMEN 3							48,60
PESO DE VARILLA 5/8" REFUERZO DE VIGAS X 6M							1,552
TOTAL KILOGRAMOS VARILLA 5/8" PARA VIGAS							75,43
TOTAL PESO VARILLA 3/8" ESTRIBOS DE VIGAS							
TOTAL FINAL ACERO DE REFUERZO VIGAS							75,43
ALAMBRE NEGRO 40 KG X TONELADA							3,02
TOTAL FINAL ACERO DE REFUERZO VIGAS CON ALAMBRE							78,44

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 2 / 5	78,44
		Pasan / vienen	988,36
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES								
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019							
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	31	de						313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2							
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21							

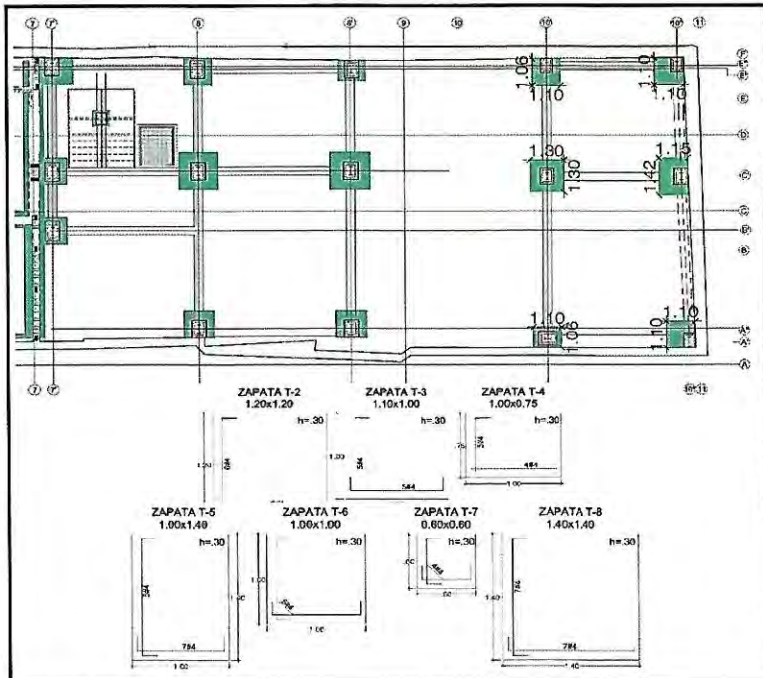

LOCALIZACION	TIPO	SENTIDO EN X	LONGITUD		SENTIDO EN Y			ML X ZAPATAS	CANTIDAD	SUB TOTAL
VARILLA 1/2"ZAPATA 8E`	AJUSTE DE DISEÑO	7,00	1,70	11,90	7,00	1,50	10,50	22,40	2,00	44,80
VARILLA 1/2" ZAPATA 8`E`	TIPO 4	7,00	1,80	12,60	7,00	1,60	11,20	23,80	1,00	23,80
VARILLA 1/2" ZAPATA 8C`	TIPO 8	7,00	1,80	12,60	7,00	1,80	12,60	25,20	1,00	25,20
VARILLA 1/2" ZAPATA 8`C`	TIPO 8	7,00	1,80	12,60	7,00	1,80	12,60	25,20	1,00	25,20
VARILLA 1/2" ZAPATA 8`A`	TIPO 3	7,00	1,50	10,50	7,00	1,40	9,80	20,30	1,00	20,30
VARILLA 1/2" ZAPATA 8`A`	TIPO 3	7,00	1,50	10,50	7,00	1,40	9,80	20,30	1,00	20,30

TOTAL METROS DE VARILLA 1/2" PARA REFUERZO DE VIGAS VOLUMEN 2			159,60
PESO DE VARILLA 1/2" PARA REFUERZO DE VIGAS VOLUMEN 2			0,99
TOTAL KILOGRAMOS VARILLA DE REFUERZO 1/2" PARA VIGAS VOLUMEN 2			158,00
ALAMBRE NEGRO 40 KG X TONELADA			6,32
TOTAL FINAL KILOGRAMOS VARILLA DE REFUERZO 1/2" PARA ZAPATAS VOLUMEN 2			164,32
Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 3 / 5	164,32
		Pasan / vienen	1152,68
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	32	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2		
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

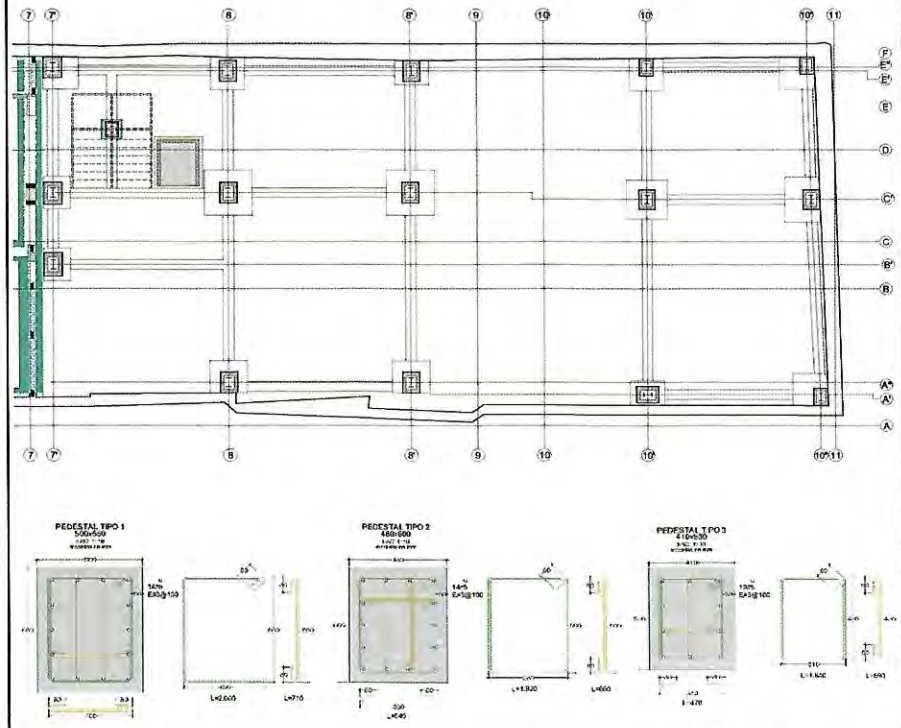

LOCALIZACION	TIPO	LONGITUD	# VARILLAS	ML X UN	CANTIDAD	SUB TOTAL
VARILLA 5/8" PEDESTAL 8-E`	1,00	1,40	14,00	19,60	1,00	19,60
VARILLA 5/8" PEDESTAL 8`E`	1,00	1,40	14,00	19,60	1,00	19,60
VARILLA 5/-8" PEDESTAL 8-C`	1,00	1,40	14,00	19,60	1,00	19,60
VARILLA 5/8" PEDESTAL 8`-C`	1,00	1,40	14,00	19,60	1,00	19,60
VARILLA 5/8" PEDESTAL 10A`	1,00	1,40	14,00	19,60	1,00	19,60
VARILLA 5/8" PEDESTAL 10`A`	1,00	1,40	14,00	19,60	1,00	19,60
TOTAL METROS DE VARILLA 5/8" REFUERZO DE PEDESTALES						117,60
PESO DE VARILLA 5/8" PARA REFUERZO DE PEDESTALES						1,55
TOTAL KILOGRAMOS VARILLA 5/8" REFUERZO PEDESTALES						182,52

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 4 / 5	182,52
		Pasan / vienen	1335,20
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**3.400,23**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	33		DE	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2			
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

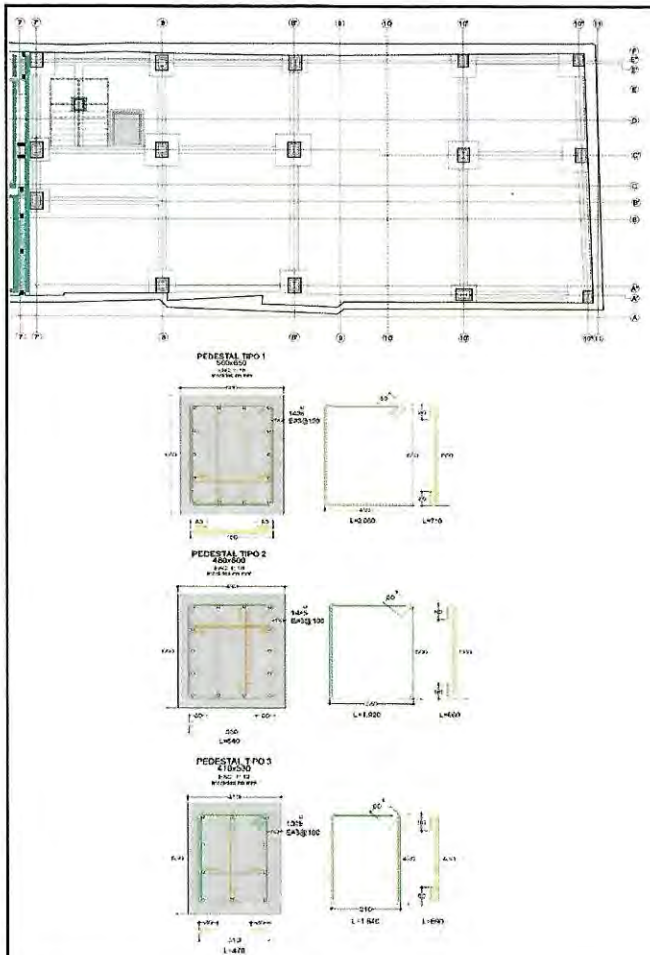

LOCALIZACION	DISTANCIA	SECCIONES	ESTRIBOS	MEDIDA ESTRIBOS	# GANCHOS	TIPO PEDESTAL	SUB TOTAL
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8E`	1,30	0,10	13,00	2,06		1	26,78
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8`E`	0,60	0,10	6,00	2,06		1	12,36
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8 `C`	0,60	0,10	6,00	2,06		1	12,36
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8C`	1,20	0,10	12,00	2,06		1	24,72
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8A`	1,20	0,10	12,00	2,06		1	24,72
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8`A`	1,00	0,10	10,00	2,06		1	20,60
TOTAL METROS DE VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTALES							121,54
PESO DE VARILLA 3/8" PARA ESTRIBOS PEDESTALES							0,56
TOTAL FINAL KILOGRAMOS VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTALES							68,06
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8E`	1,30	0,10	13,00	2,54	1,00	1,00	33,02
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8`E`	0,60	0,10	6,00	2,54	1,00	1,00	15,24
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8 `C`	0,60	0,10	6,00	2,54	1,00	1,00	15,24
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8C`	1,20	0,10	12,00	2,54	1,00	1,00	30,48
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8A`	1,20	0,10	12,00	2,54	1,00	1,00	30,48
VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTAL 8`A`	1,00	0,10	10,00	2,54	1,00	1,00	25,40
TOTAL METROS DE VARILLA 3/8" GANCHOS PEDESTALES							149,86
PESO DE VARILLA 3/8" PARA ESTRIBOS PEDESTALES							0,56
TOTAL FINAL KILOGRAMOS VARILLA 3/8" ESTRIBOS PEDESTALES							83,92
ALAMBRE NEGRO 40KG X TONELADA PARA REFUERZO, GANCHOS Y ESTRIBOS PEDESTALES							3,36
TOTAL FINAL KG ACERO DE REFUERZO PARA PEDESTALES							87,28

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 5 / 5	87,28
		Pasan / vienen	1422,48
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	34 de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

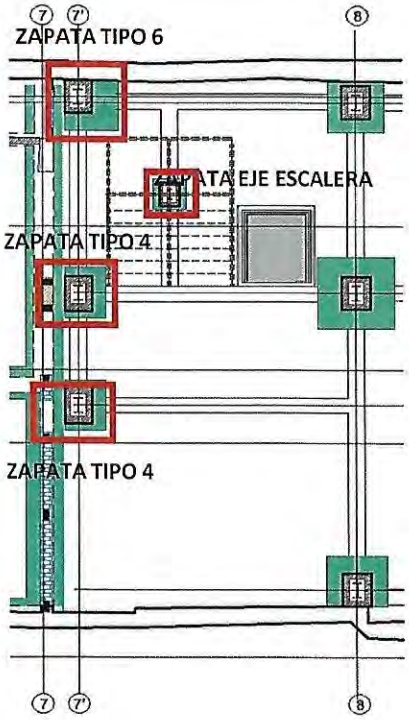

LOCALIZACION	VARILLA SENTIDO X	VARILLA SNTIDO Y	# DE VARILLA	CANTIDAD VARILLAS	%	PESO	SUB TOTAL
PARRILLA ZAPATA TIPO 6 EJE 7"-E`	1,40	1,40	VARILLA 1/2 ACERO	12,00		0,994	18,10
PARRILLA ZAPATA TIPO 4 EJE 7"-C`	1,40	1,40	VARILLA 1/2 ACERO	12,00		0,994	18,10
PARRILLA ZAPATA TIPO 4 EJE 7"-B`	1,40	1,40	VARILLA 1/2 ACERO	12,00		0,994	18,10
PARRILLA ZAPATA EJE ESCALERA	0,90	0,90	VARILLA 1/2 ACERO	8,00		0,994	8,06
TOTAL ACERO PARA PARRILLAS DE ZAPATAS							62,35
ALAMBRE NEGRO 40 KG X TONELADA						0,040	2,49
TOTAL ACERO PARA PARRILLAS DE ZAPATAS CON ALAMBRE NEGRO							**64,85**

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 1 / 4	64,85
		Pasan / vienen	1487,33
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	35 de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

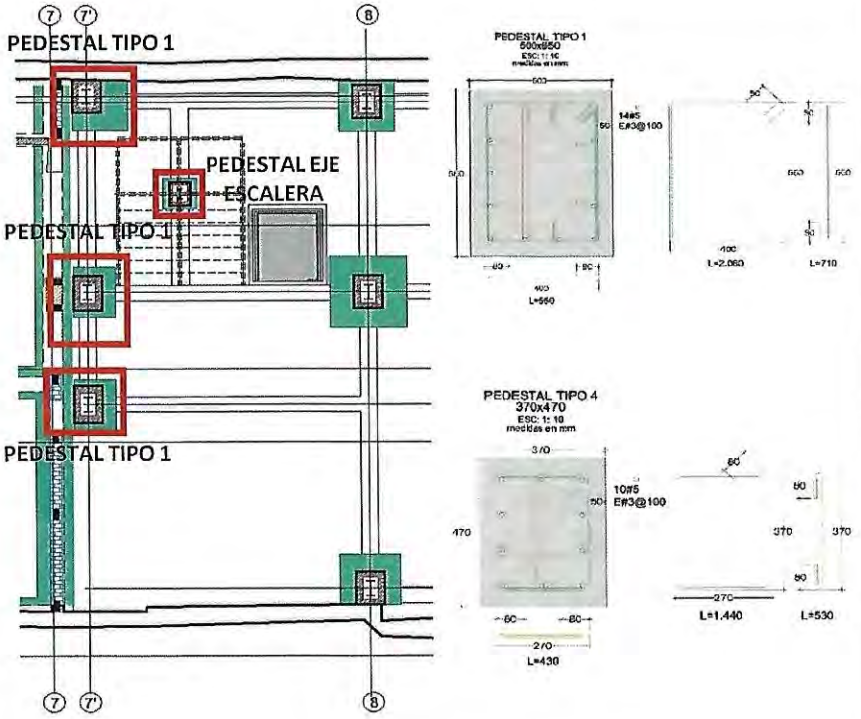

LOCALIZACION	LARGO	CANTIDAD	# DE VARILLA	PESO KG/M	%	CANT	SUB TOTAL
PEDESTAL TIPO 1 GANCHOS EJE X	0,71	18,00	3/8"	0,56		3,0	21,47
PEDESTAL TIPO 1 GANCHOS EJE Y	0,56	18,00	3/8"	0,56		3,0	16,93
PEDESTAL TIPO 1 FLEJES	2,06	9,00	3/8"	0,56		3,0	31,15
PEDESTAL TIPO 1 VARILLA	1,55	14,00	5/8"	1,55		3,0	101,04
PEDESTAL TIPO 4 GANCHOS EJE X	0,53	18,00	3/8"	0,56		1,000	5,34
PEDESTAL TIPO 4 GANCHOS EJE Y	0,43	18,00	3/8"	0,56		1,0	4,33
PEDESTAL TIPO 4 FLEJES	1,44	9,00	3/8"	0,56		1,0	7,26
PEDESTAL TIPO 4 VARILLA	1,55	10,00	5/8"	1,55		1,0	24,06
TOTAL ACERO PARA PEDESTALES							195,44
ALAMBRE NEGRO 40 KG X TONELADA						0,040	7,82
TOTAL ACERO PARA PEDESTALES CON ALAMBRE NEGRO							**203,26**

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 2/4	203,26
		Pasan / vienen	1690,58
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**3.400,23**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	36 de 313	
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21	

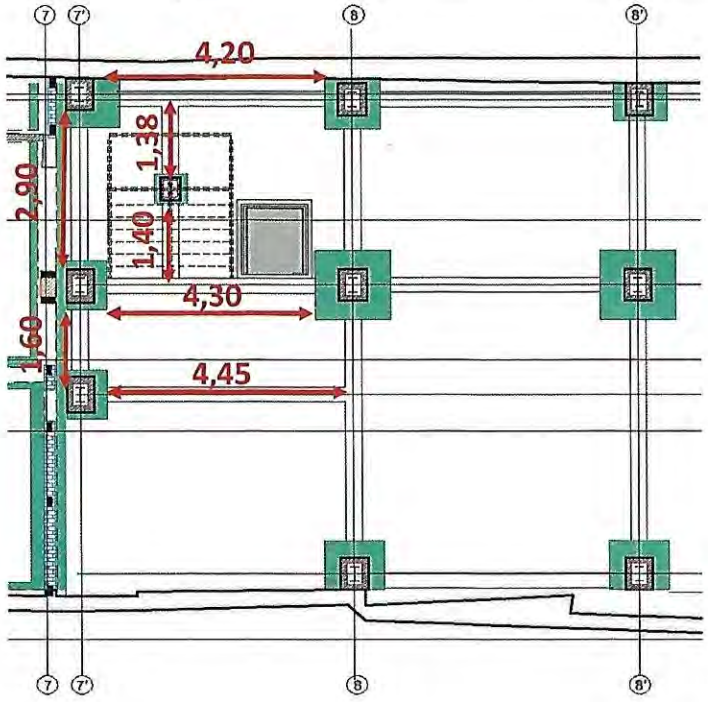

LOCALIZACION	LARGO	SECCIONES	ESTRIBOS	MEDIDAS ESTRIBOS	%	PESO	SUB TOTAL
ESTRIBOS VIGA EJE E`(8-8`)	4,20	0,15	28,00	0,96		0,56	15,05
ESTRIBOS VIGA EJE C`(7"-8)	4,30	0,15	28,67	0,96		0,56	15,41
ESTRIBOS VIGA B`(7"-8)	4,60	0,15	30,67	0,96		0,56	16,49
ESTRIBOS VIGA 7"(E`-C`)	2,90	0,15	19,33	0,96		0,56	10,39
ESTRIBOS VIGA EJE ESCALERA (7"-8)	1,38	0,15	9,20	0,96		0,56	4,95
ESTRIBOS VIGA EJE ESCALERA (7"-8)	1,40	0,15	9,33	0,96		0,56	5,02
ESTRIBOS VIGA 7"(C`-B`)	1,60	0,15	10,67	0,96		0,56	5,73
TOTAL KG DE ACERO PARA ESTRIBOS DE VIGAS							73,04
ALAMBRE NEGRO 40 KG X TONELADA						0,040	2,92
TOTAL KG DE ACERO PARA ESTRIBOS DE VIGAS CON ALAMBRE NEGRO							**75,96**

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 3 / 4	75,96
		Pasan / vienen	1766,54
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.		36	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2			
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21			

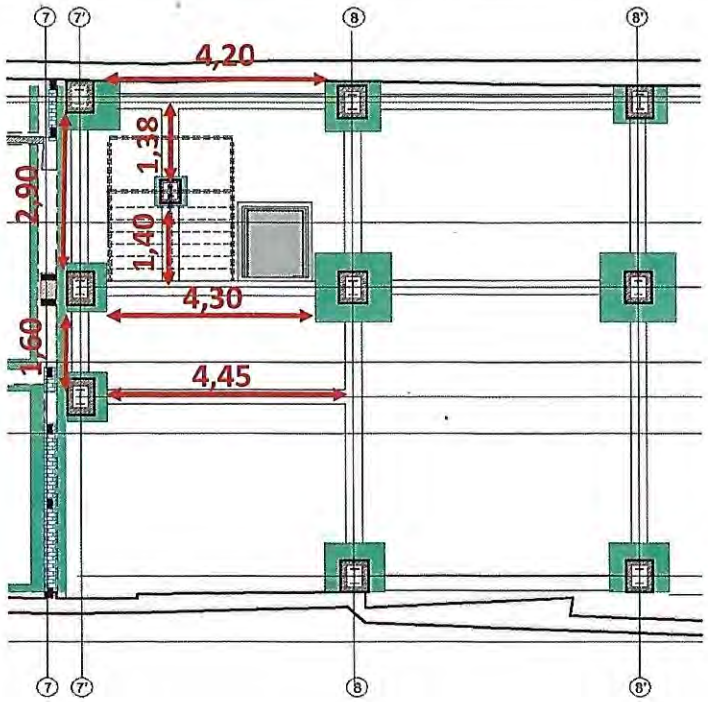

LOCALIZACION	LARGO	SECCIONES	ESTRIBOS	MEDIDAS ESTRIBOS	%	PESO	SUB TOTAL
ESTRIBOS VIGA EJE E`(8-8`)	4,20	0,15	28,00	0,96		0,56	15,05
ESTRIBOS VIGA EJE C`(7"-8)	4,30	0,15	28,67	0,96		0,56	15,41
ESTRIBOS VIGA B`(7"-8)	4,60	0,15	30,67	0,96		0,56	16,49
ESTRIBOS VIGA 7"(E`-C`)	2,90	0,15	19,33	0,96		0,56	10,39
ESTRIBOS VIGA EJE ESCALERA (7"-8)	1,38	0,15	9,20	0,96		0,56	4,95
ESTRIBOS VIGA EJE ESCALERA (7"-8)	1,40	0,15	9,33	0,96		0,56	5,02
ESTRIBOS VIGA 7"(C`-B`)	1,60	0,15	10,67	0,96		0,56	5,73
TOTAL KG DE ACERO PARA ESTRIBOS DE VIGAS							73,04
ALAMBRE NEGRO 40 KG X TONELADA						0,040	2,92
TOTAL KG DE ACERO PARA ESTRIBOS DE VIGAS CON ALAMBRE NEGRO							**75,96**

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 3 / 4	75,96
		Pasan / vienen	1766,54
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**3.400,23**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	37	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	Volumen 2		
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

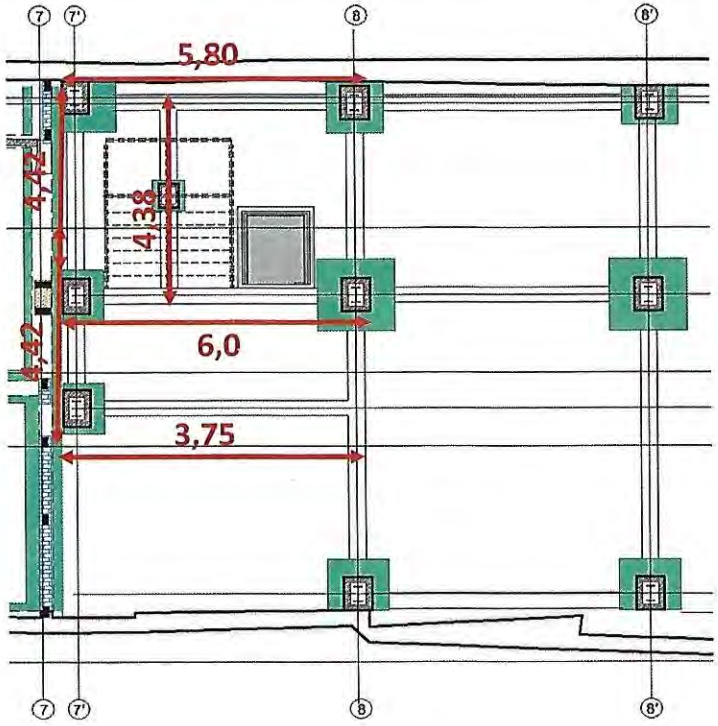

LOCALIZACION	LARGO	MEDIDA X M	# VARILLAS X TRAMO	PESO X ML	%	Cant.	SUB TOTAL
VARILLA 5/8" VIGA EJE E`(7"-8`)	5,50		6,00	1,552		12,00	102,43
VARILLA 5/8" VIGA EJE C`(7"-8)	6,00		6,00	1,552		12,00	111,74
VARILLA 5/8" VIGA B`(7"-8)	6,00		6,00	1,552		12,00	111,74
VARILLA 5/8" VIGA 7"(E`-A`)	3,97		6,00	1,552		12,00	73,94
VARILLA 5/8" VIGA EJE ESCALERA (7"-8)	4,38		6,00	1,552		12,00	81,57
VARILLA 5/8" VIGA EJE 7` (C`-B`)	3,70		6,00	1,552		12,00	68,91
REFUERZO ESTRUCTURAL VIGA EJE 7 (C`-B`)	2,95		6,00	1,552		12,00	54,94

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 4 / 4	605,28
		Pasan / vienen	2371,82
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	HOJA No.	38 de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

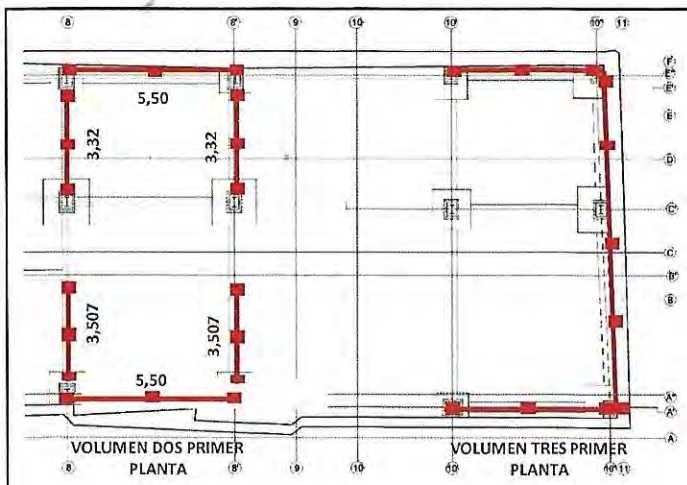

7' PATIO 2 PRIMER PLANTA 8

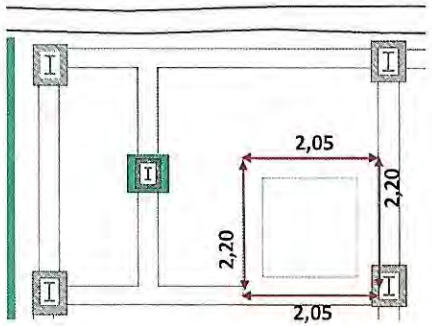

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO		CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	2,60	2,00	0,994		11,00	56,86
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 3/8 REFUERZO Z	0,25	26,00	0,560		11,00	40,04
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 1/2 VIGA SUPERIOR HORIZONTAL	21,32	2,00	0,994		1,00	42,38
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VIGA SUPERIOR	0,25	213,20	0,560		1,00	29,848
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	2,60	2,00	0,994		6,00	31,01
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	VARILLA 3/8 REFUERZO Z	0,25	26,00	0,560		6,00	21,84
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	VARILLA 1/2 VIGA SUPERIOR HORIZONTAL	5,35	2,00	0,994		2,00	21,27
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VIGA SUPERIOR	0,25	53,00	0,560		2,00	14,84
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	0,44	2,00	0,994		12,00	10,50
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VERTICAL	0,25	4,00	0,560		12,00	6,72
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 1/2" REFUERZO HORIZONTAL	3,32	2,00	0,994		2,00	13,20
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 3/8 REFUERZO Z HORIZONTAL	0,25	33,20	0,560		2,00	9,30
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	3,507	2,00	0,994		2,00	13,94
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA ANTEPECHO	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VERTICAL	0,250	35,07	0,560		2,00	9,82
PATIO 1 VIGAS ASCENSOR	VARILLA 5/8" REFUERZO HORIZONTAL	2,34	4,00	1,552		2,00	29,05
PATIO 1 VIGAS ASCENSOR	VARILLA 5/8" REFUERZO HORIZONTAL	2,60	4,00	1,552		2,00	32,28
PATIO 1 VIGAS ASCENSOR	VARILLA 3/8" ESTRIBOS	2,34	23,40	0,56		2,00	26,21
PATIO 1 VIGAS ASCENSOR	VARILLA 3/8" ESTRIBOS	2,60	26,00	0,56		2,00	29,12
TOTAL KG DE ACERO							438,23
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE X 0.04						0,04	17,53
TOTAL KG DE ACERO CON ALAMBRE NEGRO							455,76

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 1 / 4	455,76
		Pasan / vienen	2827,59
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	HOJA No.	39	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

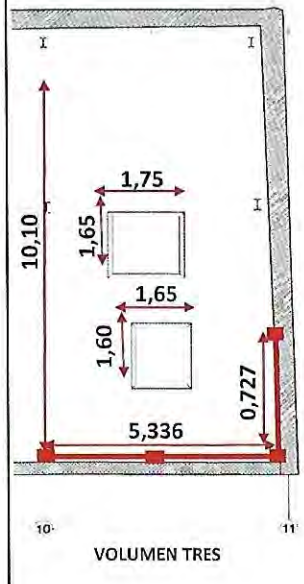

VOLUMEN TRES

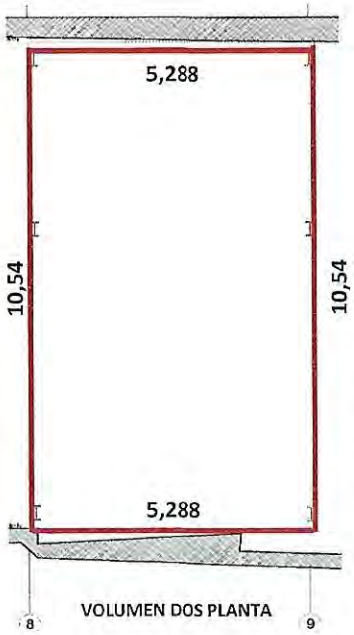

VOLUMEN DOS PLANTA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO		CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PLANTA 2	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	1,70	2,00	0,994		4,00	13,52
VOLUMEN 3 PLANTA 2	VARILLA 3/8" REFUERZO Z	0,25	16,00	0,560		4,00	8,96
VOLUMEN 3 PLANTA 2	VARILLA 1/2" VIGA SUPERIOR HORIZONTAL	6,06	2,00	0,994		4,00	48,21
VOLUMEN 3 PLANTA 2	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VIGA SUPERIOR	0,25	59,00	0,560		4,00	33,04
BORDILLO ARBOL	VARILLA 1/2 HORIZONTAL	1,65	2,00	0,994		2,00	6,56
BORDILLO ARBOL	VARILLA 3/8 VERTICAL	0,35	7,00	0,560		2,00	7,84
BORDILLO ARBOL	VARILLA 1/2 HORIZONTAL	1,55	2,00	0,994		2,00	6,16
BORDILLO ARBOL	VARILLA 3/8 VERTICAL	0,35	6,00	0,560		2,00	6,72
BORDILLO ARBOL	VARILLA 1/2 HORIZONTAL	1,55	2,00	0,994		2,00	6,16
BORDILLO ARBOL	VARILLA 3/8 VERTICAL	0,35	6,00	0,560		2,00	6,72
BORDILLO ARBOL	VARILLA 1/2 HORIZONTAL	1,500	2,00	0,994		2,00	5,96
BORDILLO ARBOL	VARILLA 3/8 VERTICAL	0,350	6,00	0,560		2,00	6,72
BORDILLO FRONTAL	VARILLA 1/2 HORIZONTAL	10,100	2,00	0,994		1,00	20,08
BORDILLO FRONTAL	VARILLA 3/8 VERTICAL	0,350	40,00	0,560		1,00	22,40
VOLUMEN 2 CUBIERTA	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	10,54	2,00	0,994		2,00	41,91
VOLUMEN 2 CUBIERTA	VARILLA 3/8" REFUERZO Z	0,25	105,40	0,560		2,00	29,51
VOLUMEN 2 CUBIERTA	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	5,288	2,00	0,994		2,00	21,03
VOLUMEN 2 CUBIERTA	VARILLA 3/8" REFUERZO Z	0,250	52,88	0,560		2,00	14,81
TOTAL KG ACERO							306,31
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE X 0.04						0,04	12,25
TOTAL KG DE ACERO CON ALAMBRE NEGRO							318,56

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 2 / 4	318,56
		Pasan / vienen	3146,15
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	HOJA No.	40	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

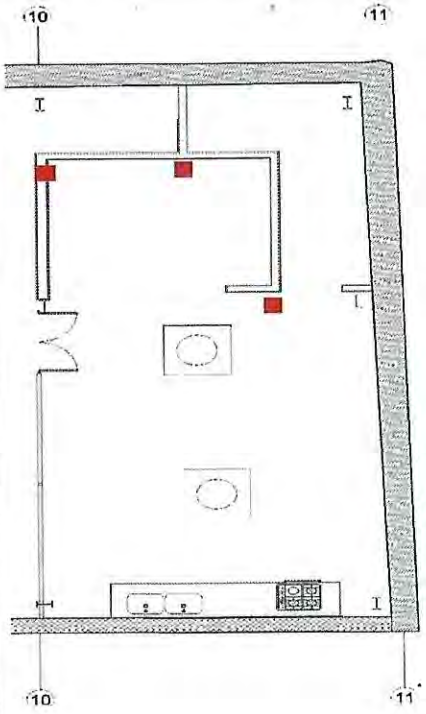

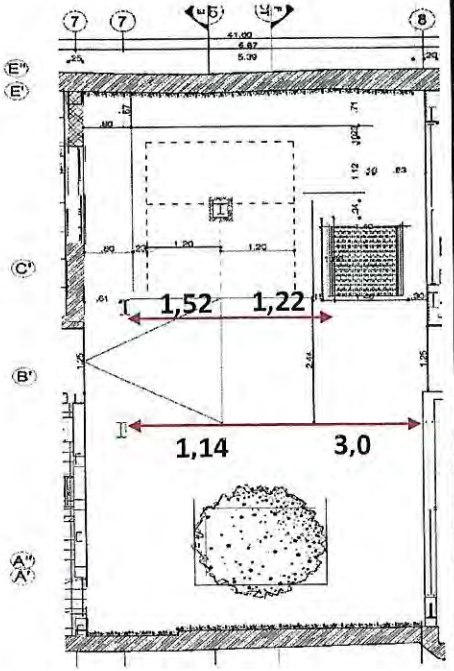

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO		CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	2,537	2,0	0,994		3,000	15,13
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	VARILLA 3/8" REFUERZO Z	0,250	24,000	0,560		3,000	10,08
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	1,520	3,0	0,994		1,000	4,53
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 3/8" REFUERZO	0,400	10,133	0,560		1,000	2,27
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	1,220	3,0	0,994		1,00	3,64
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 3/8" REFUERZO	0,250	8,1	0,56		1,00	1,14
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	1,140	3,0	0,99		1,00	3,40
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 3/8" REFUERZO	0,400	8,0	0,56		1,00	1,79
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	3,000	3,0	0,99		1,00	8,95
BORDILLOS PATIO DOS	VARILLA 3/8" REFUERZO	0,40	20,0	0,56		1,00	4,48
TOTAL KG ACERO							55,41
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE X 0.04						0,04	2,22
TOTAL KG ACERO CON ALAMBRE NEGRO							57,62

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 3 / 4	57,62
		Pasan / vienen	3203,77
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	150,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	**HOJA No.**	41	de	313
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

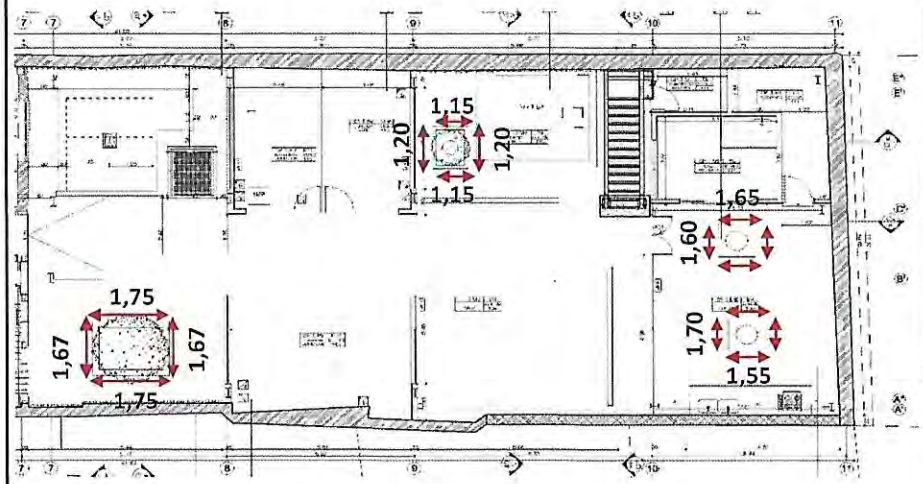

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO		CANT	SUB TOTAL
PATIO 2	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,97	9,00	0,994		2,00	35,25
PATIO 2	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,20	10,00	0,994		2,00	23,86
PATIO 2	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,82	9,00	0,994		2,00	32,56
PATIO 2	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,20	12,00	0,994		2,00	28,63
PATIO 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,60	9,00	0,994		2,00	28,63
PATIO 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,20	8,00	0,994		2,00	19,08
PATIO 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,60	9,00	0,994		2,00	28,63
PATIO 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,20	8,00	0,994		2,00	19,08
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,60	7,00	0,994		2,00	22,27
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,50	8,00	0,994		2,00	23,86
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,55	7,00	0,994		2,00	21,57
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,50	8,00	0,994		2,00	23,86
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,60	7,00	0,994		2,00	22,27
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,50	8,00	0,994		2,00	23,86
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	1,55	7,00	0,994		2,00	21,57
VOLUMEN 3	VARILLA 1/2" ESTRIBOS	1,50	8,00	0,994		2,00	23,86
TOTAL KG ACERO							398,81
ALMABRE NEGRO DE AMARRE X 0.04						0,04	15,95
TOTAL ACERO CON ALAMBRE							414,77

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 4 / 4	414,77
		Pasan / vienen	3618,54
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	150,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**3.400,23**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	HOJA No.	42	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO DE CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

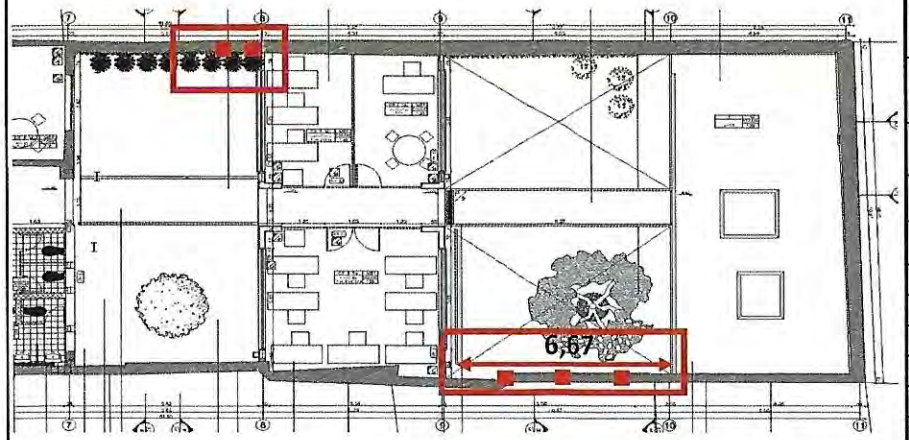

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO		CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 MURO COLINDANTE ORIENTAL	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	3,600	2,0	0,994		2,000	14,31
PATIO 2 MURO COLINDANTE ORIENTAL	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	0,250	36,00	0,560		2,00	10,08
PATIO 3 MURO OCCIDENTAL	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	1,700	2,0	0,994		3,000	10,14
PATIO 3 MURO OCCIDENTAL	VARILLA 3/8" REFUERZO Z	0,250	17,00	0,560		3,000	7,14
PATIO 3 MURO OCCIDENTAL	VARILLA 1/2" VIGA SUPERIOR HORIZONTAL	6,670	2,00	0,994		1,000	13,26
PATIO 3 MURO OCCIDENTAL	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VIGA SUPERIOR	0,250	66,70	0,560		1,000	9,34
			TOTAL KG ACERO				64,27
			ALAMBRE NEGRO DE AMARRE X 0.04			0,04	2,57
			TOTAL KG DE ACERO CON ALAMBRE NEGRO				66,84

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	66,84
		Pasan / vienen	3673,14
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3.400,23	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	HOJA No.	43	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

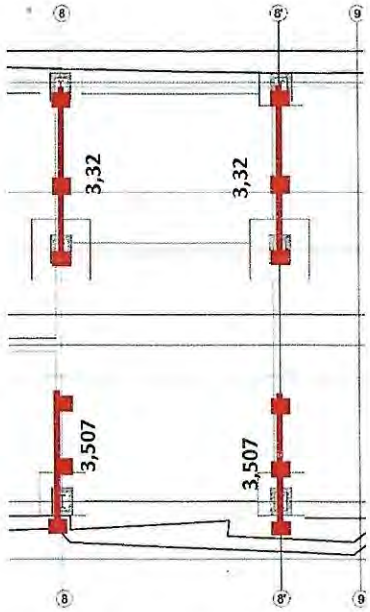

VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	0,44	2,00	0,99		12,00	10,50
VOLUMEN DOS SSEGUNDA PLANTA	VARILLA 3/8" REFUERZO Z VERTICAL	0,25	4,00	0,56		12,00	6,72
VOLUMEN DOS SSEGUNDA PLANTA	VARILLA 1/2" REFUERZO HORIZONTAL	1,70	2,00	0,99		2,00	6,76
VOLUMEN DOS SSEGUNDA PLANTA	VARILLA 3/8" REFUERZO Z HORIZONTAL	0,25	17,00	0,56		2,00	4,76
VOLUMEN DOS SSEGUNDA PLANTA	VARILLA 1/2" REFUERZO HORIZONTAL	3,51	2,00	0,99		2,00	13,94
VOLUMEN DOS SSEGUNDA PLANTA	VARILLA 3/8" REFUERZO Z HORIZONTAL	0,25	35,07	0,56		2,00	9,82
TOTAL KG DE ACERO							52,50
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE X 0.04						0,04	2,10
TOTAL KG DE ACERO CON ALAMBRE NEGRO							54,60

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	54,60
		Pasan / vienen	3727,74
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**3.400,23**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO


PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO 3.3	ACERO DE REFUERZO	HOJA No. 44 de 313	
UNIDAD KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR
ITEM No. 3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21

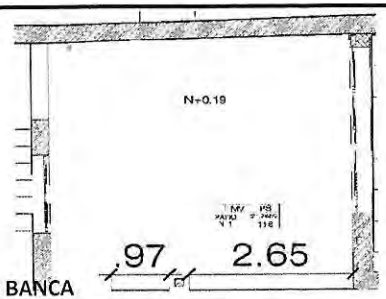

PATIO 1 / BORDILLO BANCA

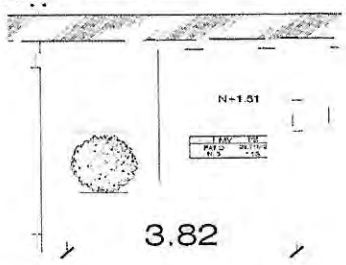

PATIO 3 / BORDILLO

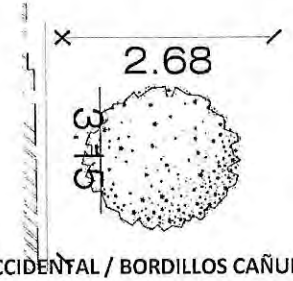

PATIO 2 COSTADO OCCIDENTAL / BORDILLOS CAÑUELAS

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 1 - BANCA COST SUR	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	2,65	2,00	0,994		1,00	5,27
PATIO 1 - BANCA COSTADO NORTE	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	0,97	2,00	0,994		1,00	1,93
PATIO 1 - BANCA COSTADO NORTE	VARILLA 3/8" ESTRIBOS	0,38	4,85	0,557		1,00	1,01
PATIO 3 BORDILLO COST ORIENTAL	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	3,82	2,00	0,994		1,00	7,59
PATIO 3 BORDILLO COST ORIENTAL	VARILLA 3/8" ESTRIBOS	0,20	25,47	0,557		1,00	2,84
PATIO 2 BORDILLO CAÑUELA	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	2,68	1,00	0,994		2,00	5,33
PATIO 2 BORDILLO CAÑUELA	VARILLA 3/8" ESTRIBOS	0,30	17,87	0,557		2,00	5,97
PATIO 2 BORDILLO CAÑUELA	VARILLA 1/2" HORIZONTAL	3,15	1,00	0,994		2,00	6,26
PATIO 2 BORDILLO CAÑUELA	VARILLA 3/8" ESTRIBOS	0,20	21,00	0,557		2,00	4,68
TOTAL KG DE ACERO							40,88
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE X 0.04						0,04	1,64
TOTAL KG DE ACERO CON ALAMBRE NEGRO							42,52

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	42,52
		Pasan / vienen	3770,25
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	1.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**3.400,23**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	HOJA No.	45	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

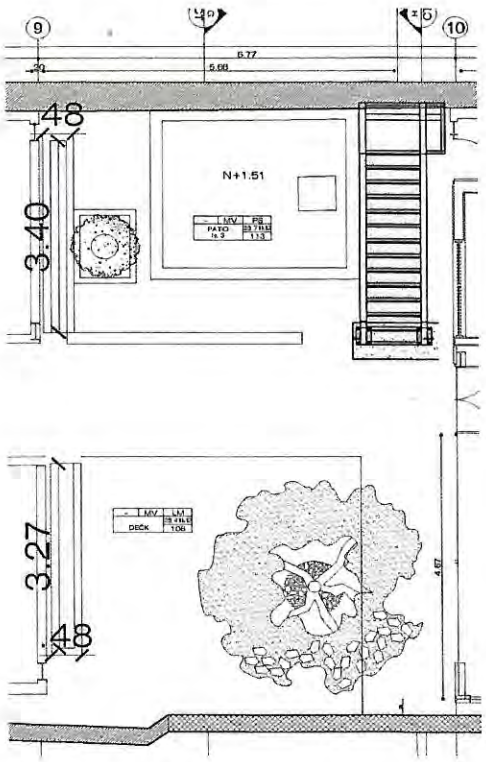

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 3 BORDILLO CAÑUELAS COST ORIENTAL	VARILLA 1/2" HORIZONTAL BORDILLO CAÑUELA	3,40	1,00	0,994		2,00	6,76
PATIO 3 BORDILLO CAÑUELAS COST ORIENTAL	VARILLA 1/2" HORIZONTAL BORDILLO CAÑUELA	0,480	1,00	0,994		2,00	0,95
PATIO 3 BORDILLO CAÑUELAS COST ORIENTAL	VARILLA 3/8" VERTICAL BORDILLO CAÑUELA	0,20	22,67	0,557		1,00	2,53
PATIO 3 BORDILLO CAÑUELAS COST OCCIDENTAL	VARILLA 1/2" HORIZONTAL BORDILLO CAÑUELA	3,27	1,00	0,994		2,00	6,50
PATIO 3 BORDILLO CAÑUELAS COST OCCIDENTAL	VARILLA 1/2" HORIZONTAL BORDILLO CAÑUELA	0,480	1,00	0,994		2,00	0,95
PATIO 3 BORDILLO CAÑUELAS COST OCCIDENTAL	VARILLA 3/8" VERTICAL BORDILLO CAÑUELA	0,20	21,80	0,557		1,00	2,43
			TOTAL KG DE ACERO				20,12
			ALAMBRE NEGRO DE AMARRE X 0.04			0,04	0,80
			TOTAL KG DE ACERO CON ALAMBRE NEGRO				20,93

Cantidad pagadas en los cortes	3.400,23	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	20,93
		Pasan / vienen	3791,18
Cantidad pagada Corte No. 10	54,60	Cantidad Contractual	1.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**3.400,23**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**3812,11**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	**411,88**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarioslas obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
			HOJA No.	46 de	313
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	ZONA	EXTERIOR	
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN			
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	HOJA No.	47	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	3.3.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

RAMPA ACCESO VOLUMEN UNO MOVILIDAD REDUCIDA

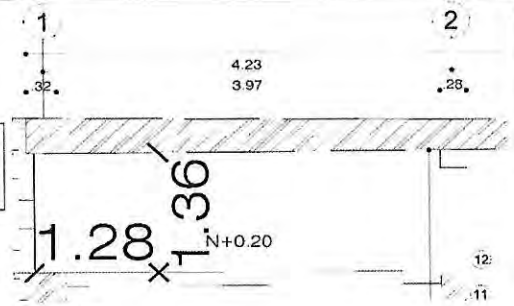

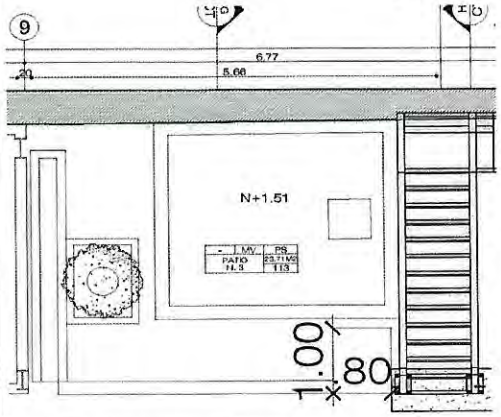

RAMPA ACCESO CUARTO DE BOMBAS PATIO 3

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	PESO X M2	TRASLAPO 0,20	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN UNO RAMPA ACCESO MOVILIDAD REDUCIDA	1,28	1,36	3,51	0		1,0	6,11
PATIO 3 RAMPA ACCESO A TANQUE	1,00	0,80	3,51	0		1	2,81

Cantidad pagadas en los cortes	1.084,31	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	8,92
		Pasan	8,92
Cantidad pagada Corte No. 10	3,48	Cantidad Contractual	872,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	1.084,31	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	HOJA No.	48	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	3.3.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

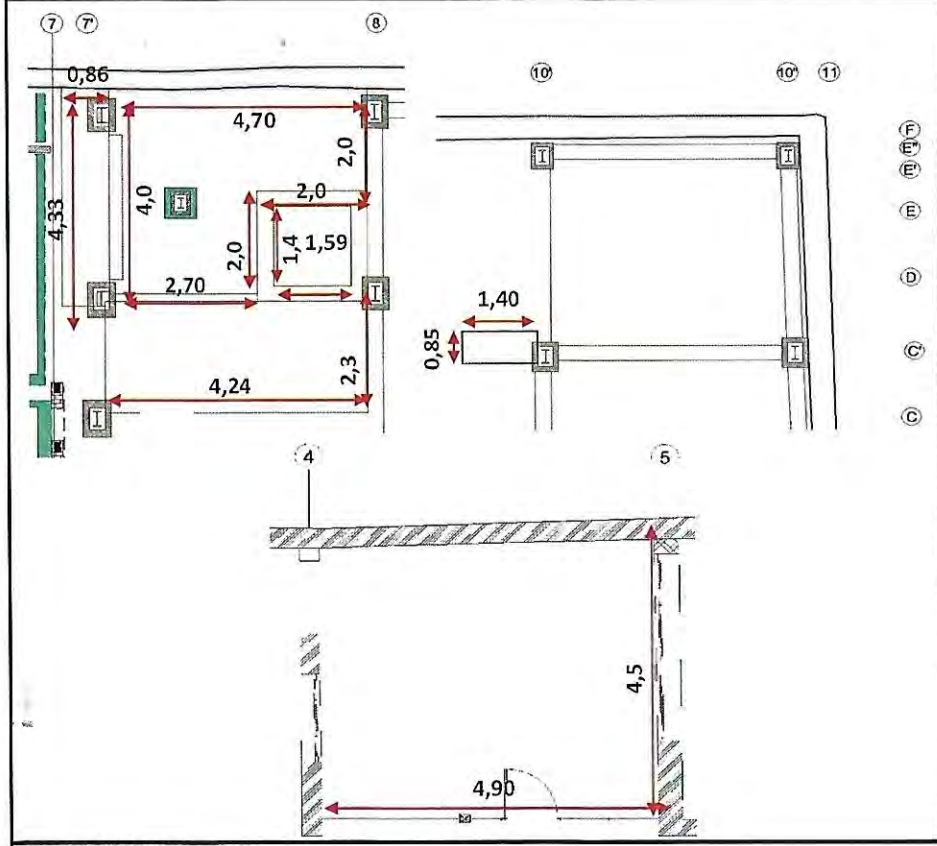

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	PESO X M2	TRASLAPO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 / EJE 7-7' (E'-C')	4,33	0,86	3,510	0,20		1,00	2,61
PATIO 2 / EJE 7'-8 (E'-C')	4,12	3,50	3,510	0,20		1,00	10,13
PATIO 2 / EJE 7-8' (E-C) ASCENSOR	1,59	1,41	3,510	0,00		1,00	7,85
PATIO 2 / EJE 7-8' (C-B) RAMPA	2,38	4,24	3,510	0,20		1,00	7,08
PATIO 3 / EJE 10-10' (E'-C')	1,40	0,85	3,510	0,00		1,00	0,00
PATIO 1	4,90	4,51	3,51	0,20		1,00	15,51

Cantidad pagadas en los cortes	1.084,31	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	43,18
		Vienen	8,92
Cantidad pagada Corte No. 10	3,48	Cantidad Contractual	872,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**1.084,31**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**52,10**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	HOJA No.	49	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	3.3.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	50	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

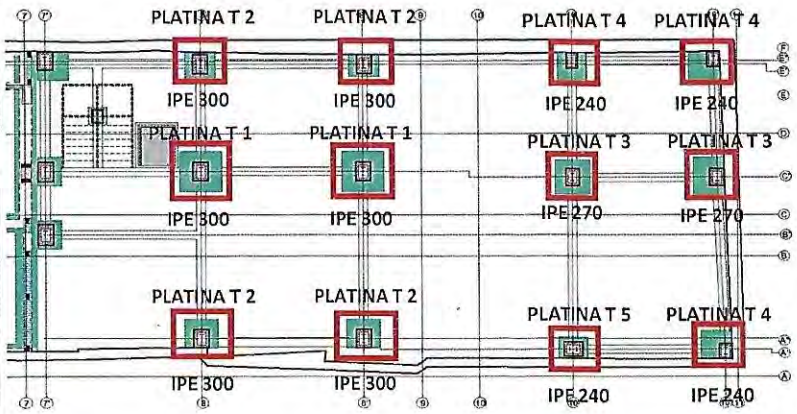

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2	Platina tipo 1 e:3/4"	0,29	0,44	0,019	149,50	2,00	38,15
VOLUMEN 2	Platina tipo 2 e:7/8"	0,29	0,44	0,022	174,50	4,00	89,06
VOLUMEN 3	Platina tipo 3 e:1"	0,29	0,41	0,025	199,40	2,00	47,42
VOLUMEN 3	Platina tipo 4 e:7/8"	0,26	0,38	0,022	174,50	3,00	51,72
VOLUMEN 3	Platina tipo 5 e:1 1/4"	0,29	0,44	0,032	249,20	1,00	31,80
VOLUMEN 3	IPE 240 columnas	2,70			30,70	4,00	331,560
VOLUMEN 3	IPE 270 columnas	2,70			36,10	2,00	194,94
VOLUMEN 2	IPE 300 columnas	5,90			42,20	6,00	1493,88

Cantidad pagadas en los cortes	11.831,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	2.278,53
		Pasan	2278,53
Cantidad pagada Corte No. 10	300,00	Cantidad Contractual	11.296,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.831,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5.1	ESTRUCTURA METALICA	HOJA No.	51 de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	5.1.1	ESTRCUTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300. PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21	

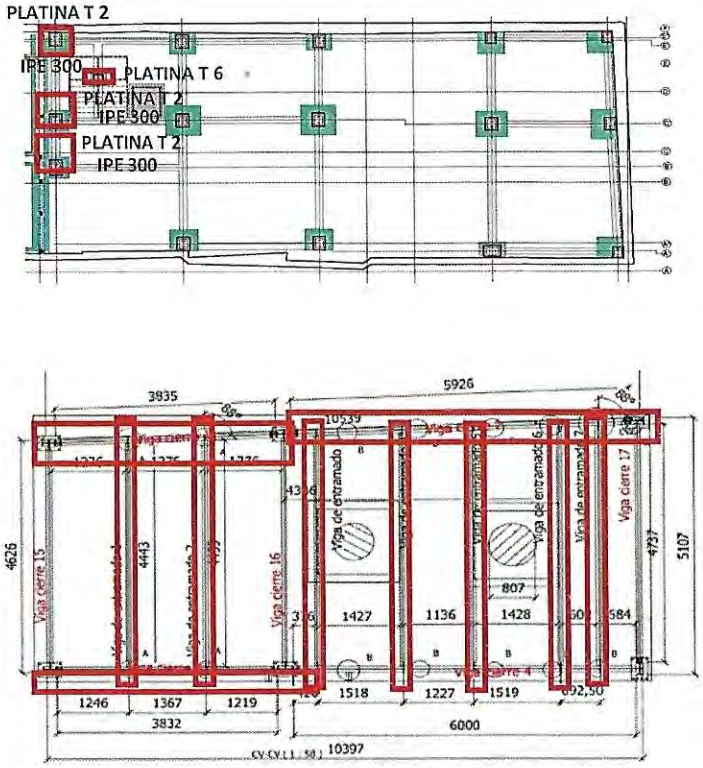

VOLUMEN 3 ENTRE PISO SEGUNDA PLANTA

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO X ML.	%	CANT	SUB TOTAL
EJE 7" - E" PLATINA TIPO 2 Platina tipo 2 e:7/8"	0,29	0,44	0,022	174,50		3,00	66,80
EJE ESCALERA PLATINA TIPO 6	0,24	0,34	0,022	174,50		1,00	14,24
IPE 300 COLUMNA EJE 7" (E"-B")	6,00			42,20		3,00	759,60
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 1	4,44			18,80		1,00	83,53
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 2	4,50			18,80		1,00	84,58
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 3	4,569			18,80		1,00	85,90
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 4	4,631			18,80		1,00	87,06
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 5	4,68			18,80		1,00	87,98
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 6	4,74			18,80		1,00	89,15
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 7	4,77			18,80		1,00	89,68
VIGA CIERRE 1 IPE 220	3,84			26,20		1,00	100,48
VIGA CIERRE 2 IPE 220	5,926			30,70		1,00	181,93
VIGA CIERRE 3 IPE 220	3,83			26,20		1,00	100,40
PERFIL CUADRADO 50X50 2MM	1,700			2,93		4,00	19,92

Cantidad pagadas en los cortes	11.831,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1.851,24
		Pasan / vienen	4129,78
Cantidad pagada Corte No. 10	300,00	Cantidad Contractual	11.296,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	11.831,36	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:


ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra


ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.


BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**


PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5.1	ESTRUCTURA METALICA	HOJA No.	52	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRCUTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300. PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21		




VOLUMEN 2 ENTRE PISO SEGUNDA PLANTA


VOLUMEN 2 ENTRE PISO TERCER PLANTA

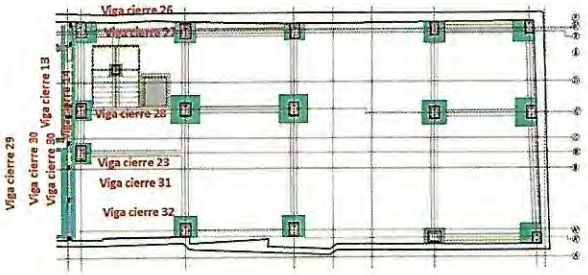

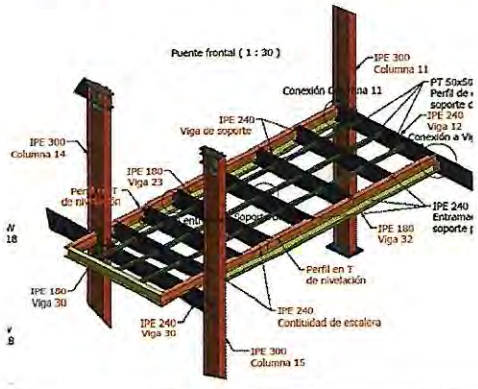

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO X ML	%	CANT	SUB TOTAL
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Y 17	5,088			18,80		10,00	956,54
VIGA CIERRE 4 IPE 240	6,00			30,70		1,00	184,20
VIGA CIERRE 5 IPE 240	3,32			30,70		1,00	101,80
VIGA CIERRE 6 IPE 240	5,738			30,70		1,00	176,16
VIGA CIERRE 7 IPE 240	3,316			30,70		1,00	101,80
VIGA CIERRE 8 IPE 240	5,738			30,70		1,00	176,16
VIGA CIERRE 9 IPE 240	5,738			30,70		1,00	176,16
VIGA CIERRE 10 IPE 240	3,316			30,70		1,00	101,80
VIGA CIERRE 11 IPE 240	5,738			30,70		1,00	176,16
VIGA CIERRE 12 IPE 240	3,316			30,70		1,00	101,80
VIGA CIERRE 15 IPE 180	4,626			18,80		1,00	86,97
VIGE CIERRE 16 IPE 180	4,499			18,80		1,00	84,58
VIGA CIERRE 17 IPE 180	5,070			18,80		1,00	95,32
VIGA CIERRE 18 IPE 180	5,088			18,80		1,00	95,65
VIGA CIERRE 19 IPE 180	5,088			18,80		1,00	95,65
VIGA CIERRE 20 IPE 180	5,088			18,80		1,00	95,65
VIGA CIERRE 21 IPE 180	5,088			18,80		1,00	95,65
VIGA CIERRE 24 IPE 180	5,088			18,80		1,00	95,65
VIGA CIERRE 25 IPE 180	5,088			18,80		1,00	95,65
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,680			16,07		2,00	118,28
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,510			16,07		1,00	56,41
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,730			16,07		1,00	59,94
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,590			16,07		2,00	115,38
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,510			16,07		1,00	56,41
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,740			16,07		1,00	60,10
VIGA CIERRE 27 IPE 220	4,624			26,20		1,00	121,15
VIGA CIERRE 14 IPE 240	3,329			30,70		1,00	102,20
TOTAL KG ESTRUCTURA							3783,23
ESTRUCTURA PUENTE							
VIGA CIERRE 30 IPE 240	2,078			30,70		1,00	63,79
VIGA CIERRE 30` IPE 180	2,078			18,80		1,00	39,07
VIGA CIERRE 23 IPE 180	4,860			18,80		1,00	91,37
VIGA CIERRE 32 IPE 180	4,800			18,80		1,00	90,24
PERFIL EN T NIVELACION	4,822			73,572		1,00	354,76
PERFIL EN T NIVELACION	4,822			73,572		1,00	354,76
ENTRAMADO PUENTE IPE 240	2,078			30,70		7,00	446,56
VIGA CIERRA 13 IPE 240	3,329			30,70		1,00	102,20
VIGA CIERRE 26 IPE 180	4,624			18,80		1,00	86,93
VIGA CIERRE 28 IPE 240	4,704			30,70		1,00	144,41
VIGA CIERRE 29 IPE 240	2,078			30,70		1,00	63,79
VIGA CIERRE 31 IPE 240	4,819			30,70		1,00	147,94
PERFIL CUADRADO 50 2MM	0,686			3,04		12,00	25,03
PERFIL CUADRADO 50 2MM	0,480			3,04		6,00	8,76
PERFIL CUADRADO 50 2MM	0,839			3,04		3,00	7,65
TOTAL KG ESTRUCTURA PUENTE							2027,27

Cantidad pagadas en los cortes	11.831,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	5.810,50
		Pasan / vienen	9940,28
Cantidad pagada Corte No. 10	300,00	Cantidad Contractual	11.296,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.831,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO


PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	**HOJA No.**	53	**de**	313
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

















LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	ANCHO	PESO X ML	%	CANT	SUB TOTAL
SOPORTE GUALDERA	platina e= 1/2 " L=310x230x15,87mm C/4 perforaciones 5/8"	0,071		124,60		2,00	17,69
SOPORTE COLUMNA CENTRAL	platina e= 1/2" L=276x276x15,87mm C/4 perforaciones 5/8"	0,076		124,60		1,00	9,47
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,217		30,88		2,00	13,40
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,684		30,88		1,00	82,88
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,723		30,88		1,00	84,09
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,779		30,88		1,00	85,82
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,481		30,88		2,00	29,71
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,571		30,88		1,00	48,51
COLUMNA	PT 135x135x6mm	1,760		23,58		1,00	41,50
COLUMNA	PT 50x50x2mm	1,059		16,13		4,00	68,33
COLUMNA	Platina 3/8" (180mmx220mm)	0,04		124,60		30,00	149,52
REFUERZO PATIN	Platina 1/4" (1,22mmx2,44m)	0,01		49,85		4,00	2,79
REFUERZO PATIN	PT 200x100x4mm	1,04		22,95		1,00	23,91

Cantidad pagadas en los cortes	11.831,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	657,62
		Pasan / vienen	10597,90
Cantidad pagada Corte No. 10	300,00	Cantidad Contractual	11.296,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.831,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	54 de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

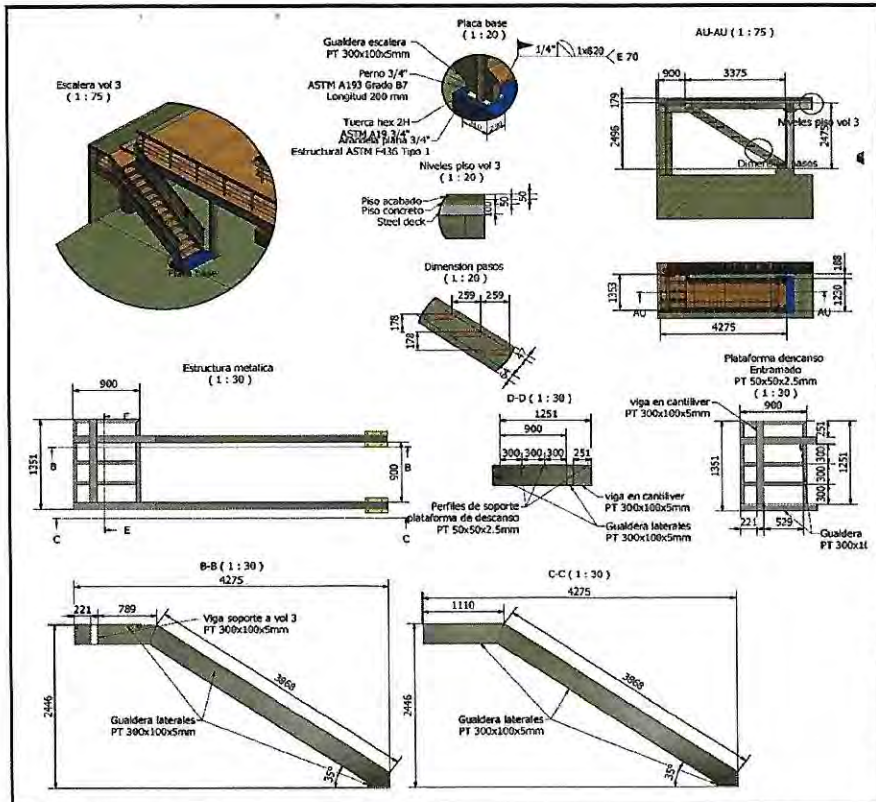

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	ANCHO	PESO X ML	%	CANT	SUB TOTAL
ESCALERA VOLUMEN TRES							
SOPORTE GUALDERA	platina e= 1/2 " L=310x230x16mm C/4 perforaciones 3/4"	0,071		124,60		2,00	17,69
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,204		30,88		2,00	12,60
GUALDERA	PT 300x100x5mm	3,868		30,88		2,00	238,89
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,789		30,88		1,00	24,36
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,211		30,88		1,00	6,52
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,110		30,88		1,00	34,28
	Platina 3/8" (180mmx220mm)	0,040		124,60		26,00	129,58
REFUERZO PATIN	Platina 1/4" (1,22mx2,44m)	0,006		49,85		1,00	0,30
REFUERZO PATIN	Platina 3/8" (1,22mx2,44m)	0,011		74,77		1,00	0,82
REFUERZO PATIN	Platina 3/8" (1,22mx2,44m)	0,049		74,77		1,00	3,66

Cantidad pagadas en los cortes	11.831,36	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	468,71
		Pasan / vienen	11066,61
Cantidad pagada Corte No. 10	300,00	Cantidad Contractual	150,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	11.831,36	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	55 de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21	

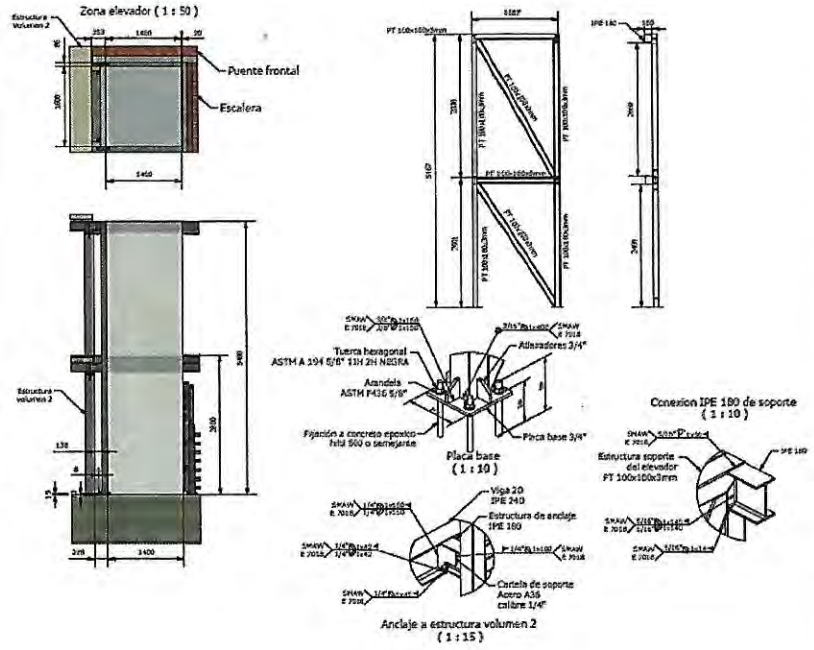

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	ANCHO	PESO X ML	%	CANT	SUB TOTAL
ESTRUCTURA ASCENSOR							
Placa base estructura ascensor	Platina e= 3/4" L_220x220x19,05mm c/4 perforaciones 5/8"	0,048	0,048	149,20		2,00	14,32
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	5,437	5,437	8,96		2,00	97,43
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	1,600	1,60	8,96		1,00	14,34
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	1,400	1,40	8,96		3,00	37,63
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	0,150	0,15	8,96		4,00	5,38
ESTRUCTURA ESCALERA PATIO 2							
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,324		30,88		1,00	40,89
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,465		30,88		1,00	14,36
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,939		30,88		1,00	59,88
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,506		30,88		2,00	31,25
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,03		30,88		1,00	62,69
GUALDERA	PT 50X50X2MM	1,04		16,13		1,00	16,81
PLATINA 1/4"	Refuerzo patin	0,04		49,85		2,00	3,89
ESTRUCTURA ESCALERA PATIO 3							
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,90		16,13		2,00	29,00
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,59		16,13		2,00	19,03
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,08		16,13		2,00	2,52
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,25		16,13		2,00	8,19
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,13		16,13		1,00	2,06
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,641		16,13		1,00	10,34

Cantidad pagadas en los cortes	11.061,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	470,00
		Pasan / vienen	11536,61
Cantidad pagada Corte No. 07	1126,33	Cantidad Contractual	150,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.061,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	56	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

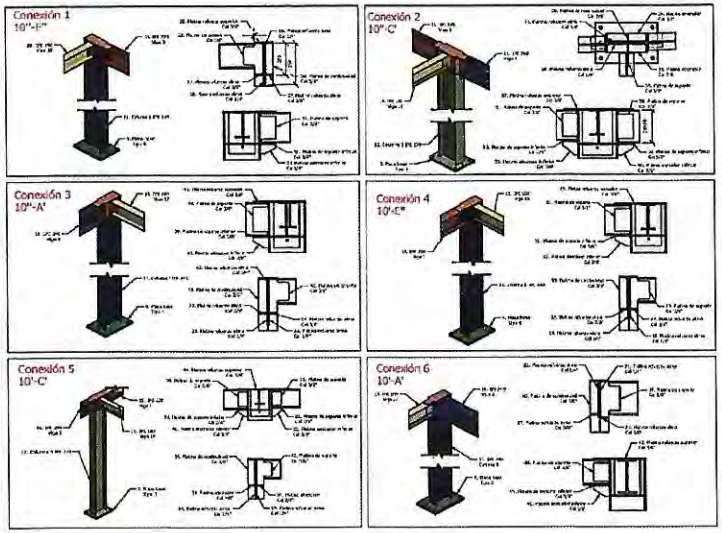

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 1	Refuerzo patin - Platina 170mmx296mmx1/4"		0,050		49,85	2,00	4,99
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 1	Refuerzo patin a patin / Platina 220mmx51mmx3/8"		0,011		74,77	2,00	1,64
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 1	Refuerzo superior - Platina 340mmx120mmx3/8"		0,041		74,77	1,00	3,07
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 1	Platina de soporte - Platina 219mmx127mmx3/8"		0,028		74,77	1,00	2,09
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 1	Platina de continuidad - Platina 220mmx50mmx3/8"		0,011		74,77	1,00	0,82
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 1	Platina de soporte - Platina 100mmx162mmx3/8"		0,016		74,77	1,00	1,20
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 1	Platina de soporte - Platina 100mmx90mmx3/8"		0,009		74,77	1,00	0,67
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 1	Atriesado Platina 96mmx100mmx3/8"		0,007		74,77	1,00	0,52
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 2	Refuerzo patin - Platina 200mmx326mmx1/4"		0,065		49,85	2,00	6,48
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 2	Platina de soporte 100mmx162mmx3/8"		0,016		74,77	1,00	1,20
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 2	Platina de soporte 100mmx90mmx3/8"		0,009		74,77	1,00	0,67
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 2	Atiesado Platina 96mmx100mmx3/8"		0,007		74,77	1,00	0,52
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 2	Platina atiesado 249mmx58mmx3/8"		0,014		74,77	2,00	2,09
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 2	Platina de soporte 240mmx134mmx3/8"		0,032		74,77	1,00	2,39
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 2	Platina de continuidad 240mmx58mmx3/8"		0,014		74,77	1,00	1,05
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 2	Platina superior 460mmx135mmx3/8"		0,062		74,77	1,00	4,64
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 2	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017		74,77	1,00	1,27
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 2	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010		74,77	1,00	0,75
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 2	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008		74,77	1,00	0,60

Cantidad pagadas en los cortes	11.831,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	36,66
		Pasan / vienen	11573,27
Cantidad pagada Corte No. 10	300,00	Cantidad Contractual	11.296,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.831,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO 5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No. 57	de 313
UNIDAD KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR
ITEM No. 5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21

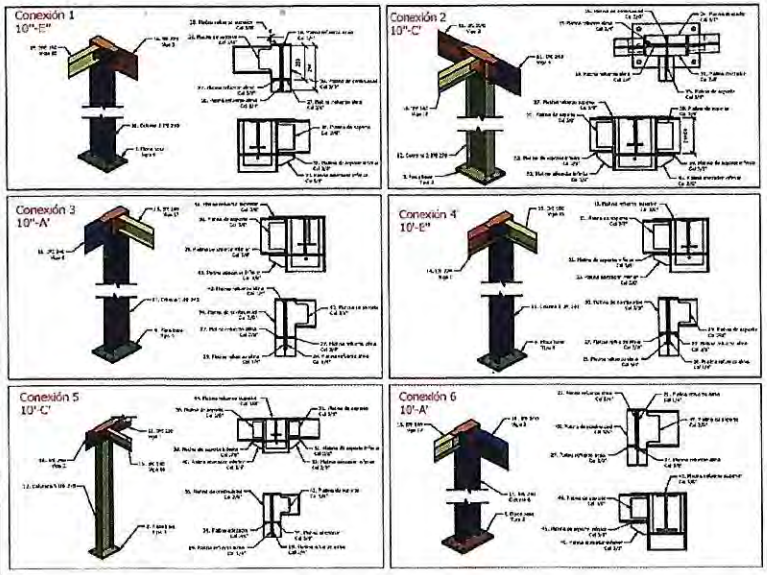

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 3	Refuerzo patin - Platina 170mmx296mmx1/4"		0,050		49,85	2,00	4,99
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 3	Refuerzo patin a patin / Platina 220mmx51mmx3/8"		0,011		74,77	2,00	1,64
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 3	Platina de continuidad 240mmx58mmx3/8"		0,041		74,77	1,00	3,07
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 3	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,028		74,77	1,00	2,09
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 3	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,011		74,77	1,00	0,82
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 3	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,016		74,77	1,00	1,20
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 3	Platina de soporte 340mmx120mmx3/8"		0,009		74,77	1,00	0,67
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 3	Platina de soporte 240mmx127mmx3/8"		0,007		74,77	1,00	0,52
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Refuerzo patin Platina 170mmx296mmx1/4"		0,065		49,85	2,00	6,48
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Refuerzo patin a patin Platina 220mmx51mmx3/8"		0,016		74,77	2,00	2,39
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Platina de soporte 219mmx127mmx3/8"		0,009		74,77	1,00	0,67
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Platina de continuidad 220mmx50mmx3/8"		0,007		74,77	1,00	0,52
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Platina de soporte 100mmx162mmx3/8"		0,014		74,77	1,00	1,05
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Platina de soporte 100mmx90mmx3/8"		0,032		74,77	1,00	2,39
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Platina atiesado 96mmx100mmx3/8"		0,014		74,77	1,00	1,05
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Platina atiesado 249mmx58mmx3/8"		0,062		74,77	1,00	4,64

Cantidad pagadas en los cortes	11.831,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	34,20
		Pasan	11607,47
Cantidad pagada Corte No. 10	300,00	Cantidad Contractual	11.296,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	11.831,36	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO


PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA: CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	58	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21		














LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Refuerzo patin Platina 170mmx296mmx1/4"		0,050	49,85		2,00	4,99
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Refuerzo patin Platina 220mmx51mmx3/8"		0,011	74,77		2,00	1,64
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Platina de soporte 219mmx127mmx3/8"		0,028	74,77		1,00	2,09
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Platina de continuidad 220mmx50mmx3/8"		0,011	74,77		1,00	0,82
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Platina de soporte 100mmx162mmx3/8"		0,016	74,77		1,00	1,20
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Platina de soporte 100mmx90mmx3/8"		0,009	74,77		1,00	0,67
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Atriesado Platina 96mmx100mmx3/8"		0,007	74,77		1,00	0,52
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 4	Platina atriesado 249mmx58mmx3/8"		0,014	74,77		1,00	1,05
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 5	Refuerzo patin Platina 200mmx326mmx1/4"		0,065	49,85		2,00	6,48
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 5	Platina de soporte 100mmx162mmx3/8"		0,016	74,77		1,00	1,20
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 5	Platina de soporte 100mmx90mmx3/8"		0,009	74,77		1,00	0,67
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 5	Atriesado Platina 96mmx100mmx3/8"		0,007	74,77		1,00	0,52
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 5	Platina atiesado 249mmx58mmx3/8"		0,014	74,77		2,00	2,09
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 5	Platina de soporte 240mmx134mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 5	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 5	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		1,00	0,75
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 5	Atisador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		1,00	0,60
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 5	Soporte superior Platina 560mmx135mmx3/8"		0,076	74,77		1,00	5,68

Cantidad pagadas en los cortes	11.531,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	34,64
		Pasan	11642,11
Cantidad pagada Corte No. 09	470,00	Cantidad Contractual	12.185,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	11.531,36	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C.°

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA: CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
		HOJA No. 59	de 313
CAPITULO 5	ESTRUCTURA DE METAL	ZONA	EXTERIOR
UNIDAD KG	DESCRIPCIÓN		
ITEM No. 5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	CORTE 11	Periodo del 1/01 /21 al 3/02/21

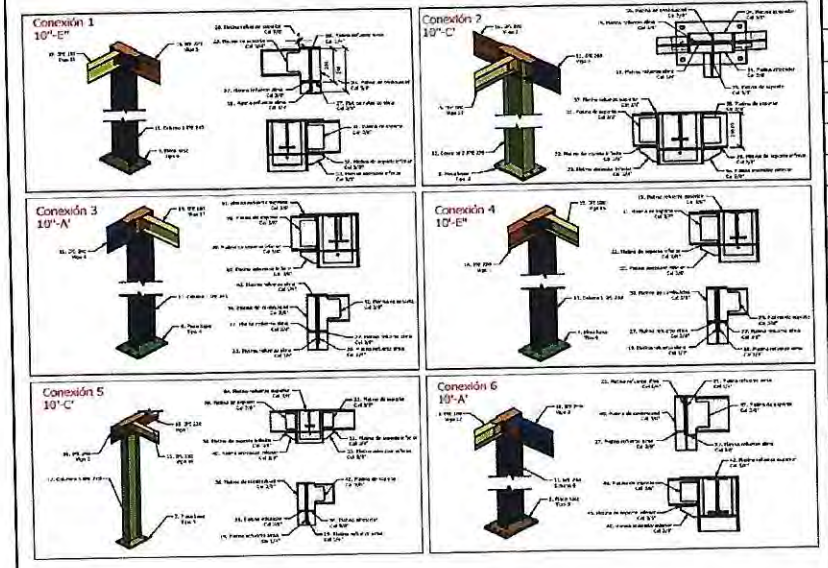

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 6	Refuerzo patin Platina 170mmx256mmx1/4"		0,044	49,85		2,00	4,39
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 6	Refuerzo patin Platina 220mmx51mmx3/8"		0,011	74,77		2,00	1,64
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 6	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		1,00	0,60
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 6	Platina de soporte 340mmx120mmx3/8"		0,041	74,77		1,00	3,07
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 6	Atizado Platina 100mmx70mmx3/8"		0,007	74,77		1,00	0,52
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 6	Atiezado Platina 100mmx130mmx3/8"		0,013	74,77		1,00	0,97
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 6	Refuerzo alma Platina 127mmx256mmx3/8"		0,033	74,77		1,00	2,47
VOLUMEN 3 - CABEZAL COLUMNA 6	Platina de soporte 230mmx60mmx3/8"		0,012	74,77		1,00	0,90
VOLUMEN 2 - PLACA BASE - COLUMNA 7	Refuerzo patin Platina 228mmx134mmx1/4"		0,031	49,85		2,00	3,09
VOLUMEN 2 - PLACA BASE - COLUMNA 7	Platina 226mmx211mmx3/8"		0,048	74,77		1,00	3,59
VOLUMEN 3 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 7	Refuerzo patin Platina 229mmx326mmx1/4"		0,075	74,77		2,00	11,22
VOLUMEN 3 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 7	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 3 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 7	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		2,00	1,50
VOLUMEN 3 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 7	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		1,00	0,60
VOLUMEN 3 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 7	Platina de soporte 150mmx400mmx3/8"		0,060	74,77		1,00	4,49
VOLUMEN 3 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 7	Platina de soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		1,00	1,35
VOLUMEN 3 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 7	Platina de soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
VOLUMEN 3 - CABEZAL SUPERIOR - COLUMNA 7	Atiesado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 3 - CABEZAL MEDIO - COLUMNA 7	Refuerzo patin Platina 229mmx134mmx1/4"		0,031	49,85		2,00	3,09
VOLUMEN 3 - CABEZAL MEDIO - COLUMNA 7	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 3 - CABEZAL MEDIO - COLUMNA 7	Refuerzo alma Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		2,00	1,50
VOLUMEN 3 - CABEZAL MEDIO - COLUMNA 7	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		2,00	1,20
VOLUMEN 3 - CABEZAL MEDIO - COLUMNA 7	Platina de soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		4,00	5,38
VOLUMEN 3 - CABEZAL MEDIO - COLUMNA 7	Platina soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
VOLUMEN 3 - CABEZAL MEDIO - COLUMNA 7	Atiezado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 3 - CABEZAL MEDIO - COLUMNA 7	Atiezado Platina 288mmx224mmx3/8"		0,065	74,77		1,00	4,86

Cantidad pagadas en los cortes	11.531,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	65,97
		Pasan	11708,08
Cantidad pagada Corte No. 09	470,00	Cantidad Contractual	12.185,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	11.531,36	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	60	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	MEMORIA FINAL	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

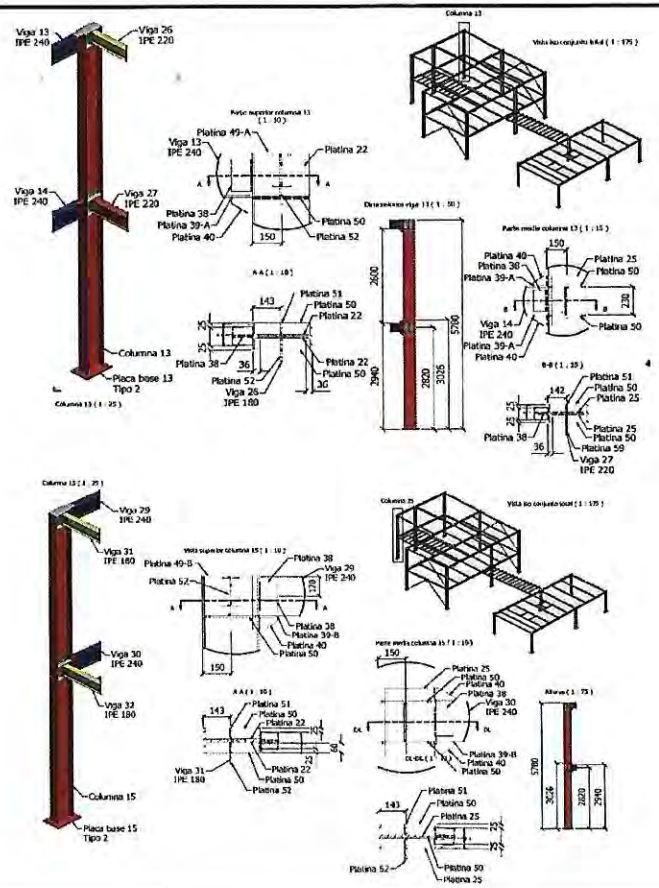

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 8	Platina de soporte 229mmx326mmx1/4"		0,075	49,85		2,00	7,48
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 8	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		2,00	2,54
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 8	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		1,00	0,75
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 8	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		1,00	0,60
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 8	Platina soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		1,00	1,35
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 8	Platina soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 8	Atiesado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 8	Refuerzo superior Platina 500mmx150mmx3/8"		0,075	74,77		1,00	5,61
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 8	Refuerzo patin Platina 229mmx326mmx1/4"		0,075	49,85		2,00	7,48
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 8	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 8	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		2,00	1,50
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 8	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		1,00	0,60
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 8	Platina soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		2,00	2,69
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 8	Platina soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 8	Atiesado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39

Cantidad pagadas en los cortes	11.531,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	38,88
		Pasan	11746,97
Cantidad pagada Corte No. 09	470,00	Cantidad Contractual	12.185,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.531,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	61	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	MEMORIA FINAL	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

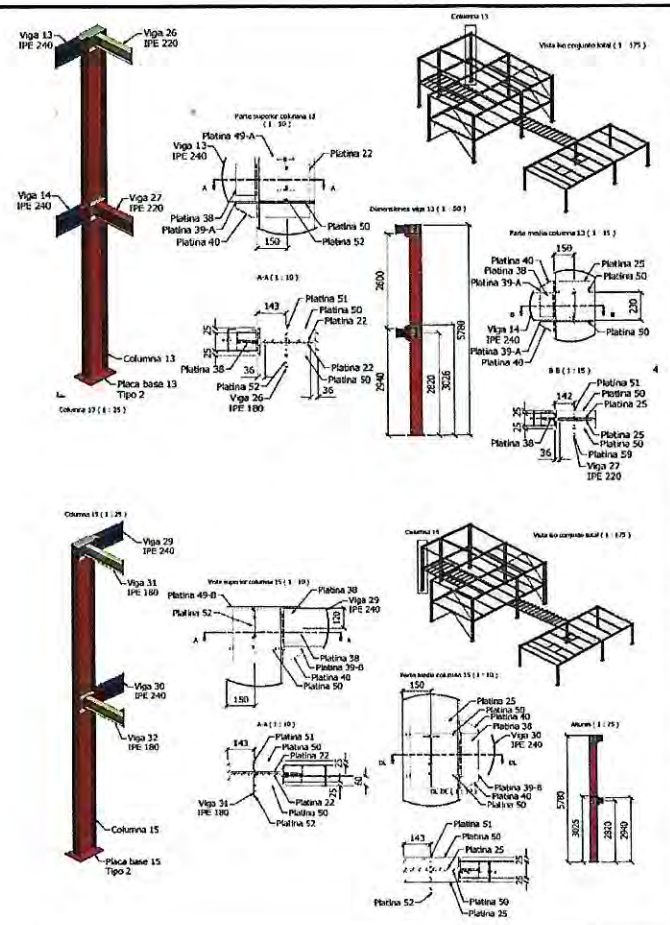

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2 - PLACA BASE COLUMNA 9	Refuerzo patin Platina 228mmx134mmx1/4"		0,031	49,85		2,00	3,09
VOLUMEN 2 - PLACA BASE COLUMNA 9	Atiesado Platina 226mmx211mmx3/8"		0,048	74,77		1,00	3,59
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 9	Platina de soporte 229mmx326mmx1/4"		0,075	74,77		2,00	11,22
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 9	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 9	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		1,00	0,75
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 9	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		1,00	0,60
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 9	Platina de soporte 150mmx400mmx3/8"		0,060	74,77		1,00	4,49
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 9	Platina soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		2,00	2,69
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 9	Platina soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	47,77		1,00	0,72
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 9	Atiezado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 9	Refuerzo patin Platina 229mmx134mmx1/4"		0,031	49,85		2,00	3,09
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 9	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 9	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		2,00	1,50
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 9	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		2,00	1,20
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 9	Platina soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		4,00	5,38
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 9	Platina soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 9	Atiesado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 9	Platina 288mmx224mmx3/8"		0,065	74,77		1,00	4,86

Cantidad pagadas en los cortes	11.531,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	51,61
		Pasan	11798,58
Cantidad pagada Corte No. 09	470,00	Cantidad Contractual	12.185,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	11.531,36	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizadaen la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	62 de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	MEMORIA FINAL	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21	

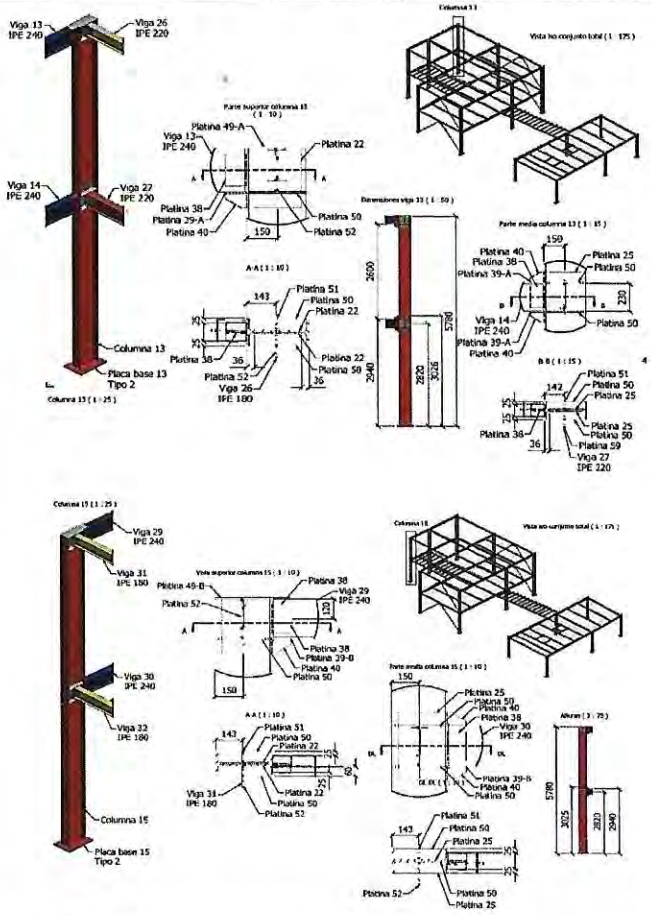

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2 - PLACA BASE COLUMNA 10	Refuerzo patin Platina 228mmx134mmx1/4"		0,031	49,85		2,00	3,09
VOLUMEN 2 - PLACA BASE COLUMNA 10	Atiesado Platina 226mmx211mmx3/8"		0,048	74,77		1,00	3,59
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 10	Platina de soporte 229mmx326mmx1/4"		0,075	74,77		2,00	11,22
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 10	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 10	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		1,00	0,75
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 10	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		1,00	0,60
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 10	Platina de soporte 150mmx400mmx3/8"		0,060	74,77		1,00	4,49
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 10	Platina soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		2,00	2,69
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 10	Platina soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	47,77		1,00	0,72
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 10	Atiezado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 10	Refuerzo patin Platina 229mmx134mmx1/4"		0,031	49,85		2,00	3,09
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 10	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 10	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		2,00	1,50
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 10	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		2,00	1,20
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 10	Platina soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		4,00	5,38
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 10	Platina soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 10	Atiesado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 10	Platina 288mmx224mmx3/8"		0,065	74,77		1,00	4,86

Cantidad pagadas en los cortes	11.531,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	51,61
		Pasan / vienen	11850,19
Cantidad pagada Corte No. 09	470,00	Cantidad Contractual	12.185,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	11.531,36	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	5 ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	63 de 313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA: EXTERIOR
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	MEMORIA FINAL: Periodo del 1/01/21 al 3/02/21

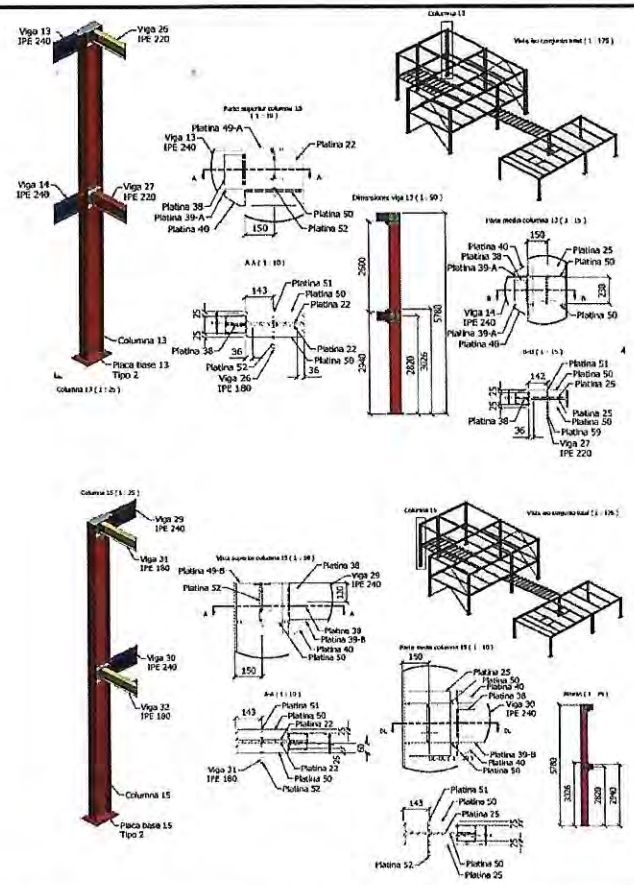

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 11	Platina de soporte 229mmx326mmx1/4"		0,075	49,85		2,00	7,48
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 11	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		2,00	2,54
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 11	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		2,00	1,50
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 11	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		2,00	1,20
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 11	Platina soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		2,00	2,69
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 11	Platina soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 11	Atiezado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 11	Platina 500mmx138mmx3/8"		0,075	74,77		1,00	5,61
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 11	Platina 229mmx326mmx1/4"		0,075	49,85		2,00	7,48
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 11	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		2,00	2,54
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 11	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		4,00	2,99
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 11	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		4,00	2,39
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 11	Platina soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		4,00	5,38
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 11	Platina soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 11	Atiezado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39

Cantidad pagadas en los cortes	11.531,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	48,83
		Pasan / vienen	11699,01
Cantidad pagada Corte No. 09	470,00	Cantidad Contractual	12.185,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.531,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	64	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	MEMORIA FINAL	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

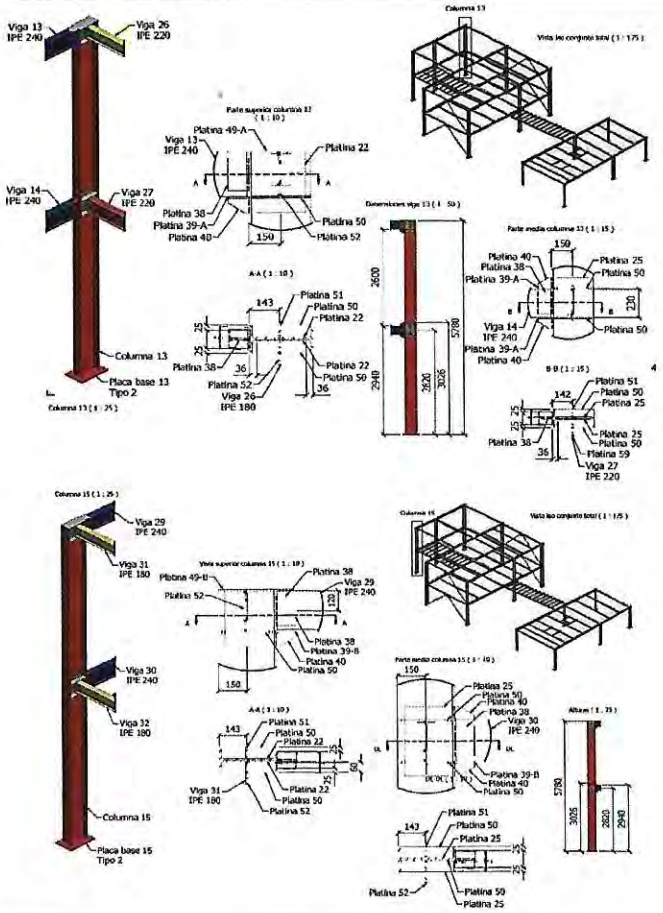

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2 - PLACA BASE COLUMNA 12	Refuerzo patin Platina 228mmx134mmx1/4"		0,031	49,85		2,00	3,09
VOLUMEN 2 - PLACA BASE COLUMNA 12	Atiesado Platina 226mmx211mmx3/8"		0,048	74,77		1,00	3,59
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 12	Platina de soporte 229mmx326mmx1/4"		0,075	74,77		2,00	11,22
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 12	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 12	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		1,00	0,75
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 12	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		1,00	0,60
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 12	Platina de soporte 150mmx400mmx3/8"		0,060	74,77		1,00	4,49
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 12	Platina soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		2,00	2,69
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 12	Platina soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	47,77		1,00	0,72
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 12	Atiezado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 12	Refuerzo patin Platina 229mmx134mmx1/4"		0,031	49,85		1,00	1,55
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 12	Refuerzo alma Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 12	Soporte inferior Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		2,00	1,50
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 12	Atizador Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		2,00	1,20
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 12	Platina soporte 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		4,00	5,38
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 12	Platina soporte 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 12	Atiesado Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 12	Platina 288mmx224mmx3/8"		0,065	74,77		1,00	4,86

Cantidad pagadas en los cortes	11.531,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	50,07
		Pasan / vienen	11949,08
Cantidad pagada Corte No. 09	470,00	Cantidad Contractual	12.185,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	11.531,36	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	65	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	MEMORIA FINAL	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

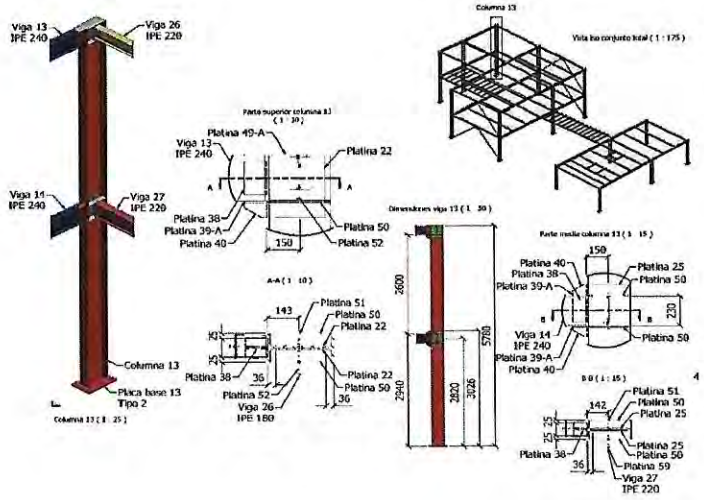

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 229mmx326mmx1/4"		0,031	49,85		2,00	3,09
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 174mmx100mmx3/8"		0,048	74,77		1,00	3,59
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 100mmx100mmx3/8"		0,075	74,77		2,00	11,22
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 100mmx76mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 150mmx400mmx3/8"		0,010	74,77		1,00	0,75
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 279mmx65mmx3/8"		0,008	74,77		1,00	0,60
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 230mmx65mmx3/8"		0,060	74,77		1,00	4,49
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 230mmx138mmx3/8"		0,018	74,77		2,00	2,69
VOLUMEN 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 13	Platina 229mmx326mmx1/4"		0,015	47,77		1,00	0,72
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 205mmx42mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 174mmx100mmx3/8"		0,031	49,85		1,00	1,55
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 100mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 100mmx76mmx3/8"		0,010	74,77		2,00	1,50
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 279mmx65mmx3/8"		0,008	74,77		2,00	1,20
VOLUMEN 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 13	Platina 230mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		4,00	5,38

Cantidad pagadas en los cortes	11.531,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	41,69
		Pasan / vienen	11990,77
Cantidad pagada Corte No. 09	470,00	Cantidad Contractual	12.185,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.531,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	66	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	MEMORIA FINAL	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

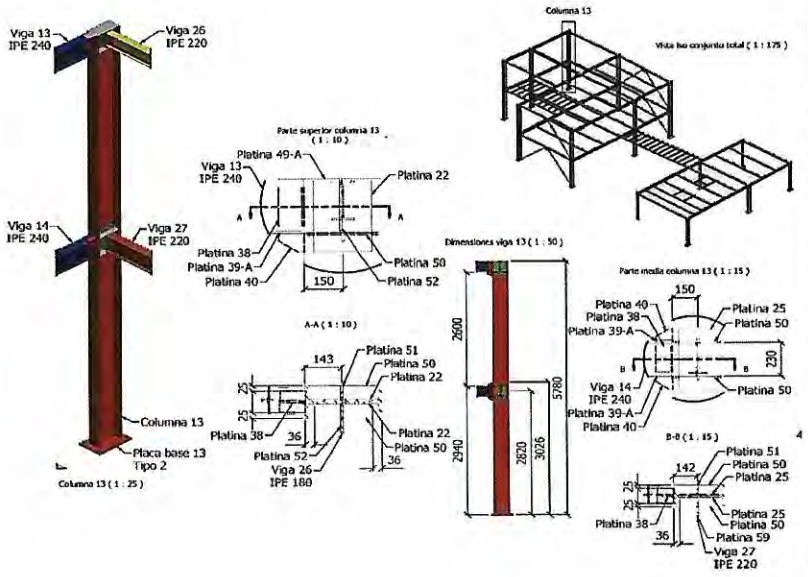

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 14	Platina 229mmx326mmx1/4"		0,075	49,85		2,00	7,48
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 14	Platina 240mmx158mmx1/4"		0,012	49,85		1,00	0,60
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 14	Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		2,00	2,54
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 14	Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		2,00	1,50
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 14	Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		2,00	1,20
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 14	Platina 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		2,00	2,69
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 14	Platina 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 14	Platina 500mmx150mmx3/8"		0,075	74,77		1,00	5,61
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 229mmx326mmx1/4"		0,075	49,85		2,00	7,48
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 174mmx100mmx3/8"		0,012	74,77		2,00	1,79
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	49,85		4,00	1,99
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 100mmx76mmx3/8"		0,080	74,77		4,00	23,93
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		4,00	5,38
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39

Cantidad pagadas en los cortes	11.531,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	66,82
		Pasan / vienen	12057,59
Cantidad pagada Corte No. 09	470,00	Cantidad Contractual	12.185,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.531,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	67 de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

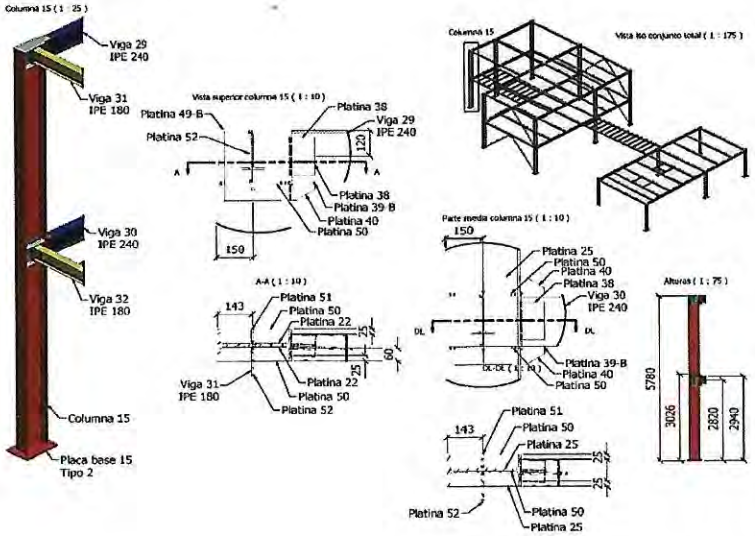

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 15	Platina 229mmx326mmx1/4"		0,075	49,85		2,00	7,48
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 15	Platina 174mmx100mmx3/8"		0,017	74,77		1,00	1,27
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 15	Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	74,77		1,00	0,75
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 15	Platina 100mmx76mmx3/8"		0,008	74,77		1,00	0,60
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 15	Platina 150mmx400mmx3/8"		0,060	74,77		1,00	4,49
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 15	Platina 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		2,00	2,69
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 15	Platina 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
PATIO 2 - CABEZAL SUPERIOR COLUMNA 15	Platina 230mmx138mmx3/8"		0,075	74,77		1,00	5,61
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 229mmx326mmx1/4"		0,075	49,85		2,00	7,48
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 174mmx100mmx3/8"		0,012	74,77		1,00	0,90
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 100mmx100mmx3/8"		0,010	49,85		2,00	1,00
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 100mmx76mmx3/8"		0,080	74,77		1,00	5,98
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 279mmx65mmx3/8"		0,018	74,77		4,00	5,38
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 230mmx65mmx3/8"		0,015	74,77		1,00	1,12
PATIO 2 - CABEZAL MEDIO COLUMNA 14	Platina 230mmx138mmx3/8"		0,032	74,77		1,00	2,39

Cantidad pagadas en los cortes	11.531,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	48,25
		Pasan / vienen	12105,84
Cantidad pagada Corte No. 09	470,00	Cantidad Contractual	12.185,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.531,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	68	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIMENSION	GROSOR	PESO X ML	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 - PUENTE VOLUMEN 1 - 2	Platina 76mmx61mmx3/8"		0,015		24,96	84,00	31,45
PATIO 2 - PUENTE VOLUMEN 1 - 2	Angulo de soporte de IPE de apoyo entramado		0,130		9,40	28,00	34,22
PATIO 2 - CUBIERTA ASCENSOR Y PUENTE	CUBIERTA PUENTE						346,46
PATIO 2 Y 3	REJILLA CARCAMOS CAÑUELAS	24,890			4,99	1,00	124,20
angulo 1/2"x 1/8		0,56	4,00				2,24
transversales		0,36	7,63				2,75
VOLUMEN 3 PISO 1	REJILLAS ARBOLES	1,310	1,500		8,65	1,00	17,00
		1,340	1,380		8,65	1,00	16,00

Cantidad pagadas en los cortes	11.881,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	574,31
		Pasan / vienen	12105,84
Cantidad pagada Corte No. 10	350,00	Cantidad Contractual	12.185,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.881,36**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**12680,15**
		CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	**798,79**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1:12185,61 KG / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 5,25 KG EJECUTADOS EN OBRA / PENDIENTES POR COBRAR EN PRESENTE ACTA: 895,15 KG / TOTAL CANTIDAD ITEM: 12776,51 KG.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	HOJA No.	69	de	313
UNIDAD	KG	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	HOJA No.	70	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	6.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTURADO # 4	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

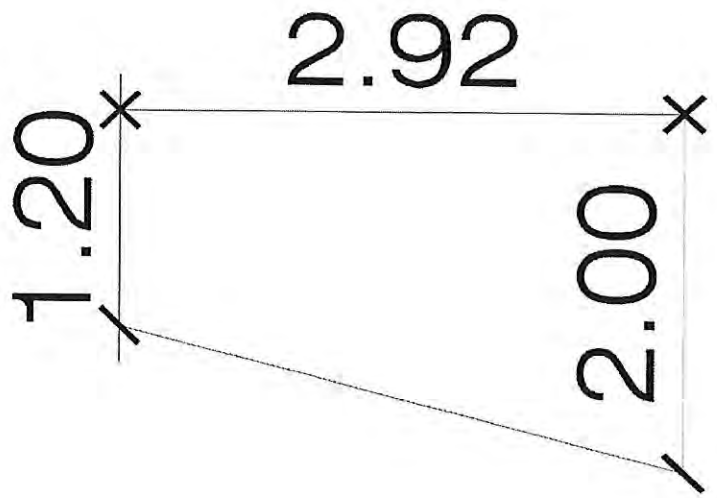

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ALTO	ANCHO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2 / MURO COLINDANTE COSTADO OCCIDENTAL	CONSTRUCCION DE MURO EN CUCHILLA	2,92	1,60			1,00	4,67

Cantidad pagadas en los cortes	148,75	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	4,67
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	120,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	148,75	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	4,67

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 153,00 M2 / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 0,42 M2 EJECUTADOS EN OBRA / TOTAL CANTIDAD ITEM: 153,42 M2 EJECUTADOS EN OBRA / PENDIENTES POR COBRAR EN ACTA 11: 4,67 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019			
CAPITULO	6.1	MUROS	HOJA No.	71	de	313	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	6.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTIRADO Nº 4	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	HOJA No.	72	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 6.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTIRADO N°. 4	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

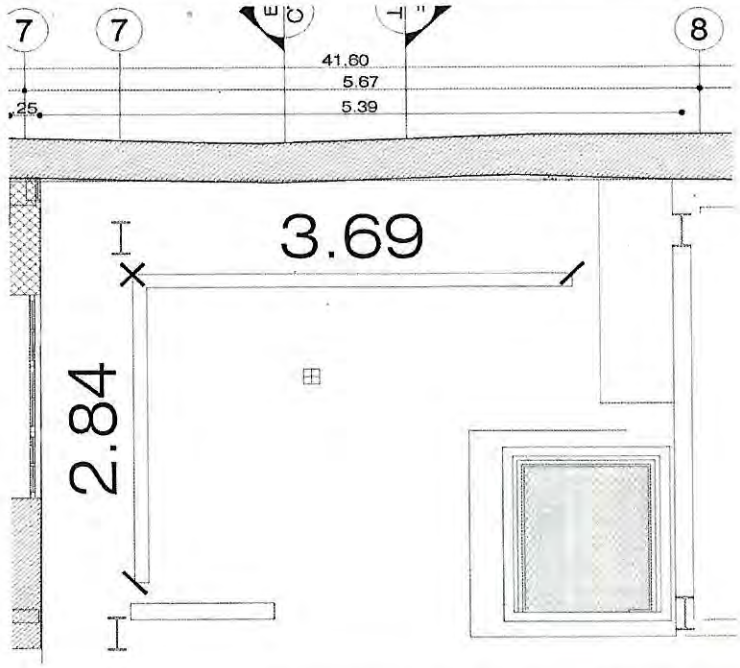

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 COSTADO ORIENTAL	BORDILLOS EN BLOQUE #4	2,84				1,00	2,84
PATIO 2 COSTADO ORIENTAL	BORDILLOS EN BLOQUE #4	3,69				1,00	3,69

Cantidad pagadas en los cortes	57,66	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	6,53
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 10	10,40	Cantidad Contractual	80,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	57,66	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	6,53

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 80,00 ML / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 15,81 ML / TOTAL CANTIDAD ITEM: 64,19 ML EJECUTADOS EN OBRA PENDIENTES POR COBRAR 6,53 ML EN PRESENTE ACTA

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	HOJA No.	73	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 6.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTIRADO Nº. 4	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	HOJA No.	74 de	313
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	NP 6.1.3	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 1/2" PROFUNDIDAD 15 CMS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

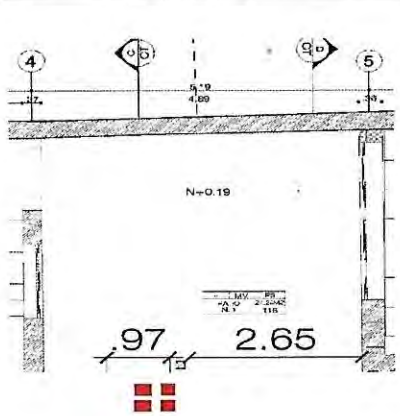

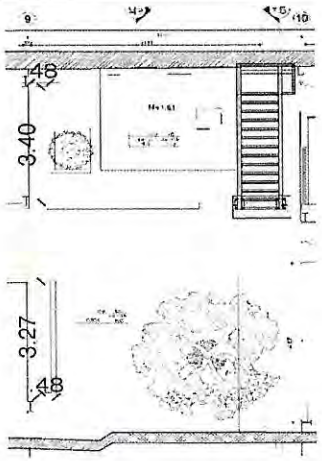

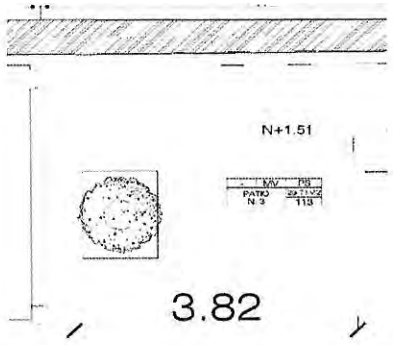

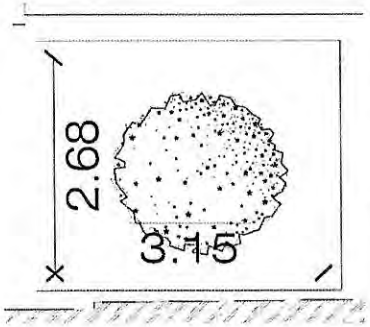

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIST ENTRE CU	CANT	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 1 BORDILLO BANCA	ANCLAJE VARILLA 1/2"	0,15		8,00		8,00	8,00
PATIO 3 BORDILLO CAÑUELA COSTADO ORIENTAL	ENCLAJE EPOXICO PARA VARILLA	3,40	0,2	17,00		2,00	34,00
PATIO 3 BORDILLO CAÑUELA COSTADO ORIENTAL	ENCLAJE EPOXICO PARA VARILLA	0,48	0,2	2,40		1,00	2,40
PATIO 3 BORDILLO CAÑUELA COSTADO OCCIDENTAL	ENCLAJE EPOXICO PARA VARILLA	3,00	0,2	15,00		1,00	15,00
PATIO 3 BORDILLO CAÑUELA COSTADO OCCIDENTAL	ENCLAJE EPOXICO PARA VARILLA	0,48	0,2	2,40		1,00	2,40
PATIO 3 BORDILLO RAMPA	ENCLAJE EPOXICO PARA VARILLA	3,82	0,2	19,10		1,00	19,10
PATIO 2 COSTADO OCCIDENTAL BORDILLO CAÑUELA	ENCLAJE EPOXICO PARA VARILLA	0,00	0,2	0,00		2,00	0,00
PATIO 2 COSTADO OCCIDENTAL BORDILLO CAÑUELA	ENCLAJE EPOXICO PARA VARILLA	3,42	0,20	17,10		2,00	34,20

Cantidad pagadas en los cortes	152,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	115,10
		Pasan	
Cantidad pagada Corte No. 10	24,00	Cantidad Contractual	230,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**152,00**	**CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE**	**115,10**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 230,00 UN / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 72,00 UN EJECUTADAS EN OBRA / TOTAL CANTIDAD ITEM: 302,00 UN EJECUTADAS EN OBRA PENDIENTES POR COBRAR EN ACTA 11: 150,00 UN.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	HOJA No.	75	de	313
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 6.1.3	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 1/2" PROFUNDIDAD 15 CMS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	6.2	MUROS LIVIANOS	HOJA No.	76	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	6.2.1	MUROS DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

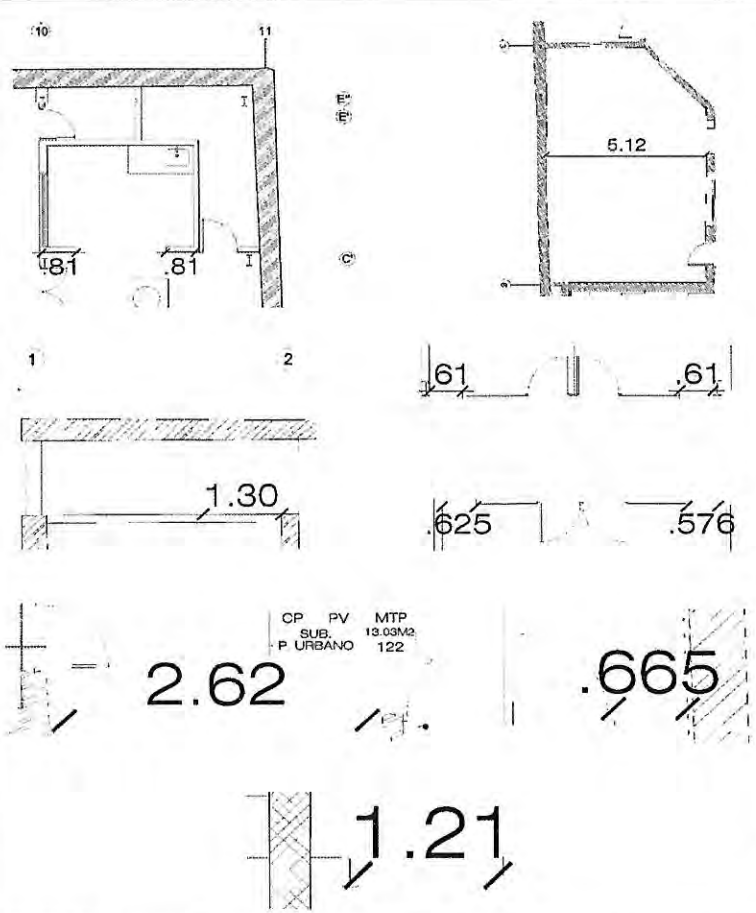

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PISO 1 LACTANCIA	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,81	0,20	2,537		2,00	4,11
VOLUMEN 3 PISO 1 DEPOSITO	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,665	0,20	2,448		1,00	1,63
VOLUMEN UNO SEGUNDA PLANTA	MURO SUPERBOARD DIVISORIO A DOS CARAS	5,12	0,20	3,00		1,00	15,36
VOLUMEN UNO - SELLAR VANO OFICINA RADICACIONES	MURO SUPER BOARD DOS CARAS	1,05	0,20	2,40		1,00	2,52
VOLUMEN UNO - SEGUNDA PLANTA SUB P URBANO	MURO SUPER BOARD DOS CARAS	2,62	0,20	0,76		1,00	1,99
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA COST ORIENTAL	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,61	0,15	2,4		2,00	2,93
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA COST OCCIDENTAL	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,625	0,15	2,42		1,00	1,51
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA COST OCCIDENTAL	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,58	0,15	2,42		1,00	1,39
VOLUMEN DOS SEGUNDO PISO	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,61	0,15	2,46		2,00	3,02
VOLUMEN TRES PRIMER PISO MOCHETA COCINA	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	1,20	0,20	2,32		1,00	2,78

Cantidad pagadas en los cortes	79,47	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	37,24
		Pasan / vienen	37,24
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	79,47	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	6.2	MUROS LIVIANOS	HOJA No.	77 de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	6.2.1	MUROS DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

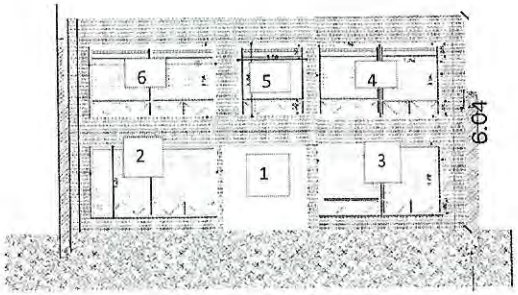

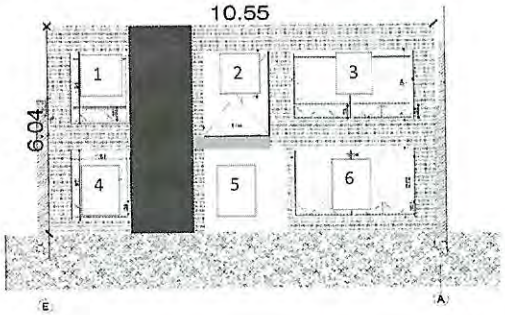

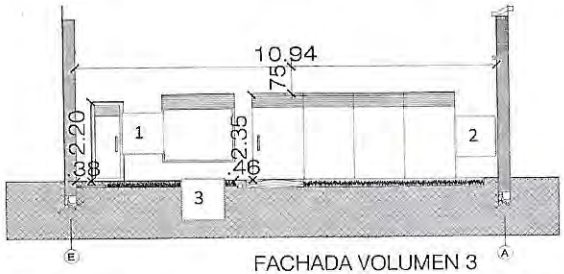

FACHADA VOLUMEN 3

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
FACHADA SUR VOLUMEN 2	FACHADA EN SUPERBOARD A DOS CARAS	11,22		5,935		1,00	66,59
1	VANO DE ACCESO	2,11		2,190		-1,00	-4,62
2	MENOS VANO VENTANA		3,32	1,860		-1,00	-6,18
3	MENOS VANO VENTANA		3,04	1,860		-1,00	-5,65
4	MENOS VANO VENTANA		3,34	1,930		-1,00	-6,45
5	MENOS VANO VENTANA		1,56	1,930		-1,00	-3,01
6	MENOS VANO VENTANA		3,32	1,930		-1,00	-6,41
FACHADA NORTE VOLUMEN 2	FACHADA EN SUPERBOARD A DOS CARAS	10,56		6,010		1,00	63,466
1	VANO VENTANA		1,54	1,935		-1,00	-2,97
2	VANO PUENTE		1,55	2,330		-1,00	-3,61
3	VANO PUENTE		3,36	1,920		-1,00	-6,45
4	VANO VENTANA		1,55	1,86		-1,00	-2,88
5	VANO ACCESO		2,09	2,28		-1,00	-4,77
6	VANO VENTANA		3,37	1,860		-1,00	-6,27
FACHADA VOLUMEN 3	FACHADA EN SUPERBOARD A DOS CARAS	10,96		3,06		1,00	33,54
	VENTANA		5,01	2,32		-1,00	-11,62
	VENTANA		1,76	1,91		-1,00	-3,36
	PUERTA		0,84	2,34		-1,00	-1,95

Cantidad pagadas en los cortes	79,47	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	87,39
		Pasan / vienen	37,24
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	79,47	CANT. TOTAL MEMORIAS	124,64
		CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	45,17

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 103.00 M2 / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 15,52 M2 EJECUTADA EN OBRA, DE LA CUAL SE COBRARON: 79,47 M2 EN ACTAS ANTERIORES, QUEDANDO PENDIENTE POR COBRAR EN ACTA 11: 39,05 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-2019		
CAPITULO	6.2	MUROS LIVIANOS	**HOJA No.**	78	**de**	313
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	VOLUMEN 2		
ITEM No.	6.2.1	MUROS DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO

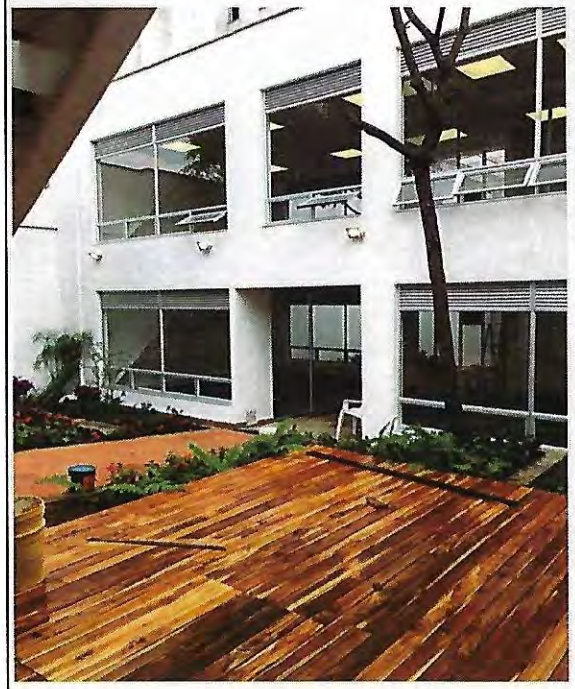





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO


PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	6.2	MUROS LIVIANOS	HOJA No.		79	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	6.2.2	MUROS (< a 50cm) DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21			



MOCHETAS PARA MARCO PUERTA MADERA







4

MURO BAJO DIVISION RACK - OFICINA

VACIOS ARBOLES VOLUMEN TRES

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN UNO - SEGUNDA PLANTA	MOCHETAS DOBLE CARA	2,12	0,13	2,120		2,00	4,240
VOLUMEN TRES - PRIMER PLANTA - VACIOS ARBOLES	MURO PARA TAPAR VACIOS ARBOLES	1,50	0,15	0,57		2,00	3,00
VOLUMEN TRES - PRIMER PLANTA - VACIOS ARBOLES	MURO PARA TAPAR VACIOS ARBOLES	1,42	0,15	0,57		2,00	2,84
VOLUMEN TRES - PRIMER PLANTA - VACIOS ARBOLES	MURO PARA TAPAR VACIOS ARBOLES	1,15	0,15	0,57		2,00	2,30
VOLUMEN TRES - PRIMER PLANTA - VACIOS ARBOLES	MURO PARA TAPAR VACIOS ARBOLES	1,42	0,15	0,57		2,00	2,84

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	15,22
		Pasan / vienen	15,22
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	0,00	CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	6.2	MUROS LIVIANOS	HOJA No.	80	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	6.2.2	MUROS (< a 50cm) DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

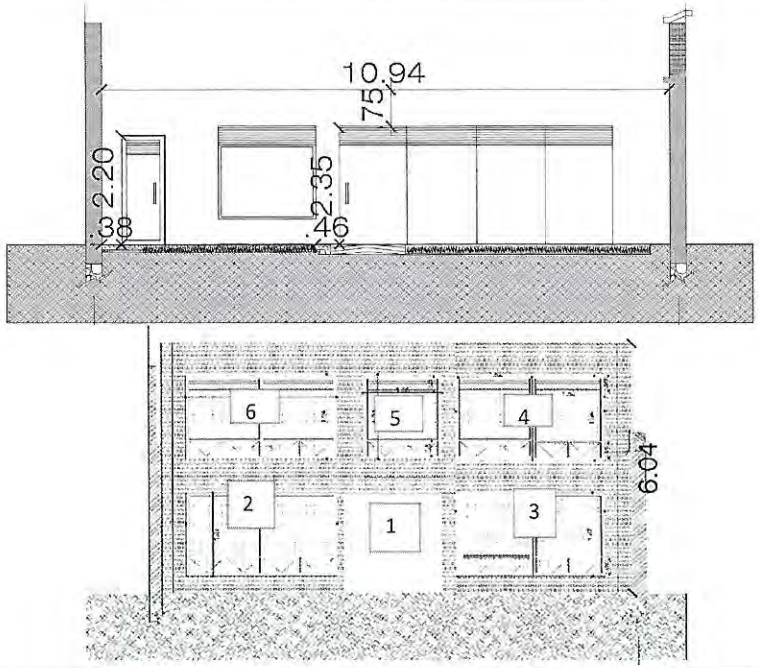

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 - FACHADA PRIMER PLANTA							
		2,32				2,00	4,640
	ventana	1,76				1,00	1,760
		1,91				2,00	3,820
	puerta	2,34				2,00	4,680
FACHADA SUR VOLUMEN 2							
2	VENTANA	3,32				1,00	3,320
		1,86				2,00	3,720
3		3,04				1,00	3,040
		1,86				2,00	3,720
4		3,34				1,00	3,340
		1,93				2,00	3,860
5		1,56				1,00	1,560
		1,93				2,00	3,860
6		3,32				1,00	3,320
		1,93				2,00	3,860

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	48,50
		Pasan / vienen	15,22
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	0,00	CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	6.2	MUROS LIVIANOS	**HOJA No.**		81	**de**	313
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	6.2.2	MUROS (< a 50cm) DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

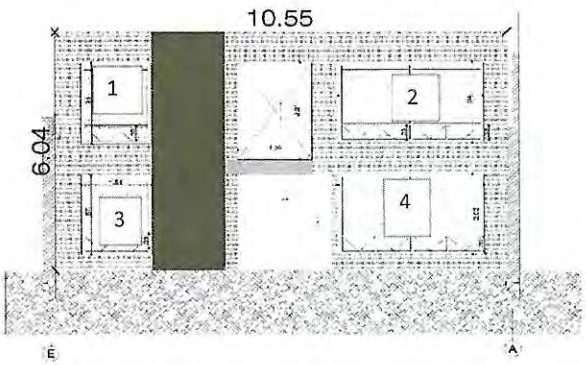

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
FACHADA NORTE VOLUMEN 2							
1		1,540				1,00	1,540
		1,935				2,00	3,870
2		3,360				1,00	3,360
		1,920				2,00	3,840
3		1,550				1,00	1,550
		1,860				2,00	3,720
4		3,370				1,00	3,370
		1,860				2,00	3,720

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	24,97
		Pasan / vienen	63,72
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE**	**88,69**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-2019		
CAPITULO	6.2	MUROS LIVIANOS	HOJA No.		82	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	VOLUMEN 2			
ITEM No.	6.2.2	MUROS (< a 50cm) DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7.2	CIELO RASOS	HOJA No.	83 de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	7.2.3	DINTELES EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

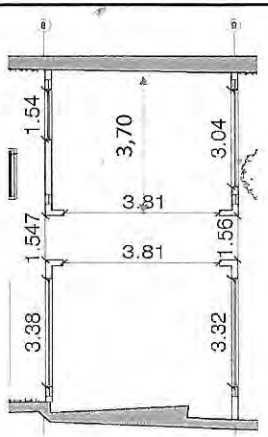

VOLUMEN DOS PRIMER PISO

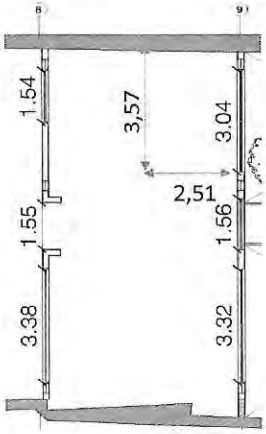

VOLUMEN DOS SEGUNDO PISO

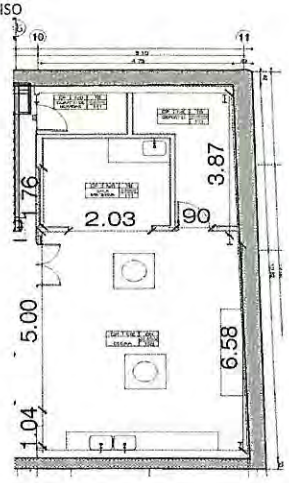

VOLUMEN TRES

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	DINTEL ACCESO OFICINAS	3,81				2,00	7,62
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	DINTEL DIVISION OFICINA	3,70				1,00	3,70
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	DINTEL TAPAS BAJANTE AGUA LLUVIA	1,04				1,00	1,04
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	DINTEL ACCESO DEPOSITO	0,900				1,00	0,90
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	DINTEL ACCESO LACTANCIA	1,611				1,00	1,61
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	DINTEL ACCESO BOMBAS	0,838				1,00	0,84
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	DINTEL PERIMETRAL FACHADA	5,005				1,00	5,01
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	DINTEL VANO VENTANA LACTANCIA	1,764				1,00	1,76
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	DINTEL ACCESO A VOLUMEN 2	2,09				1,00	2,09
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA - COSTADO NOR ORIENTAL	DINTEL VANO VENTANA OFICINA ORIENTAL	1,547				1,00	1,55
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA - COSTADO NOR OCCIDENTAL	DINTEL VANO VENTANA OFICINA OCCIDENTAL	3,37				1,00	3,37
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	DINTEL ACCESO SUR	2,12				1,00	2,12
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	DINTEL VANO VENTANA OFICINA OCCIDENTAL	3,32				1,00	3,32
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	DINTEL VANO VENTANA OFICINA OCCIDENTAL	3,04				1,00	3,04
VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA	DINTEL VANO ACCESO PUENTE	1,55				1,00	1,55
VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA	DINTEL VANO NOR ORIENTAL	1,54				1,00	1,54
VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA	DINTEL VANO NOR OCCIDENTAL	3,34				1,00	3,34
VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA	DINTEL DIVISION OFICINA	6,07				1,00	6,07
VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA COSTADO SUR	DINTEL VANO SUR ORIENTAL	3,04				1,00	3,04
VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA COSTADO SUR	DINTEL VANO SUR	1,57				1,00	1,57
VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA COSTADO SUR	DINTEL VANO SUR OCCIDENTAL	3,37				1,00	3,37

Cantidad pagadas en los cortes	22,68	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	58,44
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	23,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	22,68	CANT. TOTAL MEMORIAS	58,44
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	35,76

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7.2	CIELO RASOS	HOJA No.	84	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	7.2.3	DINTELES EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		


REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTA INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	7.2	CIELO RASOS	HOJA No.	85	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	7.2.4	DILATACION Z CONTRA MUROS	CORTE 11	Periodo del 13/12/20 al 31/12/20		

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL

Cantidad pagadas en los cortes	60,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	0,00
		Pasan	
Cantidad pagada Corte No. 10	60,00	Cantidad Contractual	60,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**60,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**-60,00**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 60,00 ML / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 60.00 ML COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES Y NO EJECUTADO EN OBRA / ITEM CON UNA CANTIDAD NEGATIVA DE: -60.00 ML

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	HOJA No.	86 de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	MEMORIA FINAL	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

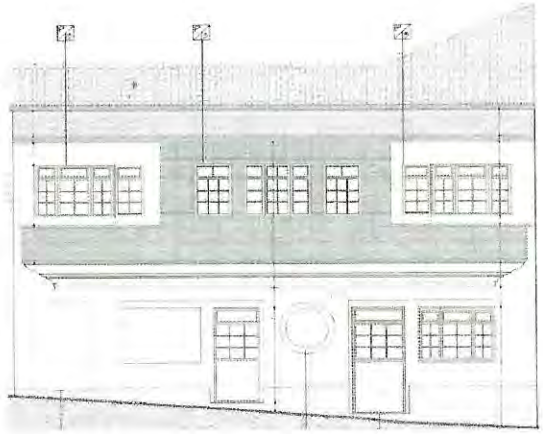

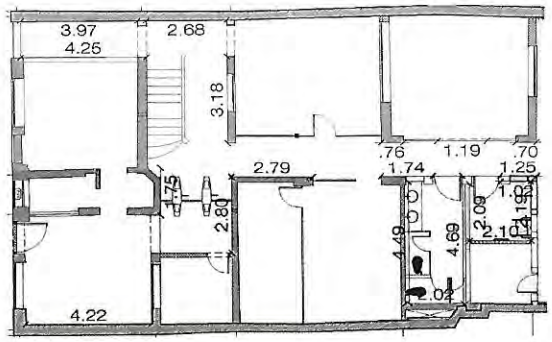

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
FACHADA PRINCIPAL	ESTUCO	11,950		7,72		1,00	92,25
	BALCON	3,200		1,03		4,00	13,18
	MUROS LATERALES		0,56	2,88		2,00	3,23
	CUBIERTA-BALCON	3,200		0,60		2,00	3,84
SEGUNDO PISO	VANO VENTANA	1,860		1,52		-1,00	-2,83
	VANO PUERTA BALCON	0,650		2,22		-1,00	-1,44
	VENTANAS	0,850		1,29		-1,00	-1,10
	VENTANAS	1,550		1,29		-1,00	-2,00
	VENTANAS	0,850		1,29		-1,00	-1,10
	VANO VENTANA	1,860		1,52		-1,00	-2,83
	VANO PUERTA BALCON	0,650		2,22		-1,00	-1,44
PRIMER PISO	VANO ACCESO DISCAP.		1,34	2,23		-1,00	-2,99
	VANO VENTANA		1,76	1,48		-1,00	-2,60
	AREA OCULO						-0,76
	PUERTA RADICACION		1,18	2,85		-1,00	-3,36
	VENTANA ACCESO RADICACION		1,57	1,75		-1,00	-2,75
BIC PRIMER PLANTA							
HALL ACCESO	ESTUCO	3,970		2,90		1,00	11,51
HALL ACCESO	ESTUCO	4,250		2,90		1,00	12,33
HALL ACCESO	ESTUCO	2,680		2,90		1,00	7,77
HALL ACCESO	ESTUCO	3,180		2,90		1,00	9,22
TORNIQUIETES	ESTUCO	1,750		2,90		1,00	5,08
RECEPCION	ESTUCO	4,220		3,46		1,00	14,60
TORNIQUIETES	ESTUCO	2,800		2,90		1,00	8,12
HALL	ESTUCO	2,790		2,90		1,00	8,09
HALL	ESTUCO	0,760		2,90		1,00	2,20
HALL	ESTUCO	1,740		2,90		1,00	5,05
HALL	ESTUCO	1,250		2,90		1,00	3,63
HALL	ESTUCO	0,700		2,90		1,00	2,03

Cantidad pagadas en los cortes	142,69	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	176,93
		Pasan / vienen	176,93
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	142,69	CANT.TOTAL MEMORIAS	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	HOJA No.	87	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

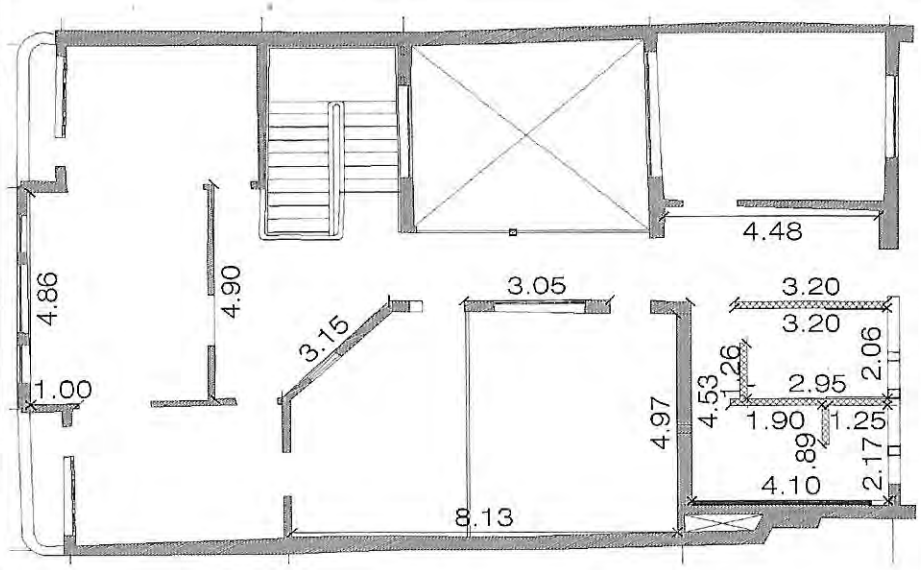

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
BIC SEGUNDA PLANTA							
HALL	ESTUCO (descontando vanos)	4,66		2,90		1,00	9,38
HALL	ESTUCO	1,00		2,90		1,00	2,90
HALL	ESTUCO	4,90		2,90		1,00	11,57
HALL	ESTUCO	3,25		2,90		1,00	7,34
HALL	ESTUCO	3,05		2,90		1,00	8,85
	MENOS VANO VENTANA	1,87		1,48		-1,00	-2,77
HALL	ESTUCO	8,13		2,90		1,00	23,58
HALL	ESTUCO	4,97		2,90		1,00	14,41
HALL	ESTUCO	4,48		2,90		1,00	10,66
HALL	ESTUCO	3,20		2,90		1,00	9,28
HALL	ESTUCO	3,20		2,90		1,00	9,28

Cantidad pagadas en los cortes	142,69	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	104,48
		Pasan / vienen	176,93
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**142,69**	**CANT.A PAGAR EN PRESENTE CORTE**	**281,41**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 315.00 M2 / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 88,75 M2 EJECUTADOS EN OBRA / TOTAL CANTIDAD ITEM: 424,10 M2 EJECUTADOS EN OBRA PENDIENTE POR COBRAR: 281,41 M2 EJECUTADOS EN OBRA

CARLESA

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

Liliana Marcelo T.

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019			
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.	88	de	313	
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	HOJA No.	89	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	7.3.2	ESTUCO SOBRE CIELO RASO (Incuye cinta malla)	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

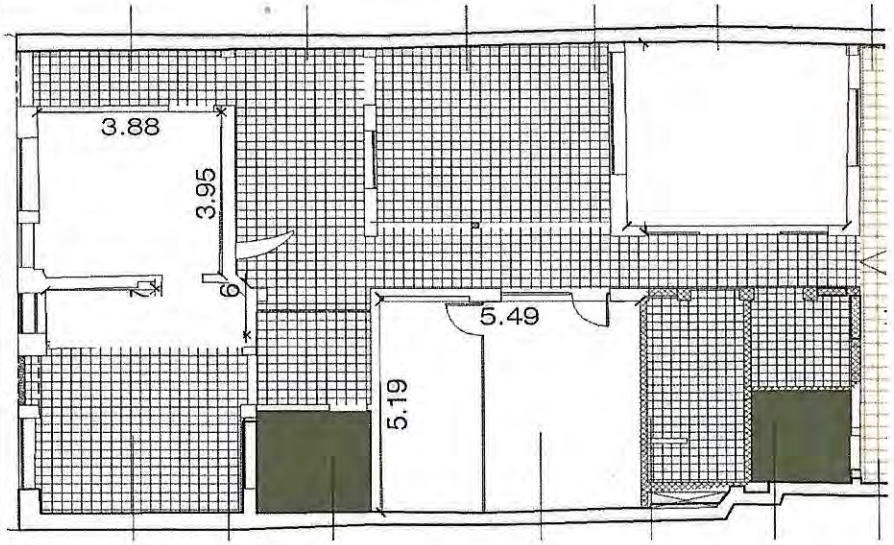

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN UNO - PRIMER PISO - OFICINA RADICACIONES	ESTUCO SOBRE CIELO RASO POR DILATACIONES	3,95	3,88			1,00	15,33
VOLUMEN UNO PRIMER PISO OFICINA SISTEMAS	ESTUCO SOBRE CIELO RASO POR DILATACIONES	5,19	5,49			1,00	28,49

Cantidad pagadas en los cortes	175,54	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	43,82
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	185,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	175,54	CANT. TOTAL MEMORIAS	43,82

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 200.00 M2 / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 19.36 M2 EJECUTADOS EN OBRA Y NO COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES / TOTAL CANTIDAD ITEM: 219.36 M2 EJECUTADOS EN OBRA Y COBRADOS: 175.54 M2 EN AC TAS ANTEREIORES / PENDIENTES POR COBRAR EN ACTA 11: 43,82 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	HOJA No.		90	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	7.3.2	ESTUCO SOBRE CIELO RASO (Incuye cinta malla)	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO











OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : 0CHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP			CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	HOJA No.		91	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	7.3.3	ESTUCO SOBRE MUROS (Fibrocemento y drywall)	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

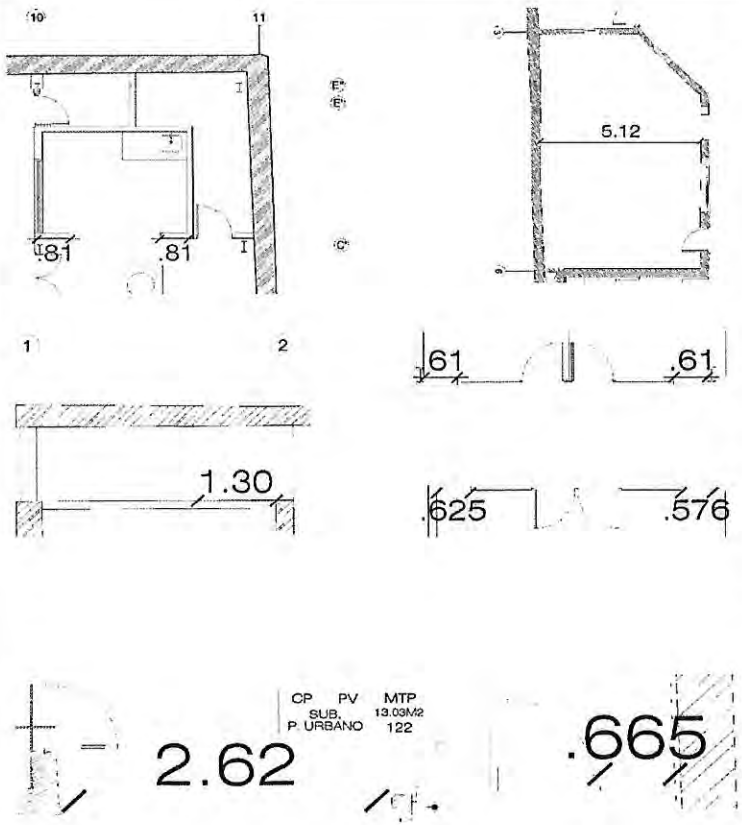

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PISO 1 LACTANCIA	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,81		2,537		2,00	4,11
VOLUMEN 3 PISO 1 DEPOSITO	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,665		2,448		1,00	1,63
VOLUMEN UNO SEGUNDA PLANTA	MURO SUPERBOARD DIVISORIO A DOS CARAS	5,120		2,900		1,00	14,85
VOLUMEN UNO - SELLAR VANO OFICINA RADICACIONES	MURO SUPER BOARD DOS CARAS	1,050		2,400		1,00	2,52
VOLUMEN UNO - SEGUNDA PLANTA SUB P URBANO	DINTEL SUPERBOARD DOS CARAS	2,615		0,760		1,00	1,99
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA COST ORIENTAL	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,610		2,400		2,00	2,93
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA COST OCCIDENTAL	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,625		2,420		1,00	1,51
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA COST OCCIDENTAL	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,576		2,420		1,00	1,39
VOLUMEN DOS SEGUNDO PISO	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,613		2,464		2,00	3,02
VOLUMEN TRES PRIMER PISO MOCHETA COCINA	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	1,215		2,320		1,00	2,82

Cantidad pagadas en los cortes	16,67	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	36,77
		Pasan / vienen	36,77
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	182,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	16,67	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 182,00 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 62,84 M2 DE LOS CUALES SE PAGARON: 16,67 EN ACTAS ANTERIORES / TOTAL CANTIDAD ITEM: 119.16 M2 EJECUTADOS EN OBRA Y PENDIENTES POR COBRAR: 102,49 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	HOJA No.	92 de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	7.3.3	ESTUCO SOBRE MUROS (Fibrocemento y drywall)	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

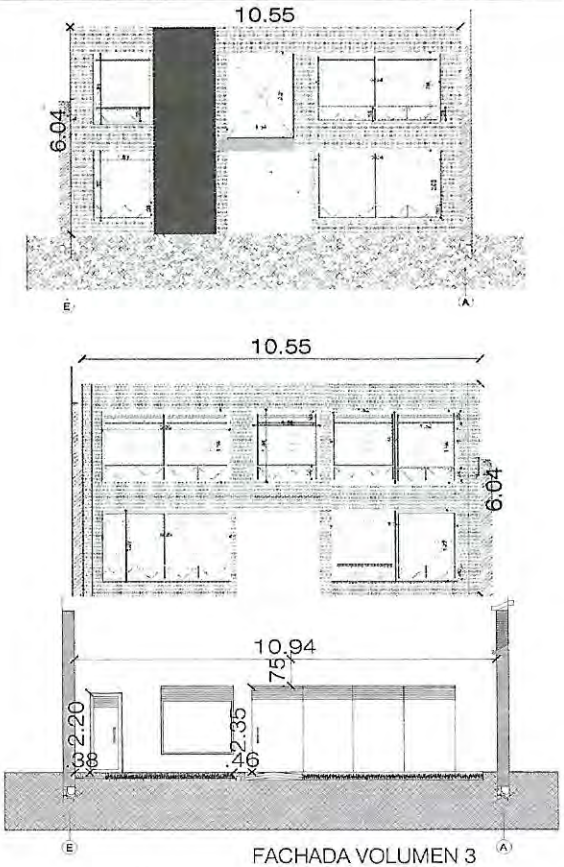

FACHADA VOLUMEN 3

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
FACHADA SUR VOLUMEN 2	FACHADA EN SUPERBOARD A DOS CARAS	11,22		5,935		1,00	66,59
1	VANO DE ACCESO	2,11		2,190		-1,00	-4,62
2	MENOS VANO VENTANA		3,32	1,860		-1,00	-6,18
3	MENOS VANO VENTANA		3,04	1,860		-1,00	-5,65
4	MENOS VANO VENTANA		3,34	1,930		-1,00	-6,45
5	MENOS VANO VENTANA		1,56	1,930		-1,00	-3,01
6	MENOS VANO VENTANA		3,32	1,930		-1,00	-6,41
FACHADA NORTE VOLUMEN 2	FACHADA EN SUPERBOARD A DOS CARAS	10,56		6,010		1,00	63,466
1	VANO VENTANA		1,54	1,935		-1,00	-2,97
2	VANO PUENTE		1,55	2,330		-1,00	-3,61
3	VANO PUENTE		3,36	1,920		-1,00	-6,45
4	VANO VENTANA		1,55	1,86		-1,00	-2,88
5	VANO ACCESO		2,09	2,28		-1,00	-4,77
6	VANO VENTANA		3,37	1,860		-1,00	-6,27
FACHADA VOLUMEN 3	FACHADA EN SUPERBOARD A DOS CARAS	10,96		3,06		1,00	33,54
	VENTANA		5,01	2,32		-1,00	-11,62
	VENTANA		1,76	1,91		-1,00	-3,36
	PUERTA		0,84	2,34		-1,00	-1,95

Cantidad pagadas en los cortes	16,67	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	87,39
		Pasan / vienen	36,77
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	16,67	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	124,16
		CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	107,49

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 182,00 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 62,84 M2 DE LOS CUALES SE PAGARON: 16,67 EN ACTAS ANTERIORES / TOTAL CANTIDAD ITEM: 119.16 M2 EJECUTADOS EN OBRA Y PENDIENTES POR COBRAR: 102,49 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-2019		
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	**HOJA No.**	93	**de**	313
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	VOLUMEN 2		
ITEM No.	7.3.3	ESTUCO SOBRE MUROS (Fibrocemento y drywall)	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.	94	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	7.3.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE (ML)	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		



MOCHETAS PARA MARCO PUERTA MADERA

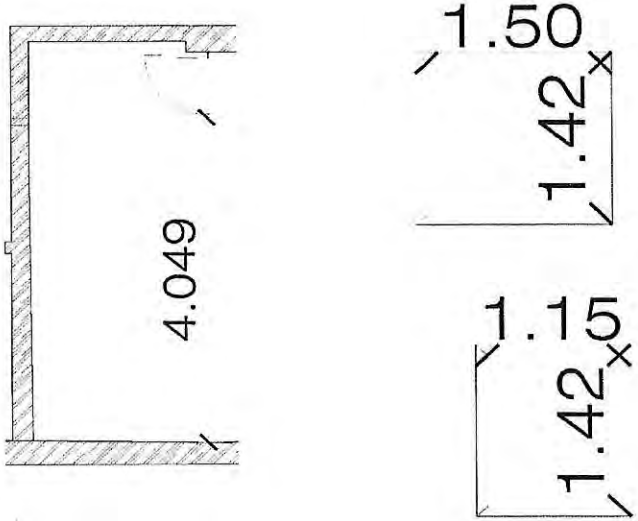

4

MURO BAJO DIVISION RACK - OFICINA

VACIOS ARBOLES VOLUMEN TRES

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN UNO - SEGUNDA PLANTA	MOCHETAS DOBLE CARA	2,12	0,13	2,120		2,00	4,240
VOLUMEN UNO - PRIMER PLANTA - RACK	MURO BAJO DIVISION RACK	4,05	0,20	0,300		1,00	4,05
VOLUMEN TRES - PRIMER PLANTA - VACIOS ARBOLES	MURO PARA TAPAR VACIOS ARBOLES	1,50	0,15	0,57		2,00	3,00
VOLUMEN TRES - PRIMER PLANTA - VACIOS ARBOLES	MURO PARA TAPAR VACIOS ARBOLES	1,42	0,15	0,57		2,00	2,84
VOLUMEN TRES - PRIMER PLANTA - VACIOS ARBOLES	MURO PARA TAPAR VACIOS ARBOLES	1,15	0,15	0,57		2,00	2,30
VOLUMEN TRES - PRIMER PLANTA - VACIOS ARBOLES	MURO PARA TAPAR VACIOS ARBOLES	1,42	0,15	0,57		2,00	2,84

Cantidad pagadas en los cortes	178,34	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	19,27
		Pasan / vienen	19,27
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	185,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	178,34	CANT. TOTAL MEMORIAS	

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 185,00 ML / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 57,12 M2 EJECUTADA EN OBRA / TOTAL CANTIDAD ITEM: 242,12 EJECUTADOS EN OBRA Y COBRADOS: 178.34 ML EN ACTAS ANTERIORES / PENDIENTE POR COBRAR: 63,78 ML EJECUTADOS EN OBRA.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	HOJA No.	96	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	7.3.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE (ML)	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

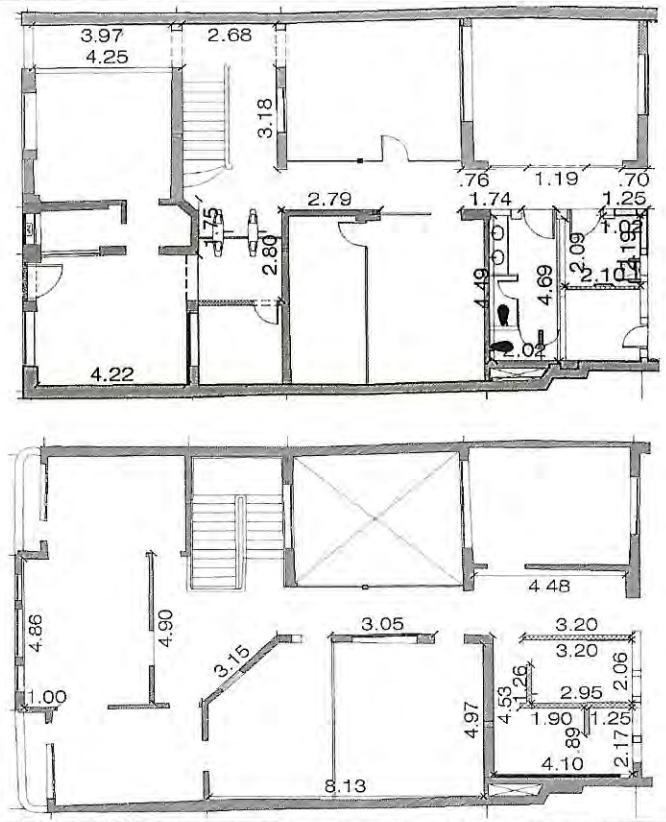

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ALTO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
BIC PRIMER PLANTA							
BAÑOS	ESTUCO	4,49	0,42			1,00	4,49
BAÑOS	ESTUCO	2,02	0,42			1,00	2,02
BAÑOS	ESTUCO	4,69	0,42			1,00	4,69
BAÑOS	ESTUCO	2,09	0,42			1,00	2,09
BAÑOS	ESTUCO	2,10	0,42			1,00	2,10
BÑOS	ESTUCO	2,19	0,42			1,00	2,19
BAÑOS	ESTUCO	1,02	0,42			1,00	1,02
BIC SEGUNDA PLANTA							
BAÑOS	ESTUCO	4,53				1,00	4,53
BAÑOS	ESTUCO	4,10				1,00	4,10
BAÑOS	ESTUCO	2,17				1,00	2,17
BAÑOS	ESTUCO	1,25				1,00	1,25
BAÑOS	ESTUCO	0,89				2,00	1,78
BAÑOS	ESTUCO	1,26				2,00	2,52
BÑOS	ESTUCO	2,95				1,00	2,95
BAÑOS	ESTUCO	2,06				1,00	2,06

Cantidad pagadas en los cortes	178,34	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	39,96
		Pasan / vienen	19,27
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	185,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	178,34	CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	59,23

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 185,00 ML / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 57,12 M2 EJECUTADA EN OBRA / TOTAL CANTIDAD ITEM: 237,57 EJECUTADOS EN OBRA Y COBRADOS: 178.34 ML EN ACTAS ANTERIORES / PENDIENTE POR COBRAR: 59,23 ML EJECUTADOS EN OBRA.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	**HOJA No.**	97	**de**	313
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	7.3.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE (ml)	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8	PISOS Y CIELO RASO	HOJA No.		98	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	8.1.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

PRIMER PLANTA

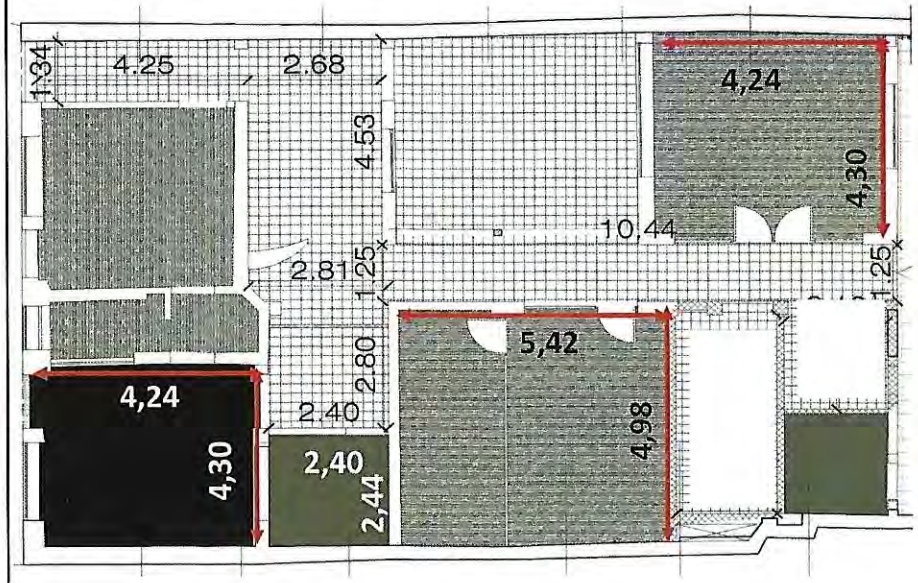

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA							
HALL CIRCULACION	ALISTADO DE PISO	10,44	1,25			1,00	13,05
	ALISTADO DE PISO						
OFICINA SISTEMAS	ALISTADO DE PISO	5,420	4,98			1,00	26,99
	ALISTADO DE PISO						
OFICINA PUBLICACIONES	ALISTADO DE PISO	4,240	4,30			1,00	18,23
	ALISTADO DE PISO						
HALL ACCESO	ALISTADO DE PISO	4,250	1,34			1,00	5,70
	ALISTADO DE PISO						
HALL ESCALERAS	ALISTADO DE PISO	2,680	4,53			1,00	12,14
ACCESO ESCALERAS	ALISTADO DE PISO	2,810	1,25			1,00	3,51
	ALISTADO DE PISO						
TORNIQUETES	ALISTADO DE PISO	2,800	2,40			1,00	6,72
	ALISTADO DE PISO						
RECEPCION	ALISTADO DE PISO	4,240	4,30			1,00	18,23
CUARTO ELECTRICO	ALISTADO DE PISO	2,40	2,44			1,00	5,86

Cantidad pagadas en los cortes	329,11	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	110,43
		Pasan / vienen	110,43
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	210,20
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**329,11**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8	PISOS Y CIELO RASO	HOJA No.	99	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	8.1.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

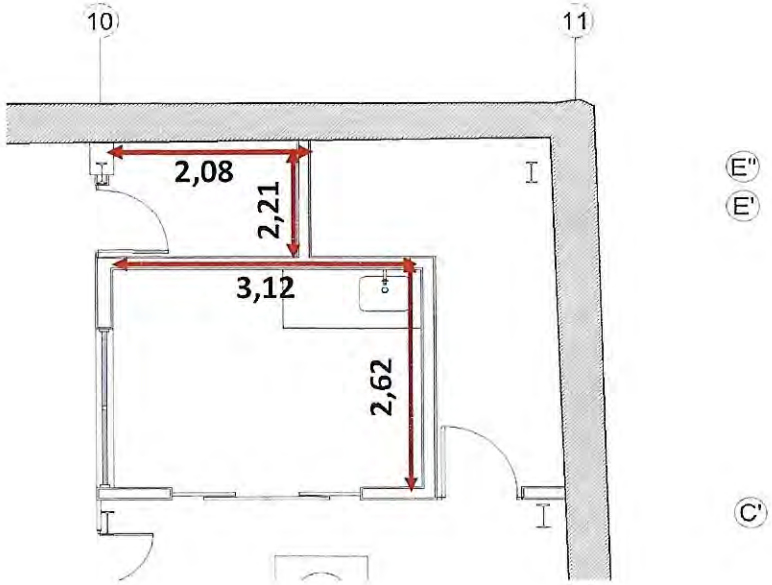

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA							
CUARTO MOBAS	ALISTADO DE PISO	2,08	2,21			1,00	4,60
SALA MATERNA	ALISTADO DE PISO	3,12	2,62			1,00	8,17

Cantidad pagadas en los cortes	329,11	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	12,78
		Pasan / vienen	110,43
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	210,20
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**329,11**	**CANT. A PAGAR EN PRESENTE ACTA**	**123,20**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8	PISOS Y CIELO RASO	HOJA No.	100	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	8.1.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO 8.1	ALISTADO DE PISOS	HOJA No. 101	de 313
UNIDAD M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR
ITEM No. NP 8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE YUMBOLON SOBRE LAMINAS DE SUPER BOARD PARA INSTALACION DE PISO EN MADERA	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4302/21

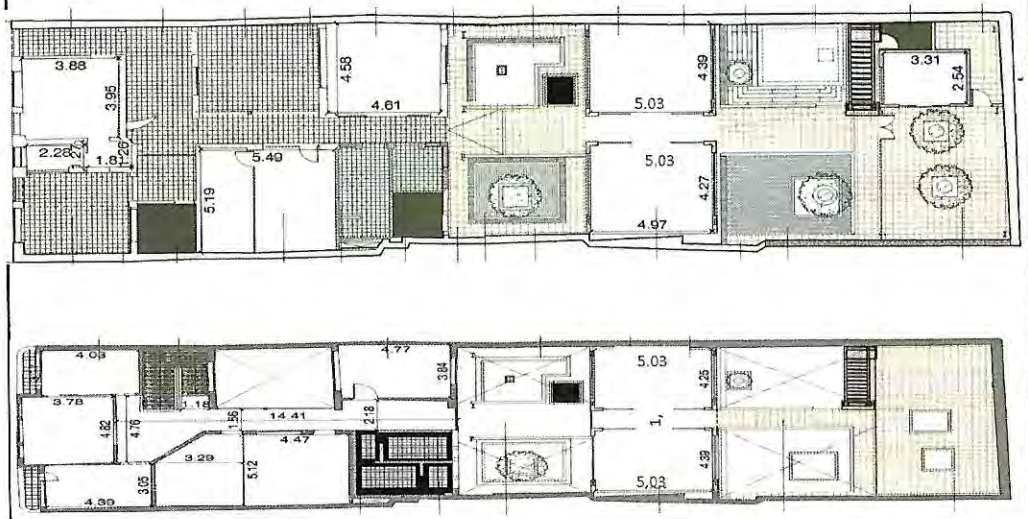

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
OFICINA RADICACIONES	INSTALACION PISO MADERA	3,95	3,88			1,00	15,33
ARCHIVO PUBLICACIONES	INSTALACION PISO MADERA	2,28	1,27			1,00	2,90
ARCHIVO PUBLICACIONES	INSTALACION PISO MADERA	1,81	1,26			1,00	2,28
							0,00
							0,00
ASESORES JURIDICOS	INSTALACION PISO MADERA	4,39	5,03			1,00	22,08
JEFE JURIDICA	INSTALACION PISO MADERA	5,03	4,27			1,00	21,48
							0,00
		SEGUNDA PLANTA					
SUB P URBANO	INSTALACION PISO MADERA	4,03	3,17			1,00	12,78
EQUIPO P URBANO	INSTALACION PISO MADERA	4,82	3,78			1,00	18,22
ASESOR JURIDICO	INSTALACION PISO MADERA	4,39	3,05			1,00	13,39
AREA JURIDICA	INSTALACION PISO MADERA	5,12	3,29			1,00	16,87
AREA JURIDICA	INSTALACION PISO MADERA	5,12	4,47			1,00	22,89
SALA DE JUNTAS	INSTALACION PISO MADERA	4,77	3,84			1,00	18,32
OFICINA PLANEACION	INSTALACION PISO MADERA	5,03	4,39			1,00	22,08
JEFE JURIDICA	INSTALACION PISO MADERA	5,03	4,25			1,00	21,38
HALL VOLUMEN DOS	INSTALACION PISO MADERA	5,03	1,55			1,00	7,80
HALL BIC	INSTALACION PISO MADERA	14,41	2,26			1,00	32,51

Cantidad pagadas en los cortes	299,46	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	250,28
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	298,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**299,46**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**250,28**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTA ACTA	**-49,18**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.1	ALISTADO DE PISOS	HOJA No.	102	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE YUMBOLON SOBRE LAMINAS DE SUPER BOARD PARA INSTALACION DE PISO EN MADERA	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8	PISOS Y CIELO RASO	HOJA No.	103	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLON DE ARCILLA e:4cm	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 DEPOSITO	PISO FATO	2,990	1,180			1,00	3,53
VOLUMEN 3 DEPOSITO	PISO FATO	1,560	1,550			1,00	2,42
VOLUMEN 3 COCINETA	PISO FATO	5,000	6,150			1,00	30,75
VOLUMEN 3 HALL FRONTAL	PISO FATO	1,100	10,940			1,00	12,03
RAMPA PATIO 2 VOLUMEN 2 - 3	PISO FATO	5,120	2,000			1,00	10,24
PATIO 2 ZONA PUNTO FIJO	PISO FATO	2,050	0,600			1,00	1,23
PATIO 2 ORIENTE	PISO FATO	3,700	0,750			1,00	2,78
PATIO 2 ORIENTE	PISO FATO	4,326	0,870			1,00	3,76
RAMPA PATIO 2	PISO FATO	4,240	2,240			1,00	9,50
ACCESO PATIO 2	PISO FATO	2,370	0,860			1,00	2,04
PATIO 2 OCCIDENT.	PISO FATO	3,850	0,920			1,00	3,54
PATIO 2 OCCIDENT.	PISO FATO	3,750	0,350			1,00	1,31
PATIO 2 OCCIDENT.	PISO FATO	3,850	0,810			1,00	3,12
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	PISO FATO DESCONTANDO VACIO ARBOLES	11,037	4,790			1,00	52,87
VOLUMEN 2 PLANTA CUBIERTA	PISO FATO	10,070	4,900			1,00	49,34

Cantidad pagadas en los cortes	171,66	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	188,46
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	153,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**171,66**	**CANT. TOTAL MEMORIA**	**188,46**
		CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	**16,80**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 215,3 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 26,84 M2 NO EJECUTADOS EN OBRA / TOTAL CANTIDAD ITEM: 188,46 M2 EJECUTADOS EN OBRA DE LOS CUALES NO SE COBRARON 16,80 M2 EN ACTAS ANTERIORES

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8	PISOS Y CIELO RASO	HOJA No.	104	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLON DE ARCILLA e:4cm	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	105 de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	8.2.2	PISO EN MADERA NATURAL TABLILLA DE 8CM X 18MM DE ZAPAN O SILIMAR. CON ACABADO EN LACA BONNA O SIMILAR	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

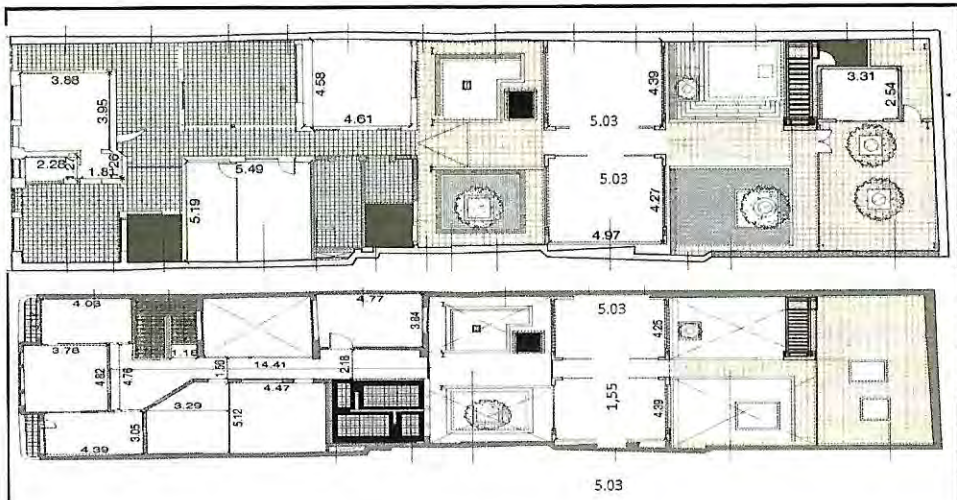



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA							
OFICINA RADICACIONES	INSTALACION PISO MADERA	3,95	3,88			1,00	15,33
ARCHIVO PUBLICACIONES	INSTALACION PISO MADERA	2,28	1,27			1,00	2,90
ARCHIVO PUBLICACIONES	INSTALACION PISO MADERA	1,81	1,26			1,00	2,28
OFICINA SISTEMAS	INSTALACION PISO MADERA	5,49	5,19			1,00	28,49
ARCHIVO JURIDICO	INSTALACION PISO MADERA	4,58	4,61			1,00	21,11
ASESORES JURIDICOS	INSTALACION PISO MADERA	4,39	5,03			1,00	22,08
JEFE JURIDICA	INSTALACION PISO MADERA	5,03	4,27			1,00	21,48
SALA MATERNA	INSTALACION PISO MADERA	3,10	2,34			1,00	7,26
BANCAS PATIO 1	MADERA	2,64	0,33			1,00	0,87
BANCAS PATIO 1	MADERA	0,99	0,33			1,00	0,33
BANCAS PATIO 2	MADERA	4,80	0,21			1,00	1,01
SEGUNDA PLANTA							
SUB P URBANO	INSTALACION PISO MADERA	4,03	3,17			1,00	12,78
EQUIPO P URBANO	INSTALACION PISO MADERA	4,82	3,78			1,00	18,22
ASESOR JURIDICO	INSTALACION PISO MADERA	4,39	3,08			1,00	13,52
AREA JURIDICA	INSTALACION PISO MADERA	5,12	3,29			1,00	16,87
AREA JURIDICA	INSTALACION PISO MADERA	5,12	4,47			1,00	22,89
SALA DE JUNTAS	INSTALACION PISO MADERA	4,77	3,84			1,00	18,32
OFICINA PLANEACION	INSTALACION PISO MADERA	5,03	4,39			1,00	22,08
JEFE JURIDICA	INSTALACION PISO MADERA	5,03	4,25			1,00	21,38
HALL VOLUMEN DOS	INSTALACION PISO MADERA	5,03	1,55			1,00	7,80
HALL BIC	INSTALACION PISO MADERA	14,41	2,26			1,00	32,51
PUENTE METALICO 1 PISO	INSTALACION MADERA CIELO RASO	5,44	2,12			1,00	11,53

Cantidad pagadas en los cortes	299,46	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	321,02
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	298,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	299,46	CANT. TOTAL MEMORIAS	321,02
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	21,56

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADCION 1: 298,71 M2 / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 20,37 M2 EJECUTADOS EN OBRA Y NO COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES / TOTAL CANTIDAD ITEM: 321,02 M2 EJECUTADOS EN OBRA Y PENDIENTE POR COBRAR: 21,56 M2 EJEUCTADOS EN OBRA.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	106	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	8.2.2	PISO EN MADERA NATURAL TABLILLA DE 8CM X 18MM DE ZAPAN O SILIMAR. CON ACABADO EN LACA BONNA O SIMILAR	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	107	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO BALDOSA ARTESANAL EN CEMENTO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

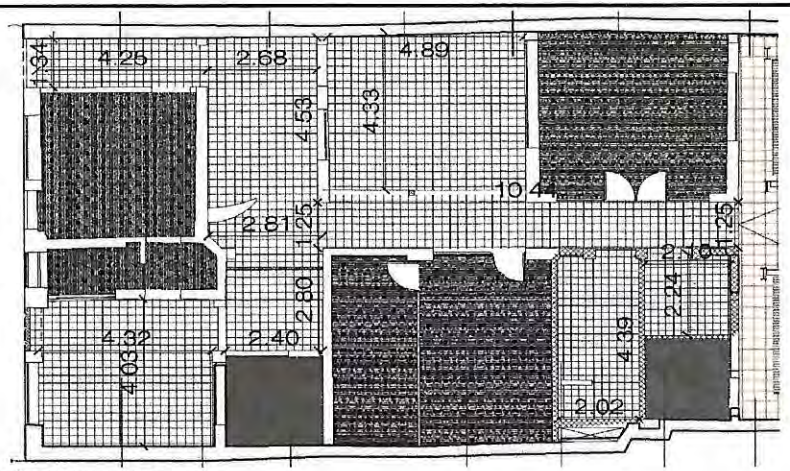


BAÑOS SEGUNDA PLANTA





BALCONES SEGUNDA PLANTA VOLUMEN UNO



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
PASILLO ACCESO	BALDOSIN 20X20	4,25	1,34			1,00	5,70
PASILLO ESCALERAS	BALDOSIN 20X20	4,53	2,68			1,00	12,14
ACCESO ESCALERAS	BALDOSIN 20X20	1,25	2,81			1,00	3,51
ZONA TORNIQUETES	BALDOSIN 20X20	2,80	2,40			1,00	6,72
HALL CIRCULACION	BALDOSIN 20X20	10,44	1,25			1,00	13,05
BAÑO MUJERES	BALDOSIN 20X20	4,39	2,02			1,00	8,87
BAÑO HOMBRES	BALDOSIN 20X20	2,24	2,10			1,00	4,70
PATIO 1	BALDOSIN 20X20	4,90	4,63			1,00	22,69
RECEPCION	BALDOSIN 20X20	4,92	4,43			1,00	21,80
HALL BAÑOS PISO 2	BALDOSIN 20X20	2,36	1,00			1,00	2,36
BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO	BALDOSIN 20X20	2,95	2,06			1,00	6,08
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	BALDOSIN 20X20	2,70	2,15			1,00	5,81
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	BALDOSIN 20X20	2,17	1,25			1,00	2,71
VOLUMEN UNO SEGUNDO PISO BALCONES	BALDOSIN 20X21	3,16	0,56			1,00	1,77
VOLUMEN UNO SEGUNDO PISO BALCONES	BALDOSIN 20X22	3,09	0,66			1,00	2,04

Cantidad pagadas en los cortes	116,13	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	119,94
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	182,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**116,13**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**119,94**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	**3,81**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 124,10 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 4,16 M2 NO EJECUTADOS EN OBRA NI COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES / TOTAL CANTIDAD ITEM: 119,94 M2 EJECUTADOS EN OBRA PENDIENTE POR COBRAR 3,81 M2 EJECUTADOS EN BALCONES.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	108	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO BALDOSA ARTESANAL EN CEMENTO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	109 de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	8.2.4	PISO DECK PARA TERRAZA	MEMORIA FINAL	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

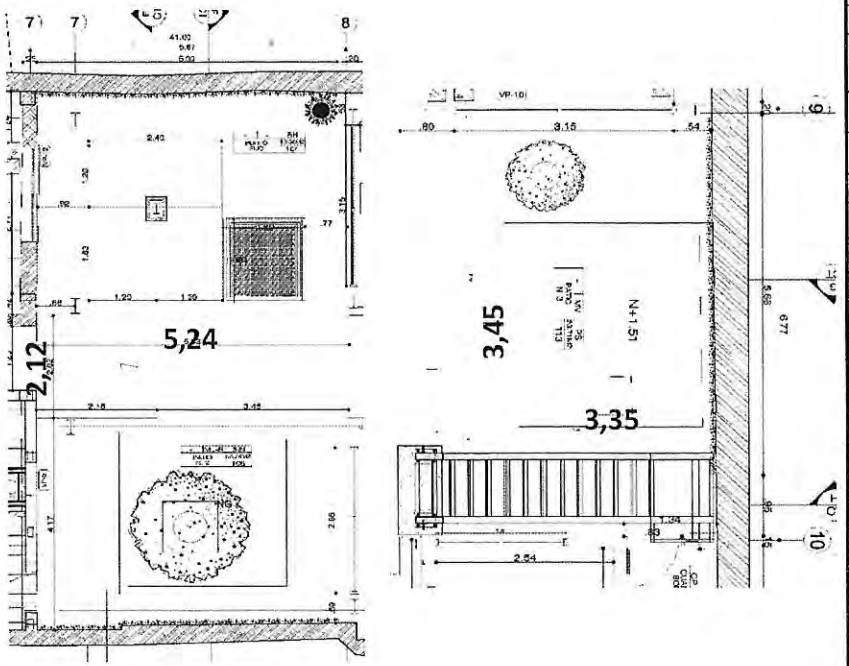

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
PUENTE METALICO VOLUMEN 1 - 2	PISO EN DECK PARA EXTERIOR	5,24	2,12			1,00	11,10
AREA SOBRE TANQUE	PISO EN DECK PARA EXTERIOR	3,480	3,77			1,00	13,12

Cantidad pagadas en los cortes	13,29	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	24,22
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	82,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**13,29**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**24,22**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	**10,93**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 22,01 M2 / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 0,65 M2 / TOTAL CANTIDAD ITEM: 24,22 M2 EJECUTADOS EN OBRA, PENDIENTE POR COBRAR: 10,93 M2 EJECUTADOS EN OBRA.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	110	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	8.2.4	PISO DECK PARA TERRAZA	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	110B	de	313
UNIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	8.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS EN MADERA ZAPAN L=1.20 M A=.30 CMS PARA ESCALERAS - INMUNIZADO SELLADO y LACADO	MEMORIA FINAL	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

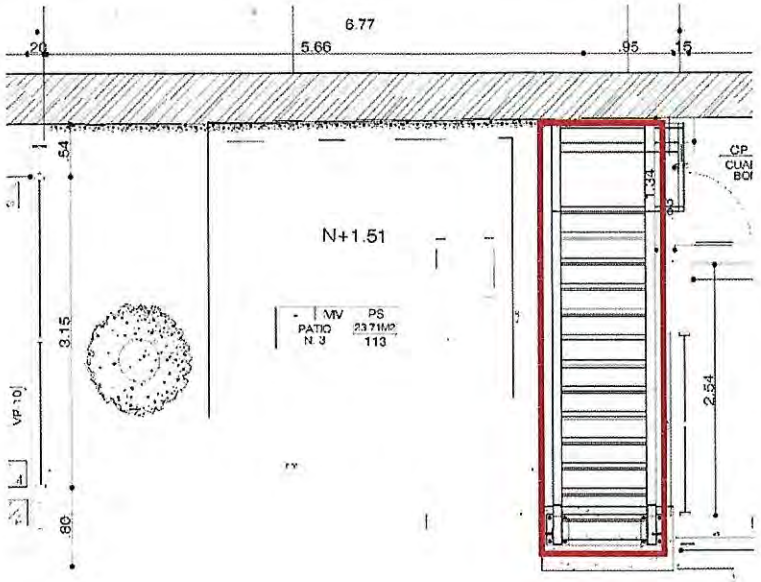

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	AREA	%	CANT	SUB TOTAL
ESCALERA DE ACCESO VOLUMEN 3	CANTIDAD DE PASOS					13,00	
	CANTIDAD DE PASOS EN 1,20 MTL					0,75	9,75
CANTIDAD PAGADA EN CORTE 9 PARA ESA ESCALERA							**13,00**

Cantidad pagadas en los cortes	28,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	-3,25
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	28,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**28,00**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**-3,25**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	**-3,25**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	111	de	313
UNIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	8.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCANSO EN MADERA ZAPAN L=2.25 x 1.20 x 5 cms PARA ESCALERAS-INMUNIZADO SELLADO y LACADO	MEMORIA FINAL	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

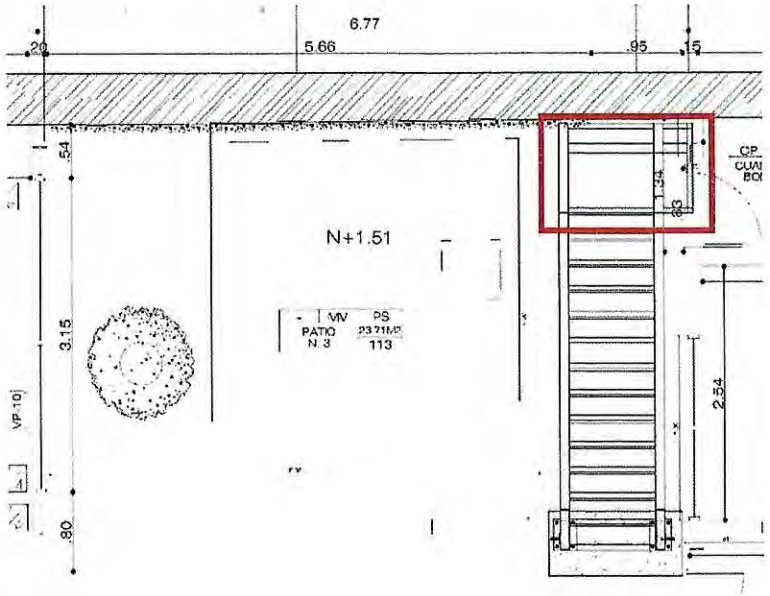

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	AREA	%	CANT	SUB TOTAL
DESCANSO	ACCESO TERRAZA	1,320	0,90	1,19		1,00	0,440
DESCANSO	PAGADO EN CORTE 9	2,250	1,20	2,70		1,00	
DESCANSO	ACCESO ASCENSOR	2,25	1,20			1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	2,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	1,44
		Pasan / vienen	0.00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	82,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**2,00**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**1,44**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	**-0,56**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	IDPC INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	112	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 8.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCANSO EN MADERA ZAPAN L=2.25 x 1.20 x 5 cms PARA ESCALERAS-INMUNIZADO SELLADO y LACADO,	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	113 de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	NP 8.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS TABLON DE ARCILLA E 4CMS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

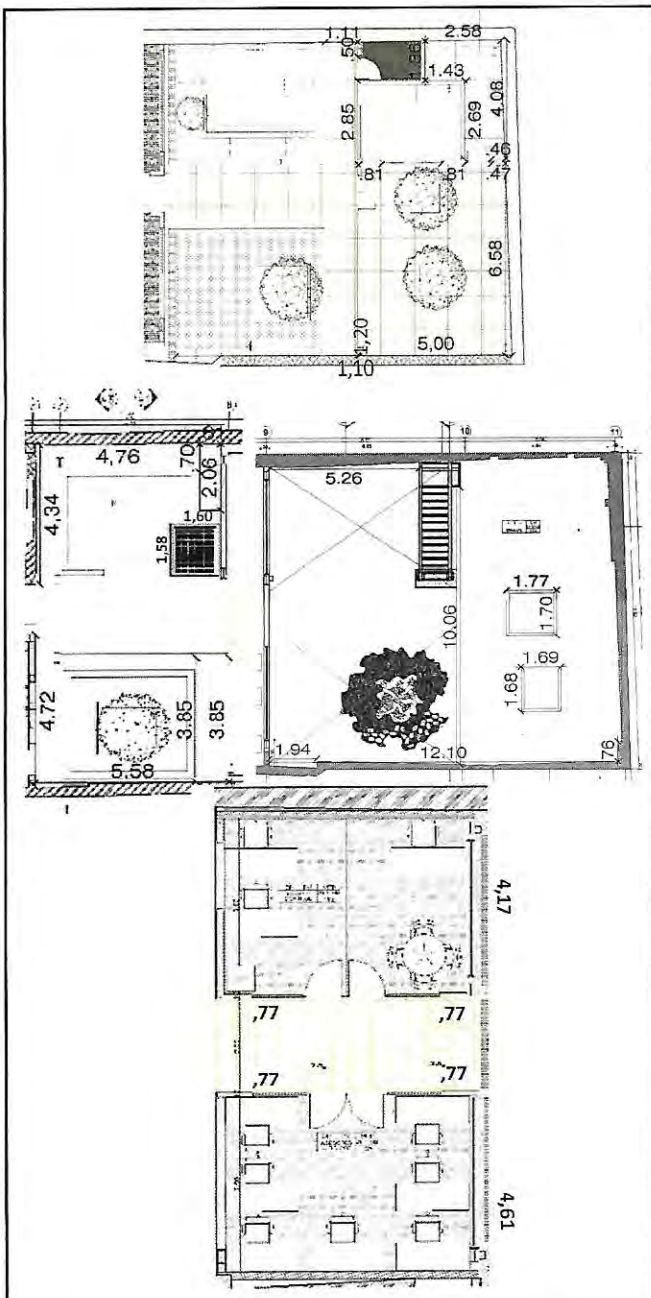

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	1,36				1,00	1,36
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	2,58				1,00	2,58
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	4,08				1,00	4,08
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	0,46				1,00	0,46
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	0,47				1,00	0,47
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	6,58				1,00	6,58
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	5,00				1,00	5,00
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	0,81				2,00	0,81
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	2,69				1,00	2,69
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	1,43				1,00	1,43
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	2,85				1,00	2,85
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	0,50				1,00	0,50
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	1,11				1,00	1,11
PATIO 2 COST ORIENT	GUARDAESCOBAS FATO	2,06				1,00	2,06
PATIO 2 COST ORIENT	GUARDAESCOBAS FATO	0,70				1,00	0,70
PATIO 2 COST ORIENT	GUARDAESCOBAS FATO	4,76				1,00	4,76
PATIO 2 COST ORIENT	GUARDAESCOBAS FATO	4,34				1,00	4,34
PATIO 2 COST OCCID	GUARDAESCOBAS FATO	4,72				1,00	4,72
PATIO 2 COST OCCID	GUARDAESCOBAS FATO	5,58				1,00	5,58
PATIO 2 COST OCCID	GUARDAESCOBAS FATO	3,85				1,00	3,85
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	BORDILLO FATO	0,76				1,00	0,76
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	BORDILLO FATO	1,77				1,00	1,77
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	BORDILLO FATO	1,70				1,00	1,70
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	BORDILLO FATO	1,69				1,00	1,69
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	BORDILLO FATO	1,68				1,00	1,68
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	BORDILLO FATO	10,06				1,00	10,06
PATIO 3 MURO COLINDANTE	REMATE MURO	7,10				1,00	7,10
PATIO 2 SEGUNDA PLANTA	BORDILLO FATO	1,94				1,00	1,94
PATIO 2 MURO COST ORIENTAL	REMATE MURO	5,26				1,00	5,26
PATIO 2 ASCENSOR	ANDEN BORDILLO	3,18				1,00	3,18
VOLUMEN 2 FACHADA SUR	GUARDA ESCOBA	4,17				1,00	4,17
VOLUMEN 2 FACHADA SUR	GUARDA ESCOBA	4,61				1,00	4,61
HALL VOLUMEN 2	GUARDA ESCOBAS	0,77				4,00	0,77

Cantidad pagadas en los cortes	29,92	Cantidad de la Ficha No 1 / 2	100,62
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No 10	0,00	Cantidad Contractual	78,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	29,92	CANT. TOTAL MEMORIAS	100,62
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	70,70

OBSERVACIONES: TOTAL CANTIDAD ITEM: 100,62 ML DE LOS CUALES ESTAN PENDIENTES POR COBRAR: 70,70 ML EJECUTADOS EN OBRA.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	114	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 8.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS TABLON DE ARCILLA E:4CMS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	115	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 8.2.11	INSTALACION DE LAJAS EN PIEDRA ENCONTRADAS EN LAS EXCAVACIONES DEL PASILLO PRIMER PISO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

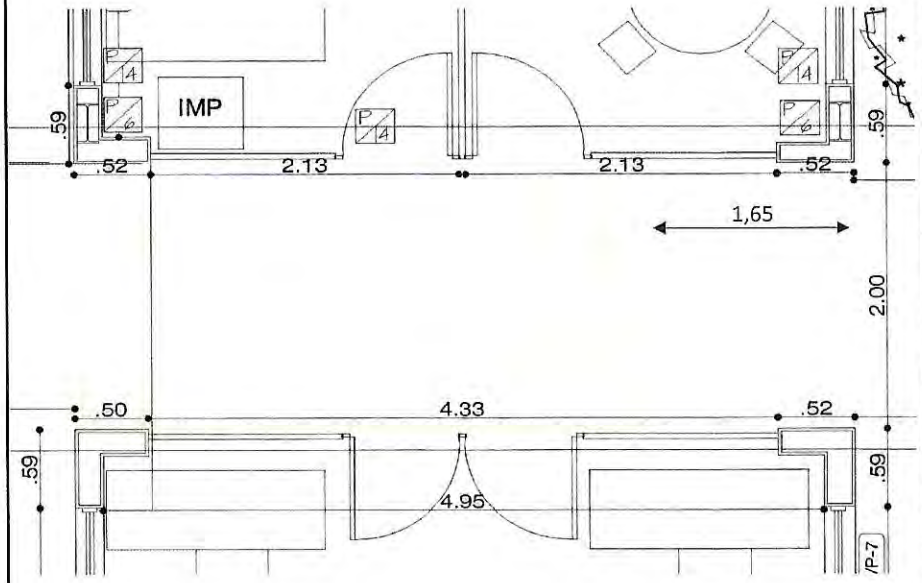

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	INSTALACION PIEDRA	1,65	2,00			1,00	3,30

Cantidad pagadas en los cortes	3,30	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	3,30
		Pasan / vienen	3,30
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	4,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	3,30	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.		116	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	NP 8.2.11	INSTALACION DE LAJAS EN PIEDRA ENCONTRADAS EN LAS EXCAVACIONES DEL PASILLO PRIMER PISO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

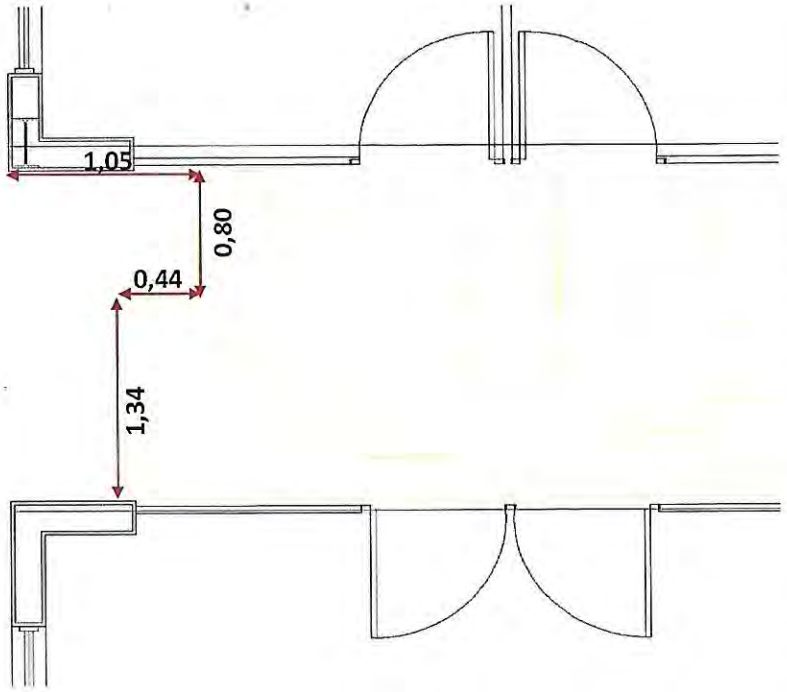

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	INSTALACION PIEDRA	0,76	2,14			1,00	1,63

Cantidad pagadas en los cortes	3,30	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,63
		Pasan / vienen	3,30
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	4,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**3,30**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**4,93**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTA CORTE	**1,63**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 4,0 M2 / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 0,93 M2 EJECUTADOS EN OBRA / TOTAL CANTIDAD ITEM: 4,93 M2 EJECUTADOS EN OBRA Y PENDIENTES POR COBRAR: 1,63 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	117	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 8.2.11	INSTALACION DE LAJAS EN PIEDRA ENCONTRADAS EN LAS EXCAVACIONES DEL PASILLO PRIMER PISO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:	**ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES** Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	118	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 8.2.12	EMBOQUILLADO, LAVADO Y CONSOLIDADO DE PISO EN PIEDRA PASILLO PRIMER PISO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

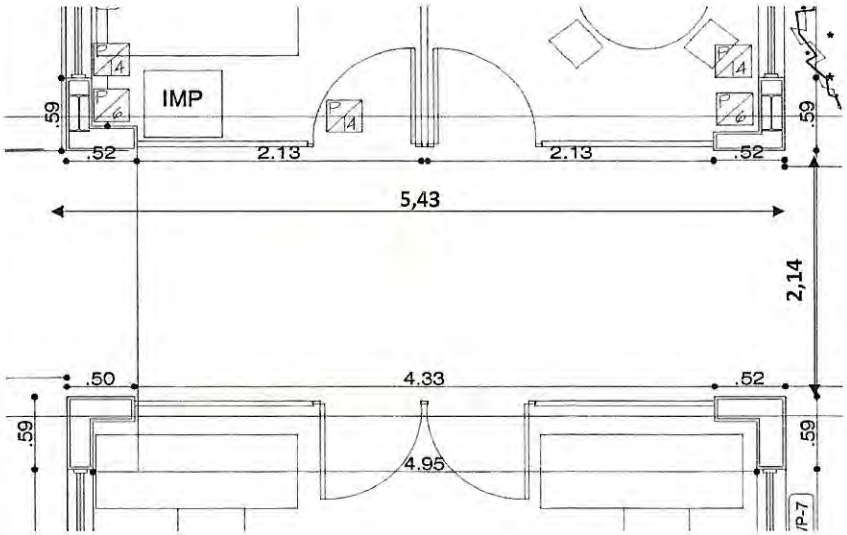

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS HALL	EMBOQUILLADO, LAVADO Y CONSOLIDADO PIEDRA	5,43	2,14			1,00	11,62

Cantidad pagadas en los cortes	10,60	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	11,62
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	13,26
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**10,60**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**11,62**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE	**1,02**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 13,26 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 1,64 M2 NO EJECUTADOS EN OBRA NI COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES / TOTAL CANTIDAD ITEM: 11,62 M2 EJECUTADOS EN OBRA PENDIENTE POR COBRAR: 1,02 M2 EJECUTADOS EN OBRA.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	HOJA No.	119	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 8.2.12	EMBOQUILLADO, LAVADO Y CONSOLIDADO DE PISO EN PIEDRA PASILLO PRIMER PISO	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES	**ARQ. LILIANA MARCELO**
Residente de obra	Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	9	PARED Y ENCHAPES	HOJA No.	120	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	9.1.1	ENCHAPE CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

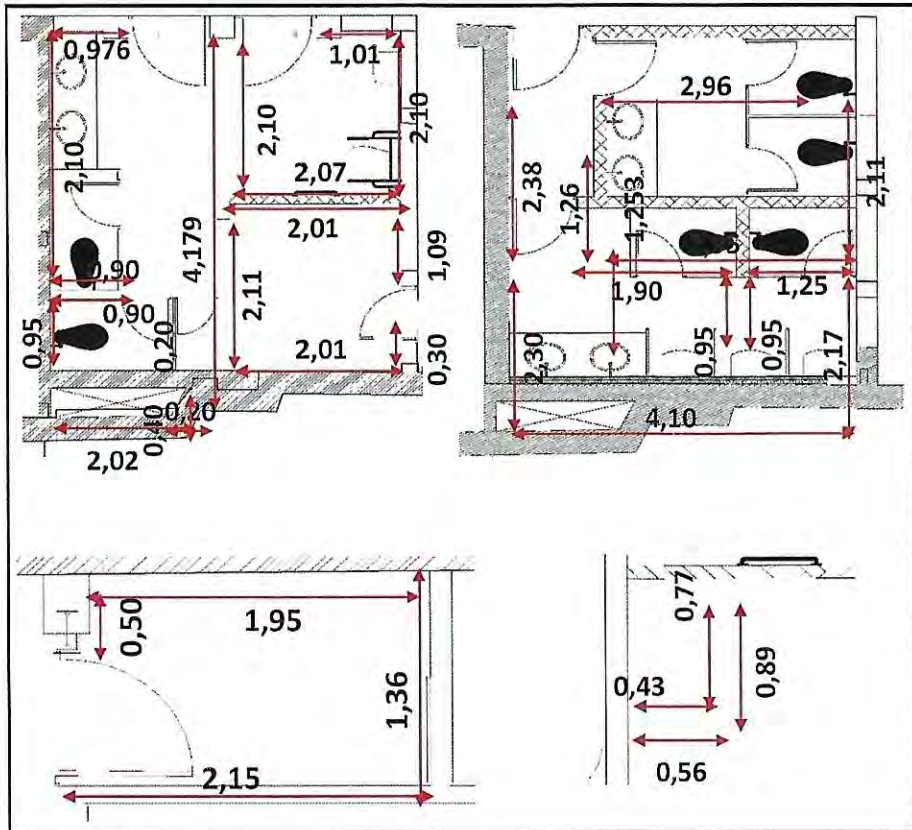

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA BIC							
BAÑO HOMBRES	ENCHAPE PARED BAÑO	7,53	2,00			1,00	15,06
SHUT BASURAS	ENCHAPE SHUT	7,32	2,38			1,00	17,42
BAÑO MUJERES	ENCHAPE BAÑO	14,17	2,00			1,00	28,34
SEGUNDA PLANTA BIC							
BAÑO HOMBRES	ENCHAPE MUROS	13,90	2,00			1,00	27,80
BAÑO MUJERES	ENCHAPE MUROS	9,273	2,00			1,00	18,55
HALL ACCESO	ENCHAPE MUROS	3,94	2,00			1,00	7,88
PRIMER PLANTA VOLUMEN TRES							
CUARTO BOMBAS	ENCHAPE MUROS	5,960		2,51		1,00	14,96
POCETA CUARTO DE BASURAS PRIMER PLANTA BIC							
POCETA ASEO	ENCHAPE CARA INTERNA	0,43		0,36		1,00	0,15
POCETA ASEO	ENCHAPE CARA INTERNA	0,77		0,36		1,00	0,28
POCETA ASEO	ENCHAPE CARA EXTERIOR	0,56		0,36		1,00	0,20
POCETA ASEO	ENCHAPE CARA EXTERIOR	0,89		0,36		1,00	0,32

Cantidad pagadas en los cortes	128,78	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	130,96
		Pasan / vienen	130,96
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	163,80
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	128,78	CANT. TOTAL MEMORIAS	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	9	PARED Y ENCHAPES	HOJA No.	121	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	9.1.1	ENCHAPE CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

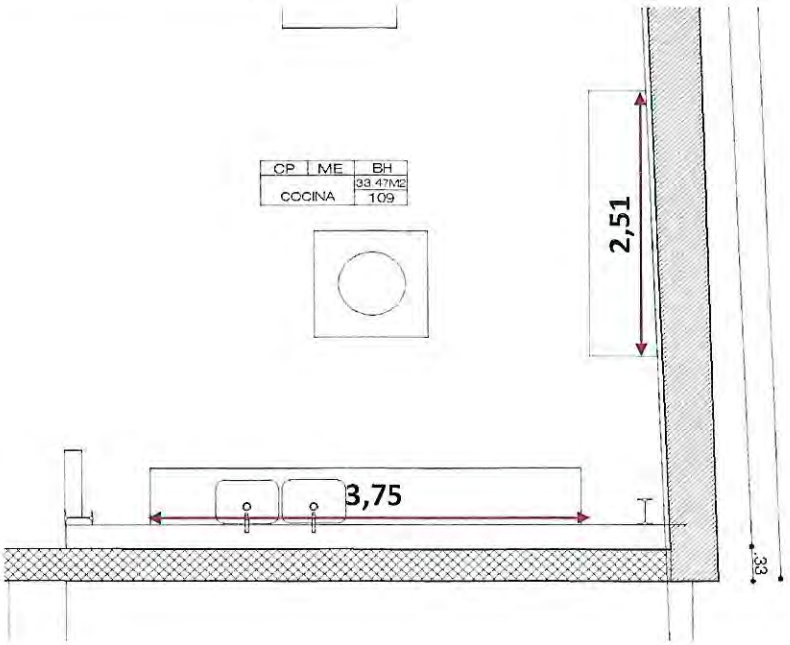

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 AREA COCINA	ENCHAPE SALPICADERO COCINA	2,51	0,60			1,00	1,51
VOLUMEN 3 AREA COCINA	ENCHAPE SALPICADERO MESON HORNOS	3,75	0,50			1,00	1,88
VOLUMEN 3 LACTANCIA	ENCHAPE SALPICADERO MUEBLE LAVADO	1,50	0,50			1,00	0,75

Cantidad pagadas en los cortes	128,78	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	4,13
		Pasan / vienen	130,96
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	181,61
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**128,78**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**135,09**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE ACTA	**6,31**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 134,00 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 1,11 M2 NO EJECUTADOS EN OBRA NI COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES / TOTAL CANTIDAD ITEM: 135,09 M2 EJECUTADOS EN OBRA PENDIENTE POR COBRAR: 6,31 M2 EJECUTADOS EN OBRA NO COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.


BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	9	PARED Y ENCHAPES	HOJA No.	122	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	9.1.1	ENCHAPE CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





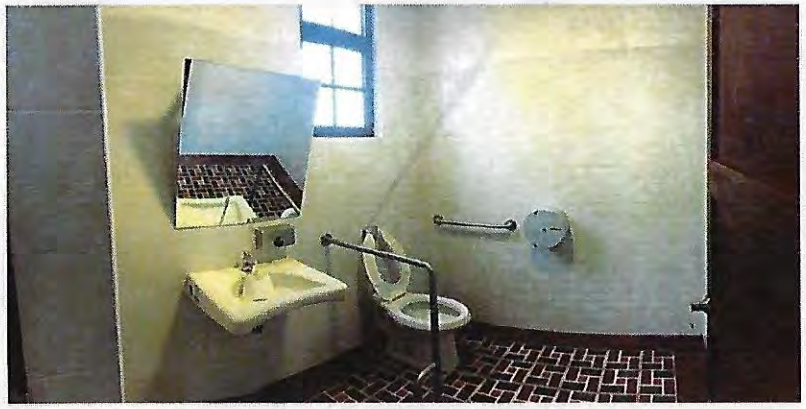

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	10	CENEFAS Y PIRLANES	HOJA No.	123 de 313	
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	10.1.1	CENEFA PISO GRAVILLA MONA Nª 1 Y 2	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 - ACCESO ASCENSOR	CENEFA PISO GRAVILLA MONA	1,66	0,10			1,00	1,66
PATIO 2 - RAMPA ACCESO	CENEFA PISO GRAVILLA MONA	1,20	0,10			1,00	1,20
PATIO 2 - RAMPA ACCESO	CENEFA PISO GRAVILLA MONA	4,35	0,10			1,00	4,35
VOLUMEN 3 TERRAZA	CENEFA PISO GRAVILLA MONA	32,34	0,10			1,00	32,34
VOLUMEN 3 - TERRAZA	CENEFA PISO GRAVILLA MONA	6,87	0,10			1,00	6,87
VOLUMEN 3 TERRAZA	CENEFA PISO GRAVILLA MONA	6,69	0,10			1,00	6,69
VOLUMEN 2 CUBIERTA	CENEFA PISO GRAVILLA	5,29	0,10			2,00	10,58
VOLUMEN 2 CUBIERTA	CENEFA PISO GRAVILLA	10,54	0,10			2,00	21,08
PATIO 2 BORDILLO	CENEFA PISO GRAVILLA	3,32	0,20			2,00	6,64
PATIO 2 BORDILLO	CENEFA PISO GRAVILLA	3,78	0,20			2,00	7,56
PATIO 2 PLATINAS	CENEFA PISO GRAVILLA	0,40	0,30			3,00	1,20

Cantidad pagadas en los cortes	76,29	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	100,16
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	45,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**76,29**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**100,16**
		CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 76,29 ML / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 50,03 ML EJECUTADOS EN OBRA PENDIENTES POR COBRAR / TOTAL CANTIDAD ITEM: 126,32 ML EJECUTADOS EN OBRA

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	10	CENEFAS Y PIRLANES	HOJA No.	124 de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	10.1.1	CENEFA PISO GRAVILLA MONA Nº 1 Y 2	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

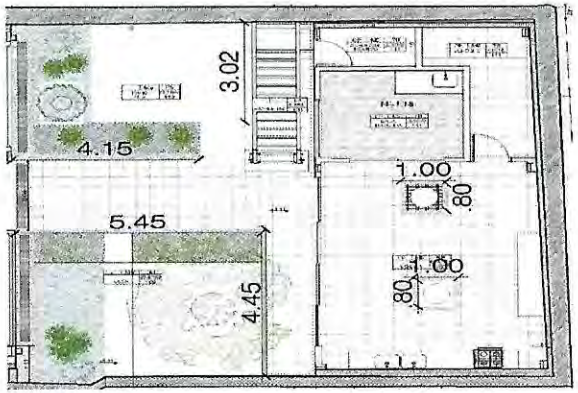

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 3 COSTADO ORIENTAL	CENEFA PISO GRAVILLA MONA	4,15	0,10			1,00	4,15
PATIO 3 COSTADO ORIENTAL	CENEFA PISO GRAVILLA MONA	3,02	0,10			1,00	3,02
PATIO 3 - COSTADO OCCIDENTAL	CENEFA PISO GRAVILLA MONA	5,45	0,10			2,00	10,90
PATIO 3 - COSTADO OCCIDENTAL	CENEFA PISO GRAVILLA MONA	4,45	0,10			2,00	8,90
VOLUMEN 3 ARBOLES	CENEFA PISO GRAVILLA	1,00	0,15			2,00	2,00
VOLUMEN 3 ARBOLES	CENEFA PISO GRAVILLA	0,80	0,15			2,00	1,60

Cantidad pagadas en los cortes	76,29	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	30,57
		Pasan / vienen	100,16
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	45,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**76,29**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**130,73**
		CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	**54,44**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 76,29 ML / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 50,03 ML EJECUTADOS EN OBRA PENDIENTES POR COBRAR / TOTAL CANTIDAD ITEM: 126,32 ML EJECUTADOS EN OBRA

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	10	CENEFAS Y PIRLANES	HOJA No.	125	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	10.1.1	CENEFA PISO GRAVILLA MONA Nº 1 Y 2	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	10.2	PIRLANES EN MADERA	HOJA No.	126	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	10.2.1	PIRLAN EN MADERA ZAPAN PARA ACCESO A OFICINAS DE 15.20 Y 30CM	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

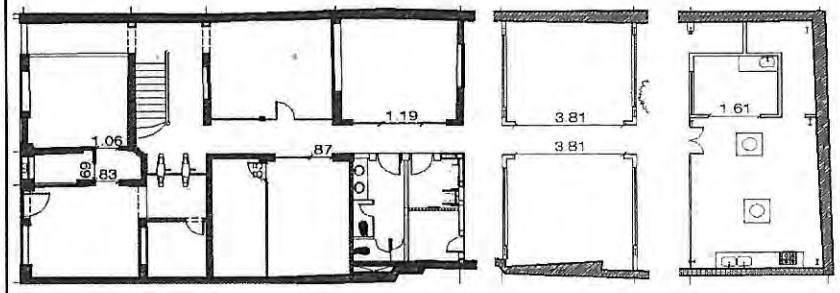

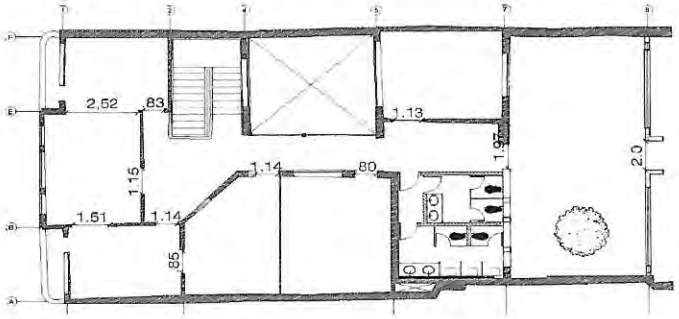

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
OFICINA RADICACION	PIRLAN MADERA ACCESO	1,065				1,00	1,065
ARCHIVO	PIRLAN MADERA ACCESO	0,69				1,00	0,690
ARCHIVO	PIRLAN MADERA ACCESO	0,834				1,00	0,834
OFICINA SISTEMAS	PIRLAN MADERA ACCESO	0,876				1,00	0,876
ARCHIVO JURIDICO	PIRLAN MADERA ACCESO	1,199				1,00	1,199
JURIDICA	PIRLAN MADERA ACCESO	3,81				1,00	3,81
ASESORES JURIDICA	PIRLAN MADERA ACCESO	3,81				1,00	3,81
LACTANCIA	PIRLAN MADERA ACCESO	1,615				1,00	1,615
		SEGUNDA PLANTA					
SUB P URBANO	PIRLAN MADERA ACCESO	0,83				1,00	0,83
EQUIPO P URBANO	PIRLAN MADERA ACCESO	1,150				1,00	1,150
ASESOR JURIDICO	PIRLAN MADERA ACCESO	1,14				1,00	1,14
ASESOR JURIDICO	PIRLAN MADERA ACCESO	0,85				1,00	0,85
AREA JURIDICA	PIRLAN MADERA ACCESO	1,145				1,00	1,145
AREA JURIDICA	PIRLAN MADERA ACCESO	0,809				1,00	0,809
SALA JUNTAS	PIRLAN MADERA ACCESO	1,130				1,00	1,130
ACCESO A VOLUMEN 2	PIRLAN MADERA ACCESO	1,970				1,00	1,970

Cantidad pagadas en los cortes	22,96	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	22,92
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	20,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**22,96**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**22,92**
		CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	**-0,04**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 22,96 ML / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 0,04 ML COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES / TOTAL CANTIDAD ITEM: 22,92 EJECUTADOS / ITEM CON CANTIDAD NEGATIVA DE: -0,04 ML.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	10.2	PIRLANES EN MADERA	HOJA No.		127	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	10.2.1	PIRLAN EN MADERA ZAPAN PARA ACCESO A OFICINAS DE 15.20 Y 30CM	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11,7	BAJANTES Y DESAGUES	**HOJA No.**	128 de 313	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	11,7,1	TUBERIA PVC 6" ALL	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
	TUBERIA PVC 6"ALL	23,000				-1,00	-23,00
	ITEM NO EJECUTADO						

Cantidad pagadas en los cortes	23,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	-23,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	33,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**23,00**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**-23,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	11,7	BAJANTES Y DESAGUES	HOJA No.		129	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	11,7,2	ACCESORIOS PVC 6" ALL	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
	ACCESORIOS PVC 6"ALL					-4,00	-4,00
	ITEM NO EJECUTADO						

Cantidad pagadas en los cortes	4,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	-4,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	33,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**4,00**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**-4,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	11,7	BAJANTES Y DESAGUES	**HOJA No.**		130	de	313
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	11,7,7	SIFON DE PISO 2"	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
	SIFON DE PISO 2"					-1,00	-1,00
	ITEM NO EJECUTADO						

Cantidad pagadas en los cortes	1,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	-1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	1,00	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	-1,00

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12.1	APARATOS	HOJA No.	131	de	313
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	12.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS SENCILLO CON GRIFRIA (tramontina o similar, bajo poner) cocineta	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

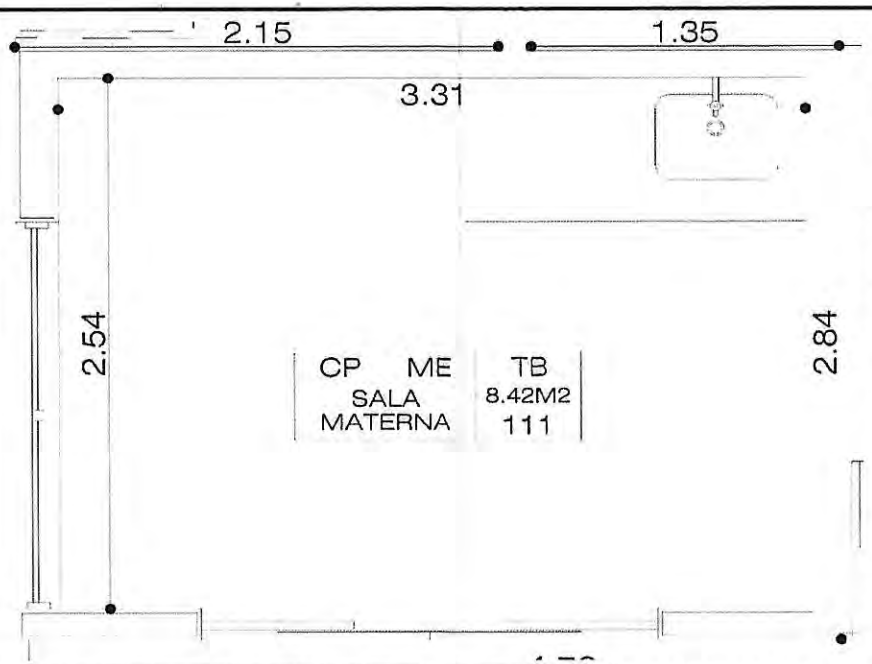

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
CUARTO LACTANCIA	LAVAPLATOS CON GRIFERIA SOBRE MESON					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	0,00	CANT. TOTAL MEMORIAS	1,00

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 1,0 UN / TOTAL CANTIDAD ITEM: 1,0 UN EJECUTADOS EN OBRA.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA: CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.1	APARATOS	HOJA No.		132	de	313
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	12.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS SENCILLO CON GRIFRIA (tramontina o similar, bajo poner) cocineta	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12,1	APARATOS	HOJA No.		133	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	12,1,12	EXTINTORES ABC	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
	EXTINTORES ABC					-6,00	-6,00
	ITEM NO EJECUTADO						

Cantidad pagadas en los cortes	6,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	-6,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	6,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**6,00**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**-6,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12.2	MESONES	HOJA No.	135	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CON PLACA MACIZA DE GRANITO MARMOL DE COLOR NEGRO SAN GABRIEL E_20MM A MESON =.60CM, CON FALDON Y SALPICADERO EPOXICO DE ADHESION	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

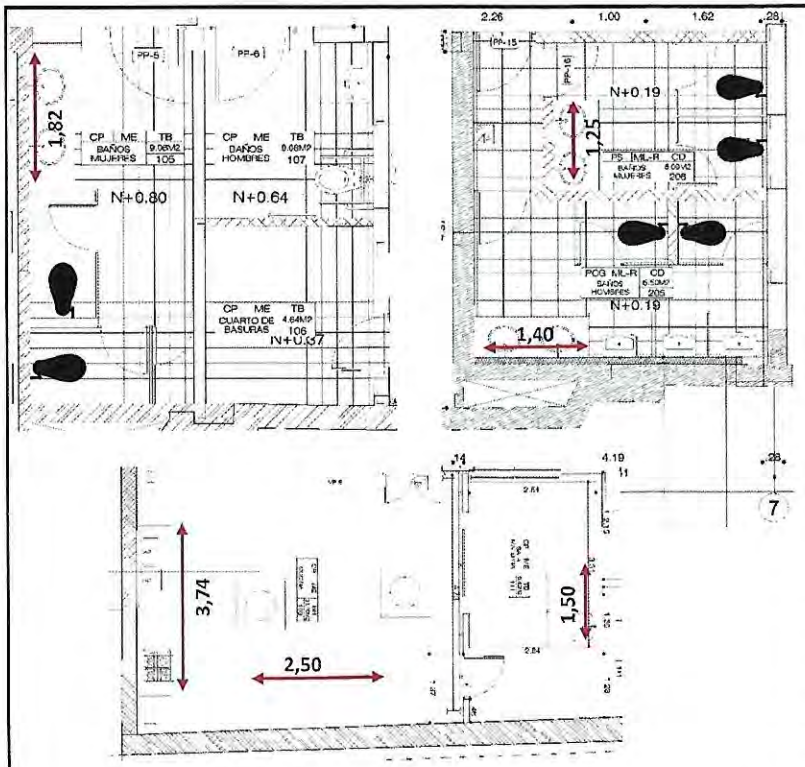

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA							
BAÑO MUJERES	MESON GRANITO	1,82				1,00	1,82
COCINETA	MESON GRANITO	3,74				1,00	3,74
HORNOS	MESON GRANITO	2,50				1,00	2,50
LACTANCIA	MESON GRANITO	1,50				1,00	1,50
SEGUNDA PLANTA							
BAÑO MUJERES	MESON GRANITO	1,250				1,00	1,25
BAÑO HOMBRES	MESON GRANITO	1,400				1,00	1,40

Cantidad pagadas en los cortes	13,38	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	12,21
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	18,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**13,38**	**CANT. TOTAL MEMORIA**	**12,21**
		CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	**-1,17**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 18,00 ML / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 1,17 ML NO EJECUTADOS EN OBRA QUE FUERON COBRADOS EN ACTAS ANTERIORES / TOTAL CANTIDAD ITEM: 12,21 ML / ITEM CON CANTIDAD NEGATIVA DE: -1,17 ML

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.2	MESONES	HOJA No.	136	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CON PLACA MACIZA DE GRANITO MARMOL DE COLOR NEGRO SAN GABRIEL E_20MM A MESON =.60CM, CON FALDON Y SALPICADERO EPOXICO DE ADHESION	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.3	GRIFERIAS Y ACCESORIOS	HOJA No.	137	de	313
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	12.3.4	LLAVE TERMINAL	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 4/02/21		

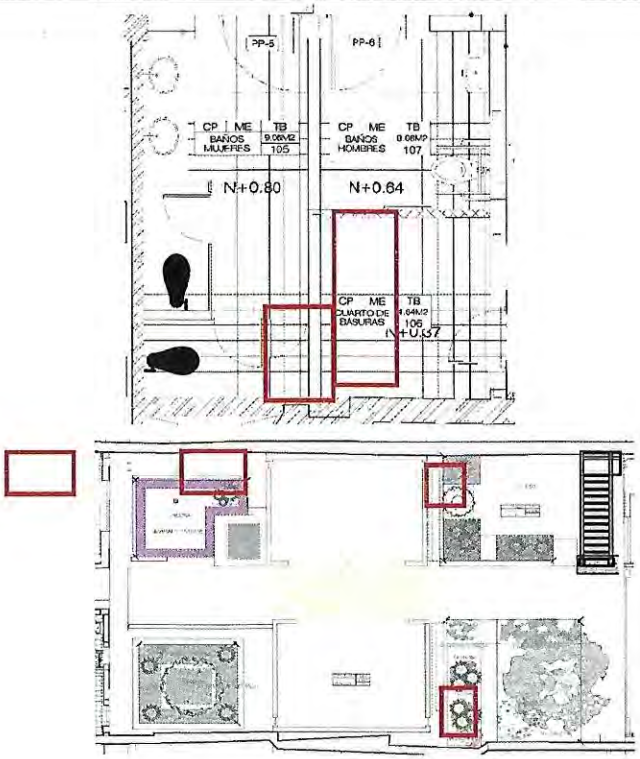

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA							
BAÑO MUJERES	LLAVE TERMINAL ASEO					1,00	1,00
SHUT BASURAS	LLAVE TERMINAL ASEO					2,00	2,00
PATIO 2	LLAVE TERMINAL ASEO					1,00	1,00
PATIO 3	LLAVE TERMINAL ASEO					2,00	2,00
PATIO 1	LLAVE TERMINAL ASEO					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	2,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	7,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	6,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**2,00**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**7,00**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE ACTA	**5,00**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 6,0 UN / ITEM CON UNA MAYOR CANTIDAD DE: 1,0 UN / CANTIDAD ITEM: 7,0 UN EJECUTADOS EN OBRA PENDIENTES POR COBRAR: 5,0 UN.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12.3	GRIFERIAS Y ACCESORIOS	HOJA No.	138	de	313
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	12.3.4	LLAVE TERMINAL	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO 12.3	GRIFERIAS Y ACCESORIOS	HOJA No. 139 de 313	
UNIDAD UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR
ITEM No. 12.3.5	REJILLA CON SOSCO 3X2" C/I	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21

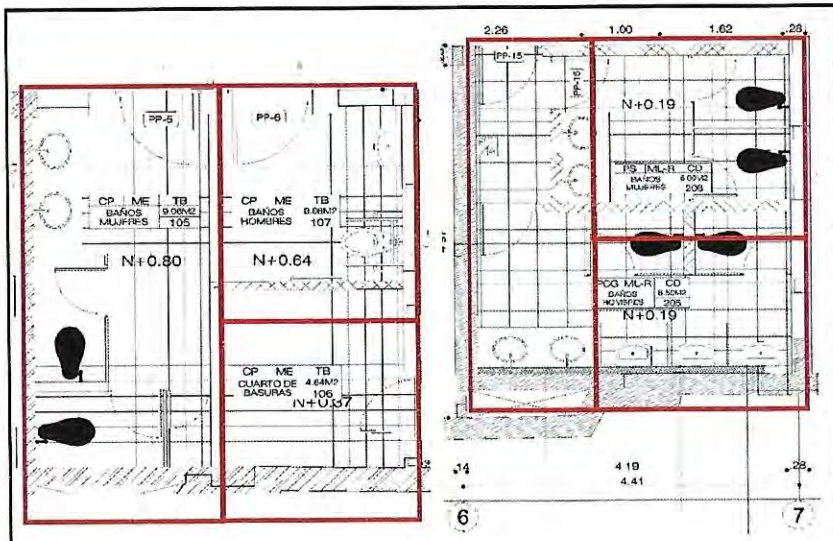

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
	PRIMER PLANTA						
BAÑO MUJERES	REJILLA CON SOSCO 3X2"					2,00	2,00
SHUT BASURAS	REJILLA CON SOSCO 3X2"					1,00	1,00
MOVILIDAD REDUCIDA	REJILLA CON SOSCO 3X2"					1,00	1,00
	SEGUNDA PLANTA						
BAÑO HOMBRES	REJILLA CON SOSCO 3X2"					1,00	1,00
BAÑO MUJERES	REJILLA CON SOSCO 3X2"					1,00	1,00
	REJILLAS EXTERIORES						
VOLUMEN 2	REJILLA CON SOSCO 3X2"					3,00	3,00
VOLUMEN 3	REJILLA CON SOSCO 3X2"					3,00	3,00

Cantidad pagadas en los cortes	6,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	12,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	6,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**6,00**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**12,00**
		CANT. A PAGAR EN PRESENTE ACTA	**6,00**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 6,0 UN / ITEM CON UA MAYOR CANTIDAD DE: 10,0 UN / CANTIDAD ITEM: 16,0 UN EJECUTADOS EN OBRA / PENDIENTES POR COBRAR EN ACTA 11: 10,0 UN.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.3	GRIFERIAS Y ACCESORIOS	HOJA No.	140	de	313
UNIDAD	UN	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	12.3.5	REJILLA CON SOSCO 3X2" C/I	MEMORIA FINAL	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	13.1	COCINA INTEGRAL ZONA DE CAFETERIA	HOJA No.	141	de	313
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 13.1.2	MUEBLE PARA AREA DE LACTANCIA LONGITUD DE 1.50MTS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

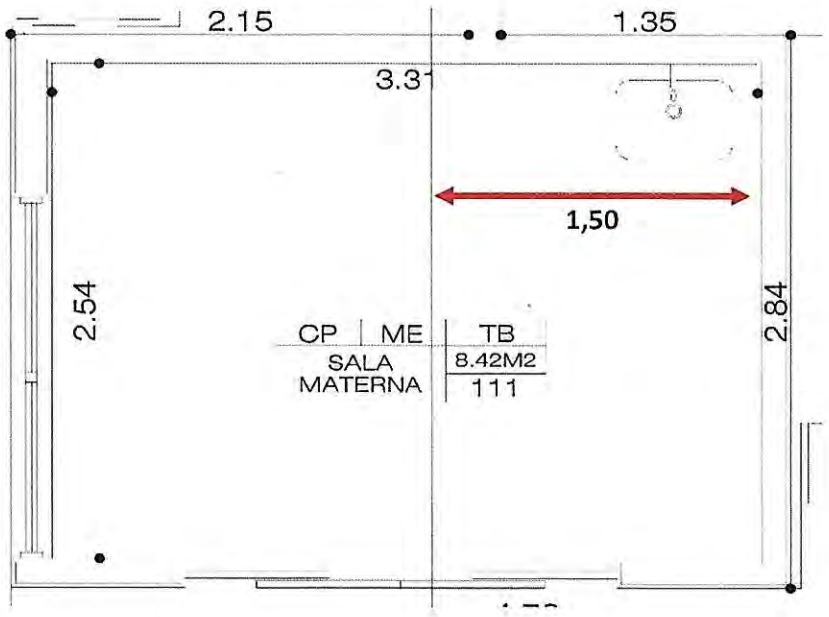

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
SALA LACTANCIA	MUEBLE EN MADERA BAJO MESON	1,500		0,90		1,00	1,50

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,50
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	1,50
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR EN PRESENTE CORTE**	**1,50**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 1,50 ML / TOTAL CANTIDAD ITEM: 1,50 ML EJECUTADOS EN OBRA / EN ACTA 9 NO SE MULTIPLICO EL VALOR POR LA CANTIDAD / SE COBRAN EN PRESENTE ACTA: 1,50 ML

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
			HOJA No.	142 de	313
CAPITULO	13.1	COCINA INTEGRAL ZONA DE CAFETERIA	ZONA	EXTERIOR	
UNIDAD	ML	DESCRIPCIÓN			
ITEM No.	NP 13.1.2	MUEBLE PARA AREA DE LACTANCIA LONGITUD DE 1.50MTS	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	HOJA No.	143 de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	14.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MURO CON PAÑETE O SUPERBOARD.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

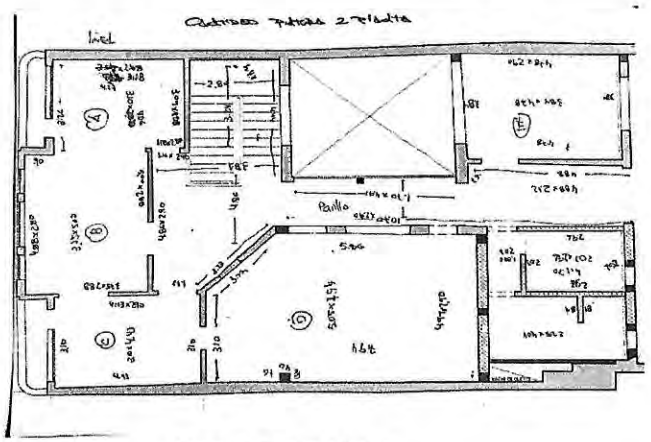

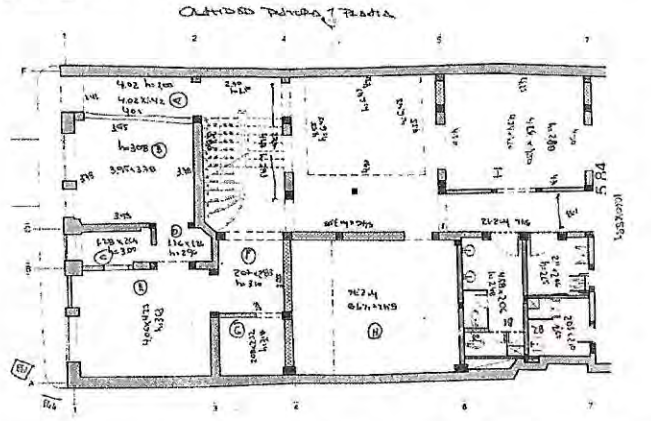

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
SEGUNDA PLANTA VOLUMEN PATRIMONIAL							
ESPACIO A	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	4,03		2,88		1,00	11,6064
		3,10		2,88		1,00	8,928
		4,03		3,03		1,00	12,2109
		3,08		3,03		1,00	9,3324
	MENOS VANO VENTANA	1,84		1,31		-1,00	-2,4104
	MENOS VANO PUERTA	0,67		2,23		-1,00	-1,4941
	MENOS VANO PUERTA-VENTANA	2,16		2,64		-1,00	-5,7024
	MENOS VANO DE PUERTA	0,87		2,18		-1,00	-1,8966
ESPACIO B	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	4,86		2,88		1,00	13,9968
		4,86		2,88		1,00	13,9968
		3,71		2,88		1,00	10,6848
		3,73		2,88		1,00	10,7424
	VIGA	1,05		4,86		1,00	5,103
	VANO VENTANA	0,91		1,31		-1,00	-1,19
	VANO VENTANA	1,63		1,31		-1,00	-2,14
	VANO VENTANA	0,9		1,31		-1,00	-1,18
	VANO PUERTA	1,57		2,19		-1,00	-3,44
	PUERTA VENTANA	2,16		2,64		-1,00	-5,70
	VANO PUERTA	1,2		2,19		-1,00	-2,63
ESPACIO C	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	4,39		3,03		1,00	13,30
		3,06		3,03		1,00	9,27
		3,07		2,88		1,00	8,84
		4,39		2,88		1,00	12,64
	MENOS VANO DE PUERTA	0,89		2,21		-1,00	-1,9669

Cantidad pagadas en los cortes	754,38	Cantidad de la Ficha No. 1 / 5	110,91
		Pasan / vienen	110,91
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	700,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	754,38	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 887,22 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 70754 M2 / PENDIENTE POR COBRAR: 62,10 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C "

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	HOJA No.		144 de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	14.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MURO CON PAÑETE O SUPERBOARD.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

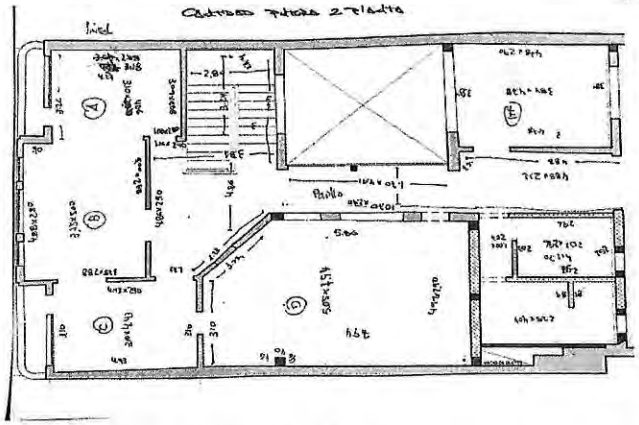

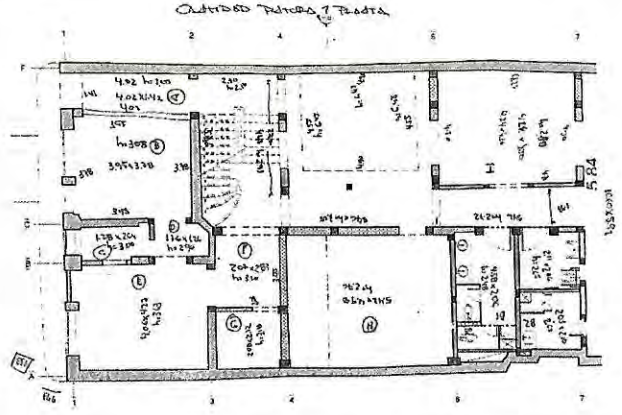

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
SEGUNDA PLANTA VOLUMEN PATRIMONIAL							
ESPACIO C	MENOS VANO PUERTA		1,190	2,19		-1,00	-2,6061
	MENOS VANO PUERTA		1,570	2,19		-1,00	-3,4383
	MENOS VANO VENTANA	1,82		1,33		-1,00	-2,4206
	MENOS VANO PUERTA	0,68		2,20		-1,00	-1,496
ESPACIO D	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	16,28		2,88		1,00	46,8864
		4,74		0,64		1,00	3,0336
		1,31		0,32		1,00	0,4192
		2,17		0,15		1,00	0,3255
	MENOS VANO PUERTA		1,240	2,39		-1,00	-2,9636
	MENOS VANO VENTANA		1,190	1,50		-1,00	-1,785
	MENOS VANO PUERTA		0,890	2,21		-1,00	-1,9669
ESPACIO E	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	17,99		2,88		1,00	51,8112
	VIGA	3,93		0,28		1,00	1,1004
	MENOS VANO PUERTA		0,870	2,39		-1,00	-2,0793
	MENOS VANO VENTANA		1,890	1,46		-1,00	-2,7594
ESPACIO F	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	4,77	2,880			1,00	13,7376
		3,86	2,880			1,00	11,1168
		4,77	3,160			1,00	15,0732
		3,86	2,880			1,00	11,1168
	MENOS VANO VENTANA	1,87		1,46		-1,00	-2,73
	MENOS VANO VENTANA	2,78		1,50		-1,00	-4,17
	MENOS VANO PUERTA	1,07		2,19		-1,00	-2,34
CIRCULACION		10,63		2,88		1,00	30,61
		6,4		2,88		1,00	18,43

Cantidad pagadas en los cortes	754,38	Cantidad de la Ficha No. 2 / 5	172,91
		Pasan / vienen	110,91
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	700,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	754,38	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 887,22 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 70754 M2 / PENDIENTE POR COBRAR: 62,10 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b nº 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
			HOJA No.	145 de 313	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**ZONA**	EXTERIOR	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**			
ITEM No.	14.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MURO CON PAÑETE O SUPERBOARD.	**CORTE 11**	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

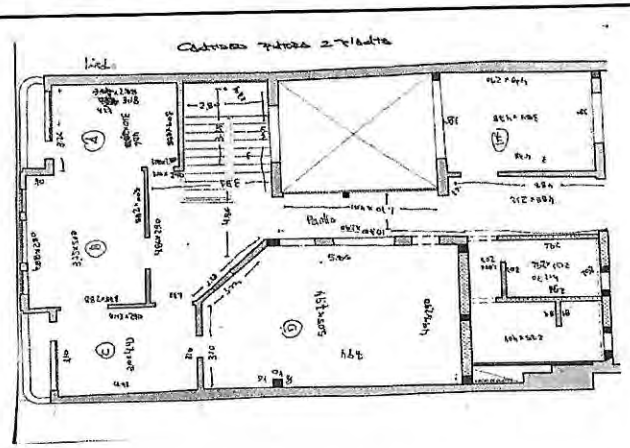

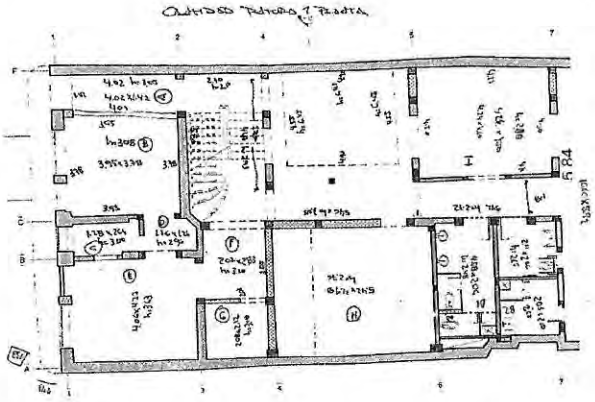

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
SEGUNDA PLANTA VOLUMEN PATRIMONIAL							
CIRCULACION	MENOS VANO DE PUERTA		0,970	2,23		-1,00	-2,1631
HALL IMPRESORA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	10,55		2,88		1,00	30,3840
	MENOS VANO DE VENTANA	1,19		1,50		-1,00	-1,785
	MENOS VANO DE PUERTA		0,870	2,18		-1,00	-1,8966
	MENOS VANO DE PUERTA		1,200	2,19		-1,00	-2,628
	MENOS VANO DE PUERTA		1,190	2,19		-1,00	-2,6061
HALL ESCALERA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	10,25		3,68		1,00	37,72
	MENOS VANO VENTANA	1,99		1,50		-1,00	-2,985
PRIMER PISO PATRIMONIAL							
HALL ESCALERA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	3,10		2,63		1,00	8,153
SALA DE ESPERA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	16,37		3,45		1,00	56,4765
	MENOS VANO ACCESOS		1,060	2,54		-1,00	-2,6924
	MENOS VANO ACCESOS		1,380	2,40		-1,00	-3,312
	MENOS VANO VENTANA		1,750	1,57		-1,00	-2,7475
	MENOS VANO PUERTA ACCESO		1,160	2,78		-1,00	-3,2248
	MENOS VENTANILLA VIGILANCIA		0,610	0,86		-1,00	-0,5246
HALL RECEPCION	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	6,03		2,91		1,00	17,5473
	MENOS VANO CORRESPONDENCIA		1,050	2,17		-1,00	-2,2785
VIGILANCIA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS	7,26		2,91		1,00	21,1266
	PUERTA VIGILANCIA		0,830	2,35		-1,00	-1,9505
	OCULO FACHADA						-0,16
CORRESPONDENCIA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	15,37		3,06		1,00	47,03
	MENOS VANO VENTANA		1,780	1,57		-1,00	-2,79
	VANO ACCESO		1,050	2,17		-1,00	-2,28
HALL ACCESO CUARTO ELECTRICO	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	5,1		3,09		1,00	15,73

Cantidad pagadas en los cortes	754,38	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	198,15
		Pasan / vienen	283,82
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	700,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**754,38**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 887,22 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 70754 M2 / PENDIENTE POR COBRAR: 62,10 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	HOJA No.	146 de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	14.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MURO CON PAÑETE O SUPERBOARD.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

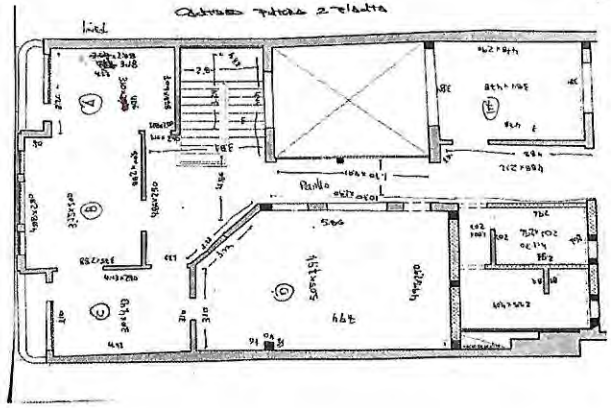

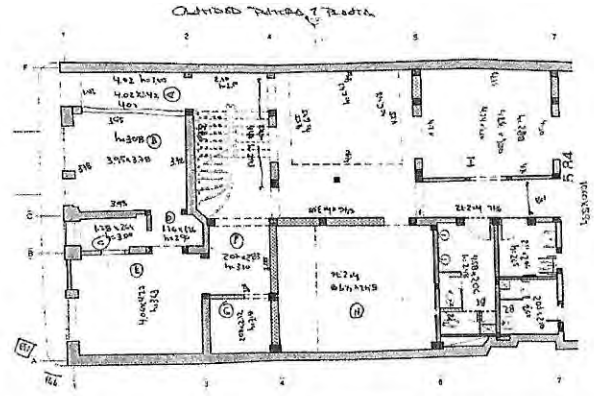

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO PATRIMONIAL							
CUARTO ELECTRICO	PINTURA VINILO TIPO 1	8,35		3,17		1,00	26,4695
HALL CUARTO ELECTRICO	MENOS VANO PUERTA CUARTO ELECTRICO		0,880	2,33		-1,00	-2,0504
ESCALERA	PINTURA VINILO TIPO 1	5,88		2,65		1,00	15,5820
	MENOS VANO VENTANA		1,380	1,18		-1,00	-1,6284
	MENOS VANO VENTANA		1,170	2,05		-1,00	-2,3985
ESCALERA AREA INFERIOR	PINTURA VINILO TIPO 1	2,95		1,94		1,00	5,723
TRIANGULO BAJO ESCALERA	PINTURA VINILO TIPO 1	3,29		1,14		1,00	3,7506
ACCESO DISCAPACITADOS	PINTURA VINILO TIPO 1	10,91		2,90		1,00	31,639
	MENOS VANO		1,330	2,32		-1,00	-3,0856
	MENOS TABLERO ELECTRICO		0,600	0,70		-1,00	-0,42
	MENOS VANO ACCESO ESCALERA		1,150	2,05		-1,00	-2,3575
HALL PRIMER PISO	PINTURA VINILO TIPO 1	10,54		2,57		1,00	27,0878
	MENOS VANO PUERTA SISTEMAS	3,01		2,20		-1,00	-6,622
	MENOS VANO BAÑO DISCAPACITADO		0,980	2,34		-1,00	-2,2932
	VANO BAÑO MUJERES		1,010	2,35		-1,00	-2,3735
RACK	PINTURA VINILO TIPO 1	9,02		2,57		1,00	23,1814
	AREA OCULO RACK					-1,00	-0,16
SISTEMAS	PINTURA VINILO TIPO 1	8,52		2,57		1,00	21,8964
		2,54		0,62		1,00	1,5748
SALA DE JUNTAS	PINTURA VINILO TIPO 1	17,80		2,67		1,00	47,526
	MENOS VANO VENTANA		1,680	1,47		-1,00	-2,4696
	MENOS VANO VENTANA		1,680	1,48		-1,00	-2,4864
	MENOS VANO PUERTA		1,200	2,35		-1,00	-2,82

Cantidad pagadas en los cortes	754,38	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	173,27
		Pasan / Vienen	481,97
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	700,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	754,38	CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE	

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 887,22 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 70764 M2 / PENDIENTE POR COBRAR: 62,10 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoría.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	HOJA No.	147 de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR	
ITEM No.	14.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MURO CON PAÑETE O SUPERBOARD.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21	

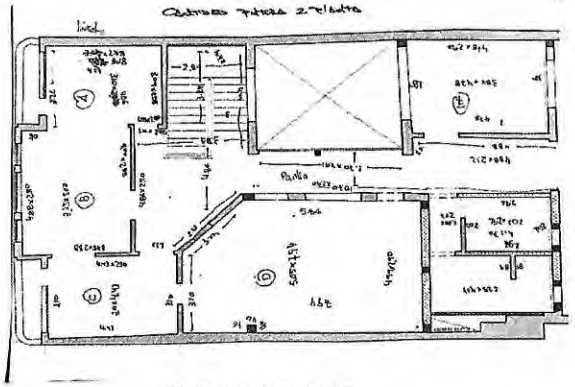

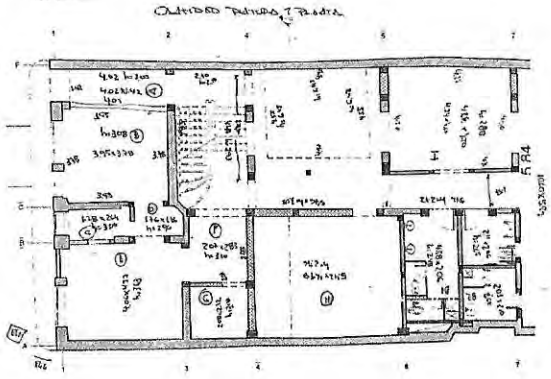

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA VOLUMEN 3							
COCINETA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	5,00		2,46			12,3
COCINETA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	6,57		2,46			16,1622
ACCESO LACTANCIA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	0,65		2,43			1,5795
ACCESO LACTANCIA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	1,00		2,43			2,43
DEPOSITO	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	11,82		2,46			29,0772
LACTANCIA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	8,14		2,43			19,7802
ACCESO COCINETA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	1,20		2,46			2,952
PRIMER PLANTA VOLUMEN 2							
JURIDICA ORIENTE	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	9,12		2,39			21,80
JURIDICA OCCIDENTE	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	7,3		2,39			17,45
SEGUNDA PLANTA VOLUMEN 2							
JURIDICA Y PLANEACION	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	15,395		2,45			37,72

Cantidad pagadas en los cortes	754,38	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	161,24
		Pasan / vienen	655,23
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	700,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**754,38**	**CANT. TOTAL MEMORIAS**	**816,48**
		CANT. TOTAL MEMORIAS	**62,10**

OBSERVACIONES: CANTIDAD ADICION 1: 887,22 M2 / ITEM CON UNA MENOR CANTIDAD DE: 70754 M2 / PENDIENTE POR COBRAR: 62,10 M2.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	HOJA No.		148	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR			
ITEM No.	14.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MURO CON PAÑETE O SUPERBOARD.	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21			

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	HOJA No.	149	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	14.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPOERBOARD	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

VOLUMEN DOS PRIMER Y SEGUNDA PLANTA

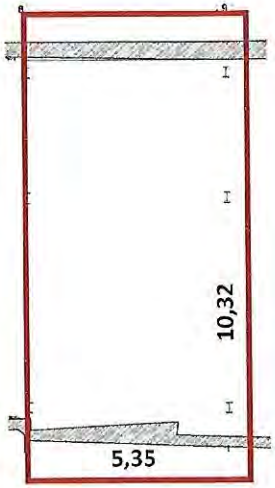

VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA

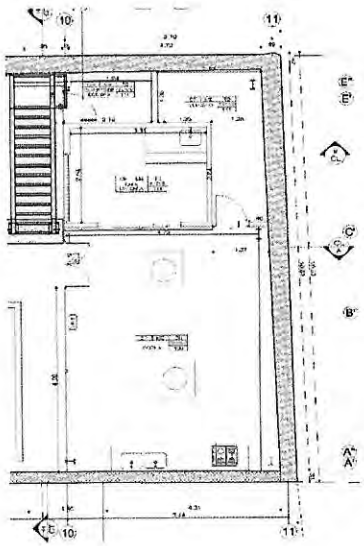

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
	PRIMER PLANTA VOLUMEN 3						
VOLUMEN 3 COCINETA	VINILO TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE CIELO RASO	6,54	5,000			1,00	32,70
	VANOS ARBOLES	1,40	1,360			-1,00	-1,90
		1,40	1,390			-1,00	-1,95
VOLUMEN 3 DEPOSITO	VINILO TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE CIELO RASO	3,83	1,843			1,00	7,06
VOLUMEN 3 LACTANCIA	VINILO TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE CIELO RASO	3,12	2,620			1,00	8,174
VOLUMEN 3 BOMBAS	VINILO TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE CIELO RASO	2,09	1,170			1,00	2,445
VALOR CORTE 9							62,130
							-15,600
	PRIMER PLANTA VOLUMEN 2						
VOLUMEN 2 OFICINA JURIDICA	VINILO TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE CIELO RASO	3,88	5,070			2,00	39,3432
CIRCULAC ION		5,20	2,090			1,00	10,868
COBRADO CORTE 9							56,3
							-6,0888
	SEGUNDA PLANTA VOLUMEN 2						
VOLUMEN 2 SEGUNDA PLANTA	VINILO TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE CIELO RASO	10,06	5,060			1,00	50,9036
COBRADO CORTE 9							56,30
							-5,40

Cantidad pagadas en los cortes	754,38	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	-27,09
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 10	0,00	Cantidad Contractual	133,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	754,38	CANT. TOTAL MEMORIAS	-27,09

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	HOJA No.	150	de	313
UNIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	ZONA	EXTERIOR		
ITEM No.	14.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPOERBOARD	CORTE 11	Periodo del 1/01/21 al 3/02/21		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	ARQ. LILIANA MARCELO Residente de Interventoria.
