

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PROGRAMACION DE OBRA SA-027-2020**	101 días	lun 4/01/21	lun 31/05/21
2		**INICIO**	**101 días**	**lun 4/01/21**	**lun 31/05/21**
3		TRASLADO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL A OBRAS	1 día	lun 4/01/21	lun 4/01/21
4		**INTENDENCIA ALCALDIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA**	101 días	lun 4/01/21	lun 31/05/21
5		**DESMONTE Y DEMOLICIONES**	**20 días**	**lun 8/02/21**	**vie 5/03/21**
13		**PINTURAS INTERIOR Y EXTERIOR**	**35 días**	**lun 1/02/21**	**vie 19/03/21**
23		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA**	**8 días**	**vie 19/02/21**	**mar 2/03/21**
26		**SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK**	**12 días**	**mar 30/03/21**	**vie 16/04/21**
27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PISO DECK, INCLUYE, PILOTES CORTOS DE 0.10 X 0.10 METROS Y VIGAS LATERALES INMUNIZADAS E IMPERMEABILIZADAS (VER DISEÑO)	7 días	mar 30/03/21	vie 9/04/21
28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DECK EN MADERA TEKA CON APERTURA DE 5 MM	5 días	lun 12/04/21	vie 16/04/21
29		**PISOS**	**35 días**	**lun 8/02/21**	**lun 29/03/21**
30		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E = 0.05 MTS	3 días	vie 5/03/21	mar 9/03/21

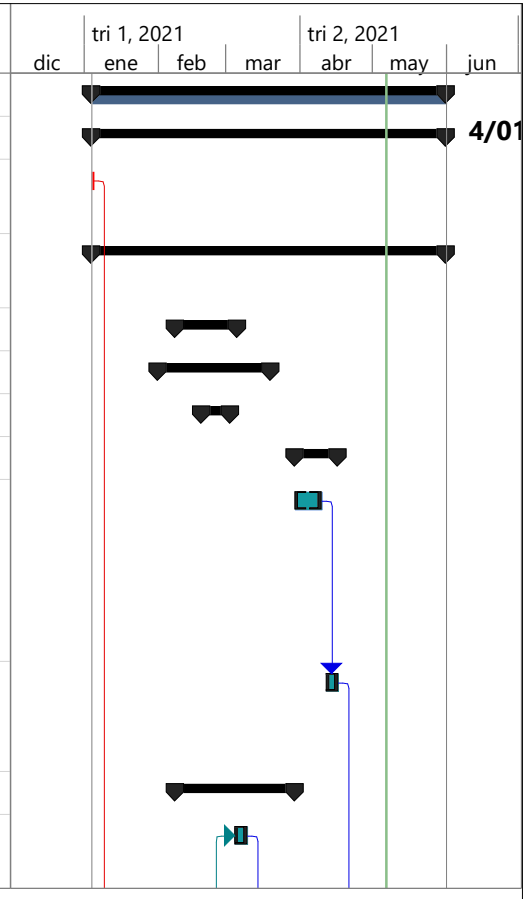

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: vie 7/05/21

Tarea		Tareas externas		solo fin	
División		Hito externo		Fecha límite	
Hito		Tarea inactiva		Tarea crítica	
Resumen		Hito inactivo		Línea base	
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Hito de línea base	
Agrupar por síntesis		Tarea manual		Resumen de línea base	
Tarea resumida		solo duración		Progreso	
Tarea crítica resumida		Informe de resumen manual		Margen de demora	
Hito resumido		Resumen manual			
Progreso resumido		solo el comienzo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
31		PISO POMPEYA TIPO TAPETE O SIMILAR	3 días	mié 10/03/21	vie 12/03/21
32		ZÓCALO EN POMPEYA E = 0.10 METROS O SIMILAR	2 días	lun 15/03/21	mar 16/03/21
33		CENEFA EN POMPEYA O SIMILAR	2 días	jue 4/03/21	vie 5/03/21
34		DESBASTE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO PULIDO	12 días	lun 8/03/21	mié 24/03/21
35		PISO EN ADOQUÍN CON BORDE DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI A CADA 3.00 METROS, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE D = 3/8" Y ESTRIBOS DE D = 1/4" A CADA 0.32 METROS. (NO INCLUYE EL MATERIAL DE ADOQUIN)	3 días	lun 15/02/21	mié 17/02/21
36		DESBASTE, PULIDA Y CRISTALIZADA DE PIEDRA BOGOTANA EN FACHADA	15 días	lun 8/03/21	lun 29/03/21
37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	4 días	lun 8/02/21	jue 11/02/21
38		**ESTRUCTURAS METALICAS**	**52 días**	**lun 15/02/21**	**vie 30/04/21**

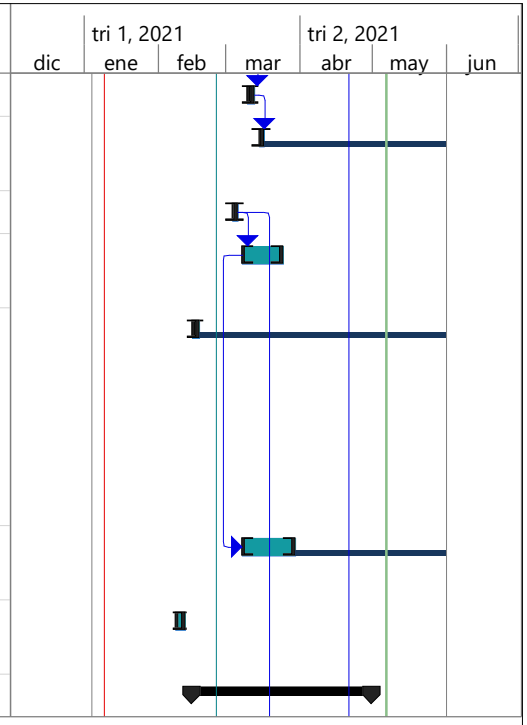

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: vie 7/05/21

Tarea	Tareas externas	solo fin
División	Hito externo	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Tarea crítica
Resumen	Hito inactivo	Línea base
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Hito de línea base
Agrupar por síntesis	Tarea manual	Resumen de línea base
Tarea resumida	solo duración	Progreso
Tarea crítica resumida	Informe de resumen manual	Margen de demora
Hito resumido	Resumen manual	
Progreso resumido	solo el comienzo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS ALTURA 1.00 METROS, EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO EXTERNO, PARALES, FLANCHES EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 3/16", ANCLADOS A MURO CON PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" CUBIERTOS CON ESCUD	10 días	lun 19/04/21	vie 30/04/21
40		MANTENIMIENTO DE PASAMANOS METALICO, INCLUYE LIGADO, GRATEADO, LAVADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO CROMATO DE ZINC Y ACABADO EN ESMALTE INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS AVERIADOS HASTA EN UN 30%	5 días	lun 19/04/21	vie 23/04/21

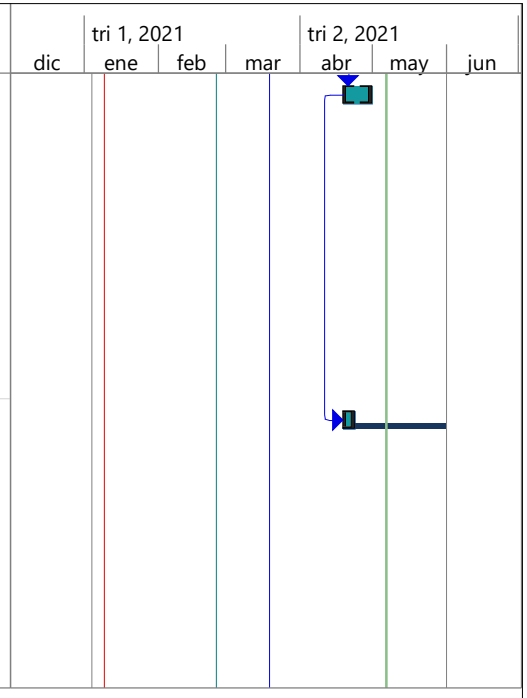

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: vie 7/05/21

Tarea	Tareas externas	solo fin
División	Hito externo	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Tarea crítica
Resumen	Hito inactivo	Línea base
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Hito de línea base
Agrupar por síntesis	Tarea manual	Resumen de línea base
Tarea resumida	solo duración	Progreso
Tarea crítica resumida	Informe de resumen manual	Margen de demora
Hito resumido	Resumen manual	
Progreso resumido	solo el comienzo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
41		SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOLES EN ESTRUCTURA EN TUBERIA GALVANIZADA, BASES CON PLATINAS Y PERNOS DE ANCLAJES, PERGOLAS EN MADERA PLASTICA CON PINTURA AEROFLEX DE PINTUCO O SIMILAR (VER DISEÑO).	4 días	lun 15/02/21	jue 18/02/21
42		**AMPLIACION SEGUNDO PISO**	**35 días**	**lun 12/04/21**	**lun 31/05/21**
43		SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 MM, INCOLORO CON BORDES PULIDOS, BRILLADOS, INSTALADOS CON PERFIL EFE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR (SISTEMA SPIDER)	5 días	mar 25/05/21	lun 31/05/21
44		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LOSA, ESTRUCTURA CORPALOSA STEEL DECK 3", EN LÁMINA CALIBRE 18, INCLUYE VIGUETAS Y RIOSTRAS, FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.12 MTS CON SUS REFUERZOS Y MALLA ELECTROSOLDADA	22 días	lun 12/04/21	mar 11/05/21
45		**DIVISION DE LA SALA DE JUNTAS**	**7 días**	**lun 1/02/21**	**mar 9/02/21**

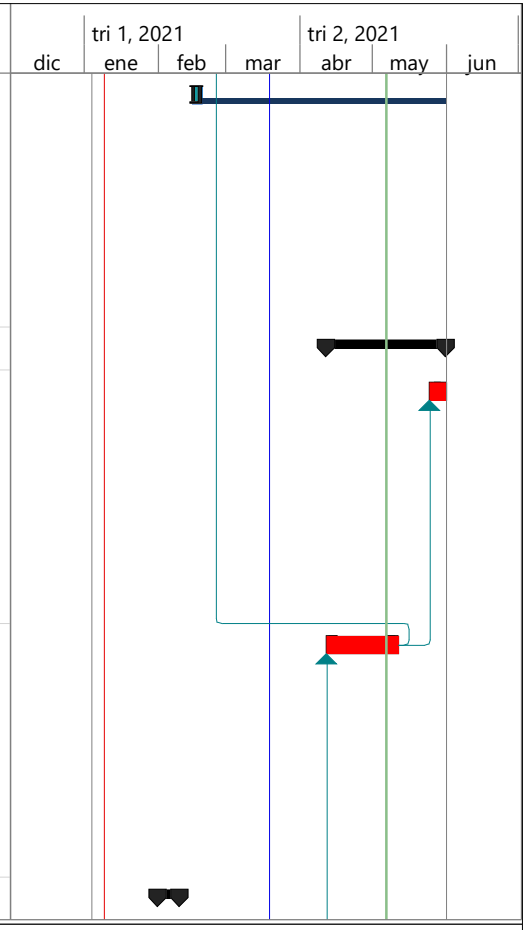

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: vie 7/05/21

Tarea		Tareas externas		solo fin	
División		Hito externo		Fecha límite	
Hito		Tarea inactiva		Tarea crítica	
Resumen		Hito inactivo		Línea base	
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Hito de línea base	
Agrupar por síntesis		Tarea manual		Resumen de línea base	
Tarea resumida		solo duración		Progreso	
Tarea crítica resumida		Informe de resumen manual		Margen de demora	
Hito resumido		Resumen manual			
Progreso resumido		solo el comienzo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
48		**RED ELECTRICA**	**31 días**	**lun 8/02/21**	**mar 23/03/21**
49		**RED ELECTRICA AMPLIACION SEGUNDO PISO**	**2 días**	**vie 19/03/21**	**mar 23/03/21**
50		E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	2 días	vie 19/03/21	mar 23/03/21
51		**RED ELECTRICA SALA DE JUNTAS PRIMER PISO**	**3 días**	**lun 8/02/21**	**mié 10/02/21**
52		E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	2 días	lun 8/02/21	mar 9/02/21
53		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO.	1 día	mié 10/02/21	mié 10/02/21
54		**DISEÑOS DE OBRA**	**45 días**	**lun 4/01/21**	**lun 8/03/21**
55		**PROVISIONES**	**45 días**	**lun 4/01/21**	**lun 8/03/21**
56		DISEÑOS DE OBRA	35 días	mar 5/01/21	mar 23/02/21
57		**BIBLIOTECA VILLAS DE SAN PABLO**	61 días	lun 4/01/21	mié 31/03/21
93		**BIBLIOTECA LAS GARDENIAS**	**40 días**	**vie 15/01/21**	**jue 11/03/21**
127		**BIBLIOTECA ALVARO CEPEDA SAMIDIO**	**49 días**	**jue 21/01/21**	**mié 31/03/21**
128		**CARPINTERIA EN MADERA**	**6 días**	**jue 21/01/21**	**jue 28/01/21**

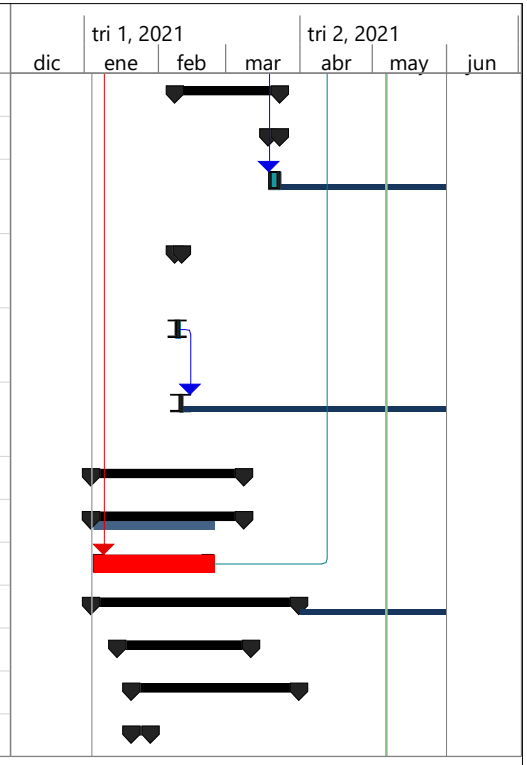

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: vie 7/05/21

Tarea	Tareas externas	solo fin
División	Hito externo	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Tarea crítica
Resumen	Hito inactivo	Línea base
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Hito de línea base
Agrupar por síntesis	Tarea manual	Resumen de línea base
Tarea resumida	solo duración	Progreso
Tarea crítica resumida	Informe de resumen manual	Margen de demora
Hito resumido	Resumen manual	
Progreso resumido	solo el comienzo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
129		FUMIGACION DE AREA AFECTADA CON COMEJEN, POLILLA Y CARCOMA, CON APLICACIÓN DE INMUNIZANTE, CON CARACTER CURATIVO Y PREVENTIVO, SISTEMA DE ASPERSIÓN Y SEGUIMIENTO, GARANTIZADO POR 6 MESES	2 días	jue 21/01/21	vie 22/01/21
130		DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL	2 días	lun 25/01/21	mar 26/01/21
131		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MADERA DE ROBLE DE 1.50 X 1.50 METROS, INCLUYE MARCO Y PINTURA PARA MADERA (VER DISEÑO)	2 días	mié 27/01/21	jue 28/01/21
132		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLAS, INCLUYE TAPA METÁLICA Y BISAGRAS	1 día		
133		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**	**17 días**	**lun 8/03/21**	**mié 31/03/21**
134		RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN MUROS Y GRADAS	2 días	lun 8/03/21	mar 9/03/21
135		DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	1 día	lun 8/03/21	lun 8/03/21
136		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E = 0.07 METROS	3 días	mar 9/03/21	jue 11/03/21

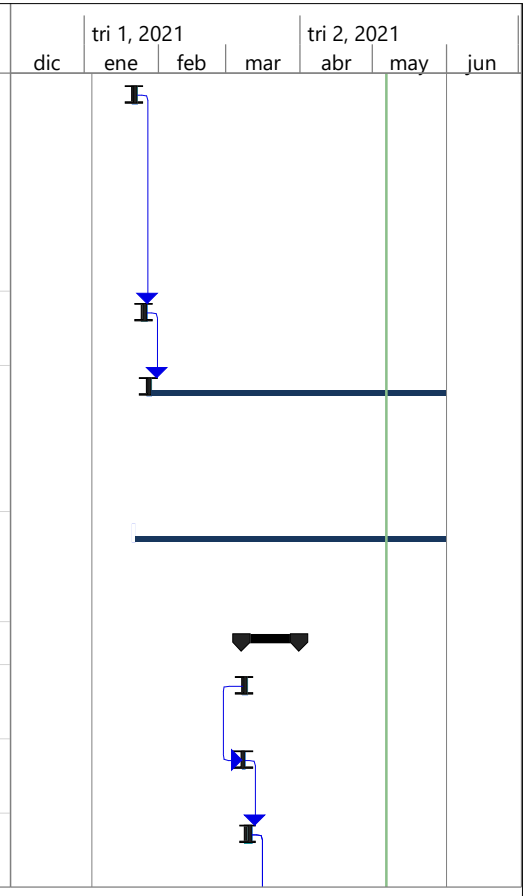

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: vie 7/05/21

Tarea	Tareas externas	solo fin
División	Hito externo	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Tarea crítica
Resumen	Hito inactivo	Línea base
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Hito de línea base
Agrupar por síntesis	Tarea manual	Resumen de línea base
Tarea resumida	solo duración	Progreso
Tarea crítica resumida	Informe de resumen manual	Margen de demora
Hito resumido	Resumen manual	
Progreso resumido	solo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
137		PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	5 días	vie 12/03/21	jue 18/03/21
138		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	5 días	vie 12/03/21	jue 18/03/21
139		DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	1 día	lun 8/03/21	lun 8/03/21
140		PISO EN BALDOSA DE CEMENTO DE 0.20 X 0.20 MTS	1 día	lun 8/03/21	lun 8/03/21
141		PINTURA DE ESMALTE PARA REJA TIPO PINTUCO O SIMILAR	5 días	vie 19/03/21	vie 26/03/21
142		LIMPIEZA GENERAL	3 días	lun 29/03/21	mié 31/03/21
143		SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12000 BTU.	2 días	mar 30/03/21	mié 31/03/21
144		**FIN**	101 días	lun 4/01/21	lun 31/05/21

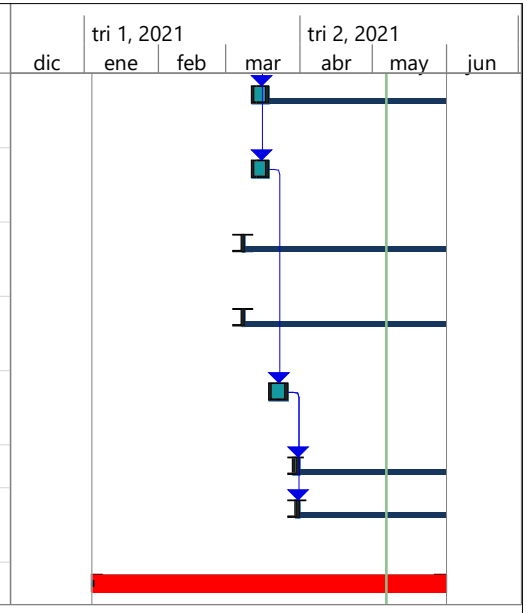

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: vie 7/05/21

Tarea	Tareas externas	solo fin
División	Hito externo	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Tarea crítica
Resumen	Hito inactivo	Línea base
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Hito de línea base
Agrupar por síntesis	Tarea manual	Resumen de línea base
Tarea resumida	solo duración	Progreso
Tarea crítica resumida	Informe de resumen manual	Margen de demora
Hito resumido	Resumen manual	
Progreso resumido	solo el comienzo	
