Barranquilla, 15 de agosto de 2021

Ingeniero
JOSE LUIS GARCIA MULFORD
Subsecretario de Vías y Construcción – Secretaría de Infraestructura
Gobernación del Departamento del Atlántico
Supervisor
E.S.D.

De acuerdo con el contrato **202100749**, me permito presentar el informe parcial de actividades realizadas, correspondientes al mes comprendido entre el **15 de julio y el 14 de agosto de 2021**, conforme al objeto del contrato: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRTARÍA**.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Visitas de supervisión y seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento y adecuación llevadas a cabo en la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito, en el Municipio de Usiacurí, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Sede Principal, en el Corregimiento de Campeche, Municipio de Baranoa y en la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado, en el Municipio de Baranoa.

- Visitas de apoyo a la ejecución de las obras (montaje e instalación de estructuras metálicas), llevadas a cabo en los Parques para la Gente en los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomas y Juan de Acosta.

- Asistencia a la Audiencia y Participación de Terceros, realizada en las instalaciones de Centro de Convivencia Ciudadana del Municipio de Baranoa, por parte de la Agencia Nacional de Minería, para socializar ante la comunidad, entes y autoridades locales, el proceso de proyecto de la propuesta de concesión No. OG2-09216.

- Elaboración y presentación de informes semanales y mensual de visitas de seguimiento y supervisión y actividades.

MARLON ENRIQUE CERRA NOLASCO
C.C. 72.303.708 de Barranquilla.

ANEXO
INFORME MENSUAL

Atlántico para la Gente

Gobernación del Atlántico

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

MEJORAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

El día, jueves 15 de julio de 2021, se realizó visita de supervisión y seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento y adecuación llevadas a cabo en la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito, en el Municipio de Usiacurí, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Sede Principal, en el Corregimiento de Campeche, Municipio de Baranoa y en la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado, en el Municipio de Baranoa.

MUNICIPIO DE USIACURÍ - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Continúan las adecuaciones externas e internas en lo que será el baño de niñas y el de discapacitados, donde se puedo apreciar que ya estaba fundido el mesón de lavamanos externo, algunas láminas de cubiertas reemplazadas, el tanque levado desmontado e iniciada la actividad de plantillado de piso exterior.





El Baño de discapacitados se encontró con algunos muso enchapados y con las acometidas hidráulicas instaladas. Esta pendiente la terminación de la plantilla y del enchape sobre muros, así como la instalación de piso cerámico y batería sanitaria.





Al interior del baño de las niñas, se observó en detalle que todas las láminas de cubierta fueron reemplazadas y que se han reemplazado algunos de los listones de madera que conforman la estructura soporte de la cubierta. En mi opinión esta estructura debió ser reemplazada en su totalidad con la utilización de perfiles Chanel galvanizados.





Actividades de enchape cerámico sobre muro bastante adelantado, con wins metálicos instalados en cantos de muros.





Considero que podría tener un mejor orden y ase de la obra que permita una mejor sensación de avance y control de las actividades que se realizan, sin mencionar que se pueden disminuir significativamente los riesgos de lesiones por accidentes.





CORREGIMIENTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SEDE PRINCIPAL.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontró que el baño existente estaba con pintura de acabado exterior de acuerdo con los colores establecidos.



Al costado continúan las labores de levante de muros, luego de encontrase fundidas las columnas y la cimentación terminada. También se hacían actividades de relleno y compactación.






Para los baños de los profesores se encontró que se estaban haciendo las actividades de reubicación e instalación de acometidas hidráulicas y sanitarias.




MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO PANTOJA MALDONADO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por el ingeniero residente de la obra Fredy Garzón. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Continua la adecuación del andén lateral, con plantilla fundida parcialmente y adecuación del terreno o espacio en el que se desarrollará la rampa para discapacitados.





Continúan y avanzan las actividades de instalación de piso en loseta, en las diferentes áreas a intervenir contempladas en el urbanismo inicial.









Así mismos, se encontró personal trabajando en las áreas adicionadas al urbanismo inicial, como complemento de proyecto general, con el relleno y compactación de dichas zonas.





Atlántico para la Gente

Gobernación del Atlántico

INFORME ESTRUCTURAS METÁLICAS PARQUES PARA LA GENTE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ESTRUSTURAS METÁLICAS EN PARQUES PARA LA GENTE.

El día, miércoles 21 de julio de 2021, se realizó visita de apoyo a la ejecución de las obras (montaje e instalación de estructuras metálicas), llevadas a cabo en los Parques para la Gente en los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomas y Juan de Acosta.

MUNICIPIO DE SABANAGRANDE.

En las instalaciones de la obra, fui recibido y atendido por el residente de interventoría. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

La estructura metálica existente en la obra corresponde a la de la cubierta de la gradería, en ella se pudo observar una estructura que a rasgos generales esta muy bien desarrollada e instalada, con pequeños detalles que fueron expuestos al residente de interventoría par que fuesen corregidos.





Se sugiere la colocación de doble tuerca en las bases de ancleje a los pedestales.





Se observó uno de los posetes bastante torcido.





Se advierte al residente de que en algunos de los soprtes de las correas, la aplicación de la soldadura no es simetrica, es decir, en algunos las el cordon es corrido y en ambos lados del soporte. En otros solo fue aplicado el cordosn de soladura en un lado. Y en otros soportes la soldadura fue aplicada por puntos y no por cordon corrido.







MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.

En las instalaciones de la obra, fui recibido y atendido por el residente de obra. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

En la obra se encontró una estrctura mucho más robusta tipo galpon o coliseo la cual albergará una cancha múltiple. A primera vista se pudo observar que las uniones de de tramos de perfiles IP para las vigas, fueron soldadas sin escalonamiento los que para este tipo de lementos estructurales no es recomendable. El contratista manifestó que se hizo de esa manera pues se ha usado una soldadura especial, la cual permiete este tipo de uniones.



Se ha solicitado al contratista de la estructura metálica, en reiteradas oportunidades, la información técnica de la soldadura usada pero, hatsa la fecha de de este informe, el el contratista no ha suministrado la información.







Tambien se observó que en las cuatro columnas de las puntas de la cuadricula, que conforma la cancha múltiple, en la parte superior de estas columnas, la sección del perfil HEA, cambia incrementándose, lo que que es muy extraño para cualquier tipor de elemento estructural.

La bases de la columnas estaban ancladas con pernos de sujeción, por medio de una placa de hierro, al pedestal. Este elemento esta pendiente por la aplicación de mortero sin contracción para relleno de anclajes (Grouting).



MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA.

En las instalaciones de la obra, fui recibido y atendido por el residente de obra. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

En sitio se encontró una estructura igual de robusta a las del municipio de Santo Tomas, aun que un poco mas atrasada en su proceso de montaje, y como el contratista es el mismo; las mismas observaciones. En las cuatro columnas de las puntas de la cuadricula, que conforma la cancha múltiple, en la parte superior de estas columnas, la sección del perfil HEA, cambia incrementándose, lo que que es muy extraño para cualquier tipor de elemento estructural.





En algunas uniones de soldadura se pudo apreciar la rotura del material debido al tiempo de aplicación del arco eléctrico, lo que genera puntos de debilidad del materialy por consiguente del elemento estructural. El residente de obra manifesto que todos esos aspectos ya se los había comunicado al subcontratista pues hay elementos que estan solo montados con puntos de soldaduras y no se han aplicado los cordones corridos debidos.





En el momento de la visita se estaba realizando el procose de fundida de las placas de concreto de la cancha múltiple.



Atlántico para la Gente

Gobernación del Atlántico

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

MEJORAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

El día, miércoles 28 de julio de 2021, se realizó visita de supervisión y seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento y adecuación llevadas a cabo en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Sede Principal, en el Corregimiento de Campeche, Municipio de Baranoa y en la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado, en el Municipio de Baranoa.

CORREGIMIENTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SEDE PRINCIPAL.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontró que en el baño de niñas (existente), estaban realizando las labores de instalación de pocetas para lavamanos, grifería y conexión de sifones.













La estructura de soporte para el tanque elevado se encontró totalmente fundida.

Al interior del baño de niñas, se pudo observar que los sanitarios ya estaban instalados y que las puertas de cada uno de los cubículos sanitarios también estaban instaladas.





Al costado continúan las labores de construcción del baño de niños, el cual cuanta con levante de muros y vigas de amarre fundidas. Se encontró personal trabajando en los levantes de las cuchillas para cubierta.





Al interior del baño se puede observar, cómo será la distribución del baño con los cubículos sanitarios.





En los baños de profesores se encontró que se encontraron los levantes de módulos divisorios y personal en labores de instalación de pisos y enchapes cerámicos.





MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO PANTOJA MALDONADO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por el ingeniero residente de la obra Fredy Garzón. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontró fundido uno de los andenes (adicionales), solicitado por el rector del colegio, el cual comunica la entrada del colegio con el auditorio.



También se encontró que gran parte del segundo anden, solicitado por el rector, estaba fundido, con un pequeño tramo por fundir.







Por otro lado, continua la adecuación del andén lateral, ya con piso en loseta instalado y adecuación del terreno o espacio en el que se desarrollará la rampa para discapacitados.





En las demás áreas o zonas de adecuación, contempladas en el urbanismo, continúan las labores de instalación de bordillos prefabricados, colocación de piso en loseta y construcción de rampas de acceso e interconexión a las diferentes áreas.














El día, miércoles 04 de agosto de 2021, se realizó visita de supervisión y seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento y adecuación llevadas a cabo en la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito, en el Municipio de Usiacurí, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Sede Principal, en el Corregimiento de Campeche, Municipio de Baranoa y en la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado, en el Municipio de Baranoa.

MUNICIPIO DE USIACURÍ - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

En la parte externa del baño de niñas y de discapacitados, fue fundida la plantilla del piso y terminados los registros sanitarios. La cubierta en lámina de eternit fue instalada en su totalidad y se iniciaron los trabajos de instalación de enchape cerámico en muros de lavamanos. En la parte posterior del baño se realizaban trabajos de estucado sobre muros.





Para el baño de discapacitados, se encontró que las paredes estaban totalmente enchapadas, así como los pisos. Pendiente la instalación de la batería sanitaria y los respectivos accesorios.

Al interior del baño de niñas, fue instalado el cielo raso en yeso cartón y continúan los trabajos de instalación de enchape cerámico sobe muros, resane y estucado de paredes.









En la parte de afuera del baño se encontró la excavación en donde se construirá la columna y base para la instalación del tanque elevado de agua potable.





CORREGIMIENTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SEDE PRINCIPAL.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Se encontró un avance importante general de la obra, puesto que el baño de niñas (existente), está completamente terminado, pendiente únicamente de las conexiones finales de redes sanitarias e hidráulicas.



Al costado continúan las labores de construcción del baño de varones, en el que se adelantan los trabajos de pañetes sobre muros exteriores y levantes de muros divisorios de cubículos sanitarios internos.





MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO PANTOJA MALDONADO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por el ingeniero residente de la obra Fredy Garzón. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Al ingresar a la Institución Educativa se encontraron unas obras muy adelantadas, que de acuerdo con lo comentado por el residente, se tenían programado finalizar en esa misma semana. Se observó anden totalmente reconstruido y acabado con proceso de elaboración y acabado de rampa para discapacitados.




Nivelación de registros y colocación de remates de pisos en loseta.




Construcción de descansos para desarrollo correcto de rampas de interconexión para acceso a discapacitados.




Áreas con terrazas completamente terminadas y acabadas con pisos en loseta, rampas de acceso para discapacitados y bordillos prefabricados debidamente instalados.







Por motivo de escorrentías de aguas lluvias se procederá a la construcción de un cárcamo (círculo rojo en la imagen), que permita la evacuación de dichas aguas e impida la inundación o ingreso de éstas a las aulas de clase.

También se encontró terminado el tramo de anden pendiente, que hacía parte de los adicionales solicitados por el rector del colegio.



Atlántico para la Gente

Gobernación del Atlántico

INFORME AUDIENCIA Y PARTICIPACIÓN DE TERCEROS AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA.

AUDIENCIA Y PARTICIPACIÓN DE TERCEROS
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.

El día, jueves 05 de agosto de 2021, se realizó en las instalaciones de Centro de Convivencia Ciudadana del Municipio de Baranoa, la Audiencia y Participación de Terceros, por parte de la Agencia Nacional de Minería, en la cual tenía como finalidad socializar ante la comunidad, entes y autoridades locales, el proceso de proyecto de la propuesta de concesión No. OG2-09216.





El proyecto pretende otorgar al proponente A.G.M. DESARROLLOS S.A.S., el permiso de exploración mineral en 2.225,0465 hectáreas que corresponden a un 23,41% del Municipio de Baranoa y 76,59% entre los Municipios de Usiacurí, Tubará y Juan de Acosta.

La intervención, por parte de la Agencia Nacional de Minería, estuvo liderada por la Gerente de Contratación y Titulación, la señora Ana María Gonzalez y su grupo de apoyo, quienes explicaron todo el proceso general de contratación y sus alcances, con la ayuda de la siguiente información, la cual fua proyectada.


AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA
OG2-09216


AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Proceso Precontractual
Evaluación de la propuesta


AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Trámite de una Propuesta de Contrato de Concesión Minera
¿Quiénes pueden radicar una propuesta?
¿Cómo se hace?
Evaluación Técnica
Evaluación Jurídica
Evaluación de Capacidad Económica


AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
¿Cómo se Realiza la Evaluación Técnica de una Propuesta?
Análisis del plano topográfico: Cumple con los requisitos exigidos en la Resolución 40000 de 2015
Análisis de libertad de área: Libre de superposiciones con zonas excluibles de la minería (Páramos, Parques Naturales, Humedales Ramsar), Etc.
Análisis del Formato A: Cumple con la Resolución 143 de 29 de marzo de 2017
Mínimos de idoneidad laboral
Mínimos de idoneidad ambiental
Viabilidad técnica

Evaluación de la Capacidad Económica

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

Antes del 9 de junio de 2015

Después del 9 de junio de 2015

Tiene por objetivo determinar que el proponente cuente con los recursos económicos necesarios para adelantar un proyecto minero y el cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales.

¿Cómo se Realiza la Evaluación Jurídica?

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA




AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
¿Qué cambió con el fallo C-389 de 2016 de la Honorable Corte Constitucional?
Reunión de Coordinación y Concurrencia
Audiencia Pública de Participación Ciudadana


Título Minero
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
¿?
¿Qué es un
TÍTULO MINERO?
Es aquella figura jurídica por medio de la cual el Estado concede el derecho a explorar y explotar los recursos naturales minerales por cuenta y riesgo del titular.


¿Qué Actividades se Adelantan en la Etapa de Exploración?
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Actividades Exploratorias
Revisión Bibliográfica, base Topográfica del área
Contacto con la comunidad
Trincheras y Apiques
Geoquímica y Geofísica, Estudio de Dinámica Fluvial del Cauce
Características hidrológicas y sedimentológicas del cauce
Pozos, galerías y Perforaciones profundas
Evaluación y modelo geológico
Manejo Ambiental
Selección optima de sitios de campamentos y helipuertos
Manejo de aguas lluvias y residuales
Manejo de cuerpos de agua
Manejo de material particulado y gases
Manejo del ruido
Manejo de fauna y flora
Plan de gestión social
Rescate arqueológico
Manejo de hundimientos
Movilidad laboral
Ingeniero ambiental
Ingeniero de minas
Ingeniero Geólogo - Geólogo
Hidrólogo
Antropólogo
Ingeniero civil
Ingeniero forestal
Profesional en Biología
Trabajador (a) social
Comunicador social
Arqueólogo (a)


¿Qué diferencia hay entre Explorar y Explotar?
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Exploración
Se realizan estudios de conocimiento del suelo y el sub-suelo, mediante métodos geológicos geoquímicos y geofísicos.
Se define el área a utilizar.
En esta etapa se determina si existe o no afectación a los ecosistemas.
Se aplican guías minero-ambientales y se requieren permisos para el uso de recursos naturales renovables.
Explotación
Requiere de licencia ambiental y la aprobación del Plan de Trabajo y Obras – PTO.
Se extrae, capta, beneficia y comercializa el mineral.
Presentación de póliza minero-ambiental y Pago de regalías.
Se realiza el plan de cierre y abandono de los montajes, de la infraestructura y recuperación del área para restablecer a su estado inicial.

¿Qué Permisos Ambientales se pueden Requerir en la Etapa de Exploración?

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA


Concesión de aguas


Permiso de vertimientos


Permisos de ocupación de cauces


Permiso de aprovechamiento forestal


Permisos de emisiones atmosféricas


¿Ante quien se tramita? Ante la autoridad ambiental Competente, CAR o ANLA, según corresponda.

¿Quiénes pueden asistir a la Audiencia?

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

A la Audiencia puede asistir toda la Comunidad sin excepción, las Autoridades Municipales y Regionales.




AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

¿Quiénes pueden intervenir en la Audiencia?



En la Audiencia pueden intervenir quienes en las fechas establecidas, se inscriban a través de los formatos dispuestos en la Alcaldía del Municipio o en la página web de la entidad www.anm.gov.co sección Audiencias Públicas.

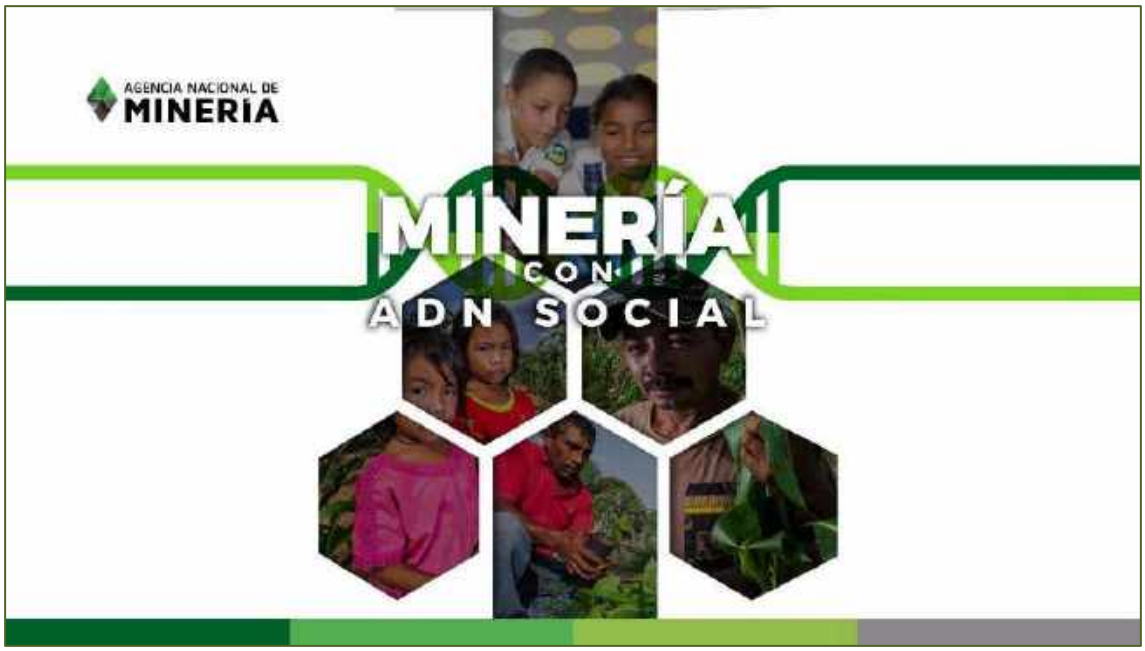

¿QUÉ ES UN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS)?



Resolución 406 Jun 28/2019 – *"Por la cual se modifica la Resolución 318 del 20 de junio de 2018 por la cual se adoptan los términos de referencia aplicables para la elaboración de los programas y proyectos de Gestión Social en la ejecución de los proyectos mineros, y se dictan otras disposiciones"*

- Es un ***instrumento de gestión*** que recopila todos los programas, proyectos que se desarrollan en el área de influencia por parte del concesionario minero.
- Busca ***prevenir, mitigar y atender los riesgos sociales*** generados por el desarrollo del proyecto minero e incrementar las ***oportunidades y beneficios*** generados por el mismo.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

¿PARA QUÉ SIRVE UN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL?



- *Para generar oportunidades* sociales y económicas en el área de influencia del proyecto.
- *Para promover la participación de la ciudadanía* en la identificación de los riesgos posibles producto del proyecto minero en su territorio propio.
- *Para potenciar, mantener y fidelizar relaciones positivas con las entidades locales, comunidades y personas* vinculadas al desarrollo del proyecto minero.
- *Para garantizar el reconocimiento y la inclusión de todos y todas* a través del cumplimiento de los lineamientos de la Política Pública de DDHH, de enfoque diferencial, de género, entre otras.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

¿CÓMO SE REALIZA UN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL?



- Términos de Referencia
- Acompañamiento de los Enlaces Territoriales
- Actas de Audiencias y reuniones de Coordinación y Concurrencia
- Plan de Desarrollo municipal, departamental, nacional y política de DDHH

IMPORTANTE: Tanto el Plan de Manejo Ambiental, como el Estudio de Impacto Ambiental, son un insumo del PGS. El PGA o EIA, y el PGS deben estar alineados para facilitarle al Titular Minero cumplir con ambos requisitos.

El PGS NO reemplaza el PMA o el EIA

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

¿CUANDO SE PRESENTA EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL?



- 30 días antes de finalizar la etapa de exploración o a la presentación del Programa de Trabajos y Obras (PTO).
- La ANM tendrá 3 meses para evaluarlo.
- Se actualizará cuando se requiera.
- Los informes de seguimiento serán anuales.

IMPORTANTE: Los PGS aplican para todos los contratos de concesión que tenga la cláusula social antes de 2015 y los que se firmaron después del PND -Ley 1753 de 2015.

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA


Propuesta Viabilizada en el Municipio de
Baranoa - Atlántico
OG2-09216
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA


Propuestas Viabilizadas Municipio Baranoa - Atlántico
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
TUBARA
MALAMBO
MANATI
POLO NUEVO
REPELO
SANTO TOMÁS
PONEDERA
SABANALARGA

Propuesta de Contrato de Concesión OG2-09216

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

N° EXPEDIENTE	OG2-09216
MINERAL	ARENAS, ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS, GRAVAS, GRAVAS NATURALES, GRAVILLA (MIG)
FECHA DE RADICACIÓN	2 DE JULIO DE 2013
PROPONENTE	AGM DESARROLLOS SAS
ÁREA DEFINIDA SUSCEPTIBLE DE CONTRATAR	**2.225,04648 HECTÁREAS DISTRIBUIDAS EN UNA (01) ZONA, DE LAS CUALES EL 23,41% CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE BARANOA Y EL 76,59% CORRESPONDEN A LOS MUNICIPIO DE USIACURÍ, JUAN DE ACOSTA Y TUBARÁ**
UBICACIÓN	BARANOA – ATLÁNTICO / USIACURÍ – ATLÁNTICO / JUAN DE ACOSTA – ATLÁNTICO / TUBARÁ - ATLÁNTICO

Vista Satelital de la Propuesta de Contrato de Concesión OG2-09216

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA



Luego de la presentación, se dio apertura del micrófono a las inquietudes de los asistentes las cuales fueron básicamente las preocupaciones de las diferentes comunidades del sector, así:

- Efectos negativos que tiene la exploración y explotación minera, tanto a las comunidades aledañas y al entorno ambiental.

- Revisión de la permisibilidad minera de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio.

- Preocupación por la no presencia en la audiencia del alcalde y de representantes de la Procuraduría, Personería y Planeación.

- Problemática con grupos étnicos y/o asentamientos indígenas en las zonas que se incluyen en el proyecto.

Pasado el lapso de preguntas, la señora Ana María Gonzalez, de la Agencia Nacional de Minería, procedió a dar respuesta a cada uno de los interrogantes manifestados por la comunidad, con lo que se dio fin a la audiencia.

De esta audiencia la Agencia Nacional de Minería generará un Acta de la cual solicité se me remitiera una copia vía correo electrónico. En cuanto reciba la información la hare llegar a la secretaría para complementar este informe.

Atlántico para la Gente

Gobernación del Atlántico

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

MEJORAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

El día, miércoles 04 de agosto de 2021, se realizó visita de supervisión y seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento y adecuación llevadas a cabo en la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito, en el Municipio de Usiacurí, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Sede Principal, en el Corregimiento de Campeche, Municipio de Baranoa y en la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado, en el Municipio de Baranoa.

MUNICIPIO DE USIACURÍ - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

En la parte externa del baño de niñas y de discapacitados, se iniciaron los trabajos de instalación de perfilería para estructura de cielo raso, así como la instalación de bajante de aguas lluvia. También se continúan las labores de instalación de enchape cerámico en paredes, pulido de mesón de granito y, según me informaron los trabajadores, estaban por iniciar la instalación de las pocetas de lavamanos.





Para el baño de discapacitados, se encontró que las paredes estaban totalmente enchapadas, así como los pisos. Pendiente la instalación de la batería sanitaria y los respectivos accesorios.





Al interior del baño de niñas, se encontró totalmente instalado el enchape cerámico sobre muros y los pisos en baldosas cerámicas. Pendiente el proceso de refragüe de pisos y paredes.









El personal en sitio se encontraba adelantando las labores de pulido de mesones en granito para los lavamanos y terminando detalles de acabado de estos elementos.





Fueron instaladas lámparas herméticas tipo led.





Los trabajos para la construcción de la estructura soporte para el tanque levado aun no inician y continua el agujero en las mismas condiciones.



CORREGIMIENTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SEDE PRINCIPAL.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por la ingeniera residente de la obra Francia Gonzalez. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Ya se pueden apreciar las dos edificaciones, la correspondiente a al baño de las niñas que fue la reconstruida o adecuada. Y la nueva construcción que va tomando forma para el baño de los niños.





El baño de niños ya fue pañetado casi que en su totalidad en la parte exterior.





Internamente se encontró levante completo de muros divisorios para módulos sanitarios y el pañete de muros iniciado. Personal en sitio adelantando los trabajos de instalación de estructura metálica para soporte de láminas de cubierta.






Los trabajos adicionales de adecuación para los baños de profesores fueron terminados y se encontraban en proceso de limpieza y toma de detalles menores.




MUNICIPIO DE BARANOA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO PANTOJA MALDONADO.

En las instalaciones de la institución educativa, fui recibido y atendido por el ingeniero residente de la obra Fredy Garzón. En la vista se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Al ingresar a la Institución Educativa se encontraron las obras completamente culminadas, con personal menor, en labores de limpieza.















Imágenes del antes y después de cárcamo construido para evitar el ingreso de las aguas de escorrentías a las aulas, permitiendo la evacuación de dichas aguas direccionándolas hacia la cuneta de drenaje con la que cuenta la institución educativa para tal fin.





El contratista manifestó que procedería a realizar la respectiva acta de entrega para que el rector reciba las obras a satisfacción. En cuento el contratista me haga llegar dicho documento los remitiré a la secretaría de infraestructura como complemento de este informe y de la labor de supervisión realizada.

Informe presentado elaborado y presentado por:

Marlon Enrique Cerra Nolasco
Ingeniero Mecánico y Civil.
Profesional de Apoyo - Contratista
Gobernación del Atlántico – Sec. De Infraestructura.
Firmado Electrónicamente. 14-08-2021
