| N° DE INFORME | 03 |
|---|---|

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | HAROLD DAVID TORRES VALLEJO | | | **C.C.** | 1.124.861.052 DE MOCOA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA PARA APOYAR LA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL EN LA FORMULACION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y SU INTEGRACION CON LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES ENCAMINADOS A LA RECONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE MOCOA, EN EL MARCO DEL PLAN ESPECIFICO PARA LA RECONSTRUCCION DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 141 DE 12 DE AGOSTO DE 2019. | | | | |
| **PLAZO 6 MESES** | **DESDE** 13 de mayo de 2021 | **HASTA** | 12 de noviembre de 2021 | **SUPERVISOR** | JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS |
| **N° CONTRATO** | 139 DEL 13 DE MAYO DE 2021 | **VALOR** | $ 20.433.600 | **DEPENDENCIA** | SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERIODO COBRADO** | **DESDE** | 13 de julio de 2021 | **HASTA** | 12 de agosto de 2021 |

| ACTIVIDADES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES REALIZADAS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|
| 1) Apoyar desde sus conocimientos profesionales especializados el seguimiento a los proyectos del PAE, en el marco de la gestión de riesgo, como son los relacionados con vivienda, salud, agua potable, obras de mitigación, informando oportunamente de las novedades que se presenten durante su ejecución. | Conceptos técnicos para la buena ejecución de las actividades relacionadas con cimentaciones o estabilidad de laderas, mediante oficios o participación en comités técnicos. | Documentación digital que reposa en el computador de apoyo profesional secretaria de obras e infraestructura Lorena Acosta, en la carpeta: "ALCALDIA MOCOA"<br><br>**RUTA:** Harold David Torres - Alcaldía Mocoa – Cto No. 063 del 18-02-19 – Actas de comité en PDF – Acta de comité No. 24<br><br>Se anexa documentos en el presente informe en un CD en formato digital y físico. |
| 2) Apoyar a la supervisión de los contratos y/o convenios, relacionados con las obras de rehabilitación y reconstrucción de Mocoa, en el marco del retorno a la normalidad declarada mediante el decreto 0141 de 12 de agosto de 2019. | Supervisión Cto. No. 063 de 2019, muro de contención barrio modelo.<br><br>Supervisión Cto No. 265 de 2020, placa huella Los pinos San Antonio.<br><br>Supervisión Cto No. 297 de 2019, Muro de contención Barrio Libertador. | Documentación digital que reposa en el computador de apoyo profesional secretaria de obras e infraestructura Lorena Acosta, en la carpeta: "ALCALDIA MOCOA"<br><br>**RUTA:** Harold David Torres - Alcaldía Mocoa – Supervisión de contratos.<br><br>Se radica en físico en la oficina de Contratación, para que se anexe al expediente del contrato. Se anexa documentos en el presente informe en |

| | | |
|---|---|---|
| | | un CD en formato digital y físico. |
| **3)** Coadyuvar, desde el componente técnico en la elaboración de conceptos especializados que le sean solicitados frente a la gestión de riesgo de desastres y frente a las emergencias presentada en el municipio de Mocoa. | Concepto técnico e identificación del problema causante de los deslizamientos, y posibles obras de mitigación instantánea por parte de la comunidad, mientras se formula el informe con las obras de mitigación propuestas con los estudios técnicos correspondientes. | Documentación digital que reposa en el computador de apoyo profesional secretaria de obras e infraestructura Lorena Acosta, en la carpeta: "ALCALDIA MOCOA"<br><br>**RUTA:** - Harold David Torres - Alcaldía Mocoa – Respuesta oficios – Registro fotográfico visitas - Registro fotográfico visitas.pdf<br><br>Se anexa documentos en el presente informe en un CD en formato digital y físico. |
| **4)** Apoyar en la elaboración de estudios y diseños, presupuestos, APU y MGA que sean requeridos por la dependencia. | Trabajar en cotización de insumos para la construcción de obras civiles, elaborar lista de precios unificados, para todos los proyectos que se formulen en el municipio de Mocoa. | Documentación digital que reposa en el computador de apoyo profesional secretaria de obras e infraestructura Lorena Acosta, en la carpeta: "ALCALDIA MOCOA".<br><br>**RUTA:** Harold David Torres - Alcaldía Mocoa – Proyectos- Estudio de Mercado SOI-GRDM<br><br>Se anexa documentos en el presente informe en un CD en formato digital, no se anexan en físico debido a que son proyectos con bastantes documentos. |
| **5)** Apoyo especializado en la revisión de estudios y diseños, planos y en la elaboración de proyectos MGA. | No se desarrolló esta obligación debido a que no se han formulado proyectos de obras civiles en este mes en la dependencia SOIM-CGRDM. | |
| **6)** Acompañamiento especializado en las reuniones de articulación departamental y municipal asignadas, para el seguimiento de las actividades establecidas para la reconstrucción del municipio. | Acompañamiento reuniones semanales rutas PDET, para seguimiento a proyectos de inversión dentro del municipio. | Documentación digital que reposa en el computador de apoyo profesional secretaria de obras e infraestructura Lorena Acosta, en la carpeta: "ALCALDIA MOCOA".<br><br>**RUTA:** Harold David Torres - Alcaldía Mocoa – Reuniones PDET - Evidencia reuniones PDET.<br><br>Se anexa imágenes en el presente informe en un CD en formato digital y físico. |
| **7)** Apoyar técnicamente en la etapa precontractual y contractual de los procesos de obras que se requieran | Apoyo en acto administrativo adicional en tiempo y valor contrato N° 297 de 2019 "Construcción Muro de Contención Barrio | Documentación digital que reposa en el computador de apoyo profesional secretaria de obras e infraestructura |

| | | |
|---|---|---|
| por la dependencia. | Libertador, Municipio de Mocoa, Putumayo" | Lorena Acosta, en la carpeta: "ALCALDIA MOCOA".<br><br>**RUTA:** Harold David Torres - Alcaldía Mocoa – Supervisión Cto No. 297 de 2019, Muro de contención Barrio Libertador – Adicional No 02.<br><br>Se anexa documentos en el presente informe en un CD en formato digital, no se anexan en físico debido a que son bastantes carpetas y documentos. |
| **8)** Apoyar las acciones de respuesta y recuperación prioritaria ante situaciones declaradas de calamidad publica o desastre que se presenten en el municipio, que le sean comunicadas por el supervisor del contrato, así como a las jornadas de atención a damnificados programadas post-desastre como tramite de subsidios de arrendo, entrega de viviendas, entrega de ayuda humanitaria y demás programadas en el marco de la reconstrucción de la ciudad. | No se desarrolló esta obligación debido a que el supervisor del contrato designo a otros profesionales para esta tarea. | |
| **9)** Apoyo en la verificación de predios en riesgo para certificación técnica como criterio de asignación de viviendas para damnificados. | No se desarrolló esta obligación debido a que el supervisor del contrato designo a otros profesionales para esta tarea. | |
| **10)** Realizar las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, y que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. | Acompañamiento a realizar el inventario de obras civiles, sobre el tramo vial Condagua-Osococha, a personal del INVIAS. Con el objetivo de formular proyectos en beneficio a la comunidad. | Documentación digital que reposa en el computador de apoyo profesional secretaria de obras e infraestructura Lorena Acosta, en la carpeta: "ALCALDIA MOCOA".<br><br>**RUTA:** Harold David Torres - Alcaldía Mocoa – Placa huella Condagua - Osococha INVIAS - Evidencia inventario Tramo vial Condagua Osococha<br><br>Se anexa imágenes en el presente informe en un CD en formato digital y físico. |

| OBSERVACIONES |
|---|
| *Esta información será entregada en físico y digital al finalizar el contrato al computador de la profesional de apoyo Lorena Acosta, de la secretaria de obras e infraestructura municipal.* |

| RELACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | | PLANILLA N°: 51026480 | |
|---|---|---|---|---|
| **APORTES A** | **PERIODO PAGADO** | **FECHA DEL PAGO** | **VALOR PAGADO** | **ENTIDAD RECAUDADORA** |
| **SALUD** | Julio 2021 | **17/08/2021** | **$ 218,000** | NUEVA EPS |
| **PENSION** | Julio 2021 | **17/08/2021** | **$ 170,300** | PORVENIR |
| **RIESGOS LABORALES** | Julio 2021 | **17/08/2021** | **$ 7,200** | POSITIVA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA DEL CONTRATISTA** | **HAROLD DAVID TORRES VALLEJO** | **FECHA** | 18 de agosto de 2021 |

| REVISION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | | **APRUEBA** | | **FECHA** | **FIRMA** |
| **REVISÓ** | **SARHA VANESSA ORDOÑEZ URBANO** | ~~SI~~ | NO | 18-8-21 | |
| **APROBÓ** | **JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS** | SI | NO | 18-08-21 | |

# ANEXOS

**RUTA:** Harold David Torres - Alcaldía Mocoa – Cto No. 063 del 18-02-19 – Actas de comité en PDF – Acta de comité No. 24.

# REUNION COMITÉ DE OBRA No. 24

## CONTRATO DE OBRA No.: 063 DEL 18 DE FEBRERO DE 2019

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 063 DEL 18 DE FEBRERO DE 2019 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 7 DEL BARRIO MODELO PRIMERA FASE, EN EL MARCO DEL CONVENIO MARCO NO. 9677-PPAL001-704-2018, EN PRO DE LA DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE DESASTRE DECLARADA MEDIANTE DECRETO 599 DE 2017 PRORROGADA MEDIANTE DECRETO 606 DE 2018 Y LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO 0176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 |
| **VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:** | TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($3.493.604.844,00 MDA/CTE.) |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO<br>NIT. 800102891-6<br>R.L/ JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ<br>ALCALDE MUNICIPAL |
| **CONTRATISTA:** | VIRGILIO BRAVO SOSA<br>No. 18.125.909 DE MOCOA (P) |
| **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:** | 18 DE FEBRERO DE 2019 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | DOCE (12) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2019 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:** | VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2020 |
| **FECHA DE REINICIO No. 01:** | TRECE (13) DE JULIO DE 2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN No. 02:** | QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2020 |
| **FECHA PRORROGA No. 01** | SIETE (07) DE OCTUBRE DE 2020 |
| **PLAZO PRORROGA No. 01** | DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| **FECHA DE TERMINACION No. 03:** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA DE SUSPENCIÓN No. 02:** | DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 02:** | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS |
| **FECHA DE REINICIO No.02** | PRIMERO (01) DE FEBRERO 2021 |
| **ADICION RECURSOS Y PRORROGA:** | $347.631.057 CUATRO (4) MESES |

# REUNION COMITÉ DE OBRA No. 24

**CONTRATO DE OBRA No.: 063 DEL 18 DE FEBRERO DE 2019**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACION No. 03:** | CATORCE (14) DE JUNIO DE 2021 |
| **FECHA DE TERMINACION No. 03:** | CATORCE (14) DE JUNIO DE 2021 |
| **FECHA DE SUSPENSION No. 03:** | DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2021 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 03:** | TREINTA (30) DIAS |
| **AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 03:** | DIECIOCHO (18) DE JUNIO 2021 |
| **PLAZO AMPLIACION A LA SUSPENSION 03:** | TREINTA (30) DIAS |
| **FECHA DE REINICIO No. 03:** | DIECIOCHO (18) DE JULIO DE 2021 |
| **FECHA DE TERMINACION N0. 04:** | TRECE (13) DE AGOSTO DE 2021 |

En Mocoa el día veintinueve (29) del mes de junio de 2021, se reúnen, el **Ing. Jhosser Alexander Barrera Arciniegas,** Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal como supervisor, **Ing. Virgilio Bravo Sosa,** contratista de obra, **Ing. Alexander Mena,** residente de interventoría, **Arq. William Cordoba,** apoyo de interventoría **Ing. Carlos Mario Arteaga,** contratista UNGRD, **Ing. Harold David Torres,** profesional de apoyo SOIGRD, **Ing. Saul Veloza,** Contratista empresa APICON SAS, con el fin de revisar temas relacionados al contrato de obra No. 063 del 18 de febrero de 2019.

## I. Objeto:

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 7 DEL BARRIO MODELO PRIMERA FASE, EN EL MARCO DEL CONVENIO MARCO NO. 9677-PPAL001-704-2018, EN PRO DE LA DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE DESASTRE DECLARADA MEDIANTE DECRETO 599 DE 2017 PRORROGADA MEDIANTE DECRETO 606 DE 2018 Y LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO 0176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019.

## II. Orden del día:

1. Verificación de Participantes
2. Tratar temas referente a los inconvenientes que se presentan en obra y solicitud de prorroga en tiempo por parte del contratista.
3. Definir las acciones a tomar referente al tema.

**REUNION COMITÉ DE OBRA No. 24**
**CONTRATO DE OBRA No.: 063 DEL 18 DE FEBRERO DE 2019**

**III. Desarrollo del tema:**

1. El ing. Jhosser Alexander Barrera Arciniegas, Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal como supervisor, saluda a los participantes del comité, y da paso a continuar cediéndoles la palabra a los contratistas de obra e interventoría.
2. Interviene el Ing. Harold David Torres, Profesional de apoyo SOIM-CMGRD, manifiesta que es necesario aclarar que la función de los drenes subhorizontales es, evitar que se acumule agua, y esta instalados para actuar en el tiempo. No para drenar el agua en el momento de su instalación.
3. Interviene el Arq. William Córdoba, apoyo interventoría, manifiesta que la recomendación de interventoría es que hay drenes que son menores a dos metros de longitud, entonces se cree que no están cumpliendo su función, por lo que se propone sumar todos las longitudes de los drenes menores a dos metros, el resultado de esa suma añadírselos a los demás drenes para que tengan más profundidad.
4. Interviene el Ing. Virgilio Bravo Sosa, contratista de obra, manifiesta que en total son 105 metros de drenes mayores a 10 metros y son 265 metros de drenes menores a 10 metros. La interventoría va a entregarle la ubicación de los drenes menores a 10 metros. Se considera que los drenes menores a 1.50 metros de longitud, no serían eficientes.
5. El ing. Jhosser Alexander Barrera Arciniegas, Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal como supervisor, pregunta, si los drenes cortos no cumplirían la función de drenar el agua que no pudo drenarse con los drenes de mayor profundidad.
6. Interviene el ing. Saul Veloza, Contratista empresa APICON SAS, manifiesta que el dren lleva de uno a dos metros la tubería sin perforar, es por eso que se instalan unos drenes de 2 metros de profundidad. Una opción sería perforar toda la tubería.
7. Interviene el Ing. Harold David Torres, Profesional de apoyo SOIM-CMGRD, manifiesta que se debe averiguar el por que se deja la tubería de los drenes sin perforar los dos primeros metros en el diseño. Por otro lado, cree que el argumento es que la cara externa del talud es susceptible a erosionarse o derrumbarse, entonces en caso de que pase eso, y la tubería este perforada los primeros metros, se colmataría y no cumpliría su función.
8. El ing. Jhosser Alexander Barrera Arciniegas, Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal como supervisor, manifiesta que dicho lo anterior, es mejor dejar los drenes como están planteados en el diseño.
9. Interviene el Ing. Virgilio Bravo Sosa, contratista de obra, manifiesta que se hagan los drenes menores a 2 metros pero que los drenes de mayor a profundidad vaya perforada toda la tubería.
10. El ing. Jhosser Alexander Barrera Arciniegas, Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal como supervisor, manifiesta que se debe revisar el diseño para saber el por que de los 2 metros de tubería sin perforar.
11. Interviene el ing. Saul Veloza, Contratista empresa APICON SAS, manifiesta que es importante definir el tema de la cantidad de drenes, para que se tengan en cuenta cuando se comiencen a hacer la pantalla inclinada hay dejar esos espacios.
12. El ing. Jhosser Alexander Barrera Arciniegas, Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal como supervisor, manifiesta que la idea del presente comité es para poder

definir fechas de la hoja de ruta que se va a trazar para reiniciar el contrato y lo que se viene que es el tema de la solicitud de prorroga hecha por el contratista. De todas las obras de mitigación en el municipio esta fue la primera que inicio, tiene el porcentaje más avanzado de ejecución, la idea es que se termine de primeros. Se quiere saber que ha pasado si ya se han hecho pruebas en las perforaciones de los drenes, si ya se calcularon rendimientos, con base en eso se plantea cuando se tiene la solicitud con la sustentación técnica y la interventoría cuando presentaría la viabilidad de la solicitud. La idea es que en este tiempo de suspensión se vaya preparando todo el paquete de la suspensión para apenas se reinicie la obra se comience con el respectivo acto administrativo.

13. Interviene el Ing. Virgilio Bravo Sosa, contratista de obra, manifiesta que cuando se hizo la primera reprogramación, se hablo con el ing. Saul Veloza, explicándole lo que estaba pasando, y se hizo una primera evaluación en la que el rendimiento era de 2 días a 2 días y medio por cada anclaje, han pasado cosas que el ing. Saul Veloza les va a comentar el procedimiento que se va a realizar para poder avanzar y cumplir con los tiempos.
14. Interviene el ing. Saul Veloza, Contratista empresa APICON SAS, manifiesta que todos los presentes en el comité tienen conocimiento de los problemas o inconvenientes que se han venido presentando en obra, el terreno es totalmente diferente al que se tiene en el estudio de suelos del proyecto, el tema de permanentes lluvias en el municipio, el suelo es un material suelto por lo que se tienen complicaciones. Para solucionar estos problemas, se ha tenido que hacer un revestimiento que lo que hace es que a medida que se va perforando se va encamisando la perforación, sucede que el tipo de material son bolos de gran diámetro y se complico el encamisado, antes del paro nacional se había optado por realizar las perforaciones mediante un sistema ABS, en su momento se solicitó a los únicos proveedores en Colombia, de un sistema ABS, que es una broca especial, en el momento no había. entonces toco optar por un sistema que actualmente se esta probando, ese sistema ha funcionado y no ha funcionado, por que cuando encuentra canto rodado es complicado pasar el encamisado por ahí. Se hace la aclaración que el problema no es de la capacidad del equipo de perforación, realmente el punto critico es el encamisado. Se logro contactar con una empresa de la ciudad de Medellín que tiene la broca ABS, lo que pasa es que ya todo esto es sobrecostos, no se va a dejar la obra inconclusa, es un tema que se hablara con el contratista de obra ing. Virgilio Bravo. Entonces el tema de la broca ABS, ya está solucionado y para el día sábado 03 de julio a más tardar estaría acá en obra. El tema del cronograma con los tiempos y rendimientos, se podría hacer cuando se tenga definido que el método ABS, es el adecuado y funciona.
15. Interviene el Ing. Carlos Mario Arteaga, Contratista UNGRD, manifiesta que la suspensión se vence el 17 de julio de 2021, se tendrían dos semanas para realizar pruebas con el equipo ABS, y se podrían tener rendimientos reales, para poder entregar la solicitud de prorroga lo mas pronto posible, basados en que la unidad por que los procesos administrativos son lentos y complejos. Entonces, del 12 de julio al 17 de julio de 2021, se tiene que armar el paquete técnico de la solicitud y viabilidad de prórroga, es entendible el problema que se ha tenido con los niveles freáticos altos y suelos sueltos.
16. Interviene el Ing. Virgilio Bravo Sosa, contratista de obra, manifiesta que el problema es que la programación de obra sigue retrasándose, debido a que se demora el acto administrativo de la prórroga. Cada semana que no se apruebe el adicional, se va a retrasar más la programación. Se va a

tratar de buscar la manera de tener el todos los documentos para el adicional junto con interventoría para antes del 14 de febrero de 2021.

## I. Conclusiones y compromisos:

- El contrato se reinicia el 17 de julio de 2021.
- El Lunes 05 de julio de 2021: Se inician pruebas con maquinaria nueva para calcular los rendimientos de ejecución de perforación de anclajes y subdrenes.
- Lunes 19 de Julio de 2021: Interventoría ya realizo revisión y presenta viabilidad de solicitud de prorroga en tiempo hecha por el contratista de obra.

Para constancia de lo anterior, se anexa el listado de asistencia al presente comité bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

**RUTA:** Harold David Torres - Alcaldía Mocoa – Respuesta oficios – Registro fotográfico visitas - Registro fotográfico visitas.pdf.

## REGISTRO FOTOGRAFICO VISITAS TECNICAS

Visita técnica Vereda Campucana

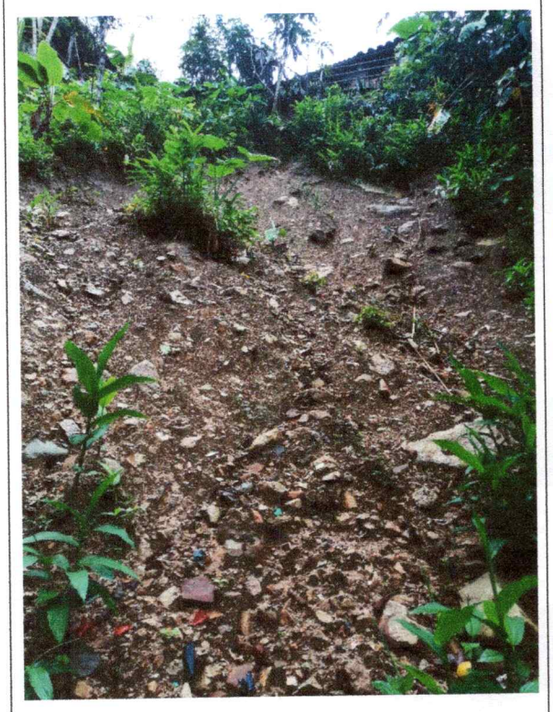


**Imagen 1.** Deslizamiento ocurrido en la Vda. Campucana

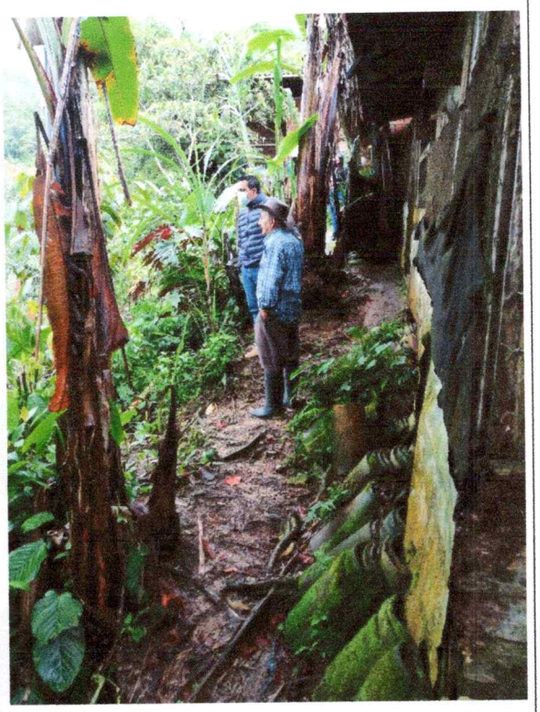
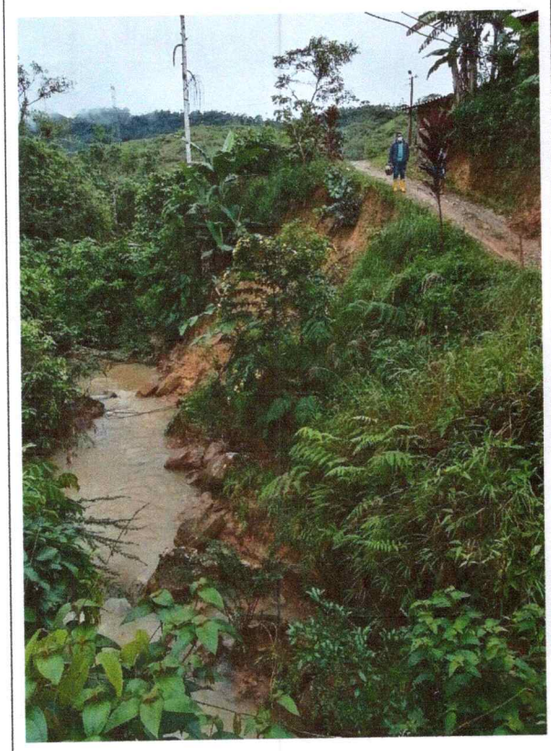


**Imagen 2.** Explicación de los posibles detonantes del deslizamiento, y medidas de prevención al habitante afectado.

| REGISTRO FOTOGRAFICO VISITAS TECNICAS | |
|---|---|
| Visita técnica Vereda Las toldas | |
|  |  |
| **Imagen 3.** Deslizamiento ocurrido en la Vda. Las Toldas | **Imagen 4.** Deslizamiento ocurrido por creciente de la quebrada, causando socavación y desestabilizando el talud. |

## REGISTRO FOTOGRAFICO VISITAS TECNICAS

Visita técnica Vereda Las toldas



**Imagen 5.** Deslizamiento ocurrido en la Vda. Villa Rosa etapa 3.

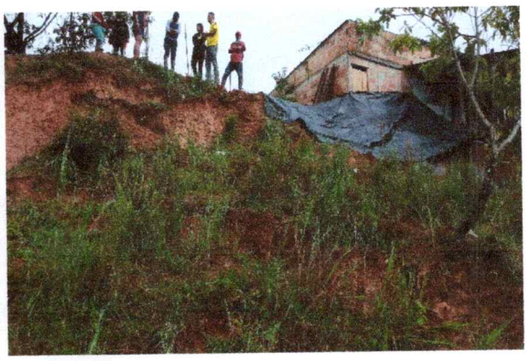




**Imagen 6.** Deslizamiento ocurrido por Fuertes precipitaciones en el Municipio, habitantes construyeron sobre un relleno antrópico, y tuvieron perdidas materiales.

**Ruta:** Harold David Torres - Alcaldía Mocoa – Reuniones PDET - Evidencia reuniones PDET.

## EVIDENCIA REUNIONES PROGRAMA RUTAS PDET

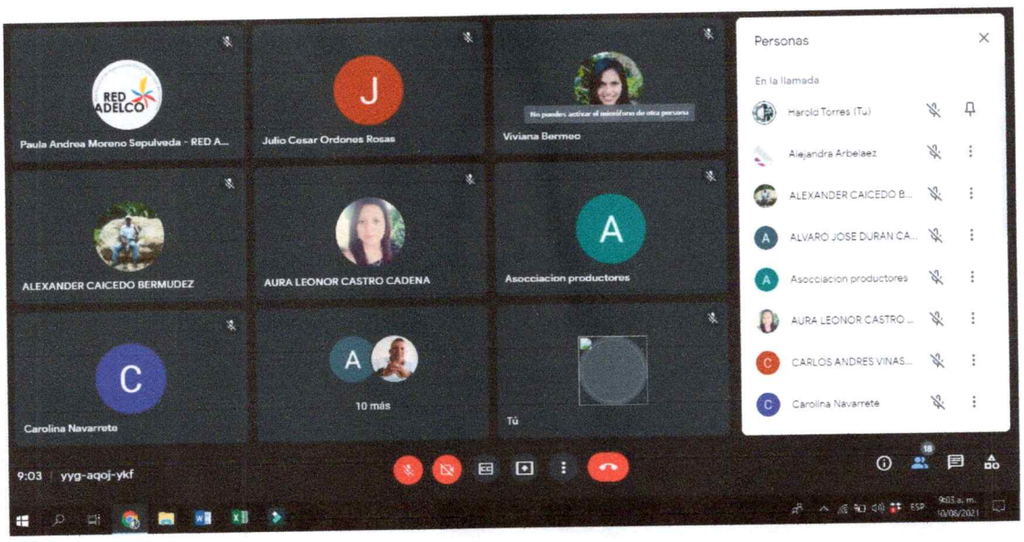



**Imagen 1.** Evidencia reunión realizada el 10 de agosto de 2021.

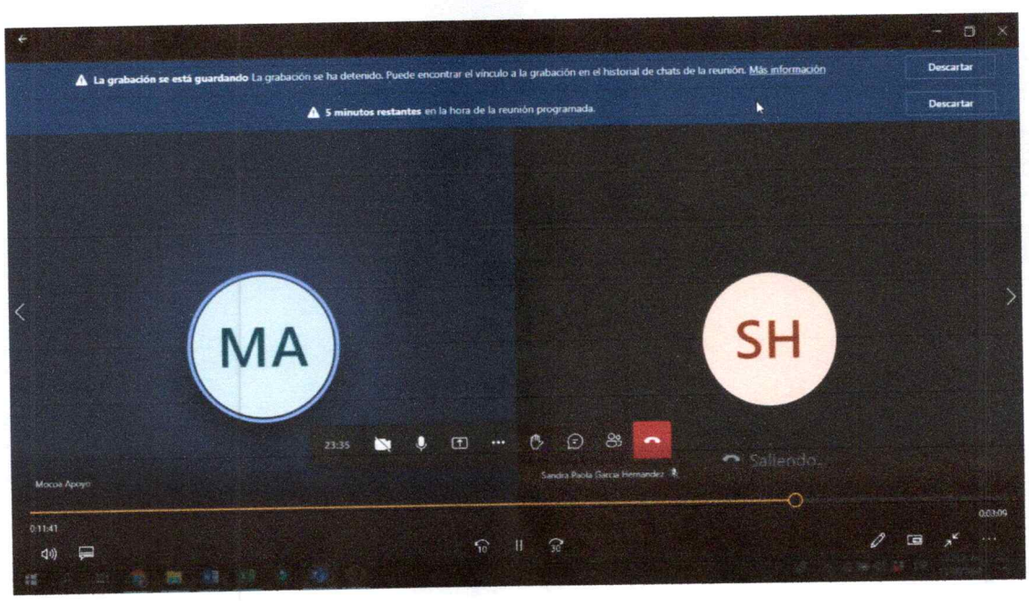



**Imagen 2.** Evidencia reunión realizada el 13 de agosto de 2021.

**RUTA:** Harold David Torres - Alcaldía Mocoa – Placa huella Condagua - Osococha INVIAS - Evidencia inventario Tramo vial Condagua Osococha

## REGISTRO FOTOGRAFICO RECORRIDO SOBRE TRAMO VIAL VEREDA CONDAGUA - OSOCOCHA



**Imagen 1.** Recorrido sobre el tramo vial Condagua – Osococha, para realizar inventario de estructuras existentes. En compañía del INVIAS.

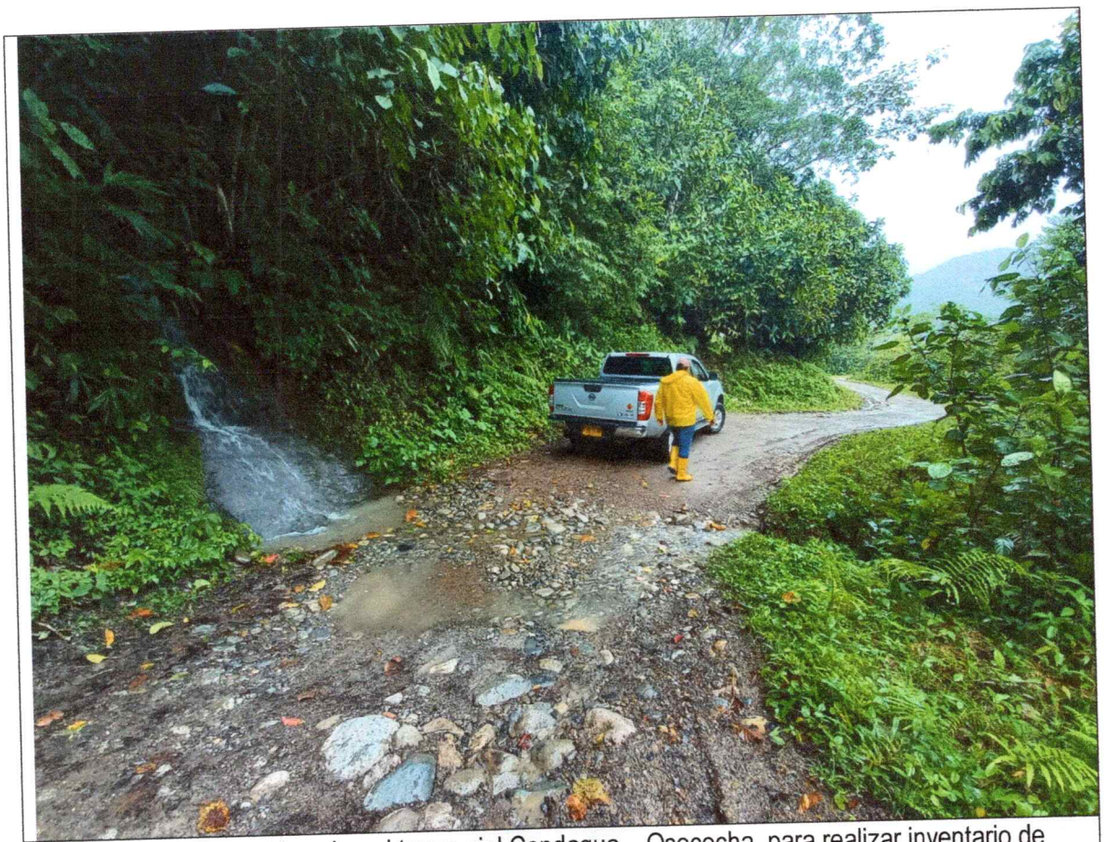


**Imagen 2.** Recorrido sobre el tramo vial Condagua – Osococha, para realizar inventario de estructuras existentes. En compañía del INVIAS.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2021-08-17, 01:58:21 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | julio de 2021 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | julio de 2021 |
| **Empresa** | HAROLD DAVID TORRES VALLEJO |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 1124861052 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 51026480 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1097359469 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 395.500 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | $ 218.000 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 1 | $ 170.300 | $ 0 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1 | $ 7.200 | $ 0 |
| | | | **SubTotales:** | $ 395.500 | $ 0 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 395.500 |



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

EXPERTOS en PILA
