Alcaldía Local de Barrios Unidos
FECHA: 19-AGOSTO-2021
RADICADO BARRIOS UNIDOS: 20216210038992
FOLIOS: 5
ANEXOS: 0

Bogotá D.C., 19 de agosto de 2021

Señores:
Alcaldía Local de Barrios Unidos
Atn: Dr. Antonio Carrillo
Alcalde Local
Ciudad

Asunto: ALCANCE AL RADICADO No 2021621003517-2.

Ref: Contrato de obra 241-2019 y Contrato de Interventoría CIN-242-2019

Por medio de la presente la interventoría "INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S" hace la debida revisión de la documentación enviada por parte del contratista CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020, dándole alcance a la prorroga solicitada bajo el radicado 2021621003517-2, teniendo en cuenta lo solicitado se adjunta la programación para la ejecución de los segmentos viales que se le asignaron al contratista; se adjunta la programación para la realización de la señalización y demarcación de los segmentos viales intervenidos en el contrato de obra 241 de 2019.

De acuerdo con lo anterior esta interventoría INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES S.A.S hace entrega de la programación de los segmentos viales priorizados por la Alcaldía Menor De Barrios Unidos.

Se anexa documentación enviada por el contratista

Atentamente

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal

CONSORCIO
BARRIOS UNIDOS 2020

Bogotá, 18 de agosto de 2021 **CBU2020-OB-015-2021**

Señores
Interventoría y Construciviles SAS
Atn: Ing. Carlos Arámbula
Director de Interventoría
Calle 127ª # 7-19-OF 404
Ciudad

REF: COP-241-2019, cuyo objeto es: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS

ASUNTO: Programación de Segmentos viales Priorizados por la Alcaldía Menor Barrios Unidos

Cordial saludo:

Por medio del presente se da alcance al Oficio CBU2020-OB-014-2121 (Solicitud de Prórroga del Contrato 241 de 2019), con el fin de adjuntar la Programación para la ejecución de los segmentos viales que se asignaron por parte de la Entidad, así como la programación para la realización de la señalización y demarcación de los Segmentos viales intervenidos en el Contrato 241 de 2019.

La solicitud de Prorroga obedece a treinta (30) días calendario, para finalización el 23 de septiembre del año en curso, a razón de que la finalización actual del contrato está dada para el próximo 23 de agosto de 2021.


Se anexan 3 folios de la Programación en PDF.

Atentamente,



IVAN ALONSO PARDO
Director de Obra
CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 (FRENTES NUEVOS)**	**23 días**	**mié 18/08/21**	**vie 17/09/21**	
2	**12000093 - Carrera 65a entre Calles 96 y 97**	**15 días**	**mié 18/08/21**	**mar 7/09/21**	
3	**PRELIMINARES**	**1 día**	**mié 18/08/21**	**mié 18/08/21**	
4	REPLANTEO GENERAL E INSTALACION DE CERRAMIENTO Y PROTOCOLOS	1 día	mié 18/08/21	mié 18/08/21	
5	**LLENOS**	**13 días**	**jue 19/08/21**	**lun 6/09/21**	
6	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	jue 19/08/21	jue 19/08/21	4
7	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	4 días	vie 20/08/21	mié 25/08/21	6
8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	6 días	vie 20/08/21	vie 27/08/21	6
9	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	12 días	vie 20/08/21	lun 6/09/21	6
10	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 23/08/21	lun 23/08/21	7FC-3 días
11	MEJORAMIENTO CON BARRENOS DE CAL	7 días	lun 23/08/21	mar 31/08/21	10FC-1 día
12	DEMOLICION SARDINEL EXISTENTE	1 día	vie 27/08/21	vie 27/08/21	11FC-3 días
13	INSTALACION DE GEOCELDA	3 días	vie 27/08/21	mar 31/08/21	11FC-3 días
14	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA PROTECCION REDES	1 día	mié 25/08/21	mié 25/08/21	7FC-1 día
15	RCD PARA LLENO DE GEOCELDA	4 días	vie 27/08/21	mié 1/09/21	13CC
16	GEOMALLA	3 días	mar 31/08/21	jue 2/09/21	15FC-2 días
17	MBR (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación).	5 días	mar 31/08/21	lun 6/09/21	16CC
18	RENIVELACION DE CARGUES	1 día	lun 6/09/21	lun 6/09/21	17FC-1 día
19	**OBRAS HIDRAULICAS**	**11 días**	**mié 18/08/21**	**mié 1/09/21**	
20	PLACA FONDO POZOS	1 día	mié 18/08/21	mié 18/08/21	
21	CONSTRUCCIÓN DE POZOS	2 días	jue 19/08/21	vie 20/08/21	20
22	INSTALACION DE RED RESIDUAL	5 días	lun 23/08/21	vie 27/08/21	21
23	INSTALACION DE RED PLUVIAL	5 días	mié 25/08/21	mar 31/08/21	22FC-3 días
24	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	1 día	mié 25/08/21	mié 25/08/21	23CC
25	SUMIDERO SL100	1 día	jue 26/08/21	jue 26/08/21	24
26	PLACA CUBIERTA POZO INSPECCION	1 día	mié 1/09/21	mié 1/09/21	23
27	**OBRAS ESPACIO PUBLICO**	**4 días**	**vie 27/08/21**	**mié 1/09/21**	
28	INSTALACION SARDINEL	1 día	vie 27/08/21	vie 27/08/21	13FC-3 días
29	DEMOLICION ESPACIO PUBLICO	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	28
30	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE PASO	3 días	lun 30/08/21	mié 1/09/21	29CC
31	ESTRUCTURA DE ESPACIO PUBLICO	2 días	mar 31/08/21	mié 1/09/21	29CC+1 día
32	NIVELACION Y COMPACTACION	1 día	mar 31/08/21	mar 31/08/21	31CC
33	INSTALACION CONCRETO ESCOBIADO	2 días	mar 31/08/21	mié 1/09/21	32FC-1 día
34	**ASFALTO**	**1 día**	**mar 7/09/21**	**mar 7/09/21**	
35	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0	4 horas	mar 7/09/21	mar 7/09/21	18
36	INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA	1 día	mar 7/09/21	mar 7/09/21	35CC
37	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	4 horas	mar 7/09/21	mar 7/09/21	36CC
38	**12000078 - 12000088 - 1200098 - Calle 97a entre Carreras 60 y 61A**	**15 días**	**mié 18/08/21**	**mar 7/09/21**	**2CC**
39	**PRELIMINARES**	**1 día**	**mié 18/08/21**	**mié 18/08/21**	
40	REPLANTEO GENERAL E INSTALACION DE CERRAMIENTO Y PROTOCOLOS	1 día	mié 18/08/21	mié 18/08/21	4CC
41	**LLENOS**	**13 días**	**jue 19/08/21**	**lun 6/09/21**	

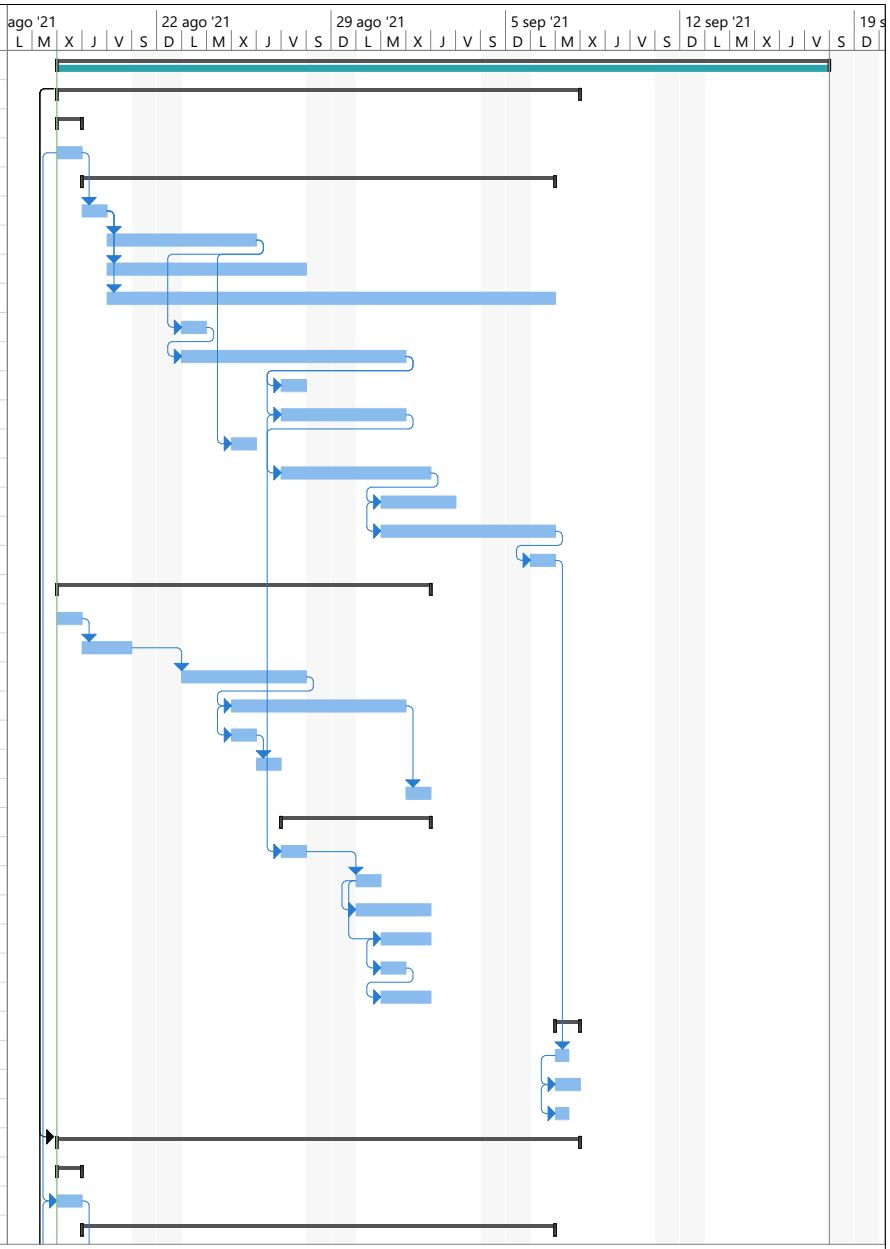

Proyecto: CRONOGRAMA CIV NUEVOS
Fecha: mié 18/08/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
42	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	jue 19/08/21	jue 19/08/21	40
43	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	4 días	vie 20/08/21	mié 25/08/21	42
44	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	6 días	vie 20/08/21	vie 27/08/21	42
45	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	12 días	vie 20/08/21	lun 6/09/21	42
46	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 23/08/21	lun 23/08/21	43FC-3 días
47	MEJORAMIENTO CON BARRENOS DE CAL	7 días	lun 23/08/21	mar 31/08/21	46FC-1 día
48	DEMOLICION SARDINEL EXISTENTE	1 día	vie 27/08/21	vie 27/08/21	47FC-3 días
49	INSTALACION DE GEOCELDA	3 días	vie 27/08/21	mar 31/08/21	47FC-3 días
50	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA PROTECCION REDES	1 día	mié 25/08/21	mié 25/08/21	43FC-1 día
51	RCD PARA LLENO DE GEOCELDA	4 días	vie 27/08/21	mié 1/09/21	49CC
52	GEOMALLA	3 días	mar 31/08/21	jue 2/09/21	51FC-2 días
53	MBR (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación).	5 días	mar 31/08/21	lun 6/09/21	52CC
54	RENIVELACION DE CARGUES	1 día	lun 6/09/21	lun 6/09/21	53FC-1 día
55	**OBRAS HIDRAULICAS**	**11 días**	**mié 18/08/21**	**mié 1/09/21**	
56	PLACA FONDO POZOS	1 día	mié 18/08/21	mié 18/08/21	
57	CONSTRUCCIÓN DE POZOS	2 días	jue 19/08/21	vie 20/08/21	56
58	INSTALACION DE RED RESIDUAL	5 días	lun 23/08/21	vie 27/08/21	57
59	INSTALACION DE RED PLUVIAL	5 días	mié 25/08/21	mar 31/08/21	58FC-3 días
60	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	1 día	mié 25/08/21	mié 25/08/21	59CC
61	SUMIDERO SL100	1 día	jue 26/08/21	jue 26/08/21	60
62	PLACA CUBIERTA POZO INSPECCION	1 día	mié 1/09/21	mié 1/09/21	59
63	**OBRAS ESPACIO PUBLICO**	**4 días**	**vie 27/08/21**	**mié 1/09/21**	
64	INSTALACION SARDINEL	1 día	vie 27/08/21	vie 27/08/21	49CC
65	DEMOLICION ESPACIO PUBLICO	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	64
66	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE PASO	3 días	lun 30/08/21	mié 1/09/21	65CC
67	ESTRUCTURA DE ESPACIO PUBLICO	2 días	mar 31/08/21	mié 1/09/21	65
68	NIVELACION Y COMPACTACION	1 día	mar 31/08/21	mar 31/08/21	67CC
69	INSTALACION CONCRETO ESCOBIADO	2 días	mar 31/08/21	mié 1/09/21	65
70	**ASFALTO**	**1 día**	**mar 7/09/21**	**mar 7/09/21**	
71	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0	4 horas	mar 7/09/21	mar 7/09/21	54
72	INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA	1 día	mar 7/09/21	mar 7/09/21	71CC;53
73	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	4 horas	mar 7/09/21	mar 7/09/21	72CC
74	**12001962 Carrera 27 entre Calles 73bis y 74**	**15 días**	**mié 18/08/21**	**mar 7/09/21**	**2CC**
75	**PRELIMINARES**	**1 día**	**mié 18/08/21**	**mié 18/08/21**	
76	REPLANTEO GENERAL E INSTALACION DE CERRAMIENTO Y PROTOCOLOS	1 día	mié 18/08/21	mié 18/08/21	
77	**LLENOS**	**13 días**	**jue 19/08/21**	**lun 6/09/21**	
78	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	jue 19/08/21	jue 19/08/21	76
79	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	4 días	vie 20/08/21	mié 25/08/21	78
80	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	6 días	vie 20/08/21	vie 27/08/21	78
81	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	12 días	vie 20/08/21	lun 6/09/21	78
82	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 23/08/21	lun 23/08/21	79FC-3 días

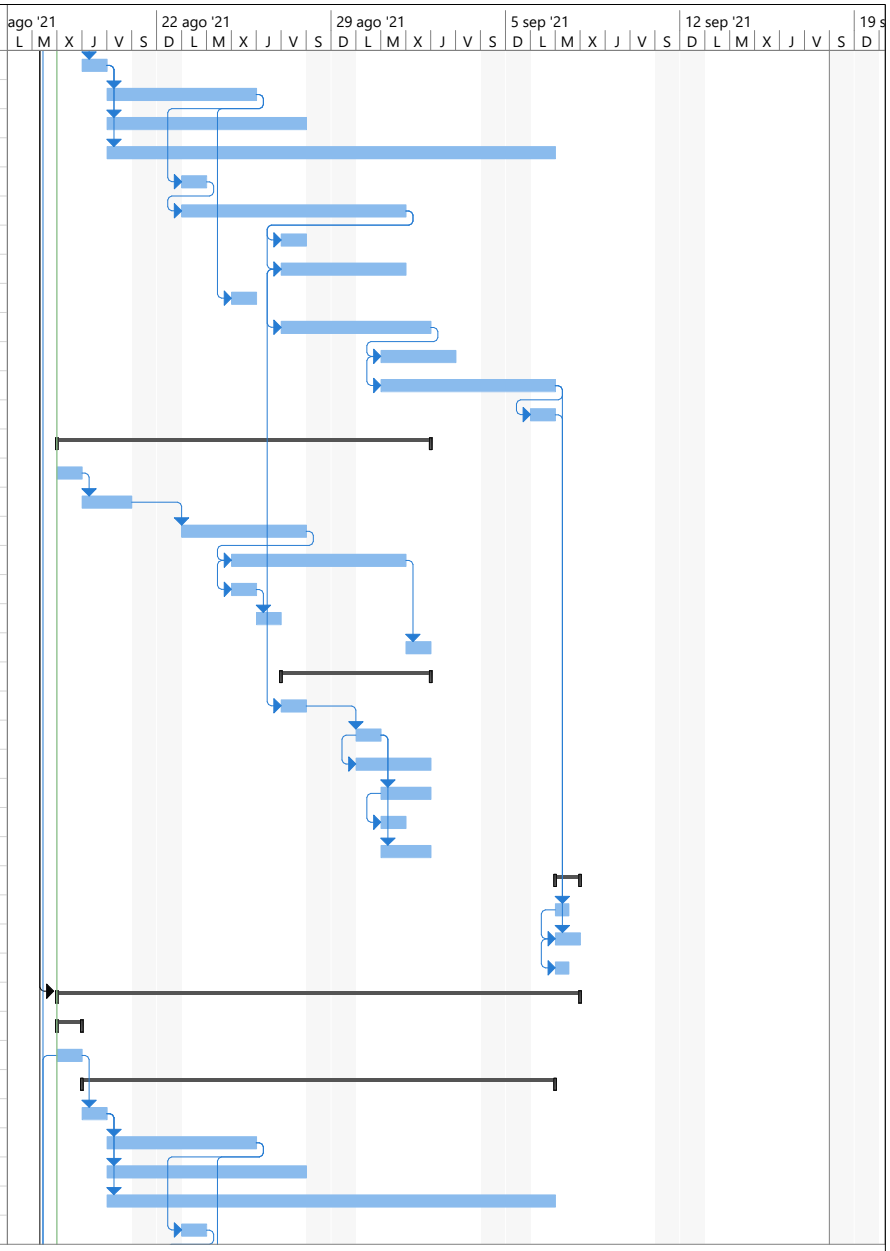

Proyecto: CRONOGRAMA CIV NUEVOS
Fecha: mié 18/08/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
83	MEJORAMIENTO CON RAJON	7 días	lun 23/08/21	mar 31/08/21	82FC-1 día
84	DEMOLICION SARDINEL EXISTENTE	1 día	vie 27/08/21	vie 27/08/21	83FC-3 días
85	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA PROTECCION REDES	1 día	mié 25/08/21	mié 25/08/21	79FC-1 día
86	MBR (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación).	6 días	lun 30/08/21	lun 6/09/21	84
87	RENIVELACION DE CARGUES	1 día	lun 6/09/21	lun 6/09/21	86FC-1 día
88	**OBRAS HIDRAULICAS**	**12 días**	**mié 18/08/21**	**jue 2/09/21**	
89	PLACA FONDO POZOS	1 día	mié 18/08/21	mié 18/08/21	
90	CONSTRUCCIÓN DE POZOS	2 días	jue 19/08/21	vie 20/08/21	89
91	INSTALACION DE RED COMBINADA	5 días	lun 23/08/21	vie 27/08/21	90
92	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	91
93	SUMIDERO SL100	2 días	mar 31/08/21	mié 1/09/21	92
94	PLACA CUBIERTA POZO INSPECCION	1 día	jue 2/09/21	jue 2/09/21	93
95	**OBRAS ESPACIO PUBLICO**	**4 días**	**jue 26/08/21**	**mar 31/08/21**	
96	INSTALACION SARDINEL	1 día	jue 26/08/21	jue 26/08/21	90FC+3 días
97	DEMOLICION ESPACIO PUBLICO	1 día	vie 27/08/21	vie 27/08/21	96
98	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE PASO	3 días	vie 27/08/21	mar 31/08/21	97CC
99	ESTRUCTURA DE ESPACIO PUBLICO	2 días	lun 30/08/21	mar 31/08/21	97
100	NIVELACION Y COMPACTACION	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	99CC
101	INSTALACION CONCRETO ESCOBIADO	2 días	lun 30/08/21	mar 31/08/21	97
102	**ASFALTO**	**1 día**	**mar 7/09/21**	**mar 7/09/21**	
103	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0	4 horas	mar 7/09/21	mar 7/09/21	87
104	INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA	1 día	mar 7/09/21	mar 7/09/21	86;103CC
105	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	4 horas	mar 7/09/21	mar 7/09/21	104CC
106	**Señalizacion y demarcacion de los frentes intervenidos Barrios Unidos**	**23 días**	**mié 18/08/21**	**vie 17/09/21**	**2CC**
107	**CIV INTERVENIDOS**	**23 días**	**mié 18/08/21**	**vie 17/09/21**	
108	CIV 12001759	2 días	mié 18/08/21	jue 19/08/21	40CC;76CC
109	CIV 12001804	2 días	vie 20/08/21	lun 23/08/21	108
110	CIV 12001171 Y CIV 12001180	2 días	mar 24/08/21	mié 25/08/21	109
111	CIV 12000073	2 días	jue 26/08/21	vie 27/08/21	110
112	CIV 12002511, 12002481 Y 12002418	3 días	lun 30/08/21	mié 1/09/21	111
113	CIV 12002216, 12002244 Y 12002104	3 días	jue 2/09/21	lun 6/09/21	112
114	CIV 12000914 Y 12000874	2 días	mar 7/09/21	mié 8/09/21	113
115	CIV 12001501 Y 12000853	2 días	vie 20/08/21	lun 23/08/21	108
116	CIV 12002536	2 días	mié 25/08/21	jue 26/08/21	115FC+1 día
117	CIV 12001961	3 días	mié 1/09/21	vie 3/09/21	116FC+3 días
118	CIV 12001762	3 días	lun 6/09/21	mié 8/09/21	117
119	CIV 12002284	2 días	jue 9/09/21	vie 10/09/21	114
120	CIV 12002536	2 días	lun 13/09/21	mar 14/09/21	119
121	CIV 12000078, 12000088, 12000098 Y 12000093	3 días	mié 15/09/21	vie 17/09/21	120

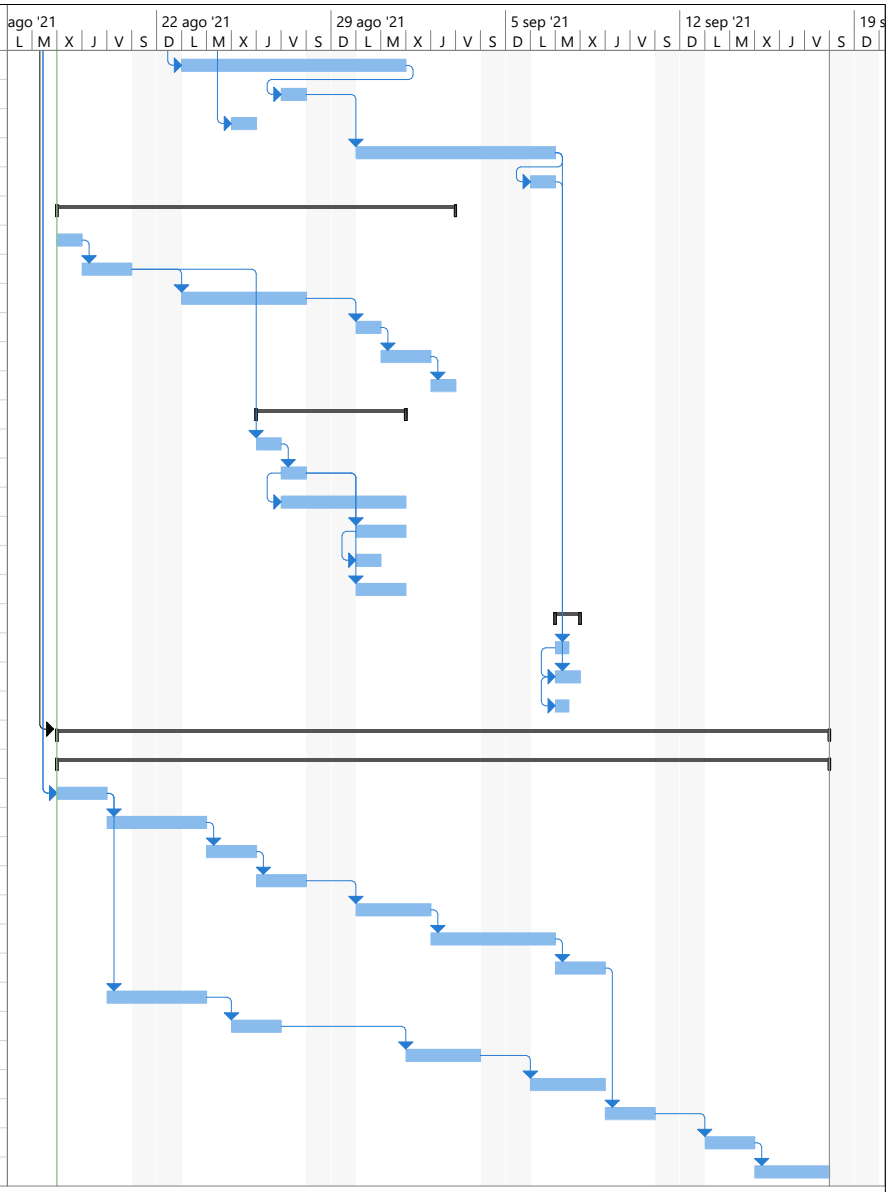

Proyecto: CRONOGRAMA CIV NUEVOS
Fecha: mié 18/08/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	
