GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 5 Del: 14 de octubre de 2020 Al: 20 de octubre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias 35 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 19.44%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoria CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA


ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - VÍA REVENTONES A LOS ALPES Y VÍA VARIANTE COTA

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S	**Interventor:**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020	Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Valor Inicial:	$ 842,543,975	Valor Inicial:	$ 531,944,650
Valor Actualizado:	$ 842,543,975	Valor Actualizado:	$ 531,944,650
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020	Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021	Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021

AVANCE DE CONSULTORIA GENERAL

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA programada (%)	3.95%	9.55%	CONSULTORIA Ejecutada (%)	2.19%	5.79%
Valor de la CONSULTORIA	$ 26,632,608	$ 64,370,600	Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 14,735,045	$ 39,040,732

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

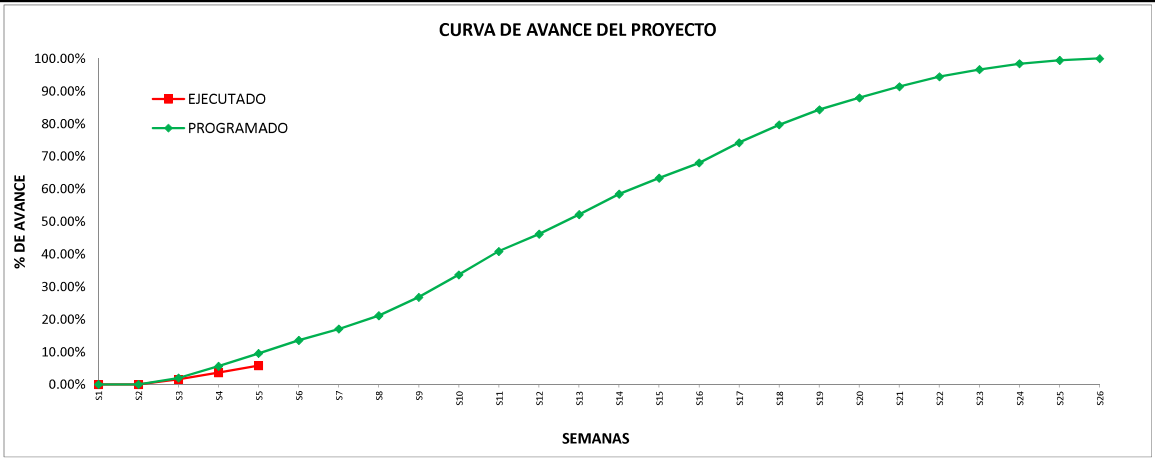

VIA: REVENTONES - LOS ALPES

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S	**Interventor:**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020	Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Valor Inicial:	$ 493,103,370		
Valor Actualizado:	$ 493,103,370		
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020	Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021	Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 5 Del: 14 de octubre de 2020 Al: 20 de octubre de 2020


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias 35 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 19.44%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoria CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

AVANCE DE CONSULTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA programada (%)	3.95%	9.63%	CONSULTORIA Física Ejecutada (%)	2.43%	6.08%
Valor de la CONSULTORIA	$ 15,585,588	$ 38,004,953	Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 9,595,196	$ 23,997,116

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

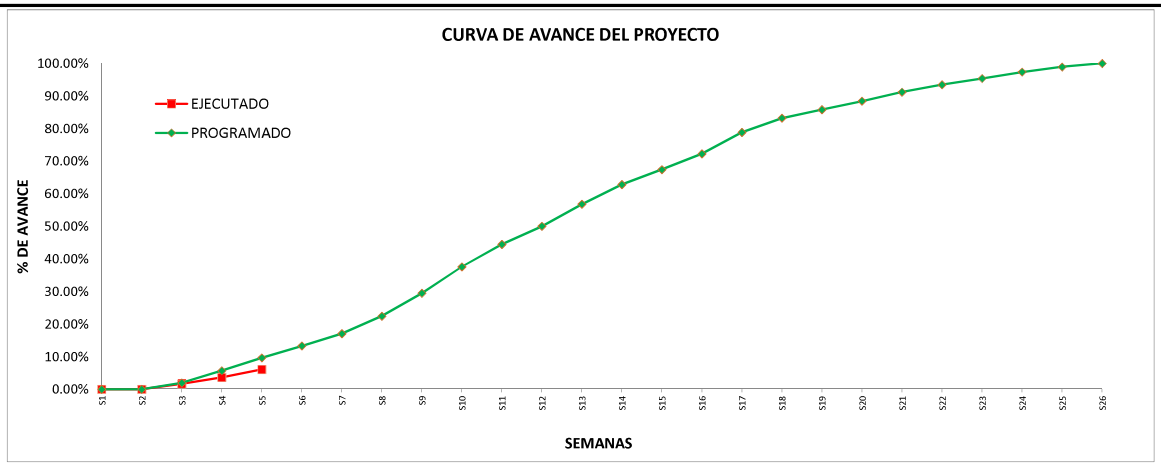

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de campo, especificamente Inspección visual de las obras de drenaje y la Inspección del estado superficial de pavimentos._(Actividad 90)
Se cargan al SECOP II las pólizas de inicio del contrato_(Actividad 2)
Se recibe comunicación INT-UN-REV-082-2020-008 (16/10/2020) con comentarios de la Interventoría Versión 2. a los documentos Plan de campo, Metodología y Cronograma._(Actividad 5)
Se programan y ejecutan actividades en el Tramo Reventones - Los Alpes, con el área de Estructuras._(Actividad 99)
Se realiza el cronograma para las actividades del área de Topografía en el Tramo Reventones - Los Alpes._(Actividad 2)

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Existen algunos retrasos de las actividades de campo en espera de la aprobación por parte de la Interventoría de las metodologías y plan de campo. Una vez estos productos se encuentren aprobados se remitirá el plan de trabajo que mitigue los retrasos en el inicio de estas actividades

ACTIVIDADES A REALIZAR

Para la próxima semana se continúan trabajos de Campo en el Tramo Reventones - Los Alpes con el área de Estructuras y Topografía – georreferenciación_(Actividad 22, 93).
Se realiza la logística para las actividades de la salida a campo de los Especialistas Ambiental, Social, Biólogo y Forestal._(Actividad 107, 108, 112, 113)
Inicio de estudio de hidrologia_(Actividad 85)
Salida a campo de los Especialistas Ambiental, Social, Biólogo, Forestal
Inicio de socialización y acompañamiento de trabajos de consultoría con la comunidad

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 5 Del: 14 de octubre de 2020 Al: 20 de octubre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias 35 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 19.44%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoria CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

REGISTRO FOTOGRAFICO

PAVIMENTOS





HIDRÁULICA





GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 5 Del: 14 de octubre de 2020 Al: 20 de octubre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias 35 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 19.44%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoria CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

Anexos

VIA | **VARIANTE COTA**

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020
Valor Inicial:	$ 349,440,605
Valor Actualizado:	$ 349,440,605
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


Interventor:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021

AVANCE DE CONSULTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA programada (%)	3.95%	9.47%
Valor de la CONSULTORIA programada:	$ 11,046,645	$ 26,462,290

	SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA Física Ejecutada (%)	1.94%	5.50%
Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 5,422,870	$ 15,378,172

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

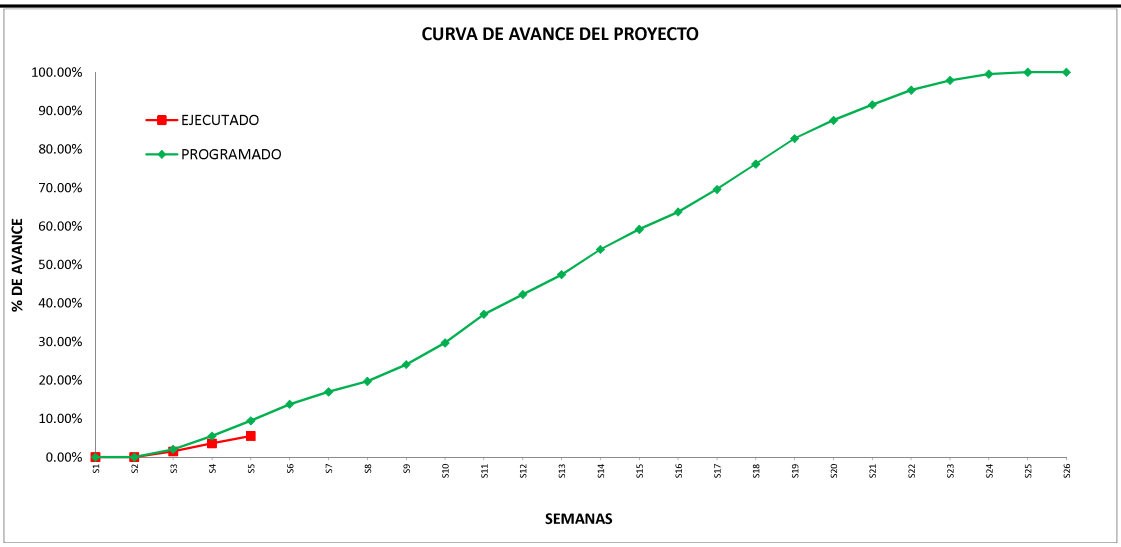

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza comité técnico presencial con el fin de establecer los lineamientos para la ejecución del proyecto Variante Cota._(Actividad 1).
Se solicita presentar oferta técnica y económica por actividades adicionales al contemplar segunda calzada en el corredor

Se realiza la entrega del Informe de revisión de la Topografía suministrada por el ICCU. _(Actividad 22)

Recopilación y análisis de Información Secundaria_(Actividad 12)

Est. Antecedentes y Geo. General_(Actividad 36)

Recopilación y análisis de Información Existente_(Actividad 75)

Recopilación y análisis Información existente_(Actividad 84)

Revisión de Información Secundaria_(Actividad 105)

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 5 Del: 14 de octubre de 2020 Al: 20 de octubre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias 35 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 19.44%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoria CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Existen algunos retrasos de las actividades de campo en espera de la aprobación por parte de la Interventoria de las metodologías y plan de campo. Una vez estos productos se encuentren aprobados se remitirá el plan de trabajo que mitigue los retrasos en el inicio de estas actividades

ACTIVIDADES A REALIZAR

A la espera de los lineamientos para la ejecución del proyecto Variante Cota._(Actividad 1)

REGISTRO FOTOGRAFICO

Anexos

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE CONSULTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	AUGUSTO AGUILAR FORERO	CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

* Formato de reporte y avance de actividades, tomado del manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías-INVIAS. Ministerio de Transporte. República de Colombia.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 6 Del: 21 de octubre de 2020 Al: 27 de octubre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 42 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 23.33%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoria CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA


ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - VÍA REVENTONES A LOS ALPES Y VÍA VARIANTE COTA

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S	**Interventor:**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020	Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Valor Inicial:	$ 842,543,975	Valor Inicial:	$ 531,944,650
Valor Actualizado:	$ 842,543,975	Valor Actualizado:	$ 531,944,650
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020	Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021	Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021

AVANCE DE CONSULTORIA GENERAL

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA programada (%)	3.98%	13.53%	CONSULTORIA Ejecutada (%)	2.06%	7.86%
Valor de la CONSULTORIA	$ 26,857,536	$ 91,228,137	Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 13,904,977	$ 52,945,710

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

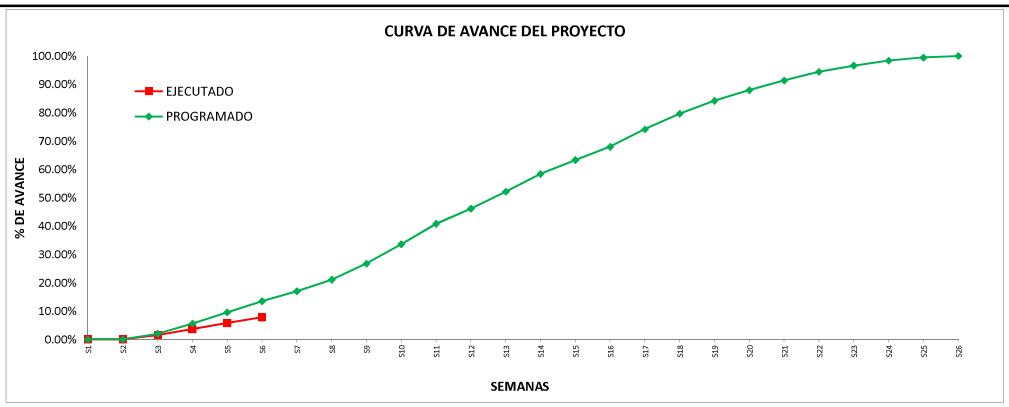

VIA REVENTONES - LOS ALPES

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S	**Interventor:**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020	Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Valor Inicial:	$ 493,103,370		
Valor Actualizado:	$ 493,103,370		
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020	Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021	Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 6 Del: 21 de octubre de 2020 Al: 27 de octubre de 2020


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 42 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 23.33%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoria CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

AVANCE DE CONSULTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA programada (%)	3,66%	13,30%	CONSULTORIA Física Ejecutada (%)	2,44%	8,52%
Valor de la CONSULTORIA	$ 14,441,950	$ 52,446,903	Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 9,610,131	$ 33,607,247

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

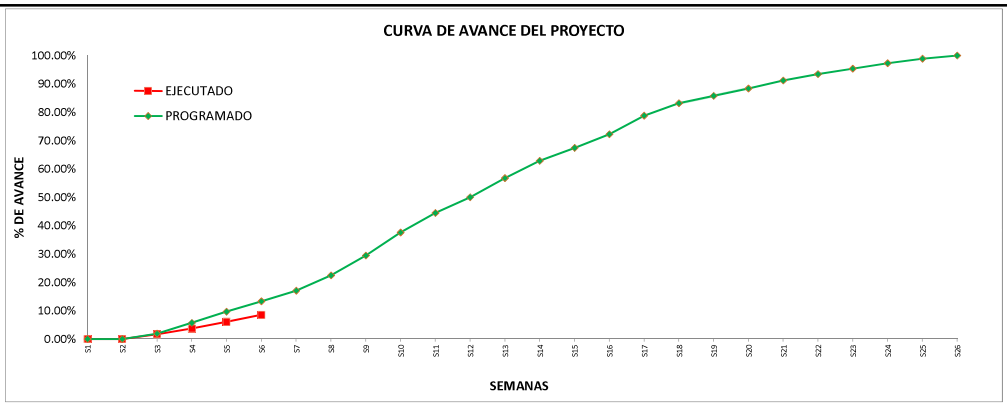

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza el cronograma para las actividades a realizar en el Tramo Reventones - Los Alpes con los Especialistas Ambiental, Social, Biólogo y Forestal._(Actividad 107, 108, 112, 113)
Se realiza solicitud de información a terceros específicamente para efectos de los trabajos del área Ambiental. _(Actividad 12, 74, 83, 104, 121) _(Actividad 12, 75, 84, 105, 121)
Se realizaron trabajos de campo con el área de Estructuras, específicamente Inspección de cunetas, muros de contención, gaviones, alcantarillas. _(Actividad 93)
Se realizan trabajos de campo en el Tramo Reventones - Los Alpes con el área de Topografía, específicamente materialización de mojones._(Actividad 22)

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Existen algunos retrasos de las actividades de campo en espera de la aprobación por parte de la Interventoría de las metodologías y plan de campo. Una vez estos productos se encuentren aprobados se remitirá el plan de trabajo que mitigue los retrasos en el inicio de estas actividades

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se programaron las actividades de la salida a campo de los Especialistas Ambiental, Social, Biólogo y Forestal._(Actividad 107, 108)
Se realizaran reuniones con líderes sociales e Inventario de predios._(Actividad 112, 113)
Se continúan los trabajos de campo en el Tramo Reventones - Los Alpes con el área de Topografía._(Actividad 22)

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 6 Del: 21 de octubre de 2020 Al: 27 de octubre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 42 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 23.33%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoria CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTRUCTURAS













GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 6 Del: 21 de octubre de 2020 Al: 27 de octubre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 42 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 23.33%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoria CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

Anexos

VIA	VARIANTE COTA

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020
Valor Inicial:	$ 349,440,605
Valor Actualizado:	$ 349,440,605
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


Interventor:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021

AVANCE DE CONSULTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA programada (%)	4.31%	13.77%
Valor de la CONSULTORIA programada:	$ 12,043,666	$ 38,505,957

	SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA Fisica Ejecutada (%)	1.69%	7.19%
Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 4,723,754	$ 20,101,926

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

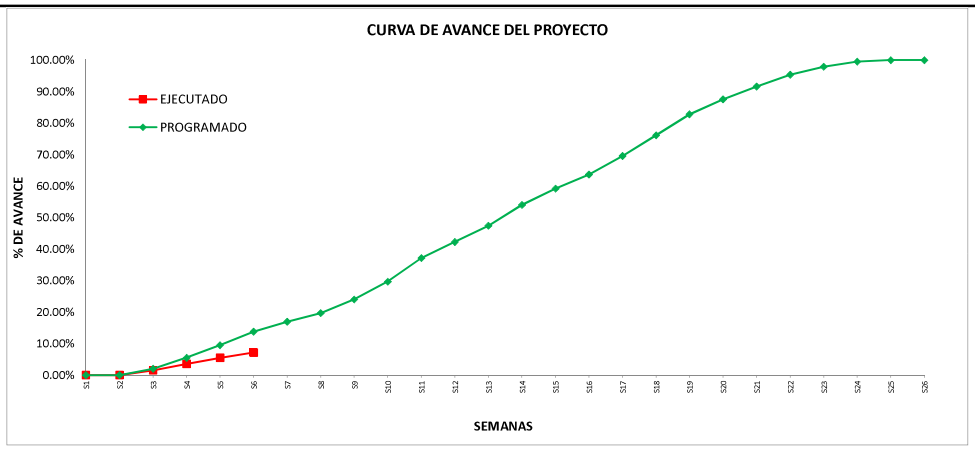

ACTIVIDADES REALIZADAS

Recopilación y análisis de Información Secundaria_(Actividad 12)
Est. Antecedentes y Geo. General_(Actividad 36)
Recopilación y análisis de Información Existente_(Actividad 75)
Recopilación y análisis Información existente_(Actividad 84)
Revisión de Información Secundaria_(Actividad 105)

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 6 Del: 21 de octubre de 2020 Al: 27 de octubre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 42 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 23.33%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoría CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Existen algunos retrasos de las actividades de campo en espera de la aprobación por parte de la Interventoría de las metodologías y plan de campo. Una vez estos productos se encuentren aprobados se remitirá el plan de trabajo que mitigue los retrasos en el inicio de estas actividades.
En atención a la solicitud realizada en comité de seguimiento, el 23 de octubre de 2020 se remite propuesta técnica y económica para ejecución de diseños de segunda calzada en la Variante Cota. A la fecha se está a la espera de la respuesta por parte de la Interventoría y de la Entidad.

ACTIVIDADES A REALIZAR

A la espera de los lineamientos para la ejecución del proyecto Variante Cota._(Actividad 1)

REGISTRO FOTOGRAFICO

Anexos

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE CONSULTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	AUGUSTO AGUILAR FORERO	CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

* Formato de reporte y avance de actividades, tomado del manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías-INVIAS. Ministerio de Transporte. República de Colombia.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 7 Del: 28 de octubre de 2020 Al: 3 de noviembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 49 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 27.22%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoría CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA


ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - VÍA REVENTONES A LOS ALPES Y VÍA VARIANTE COTA

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S	**Interventor:**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020	Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Valor Inicial:	$ 842,543,975	Valor Inicial:	$ 531,944,650
Valor Actualizado:	$ 842,543,975	Valor Actualizado:	$ 531,944,650
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020	Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021	Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021

AVANCE DE CONSULTORIA GENERAL

	SEMANAL	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
CONSULTORIA programada (%)	3.47%	17.01%	CONSULTORIA Ejecutada (%)	2.03%	9.88%
Valor de la CONSULTORIA	$ 23,408,022	$ 114,636,159	Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 13,676,756	$ 66,622,466

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

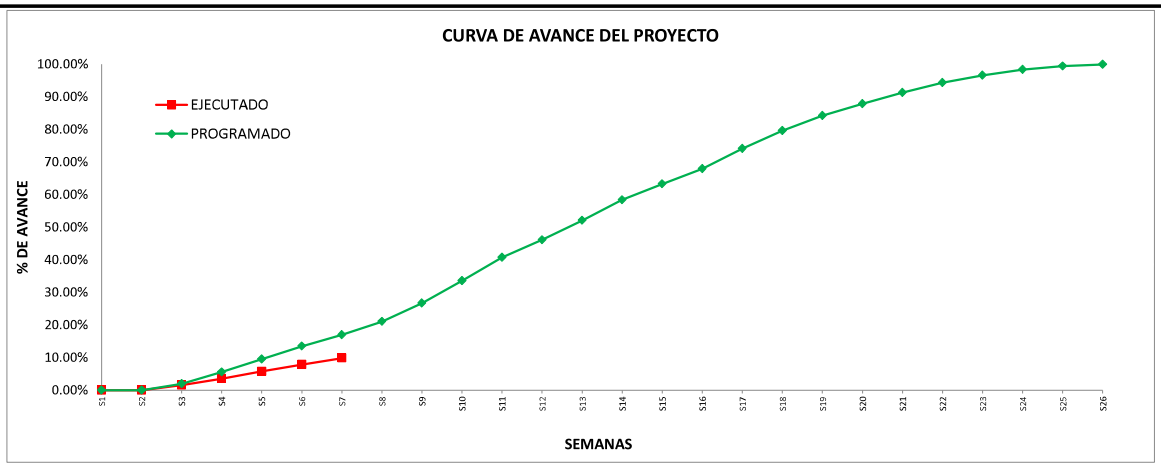

VIA	**REVENTONES - LOS ALPES**

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S	**Interventor:**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020	Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Valor Inicial:	$ 493,103,370		
Valor Actualizado:	$ 493,103,370		
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020	Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021	Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 7 Del: 28 de octubre de 2020 Al: 3 de noviembre de 2020


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 49 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 27.22%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoría CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

AVANCE DE CONSULTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA programada (%)	3.77%	17.06%	CONSULTORIA Física Ejecutada (%)	3.63%	12.15%
Valor de la CONSULTORIA	$ 14,864,572	$ 67,311,474	Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 14,321,096	$ 47,928,343

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

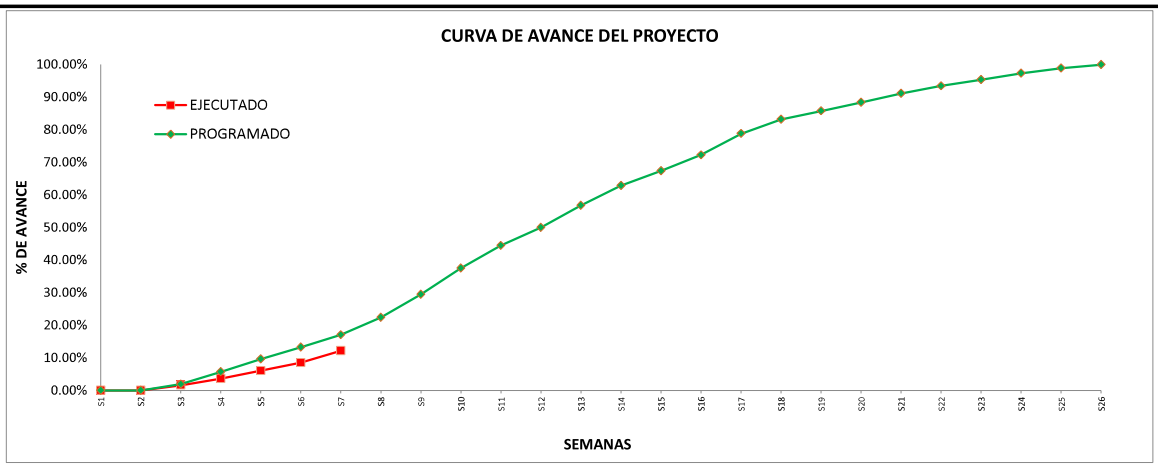

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la logística para las actividades de trabajos de campo - Aforos_(Actividad 13)
Trabajos de campo - Levantamiento topográfico Corredor_(Actividad 22)
Procesamiento de trabajos de Topografía_(Actividad 23)
Se realiza la logística para las actividades de la salida a campo, campaña Geotécnica Taludes,Inest_(Actividad 54)
Se realiza la logística para las actividades de la salida a campo, campaña Geotécnica Pavimentos_(Actividad 64)
Se continuan trabajos del Estudio Hidrología_(Actividad 85)
Se continuan trabajos del Chequeo Técnico Estructuras Existentes_(Actividad 94)
Actividades de campo - Ambiental_(Actividad 108)
Socialización y Acompañamiento de Trabajos de Consultoría con la comunidad y Alcal_(Actividad 112)
En atención a la solicitud de interventoría se remiten fichas técnicas de los sitios inestables para aprobación de campaña de exploración geotécnica

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Existen algunos retrasos de las actividades de campo, especialmente lo relacionado con la exploración geotécnica y la cual se encuentra condicionada a la aprobación por parte de Interventoría.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Trabajos de campo - Aforos_(Actividad 13)
Procesamiento Aforos_(Actividad 14)
Trabajos de campo - Levantamiento topográfico Corredor_(Actividad 22)
Procesamiento de trabajos de Topografía_(Actividad 23)
Campaña Geotécnica_(Actividad 44)
Campaña Geotécnica Taludes,Inest_(Actividad 54)
Campaña Geotécnica Pavimentos_(Actividad 64)
Estudio Hidrología_(Actividad 85)
Análisis y Diseño Hidráulico de Estructuras_(Actividad 86)
Chequeo Técnico Estructuras Existentes_(Actividad 94)
Procesamiento Actividades de Campo_(Actividad 110)

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA


Semana Número: 7 Del: 28 de octubre de 2020 Al: 3 de noviembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 49 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 27.22%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoría CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

REGISTRO FOTOGRAFICO

AMBIENTAL - FLORA - FAUNA

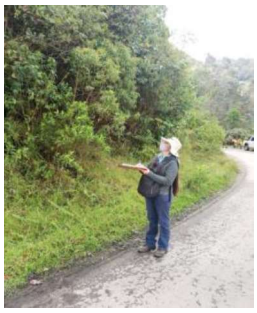



SOCIAL









GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número:	7	Del:	28 de octubre de 2020	Al:	3 de noviembre de 2020
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	49	Plazo total: 6 MESES	% de tiempo transcurrido: 27.22%
Nombre del Supervisor	JUAN VILLAMIL			Nombre del Director Interventoría	CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

Anexos


VIA	VARIANTE COTA

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S	**Interventor:**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020	Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Valor Inicial:	$ 349,440,605		
Valor Actualizado:	$ 349,440,605		
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020	Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021	Fecha de Vencimiento:	15 de marzo de 2021

AVANCE DE CONSULTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA programada (%)	3.18%	16.95%	CONSULTORIA Física Ejecutada (%)	0.43%	7.62%
Valor de la CONSULTORIA programada:	$ 8,882,838	$ 47,388,794	Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 1,195,994	$ 21,297,920

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

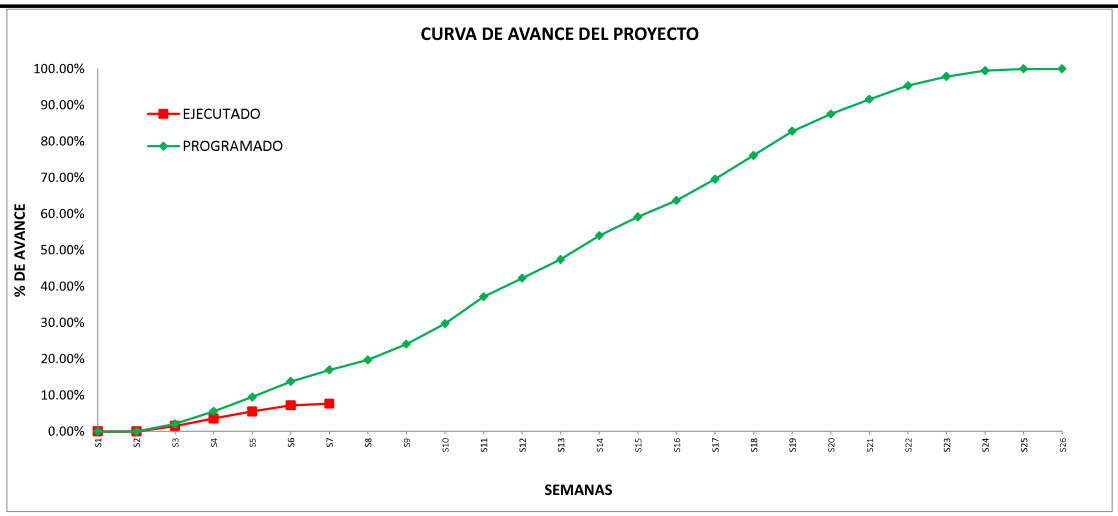

ACTIVIDADES REALIZADAS

Est. Antecedentes y Geo. General_(Actividad 36)
Recopilación y análisis de Información Existente_(Actividad 75)
Recopilación y análisis Información existente_(Actividad 84)

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 7 Del: 28 de octubre de 2020 Al: 3 de noviembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 49 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 27.22%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoría CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Existen algunos retrasos de las actividades de campo en espera de la aprobación por parte de la Interventoría de las metodologías y plan de campo. Una vez estos productos se encuentren aprobados se remitirá el plan de trabajo que mitigue los retrasos en el inicio de estas actividades.
En atención a la solicitud realizada en comité de seguimiento, el 23 de octubre de 2020 se remite propuesta técnica y económica para ejecución de diseños de segunda calzada en la Variante Cota de la cual se recibe respuesta el 30 de Octubre. En atención a la solicitud realizada en comité del 3/11/2020 se presentarán los sustentos correspondientes para la solicitud de los recursos requeridos

ACTIVIDADES A REALIZAR

A la espera de los lineamientos para la ejecución del proyecto Variante Cota._(Actividad 1)

REGISTRO FOTOGRAFICO

Anexos

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE CONSULTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	AUGUSTO AGUILAR FORERO	CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

* Formato de reporte y avance de actividades, tomado del manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías-INVIAS. Ministerio de Transporte. República de Colombia.
