GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 13 Del: 2 de Enero de 2021 Al: 8 de Enero de 2021

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 115 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 54,76%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoría CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA


ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - VÍA REVENTONES A LOS ALPES Y VÍA VARIANTE COTA

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S	**Interventor:**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020	Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Valor Inicial:	$ 842.543.975	Valor Inicial:	$ 531.944.650
Valor Actualizado:	$ 842.543.975	Valor Actualizado:	$ 531.944.650
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de Septiembre de 2020	Fecha de Iniciación:	16 de Septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	14 de Abril de 2021	Fecha de Vencimiento:	14 de Abril de 2021

AVANCE DE CONSULTORIA GENERAL

	SEMANAL	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
CONSULTORIA programada (%)	5,18%	42,81%	CONSULTORIA Ejecutada (%)	4,29%	21,24%
Valor de la CONSULTORIA	$ 34.892.753	$ 288.539.024	Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 28.921.636	$ 143.192.553

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

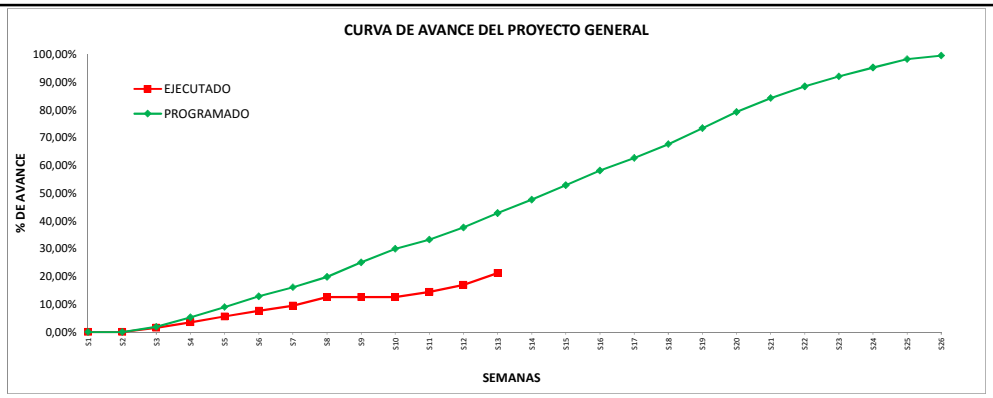

VIA	**REVENTONES - LOS ALPES**

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S	**Interventor:**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020	Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Valor Inicial:	$ 493.103.370		
Valor Actualizado:	$ 493.103.370		
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de Septiembre de 2020	Fecha de Iniciación:	16 de Septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	14 de Abril de 2021	Fecha de Vencimiento:	14 de Abril de 2021

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 13 Del: 2 de Enero de 2021 Al: 8 de Enero de 2021


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 115 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 54,76%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoría CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

AVANCE DE CONSULTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA programada (%)	5,17%	44,70%	CONSULTORIA Física Ejecutada (%)	8,58%	34,87%
Valor de la CONSULTORIA	$ 20.388.290	$ 176.338.226	Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 33.853.084	$ 137.554.450

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

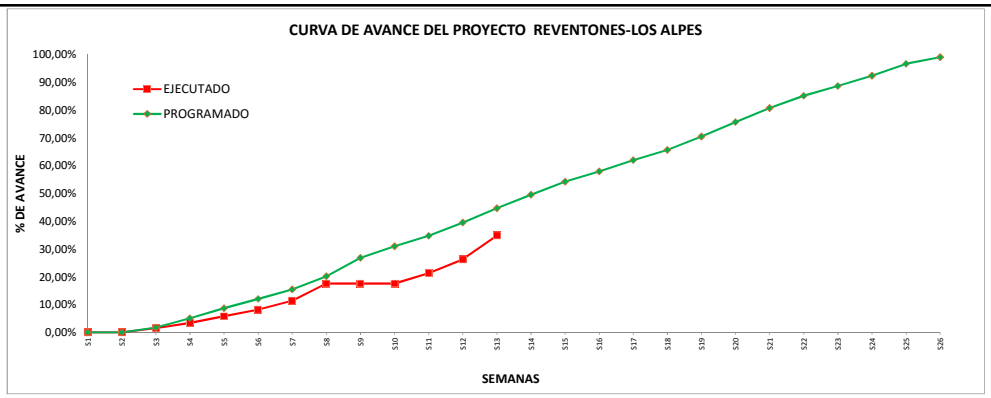

ACTIVIDADES REALIZADAS

Elaboración Informe Final Volumen I - Fase III_(Actividad 16)
Trabajos de campo - Levantamiento topográfico Corredor_(Actividad 22)
Procesamiento de trabajos de Topografía_(Actividad 23)
Campaña Geotécnica_(Actividad 44)
Ensayos de Laboratorio_(Actividad 45)
Campaña Geotécnica Taludes,Inest_(Actividad 54)
Ensayos de Laboratorio_(Actividad 55)
Campaña Geotécnica Pavimentos_(Actividad 64)
Ensayos de Laboratorio_(Actividad 65)
Chequeo Técnico Estructuras Existentes_(Actividad 94)
Socialización y Acompañamiento de Trabajos de Consultoría con la comunidad y Alcal_(Actividad 112)

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Existen algunos retrasos de las actividades de campo, especialmente lo relacionado con la exploración geotécnica cuyo inicio se realizó luego de la visita conjunta entre pares especialistas de geotecnia de la Consultoría e Interventoría en donde en campo y directamente sobre los sitios de interés se confirmó el respectivo plan de exploración.

Se continúan actividades de campo de las comisiones de Topografía y Geotecnia en el tramo vía Reventones - Los Alpes.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Elaboración Informe Final Volumen I - Fase III_(Actividad 16)
Trabajos de campo - Levantamiento topográfico Corredor_(Actividad 22)
Procesamiento de trabajos de Topografía_(Actividad 23)
Campaña Geotécnica_(Actividad 44)
Ensayos de Laboratorio_(Actividad 45)
Campaña Geotécnica Taludes,Inest_(Actividad 54)
Ensayos de Laboratorio_(Actividad 55)
Campaña Geotécnica Pavimentos_(Actividad 64)
Ensayos de Laboratorio_(Actividad 65)
Caracterización Fuentes _(Actividad 75)
Chequeo Técnico Estructuras Existentes_(Actividad 94)
Socialización y Acompañamiento de Trabajos de Consultoría con la comunidad y Alcal_(Actividad 112)

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 13 Del: 2 de Enero de 2021 Al: 8 de Enero de 2021

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 115 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 54,76%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoria CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

REGISTRO FOTOGRAFICO

TOPOGRAFIA







GEOTECNIA







GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 13 Del: 2 de Enero de 2021 Al: 8 de Enero de 2021

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 115 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 54,76%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoría CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

Anexos

VIA	VARIANTE COTA

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista:	HMV CONSULTORIA S.A.S
Contrato No.	ICCU 059 DE 2020
Valor Inicial:	$ 349.440.605
Valor Actualizado:	$ 349.440.605
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de Septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	14 de Abril de 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


Interventor:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato No.	ICCU-082 DE 2020
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	16 de Septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento:	14 de Abril de 2021

AVANCE DE CONSULTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA programada (%)	5,19%	40,91%
Valor de la CONSULTORIA programada:	$ 14.494.884	$ 114.376.911

	SEMANAL	ACUMULADO
CONSULTORIA Física Ejecutada (%)	0,00%	7,62%
Valor de la CONSULTORIA Ejecutada:	$ 0	$ 21.297.920

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

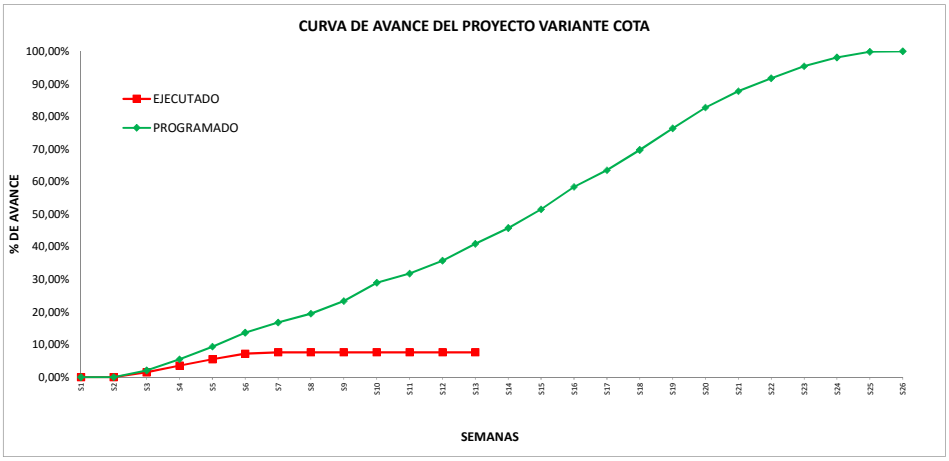

ACTIVIDADES REALIZADAS

A la fecha el proyecto se encuentra a la espera de los lineamientos para la ejecución del proyecto Variante Cota._(Actividad 1)
Esta consultoría se encuentra a la espera de respuesta de la entidad contratante a la comunicación HMV 3340-055 con fecha de 17 de diciembre 2020, sobre la revisión a la propuesta económica para la posible ejecución de la segunda calzada en el tramo vía variante cota y así poder iniciar con los trabajos programados para este tramo del contrato.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CONTRATO ICCU-059 DE 2020

INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA

Semana Número: 13 Del: 2 de Enero de 2021 Al: 8 de Enero de 2021

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 115 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 54,76%

Nombre del Supervisor JUAN VILLAMIL Nombre del Director Interventoría CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

En atención a la solicitud realizada en comité de seguimiento, el 23 de octubre de 2020 se remite propuesta técnica y económica para ejecución de diseños de segunda calzada en la Variante Cota de la cual se recibe respuesta el 30 de Octubre. En atención a la solicitud realizada en comité del 3/11/2020 se presentaron los sustentos correspondientes para la solicitud de los recursos requeridos con la comunicación HMV 3340-051. Adicionalmente en las comunicaciones HMV 3340-054 y HMV 3340-055 se ha reiterado el compromiso con la entidad para dar cumplimiento a lo contratado y no seguir generando impactos negativos y los sobrecostos proyectados inicialmentea por esta consultoría.

Luego de dos suspensiones al contrato, mesas de trabajo realizadas y comunicaciones sin respuesta, a la fecha la consultoría se encuentra a la espera de respuesta y aval para dar continuidad a las actividades programadas.

ACTIVIDADES A REALIZAR

A la fecha el proyecto se encuentra a la espera de los lineamientos para la ejecución del proyecto Variante Cota._(Actividad 1) y reprogramar el cronograma de ejecución de las actividades

REGISTRO FOTOGRAFICO

Anexos

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE CONSULTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	AUGUSTO AGUILAR FORERO	CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

* Formato de reporte y avance de actividades, tomado del manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías-INVIAS. Ministerio de Transporte. República de Colombia.
