	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 9 (Día) / 8 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA PICHUNA -NAZARET — TRAMO Y/O SECTOR(S): PICHUNA - NAZARET(K0 +000 AL K5+700)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LETICIA -AMAZONAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 9 del 2/08/2021 al 8/08/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. CAROL KATHERINE VAZQUEZ PINTO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARETH-MUNICIPIO DE LETICIA, (DEPARTAMENTO DE AMAZONAS) "PROGRAMA COLOMBIA RURAL" — FECHA DE INICIO: 3/02/2021

KM A MEJORAR: 0,438 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: 0.357 — No. PUENTES: — OTROS: 1 BOX COULVERT

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL R&R SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO CAC		
INTEGRANTES:	R/L CAMILO ALBERTO RODRIGUEZ ESTUPIÑAN			INTEGRANTES:	ANA ISABEL HENDE CARREÑO Con un porcentaje de participación del 50% Y CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ Con un porcentaje de participación del 50%		
CONTRATO No.	528 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 538.192.814,40	CONTRATO No.	1523 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 107.044.711,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (04) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 538.192.814,40	PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES Y VEINTIDOS(22) DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 107.044.711,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021		
RECURSOS POR VIGENCIA			$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ 8.180.173,49	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 538.192.814,40
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10.956.197,13
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.180.173,49
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.180.173,49

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO:

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X


MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	ACUMULADO PROYECTO TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	1	1
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):		
KM MANTENIDOS (Km):	0,438	0,438
KM BASE/SUBBASE (Km)		
KM PAVIMENTADOS (Km)		
BOXCULVERT (Un)	1	1
OTROS		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: k9+800 - k12+680

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (EXPLOTACION DE MATERIAL)	SI	NO	N/A	x

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EJECUCION

OBSERVACIONES:
NINGUNA, SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

V. GESTION PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
NO APLICA LA GESTION PREDIAL EN EL PRESENTE CONTRATO.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 8 # 7-58 Leticia

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con los ajustes a los estudios y diseños de acuerdo a las observaciones presentadas por la interventoria.

El día Martes 03 de julio de 2021 se realizó un comité de obra virtual con el objeto de dar seguimiento al contrato 528 de 2020 donde participaron La, ING CAMILA ALEXANDRA MARTINEZ CRISTANCHO profesional de apoyo a la supervisión INVIAS, ARQ VICTOR JULIO SEGURA RUIZ supervisor contrato de obra alcaldía de Alcaldía, EL ARQ CAMILO ALBERTO RODRIGUEZ ESTUPIÑAN R/L CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL R&R SAS, el ING EDER ALEXANDER OLIVERO profesional de apoyo a la supervisión Municipio de Leticia , EL ING CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ R/L INTERVENTORIA , LA ING ANA ISABEL HENDE CARREÑO DIRECTORA DE INTERVENTORIA Y EL ING. CARLOS EDUARDO VELASCO VILLARREAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

El día martes 03 de julio de 2021 una vez que el contratista subsano las observaciones presentadas por la interventoría en cuanto a lo que tiene que ver con el plan de inversión del anticipo este fue aprobado.

El día martes 03 de julio de 2021 se realizaron las Actas de Vecindad.

El día Sábado 07 de agosto de 2021 se instalo de un punto de lavado de manos para iniciar con la implantación del protocoló de Bioseguridad.

El día Sábado 07 de agosto de 2021 se instalo la Valla Informativa.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciara los trabajos preliminares de demolición de las cintas de las placa huellas y la limpieza de las obras de drenaje.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 1

PR 9+800 — PR 12+680

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

	FECHA	9 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO




03/08/2021. Acta de vecindad predio del señor Omar Hoyos



03/08/2021. Acta de vecindad predio del señor Fernando Niño



03/08/2021. Acta de vecindad predio del señor Arley Arango

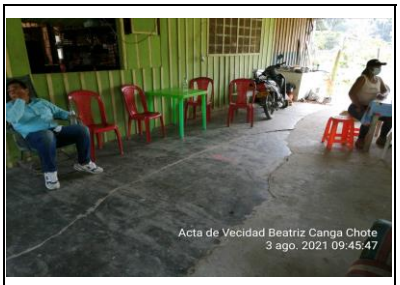

03/08/2021. Acta de vecindad predio de la señora Beatriz Canga Chote.



COMITÉ DE OBRA VIRTUAL 03/08/2021 OFICINA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPIO DE LETICIA.



07/08/2021. instalación del punto de lavado de manos para Implementación del Protocolo de Bioseguridad.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Solicitud al Contratista de la entrega de la información para el control de la ejecución de la obra mediante oficios	
Comunicar al Supervisor del contrato las dudas sobre tramites, documentación y ejecución de las actividades dando al Contratista una solución y respuesta oportunas.	
Revisar en los plazos establecidos la documentación que radique el Contratista.	FIRMA
Apoyo técnico en las actividades que ejecute el Contratista	NOMBRE: ANA ISABEL HENDE CARREÑO
	No. MAT: 25202-084564 CND
