Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

Informe Final de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 - CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021 de 2021-02-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

Yopal, 02 de Septiembre del 2021.

Doctor(a)
BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTOR(A) TECNICO DE CONSTRUCCIONES
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 - CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021 de 2021-02-24.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 26/06/2021 hasta 25/07/2021.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (5) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2021-02-26

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2021-07-25

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-07-25

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $25.132.800,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $25.132.800,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 25/07/2021, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 presenta una ejecución del 100% contra una programada del 100%.

Informe Final de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 - CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021 de 2021-02-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$25.132.800,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$25.132.800,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 2	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 3	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 4	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
PRESENTE INFORME	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$25.132.800,00	$0,00	$25.132.800,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: $5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1 Realizar la revisión y verificación de las especificaciones técnicas de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE

2. Realizar evaluación en campo y cuantificación de cantidades en planos y memorias de cálculo de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

3. Realizar visitas técnicas a los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

4. Conceptualizar sobre el análisis de todas las acciones técnicas desarrolladas en vigencia de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

5. Participar en los comités técnicos que adelante el Supervisor a los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE

Informe Final de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 - CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021 de 2021-02-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

6. Las demás que considere el supervisor que sean inherentes al objeto contractual.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
1. Realizar la revisión y verificación de las especificaciones técnicas de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. ACTIVIDAD PERMANENTE	100	3.1
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Se revisó las especificaciones tecnicas concernientes al Acta de Reinicio No 2 del 21 de julio de 2021 y a la Prorroga No 3 de fecha 22 de julio de 2021 por un plazop de 4 meses del contrato de obra No 2225 de 2019 y el Acta de Reinicio No 2 de fecha 21 de jullio del contrato de consultoria 2153 de 2019 se esta tramitando la prorroga No 3 de la consultoria.	100	3.1
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. El 07 de julio de 2021 se suscribio el Acta de Recibo final del contrato de obra No 2691 de 2017 y la Entrega Institucional al Municipio de Tauramena.	100	3.1
2. Realizar evaluación en campo y cuantificación de cantidades en planos y memorias de cálculo de los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACION AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. ACTIVIDAD PERMANENTE	100	3.2
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Se esperó recibir las correcciones definitivas de la Parcial de obra No 1 para hacer la revision respectiva en campo.aluación en campo el dia 04 de mayo de 2021, de acuerdo con la planimetria del diseño y las memorias de calculo.	100	3.2
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. Se realizo verificacion en campo con el Almacen Departamental y Municipal para la entrega institucional.	100	3.2
3. Realizar visitas técnicas a los proyectos de inversión CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA y proyecto de inversión ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, derivados del SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE. ACTIVIDAD PERMANENTE.	100	3.3

F. OBSERVACIONES:

Informe Final de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0385 - CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021 de 2021-02-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCEPTUALIZAR SOBRE EL ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE.

Atentamente,

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

BRENDA RORAIMA BARRERA
Supervisor(a)

V.°B.°:

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

FO-AB-55
21-02-2014
V.01

El presente Informe corresponde al periodo de veintiseis (26) de junio al veinticinco (25) de julio del año 2021

1. DATOS GENERALES CONTRATO PSP No No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021-Y NUMERO INTERNO 0385 DE 2021

Información del Contrato	PSP No. 0385 DE 2021	Plazo Inicial	Cinco (5) meses
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Plazo actual	Cinco (5) meses
Objeto Contractual	Realizar la revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el ánalisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.	Fecha suscripción del contrato	24/02/2021
Valor Contractual	$ 25.132.800,00	Fecha Acta de Inicio	26/02/2021
Valor Inicial	$ 25.132.800,00	Fecha de Terminación inicial	25/07/2021
Aporte Dpto.	$ 25.132.800,00	Fecha Actual de Terminación	25/07/2021
Aporte Ejecutor	$ -		
Valor Adicional	$ -		
Valor Final	$ 25.132.800,00	Estado actual del contrato	En ejecución

2. DATOS TECNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☐	RED ALC. SAN / PLUV		ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	PUENTE / ALC / BOX		UN
☐	INFRAESTRUCTURA		SEDE
☐	INTERVENTORIA		UN
☑	OTRO. CUAL?		
	Profesional Contratado	1	UN

RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL

el objeto del proyecto es: Realizar la revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el ánalisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.

DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:

Revision y verificacón y conceptualización proyectos de inversion del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. ACTA DE INICIO	26/02/2021	5 MESES		
2.				

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

		DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE	Contratante	
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Contratista:	
Rep. Legal:		Rep. Legal:	
Contrato No.	0385-2021	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 25.132.800,00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo (0%):	$ -	Valor Anticipo (%):	
Valor Adicionado:	$ -	Valor Adicionado:	
Valor Total:	$ 25.132.800,00	Valor Total:	
Valor Ejecutado:	$ 25.132.800,00	Valor Ejecutado:	
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	
Prorrogas:	N/A	Prorrogas:	
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	
Suspensiones:	N/A	Suspensiones:	
Fecha de Iniciación:	VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE 2021	Fecha de Iniciación:	
Terminación Inicial:	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2021	Terminación Inicial:	
Terminación Actual:	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2021	Terminación Actual:	
Estado Actual Contrato:	EN EJECUCION	Estado Actual Contrato:	

5. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DEL SECTORIAL EQUIPAMIENTO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 2153 DE 2019-11-25 según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
5.1. ACTA DE INICIO	24/01/2020	7 MESES		

5.2.	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	30/06/2020	2 MESES		*CAUSAS DE SUSPENSION:* SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No 2225 de 2019
5.3.	ACTA DE REINICIO No 1	31/08/2020			
5.4	ACTA PARCIAL No 1	2/10/2020		$ 29.471.186	PAGO ETAPA PRECONSTRUCTIVA
5.5.	PRORROGA No 1	23/10/2020	2 MESES Y 5 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA:* CONTINUAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019
5.6.	PRORROGA No 2	22/12/2020	4 MESES Y 15 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA:* CONTINUAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019
5.7.	ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	7/05/2021	45 DIAS		CAUSAS DE SUSPENSION: SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No 2225 de 2019
5.8.	ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2	18/06/2021	1 MES		CAUSAS DE AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2: AMPLIACION A LA SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No 2225 de 2019
5.9.	ACTA DE REINICIO No 2	21/07/2021			

6. INFORMACION DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 2153 DE 2019, según el caso si aplica.

Tipo de Proceso	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No Proceso	CAS-OPAJ-CMA-033-2019
Tipo de Contrato	CONSULTORIA
Fuentes Financiación:	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
Codigo BPIN:	20180005850005
Registro Presupuestal:	192153 - 02/12/2019 - $ 521,170,434 212153 - 09/03/2021 - $ 491,699,248
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO PLAZA DE MERCADO 2019
Nit No:	901342294-4
Rep. Legal:	DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
Cedula No:	9.431.291 DE YOPAL
Contrato No.	2153 DE 2019-11-25
Objeto:	Interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica a la construcción del Centro de Comercialización Agroempresarial en el Municipio de Villanueva.
Valor Inicial:	$ 521.170.434,00
Valor Anticipo (0 %):	$ -
Valor Adicionado:	$ -
Valor Total:	$ 521.170.434,00
Valor Ejecutado:	$ 29.471.186,00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Prorrogas:	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Plazo Actualizado:	TRECE (13) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Suspensiones:	SIETE (7) MAYO DE 2021
Tiempo Suspensión:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2020
Terminación Inicial:	VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Reiniciación:	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2021
Terminación Actual:	VEINTESIETE (27) DE JULIO DE 2021
Estado Actual Contrato:	EJECUCIÓN

CAS-OPAJ-CMA-033-2019

7. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
7.1. ACTA DE INICIO	12/03/2020	6 MESES		
7.2. ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	30/06/2020	2 MESES		*CAUSAS DE SUSPENSION:* COVID-19, TRABAJOS EN VIA TRONCAL DEL LLANO, CARENCIA DE FORMALETA EN LA REGION.
7.3. ACTA DE REINICIO No 1	31/08/2020			

7.4. PRORROGA No 1	11/11/2020	1 MES Y 15 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA:* COVID-19, TRANCONES EN LA VIA MARGINAL DEL LLANO, CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AEREAS Y LOSAS AEREAS Y NO DAN LOS TIEMPOS DEL FRAGUADO.
7.5. PRORROGA No 2	22/12/2020	4 MESES Y 15 DIAS		*CAUSAS DE LA PRORROGA:* INCONVENIENTES DE TIPO LOGISTICO QUE HAN GENERADO RETRASOS Y DEMORAS, DEMORA EN ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS POR PARTE DE LAS FERRETERIAS, DISPONIBILIDAD DE FORMALETA DE ENTREPISO.
7.6. ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1	4/01/2021			SE INCORPORARON AL PROYECTO 23 NUEVOS ITEMS NO PREVISTOS.
7.7. ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 1	11/01/2021			SE INCORPORARON LOS ITEMS NUEVOS Y SE BALANCEO EL CONTRATO
7.8. OTROSÍ MODIFICATORIO No 1	9/03/2021			
7.9. ACTA DE SUSPENSION No 2	7/05/2021	45 DIAS		*CAUSAS DE SUSPENSION:* ESCASEZ DE MATERIALES Y TIEMPOS DE ENTREGA, MATERIAL PETREO, PARO NACIONAL
7.10. ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2	18/06/2021	1 MES		*CAUSAS DE AMPLIACION A LA SUSPENSION:* ESCASEZ DE MATERIALES Y TIEMPOS DE ENTREGA, MATERIAL PETREO, INICIO DE OTROS FRENTES DE TRABAJO (EN GENERAL NO SEAN SUPERAO LAS CAUSALES QUE MOTIVARON LA SUSPENSION No 2).
7.11. ACTA DE REINICIO No 2	21/07/2021			
7.12. PRORROGA No 3	22/07/2021	4 MESES		*CAUSAS DE LA PRORROGA:* BAJO RENDIMIENTO A CAUSA DE LA PANDEMIA, ESCASEZ DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIAL PETREO, CONSECUENCIAS DEL PARO NACIONAL HUBO PROBLEMAS EN MOVILIDAD Y ACCESO A LA OBRA.

8. INFORMACION DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE OBRA No 2225 DE 2019-12-11, según el caso si aplica.

Tipo de Proceso	LICITACIÓN OBRA PÚBLICA
No Proceso	CAS-OAJ-LP-034-2019
Tipo de Contrato	OBRA
Fuentes Financiación:	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
Codigo BPIN:	2018005850005
Registro Presupuestal:	192225 13/12/2019 $ 6,340,387,359 212225 09/03/2021 $ 3,170,193,679
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO AGROCENTRO VILLANUEVA
Nit No:	901347418-3
Rep. Legal:	ANDRES HERLIMAN TRIANA BLANCO
Cedula No:	74,857,606 de Yopal
Contrato No.	2225 DE 2019
Objeto:	Construcción del Centro de Comercialización Agroempresarial en el Municipio de Villanueva.
Valor Inicial:	$ 6.340.387.359,00
Valor Anticipo (50 %):	$ 3.170.193.679,50
Valor Adicionado:	$ -
Valor Total:	$ 6.340.387.359,00
Valor Ejecutado:	$ -
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Prorrogas:	DIEZ (10) MESES
Plazo Actualizado:	DIECISEIS (16) MESES
Suspensiones:	SIETE (7) DE MAYO DE 2021
Tiempo Suspensión:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	12 DE MARZO DE 2020
Terminación Inicial:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Fecha de Reiniciación:	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2021
Terminación Actual:	VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2021
Estado Actual Contrato:	EJECUCION

CAS-OAJ-LP-034-2019

9.PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA			
% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA :	37,44%	% PROGRAMACION OBRA:	99,33%

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Durante el periodo 26 de junio al 25 de julio de 2021 se llevo a cabo por parte del profesional contratado las siguientes actividades:


El dia 21 de julio de 2021 se suscribio el Acta de reinicio No 2 del contrato de obra No 2225 de 2019 y del contrato de consultoria No 2153 de 2019, estó debido a que se han solucionado las causales que ocasionaron la Suspension No 2 y la Ampliacion No 1 a la suspension No 2, cuyas causas que las motivaron fueron las siguientes: ***escasez de materiales y tiempos de entrega:*** ya que las ferreterias no pueden dar cumplimiento con las entregas de los pedidos. ***Material Petreo:*** las graveras con las que cuenta la obra para materiales como arenas, triturados, base, sub base entre otros. ***Inicio de otros frentes de trabajo:*** debido a que los frentes de trabajo requieren para sus actividades material petreo no es posible tener frentes en otras actividades.
la suspension No 2 duro 2 meses y quince (15) dias.

el contrato de obra se reinicio el 21 de julio de 2021, estableciendo la nueva fecha de terminación el 25 de julio de 2021, tiempo insuficiente para ejecutar 61,89% de obra faltante por tal razon se suscribio el dia 22 de julio de 2021 la Prorroga No 3 por un tiempo de 4 meses. el contratista de obra hizo entrega del plan de contingencia que fue avalado por la interventoria y en el cual con una programación rigida se estima llevar a cabo la ejecucion del proyecto.

se esta tramitando la prorroga del contrato de consultoria No 2153 de 2019 para que continue llevando a cabo el seguimiento y control a la obra.







11. REGISTRO FOTOGRÁFICO (Estado en el que quedaron las estructuras ejecutadas) (DESCRIPCION).



Foto 1 vista panoramica plaza



Foto 2 Vista panoramica Plaza muros, vigas y pisos



Foto 3 vista panoramica plaza



Foto 4 Vista panoramica Plaza muros, vigas y pisos

12. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☐ NO ☐
CUALES? : _____
HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐

CAUSALES?: _____

SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☐ NO ☐
PORQUE? la obra esta en ejecución
REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐
PORQUE?

11. OBSERVACIONES

EL CONTRATO DE OBRA Y DE CONSULTORIA ESTAN EN EJECUCIÓN.

12. FIRMAS

ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
APOYO A LA SUPERVISION
C.P.S Nro. 0385-2021

Vo.Bo. SUPERVISOR
BRENDA RORAIMA BARRERA
Directora Técnica de Construcciones

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

FO-AB-55
21-02-2014
V.01

El presente Informe corresponde al periodo de veintiseis (26) de junio al veinticinco (25) de julio del año 2021

1. DATOS GENERALES CONTRATO PSP No No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0247-2021-Y NUMERO INTERNO 0385 DE 2021

Información del Contrato	PSP No. 0385 DE 2021	Plazo Inicial	Cinco (5) meses
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Plazo actual	Cinco (5) meses
Objeto Contractual	Realizar la revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el ánalisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.	Fecha suscripción del contrato	24/02/2021
Valor Contractual	$ 25.132.800,00	Fecha Acta de Inicio	26/02/2021
Valor Inicial	$ 25.132.800,00	Fecha de Terminación inicial	25/07/2021
Aporte Dpto.	$ 25.132.800,00	Fecha Actual de Terminación	25/07/2021
Aporte Ejecutor	$ -	Estado actual del contrato	En ejecución
Valor Adicional	$ -		
Valor Final	$ 25.132.800,00		

2. DATOS TÉCNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:			RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL
☐	RED DE ACUEDUCTO	ML	el objeto del proyecto es: Realizar la revisión, verificación, evaluación y conceptualizar sobre el ánalisis
☐	RED ALC. SAN / PLUV	ML	de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la vigencia de los proyectos de inversión del sectorial
☐	PTAP / PTAR	UN	de fortalecimiento de los equipamientos municipales y departamental en Casanare.
☐	POZOS PROFUNDOS	ML	
☐	VIA URB / SEC / TERC	KM	
☐	PUENTE / ALC / BOX	UN	DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:
☐	INFRAESTRUCTUR	SEDE	Revision y verificacón y conceptualización proyectos de inversion del sectorial de fortalecimiento de los
☐	INTERVENTORIA	UN	equipamientos municipales y departamental en Casanare
☑	OTRO. CUAL?		
	Profesional Contrata	1 UN	

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. ACTA DE INICIO	26/02/2021	5 MESES		
2.				

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

		DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE	Contratante	
Contratista o Ejecutor	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	Contratista:	
Rep. Legal:		Rep. Legal:	
Contrato No.	0385-2021	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 25.132.800,00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo (0%):	$ -	Valor Anticipo (%):	
Valor Adicionado:	$ -	Valor Adicionado:	
Valor Total:	$ 25.132.800,00	Valor Total:	
Valor Ejecutado:	$ 25.132.800,00	Valor Ejecutado:	
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	
Prorrogas:	N/A	Prorrogas:	
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	
Suspensiones:	N/A	Suspensiones:	
Fecha de Iniciación:	VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE 2021	Fecha de Iniciación:	
Terminación Inicial:	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2021	Terminación Inicial:	
Terminación Actual:	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2021	Terminación Actual:	
Estado Actual Contrato:	EN EJECUCION	Estado Actual Contrato:	

5. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DEL SECTORIAL EQUIPAMIENTO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 2681 DE 2017-12-26 según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
5.1. ACTA DE INICIO	1/02/2018	8 MESES		
5.2. PRORROGA No 1	31/08/2018	2 MESES		
5.3. PRORROGA No 2	14/11/2018	2 MESES		
5.4. PRORROGA No 3	15/01/2019	2 MESES		
5.5. PRORROGA No 4	20/03/2019	2 MESES		
5.6. PRORROGA No 5	29/05/2019	15 DIAS		
5.7. PRORROGA No 6 Y ADICIONAL No 1	14/06/2019	5 MESES	$ 190.327.709	
5.8. PRORROGA No 7	13/11/2019	3 MESES		
5.9. PRORROGA No 8	11/02/2020	4 MESES		
5.10 ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	24/03/2020	1 MES		
5.11 ACTA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	24/04/2020	1 MES		
5.12 ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	24/05/2020	1 MES		
5.13 ACTA DE AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSION No 1	24/06/2020	15 DIAS		
5.14 ACTA DE AMPLIACION No 4 A LA SUSPENSION No 1	10/07/2020	2 MESES		
5.15 ACTA DE REINICIO No 1	10/09/2020			
5.16 PRORROGA No 9	27/11/2020	2 MESES		
5.17 ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	22/12/2020	1 MES		
5.18 ACTA DE REINICIO No 2	21/01/2021			
5.19 PRORROGA No 10	25/01/2021	1 MES		
5.20 ACTA DE TERMINACION	26/03/2021			
5.21.				

6. INFORMACION DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE CONSULTORIA No 2681 DE 2017, según el caso si aplica.

Tipo de Proceso	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No Proceso	CAS-OAJ-CMA-040-2017
Tipo de Contrato	CONSULTORIA
Fuentes Financiación:	OTROS RECUSRSOS SFFa
Codigo BPIN:	N.A.
Registro Presupuestal:	1702681 - 28/12/2017 - $ 190,518,227 192681 - 14/06/2019 - $ 190,327,709
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Nit No:	79.799.614-9
Rep. Legal:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Cedula No:	79.799.614 DE BOGOTA
Contrato No.	2681 DE 2017-12-26
Objeto:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental para la adecuación y dotación de la planta de beneficio animal del Municipio de Tauramena, Casanare.
Valor Inicial:	$ 381.036.454,00
Valor Anticipo (50 %):	$ 190.518.227,00
Valor Adicionado:	$ 190.327.709,00
Valor Anticipo (50 %):	$ 95.163.854,50
Valor Total:	$ 571.364.163,00
Valor Anticipo (50 %):	$ 285.682.081,50
Valor Ejecutado:	$ -
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Prorrogas:	VEINTITRES (23) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	TREINTA Y UN (31) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Ultima Suspension:	22 DE DICIEMBRE DE 2020
Tiempo Suspensión:	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	01 DE FEBRERO DE 2018
Terminación Inicial:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Fecha de Reiniciación:	21 DE ENERO DE 2021

CAS-OAJ-CMA-040-2017

Terminación Actual:	26 DE MARZO DE 2021
Estado Actual Contrato:	TERMINADO

7. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DERIVADO, CONTRATO DE OBRA No 2691 DE 2017-12-27, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
7.1. ACTA DE INICIO	2/04/2018	7 MESES		
7.2. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No 1	17/09/2018			
7.3. PRORROGA No 1	8/10/2018	2 MESES		
7.4. ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 1	22/10/2018			
7.5. OTROSÍ MODIFICATORIO No 1	23/11/2018			
7.6. PRORROGA No 2	10/12/2018	2 MESES		
7.7. PRORROGA No 3	19/02/2019	2 MESES		
7.8. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No 2	21/02/2019			
7.9. PRORROGA No 4	30/04/2019	45 DIAS		
7.10 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 2	27/05/2019			
7.11 ACTA PARCIAL No 1	7/06/2019		$ 2.303.015.121	
7.12 OTROSÍ MODIFICATORIO No 2 PRORROGA No 5 Y ADICIONAL No 1	13/06/2019	4 MESES	$ 2.355.541.640	
7.13 PRORROGA No 6	15/10/2019	3 MESES		
7.14 ACTA PARCIAL No 2	23/12/2019		$ 1.589.509.650	
7.15 PRORROGA No 7	10/01/2020	4 MESES		
7.16 ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	24/03/2020	1 MES		
7.17 ACTA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	24/04/2020	1 MES		
7.18 ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	24/05/2020	1 MES		
7.19 ACTA DE AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSION No 1	24/06/2020	15 DIAS		
7.20 ACTA DE AMPLIACION No 4 A LA SUSPENSION No 1	10/07/2020	2 MESES		
7.21 ACTA DE REINICIO No 1	10/09/2020			
7.22 ACTA PARCIAL No 3	11/09/2020		$ 1.304.804.517	
7.23 PRORROGA No 8	30/10/2020	2 MESES		
7.24 ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	22/12/2020	1 MES		
7.25 ACTA DE REINICIO No 2	21/01/2021			
7.26 PRORROGA No 9	25/01/2021	1 MES		
7.27 ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No 3	9/02/2021			
7.28 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 3	11/02/2021			
7.29 OTROSÍ MODIFICATORIO No 3	17/02/2021			
7.30 ACTA DE TERMINACION	27/02/2021			
7.31 ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	7/07/2021			

Tipo de Proceso	LICITACIÓN OBRA PÚBLICA
No Proceso	CAS-OAJ-LP-025-2017
Tipo de Contrato	OBRA
Fuentes Financiación:	OTROS RECURSOS SFFa
Codigo BPIN:	N.A.
Registro Presupuestal:	1702691 29/12/2017 $ 2,357,738,483 17002691 02/01/2018 $ 2,357,738,483
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO TAURAMENA 2017
Nit No:	901141402-0
Rep. Legal:	LUIS MANUEL ROJAS GIL
Cedula No:	7,177,539 DE TUNJA
Contrato No.	2691 DE 2017
Objeto:	Adecuación y dotación de la planta de beneficio animal del Municipio de Tauramena, Casanare.
Valor Inicial:	$ 4.715.476.966,00
Valor Anticipo (50 %):	$ 2.357.738.483,00
Valor Adicionado:	$ 2.355.541.640,00
Valor Total:	$ 7.071.018.606,00
Valor Ejecutado:	$ 5.197.329.288,00
Valor Amortizado:	$ 2.598.664.644,00

CAS-OAJ-LP-025-2017

Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Prorrogas:	VENTIUN (21) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	VEINTINUEVE (29) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Ultima Suspension:	22 DE DICIEMBRE DE 2020
Tiempo Suspensión:	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	02 DE ABRIL DE 2018
Terminación Inicial:	01 DE NOVIEMBRE DE 2018
Fecha de Reiniciación:	21 DE ENERO DE 2021
Terminación Actual:	27 DE FEBRERO DE 2021
Estado Actual Contrato:	TERMINADO


9.PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA : 86,33% % PROGRAMACION OBRA: 100,00%

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Durante el periodo 26 de junio 25 de julio de 2021 se llevo a cabo por parte del profesional contratado las siguientes actividades:

Se suscribio el Acta de Recibo final de obra el dia 07 de julio de 2021, y se realizó el acta de entrega institucional con el Municipio de Tauramenta esto con el fin de que el Municipio haga las ultimas adecuaciones para que pueda poner en funcionamiento la Planta de Beneficio Animal.



11. REGISTRO FOTOGRÁFICO (Estado en el que quedaron las estructuras ejecutadas) (DESCRIPCION).

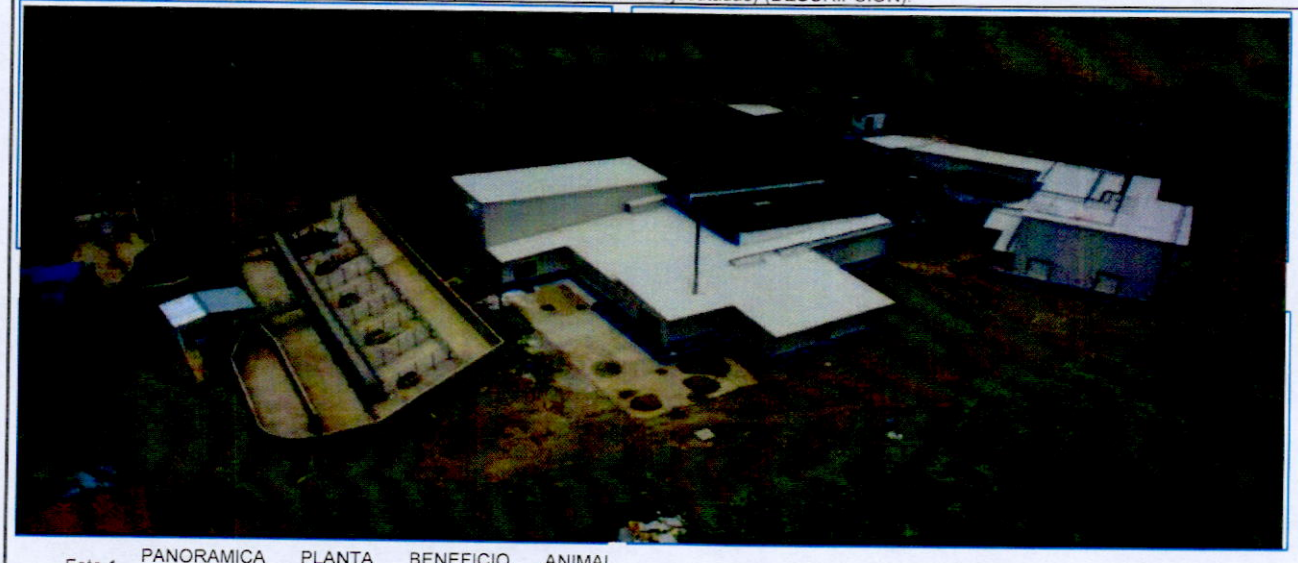


Foto 1 PANORAMICA PLANTA BENEFICIO ANIMAL TAURAMENA (IMAGEN INTERNET)

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

FO-AB-55
21-02-2014
V.01

12. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☐ NO ☐ CUALES? : _____ HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐ CAUSALES?: _____	SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐ PORQUE? _____ REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____ EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐ PORQUE? SE ESTA EPERANDO EL RECIBO DE LA OBRA

11. OBSERVACIONES	12. FIRMAS	
EL CONTRATO DE OBRA Y DE CONSULTORIA ESTAN TERMINADOS.		
	ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES APOYO A LA SUPERVISION C.P.S Nro. 0385-2021	Vo.Bo. SUPERVISOR BRENDA RORAIMA BARRERA Directora Técnica de Construcciones

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79743593
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16	TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7804764862**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1115179038		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 321.700
SUBTOTAL:			1	**$ 321.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 251.400
SUBTOTAL:			1	**$ 251.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 21.000
SUBTOTAL:			1	**$ 21.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 594.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79743593
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16	TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7804764862	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1115179038

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 321.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.700	$ 0	$ 321.700
SUBTOTALES:										**$ 321.700**	**$ 0**	**$ 321.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 251.400
SUBTOTALES:													**$ 251.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 251.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.000	$ 21.000	$ 0	$ 0	$ 21.000
SUBTOTALES:									**$ 21.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 21.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PENSIONADO	FORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	DOM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79743593	ROJAS ARGUELLES CARLOS MAURICIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.010.624					NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.010.624	$ 321.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 321.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.010.624	$ 251.400	$ 0	$ 251.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.010.624	$ 79743593	$ 21.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 594.100**

Planilla Pagada
