INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 13

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2019 AL 25 DE AGOSTO DE 2019

CONTRATO 186 DE 2017: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°127-2017 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O ADECUACION Y/O RECUPERACION Y/O DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, QUE ESTEN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEO-REFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE PERTENEZCAN AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO CAPITAL

BOGOTA D.C

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTENIDO

1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 4
1.1 ANTECEDENTES 4
1.2 LOCALIZACIÓN 5
1.3 FINALIDAD DEL PROYECTO 6
2 CONDICIONES DEL CONTRATO 7
2.1 ORGANIGRAMA GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 7
2.2 ORGANIGRAMA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8
2.3 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
2.4 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 11
3.1 ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA 11
3.2 CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 12
3.3 ACTAS DE INICIO 12
3.4 SEGUIMIENTO A POLIZAS DE OBRA E INTERVENTORÍA 12
3.4.1 PÓLIZAS CONTRATISTA 12
3.4.2 PÓLIZAS INTERVENTORÍA 13
3.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PERSONAL 13
3.5.1 PERSONAL CALIFICADO DEL CONTRATISTA 13
3.6 EQUIPO DE OBRA 14
3.7 AVANCE EN TIEMPO 14
3.8 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 14
4 ASPECTOS TECNICOS 15
4.1 CONTROL TÉCNICO 15
4.1.1 Generalidades. 15
4.2 ENSAYOS DE LABORATORIOS REALIZADOS 25
4.3 PROGRAMACION DE OBRA. 25
4.4 AVANCE DEL CONTRATO. 26
4.4.1 AVANCE FISICO 26
4.5 ACTIVIDADES NO PREVISTAS 26
4.6 COMITÉ OBRA 26
4.7 SOLICITUDES MEDIANTE NOTA DE CAMPO 26

5 ASPECTOS AMBIENTALES Y SST ..... ¡Error! Marcador no definido.

5.1 GENERALIDADES ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.2 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.3 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.4 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.5 MANEJO INTEGRAL DE RCD ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.7 CAPACITACIONES AMBIENTALES ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.8 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.9 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

6 ASPECTOS SOCIALES ..... ¡Error! Marcador no definido.

7 RECOMENDACIONES **32**

8 ANEXOS **32**

1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 ANTECEDENTES

Según el Decreto 544 De 2012. "Por medio del cual se dictan disposiciones para la ejecución de obras con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local" señala en su Artículo 1° que "Los Planes Operativos Anuales de Inversión de los Fondos de Desarrollo Local, para la Línea de Inversión Local - Malla Vial, que comprende la construcción y reconstrucción de vías locales, mantenimiento del espacio público, la adecuación de andenes para la movilidad de las personas en situación de discapacidad y la arborización de las zonas intervenidas, se ejecutará directamente por cada una de las Alcaldías Locales. Igual tratamiento tendrá la línea de inversión local de parques de bolsillo y vecinales." (Subrayado fuera de texto)
De otro lado, el Decreto 456 de 2013 "Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá".

Así mismo, el Plan Maestro de equipamientos Deportivos (Decreto 360 de 2006) define como déficit para la red local si no se cumple un estándar de un mínimo de (2,41 m2/hab.) de espacio de parque por habitante. Al interior de los parques debe haber una distribución de 70% y 30% entre zona dura y zona blanda, y también define que el diseño y la construcción deben incluir procesos de participación ciudadana.

Este Plan Maestro identificó las siguientes dos problemáticas relacionadas con los parques en la ciudad: i) oferta desequilibrada de parques en el espacio urbano; ii) la medición del déficit de parques vecinales y de bolsillo mediante el estándar establecido (2,4 m2/hab.) indica que 57 de 104 Unidades de Planeamiento Zonal evaluadas están en un nivel inferior al considerado como satisfactorio. Para establecer el déficit de parque por UPZ según el estándar de 2,4 m 2/hab se divide el área total disponible por UPZ por el número de habitantes. Esto permite también comparar el déficit entre las UPZ de la localidad. Esperamos que el cruce y análisis de los datos permitan una mejor decisión sobre la intervención en los parques de la Red Local ya que el análisis aquí presentado muestra que no siempre se invierte en las UPZ y los parques que presentan cifras críticas según los indicadores que aquí se proponen a saber:


1. Número total de Parques por UPZ.
2. Déficit critico según estándar de un mínimo de (2,4 m2/hab.).
3. Datos de Violencia (Homicidios, Hurto, Narcóticos, Pandillas, Riñas).
4. Hacinamiento visto como la relación entre población y vivienda.
5. Proporción (Canchas deportivas, Equipamiento, Escenarios deportivos y

Juegos infantiles) y Estado del Equipamiento (Bueno, Regular, Malo). Dada la presencia de problemas de violencia y convivencia en algunos parques, se requiere de proyectos tendientes a atacar esta problemática, pues los parques son principalmente espacios públicos y lugares de encuentro e interacción ciudadana.

1.2 LOCALIZACIÓN

La localidad de Rafael Uribe Uribe según el inventario general de parques de la División Administración de Escenarios del Instituto Distrital de la Recreación y el Deporte IDRD, cuenta con 292 zonas verdes y parques que suman un total de 1.104.474,1 m2, es decir 2.9 m2/hab este indicador, bajo en comparación con los indicadores de las demás localidades y con el indicador promedio de la ciudad (4,8 m2/hab), deja ver que Rafael Uribe Uribe es la sexta localidad con menor área de parques por habitante. De este inventario, 287 parques pertenecen a la modalidad de parques vecinales de bolsillo, equivalentes al 98.2% de la totalidad de parques y zonas verdes de la localidad, Ubicados en las diferentes UPZs.

Imagen. 1 Localización General

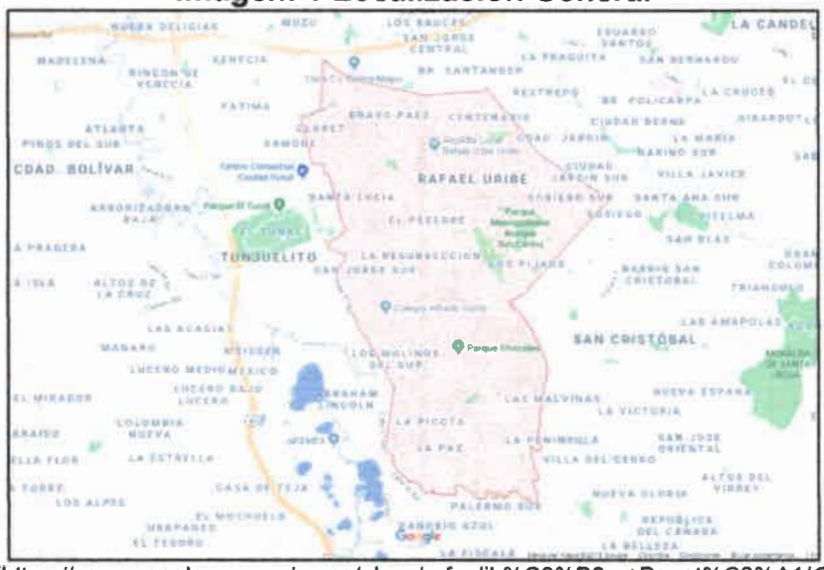

Tomado de (https://www.google.com.co/maps/place/rafaelib%C3%B3n,+Bogot%C3%A1/@4.6775246,-74.1747027,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9c5fa5d2a31d:0xa5f9c78731920c46!8m2!3d4.673689!4d-74.143671)


1.3 FINALIDAD DEL PROYECTO

Al inicio del contrato se proyectó realizar el mantenimiento de 28 parques de la localidad de Rafael Uribe Uribe los cuales posteriormente a varias reuniones y mesas de trabajo se definió la ejecución de los siguientes 15 parques:


PARQUES A INTERVENIR				
	CODIGO	PARQUE	VALOR	DIRECCIÓN
1	18-009	URB GUSTAVO RESTREPO	$ 708.436.058	Calle 28 Sur entre Carrera 15A y Transversal 15ª
2	18-019	QUIROGA	$ 106.152.962	AVENIDA CARRERA 24 CON CALLE 37 SUR COSTADO SUR-OCCIDENTA
3	18-029	SOCIEGO	$ 390.238.308	Cll 28A Y 30 Sur entere Cr 10C y 11
4	18-053	CHIRCALES	$ 158.712.678	Entre Carrera 5J Y Calle 48Jbis sur
5	18-071	EL MIRADOR	$ 623.871.444	Calle 48 Q con Diag 49 Sur
6	18-093	SAN PABLO	$ 198.392.287	
7	18-149	PLAYEN PLAYITA	$ 188.903.468	Calle 50 C Sur con Cra 11ª
8	18-167	GUSTAVO RESTREPO	$ 153.479.848	Carrera 15 Bis A con Calle 32 Sur - Costado Nor- Oriental
9	18-183	MARRUECOS	$ 185.327.676	CALLE 49D BIS SUR (DIAGONAL 48BIS G SUR) CON CARRERA 5L BIS
10	18-201	QUIROGA	$ 97.440.458	ENTRE CARRERA 18A Y CARRERA 18BIS CON EL COSTADO SUR- OCCIDENTAL DE LA CALLE 28B SUR
11	18-213	PLAYON PLAYITA	$ 261.004.148	Cra 11A entre calle 50A y 50 Sur
12	18-257	PALERMO SUR	$ 177.218.151	Cll 49A Sur y 49 C Con Cra 5 Bis
13	18-313	QUIROGA	$ 125.054.876	Cra 24B Con Diagonal 36 Sur
14	18-429	SAN JOSE	$ 663.547.847	Calle 26 Sur y Av 1 de Mayo con Cra 12 D
15	18-431	BOSQUE SAN CARLOS	$ 269.794.656	Calle 27 A sur con Cra 12 Bis y 12 C

2 CONDICIONES DEL CONTRATO

2.1 ORGANIGRAMA GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

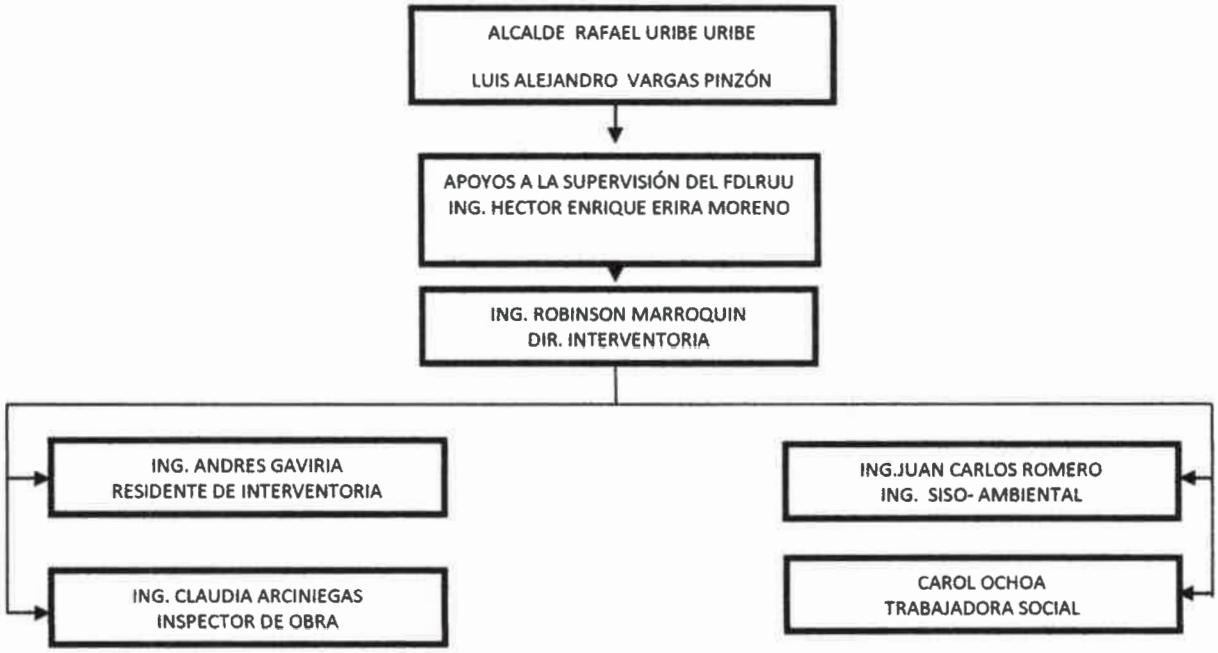

2.2 ORGANIGRAMA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

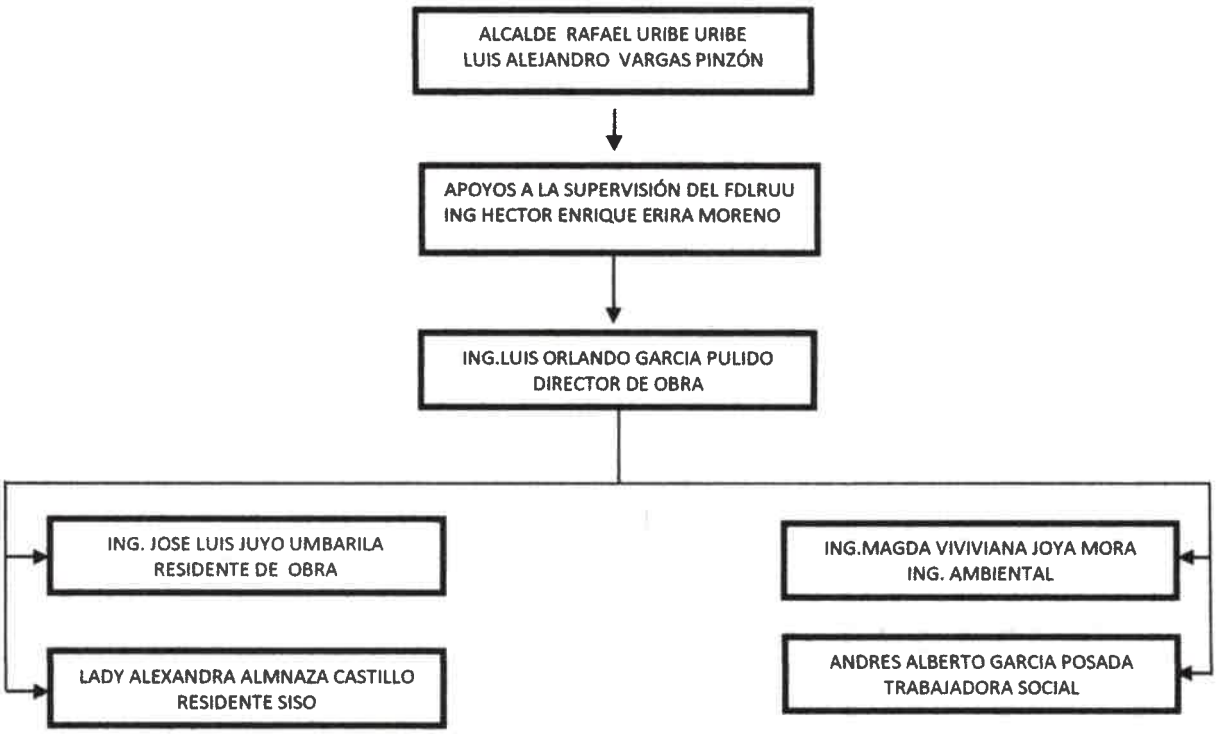

2.3 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA							
CONTRATO:	127 de 2017						
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O ADECUACION Y/O RECUPERACION Y/O DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, QUE ESTEN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEO-REFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE PERTENEZCAN AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO CAPITAL						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE						
VALOR DEL CONTRATO:	$ 4.538.231.088						
PRIMER ADICIONAL:	N/A						
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRP PARQUES						
INTERVENTOR:	ARM CONSULTING LTDA						
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	TRECE (13) MESES						
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE JULIO DE 2018	**FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:**	26	DE	AGOSTO	DE	2019
FECHAN SOLICITUD DE PRORROGA:	N/A						
FECHA MINUTA DE LA PRORROGA:	N/A						
TIEMPO DE PRORROGA :	N/A						
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A						
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO :	EN EJECUCIÓN						

2.4 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO:	**186 de 2018**						
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°127-2017 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O ADECUACION Y/O RECUPERACION Y/O DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, QUE ESTEN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEO-REFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE PERTENEZCAN AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO CAPITAL"**						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**						
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 504.229.145,00**						
INTERVENTOR:	**ARM CONSULTING LTDA**						
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	**TRECE (13) MESES**						
FECHA DE INICIACIÓN:	**26 DE JULIO DE 2018**	**FECHA DE TERMINACIÓN :**	**26**	**DE**	**AGOSTO**	**DE**	**2019**
FECHA SOLICITUD DE PRORROGA	**N/A**						
FECHA MINUTA DE PRORROGA	**N/A**						
TIEMPO DE PRORROGA	**N/A**						
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**N/A**						
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO :	**EN EJECUCIÓN**						

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

Las actividades de la Interventoría se encaminan a supervisar, asesorar, controlar, aprobar y verificar el desarrollo del proyecto de obra, de acuerdo con su alcance, haciendo cumplir en lo aplicable, las especificaciones técnicas y actividades administrativas, ambientales, sociales, legales, laborales, financieras y presupuestales contractuales, al igual que el aseguramiento integral de la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas soportados por los diseños.

Otras funciones de la Interventoría son:

- Asegurar mediante una Interventoría proactiva, la calidad del desarrollo del objeto del contrato de obra civil.
- Representar a la Alcaldía para la adecuada ejecución de los contratos apoyándolo en la dirección y coordinación de estos sin ir en contra de su misión y sus valores.
- Informar a la Entidad Contratante en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato, a través de informes mensuales o informes especiales según se establezca en las condiciones del proyecto.
- Supervisar y controlar la gestión técnica y administrativa desarrollada por el Contratista Constructor para el cumplimiento de las Labores Ambientales y de Gestión Social detalladas en el contrato de obra y en las condiciones especificadas para el proyecto.
- Efectuar el control de calidad de los materiales empleados por el Contratista Constructor, a partir de la normativa técnica aplicable y de otras condiciones particulares contratadas.
- Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el contrato de obra dentro de los plazos propuestos e inversión previstos originalmente.
- Armonizar la interacción de la Entidad Contratante y Contratista Constructor para el logro del objetivo general del proyecto, así como el de obtener, obras que satisfagan las necesidades de la comunidad.
- Constituir un canal de comunicación efectivo entre la comunidad y la Entidad Contratante para recibir y aclarar las inquietudes que resulten en desarrollo del contrato de obra civil.

Dentro de las actividades básicas desarrolladas por la Interventoría están:

- Verificación de las cantidades de obra contratada y requerida.
- Control de las cantidades de obra construidas hasta la fecha de corte del presente informe.
- Realización de los informes Mensuales.
- Visitas la obra para control de todas y cada una de las actividades realizadas por el contratista.
- Control del personal de obra y sus respectivas afiliaciones a los sistemas de seguridad social y salud.
- Responder las solicitudes técnicas, administrativas y financieras del contratista y de las entidades involucradas.

Se ha mantenido una comunicación activa con la participación de la comunidad, el contratista y la Interventoría

3.2 CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

Para el presente proyecto se generó el contrato de obra 127 de 2017 con la descripción realizada en el ítem 2.3.

Para el contrato de interventoría se generó el contrato 186 de 2017 con la descripción realizada en el ítem 2.4.

3.3 ACTAS DE INICIO

Se firmaron las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría el 26 de julio de 2018 por las partes.

3.4 SEGUIMIENTO A POLIZAS DE OBRA E INTERVENTORÍA

3.4.1 PÓLIZAS CONTRATISTA

Las pólizas de actualización del acta de inicio fueron entregadas a la interventoría mediante oficio N°36.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA	POLIZA No.	VR. ASEGURADO
SEG. DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05-02-2018 A 05-09-2018	15-40-101049607	$234.372.600.00
SEG. DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	05-02-2018 A 08-03-2019	15-44-101191372	$544.402.458.60
SEG. DEL ESTADO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	05-02-2018 A 05-09-2021	15-44-101191372	$136.100.614.65
SEG. DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS APARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA	15-44-101191372	$816.603.687.90

3.4.2 PÓLIZAS INTERVENTORÍA

Las pólizas de actualización del acta de inicio fueron entregadas a la Alcaldía mediante oficio ENV-004.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA	POLIZA No.	VR. ASEGURADO
ASEG.SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29-12-2017 A 29-08-2019	360-74-994000005129	$156,248.400.00
ASEG.SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	29-12-2017 A 29-08-2019	360-47-994000018191	$77.680.608.00
ASEG.SOLIDARIA DE COLOMBIA	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29-12-2017 A 29-08-2021	360-47-994000018191	$12.946.768.00
ASEG.SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	29-12-2017 A 29-08-2019	360-47-994000018191	$77.680.608.00

3.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PERSONAL

3.5.1 PERSONAL CALIFICADO DEL CONTRATISTA

En el período comprendido por el presente informe el contratista contó en promedio con 7 personas.

CARGO	CANTIDAD	
	INICIO MES	FIN MES
Director de Obra	1	1
Residente de Obra	1	1
Residente Ambiental	1	1
Residente SST	1	1
Residente Social	1	1
Auxiliar Central	1	1
TOTAL	7	7

3.5.2 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

En el período comprendido por el presente informe la Interventoría contó con 6 personas de las cuales son 6 como personal mínimo requerido.

	NOMBRE	CARGO
1	Robinson Marroquin	Director de Interventoría
2	Andrés Gaviria	Ingeniero Residente
3	Juan Carlos Romero	Ingeniero SST- Ambiental
4	Carol Ochoa	Residente Social
5	Claudia Arciniegas	Inspector
6	Pedro Muñoz	Conductor

Ver anexo 1. Planillas de aportes parafiscales

3.6 EQUIPO DE OBRA

Que se realizaron las labores con 15 trabajadores en los parques San Jose (18-429), sociego (18-029) y San Pablo (18-093) , el detalle se puede consultar en el anexo 6 informe de contratista, subsección informe SST.

3.7 AVANCE EN TIEMPO

Han transcurrido 396 días desde la firma del acta de inicio de obra con fecha 25 de Julio de 2018.

TIEMPO CONTRACTUAL INICIAL	396 Días
TIEMPO CONTRACTUAL ACTUALIZADO	N/A
TIEMPOTRANSCURRIDO	396 Días
TIEMPO POR EJECUTAR	0

3.8 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Para el periodo correspondiente al presente informe se emitieron (1) oficio por parte del contratista, (1) por parte de la interventoría para un total de 2 documentos enviados. *(ver anexo 2. Correspondencia)*.

4 ASPECTOS TECNICOS

4.1 CONTROL TÉCNICO

4.1.1 Generalidades.

- Que debido a la evidenciado en la inspección preliminar se llegó al concepto de viabilizar la ejecución de 16 parques desde el inicio del contrato, mencionados a continuación:

	CODIGO	PARQUE	CONCEPTO
1	18-009	URB GUSTAVO RESTREPO	VIABLE
2	18-019	QUIROGA	VIABLE
3	18-029	SOCIEGO	VIABLE
4	18-053	CHIRCALES	VIABLE
5	18-071	EL MIRADOR	VIABLE
6	18-093	SAN PABLO	VIABLE
7	18-149	PLAYEN PLAYITA	VIABLE
8	18-167	GUSTAVO RESTREPO	VIABLE
9	18-183	MARRUECOS	VIABLE
10	18-201	QUIROGA	VIABLE
11	18-213	PLAYON PLAYITA	VIABLE
12	18-257	PALERMO SUR	VIABLE
13	18-313	QUIROGA	VIABLE
14	18-429	SAN JOSE	VIABLE
15	18-431	BOSQUE SAN CARLOS	VIABLE
16	18-349	LA MERCED	VIABLE

- Que posteriormente se realizó por parte del contratista una propuesta de presupuesto de 16 parque por un valor de $ 4.807.436.825, donde por solicitud del Fondo de Desarrollo local de Rafael Uribe Uribe se solicitó se incluyera el parque granjas de san pablo y no se incluyó el presupuesto de los parques san Agustín debido a que inicialmente se iban a entregar diseños por parte del fondo de desarrollo local y el parque 18-294 URBANIZACIÓN AVENIDA DECIMA debido a que estaba pendiente una reunión con condensa para definir el alcance de la intervención.

- Que se realizaron observaciones sobre dicho presupuesto como se observa en el comité N°7.

- Que posteriormente en el comité N°8 el contratista hizo entrega de las memorias gráficas para realizar la revisión pertinente al presupuesto e hizo entrega de una programación general.

- Que se iniciaron actividades en el parque Quiroga IX con la demolición del muro con riesgo de volcamiento como se evidencia en el informe semanal N°1.

- Que posteriormente se realizó el cambio del apoyo de supervisión por parte de la alcaldía dado como apoyo a la supervisión el arquitecto Cristian Cerinza.

- Que se informó de la situación actual del contrato y se realizó una nueva revisión de los presupuestos donde se definió en mesa de trabajo del 25 de octubre (ACTA DE SEGUIMIENTO SEMANAL 11) las actividades definitivas para cada parque por debajo del valor contractual INICIAL, haciendo la claridad que el parque SAN AGUSTIN Se retiro de la lista de parques a ejecutar debido a una directriz de la entidad contratante.

- En cuanto a la ejecución se reportó el avance semanal conforme a lo establecido en los informes semanales.

- Que se realizó el primer cobro de obra e Interventoria correspondiente al porcentaje de avance ejecutado segundo establecido en el informe semanal N°5.
- Que se realizó el segundo cobro de obra e Interventoria correspondiente al porcentaje de avance ejecutado segundo establecido en el informe semanal N°9.
- Que según el informe semanal 11 se evidencia en atraso en las actividades proyectadas del 5,4% razón por la cual se solicitó un plan de contingencia al contratista.
- Frente a esto el contratista propuso abrir dos frente de trabajo adicionales, el parque 18-431 portal bosques de san Carlos y 18- 167 Gustavo Restrepo.
- Que el contratista informo que debido a los diseños de las canchas sintéticas su inicio se reprogramo para el mes de febrero y no enero como se tenía planeado inicialmente.
- Que el 13 de Diciembre se iniciaron actividades en el parque 18-431 portal bosques de San Carlos.
- Que al parque 18-201 URBANIZACIÃ N QUIROGA I, II, III finalizo obra y se encuentra para entrega a la comunidad.

- Que en el parque 18-019 URBANIZACION QUIROGA 8 ETAPA finalizan actividades contractuales está pendiente el arreglo de una carpeta asfáltica, dañada por el ingreso de vehículos pesados.

- Que en el parque 18-183 urbanización marruecos se establecieron actividades imprevistas como la solicitud de dejar a la vista las cajas de desagüe de cada casa ya que se encontraban enterradas, actividad previamente aprobada por la alcaldía antes de su ejecución.

- Que en el informe N°5 se realizó el tercer cobro de obra e Interventoria correspondiente al porcentaje de avance ejecutado segundo establecido en el informe semanal N°13, en concordancia con la forma de pago establecida en los contratos 127 de 2017 y 186 de 2018 de la localidad Rafael Uribe Uribe.

- Que el 28 de diciembre se realizó entrega a la comunidad de las obras ejecutadas en el parque 18-201 Parque Quiroga I, II y III, debido a la finalización de estas.

- Que teniendo en cuentas las festividades de Diciembre la comunidad del barrio marruecos solicito que se iniciaran las actividades de excavación para el cambio de tuberías posterior a la fecha del 3 de enero de 2019.

- Que las excavaciones del parque el mirador iniciaron según lo acordado con la comunidad y que a la fecha del presente informe el parque se encuentra preparado para fundir placa de acabado.

- Que teniendo en cuenta los atrasos evidenciados en los informes semanales la interventoria solicito al contratista generar un nuevo plan de contigencia y una programación detallada para el resto de los parques.

- Que frente la solicitud del plan de contingencia el contratista realizó las socializaciones de incio de los parques 18-313 (parque Quiroga IX), 18-167 (parque Gustavo Restrepo) y parque 18-231(parque playón playita).

- Que se inician actividades en dichos parques.

- Que la interventoría solicito al contratista la entrega del diseño de las canchas sinteriticas 10 dias antes al inicio de actividades como se evidencia en el acta de comité N°21 del 23 de enero de 2019

- Que mediante el informe N°6 se realiza el cuarto cobro de obra e Interventoria correspondiente al porcentaje de avance ejecutado segundo establecido en el informe semanal N°18, en concordancia con la forma de pago establecida en los contratos 127 de 2017 y 186 de 2018 de la localidad Rafael Uribe Uribe.

- Que posteriormente se realizó el cambio del apoyo de supervisión por parte de la alcaldía dado como apoyo a la supervisión el Ingeniero Hector Erira

- Que la interventoría aprueba la nueva programación general y detallada de cada parque, entregada por el contratista el 12 de febrero del 2019. (ver anexo 8).

- Que por parte de la interventoría se realiza cambio de residente por motivos personales, para lo cual se presenta la hoja de vida del Ingeniero Andres Gaviria , que realizara la labor a partir de este mes como residente. (ver anexo 9)

- Que se realizó las socializaciones de inicio de los parques 18-149 (parque playon) y 18-009 (parque Gustavo restrepo).

- Que se realizó socialización de inicio el día 7 de febrero en el parque 18-053 (parque chircales), en el cual se había planteado como propuesta inicial realizar mejoramiento a la cancha existente y cerramiento a la cancha, con lo cual la comunidad no estuvo de acuerdo y paso un derecho de petición solicitando la instalación de juegos biosaludables, por todo lo anterior el contratista pasa una segunda propuesta sobre este parque en donde se realizara demarcación a la cancha, cerramiento a esta , instalación de juegos biosaludables y módulos infantiles, como se evidencia en el acta de seguimiento semanal 25.

  Por todo lo anterior se deja claro que el parque que estaba previsto a iniciar el 9 de febrero, ya presenta un atraso en la ejecución de las actividades.

- Que se da aprobación al diseño de piso caucho presentado para los parques de 18-257 (parque Palermo sur) y 18-431 (parque portal de san carlos). (ver anexo 10)

- Que se da la aprobación del diseño de muro de contención presentados para los parques de 18-257 (Parque palermo sur) y parque 18-231(parque playón playita). (ver anexo 11)

- Que para el parque 18-183 (urbanización marruecos), por solicitud de la comunidad se amplia zona de juegos, con un nuevo diseño.

- Que para el parque 18-167 (Gustavo restrepo) se presenta un problema de seguridad, por tal razón se retrasan actividades que no afectan el avance programado de obra general, por esta razón se solicita acompañamiento por parte de la policía para la ejecución de las actividades.

- Que a la fecha del presente informe (corte 6) se presenta un avance de obra del 40,19 %

- Que por reglamentación del IDRD se decide no intervenir el parque la Merced con el código 18-349, ya que el parque no cuenta con el permiso para poder intervenir, por lo anterior el presupuesto proyectado para este parque se invertirá en los demás parques que se encuentran ejecución.

- Que la interventoría aprueba el diseño de las canchas sintéticas para el parque Gustavo restrepo 18-009 y san jose 18-429, presentados en los anexo 6 y 7 respectivamente.

- Que la interventoría aprueba los diseños arquitectónicos entregados de los parques Mirador 18-071 , marruecos 18-183, san pablo 18-093 y sociego 18-029, presentados en el anexo 8

- Que la interventoría aprueba el diseño de los piso cauchos para los parques playen 18-149, Gustavo restrepo 18-167, presentados en el anexo 9.

- Que se presentan los ensayos de laboratorios entregados a la fecha, en el anexo 10.

- Que en este periodo se da inicio la ejecución de los parques sociego sur 18-029 y san jose 18-429, para lo cual se realizan actas de inicio donde se le socializo a la comunidad lo que se iba a realizar.

- Que para este periodo se realizo la entrega completa del parque san carlos 18-431 y marruecos 18-183, los cuales se entregaron a la comunidad.

- Que el parque Quiroga 9 18-313 no se recibió por la comunidad, ya que faltaba la instalación del módulo de discapacitados.

- Que se corre la entrega del parque Palermo sur 18-257, ya que la comunidad solicito arreglo de las bancas existentes, tapar la baranda M-80, tapar el acero expuesto por una placa independiente de la ejecución de la obra y pintura del muro de la zona de juegos.

- Que se siguen presentando problemas de inseguridad en el parque Gustavo restrepo 18-167, para lo cual la interventoría le propone al contratista avanzar con la ejecución y terminar en un menor tiempo plasmado.

- Que se realiza visita técnica al parque mirador junto con la comunidad para escuchar las inconformidades para lo cual nos comprometemos a empradizar las zonas afectadas , instalación y reubicación de bancas existentes, mejoramiento de graderías, pintura de escaleras, pañetar el muro exterior, mejorar las 3 secciones de cerramiento que estas en mal estado , entre otros , queda como fecha de entrega el 25 de abril del 2019.

- Que se realiza reunión con la comunidad del parque Gustavo restrepo 18-009, donde se les explica la obra como vas a quedar , dejando claro que no se puede colocar cerramiento al costado de las casas, ya que se le estaría quitando zona al parque.

- Que durante este periodo se han presentado lluvias constantes, lo cual ha interferido mucho para la ejecución principalmente para los parques que cuentan con canchas como lo son mirador 18-071, Gustavo restrepo 18-009 y san jose 18-429

- Que durante este mes se programa la entrega de los parques mirador 18-071, Palermo sur 257, playón 18-213, playón 18-149 y Gustavo restrepo 18-167.

- Que por solicitud de la entidad la interventoría aprueba el NP nuevo del juego para instalar en chircales 18-053.

- Que debido al mal estado de los terrenos (presentaba fallos) de los parques san jose 18-429 y gustavo restrepo 18-009 , se decide instalar rajón para estabilizar la zona.

- Se instalan las dos módulos bio saludables en el parque Quiroga 9 18-313 , como lo había solicitado la comunidad.

- Se cambia el diseño de la cancha sintética Gustavo restrepo 18-009, ya que por solicitud de la comunidad solo se va a dejar una entrada al parque.

- Que en el parque playón 18-213 por solicitud de la comunidad se decide dar continuidad al cerramiento existente, encerrando toda la zona.

- Que por solicitud de la comunidad se decide adecuar un juego grecoromano en el parque Gustavo restrepo 18-167, con el fin que no obstruya el sendero peatonal.

Para la fecha del informe de mayo se realizaron las siguientes actividades en los siguientes parques

- Parque Chircales (18-053) se realizó la Colocación de BANCA M - 31 en la zona de la cancha, Recubrimiento sikafloor o similar de Zona de juegos de los Biosaludables, Se realiza demarcación de cancha existente , Se finalizó Cerramiento Malla contra impacto h= 2,50 ml costado Nor Oriental, Piso caucho recicl. 4 cm en zonas de juegos.
  Se aclara que desde que se realizó acta de inicio en este parque se establecio que no se iba a intervenir nada de la cancha, sin embargo por solicitud de la comunidad se hizo mantenimiento de cárcamo y cambio de rejilla en ladrillo drenajes cancha.
  Para la entrega de este parque quedan pendientes nylon, señalización informativa y IDGS.

  Parque Gustavo restrepo (18-009), Se realiza excavaciones manuales a instalación de redes CANALIZ.DUCTODUCTO.PVC-D3"TDP para la cancha, se realiza la imprimación y instalación de la grama sintetica,Se instala Araña en la zona de juegos, Se instala PISO EN CAUCHO RECICL 8 cm en la Zona de juegos,Se finaliza Piso en concreto color gris MR41 (280 kg/cm2) en la

zona de espacio publico, Se instala tubería TUBERIA PLANAR CON FILTRO 12"-Pad Drenajes cancha con asscesorios Yee Advan Edge de 12"x 12" , Tapón Tubería Planar 12",Se hace la cimentación Poste de referencia PP033-22 de 12 m metálico, se realiza el cerramiento contraimpacto y lateral de la cancha, se realiza empradización.
Por solicitud de la comunidad , se decide modificar el cerramiento lateral de la cancha ya que por seguridad de las viviendas se decide a dejar el modulo a 2,50 m de alto y continua con nylon.

- Parque sociego (18-029), se realizo la Excavación Manual en la zona de senderos peatonales, la Excavación mecánica en la zona de la cancha , los llenos en B400 en la cancha ,llenos en B400 – B600 En zonas de Andenes, se instala bordillo y cañuela en la zona de cancha y andenes, se realiza Placa de contrapiso en la zona de patinaje , se realiza Ornamentación baranda m83 en la zona de patinaje, se realizó la instalación de tubería de drenaje para la cancha , se realiza cancha en asfalto, se instala piso en concreto . se instala cerramiento en la ona de patinaje, se pinta con recubrimiento por orden de la entidad.
  Por condiciones del terreno se decide instalar rajón, y a estabilizar con concreto.

- Parque Palermo sur, por orden de la entidad se decide a pintar con recubrimiento sintético la placa de los grecoromanos.

- Parque playón (18-213), por orden de la entidad se decide a pintar con recubrimiento sintético la placa del gimnasio al aire libre y la instalación del rodadero.

- Parque Quiroga 8, por orden de la entidad se decide a pintar con recubrimiento sintético la placa del gimnasio al aire libre.

- Parque Quiroga 9, por orden de la entidad se decide a pintar con recubrimiento sintético la placa del gimnasio al aire libre.

- Parque mirador (18-071), por orden de la entidad se decide a pintar con recubrimiento sintético la placa del gimnasio al aire libre y grecoromanos , por

solicitud de la entidad se decide arreglar el cerramiento afectado por un accidente de carros.

- Parque Gustavo restrepo (18-167), por solicitud de la comunidad se decide incluir bancas al presupuesto.

- Parque san jose, se realizaron actividades de demoliciones , ecavaciones. Rellenos, placas contrapiso, redes hidrulicas, filtro francés , cajas eléctricas, imprimación asfáltica, confinamientos, piso en concreto, estructura de la cancha sintetica , muro estructural, tubería planar, accesorios hidráulicos, entre otros. Por solicitud de la alcaldía se cambia el diseño dejando una gradería continua en los sentidos laterales, donde queda el regustro aprobado por parte de la interventoría en el acta 34.

- Que en el anexo 3 se presentan las cantidades aprobadas por interventoría de este corte.
- Para el presente informe correspondiente a junio, se realizó la entrega final del parque chircales.
- Que a la fecha se lleva un porcentaje de obra del 87% de ejecución.
- Que se inicia actividades en el parque san pablo.
- Que se encuentra con actividades , el parque Gustavo Restrepo (95%) se programa entrega para el 13 de julio , el parque san jose (85%) se encuentran terminando senderos peatonales, el parque sociego (87%) se encuentra rematando senderos y san pablo (10%) se realizó demoliciones de las gradería y la capa de asfalto existente.
- Para el presente informe 12, se presenta un avance de obra ejecutado es del 89,9% .
- Durante este periodo se realizo la entrega del parque Gustavo Restrepo 18-009.
- A la fecha se presentan actividades en el parque San jose , sociego sur y san pablo.
- Se inician actividades en el parque San pablo, en donde desde un inicio se planteó la intervención de la carpeta asfáltica sin intervenir la estructura de la cancha, pero por orden de nosotros como interventoría se realizaron apiques en donde se pudo observar el mal estado de la cancha en algunas zonas, se procede a retirar la carpeta e intervenir la estructura con el fin de estabilizar el terreno .Por solicitud de la comunidad se aprueba instalar malla contra-impacto en el costado oriental.
  A la fecha se ha retirado carpeta asfáltica, se hicieron demoliciones de cimientos, se excavaron los pilotes y vigas para la construcción de la malla.

- El parque san José presenta un avance ejecutado del 95% .
- El parque sociego va en el 95% de avance ejecutado.
- Se presentan las cantidades aprobadas por interventoría en el anexo 3.

- Para el presente informe correspondiente al mes de agosto , se aprueba por parte de la entidad para el contrato 127 de 2017 , una adición de $ 2.000.000.000 y una prórroga de 4 meses y para el contrato 186 una adición de $ 200.000.000 y una prórroga de 4 meses. Esto se realizó con el fin de intervenir los siguientes parques

	CODIGO	PARQUE	DIRECCIÓN
1	18-429	SAN JOSE	Calle 26 Sur y Av 1 de Mayo con Cra 12 D
2	18-236	URBANIZACIÓN QUIROGA I II III ETAPA	carrera 21b con calle 30 sur costado occidental
3	18-089	URBANIZACIÓN AVENIDA CARACAS II Y URBANIZACIÓN GUIPARMA	carrera 10d con calle 49h sur costado nor-oriental

- Durante este periodo se realizó visita en el parque chircales, con el fin de terminar unos detalles solicitados por la comunidad, en donde la junta recibe con satisfacción el parque.
- En el parque Gustavo restrepo se terminan de instalar el sistema eléctrico, puesta a tierra, pararrayos, cableado, puerta caseta entre otros.
- Para el presente informe se terminan actividades en el parque san José, respecto a la cancha sintética y se está a la espera de los diseños finales para la ejecución de la adición.
- Para el parque sociego se termina la ejecución de la cancha, en donde se le aplicó recubrimiento, se instaló el mobiliario y empradizacion. Cabe resaltar que al sacar un balance general del presupuesto del contrato, se observa que queda un monto para el cual se realizara un comité junto a la entidad para definir qué actividades ejecutar en este parque.
- El parque san pablo fue el que más tuvo actividad, sin embargo las lluvias y los problemas de seguridad retrasaron algunas actividades, se realizó demolición de muros y de asfalto, excavaciones, rellenos, se le

realizo mantenimiento al cerramiento perimetral, se realizó la estructura de la tarima solicitada por la comunidad, carpeta asfáltica.

- Se realizó el cerramiento solicitado por la comunidad en el parque playón 18-213.

4.2 ENSAYOS DE LABORATORIOS REALIZADOS

Que a la fecha se realizaron tomas de densidad y cilindros de concreto para los parques san jose 18-429 Y san pablo 18-093, el detalle se puede observar en el informe técnico del contratista anexo 2.

4.3 PROGRAMACION DE OBRA.

El 12 de febrero entregaron un cronograma general y detallado de cada parque, para la fecha se presenta el siguiente cuadro exponiendo el estado de los parques :

	CODIGO	PARQUE	ESTADO
1	18-009	URB GUSTAVO RESTREPO	TERMINADO
2	18-019	QUIROGA	TERMINADO
3	18-029	SOCIEGO	EN EJECUCIÓN
4	18-053	CHIRCALES	TERMINADO
5	18-071	EL MIRADOR	TERMINADO
6	18-093	SAN PABLO	EN EJECUCION
7	18-149	PLAYEN PLAYITA	TERMINADO
8	18-167	GUSTAVO RESTREPO	TERMINADO
9	18-183	MARRUECOS	TERMINADO
10	18-201	QUIROGA	TERMINADO
11	18-213	PLAYON PLAYITA	TERMINADO
12	18-257	PALERMO SUR	TERMINADO
13	18-313	QUIROGA	TERMINADO
14	18-429	SAN JOSE	EN EJECUCIÓN
15	18-431	BOSQUE SAN CARLOS	TERMINADO

Que al 25 de Agosto se posee un avance programado de **95%** basado en la nueva programación y un avance ejecutado del **95,0%.**

4.4 AVANCE DEL CONTRATO.

4.4.1 AVANCE FISICO

PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO
95%	95%	95%

4.5 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Este periodo no presenta.

4.6 COMITÉ OBRA

Teniendo en cuenta una de las funciones básicas de la interventoría dentro del proyecto es la de mantener informada a la entidad contratante de los por menores del proyecto, hasta la fecha del presente informe se han realizado (2) dos comités los cuales son:

COMITÉ	FECHA
Acta de reunión N°40	16 de Agosto de 2019
Acta de reunión N°41	21 de Agosto de 2019

(Ver anexo 3. Actas de Comité).

4.7 SOLICITUDES MEDIANTE NOTA DE CAMPO

- Durante el periodo de análisis del presente informe no se presentaron notas de campo.

5 ASPECTOS AMBIENTALES Y SST

5.1 GENERALIDADES

El presente documento tiene como fin dar cumplimiento a los pliegos contractuales y servir como base para el seguimiento de la gestión desde el punto de vista ambiental.
Durante este periodo el contratista CONSORCIO PRP PARQUES continúo con la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGST) aprobados para el presente contrato de obra.

En el desarrollo de la actividad de seguimiento se pueden verificar las actividades del PMA y SGSST a través de los informes presentados por el consorcio.

Actividades de gestión ambiental.

1. Se presentó el informe del periodo de desarrollo de julio-agosto de 2019

2. Se realiza mantenimiento al cerramiento, protección de sumideros, acopio y protección de materiales pétreos de los parques: Gustavo Restrepo, San José, Sosiego y Granjas de San Pablo.

3. Se realiza jornadas de orden y aseo en todos los frentes de obra activos.

4. Se realiza instalación y mantenimiento de PMT en los diferentes frentes de obra.

MANEJO SILVICULTURAL Y PAISAJÍSTICO

Protección de árboles

Durante la ejecución de las actividades constructivas, se dará cumplimiento a las actividades de protección de árboles y zonas verdes. No se hubo presencia de árboles para protección en los frentes intervenidos en este periodo.

5.2.1 MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Manejo de campamentos y centros de acopio

Se han realizado labores administrativas generales.
Se cuenta con una bodega para almacenamiento de materiales en el barrio el sosiego, la cual cuenta con los servicios de agua, luz y recolección de basuras por las empresas prestadoras del servicio de la ciudad de Bogotá.
Donde se guardan los elementos personales de los trabajadores, se cuenta con servicio de baño y se tienen los elementos de emergencia.
Los residuos sólidos generados por el funcionamiento normal del campamento, se les dará el tratamiento requerido (disposición temporal), que permita la recolección por parte de la empresa prestadora del servicio en la zona de ubicación.

5.2 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El consorcio realiza ingreso de materiales pétreos de la empresa Costriturar para el desarrollo y ejecución de las actividades de obra aprobadas.

Tipo de Material utilizado	Volumen (m3)
B 400	140
B 600	28

5.3 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA

El consorcio realiza protección de sumideros en las zonas aledañas a los sitios de intervención a fin de proteger la caída de residuos y sedimentos provenientes de la obra al alcantarillado público.

5.4 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Con el fin de minimizar la dispersión de material particulado que pueda afectar la salud de los trabajadores, así mismo la dispersión que pueda afectar las viviendas que se encuentran alrededor de la obra, el consorcio implemento polisombra en los sitios intervenidos. La volqueta utilizada para la disposición de RCD cuenta con su respectivo PIN ambiental emitido por la SDA.

5.5 MANEJO INTEGRAL DE RCD

Se llevan a cabo actividades de excavación y demolición, por consiguiente, se generan RCD en los diferentes frentes de obra.
Durante este periodo se generan 193 m3 de RCD, los cuales son transportados en las volquetas de placas TTQ517, CRA888 las cuales cuentan con su respectivo pin ambiental y se corrobora en el listado de trasportadores aprobado por la SDA. Los RCD son dispuestos en sitios aprobados Cemex y San Antonio.

El contratista adjunta certificación correspondiente a los RCD dispuestos durante el mes de diciembre y enero en la escombrera Cemex y San Antonio, igualmente adjunta certificación correspondiente al material proveniente de Reciclados

Industriales, El Cóndor y Cemex durante el periodo comprendido entre el 26 de julio a 25 de agosto de 2019.

5.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Para facilitar la clasificación y almacenamiento de los residuos generados en la etapa de construcción el consorcio implemento puntos ecológicos con bolsas blancas y negras para recolección y disposición temporal, luego se realiza la posterior entrega del material al operador del servicio de aseo que corresponda de acuerdo al punto de intervención. El consorcio no implementa canecas o contenedores de basura por temas de seguridad en los diferentes sitios de intervención.

5.7 CAPACITACIONES AMBIENTALES

Para el periodo que registra este informe el contratista aporta los certificados y listados de asistencia a las diferentes capacitaciones ambientales.

5.8 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dentro del marco de seguridad industrial se ha requerido al contratista tener en cuenta los parámetros establecidos para este tipo de obras, donde el personal debe contar con los implementos necesarios para realizar sus actividades con la protección que esta demanda.

Se pudo evidenciar el uso de los siguientes elementos utilizados por el personal de obra:

- Protección auditiva (tapa oídos)
- Mono gafas
- Tapa bocas
- Casco de obra
- Overol distintivo del Consorcio.
- Botas con punta de acero
- Guantes, entre otros.

5.9 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el marco del Contrato de obra el contratista realiza actividades a fin de dar cumplimiento al SGSST, las cuales son verificadas y aprobadas por la interventoría. Se verificaron las siguientes actividades y acciones.

De acuerdo al informe Nº 12 SST comprendido entre el 26 de julio a 25 de agosto de 2019 se ha dado cumplimiento en cada una de las actividades realizadas en el área SST, de acuerdo a los documentos contractuales y a la Normatividad vigente.

- De acuerdo al informe Nº 12 SST comprendido entre el 25 de julio de 2019 al 26 de agosto de 2019 se ha dado cumplimiento en cada una de las actividades realizadas en el área SST, de acuerdo a los documentos contractuales y a la Normatividad vigente.
- No se realizaron Exámenes médicos ocupacionales de ingreso.
- No se presentaron accidentes de trabajo este periodo.
- Se instalaron los elementos del plan de emergencia. No se efectúan reposiciones en el botiquín por tratarse de elementos nuevos.
- Durante el mes se realizaron las siguientes inspecciones: Botiquín, Equipos contraincendios e inspección general.
- Se realiza capacitación de Higiene Postural
- Se instaló PMT en el parque Chircales.

El contratista en el desarrollo de sus actividades anexo los siguientes documentos en el informe del presente periodo los cuales se verificaron y se aprobaron.

De acuerdo al informe Nº 13 SST comprendido entre el 25 de Julio de 2019 al 26 de Agosto de 2019 se ha dado cumplimiento en cada una de las actividades realizadas en el área SST, de acuerdo a los documentos contractuales y a la Normatividad vigente.

- No se realizaron Exámenes médicos ocupacionales de ingreso.
- No se presentaron accidentes de trabajo este periodo.
- Se instalaron los elementos del plan de emergencia. No se efectúan reposiciones en el botiquín por tratarse de elementos nuevos.
- Durante el mes se realizaron las siguientes inspecciones: Botiquín, Equipos contraincendios e inspección general.
- Se realiza capacitación de Uso de epp .

El contratista relaciona los siguientes soportes en materia de SST

1. ANEXO 1. FORMATO IDU-17
2. ANEXO 2. PERSONAL ANTIGUO SEGURIDAD SOCIAL
3. ANEXO 3. PERSONAL ROTATIVO
4. ANEXO 4. PERSONAL RETIRADO
5. ANEXO 5. ENTREGA DE EPP
6. ANEXO 6. CAPACITACIONES
7. ANEXO 7. INSPECCIONES MENSUALES
8. ANEXO 8. FORMATO DE ACCIDENTALIDAD
9. ANEXO 9. ACTA VIGIA
10. ANEXO 10. INFORME DE MAQUINARIA Y VEHICULO
11. ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

6 ASPECTOS SOCIALES

Actividades realizadas

Tabla 1. Relación de actividades realizadas por el área social de interventoría.

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Entrega parques públicos	Agosto 29	Interventoría
Revisión actas de vecindad	Conforme se realiza el levantamiento de las mismas	Interventoría

Durante el periodo del presente informe, el día jueves 29 de agosto, se realizó entrega a la comunidad del parque público Desarrollo Los Chircales – código 18-053. Se contó con la participación del área social del contratista e interventoría. (Se anexa planilla de asistencia y acta de reunión)

Por otro lado, se realizó revisión de actas de vecindad levantadas en los predios aledaños al parque público San José – código 18-429.

7 RECOMENDACIONES

En lo que ha transcurrido del contrato se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Es importante que el contratista cumpla con los tiempos pactados en la programación.
- Tener en cuenta los procedimientos para desechos de materiales e insumos
- Entregar junto con los informes mensuales o cuando se indique los certificados de calidad de los materiales utilizados en obra.
- Responder oportunamente los requerimientos hechos por la interventoría y/o la entidad contratante dentro de los plazos determinados.
- Cumplir el porcentaje de personal establecido en las especificaciones técnicas.

8 ANEXOS

Anexo.1 Planilla parafiscales
Anexo.2 Correspondencia
Anexo 3 Actas comité
Anexo 4. Anexo social
