Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 06 de Agosto de 2021

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-123-2021

Referencia: Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577681-2020

Asunto: Entrega de Informe Final de obra, Informe Final SG-SST e Informe Final Ambiental.

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a los pliegos del contrato de la referencia, adjuntamos a esta comunicación el Informe Final de Obra, Informe final SG-SST e Informe final ambiental, los cuales corresponden al periodo comprendido entre el 27 de agosto al 26 de diciembre de 2020.

Cordialmente,

Ing. Miguel Angel Venegas
Director Interventoría

Anexo: Informe Final de obra. (Folios 624)
Informe Final SG-SST (se encuentra como anexo 9 del informe final de obra)
Informe Final Ambiental.

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 06 de septiembre de 2021

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-129-2021

Referencia: Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577681-2020

Asunto: Aprobación de Informe Final de obra, Informe Final SG-SST e Informe Final Ambiental.

Respetado Ingeniero:

Dando alcance al oficio **SED-INTERV-123-2021,** y en cumplimiento a los pliegos del contrato de la referencia, esta Interventoría revisó y aprobó el correspondiente Informe Final de Obra, Informe final SG-SST e Informe final ambiental, los cuales corresponden al periodo comprendido entre el 27 de agosto al 26 de diciembre de 2020.

Cordialmente,

Ing. Miguel Angel Venegas
Director Interventoría

Anexo: Informe Final de obra. (Folios 624)
Informe Final SG-SST (se encuentra como anexo 9 del informe final de obra)
Informe Final Ambiental.

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

CONTRATO # CO1.PCCNTR.1577681
GRUPO 7

INFORME FINAL

PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020

CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

ABRIL 2021

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades desarrolladas en el marco del contrato **CO1.PCCNTR.1577681 GRUPO 7**, suscrito entre la **SECRTARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL** y **el CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE** cuyo objeto es **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"**, durante el periodo comprendido entre el 27 de agosto al 26 de diciembre de 2020, para lo cual se relaciona puntualmente las actividades contempladas en el cronograma de ejecución del mismo.

2. INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATISTA

CONTRATO INICIAL	
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Nombre Contratista:	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
Número del contrato:	CO1.PCCNTR.1577681
Fecha de suscripción del contrato	27 de agosto de 2020
Valor Fiscal Inicial	863.136.958
Plazo:	4 MESES
Fecha de inicio:	27 de agosto de 2020
Fecha de terminación Inicial:	26 de diciembre de 2020
AVANCE DEL CONTRATO	

I.E.D. USAQUEN SEDE A

Se realizó intervención sobre la parte sur de la Sede, iniciado con el replanteo coordinado con la interventoría, para la construcción de la nueva cancha. Se realizó la excavación del terreno siguiendo las medidas de una cancha múltiple reglamentaria con tres servicios, microfútbol, baloncesto y voleibol. En seguida se realizó la compactación y fumigación de la subrasante y se procedió con la colocación del geotextil como capa de separación con las capas granulares. En los espesores indicados en la siguiente imagen se colocó la base y súbase granular con las especificaciones requeridas y obteniendo la compactación exigida con pruebas de laboratorio, Se suministraron e instalaron los prefabricados de confinamiento de la cancha y se construyeron los andenes laterales como zona de transición y de aislamiento con la zona verde. La placa de concreto se fundió de manera progresiva en tiras longitudinales con sus respectivos cortes para las juntas de dilatación y expansión. Posteriormente se instalaron los arcos y se realizó el sello de las placas, pintura y demarcación con las medidas reglamentarias.

Las actividades realizadas durante el contrato fueron:

- Localización y replanteo topográfico
- Demolición placa maciza h= 0.15 (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte cancha múltiple (inc. Retiro de sobr.)
- Trasiego carretilla únicamente para proyectos especiales avalados por la interventoría a una distancia de 0 - 100 m.
- Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro)
- Relleno en sub-base granular b-400 (suministro, extendido, humedecimiento y compactación)
- Rellenos compactos en material seleccionado proveniente de la excavación (inc. Manipulación, trasiego e instalación)
- Placa contrapiso de 12 cm - concreto 3000 psi. Incluye corte y dilatación
- Malla electrosoldada estándar
- Tubería PVC corrugada para filtro diámetro 4"
- Relleno gravilla de rio
- Geotextil NT 2500 (incluye suministro e instalación).
- Caja inspección 100 x 100 x 100 cm (inc. Base y cañuela y tapa con marco metálico)
- Bordillo prefabricado en concreto a – 50
- Sardinel tipo a10 (suministro e instalación. Incluye 3 cm mortero 2000 psi) (3huecos)
- Adoquín ladrillo macizo sta/fe o similar
- Vinilo s/pañete - 2 manos
- Juntas dilatación asfalto
- Cancha múltiple baloncesto - microfútbol - voleibol (inc. Dos un fijas de microbaloncesto - malla para micro futbol - juego de postes y malla para voleibol - demarcación de la cancha - transporte - e instalación)
- Pradización jardines (inc. Tierra negra)
- Cañuela tipo a120 (suministro e instalación. Incluye 3cm mortero 1:5).
- Aseo general.

Y actividades no previstas como:

- Relleno base granular clase c (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación).
- Relleno en sub-base granular tipo c (suministro, extendido, humedecimiento y compactación)
- Recubrimiento sintético con emulsión asfáltica sika (3 capas de 6mm de espesor)
- Recubrimiento con acronal sellante sintético 1 capa y 4 capas de pintura color verde rojo y azul de norma IDRD

I.E.D. PANAMÁ SEDE A:

Se realizó intervención sobre la sede del IED República de Panamá Sede A, iniciado con el replanteo coordinado con la interventoría, para la adecuación del cuarto de basuras con sus respectivas redes Hidrosanitarias, acabado interno en enchape y cielo raso en PVC, Se realizó el remplazo de algunos paneles de cerramiento en malla eslabonada, se construyó la escalera metálica y se realizó el acceso peatonal con rampa en concreto, se fundieron placas de concreto al acceso del colegio y se realizó excavación y relleno con gravilla de rio al acceso.

Las actividades realizadas durante el contrato fueron:

- Demolición de muros tolete e=12 cm. (inc. Retiro de sobr.)
- Demolición placa maciza h= 0.15 (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte cerramientos en malla tipo ondulada o eslabonada (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte y retiro de divisiones modulares
- Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro)
- Relleno en recebo común (suministro, extendido, humedecimiento y compactación)
- Concreto para vigas de cimentación 3000 psi
- Placa contrapiso de 12 cm - concreto 3000 psi. Incluye corte y dilatación
- Acero de refuerzo 60000 psi
- Malla electrosoldada estándar
- Tubería pvc-l ø 3" (inc. Accesorios)
- Tubería pvc sanitaria de 2" (incluye atraque en concreto)
- Relleno gravilla de rio
- Rampa - losa maciza concreto 3000 psi - h = 15 cm
- Concreto para escaleras 3000 psi
- Muros ladrillo tolete fino perforado e=12 cm
- Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 1/2" - 11 cm. De profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)
- Pasos prefabricados escalera b = 30 cm
- Red suministro PVCP de 1/2" (inc. Accesorios)
- Punto agua fría pvc (inc. Accesorios)
- Punto desagüe pvc ø 2"
- Bajante A.N. PVC ø 3" (inc. Accesorios)
- Llave manguera de 1/2" (suministro e instalación)
- Salida + interruptor sencillo luminex o equivalente - pvc
- Salida para lámpara fluorescente - pvc
- Pañete liso sobre muros 1:4

- Afinado endurecido mortero 1:3 h=4
- Cerámica 33 x 33
- Mediacaña en granito h = 0.10 m
- Dilataciones ladrillo 0.25 mortero 1:4
- Teja ondulada A.C. Tipo eternit no 6
- Suministro e instalación de estructura metálica de cubierta. Inc. Anticorrosivo y esmalte
- Canal lámina galvanizada ds = 50 cm - cal 20
- Marcos puertas lámina c.r. C18 - b=80 cm (antic - esmalte)
- Puerta entamborada lamina c.r. C18 (antic - esmalte)
- Baranda y pasamanos tubo de 1 1/2"
- Enchape pared 25 x 35 - macedonia corona o equivalente
- Bala fluorescente de 50 w
- Vinilo s/pañete - 2 manos
- Esmalte s/ lamina lineal
- Cerramiento tubo y malla ondulada
- Aseo general

Y actividades no previstas como:

- Muro división en superboard acabado incluye pintura
- Cieloraso en láminas de pvc
- Escalera metálica (no incluye concretos, ni baranda, medida la proyección en planta de huellas y descansos).

I.E.D. PANAMÁ SEDE B:

Se realizó intervención sobre Las baterías sanitarias del IED Republica de Panamá Sede B, iniciado con el replanteo coordinado con la interventoría, para la adecuación de las baterías sanitaria en la cual se intervino solo orinales y lavamanos del baño de niños y niñas, Se realizó la demolición de enchapes de pared y piso existentes muros en bloque y desmonte de aparatos sanitarios que solo fueron intervenidos, grifería y puertas en mal estado para el usos de los estudiantes, en la cual posteriormente se instalaron todas las redes hidrosanitarias correspondientes a baño de niños lavamanos y orinales, baño de niñas lavamanos, necesarias para su óptimo funcionamiento, se instalaron las divisiones de baños en acero inoxidable se fundieron sus respectivos mesones en granito pulido y se realizaron acabados con enchapes y pintura en vinilo, se instalaron los aparatos sanitarios nuevos correspondientes a lavamanos en baño de niñas, lavamanos y orinales en baño de niños y sanitario y lavamanos en baño

de profesores, en sala de profesores se realizó el cambio de piso y la respectiva instalación de divisiones en drywall, así mismo se realizó la instalación de dos puertas en el área administrativa y la modificación del baño de profesores, interviniendo enchapes muros e instalación de aparatos nuevos.

Las actividades realizadas durante el contrato fueron:

- Demolición de enchapes cerámicos (inc. Retiro de sobr.)
- Demolición muros en bloque; e = 12 cm (inc. Retiro de sobr.)
- Demolición de pisos en baldosín (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte aparatos sanitarios (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte puertas con marcos (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte puertas con marcos (inc. Retiro de sobr.)
- Suspensión de salida sanitaria (inc. Retiro de sobr.)
- Suspensión de salida hidráulica (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte y retiro de divisiones metálicas para baños
- Desmonte y retiro de divisiones modulares
- Demolición placa contrapiso 0.15 (inc. Retiro de sobrantes)
- Desmonte de lámparas 2x32. Incluye retiro de sobrantes
- Punto desagüe pvc ø 2"
- Muro en dry wall de 12 mm incluye estructura metálica, masilla, cinta y primera mano de pintura, visto dos caras e=12 cms
- Mesones en concreto de 40 cm
- Tubería pvcp rde 11 de 3/4"
- Punto agua fría PVC (inc. Accesorios)
- Salida para lámpara fluorescente – emt
- Interruptor senc clas.c l/nex lx-010c
- Pañete liso sobre muros 1:4
- Afinado endurecido mortero 1:3 h=4
- Baldosín granito l-1 33 x 33 mortero 1:4
- Cerámica 33 x 33
- Acabado en duro-piso p´baños
- Mediacaña en granito h = 0.10 m
- Puerta y marco en aluminio anodizado serie 3831/5020 - color mate natural + vidrio cristal templado incoloro 5 mm
- Enchape pared 25 x 35 - macedonia corona o equivalente
- Granito pulido mesones lavamanos - b = 40 cm.
- Lámpara 2x32 t8 bajo placa – hermética
- Grifería lavamanos tipo grival o simil. (Sum e instalación)
- Lavamanos nova 738 (sum e instalación)
- Orinal mediano de colgar institucional color blanco p´conexión ø 5/8" ref

21-aa-8860 mancesa o similar.
- Sanitario acuacer blanco corona (sum e instalación)
- Taparregistro 15 x 15 (sum e instalación)
- Divisiones para baños en acero inoxidable
- Estuco
- Vinilo muros interiores 3 manos
- Filos y dilataciones
- Vinilo bajo placa - 2 manos
- Anticorrosivo s/lamina llena
- Esmalte s/ lamina llena
- Esmalte s/ marcos lamina
- Cerradura schlage oficina a-50 pd
- Espejo cristal 4 mm - biselado 2 cm
- Aseo general

Y actividad no prevista como:

- Muro división en superboard acabado incluye pintura

I.E.D. PANAMÁ SEDE C.

En esta SEDE, se adelantaron trabajos de adecuación de baterías sanitarias, Instalación de cielo raso en PVC, Instalación de lámparas eléctricas y se realizó un cárcamo sin desagüe y aplicación de pintura epóxica que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para el óptimo uso y funcionamiento.

Se realizó intervención sobre La IED República de Panamá Sede C, iniciado con el replanteo coordinado con la interventoría, para la adecuación de las baterías sanitaria, Se realizó la adecuación de un espacio a cuarto frio donde se creó un punto hidráulico y uno sanitario para su respectivo funcionamiento, se creó un cuarto deportivo en la zona de circulación del primer piso, se realizo el cambio de válvulas anti vandálicas de sanitarios, lavamanos y orinales en baños del primer y segundo piso. Se instaló el cielo raso en PVC de los baños del primer piso, incluyendo el baño de discapacitados, se instalaron lámparas eléctricas, posteriormente se realizó la impermeabilización de piso del baño del segundo piso e instalación de enchape, se realizó adecuación de cuarto de basuras, se construyó un cárcamo para la recolección de aguas el cual por diseño se construyó sin desagüe, finalmente se realizó instalación de los aparatos sanitarios existentes en el colegio por presupuesto actual.

Las actividades realizadas durante el contrato fueron:

- Demolición de pisos en baldosín (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte puertas con marcos (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte ventanas o puertas metálicas (inc. Retiro de sobrantes)
- Desmonte de lámparas 2x32. Incluye retiro de sobrantes
- Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro)
- Placa contrapiso de 12 cm - concreto 3000 psi. Incluye corte y dilatación
- Malla electrosoldada estándar
- Tubería pvc sanitaria de 2" (incluye atraque en concreto)
- Muro en ladrillo tolete prensado e = 12cm
- Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 1/2" - 11 cm. De profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)
- Red suministro pvcp de 1/2" (inc. Accesorios)
- Registro paso directo de 2" kitz o similar
- Punto agua fría pvc (inc. Accesorios)
- Punto desagüe pvc ø 2"
- Salida para lámpara fluorescente – emt
- Interruptor senc clas.c l/nex lx-010c
- Pañete liso sobre muros 1:4
- Afinado endurecido mortero 1:3 h=4
- Cerámica 33 x 33
- Acabado en duro-piso p´baños
- Mediacaña en granito h = 0.10 m
- Media caña en gravilla lavada
- Suministro e instalación de manto asfaltico 2.8 a 3.00 mm
- Ventanas aluminio anodizado serie 3831/5020 - color mate natural - incluye vidrio cristal templado incoloro 5 mm
- Marcos puertas lamina c.r. C18 - b=80 cm (antic - esmalte)
- Puerta entamborada lamina c.r. C18 (antic - esmalte)
- Ventana en lámina c.r. Cal. 20 tipo persiana para ventilación (antic - esmalte)
- Enchape pared 20 x 20 - alfa liso o equivalente
- Lámpara 2x32 t8 bajo placa - hermética
- Bala fluorescente de 50 w
- Desmonte aparatos sanitarios (sólo p´atención de emergencias con reinstalación del mismo aparato sanitario)
- Pintura epóxica
- Cerradura schlage entrada a-80 pd
- Espejo cristal 4 mm - biselado 2 cm
- Vidrio crudo incoloro 5 mm - tipo peldar o similar

- Aseo general
- Cárcamo en concreto 3000 psi (interior 60 x 20 cm)

Y actividades no previstas como:

- Impermeabilización de pisos baños con membrana y aditivo
- Cieloraso en láminas de pvc
- Columneta en concreto dimensiones 0,15m x 0,20m de 3.000 psi
- Suministro e instalación de válvula empotrada de 1 1/4" de 4,8 litros para sanitario (incluye demolición de enchape y muro en el sector requerido para la correcta instalación del aparato)
- Suministro e instalación de válvula empotrada de 1 1/4" pico largo para lavamanos (incluye demolición de enchape y muro en el sector requerido para la correcta instalación del aparato)
- Emulsión asfáltica sika o similar, sellante de mortero existente

I.E.D. AQUILEO PARRA SEDE A:

En esta SEDE, se adelantaron trabajos de adecuación de redes hidrosanitarias y eléctricas, divisiones y acabados en las baterías sanitarias del edificio 3, instalación de manto asfaltico de los edificios 1,2 y 3 que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para el óptimo uso y funcionamiento.

Se realizó intervención sobre los edificios 1, 2 y 3 del IED Aquileo Parra, iniciado con el replanteo coordinado con la interventoría, para la adecuación de las baterías sanitarias y la recuperación de las áreas afectadas en cubierta, Se realizó el retiro del manto asfaltico en malas condiciones y se intervinieron las baterías sanitarias del edificio 3 en la cual se instalaron todas las redes hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su óptimo funcionamiento, se instalaron las divisiones de baños en acero inoxidable se fundieron sus respectivos mesones en granito pulido y se realizaron acabados en duro piso y pintura en vinilo.

Las actividades realizadas durante el contrato fueron:

- Demolición de enchapes cerámicos (inc. Retiro de sobr.)
- Demolición de orinal o lavamanos corrido (inc. Retiro de sobr.)
- Demolición muros en bloque; e = 12 cm (inc. Retiro de sobr.)
- Demolición pisos en tablón (inc. Retiro de sobr.)
- Demolición placa maciza h= 0.15 (inc. Retiro de sobr.)

- Desmonte aparatos sanitarios (inc. Retiro de sobr.)
- Retiro de mantos asfalticos (inc. Retiro de sobr.)
- Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro)
- Relleno en recebo común (suministro, extendido, humedecimiento y compactación)
- Placa contrapiso de 12 cm - concreto 3000 psi. Incluye corte y dilatación
- Malla electrosoldada estándar
- Tubería pvc sanitaria de 4" (incluye atraque en concreto)
- Caja inspección 60 x 60 x 60 cm (inc. Base y cañuela y tapa con marco metálico)
- Mesones en concreto de 60 cm
- Conexión completa a tanque elevado en ø PVC
- Cheque p/d red white ø 3/4" o equivalente
- Cheque p/d red white ø 3/4" o equivalente
- Cheque p/d red white ø 3/4" o equivalente
- Tubería PVCP RDE 9 de 1/2"
- Tubería PVCP RDE 21 ø 1"
- Punto agua fría PVC (inc. Accesorios)
- Punto desagüe PVC ø 2"
- Ventilación y re ventilación PVC ø 3" (inc. Accesorios)
- Salida para lámpara fluorescente - PVC
- Interruptor senc clas.c l/nex lx-010c
- Pañete liso sobre muros 1:4
- Afinado endurecido mortero 1:3 h=4
- Tableta natural 20 x 10 moore o equivalente
- Tableta natural 20 x 10 moore o equivalente
- Acabado en duro-piso p´baños
- Acabado en duro-piso p´baños
- Suministro e instalación de manto asfaltico 2.8 a 3.00 mm
- Enchape pared 25 x 35 - macedonia corona o equivalente
- Granito pulido mesones lavamanos - b = 60 cm.
- Lámpara 2x32 t8 bajo placa - hermética
- Grifería lavamanos tipo grival o simil. (Sum e instalación)
- Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer.
- Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer.
- Orinal mediano de colgar institucional color blanco p´conexión ø 5/8" ref 21-aa-8860 mancesa o similar.
- Sanitario acuacer blanco corona (sum e instalación)
- Orinal mediano de colgar institucional color blanco p´conexión ø 5/8" ref 21-aa-8860 mancesa o similar.
- Sanitario acuacer blanco corona (sum e instalación)

- Divisiones para baños en acero inoxidable
- Vinilo bajo placa - 2 manos
- Espejo cristal 4 mm - biselado 2 cm
- Aseo general

Y actividad no prevista como:

- Emulsión asfáltica sika o similar, sellante de mortero existente

I.E.D AGUSTIN FERNANDEZ:

En esta SEDE, se adelantaron trabajos de columnas y vigas e concreto para refuerzo de muro de cerramiento en malla eslabonada, que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para el óptimo uso y funcionamiento.

Se realizó intervención sobre la sede de IED AGUSTIN FERNANDEZ, iniciado con el replanteo coordinado con la interventoría, para la demolición de un tramo de muro de cerramiento sobre la parte Oriental de la institución que se encontraba en malas condiciones por el deterioro de agentes climáticos. Se realizó el desmonte de los paneles de malla ya existentes en malas condiciones de estabilidad.

Las actividades realizadas durante el contrato fueron:

- Demolición de muros tolete e=12 cm. (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte cerramientos en malla tipo ondulada o eslabonada (inc. Retiro de sobr.)
- Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro)
- Concreto para vigas de cimentación 3000 psi
- Acero de refuerzo 60000 psi
- Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" - 9 cm. De profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)
- Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 1/2" - 11 cm. De profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)
- Vinilo s/pañete - 2 manos
- Cerramiento tubo y malla ondulada
- Aseo general
- Puente de adherencia para la pega de concreto fresco a concreto endurecido

Y actividades no previstas como:

- Vigueta concreto de 3000 psi de dimensiones 0,25m x 0,25m.
- Columneta en concreto dimensiones 0,15m x 0,20m de 3000 psi.

I.E.D. DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO:

En esta SEDE, se adelantaron trabajos de estructura de cubierta metálica e instalación de cubierta tipo sándwich, instalación de cielo raso en PVC y lámparas, que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para el óptimo uso y funcionamiento.

Se realizó intervención sobre el Auditorio del IED DOMINGO FAUSTINO, iniciado con el replanteo coordinado con la interventoría, para la demolición de cielo Razo en malas condiciones que estaba en las aulas múltiples junto al mezanine y continuar con la instalación de la estructura metálica de cubierta y tejas tipo sándwich, posteriormente se instaló el cielo raso en PVC y lámparas de las zonas en las cuales había inicialmente.

Las actividades realizadas durante el contrato fueron:

- Demolición cielo raso falso (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte de lámparas 2x32. Incluye retiro de sobrantes
- Salida para lámpara fluorescente - EMT
- Interruptor senc clas.c l/nex lx-010c
- Suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich (ancho = 300 a 400 mm.) Con aislante de fibra de vidrio, poliuretano con un espesor entre 30 mm.y 40 mm. Ó lana mineral de roca entre 25 a 50 mm. - según requerimiento de obra - panel metálico inferior y superior en aluzinc calibre 26 pintados dos (2) caras con pintura poliéster libre de aceites - fijación con clips invisibles en lámina galvanizada calibre 22 (incluye tapas de borde de cubierta y los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se pagara según los metros cuadrados realmente instalados).
- Desmonte canaleta 43/90
- Retiro y disposición final de material toxico (asbesto cemento)
- Suministro e instalación de estructura metálica de cubierta. Inc. Anticorrosivo y esmalte

- Flanche lámina galvanizada cl. 20 - ds=50 cm.
- Lámpara 2x32 t8 bajo placa - hermética
- Bala fluorescente de 50 w
- Esmalte s/ lamina lineal
- Aseo general
- Limpieza de canales y bajantes

Y actividad no prevista como:

- Cieloraso en láminas de PVC

I.E.D FRIEDRICH NAUMANN SEDE B:

En esta SEDE, se adelantaron trabajos de estructura de cubierta metálica e instalación de cubierta tipo sándwich, instalación redes eléctrica, datos y lámparas, instalación de ventanas en aluminio, pañete y pintura sobre muros que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para el óptimo uso y funcionamiento.

Las actividades realizadas durante el contrato fueron:

- Demolición cielo raso falso (inc. Retiro de sobr.)
- Demolición de muros tolete e=12 cm. (inc. Retiro de sobr.)
- Desmonte de lámparas 2x32. Incluye retiro de sobrantes
- Conexión completa a tanque elevado en ø pvc
- Salida sonido en 3/4 l=5m con cable polarizado 2x14
- Salida para lámpara fluorescente - emt
- Tubería emt 1/2" - suspendida incluye accesorios
- Cableado 1#12
- Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada.
- Interruptor automático enchufable 1 polo 15/60 a
- Breaker industrial 3 x 15/60 a
- Cable utp cat 6 tendido certificado
- Salida de voz o datos en canaleta
- Interruptor senc clas.c l/nex lx-010c
- Toma doble americana 600 polo666 -n
- Filos y dilataciones
- Pañete impermeabilizado s/muros 1:3.

- Pañete liso sobre muros 1:4
- Guardaescoba en granito h = 0.065
- Suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich (ancho = 300 a 400 mm.) Con aislante de fibra de vidrio, poliuretano con un espesor entre 30 mm.y 40 mm. Ó lana mineral de roca entre 25 a 50 mm. - según requerimiento de obra - panel metálico inferior y superior en aluzinc calibre 26 pintados dos (2) caras con pintura poliéster libre de aceites - fijación con clips invisibles en lámina galvanizada calibre 22 (incluye tapas de borde de cubierta y los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se pagara según los metros cuadrados realmente instalados).
- Desmonte teja ondulada a.c.
- Desmonte cerchas y correas
- Retiro y disposicion final de material toxico (asbesto cemento)
- Suministro e instalación de estructura metalica de cubierta. Inc. Anticorrosivo y esmalte
- Canal lámina galvanizada ds = 80 cm - cal 20
- Bajante a.ll. Pvc ø 4" (inc. Accesorios)
- Ventanas aluminio corredizas + vidrio templado 5 mm.
- Lámpara 2x32 t8 bajo placa - hermetica
- Estuco
- Vinilo muros interiores 3 manos
- Esmalte s/ lamina llena
- Esmalte s/ marcos lamina

- Aseo general

INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓ

Durante el periodo del presente informe se presentaron fuertes lluvias que dificultaron el desarrollo normal de las actividades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES

Durante la ejecución del contrato en el periodo comprendido entre el 27 de agosto al 26 de diciembre de 2020 se realizaron los pagos correspondientes al sistema de seguridad social de la totalidad del personal que intervino en la ejecución tanto operarios como profesionales, en cumplimiento con las normas vigentes y CST.

ASPECTOS FINANCIEROS

A la fecha del presente informe se ha ejecutado el 100,00% del valor total del contrato con pagos correspondientes al 90.00%

3. INFORME EJECUTIVO.

INFORME EJECUTIVO

INFORME	FINAL	Periodo comprendido entre:	27/08/2020 A 26/12/2020

1. CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1577681
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
PLAZO	4 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	27 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2020


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	**14/07/2020**	**28/12/2023**	**431,568,479.00**	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**27/08/2020**	**29/12/2020**	**333,565,140.00**
CUMPLIMIENTO	27/08/2020	28/06/2021	172,627,391.60	AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONE	27/08/2020	29/12/2020	175,560,600.00
PRESTACIONES SOCIALES	27/08/2020	28/12/2023	86,313,695.80	PATRONAL	27/08/2020	29/12/2020	52,668,180.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	28/12/2020	28/12/2022	172,627,391.60	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/08/2020	29/12/2020	52,668,180.00
				VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/08/2020	29/12/2020	52,668,180.00

3. RESUMÉN DE PAGOS

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA PARCIAL # 1	29/11/2020	57,261,306.00
ACTA PARCIAL # 2	02/12/2020	182,777,655.00
ACTA PARCIAL # 3	28/12/2020	211,486,376.00
ACTA PARCIAL # 4	23/02/2021	325,330,458.00
ACTA FINAL	26/04/2021	86,279,759.00

4. CURVA S

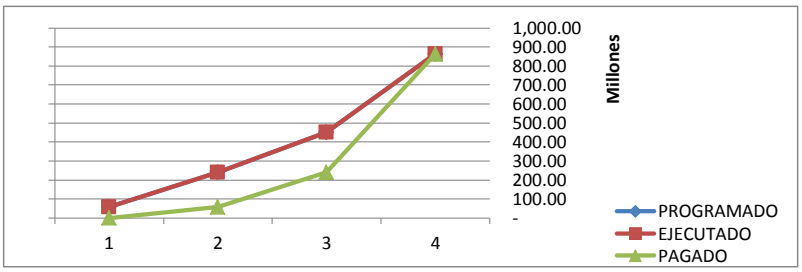

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NP 1: Relleno en sub-base granular tipo c (suministro, extendido, humedecimiento y compactación)
NP 2: Relleno base granular clase c (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación).
NP3: Columneta en concreto dimensiones 0,15m x 0,20m de 3.000 PSI
NP4: Vigueta concreto de 3000 PSI de dimensiones 0,25m x 0,25m.
NP5: Muro división en superboard acabado incluye pintura
NP6: Impermeabilización de pisos baños con membrana y aditivo
NP7: Cieloraso en láminas de PVC
NP8: Suministro e instalación de válvula empotrada de 1 1/4" de 4,8 litros para sanitario (incluye demolición de enchape y muro en el sector requerido para la correcta instalación del aparato)
NP9: Recubrimiento sintético con emulsión asfáltica sika (3 capas de 6mm de espesor)
NP10: Recubrimiento con acronal sellante sintético 1 capa y 4 capas de pintura color verde rojo y azul de norma IDRD
NP11: Suministro e instalación de válvula empotrada de 1 1/4" pico largo para lavamanos (incluye demolición de enchape y muro en el sector requerido para la correcta instalación del aparato)
NP12: Escalera metálica (no incluye concretos, ni baranda, medida la proyección en planta de huellas y descansos).
NP13: Emulsión asfáltica sika o similar, sellante de mortero existente

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

DIRECTOR DE OBRA

RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO

4. CORTE FINAL

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681 del 2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 26 DE DICIEMBRE DE 2020 A 26 DE ABRIL DE 2021

CONTRATISTA : CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

DIRECCION : CALLE 22 # 11 -81 OFICINA 301

C.C. ó NIT : 9 0 1 3 8 4 0 6 6-1

TELEFONO : 3208588834

INTERVENTOR : ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA

DIRECCION : CL 120 A No 7-36 OF 802

C.C. ó NIT : 79.780.393-2

TELEFONO : 2456144

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ESTABLECIMIENTOS : 8 SEDES
LOCALIZACION : USAQUEN - BARRIOS UNIDOS
VR. INICIAL : $ 863,136,958.00
ANTICIPO
VR. ADICIONAL :
VR. FINAL : $ 863,136,958.00

PLAZO INICIAL : 4 MESES
FECHA INICIACION : 27 DE AGOSTO DE 2020
FECHA TERMINAC.INICIAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR. :
TIEMPO SUSPENDIDO :
PLAZO TOTAL : 4 MESES
FECHA FINAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2786	02-jul-20	3487	15-jul-20	863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00
				$ 863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 86,279,759.00** OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

	ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
	I	VALOR COSTO DIRECTO DEL CONTRATO	GL	1.00	$ 671,179,594.09	$ 671,179,594.09							
		IED USAQUEN SEDE A											
1.1.8	1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2,253.00				818.68	$ 1,844,486.04	818.68	$ 1,844,486.04	
1.3.19	1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 39,291.00				498.30	$ 19,578,705.30	498.30	$ 19,578,705.30	
1.4.1	1.4.1	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 180,830.00				2.00	$ 361,660.00	2.00	$ 361,660.00	
1.4.3	1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6,159.00		13.69	$ 84,316.71	1,163.42	$ 7,165,503.78	1,177.11	$ 7,249,820.49	
2.1.6	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 39,422.00				247.66	$ 9,763,252.52	247.66	$ 9,763,252.52	
2.1.12	2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 85,206.00				45.34	$ 3,863,240.04	45.34	$ 3,863,240.04	
2.1.14	2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9,434.00				185.18	$ 1,746,988.12	185.18	$ 1,746,988.12	
2.2.11	2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 80,392.00				509.18	$ 40,933,998.56	509.18	$ 40,933,998.56	
2.3.4	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 3,026.00				1,173.81	$ 3,551,918.80	1,173.81	$ 3,551,918.80	
3.1.2	3.1.2	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	M		$ 40,303.00				109.50	$ 4,413,178.50	109.50	$ 4,413,178.50	
3.3.1	3.3.1	RELLENO GRAVILLA DE RIO	M3		$ 113,369.00				31.44	$ 3,564,321.36	31.44	$ 3,564,321.36	
3.3.4	3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	M2		$ 8,691.00				754.43	$ 6,556,751.13	754.43	$ 6,556,751.13	
3.4.4	3.4.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 729,597.00				2.00	$ 1,459,194.00	2.00	$ 1,459,194.00	
6.1.1	6.1.1	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50	M		$ 63,570.00				46.20	$ 2,936,934.00	46.20	$ 2,936,934.00	
6.1.2	6.1.2	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS)	M		$ 65,184.00				86.00	$ 5,605,824.00	86.00	$ 5,605,824.00	
10.2.8	10.2.8	ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello).	M2		$ 42,920.00				82.90	$ 3,558,068.00	82.90	$ 3,558,068.00	
18.1.7	18.1.7	VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS	M2		$ 6,684.00		2.82	$ 18,848.88	41.66	$ 278,455.44	44.48	$ 297,304.32	
20.2.6	20.2.6	JUNTAS DILATACION ASFALTO	M		$ 3,233.00				155.00	$ 501,115.00	155.00	$ 501,115.00	
20.3.6	20.3.6	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	JG		$ 5,494,207.00				1.00	$ 5,494,207.00	1.00	$ 5,494,207.00	
20.4.4	20.4.4	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2		$ 16,384.00				200.00	$ 3,276,800.00	200.00	$ 3,276,800.00	
20.5.6	20.5.6	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5).	M		$ 43,678.00				94.00	$ 4,105,732.00	94.00	$ 4,105,732.00	
21.1.1	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2,269.00				818.68	$ 1,857,584.92	818.68	$ 1,857,584.92	
		IED PANAMA SEDE A											
1.3.10	1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15,112.00				6.72	$ 101,552.64	6.72	$ 101,552.64	
1.3.19	1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 39,291.00				68.73	$ 2,700,470.43	68.73	$ 2,700,470.43	
1.3.25	1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA Ó ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 5,276.00				73.98	$ 390,318.48	73.98	$ 390,318.48	
1.3.46	1.3.46	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	M2		$ 9,512.00				14.88	$ 141,538.56	14.88	$ 141,538.56	
2.1.6	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 39,422.00		39.84	$ 1,570,572.48	22.71	$ 895,273.62	62.55	$ 2,465,846.10	
2.1.11	2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 64,092.00				22.71	$ 1,455,529.32	22.71	$ 1,455,529.32	
2.2.6	2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		$ 624,660.00				1.48	$ 924,496.80	1.48	$ 924,496.80	
2.2.11	2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 80,392.00				81.15	$ 6,523,810.80	81.15	$ 6,523,810.80	
2.3.2	2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 2,928.00				182.82	$ 535,296.96	182.82	$ 535,296.96	
2.3.4	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 3,026.00				168.79	$ 510,758.54	168.79	$ 510,758.54	
3.1.3	3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 17,037.00				11.00	$ 187,407.00	11.00	$ 187,407.00	
3.2.5	3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M		$ 23,998.00				11.00	$ 263,978.00	11.00	$ 263,978.00	
3.3.1	3.3.1	RELLENO GRAVILLA DE RIO	M3		$ 113,369.00				3.26	$ 369,582.94	3.26	$ 369,582.94	
4.3.13	4.3.13	RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm	M3		$ 685,176.00				9.26	$ 6,344,729.76	9.26	$ 6,344,729.76	

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681 del 2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 26 DE DICIEMBRE DE 2020 A 26 DE ABRIL DE 2021

CONTRATISTA : CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

DIRECCION : CALLE 22 # 11 -81 OFICINA 301

C.C. ó NIT : 9 0 1 3 8 4 0 6 6-1

TELEFONO : 3208588834

INTERVENTOR : ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA

DIRECCION : CL 120 A No 7-36 OF 802

C.C. ó NIT : 79.780.393-2

TELEFONO : 2456144

ESTABLECIMIENTOS : 8 SEDES

LOCALIZACION : USAQUEN - BARRIOS UNIDOS

VR. INICIAL : $ 863,136,958.00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 863,136,958.00

PLAZO INICIAL : 4 MESES

FECHA INICIACION : 27 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR. :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 4 MESES

FECHA FINAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2786	02-jul-20	3487	15-jul-20	863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00
				$ 863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 86,279,759.00** OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

4.4.1	4.4.1	CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI	M3		$	742,019.00					0.30	$	222,605.70	0.30	$	222,605.70	
5.2.7	5.2.7	MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm	M2		$	78,492.00					6.72	$	527,466.24	6.72	$	527,466.24	
5.4.2	5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CM		$	662.00					190.00	$	125,780.00	190.00	$	125,780.00	
6.1.13	6.1.13	PASOS PREFABRICADOS ESCALERA B = 30 cm	M		$	41,040.00		23.35	$	958,284.00				23.35	$	958,284.00	
7.4.10	7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M		$	5,236.00					6.80	$	35,604.80	6.80	$	35,604.80	
7.6.3	7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$	50,067.00					1.00	$	50,067.00	1.00	$	50,067.00	
7.7.1	7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$	60,450.00					1.00	$	60,450.00	1.00	$	60,450.00	
7.8.1	7.8.1	BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$	23,951.00					2.30	$	55,087.30	2.30	$	55,087.30	
7.12.3	7.12.3	LLAVE MANGUERA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	16,494.00					1.00	$	16,494.00	1.00	$	16,494.00	
8.1.1	8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$	70,261.00					1.00	$	70,261.00	1.00	$	70,261.00	
8.1.6	8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		$	63,946.00					2.00	$	127,892.00	2.00	$	127,892.00	
9.1.7	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$	14,087.00					6.72	$	94,664.64	6.72	$	94,664.64	
10.1.1	10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$	27,615.00					12.32	$	340,216.80	12.32	$	340,216.80	
10.2.12	10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2		$	42,428.00		0.15	$	6,364.20	9.45	$	400,944.60	9.60	$	407,308.80	
10.3.12	10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M2		$	44,977.00					11.85	$	532,977.45	11.85	$	532,977.45	
10.5.3	10.5.3	DILATACIONES LADRILLO 0.25 MORTERO 1:4	M		$	17,545.00					49.15	$	862,336.75	49.15	$	862,336.75	
11.2.35	11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$	45,643.00					10.29	$	469,666.47	10.29	$	469,666.47	
11.2.40	11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$	9,279.00					62.20	$	577,153.80	62.20	$	577,153.80	
11.3.4	11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20	M		$	38,424.00					3.00	$	115,272.00	3.00	$	115,272.00	
12.2.3	12.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UN		$	116,184.00					2.50	$	290,460.00	2.50	$	290,460.00	
12.2.4	12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2		$	343,432.00					4.20	$	1,442,414.40	4.20	$	1,442,414.40	
12.2.14	12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M		$	210,202.00		38.35	$	8,061,246.70				38.35	$	8,061,246.70	
14.1.6	14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2		$	60,304.00					25.96	$	1,565,491.84	25.96	$	1,565,491.84	
15.2.1	15.2.1	BALA FLUORESCENTE DE 50 W	UN		$	71,296.00					2.00	$	142,592.00	2.00	$	142,592.00	
18.1.7	18.1.7	VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS	M2		$	6,684.00					13.44	$	89,832.96	13.44	$	89,832.96	
18.2.4	18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M		$	6,724.00		38.35	$	257,865.40				38.35	$	257,865.40	
20.3.1	20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2		$	99,107.00					73.98	$	7,331,935.86	73.98	$	7,331,935.86	
21.1.1	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$	2,269.00		221.25	$	502,016.25				221.25	$	502,016.25	
		IED PANAMA SEDE B															
1.3.6	1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	9,504.00					40.89	$	388,618.56	40.89	$	388,618.56	
1.3.8	1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	17,207.00					16.37	$	281,678.59	16.37	$	281,678.59	
1.3.14	1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	8,860.00					41.87	$	370,968.20	41.87	$	370,968.20	
1.3.21	1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$	18,992.00					12.00	$	227,904.00	12.00	$	227,904.00	
1.3.26	1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$	28,338.00					4.00	$	113,352.00	4.00	$	113,352.00	
1.3.35	1.3.35	DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	16,744.00					5.30	$	88,743.20	5.30	$	88,743.20	
1.3.37	1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$	14,477.00		1.00	$	14,477.00	6.00	$	86,862.00	7.00	$	101,339.00	
1.3.38	1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$	5,391.00					6.00	$	32,346.00	6.00	$	32,346.00	
1.3.45	1.3.45	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS	UN		$	11,802.00		2.88	$	33,989.76	0.72	$	8,497.44	3.60	$	42,487.20	
1.3.46	1.3.46	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	M2		$	9,512.00					25.30	$	240,653.60	25.30	$	240,653.60	
1.3.48	1.3.48	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$	22,722.00					0.90	$	20,449.80	0.90	$	20,449.80	
1.3.49	1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$	10,004.00					9.00	$	90,036.00	9.00	$	90,036.00	
3.2.9	3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$	58,124.00					13.00	$	755,612.00	13.00	$	755,612.00	
5.6.4	5.6.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms	M2		$	72,913.00					17.31	$	1,262,124.03	17.31	$	1,262,124.03	
6.2.4	6.2.4	MESONES EN CONCRETO DE 40 cm	M		$	42,484.00					3.80	$	161,439.20	3.80	$	161,439.20	

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681 del 2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 26 DE DICIEMBRE DE 2020 A 26 DE ABRIL DE 2021

CONTRATISTA : CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

DIRECCION : CALLE 22 # 11 -81 OFICINA 301

C.C. ó NIT : 9 0 1 3 8 4 0 6 6-1

TELEFONO : 3208588834

INTERVENTOR : ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA

DIRECCION : CL 120 A No 7-36 OF 802

C.C. ó NIT : 79.780.393-2

TELEFONO : 2456144

ESTABLECIMIENTOS : 8 SEDES

LOCALIZACION : USAQUEN - BARRIOS UNIDOS

VR. INICIAL : $ 863,136,958.00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 863,136,958.00

PLAZO INICIAL : 4 MESES

FECHA INICIACION : 27 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR. :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 4 MESES

FECHA FINAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2786	02-jul-20	3487	15-jul-20	863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00
				$ 863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 86,279,759.00** OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

7.4.47	7.4.47	TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4"	M		$ 6,785.00					19.60	$ 132,986.00	19.60	$ 132,986.00		
7.6.3	7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 50,067.00					10.00	$ 500,670.00	10.00	$ 500,670.00		
8.1.18	8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 68,724.00					7.00	$ 481,068.00	7.00	$ 481,068.00		
8.14.17	8.14.17	INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C	UN		$ 17,048.00					4.00	$ 68,192.00	4.00	$ 68,192.00		
9.1.7	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 14,087.00					75.83	$ 1,068,217.21	75.83	$ 1,068,217.21		
10.1.1	10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 27,615.00					7.20	$ 198,828.00	7.20	$ 198,828.00		
10.2.10	10.2.10	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	M2		$ 87,691.00					8.68	$ 761,157.88	8.68	$ 761,157.88		
10.2.12	10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2		$ 42,428.00					34.80	$ 1,476,494.40	34.80	$ 1,476,494.40		
10.2.33	10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P' BAÑOS	M2		$ 47,017.00					4.23	$ 198,881.91	4.23	$ 198,881.91		
10.3.12	10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M		$ 44,977.00					30.72	$ 1,381,693.44	30.72	$ 1,381,693.44		
12.1.7	12.1.7	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2		$ 482,193.00					9.85	$ 4,749,601.05	9.85	$ 4,749,601.05		
14.1.6	14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2		$ 60,304.00					62.96	$ 3,796,739.84	62.96	$ 3,796,739.84		
14.2.4	14.2.4	GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 40 cm.	M		$ 59,009.00					3.90	$ 230,135.10	3.90	$ 230,135.10		
15.1.6	15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 186,347.00					10.00	$ 1,863,470.00	10.00	$ 1,863,470.00		
16.1.5	16.1.5	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL Ó SIMIL. (SUM E INSTALACION)	UN		$ 105,562.00					8.00	$ 844,496.00	8.00	$ 844,496.00		
16.1.23	16.1.23	LAVAMANOS NOVA 738 (SUM E INSTALACION)	UN		$ 101,812.00					8.00	$ 814,496.00	8.00	$ 814,496.00		
16.1.25	16.1.25	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P' CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR.	UN		$ 274,858.00					4.00	$ 1,099,432.00	4.00	$ 1,099,432.00		
16.1.42	16.1.42	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN		$ 307,720.00					1.00	$ 307,720.00	1.00	$ 307,720.00		
16.2.16	16.2.16	TAPARREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACION)	UN		$ 18,096.00					1.00	$ 18,096.00	1.00	$ 18,096.00		
17.2.1	17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2		$ 622,775.00					1.28	$ 797,152.00	1.28	$ 797,152.00		
18.1.3	18.1.3	ESTUCO	M2		$ 5,371.00					14.00	$ 75,194.00	14.00	$ 75,194.00		
18.1.4	18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 9,864.00					51.93	$ 512,237.52	51.93	$ 512,237.52		
18.1.5	18.1.5	FILOS Y DILATACIONES	M		$ 3,335.00					29.10	$ 97,048.50	29.10	$ 97,048.50		
18.1.8	18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		$ 9,625.00					70.75	$ 680,968.75	70.75	$ 680,968.75		
18.2.1	18.2.1	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	M2		$ 6,838.00		2.37	$ 16,206.06		2.38	$ 16,274.44	4.75	$ 32,480.50		
18.2.3	18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2		$ 14,883.00		2.37	$ 35,272.71		2.38	$ 35,421.54	4.75	$ 70,694.25		
18.2.5	18.2.5	ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	M		$ 9,534.00					5.95	$ 56,727.30	5.95	$ 56,727.30		
19.1.13	19.1.13	CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD	UN		$ 83,241.00					3.00	$ 249,723.00	3.00	$ 249,723.00		
19.3.1	19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2		$ 58,632.00					3.53	$ 206,970.96	3.53	$ 206,970.96		
21.1.1	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2,269.00					114.00	$ 258,666.00	114.00	$ 258,666.00		
		IED PANAMÁ SEDE C													
1.3.14	1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8,860.00					39.16	$ 346,957.60	39.16	$ 346,957.60		
1.3.26	1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 28,338.00					2.00	$ 56,676.00	2.00	$ 56,676.00		
1.3.28	1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 15,597.00					0.64	$ 9,982.08	0.64	$ 9,982.08		
1.3.49	1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10,004.00		1.00	$ 10,004.00		5.00	$ 50,020.00	6.00	$ 60,024.00		
2.1.6	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 39,422.00					0.55	$ 21,682.10	0.55	$ 21,682.10		
2.2.11	2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 80,392.00					3.99	$ 320,764.08	3.99	$ 320,764.08		
2.3.4	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 3,026.00					8.30	$ 25,115.80	8.30	$ 25,115.80		
3.2.5	3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M		$ 23,998.00					7.90	$ 189,584.20	7.90	$ 189,584.20		
5.2.1	5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2		$ 78,200.00					8.23	$ 643,586.00	8.23	$ 643,586.00		
5.4.2	5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CM		$ 662.00					132.00	$ 87,384.00	132.00	$ 87,384.00		
7.4.10	7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 5,236.00					45.61	$ 238,813.96	45.61	$ 238,813.96		
7.4.31	7.4.31	REGISTRO PASO DIRECTO DE 2" KITZ O SIMILAR	UN		$ 212,711.00					2.00	$ 425,422.00	2.00	$ 425,422.00		
7.6.3	7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 50,067.00					2.00	$ 100,134.00	2.00	$ 100,134.00		
7.7.1	7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$ 60,450.00					1.00	$ 60,450.00	1.00	$ 60,450.00		

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681 del 2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 26 DE DICIEMBRE DE 2020 A 26 DE ABRIL DE 2021

CONTRATISTA : CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

DIRECCION : CALLE 22 # 11 -81 OFICINA 301

C.C. ó NIT : 9 0 1 3 8 4 0 6 6-1

TELEFONO : 3208588834

INTERVENTOR : ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA

DIRECCION : CL 120 A No 7-36 OF 802

C.C. ó NIT : 79.780.393-2

TELEFONO : 2456144

ESTABLECIMIENTOS : 8 SEDES

LOCALIZACION : USAQUEN - BARRIOS UNIDOS

VR. INICIAL : $ 863,136,958.00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 863,136,958.00

PLAZO INICIAL : 4 MESES

FECHA INICIACION : 27 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR. :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 4 MESES

FECHA FINAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2786	02-jul-20	3487	15-jul-20	863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00
				$ 863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 86,279,759.00** OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

8.1.18	8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 68,724.00					20.00	$ 1,374,480.00	20.00	$ 1,374,480.00		
8.14.17	8.14.17	INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C	UN		$ 17,048.00					2.00	$ 34,096.00	2.00	$ 34,096.00		
9.1.7	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 14,087.00					56.76	$ 799,578.12	56.76	$ 799,578.12		
10.1.1	10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 27,615.00					21.99	$ 607,253.85	21.99	$ 607,253.85		
10.2.12	10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2		$ 42,428.00					21.99	$ 932,991.72	21.99	$ 932,991.72		
10.2.33	10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS	M2		$ 47,017.00					39.16	$ 1,841,185.72	39.16	$ 1,841,185.72		
10.3.12	10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M		$ 44,977.00					38.00	$ 1,709,126.00	38.00	$ 1,709,126.00		
10.3.14	10.3.14	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA	M		$ 18,855.00					18.00	$ 339,390.00	18.00	$ 339,390.00		
11.1.5	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 34,336.00					18.00	$ 618,048.00	18.00	$ 618,048.00		
12.1.8	12.1.8	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2		$ 402,729.00					2.24	$ 902,112.96	2.24	$ 902,112.96		
12.2.3	12.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UN		$ 116,184.00					4.00	$ 464,736.00	4.00	$ 464,736.00		
12.2.4	12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2		$ 343,432.00					9.82	$ 3,372,502.24	9.82	$ 3,372,502.24		
12.2.11	12.2.11	VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2		$ 199,409.00					1.70	$ 338,995.30	1.70	$ 338,995.30		
14.1.2	14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE	M2		$ 43,833.00		1.65	$ 72,324.45		12.60	$ 552,295.80	14.25	$ 624,620.25		
15.1.6	15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 186,347.00					2.00	$ 372,694.00	2.00	$ 372,694.00		
15.2.1	15.2.1	BALA FLUORESCENTE DE 50 W	UN		$ 71,296.00					18.00	$ 1,283,328.00	18.00	$ 1,283,328.00		
16.1.1	16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN		$ 36,964.00					16.00	$ 591,424.00	16.00	$ 591,424.00		
18.4.10	18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		$ 12,208.00					103.31	$ 1,261,208.48	103.31	$ 1,261,208.48		
19.1.12	19.1.12	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD	UN		$ 122,148.00					2.00	$ 244,296.00	2.00	$ 244,296.00		
19.3.1	19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2		$ 58,632.00					6.02	$ 352,964.64	6.02	$ 352,964.64		
19.3.4	19.3.4	VIDRIO CRUDO INCOLORO 5 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR	M2		$ 33,025.00					1.00	$ 33,025.00	1.00	$ 33,025.00		
21.1.1	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2,269.00					107.10	$ 243,009.90	107.10	$ 243,009.90		
21.1.15	21.1.15	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)	M		$ 187,101.00					1.20	$ 224,521.20	1.20	$ 224,521.20		
		IED AQUILEO PARRA													
1.3.6	1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9,504.00					80.20	$ 762,220.80	80.20	$ 762,220.80		
1.3.7	1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 25,112.00					6.20	$ 155,694.40	6.20	$ 155,694.40		
1.3.8	1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 17,207.00					18.22	$ 313,511.54	18.22	$ 313,511.54		
1.3.15	1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8,004.00					17.30	$ 138,469.20	17.30	$ 138,469.20		
1.3.19	1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 39,291.00					106.07	$ 4,167,596.37	106.07	$ 4,167,596.37		
1.3.21	1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 18,992.00					14.00	$ 265,888.00	14.00	$ 265,888.00		
1.3.33	1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 1,904.00					704.51	$ 1,341,387.04	704.51	$ 1,341,387.04		
2.1.6	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 39,422.00					46.60	$ 1,837,065.20	46.60	$ 1,837,065.20		
2.1.11	2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 64,092.00					98.57	$ 6,317,548.44	98.57	$ 6,317,548.44		
2.2.11	2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 80,392.00					58.40	$ 4,694,892.80	58.40	$ 4,694,892.80		
2.3.4	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 3,026.00					121.49	$ 367,628.74	121.49	$ 367,628.74		
3.2.7	3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		$ 43,559.00					56.00	$ 2,439,304.00	56.00	$ 2,439,304.00		
3.4.2	3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 395,319.00		2.00	$ 790,638.00		3.00	$ 1,185,957.00	5.00	$ 1,976,595.00		
6.2.5	6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M		$ 56,056.00					6.40	$ 358,758.40	6.40	$ 358,758.40		
7.2.1	7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN		$ 312,172.00					8.00	$ 2,497,376.00	8.00	$ 2,497,376.00		
7.4.35	7.4.35	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	UN		$ 76,254.00					2.00	$ 152,508.00	2.00	$ 152,508.00		
7.4.46	7.4.46	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"	M		$ 7,086.00					18.98	$ 134,492.28	18.98	$ 134,492.28		
7.4.50	7.4.50	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1"	M		$ 11,224.00					22.30	$ 250,295.20	22.30	$ 250,295.20		
7.6.3	7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 50,067.00					22.00	$ 1,101,474.00	22.00	$ 1,101,474.00		
7.7.1	7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$ 60,450.00		12.00	$ 725,400.00		14.00	$ 846,300.00	26.00	$ 1,571,700.00		
7.8.5	7.8.5	VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 17,884.00		0.92	$ 16,453.28		2.30	$ 41,133.20	3.22	$ 57,586.48		

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681 del 2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 26 DE DICIEMBRE DE 2020 A 26 DE ABRIL DE 2021

CONTRATISTA : CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

DIRECCION : CALLE 22 # 11 -81 OFICINA 301

C.C. ó NIT : 9 0 1 3 8 4 0 6 6-1

TELEFONO : 3208588834

INTERVENTOR : ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA

DIRECCION : CL 120 A No 7-36 OF 802

C.C. ó NIT : 79.780.393-2

TELEFONO : 2456144

ESTABLECIMIENTOS : 8 SEDES

LOCALIZACION : USAQUEN - BARRIOS UNIDOS

VR. INICIAL : $ 863,136,958.00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 863,136,958.00

PLAZO INICIAL : 4 MESES

FECHA INICIACION : 27 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR. :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 4 MESES

FECHA FINAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2786	02-jul-20	3487	15-jul-20	863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00
				$ 863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 86,279,759.00** OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

8.1.6	8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		$ 63,946.00					5.00	$ 319,730.00	5.00	$ 319,730.00		
8.14.17	8.14.17	INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C	UN		$ 17,048.00					2.00	$ 34,096.00	2.00	$ 34,096.00		
9.1.7	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 14,087.00					77.52	$ 1,092,024.24	77.52	$ 1,092,024.24		
10.1.1	10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 27,615.00					46.03	$ 1,271,118.45	46.03	$ 1,271,118.45		
10.2.25	10.2.25	TABLETA NATURAL 20 X 10 MOORE O EQUIVALENTE	M2		$ 46,638.00					17.30	$ 806,837.40	17.30	$ 806,837.40		
10.2.33	10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS	M2		$ 47,017.00					46.75	$ 2,198,044.75	46.75	$ 2,198,044.75		
10.3.12	10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M		$ 44,977.00					34.09	$ 1,533,265.93	34.09	$ 1,533,265.93		
11.1.5	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 34,336.00					704.51	$ 24,190,055.36	704.51	$ 24,190,055.36		
14.1.6	14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2		$ 60,304.00					75.00	$ 4,522,800.00	75.00	$ 4,522,800.00		
14.2.5	14.2.5	GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 60 cm.	M		$ 69,399.00					6.40	$ 444,153.60	6.40	$ 444,153.60		
15.1.6	15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 186,347.00					5.00	$ 931,735.00	5.00	$ 931,735.00		
16.1.5	16.1.5	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL Ó SIMIL. (SUM E INSTALACION)	UN		$ 105,562.00			8.00	$ 844,496.00			8.00	$ 844,496.00		
16.1.24	16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER.	UN		$ 157,024.00					8.00	$ 1,256,192.00	8.00	$ 1,256,192.00		
16.1.25	16.1.25	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR.	UN		$ 274,858.00					6.00	$ 1,649,148.00	6.00	$ 1,649,148.00		
16.1.42	16.1.42	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN		$ 307,720.00					8.00	$ 2,461,760.00	8.00	$ 2,461,760.00		
17.2.1	17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2		$ 622,775.00					30.50	$ 18,994,637.50	30.50	$ 18,994,637.50		
18.1.8	18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		$ 9,625.00					40.75	$ 392,218.75	40.75	$ 392,218.75		
19.3.1	19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2		$ 58,632.00					5.12	$ 300,195.84	5.12	$ 300,195.84		
21.1.1	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2,269.00					805.25	$ 1,827,112.25	805.25	$ 1,827,112.25		
		IED DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO													
1.3.1	1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 11,473.00			-0.90	$ 10,325.70	25.82	$ 296,232.86	24.92	$ 285,907.16		
1.3.49	1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10,004.00					2.00	$ 20,008.00	2.00	$ 20,008.00		
8.1.18	8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 68,724.00					10.00	$ 687,240.00	10.00	$ 687,240.00		
8.14.17	8.14.17	INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C	UN		$ 17,048.00					3.00	$ 51,144.00	3.00	$ 51,144.00		
11.2.20	11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y	M2		$ 139,721.00					353.52	$ 49,394,167.92	353.52	$ 49,394,167.92		
11.2.23	11.2.23	DESMONTE CANALETA 43/90	M2		$ 12,079.00					353.52	$ 4,270,168.08	353.52	$ 4,270,168.08		
11.2.30	11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG		$ 1,474.00					7,933.00	$ 11,693,242.00	7,933.00	$ 11,693,242.00		
11.2.40	11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9,279.00					2,014.53	$ 18,692,823.87	2,014.53	$ 18,692,823.87		
11.3.11	11.3.11	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DS=50 cm.	M		$ 38,287.00					80.00	$ 3,062,960.00	80.00	$ 3,062,960.00		
15.1.6	15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 186,347.00					2.00	$ 372,694.00	2.00	$ 372,694.00		
15.2.1	15.2.1	BALA FLUORESCENTE DE 50 W	UN		$ 71,296.00					8.00	$ 570,368.00	8.00	$ 570,368.00		
18.2.4	18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M		$ 6,724.00					114.24	$ 768,149.76	114.24	$ 768,149.76		
21.1.1	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2,269.00					353.52	$ 802,136.88	353.52	$ 802,136.88		
21.1.5	21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2		$ 2,085.00					15.00	$ 31,275.00	15.00	$ 31,275.00		
		IED AGUSTIN FERNANDEZ													
	1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15,112.00			0.24	$ 3,626.88	3.12	$ 47,149.44	3.36	$ 50,776.32		
	1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA Ó ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 5,276.00					90.75	$ 478,797.00	90.75	$ 478,797.00		
	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 39,422.00					9.68	$ 381,604.96	9.68	$ 381,604.96		
	2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		$ 624,660.00					5.32	$ 3,323,191.20	5.32	$ 3,323,191.20		
	2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 2,928.00					1,839.98	$ 5,387,461.44	1,839.98	$ 5,387,461.44		
	5.4.1	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CM		$ 651.00					10,487.00	$ 6,827,037.00	10,487.00	$ 6,827,037.00		
	5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CM		$ 662.00					792.00	$ 524,304.00	792.00	$ 524,304.00		
	18.1.7	VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS	M2		$ 6,684.00					122.39	$ 818,054.76	122.39	$ 818,054.76		
	20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2		$ 99,107.00					90.75	$ 8,993,960.25	90.75	$ 8,993,960.25		
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2,269.00					145.20	$ 329,458.80	145.20	$ 329,458.80		
	25.7.6	PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO	M2		$ 54,508.00					24.20	$ 1,319,093.60	24.20	$ 1,319,093.60		
		IED FRIEDRICH NAUMANN													
1.3.1	1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 11,473.00					105.43	$ 1,209,598.39	105.43	$ 1,209,598.39		
1.3.10	1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15,112.00			7.20	$ 108,806.40			7.20	$ 108,806.40		

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681 del 2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 26 DE DICIEMBRE DE 2020 A 26 DE ABRIL DE 2021

CONTRATISTA : CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

DIRECCION : CALLE 22 # 11 -81 OFICINA 301

C.C. ó NIT : 9 0 1 3 8 4 0 6 6-1

TELEFONO : 3208588834

INTERVENTOR : ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA

DIRECCION : CL 120 A No 7-36 OF 802

C.C. ó NIT : 79.780.393-2

TELEFONO : 2456144

ESTABLECIMIENTOS : 8 SEDES

LOCALIZACION : USAQUEN - BARRIOS UNIDOS

VR. INICIAL : $ 863,136,958.00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 863,136,958.00

PLAZO INICIAL : 4 MESES

FECHA INICIACION : 27 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR. :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 4 MESES

FECHA FINAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2786	02-jul-20	3487	15-jul-20	863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00
				$ 863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 86,279,759.00** OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

1.3.49	1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$	10,004.00		19.00	$	190,076.00				19.00	$ 190,076.00	
7.2.1	7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN		$	312,172.00		1.00	$	312,172.00				1.00	$ 312,172.00	
8.1.12	8.1.12	SALIDA SONIDO EN 3/4 L=5M CON CABLE POLARIZADO 2X14	UN		$	58,710.00		4.00	$	234,840.00				4.00	$ 234,840.00	
8.1.18	8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$	68,724.00					19.00	$	1,305,756.00	19.00	$ 1,305,756.00	
8.3.8	8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$	8,958.00		120.60	$	1,080,334.80				120.60	$ 1,080,334.80	
8.3.14	8.3.14	CABLEADO 1#12	M		$	2,487.00		700.00	$	1,740,900.00				700.00	$ 1,740,900.00	
8.4.3	8.4.3	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		$	462,670.00		1.00	$	462,670.00				1.00	$ 462,670.00	
8.4.7	8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		$	16,267.00		17.00	$	276,539.00				17.00	$ 276,539.00	
8.4.13	8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	UN		$	301,543.00		1.00	$	301,543.00				1.00	$ 301,543.00	
8.6.1	8.6.1	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO CERTIFICADO	M		$	4,110.00		35.00	$	143,850.00				35.00	$ 143,850.00	
8.6.4	8.6.4	SALIDA DE VOZ O DATOS EN CANALETA	UN		$	54,272.00		5.00	$	271,360.00				5.00	$ 271,360.00	
8.14.17	8.14.17	INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C	UN		$	17,048.00		4.00	$	68,192.00				4.00	$ 68,192.00	
8.14.19	8.14.19	TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO666 -N	UN		$	12,693.00		12.00	$	152,316.00				12.00	$ 152,316.00	
9.1.1	9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M		$	4,691.00		187.20	$	878,155.20				187.20	$ 878,155.20	
9.1.2	9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2		$	15,072.00		75.90	$	1,143,964.80				75.90	$ 1,143,964.80	
9.1.7	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$	14,087.00					149.73	$	2,109,246.51	149.73	$ 2,109,246.51	
10.3.5	10.3.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065	M		$	24,926.00		14.75	$	367,658.50				14.75	$ 367,658.50	
11.2.20	11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL	M2		$	139,721.00					234.00	$	32,694,714.00	234.00	$ 32,694,714.00	
11.2.26	11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$	9,292.00					234.00	$	2,174,328.00	234.00	$ 2,174,328.00	
11.2.29	11.2.29	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M		$	15,871.00		120.45	$	1,911,661.95				120.45	$ 1,911,661.95	
11.2.30	11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG		$	1,474.00		5,000.00	$	7,370,000.00				5,000.00	$ 7,370,000.00	
11.2.40	11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$	9,279.00		257.50	$	2,389,249.71	2,084.36	$	19,340,776.44	2,341.86	$ 21,730,026.15	
11.3.5	11.3.5	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20	M		$	56,796.00		25.00	$	1,419,900.00				25.00	$ 1,419,900.00	
11.3.14	11.3.14	BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M		$	25,349.00		14.00	$	354,886.00				14.00	$ 354,886.00	
12.1.1	12.1.1	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	M2		$	402,729.00					7.20	$	2,899,648.80	7.20	$ 2,899,648.80	
15.1.6	15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$	186,347.00					19.00	$	3,540,593.00	19.00	$ 3,540,593.00	
18.1.3	18.1.3	ESTUCO	M2		$	5,371.00					240.79	$	1,293,283.09	240.79	$ 1,293,283.09	
18.1.4	18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$	9,864.00					240.79	$	2,375,152.56	240.79	$ 2,375,152.56	
18.2.3	18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2		$	14,883.00		14.25	$	212,082.75				14.25	$ 212,082.75	
18.2.5	18.2.5	ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	M		$	9,534.00		17.85	$	170,181.90				17.85	$ 170,181.90	
21.1.1	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$	2,269.00		234.00	$	530,946.00				234.00	$ 530,946.00	

(ITEM NO PREVISTOS)

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
	ITEM NO PREVISTOS											
	IED USAQUEN SEDE A											
NP2	RELLENO BASE GRANULAR CLASE C (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	M3		$ 151,027.00		4.50	$ 679,621.50	140.25	$ 21,181,536.75	144.75	$ 21,861,158.25	
NP 1	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO C (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 148,320.00		17.25	$ 2,558,520.00	127.50	$ 18,910,800.00	144.75	$ 21,469,320.00	
NP9	Recubriminto sintetico con emulsion asfaltica sika (3 capas de 6mm de espesor)	M2		$ 20,409.00				420.00	$ 8,571,780.00	420.00	$ 8,571,780.00	
NP10	Recubrimiento con Acronal sellante sintetico 1 capa y 4 capas de pintura color Verde Rojo y Azul de Norma IDRD	M2		$ 24,173.00				420.00	$ 10,152,660.00	420.00	$ 10,152,660.00	
	IED PANAMA SEDE A											
NP5	Muro division en superboard acabado incluye pintura	M2		$ 149,908.00		0.64	$ 94,442.04	25.28	$ 3,789,674.24	25.92	$ 3,884,116.28	
NP7	Cieloraso en láminas de pvc	M2		$ 72,460.00		3.11	$ 225,350.60	10.40	$ 753,584.00	13.51	$ 978,934.60	
NP12	ESCALERA METÁLICA (NO INCLUYE CONCRETOS, NI BARANDA, MEDIDA LA PROYECCIÓN EN PLANTA DE HUELLAS Y DESCANSOS).	M2		$ 1,022,324.00		26.47	$ 27,060,916.28			26.47	$ 27,060,916.28	
	IED PANAMA SEDE B											
NP5	Muro division en superboard acabado incluye pintura	M2		$ 149,908.00				1.88	$ 281,827.04	1.88	$ 281,827.04	
	IED PANAMÁ SEDE C											

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681 del 2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 26 DE DICIEMBRE DE 2020 A 26 DE ABRIL DE 2021

CONTRATISTA : CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

DIRECCION : CALLE 22 # 11 -81 OFICINA 301

C.C. ó NIT : 9 0 1 3 8 4 0 6 6-1

TELEFONO : 3208588834

INTERVENTOR : ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA

DIRECCION : CL 120 A No 7-36 OF 802

C.C. ó NIT : 79.780.393-2

TELEFONO : 2456144

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ESTABLECIMIENTOS : 8 SEDES

LOCALIZACION : USAQUEN - BARRIOS UNIDOS

VR. INICIAL : $ 863,136,958.00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 863,136,958.00

PLAZO INICIAL : 4 MESES

FECHA INICIACION : 27 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR. :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 4 MESES

FECHA FINAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2786	02-jul-20	3487	15-jul-20	863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00
				$ 863,136,958.00	$ 86,281,163.00	$ 86,279,759.00	$ 1,404.00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 86,279,759.00** OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

NP6	Impermeabilizacion de pisos baños con membrana y aditivo	M2		$ 48,589.00		-2.50	$ 121,472.50	44.70	$ 2,171,928.30	42.20	$ 2,050,455.80			
NP7	Cieloraso en láminas de pvc	M2		$ 72,460.00		6.76	$ 489,829.60	39.16	$ 2,837,533.60	45.92	$ 3,327,363.20			
NP3	Columneta en concreto dimensiones 0,15M x 0,20M de 3.000 PSI	M		$ 52,759.00				3.05	$ 160,914.95	3.05	$ 160,914.95			
NP8	Suministro e instalacion de valvula empotrada de 1 1/4" de 4,8 litros para sanitario (Incluye demolicion de enchape y muro en el sector requerido para la correcta instalacion del aparato)	UN		$ 428,037.00				18.00	$ 7,704,666.00	18.00	$ 7,704,666.00			
NP11	Suministro e instalacion de valvula empotrada de 1 1/4" pico largo para lavamanos (Incluye demolicion de enchape y muro en el sector requerido para la correcta instalacion del aparato)	UN		$ 522,282.00				20.00	$ 10,445,640.00	20.00	$ 10,445,640.00			
NP13	emulsion asfaltica sika o similar, sellante de mortero existente	M2		$ 12,930.00				18.00	$ 232,740.00	18.00	$ 232,740.00			
	IED AQUILEO PARRA													
NP13	emulsion asfaltica sika o similar, sellante de mortero existente	M2		$ 12,930.00				704.51	$ 9,109,314.30	704.51	$ 9,109,314.30			
	IED DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO													
NP7	Cieloraso en láminas de pvc	M2		$ 72,460.00				25.82	$ 1,870,917.20	25.82	$ 1,870,917.20			
	IED AGUSTIN FERNANDEZ													
NP4	VIGUETA CONCRETO DE 3000 PSI DE DIMENSIONES 0,25M x 0,25M.	M		$ 69,226.00				60.50	$ 4,188,173.00	60.50	$ 4,188,173.00			
NP3	COLUMNETA EN CONCRETO DIMENSIONES 0,15M x 0,20M DE 3000 PSI.	M		$ 52,759.00				48.42	$ 2,554,590.78	48.42	$ 2,554,590.78			
	COSTO DIRECTO CONTRATO				**$ 671,179,594.09**		**$ 67,091,570.59**		**$ 604,086,933.63**		**$ 671,178,504.22**	**100.00%**		

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO	**$ 671,179,594.09**	**$ 67,091,570.59**	**$ 604,086,933.63**	**$ 671,178,504.22**	**100.00%**
A. I. U. (28.6%)	**$ 191,957,363.91**	**$ 19,188,189.19**	**$ 172,768,863.01**	**$ 191,957,052.20**	**100.00%**
VALOR TOTAL	**$ 863,136,958.00**	**$ 86,279,759.78**	**$ 776,855,796.64**	**$ 863,135,556.42**	**100.00%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )					
VALOR A PAGAR		**$ 86,279,759.78**	**$ 776,855,796.64**	**$ 863,135,556.42**	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA		**$ 0.78**	**$ 1.64**	**$ 2.42**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		**$ 86,279,759.00**	**$ 776,855,795.00**	**$ 863,135,554.00**	

SALDO DEL CONTRATO	$ 1,404.00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 1,404.00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE**
C.C. O NIT : 9 0 1 3 8 4 0 6 6-1
REP. LEGAL : DIANA ANDREA GAONA Ávila
C.C. : 40.048.703 de Tunja

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA**
C.C. O NIT : 79.780.393-2
REP. LEGAL : ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA
C.C. : 79,780,393

4.2. MEMORIAS DE CANTIDADES .

4.2.1. MEMORIAS DE CÁLCULO IED USAQUÉN SEDE A

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CANCHA	30.00	17.00			510.00				-	510.00
1. INGRESO ADOQUIN	3.70	18.60			68.82				-	68.82
2. INGRESO ADOQUIN	8.80	1.60			14.08				-	14.08
COSTADO SUR TARIMA	4.10	2.40			9.84	1.00	0.80		-0.80	9.04
COSTADO NORTE TARIMA	4.10	2.40			9.84	1.00	0.80		-0.80	9.04
CENTRO TARIMA	7.00	1.10			7.70				-	7.70
EMPRADIZADA COSTADO SUR ORIENTAL CANCHA	200.00				200.00				-	200.00
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	818.68

CROQUIS

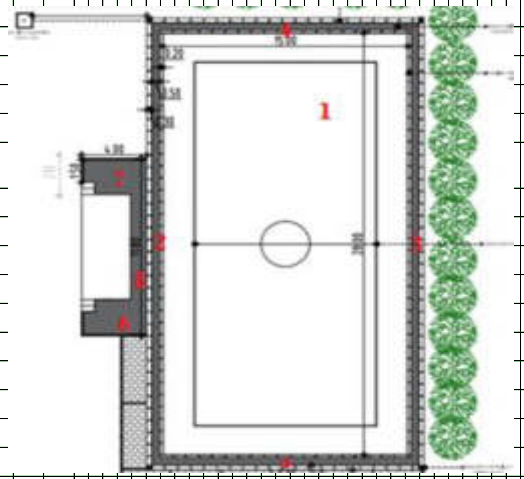

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cancha deportiva	28.00	16.80			470.40				-	470.40
area placa tarima	7.00	1.50			10.50				-	10.50
area placa tarima	4.40	3.00			13.20					13.20
area placa tarima	3.00	1.40			4.20					4.20
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	498.30

CROQUIS

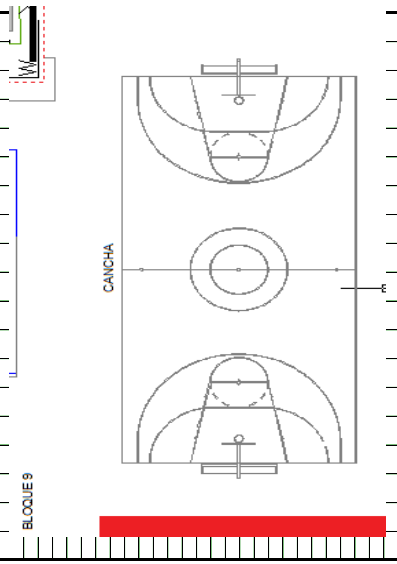

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C.

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681


DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA PARCIAL

INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.4.1	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	cantidad		L	a	h			
Cancha deportiva				2.00	2.00					2.00	
					-				-	-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	2.00	

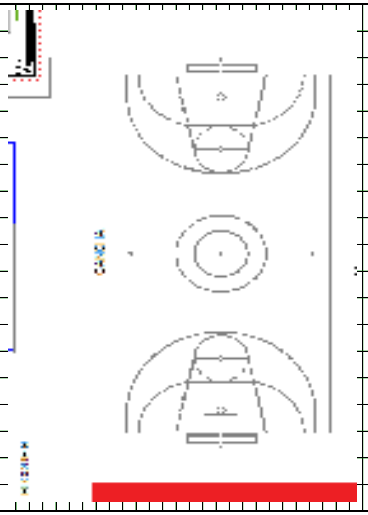

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C.


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	cantidad		L	a	h		
excavación										
excavación										
CANCHA	30.00	17.00	0.52	2.00	530.40				-	530.40
1. INGRESO ADOQUIN	3.70	18.60	0.52	2.00	71.57				-	71.57
1. INGRESO ADOQUIN	8.80	1.60	0.52	2.00	14.64				-	14.64
COSTADO SUR TARIMA	4.10	2.40	0.52	2.00	10.23	1.00	0.80		-0.80	9.43
COSTADO NORTE TARIMA	4.10	2.40	0.52	2.00	10.23	1.00	0.80		-0.80	9.43
CENTRO TARIMA	7.00	1.10	0.52	2.00	8.01				-	8.01
relleno					-					-
base granular cancha	30.00	17.00	0.22	2.00	224.40				-	224.40
sub-base granular cancha	30.00	17.00	0.20	2.00	204.00				-	204.00
1. INGRESO ADOQUIN	3.70	18.60	0.31	2.00	42.67				-	42.67
2. INGRESO ADOQUIN	8.80	1.60	0.31	2.00	8.73				-	8.73
COSTADO SUR TARIMA	4.10	2.40	0.40	2.00	7.87	-1.00	-0.80		-0.80	7.07
COSTADO NORTE TARIMA	4.10	2.40	0.40	2.00	7.87	-1.00	-0.80		-0.80	7.07
CENTRO TARIMA	7.00	1.10	0.40	2.00	6.16					6.16
adoquin costado norte	3.70	18.00	0.06	2.00	7.99					7.99
adoquin costado sur	8.00	1.60	0.06	2.00	1.54					1.54
Prado	200.00	0.12							24.00	24.00
									TOTAL	1177.11

CROQUIS

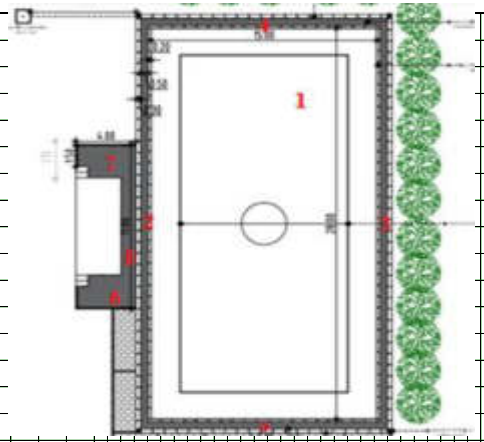

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	FE		L	a	h		
Cancha deportiva	28.00	16.80	0.40	1.00	188.16					188.16
area placa tarima	7.00	1.50	0.40	1.00	4.20				-	4.20
area placa tarima	4.40	3.00	0.40	1.00	5.28					5.28
area placa tarima	3.00	1.40	0.40	1.00	1.68					1.68
cajas	1.00	1.00	1.50	2.00	3.00					3.00
1. INGRESO ADOQUIN	3.70	18.60	0.31	1.25	26.67				-	26.67
2. INGRESO ADOQUIN	8.80	1.60	0.31	1.25	5.46				-	5.46
COSTADO SUR TARIMA	4.10	2.40	0.40	1.25	4.92	-1.00	-0.80	0.30	-0.24	4.68
COSTADO NORTE TARIMA	4.10	2.40	0.40	1.25	4.92	-1.00	-0.80	0.30	-0.24	4.68
CENTRO TARIMA	7.00	1.10	0.40	1.25	3.85					3.85
					-					
									TOTAL	247.66

CROQUIS

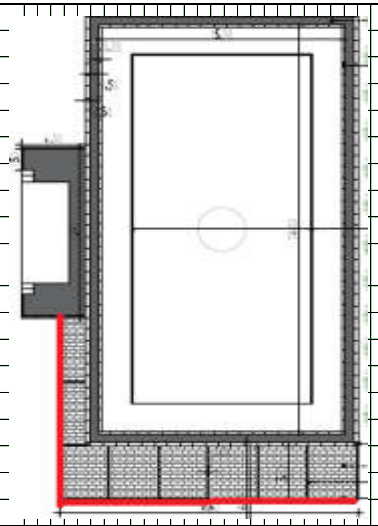

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	2	CIMENTACION	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	FC		L	a	h		
1. INGRESO ADOQUIN	3.70	18.60	0.31	1.25	26.67				-	26.67
2. INGRESO ADOQUIN	8.80	1.60	0.31	1.25	5.46				-	5.46
COSTADO SUR TARIMA	4.10	2.40	0.40	1.25	4.92	1.00	0.80	0.30	-0.24	4.68
COSTADO NORTE TARIMA	4.10	2.40	0.40	1.25	4.92	1.00	0.80	0.30	-0.24	4.68
CENTRO TARIMA	7.00	1.10	0.40	1.25	3.85				-	3.85
					-					
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	45.34

CROQUIS

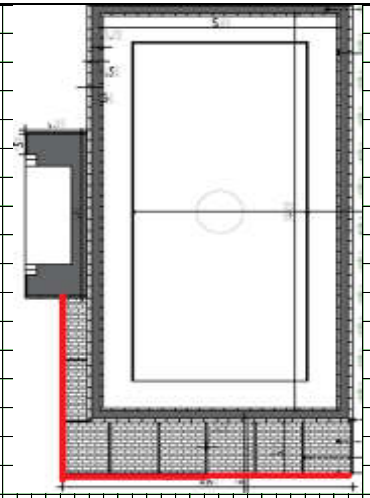

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CANCHA	30.00	17.00	0.15		76.50				-	76.50
1. INGRESO ADOQUIN	3.70	18.60	0.15		68.82				-	68.82
1. INGRESO ADOQUIN	8.80	1.60	0.15		14.08				-	14.08
COSTADO SUR TARIMA	4.10	2.40	0.15		9.84	1.00	0.80		-0.80	9.04
COSTADO NORTE TARIMA	4.10	2.40	0.15		9.84	1.00	0.80		-0.80	9.04
CENTRO TARIMA	7.00	1.10	0.15		7.70				-	7.70
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	185.18

CROQUIS

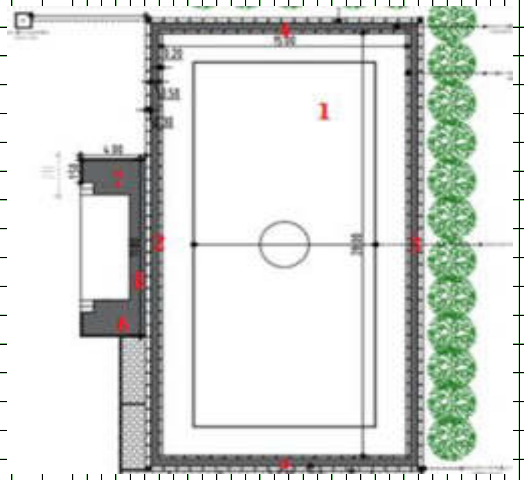

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA ESCALERA		L	a	h		
cancha	28.00	15.00			420.00				-	420.00
franja perimetral cancha (2,3,4,5)	94.00	0.50			47.00				-	47.00
Costado sur tarima (7)	4.10	2.40			9.84	-1.00	-0.80		-0.80	9.04
Costado norte tarima (6)	4.10	2.40			9.84	-1.00	-0.80		-0.80	9.04
Centro tarima (8)	7.00	1.10			7.70				-	7.70
Placa cuarto de vigilancia	4.00	4.00			16.00				-	16.00
escalón costado norte tarima	1.00	0.40			0.40				-	0.40
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	509.18

CROQUIS

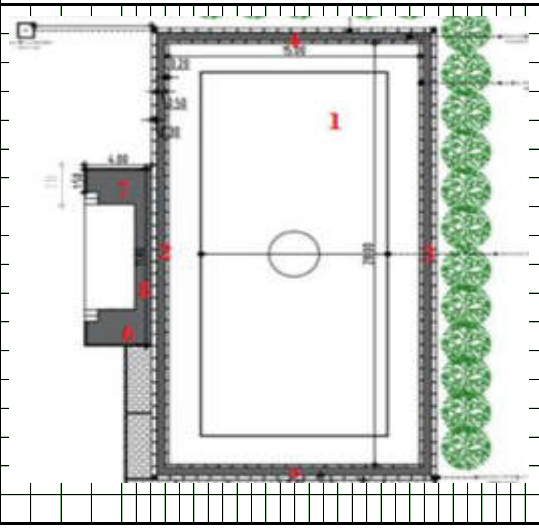

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	UND	KG		L	a	h		
1. Cancha deportiva	28.00	15.00	1.00		420.00				-	420.00
Franja perimetral cancha	94.00	0.50	1.00		47.00				-	47.00
costado sur tarima	4.10	2.40	1.00		9.84	-1.00	-0.80		-0.80	9.04
Costado norte tarima	4.10	2.40	1.00		9.84	-1.00	-0.80		-0.80	9.04
centro tarima	7.00	1.10	1.00		7.70				-	7.70
Traslapos cancha sur norte	0.30	28.00	6.00		50.40				-	50.40
Traslapos cancha Oriente-Occidente	0.30	15.00	4.00		18.00				-	18.00
Traslapos franja perimetral	0.30	0.50	14.00		2.10				-	2.10
Traslapos tarima central	0.30	7.00	0.50		1.05					1.05
					-					-
area total	564.33			2.08	1,173.81					1,173.81
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	1173.81

CROQUIS

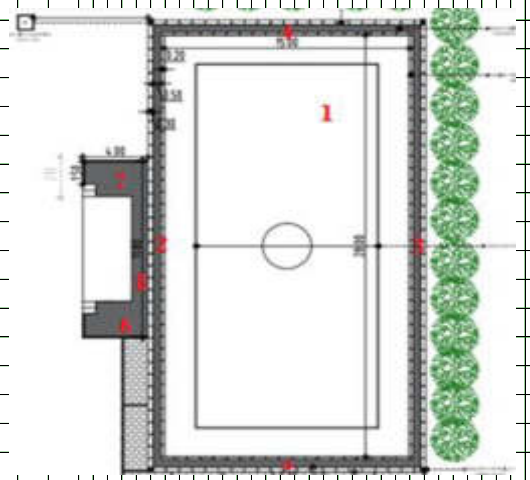

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.1.2	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. borde de cancha costado oriental	30.00				30.00				-	30.00
2. borde de cancha costado occidental	30.00				30.00					30.00
3. borde de cancha costado sur	17.00				17.00					17.00
4. borde de cancha costado norte	17.00				17.00					17.00
5. cancha a caja	8.50				8.50					8.50
6. cancha a caja	7.00				7.00					7.00
					-					-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	109.50

CROQUIS

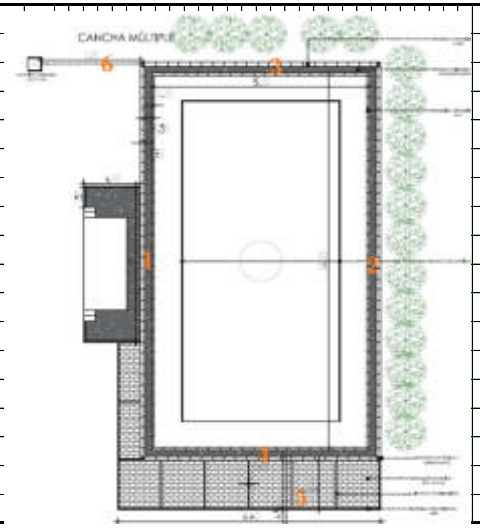

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.3.1	RELLENO GRAVILLA DE RIO	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. borde de cancha costado oriental	29.40	0.50	0.60		8.82				-	8.82
2. borde de cancha costado occidental	29.40	0.50	0.60		8.82					8.82
3. borde de cancha costado sur	15.00	0.50	0.60		4.50					4.50
4. borde de cancha costado norte	15.00	0.50	0.60		4.50					4.50
5. cancha a caja	9.00	0.50	0.60		2.70					2.70
6. cancha a caja	7.00	0.50	0.60		2.10					2.10
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	31.44

CROQUIS

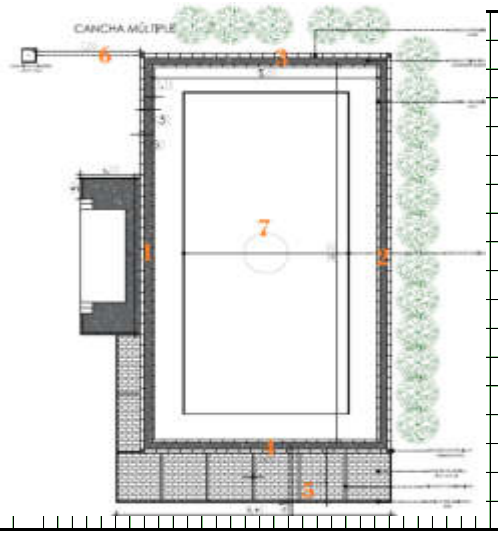

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CANCHA	30.00	17.00			510.00				-	510.00
TRASLAPOS	30.00	0.30		4.00	9.00				-	9.00
FILTRO	109.50	2.00		1.00	219.00					219.00
TRASLAPOS	109.50	0.15		1.00	16.43					16.43
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	754.43

CROQUIS

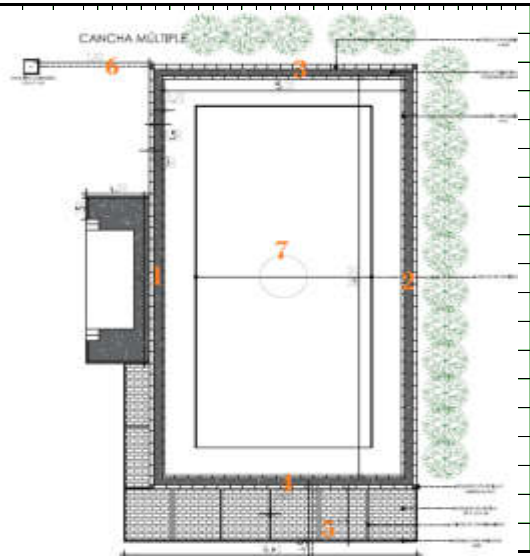

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.4.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS CANTIDAD				V. PARCIAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
5. cancha a caja sur	1.00				1.00				-	1.00
6. cancha a caja norte	1.00				1.00					1.00
										-
										-
										-
										-
					-					
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	2.00

CROQUIS

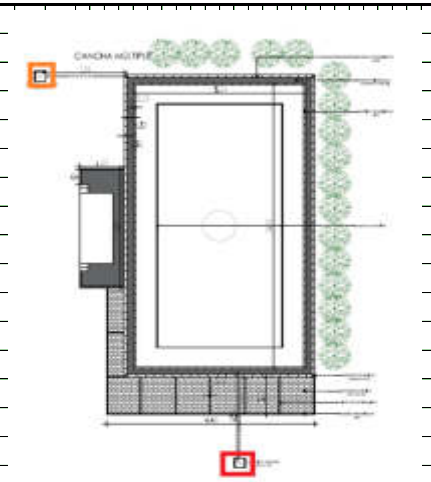

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	6.1.1	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	largo				L	a	h		
Costado sur tarima	4.10	2.40			6.50	-0.80			-0.80	5.70
Costado norte tarima	4.10	2.40			6.50	-0.80			-0.80	5.70
1. Ingreso en adoquín	3.70	18.60			22.30				-	22.30
2. Ingreso en adoquín	3.70	8.80			12.50				-	12.50
					-				-	-
					-				-	-
									-	-
									-	-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	46.20

CROQUIS

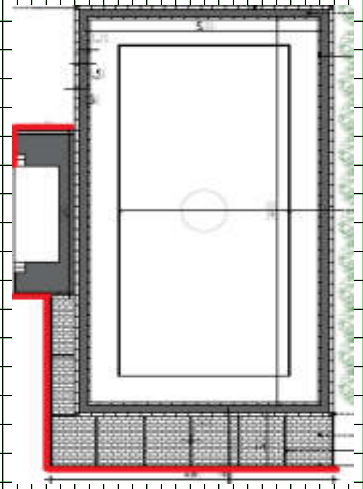

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	6.1.2	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	largo				L	a	h		
1. borde de cancha costado oriental	28.00				28.00				-	28.00
2. borde de cancha costado occidental	28.00				28.00				-	28.00
3. borde de cancha costado sur	15.00				15.00					15.00
4. borde de cancha costado norte	15.00				15.00					15.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	86.00

CROQUIS

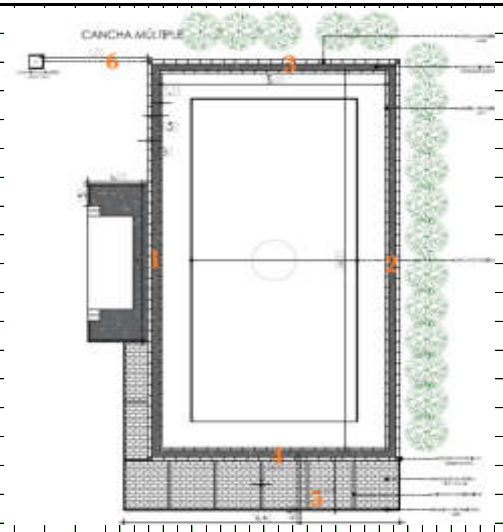

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.2.8	ADOQUIN LADRILLO MACIZO STA/FE Ó SIMILAR	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			L	a	h		
1. INGRESO ADOQUIN	3.70	18.60			68.82				-	68.82
2. INGRESO ADOQUIN	8.80	1.60			14.08				-	14.08
										-
										-
									-	-
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					-
					-					
					-					
TOTAL										82.90

CROQUIS

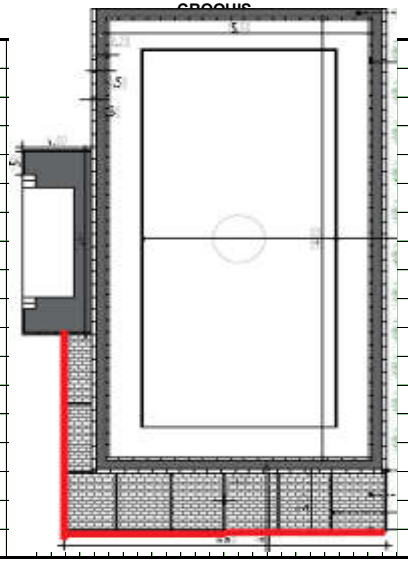

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.7	VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	cantidad		L	a	h		
tarima canhca	5.50		1.94		10.67				-	10.67
tarima canhca	3.50	7.06			24.71				-	24.71
tarima canhca	13.16		0.60		7.90				-	7.90
tarima canhca	0.30	1.00		4.00	1.20				-	1.20
					-					-
					-					
									TOTAL	44.48

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	20	OBRAS EXTERIORES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.2.6	JUNTAS DILATACION ASFALTO	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO			CANTIDAD		L	a	h			
CANCHA	28.00			5.00	140.00				-	140.00	
CANCHA	15.00			10.00	15.00				-	15.00	
					-					-	
					-					-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
									TOTAL	155.00	

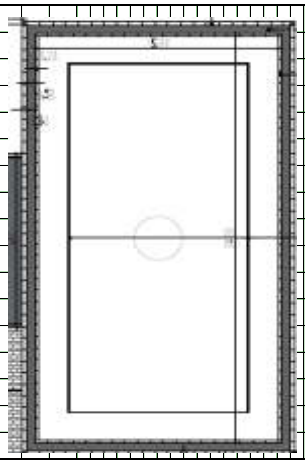

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	20	OBRAS EXTERIORES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.3.6	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO	UND	JG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS CANTIDAD				V. PARCIAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
CANCHA	1.00				1.00				-	1.00
					-				-	-
					-					-
					-					-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	1.00

CROQUIS

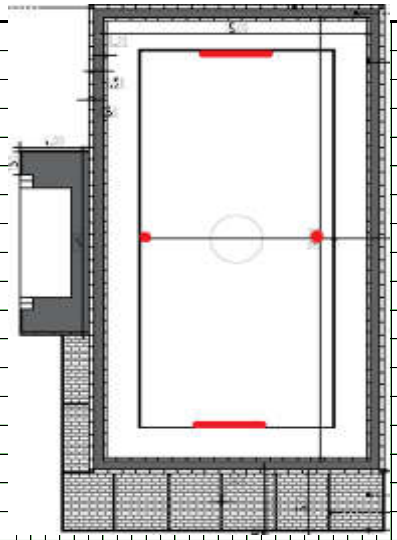

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		


CAPITULO	2	CIMENTACION	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.4.4	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	area	ANCHO	ALTO	FC		L	a	h		
cancha	200.00				200.00				-	200.00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	200.00

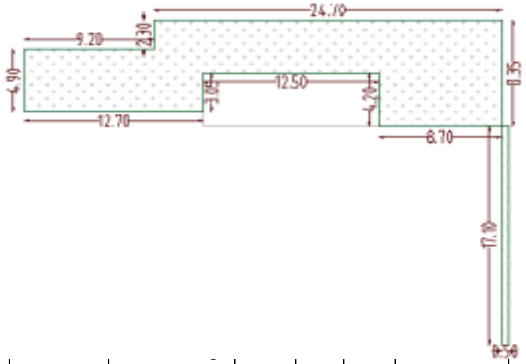

CROQUIS

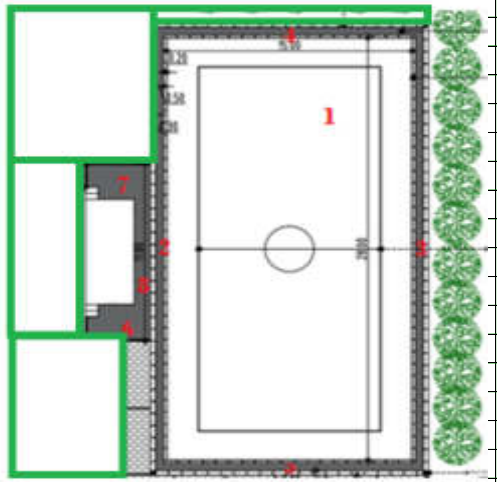

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	20	OBRAS EXTERIORES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.5.6	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5).	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. borde de cancha costado oriental	30.00				30.00				-	30.00
2. borde de cancha costado occidental	30.00				30.00				-	30.00
3. borde de cancha costado sur	17.00				17.00					17.00
4. borde de cancha costado norte	17.00				17.00					17.00
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	94.00

CROQUIS

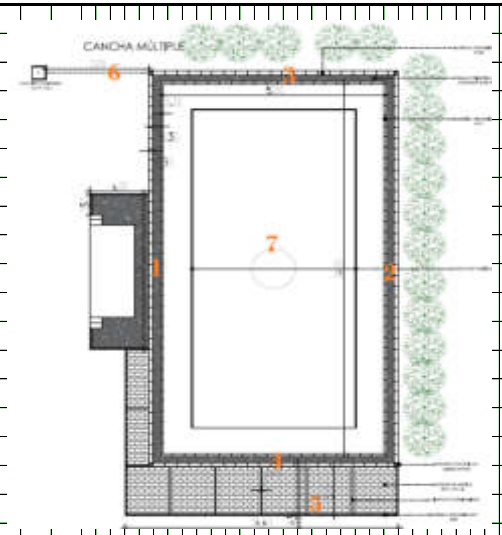

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	2	CIMENTACION	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	21.1.1	ASEO GENERAL	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTO	FC		L	a	h		
CANCHA	30.00	17.00			510.00				-	510.00
1. INGRESO ADOQUIN	3.70	18.60			68.82				-	68.82
2. INGRESO ADOQUIN	8.80	1.60			14.08				-	14.08
COSTADO SUR TARIMA	4.10	2.40			9.84	1.00	0.80		-0.80	9.04
COSTADO NORTE TARIMA	4.10	2.40			9.84	1.00	0.80		-0.80	9.04
CENTRO TARIMA	7.00	1.10			7.70				-	7.70
	area									-
prado	200.00				200.00					200.00
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	818.68

CROQUIS

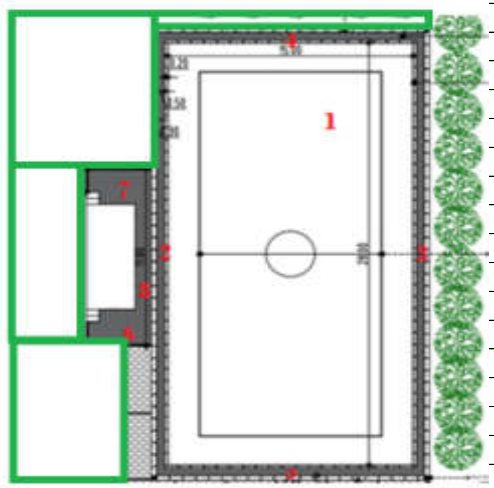

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	NP1	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO C (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	alto	fc		L	a	h			
CANCHA	30.00	17.00	0.23	1.25	144.75				-	144.75	
									-	-	
					-					-	
					-					-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	144.75	

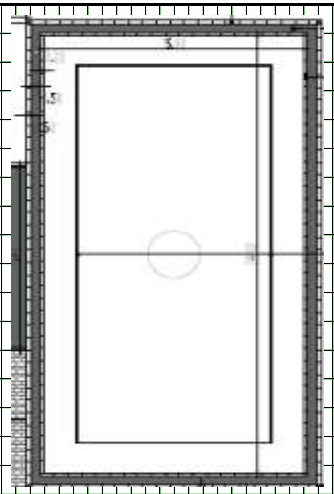

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	NP2	RELLENO BASE GRANULAR CLASE C (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	alto	fc		L	a	h		
CANCHA	30.00	17.00	0.23	1.25	144.75				-	144.75
									-	-
					-					-
					-					-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	144.75

CROQUIS

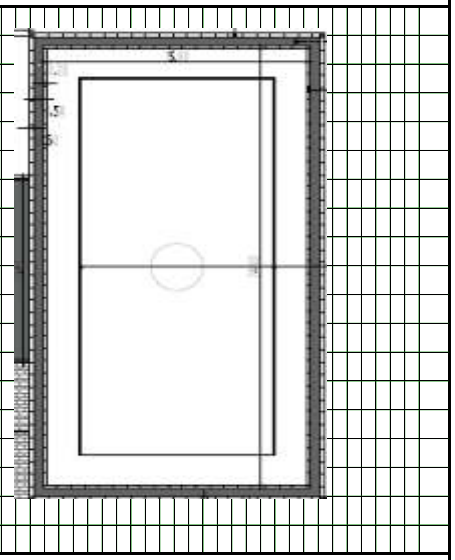

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	NP9	Recubriminto sintetico con emulsion asfaltica sika (3 capas de 6mm de espesor)	UND	M2	REF.	HOJA 1	DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO			V. PARCIAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
CANCHA	28.00	15.00			420.00				-	420.00
									-	-
					-					-
					-					-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	420.00

CROQUIS

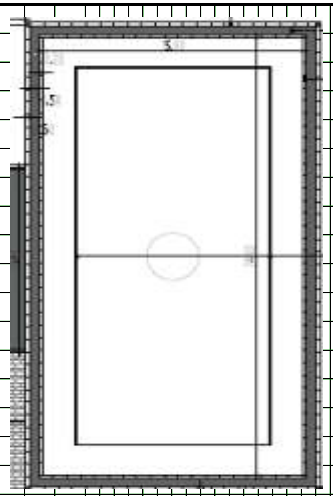

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	NP10	Recubrimiento con Acronal sellante sintetico 1 capa y 4 capas de pintura color Verde Rojo y Azul de	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO				L	a	h		
CANCHA	28.00	15.00			420.00				-	420.00
									-	-
					-					-
					-					-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	420.00

CROQUIS

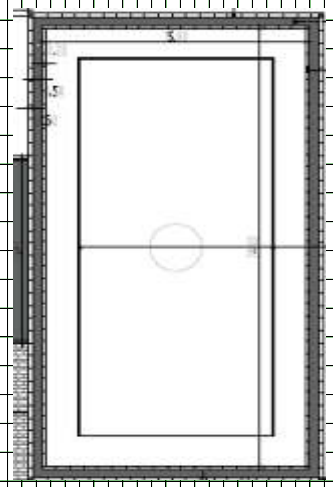

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

4.2.2. MEMORIAS DE CÁLCULO IED PANAMÁ SEDE A.

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muro de cerramiento	2.80	2.40			6.72				-	6.72	
					-				-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	6.72	

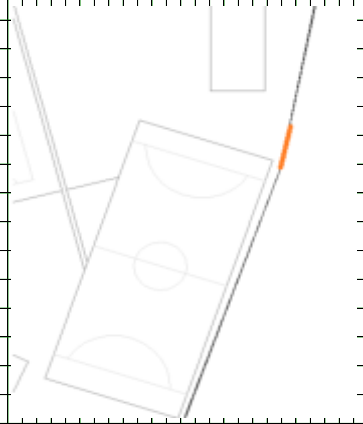

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. Placas Existentes	7.38	3.28			24.21				-	24.21
2. Placa Rampa	7.38	2.08			15.35	2.62	0.87		-2.28	13.07
3. Ingreso Cuarto de basuras	4.18	4.67			19.52					19.52
4. Cuarto de basuras	4.15	2.17			9.02					9.02
4.1. Cuarto de basuras	4.15		0.70		2.91					2.91
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	68.73

CROQUIS

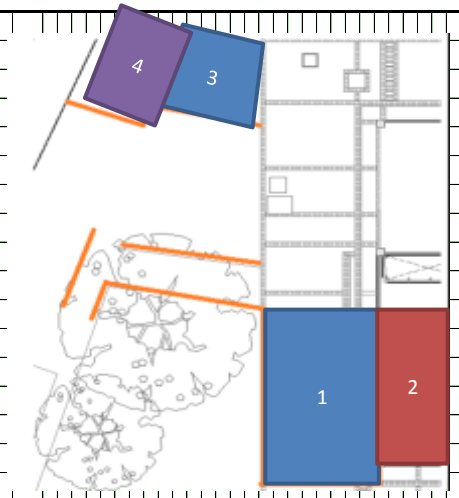

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA Ó ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cerramiento costado Oriental	49.32	1.50			73.98					73.98
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	73.98

CROQUIS

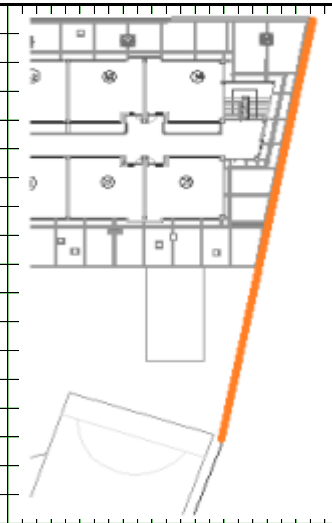

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA Ó ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras	6.20	2.40			14.88					14.88
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	14.88

CROQUIS

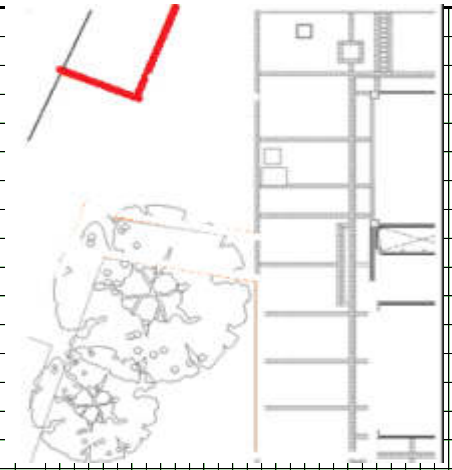

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	UND	M3	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. Placas Existentes	7.38	3.28	0.30		7.26				-	7.26
2. Placa Rampa	7.38	2.08	0.20		3.07	2.62	0.87		-2.28	0.79
3. Ingreso Cuarto de basuras	7.90	0.50	0.70		2.77					2.77
4. Cuarto de basuras	4.15	2.17	0.20		1.80					1.80
4.1. Cuarto de basuras	4.15	0.67	0.20		0.56					0.56
5. Acceso Colegio	10.08	2.10	0.45		9.53					9.53
6. PARQUEADERO CARROS	9.60	4.15	0.35		39.84					39.84
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	62.55

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. Placas Existentes	7.38	3.28	0.30		7.26				-	7.26
2. Placa Rampa	7.38	2.08	0.20		3.07	2.62	0.87		-2.28	0.79
3. Ingreso Cuarto de basuras	7.90	0.50	0.70		2.77					2.77
4. Cuarto de basuras	4.15	2.17	0.20		1.80					1.80
4.1. Cuarto de basuras	4.15	0.67	0.20		0.56					0.56
5. Acceso Colegio	10.08	2.10	0.45		9.53					9.53
					-					
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	22.71

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso principal	15.00	0.20	0.25		0.75					0.75
acceso principal	18.20	0.20	0.20		0.73					0.73
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	1.48

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. Placas Existentes	7.38	3.28			24.21				-	24.21
2. Placa Rampa	7.38	2.08			15.35	2.62	0.87		-3.49	11.86
3. Ingreso Cuarto de basuras	10.63	0.50			5.32					5.32
4. Cuarto de basuras	4.15	2.17			9.01					9.01
4.1. Cuarto de basuras	4.15	0.67			1.39					1.39
5. Acceso Colegio	10.08	2.10			21.17					21.17
6 Acceso Puerta salones	4.10	2.00			8.20					8.20
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	81.15

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	kg	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
acceso principal	182.82				182.82					182.82	
					-					-	
										-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	182.82	

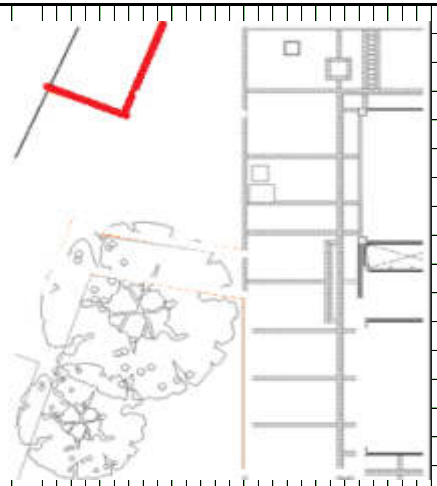

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.Cuarto de basuras	24.21	2.08			50.35					50.35
2. acceso peatonal	11.86	2.08			24.67					24.67
3. acceso peatonal	5.32	2.08			11.06					11.06
4. acceso peatonal	9.01	2.08			18.73					18.73
5. acceso peatonal	1.39	2.08			2.89					2.89
6. acceso peatonal	21.17	2.08			44.03					44.03
7. acceso peatonal	8.20	2.08			17.06					17.06
MALLA PESO 2.08*m2					-					
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
					-					
					-					
									TOTAL	168.79

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	3	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	largo	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso principal	11.00				11.00					11.00
					-					-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	11.00

CROQUIS

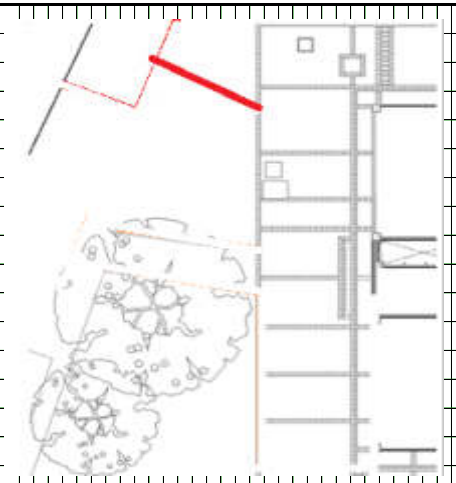

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	3	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	largo	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso principal	11.00				11.00					11.00
					-					-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	11.00

CROQUIS

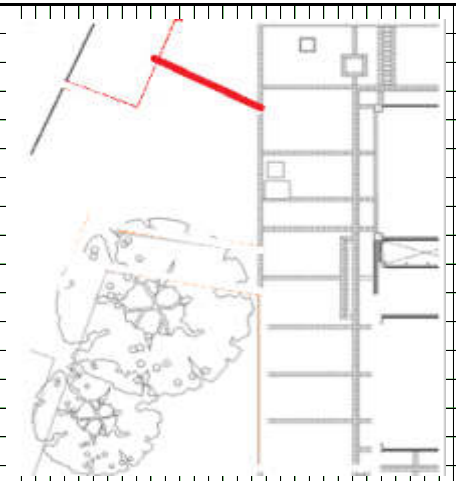

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	3	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.3.1	RELLENO GRAVILLA DE RIO	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	largo	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso peatonal	27.15	0.12			3.26				-	3.26
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	3.26

CROQUIS

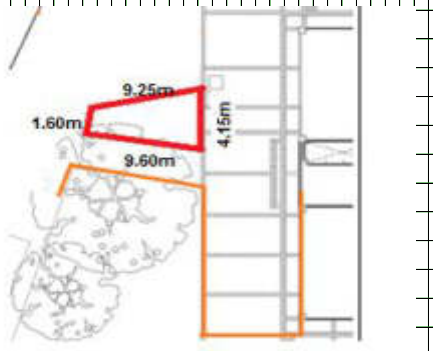

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 5 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.3.13	RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso peatonal	4.52	2.05			9.26					9.26
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	9.26

CROQUIS

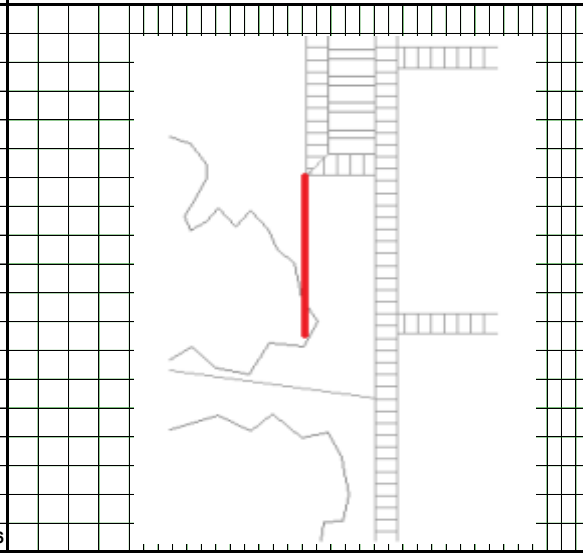

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.4.1	CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso peatonal	4.30	0.28	0.25		0.30					0.30
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	0.30

CROQUIS

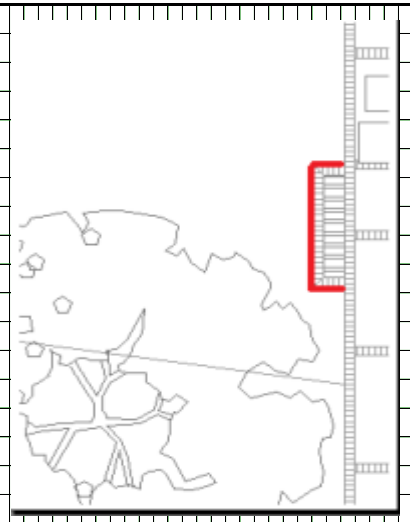

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.2.7	MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muro de cerramiento	2.80	2.40			6.72				-	6.72	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
									TOTAL	6.72	

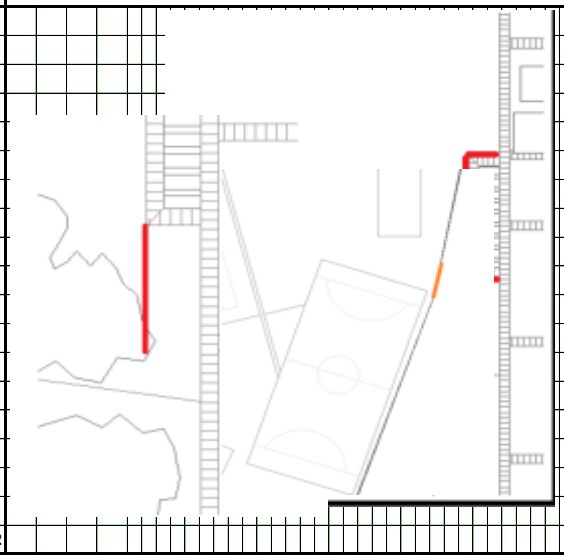

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UND	CM	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
muro de cerramiento	11.00			7.00	77.00					77.00
rampaacceso peatonal	5.00			21.00	105.00					105.00
Cuarto de basuras	4.00			2.00	8.00					8.00
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	190.00

CROQUIS

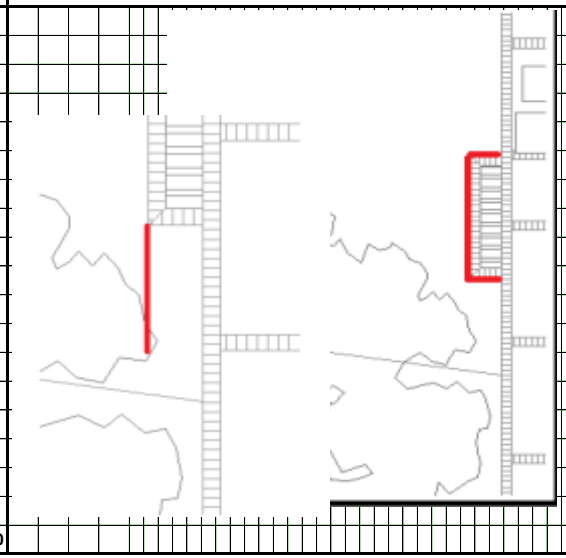

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	6.1.13	PASOS PREFABRICADOS ESCALERA B = 30 cm	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
escalera metálica del 2 a 3	1.33	0.30		17.00	6.78					6.78
escalera metálica del 1 a 2	1.33	0.30		17.00	6.78					6.78
llegada a 3er piso	1.33	0.55		1.00	0.73					0.73
descanso entre 2 y 3	1.84	2.94		1.00	5.41					5.41
descanso entre 1 y 2	1.24	2.94		1.00	3.65					3.65
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
										-
									TOTAL	23.35

CROQUIS

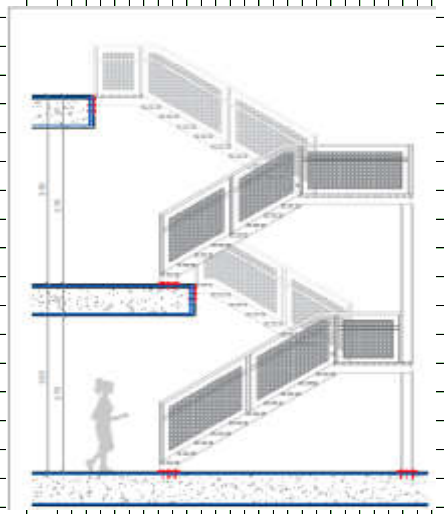

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE BASURAS	6.80				6.80				-	6.80
muro cuarto de basuras									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	6.80

CROQUIS

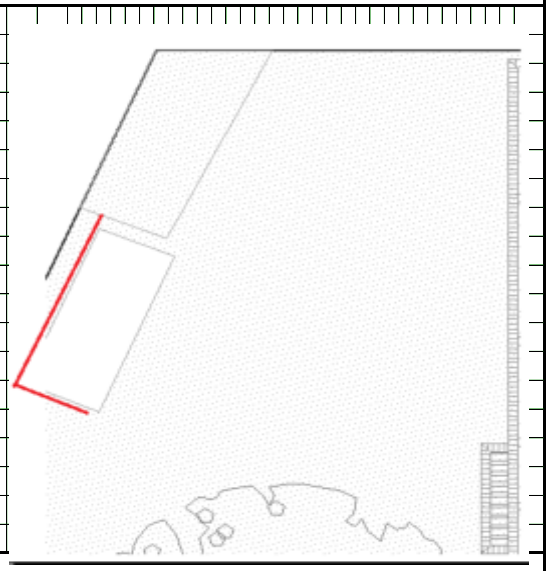

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE BASURAS	1.00				1.00				-	1.00
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	1.00

CROQUIS

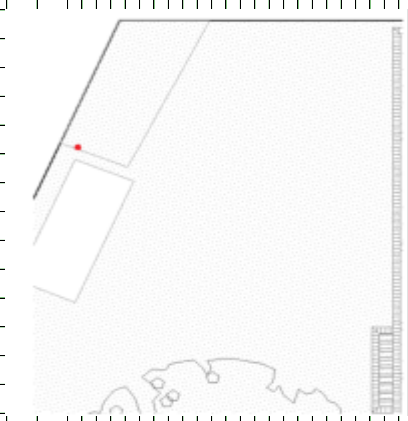

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE BASURAS	1.00				1.00				-	1.00
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	1.00

CROQUIS

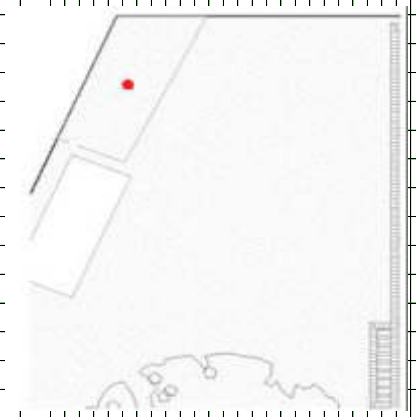

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.8.1	BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE BASURAS	2.30				2.30				-	2.30
muro cuarto de basuras									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	2.30

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	7	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.12.3	LLAVE MANGUERA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE BASURAS				1.00	1.00				-	1.00
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	1.00

CROQUIS

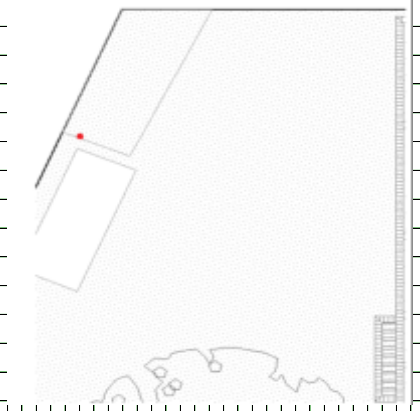

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE BASURAS				1.00	1.00				-	1.00
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	1.00

CROQUIS

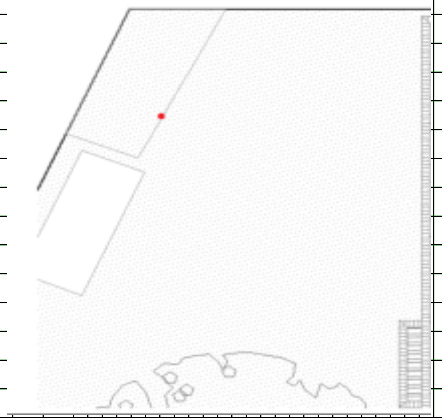

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE BASURAS				2.00	2.00				-	2.00
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	2.00

CROQUIS

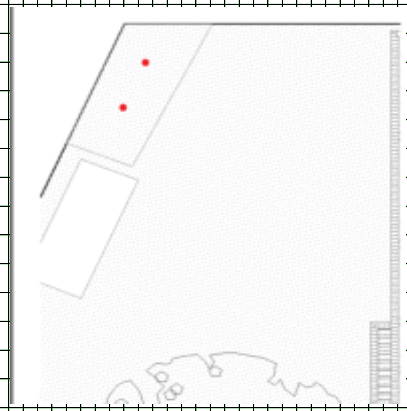

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR ROGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	9	PAÑETES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muro de cerramiento	2.80	2.40			6.72				-	6.72	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	6.72	

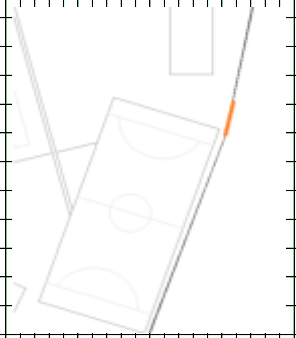

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	9	PAÑETES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras	4.40	2.80			12.32					12.32
					-					-
					-					-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	12.32

CROQUIS

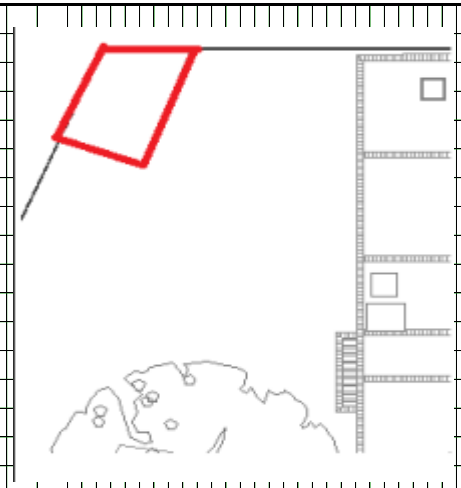

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.2.12	CERAMICA 33 X 33	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras	4.23	2.27			9.60					9.60
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	9.60

CROQUIS

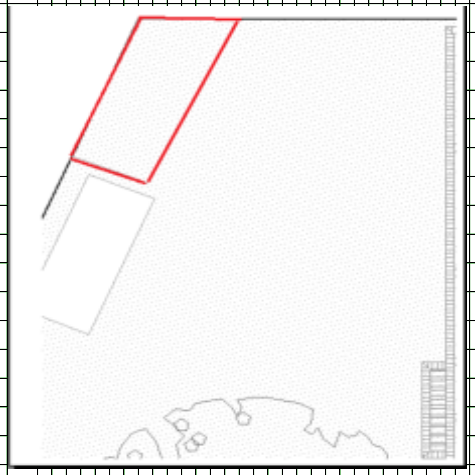

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	UND M	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso peatonal	11.85				11.85					11.85
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	11.85

CROQUIS

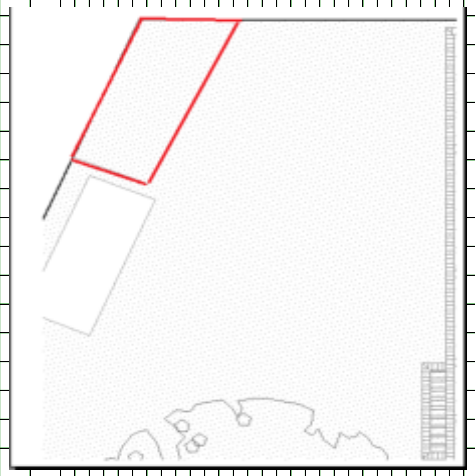

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.5.3	DILATACIONES LADRILLO 0.25 MORTERO 1:4	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso principal	49.15				49.15					49.15
					-					-
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	49.15

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso peatonal	4.20	2.45			10.29					10.29
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	10.29

CROQUIS

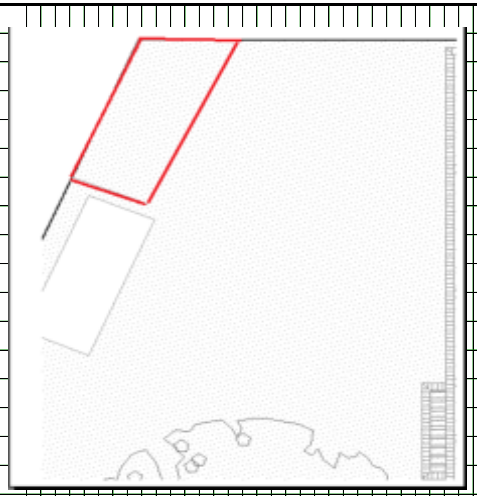

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ccubierta cuarto de basuras	21.k*m									-	
Tubo rectangular 76 x 38 x 2.0mm	3.50	4.87		1.00	17.05					17.05	
Tubo rectangular 76 x 38 x 2.0mm	3.50	4.50		1.00	15.75					15.75	
Tubo rectangular 76 x 38 x 2.0mm	3.50	4.20		1.00	14.70					14.70	
Tubo rectangular 76 x 38 x 2.0mm	3.50	2.10		2.00	14.70					14.70	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
									TOTAL	62.20	

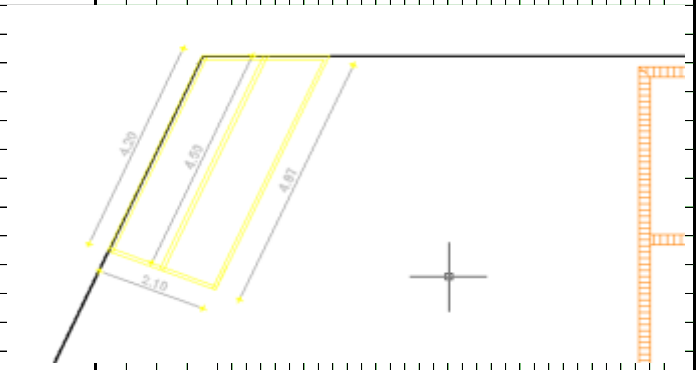

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	largo	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
muro de cerramiento	3.00			1.00	3.00					3.00
rampaacceso peatonal					-					-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	3.00

CROQUIS

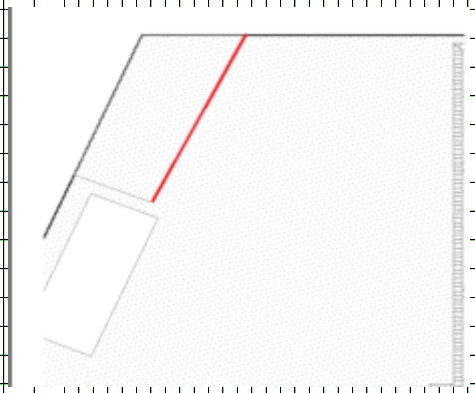

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	12	CARPINTERIA DE METÁLICA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
muro de cerramiento	2.50			1.00	2.50				-	2.50
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	2.50

CROQUIS

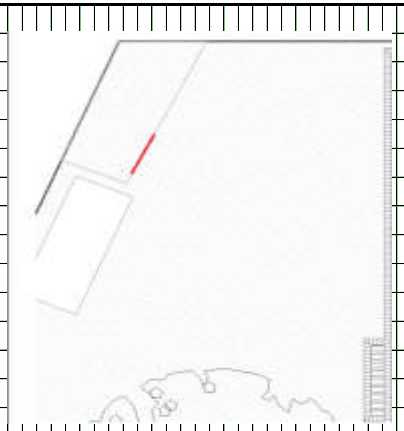

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	12	CARPINTERIA DE METÁLICA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
muro de cerramiento	2.00	2.10		1.00	4.20				-	4.20
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	4.20

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	12	CARPINTERIA DE METÁLICA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Interna					-					-
escalera metálica del 2 a 3	7.10				7.10					7.10
escalera metálica del 1 a 2	6.70				6.70					6.70
externa					-					-
escalera metálica del 2 a 3	13.50				13.50					13.50
escalera metálica del 1 a 2	11.05				11.05					11.05
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	38.35

CROQUIS

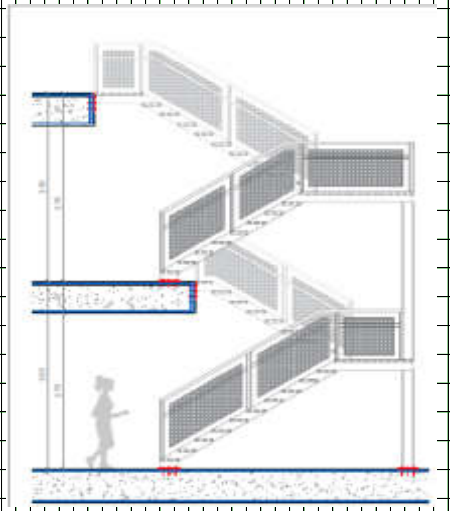

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	14	ENCHAPES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso principal	11.80		2.20		25.96					25.96
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	25.96

CROQUIS

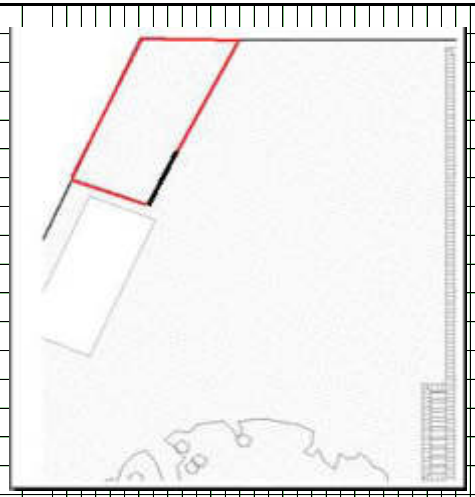

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	15	ILUMINACION	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.2.1	BALA FLUORESCENTE DE 50 W	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE BASURAS				2.00	2.00				-	2.00
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	2.00

CROQUIS

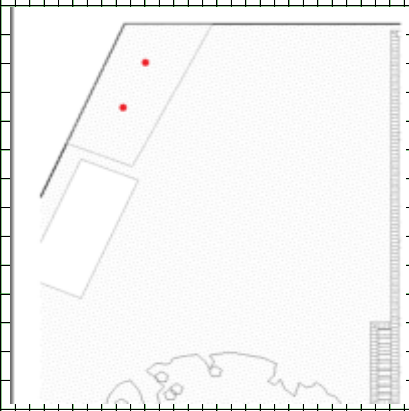

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.7	VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muro de cerramiento	2.80	2.40		2.00	13.44				-	13.44	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	13.44	

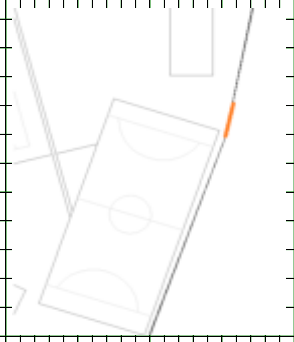

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Interna					-					-
escalera metálica del 2 a 3	7.10				7.10					7.10
escalera metálica del 1 a 2	6.70				6.70					6.70
externa					-					-
escalera metálica del 2 a 3	13.50				13.50					13.50
escalera metálica del 1 a 2	11.05				11.05					11.05
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	38.35

CROQUIS

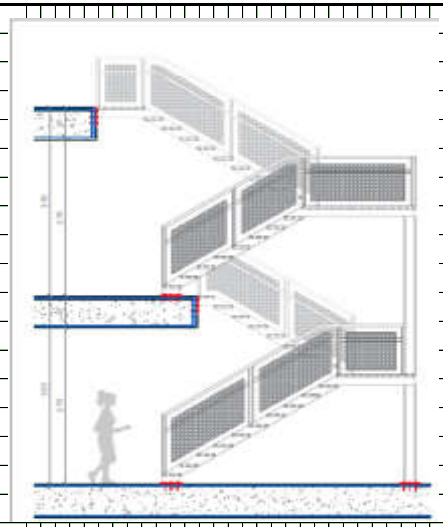

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C.

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ — NIT. 901384066-1 — CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO — ACTA PARCIAL

INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO	20	OBRAS EXTERIORES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
muro de crerramiento	49.32	1.50			73.98					73.98
					-					-
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	73.98

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	21.1.1	ASEO GENERAL	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
área cuarto de basuras					-					-
Placas Existentes	7.38	3.28			24.21				-	24.21
. Placa Rampa	7.38	2.08			15.35	2.62	0.87		-3.49	11.86
Ingreso Cuarto de basuras	10.63	2.00			21.26					21.26
Cuarto de basuras	4.20	2.25			9.45					9.45
Acceso Colegio	10.08	2.10			21.17					21.17
Acceso Puerta salones	4.10	2.00			8.20					8.20
area escaleras	26.47				26.47					26.47
area muro de cerramiento	49.32	2.00			98.64					98.64
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	221.25

CROQUIS

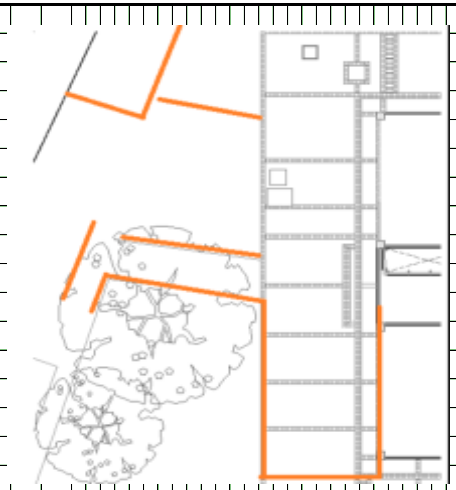

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681


DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA PARCIAL

INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO | REF.

ITEM: NP5 | Muro division en superboard acabado incluye pintura | UND M2 | REF. | HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
4. Cuarto de basuras	4.15		2.05		8.51					8.51	
4.1. Cuarto de basuras	2.17		2.05		4.45					4.45	
4. Cuarto de basuras	2.17		2.05		4.45					4.45	
4.1. Cuarto de basuras	4.15		2.05		8.51					8.51	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	25.92	

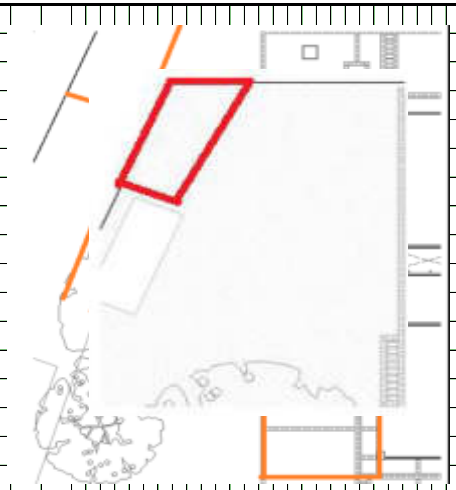

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA PARCIAL


INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO			REF.	

ITEM:	NP7	Cieloraso en láminas de pvc	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. Cuarto de basuras	4.15	2.17			9.01					9.01
1.2. Cuarto de basuras	4.15	2.17			4.50					4.50
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	13.51

CROQUIS

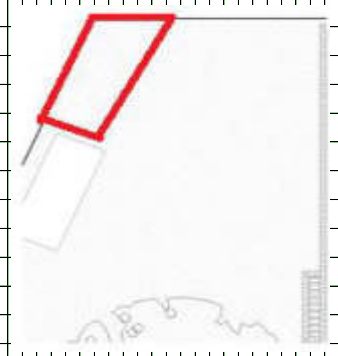

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA PARCIAL


INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO | REF.

ITEM:	NP12	ESCALERA METÁLICA (NO INCLUYE CONCRETOS, NI BARANDA, MEDIDA LA PROYECCIÓN EN PLANTA DE HUELLAS Y DESCANSOS).	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	largo	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
escalera metálica de descanso a 3er psio	3.55	1.35			4.79					4.79
Descanso escalera metálica entre 2do piso a 3er piso	1.72	3.00			5.16					5.16
escalera metálica del descanso a 2do piso	3.25	1.35			4.39					4.39
escalera metálica del 2do piso a descanso	2.98	1.35			4.02					4.02
Descanso escalera metálica entre 2do piso a 1er piso	1.15	3.00			3.45					3.45
escalera metálica del descanso a 1er piso	3.45	1.35			4.66					4.66
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	26.47

CROQUIS

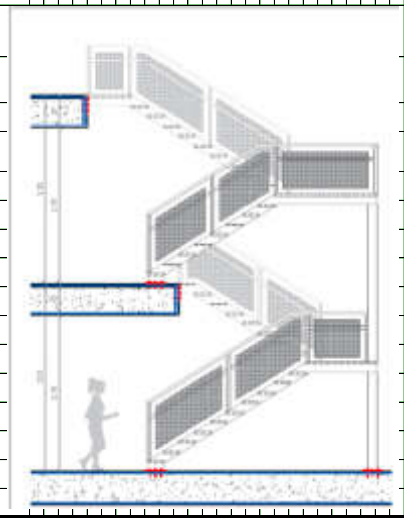

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

4.2.3 MEMORIAS DE CÁLCULO IED PANAMÁ SEDE B.

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar	1.93	1.80			3.47				-	3.47
Baño prescolar	3.20	1.80			5.76				-	5.76
Bateria baños niñas	3.97	1.70			6.75				-	6.75
Bateria baños niños	6.39	1.80			11.50					11.50
baño sala de profesroes	7.45	1.80			13.41					13.41
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	40.89

CROQUIS

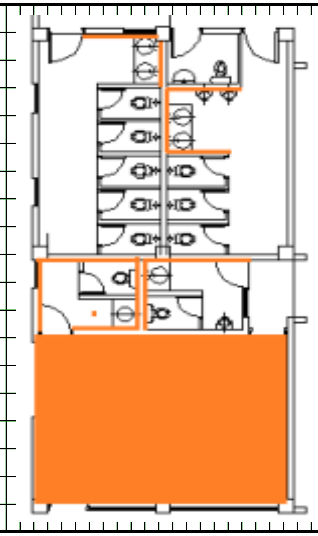

Acta pagada

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar	1.70	1.80			3.06				-	3.06
Bateria baños niñas	1.50	1.80			2.70				-	2.70
Baño aula de profesores	1.73	1.80			3.11					3.11
Baño prescolar	3.00	2.50			7.50					7.50
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	16.37

CROQUIS

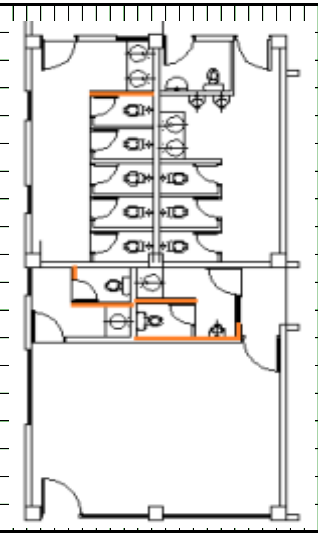

Acta pagada

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA 1	DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar	3.20	1.93			6.18				-	6.18
Baño aula de profesores	1.79	2.34			4.19				-	4.19
Bateria baños niñas	1.50	0.30			0.45					0.45
Bateria baños niños	1.50	0.30			0.45					0.45
area profesores	5.10	6.00			30.60					30.60
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	41.87

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND UN	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar				3.00	3.00				-	3.00
Baño aula de profesores				2.00	2.00				-	2.00
Bateria baños niñas				3.00	3.00					3.00
Bateria baños niños				4.00	4.00					4.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	12.00

CROQUIS

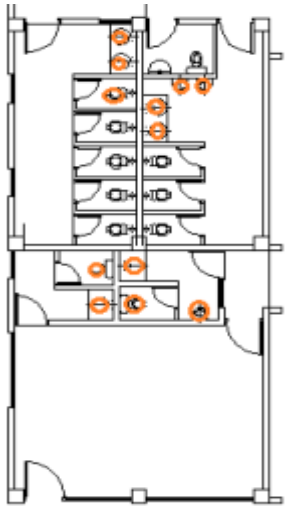

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar				1.00	1.00				-	1.00
Baño aula de profesores				1.00	1.00					1.00
Bateria baños niñas				1.00	1.00					1.00
Bateria baños niños				1.00	1.00					1.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	4.00

CROQUIS

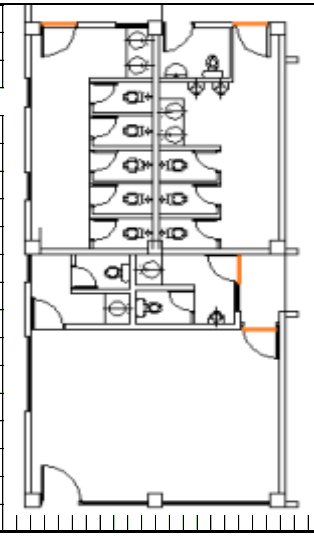

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.3.35	DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar	1.90				1.90				-	1.90
Baño aula de profesores	0.80				0.80					0.80
Bateria baños niñas	1.35				1.35					1.35
Bateria baños niños	1.25				1.25					1.25
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	5.30

CROQUIS

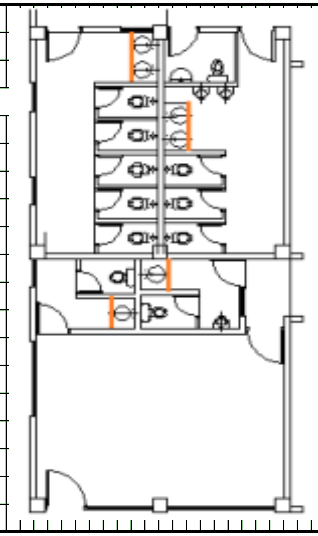

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar				3.00	3.00				-	3.00
Sifon de piso baño primaria				1.00	1.00					1.00
Bateria baños niñas				1.00	1.00					1.00
Bateria baños niños				2.00	2.00					2.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	7.00

CROQUIS

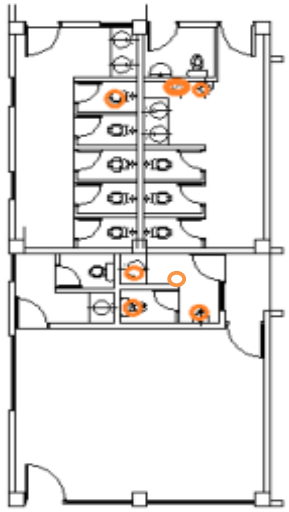

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA FINAL


INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar				3.00	3.00				-	3.00
Bateria baños niñas				1.00	1.00					1.00
Bateria baños niños				1.00	2.00					2.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	6.00

CROQUIS

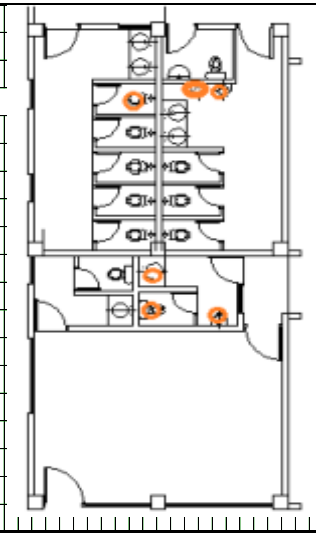

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.45	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar	1.20	0.30		2.00	0.72				-	0.72
Puertas Baños	1.20	0.80		3.00	2.88					2.88
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	3.60

CROQUIS

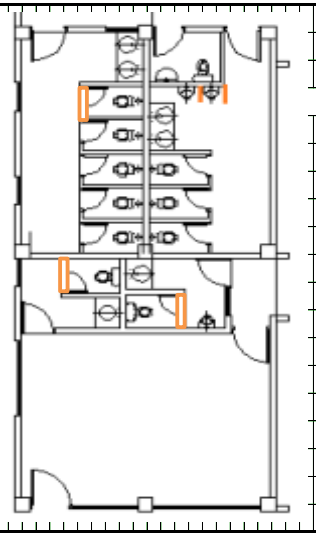

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.46	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Aula de profesores	5.5		2.3	2.00	25.30				-	25.30
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	25.30

CROQUIS

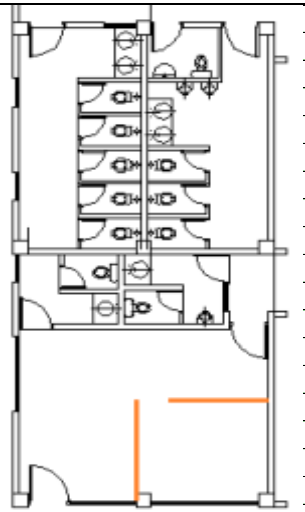

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.48	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
									-	-
									-	-
Bateria baños niñas	1.50	0.30			0.45					0.45
Bateria baños niñas	1.50	0.30			0.45					0.45
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	0.90

CROQUIS

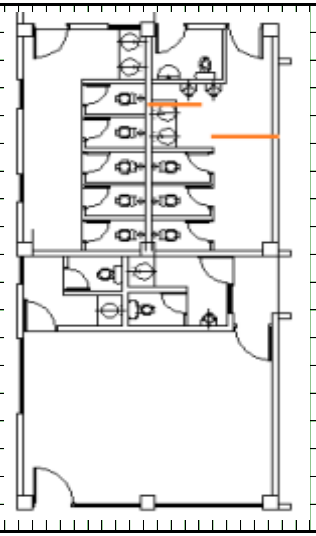

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar				2.00	2.00				-	2.00
Baño aula de profesores				1.00	1.00				-	1.00
Bateria baños niñas				2.00	2.00					2.00
Bateria baños niños				2.00	2.00					2.00
area profesores				2.00	2.00					2.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	9.00

CROQUIS

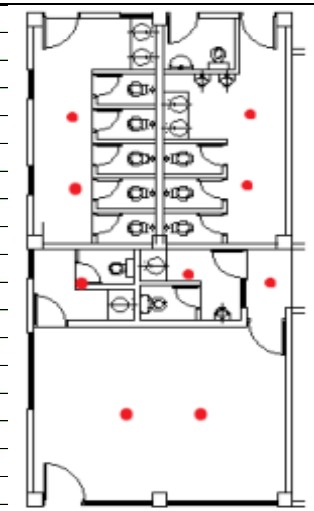

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UND	UN	REF.	HOJA 1	DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
					-				-	-
Bateria baños niñas				5.00	5.00					5.00
Bateria baños niños				8.00	8.00					8.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	13.00

CROQUIS

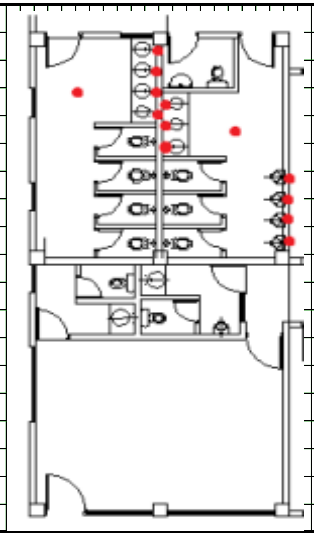

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.6.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
					-				-	-
area de profesores	2.34		2.5	2.00	11.70					11.70
area de profesores	0.95		2.50	1.00	2.38					2.38
area de profesores	1.10		2.50	1.00	2.75					2.75
dinteles	0.80		0.30	2.00	0.48					0.48
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	17.31

CROQUIS

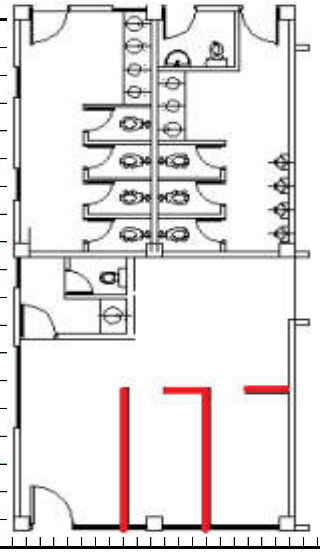

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	6.2.4	MESONES EN CONCRETO DE 40 cm	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bateria baños niñas	2.00				2.00					2.00
Bateria baños niños	1.80				1.80					1.80
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	3.80

CROQUIS

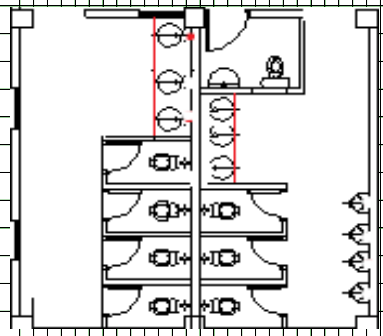

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.4.47	TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4"	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bateria baños niñas	5.00			1.00	5.00				-	5.00
Bateria baños niños	14.60			1.00	14.60					14.60
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	19.60

CROQUIS

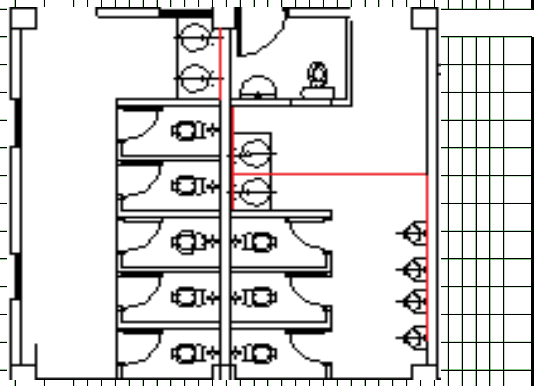

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bateria baños niñOs				7.00	7.00				-	7.00
Bateria baños niñas				3.00	3.00				-	3.00
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	10.00

CROQUIS

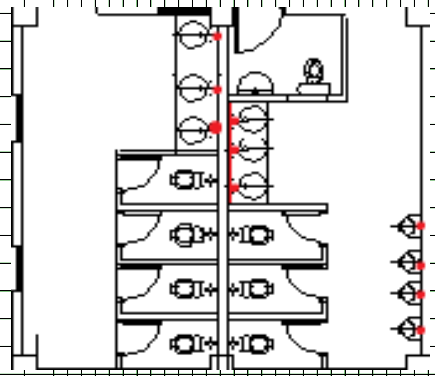

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UND	UN	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
area de profesores				7.00	7.00				-	7.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	7.00

CROQUIS



Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.14.17	INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
area de profesores				3.00	3.00				-	3.00
baño area de profesores				1.00	1.00					1.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	4.00

CROQUIS

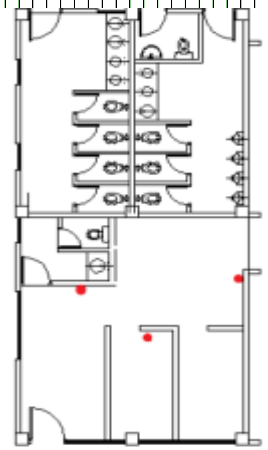

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	9	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar	5.13	2.51			12.88				-	12.88
Baño aula de profesores	7.45	2.51			18.70				-	18.70
Bateria baños niñas	12.63	1.70			21.47				-	21.47
Bateria baños niños	13.40	1.70			22.78					22.78
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	75.83

CROQUIS

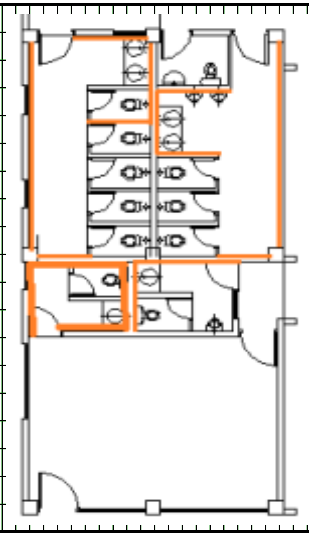

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.2.10	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
aula de profesores	3.60	2			7.20				-	7.20
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	7.20

CROQUIS

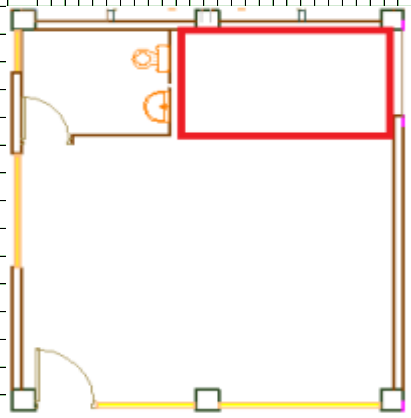

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.2.10	BALDOSIN GRANITO L-1 33 x 33 MORTERO 1:4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bateria baños niñas	2.88	1.70			4.90				-	4.90
Bateria baños niños	1.72	2.20			3.78				-	3.78
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	8.68

CROQUIS

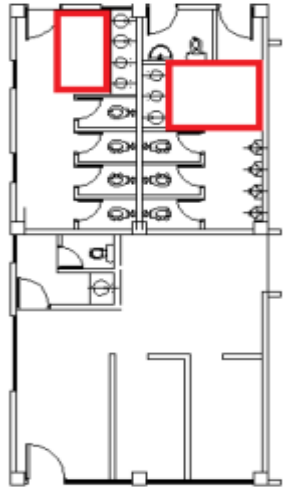

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA FINAL


INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.2.12	CERAMICA 33 X 33	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Sala de profesores	3.6	2			7.20				-	7.20
Sala de profesores	6	4.60			27.60					27.60
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	34.80

CROQUIS

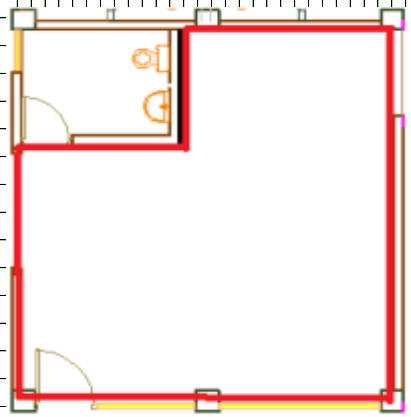

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
baño sala de profesroes	2.35	1.80			4.23					4.23
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	4.23

CROQUIS

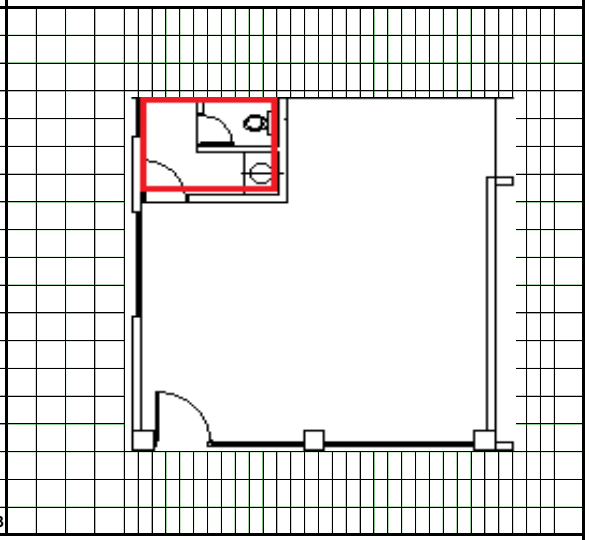

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño aula de profesores	7.57				7.57				-	7.57
Bateria baños niñas	12.50				12.50				-	12.50
Bateria baños niños	10.65				10.65				-	10.65
					-					-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	30.72

CROQUIS

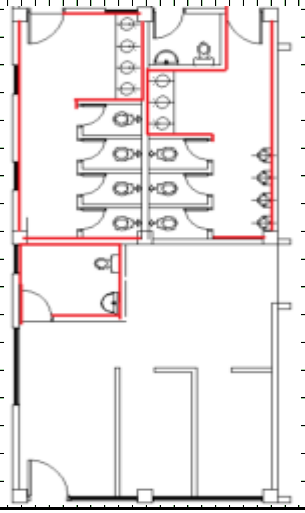

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	12	CARPINTERIA DE METÁLICA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.1.7	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
area profesores		0.80	2.2	2.00	3.52				-	3.52
area profesores		2.53	2.5	1.00	6.33					6.33
					-					-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	9.85

CROQUIS

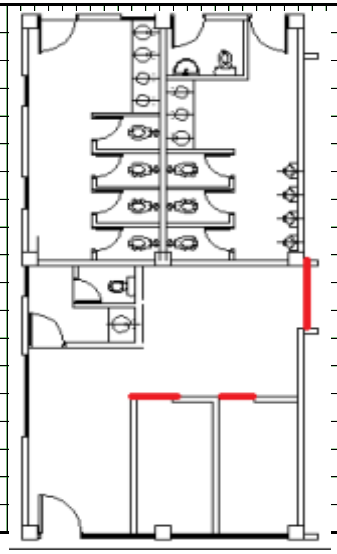

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	14	ENCHAPES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar	4.16	2.50			10.40				-	10.40
Baño aula de profesores	6.05	1.80			10.89				-	10.89
Bateria baños niñas	12.50	1.80			22.50				-	22.50
Bateria baños niños	10.65	1.80			19.17					19.17
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	62.96

CROQUIS

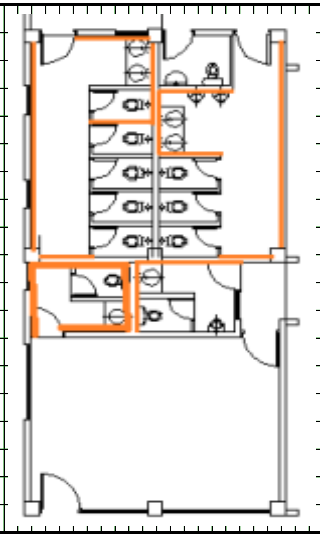

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	14	ENCHAPES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	14.2.4	GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 40 cm.	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
Bateria baños niñas	2.20				2.20				-	2.20
Bateria baños niños	1.70				1.70					1.70
					-					-
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	3.90

CROQUIS

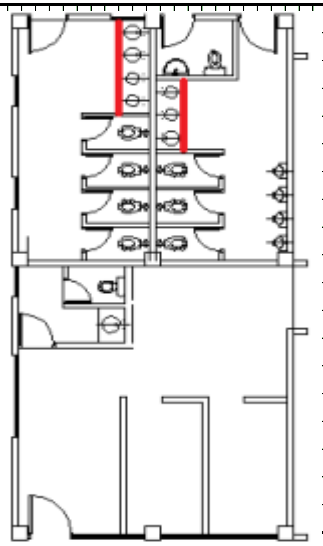

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	15	ENCHAPES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
Bateria baños niñas				2.00	2.00				-	2.00
Bateria baños niños				2.00	2.00					2.00
area profesores				6.00	6.00					6.00
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	10.00

CROQUIS

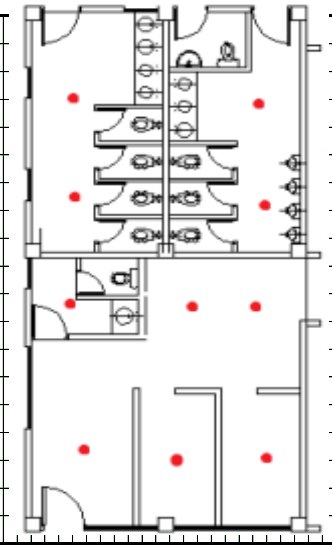

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	16.1.5	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL Ó SIMIL. (SUM E INSTALACION)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
					-				-	-
area profesores				1.00	1.00					1.00
baño niñas				4.00	4.00					4.00
baño niños				3.00	3.00					3.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	8.00

CROQUIS



Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	16.1.23	LAVAMANOS NOVA 738 (SUM E INSTALACION)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
					-				-	-
area profesores				1.00	1.00					1.00
baño niñas				4.00	4.00					4.00
baño niños				3.00	3.00					3.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	8.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	16.1.25	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR.	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
					-				-	-
Bateria baños niños				4.00	4.00					4.00
					-					-
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	4.00

CROQUIS

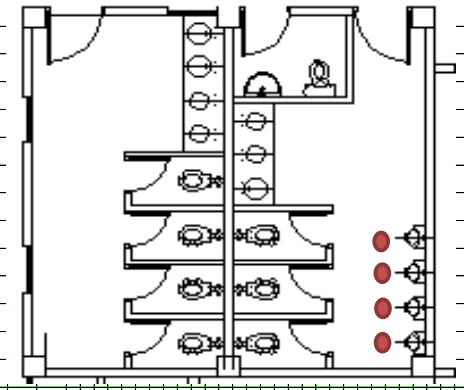

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	16.1.42	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
					-				-	-
area de profesores				1.00	1.00					1.00
					-					-
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	1.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	16.2.16	TAPARREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACION)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
					-				-	-
area de profesores				1.00	1.00					1.00
					-					-
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	1.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
baños niños		0.40	0.8	4.00	4.00				-	1.28
										-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	1.28

CROQUIS

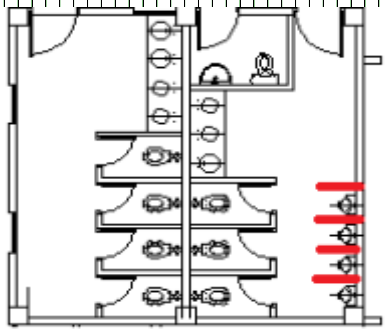

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.3	ESTUCO	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
aula de profesores	5.60		2.5		14.00				-	14.00
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	14.00

CROQUIS

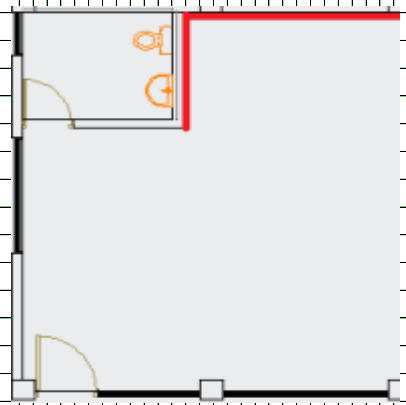

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
					-				-	-	
area de profesores	2.34		2.5	4.00	23.40				-	23.40	
area de profesores	0.95		2.50	2.00	4.75					4.75	
area de profesores	1.10		2.50	2.00	5.50					5.50	
columna baño niñas	0.40		0.80	2.00	0.64					0.64	
columna baño niñas	0.30		2.50	2.00	1.50					1.50	
columna baño niños	0.40		0.80	2.00	0.64					0.64	
columna baño niños	0.30		2.50	2.00	1.50					1.50	
aula de profesores	5.60		2.5	1.00	14.00					14.00	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
					-						
									TOTAL	51.93	

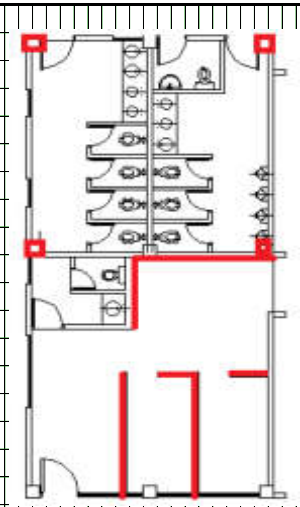

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.5	FILOS Y DILATACIONES	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
area de profesores	2.20			7.00	15.40				-	15.40
area de profesores	2.50			3.00	7.50					7.50
baño niños	1.50			1.00	1.50					1.50
columna baño niñas	1.50			1.00	1.50					1.50
dinteles	0.80			4.00	3.20					3.20
					-					-
					-					-
					-					-

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
area de profesores	6.55	5.90			38.65				-	38.65
baños	5.44	5.90			32.10					32.10
					-					-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	70.75

CROQUIS

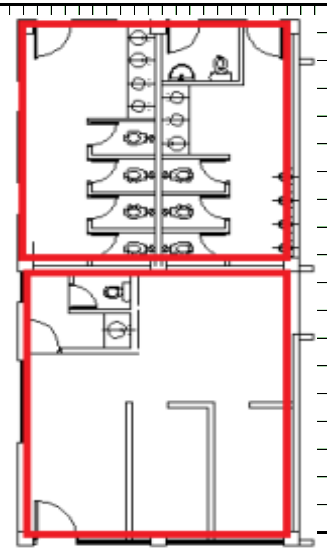

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.2.1	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
area profesores		0.95	2.5	2.00	4.75				-	4.75
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	4.75

CROQUIS

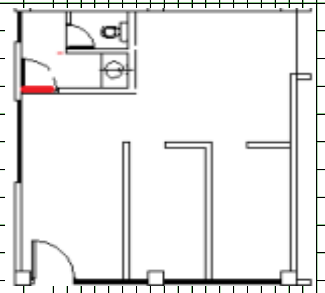

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
area profesores		0.95	2.5	2.00	4.75				-	4.75
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	4.75

CROQUIS

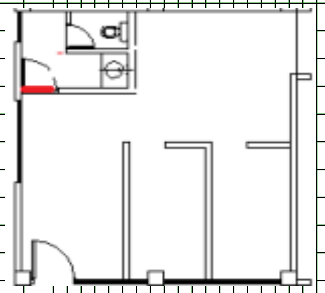

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
					-				-	-	
area profesores		0.95	5		5.95				-	5.95	
										-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
TOTAL										5.95	

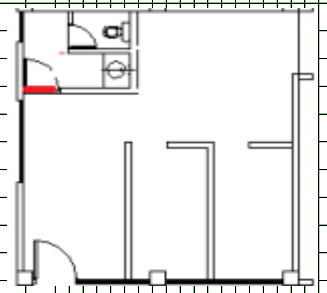

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	19	CERRADURAS Y VIDRIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	19.1.13	CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
area de profesora				3.00	3.00				-	3.00
					-					-
					-					-
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	3.00

CROQUIS

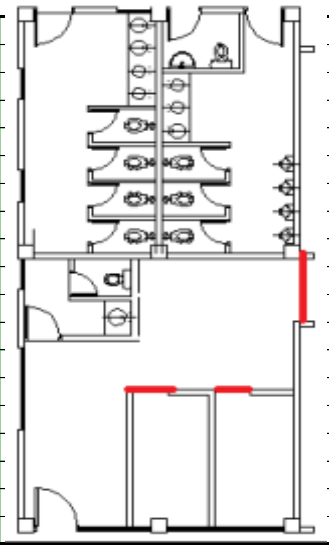

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	19	CERRADURAS Y VIDRIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
Baño niñas	1.95	0.80			1.56				-	1.56
Baño niños	1.66	0.80			1.33					1.33
baño area de profesores	0.80	0.80			0.64					0.64
					-					-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	3.53

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	21	ASEO Y VARIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	21.1.1	ASEO GENERAL	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
Baño niñas	6.00	2.90			17.40				-	17.40
Baño niñas	6.00	2.90			17.40					17.40
circulación baños	6.00	2.00			12.00					12.00
area sala de profesores	6.50	6.00			39.00					39.00
hall de circulación	18.80	1.50			28.20					28.20
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	114.00

CROQUIS

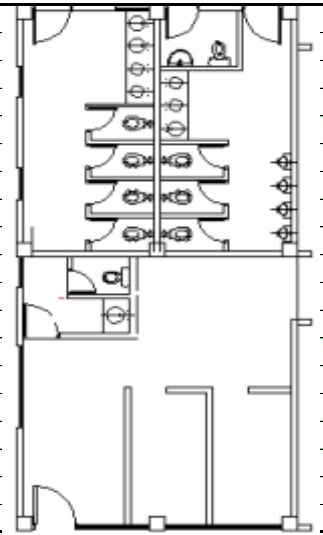

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA				DIA 26	MES 12	AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	NP5	Muro division en superboard acabado incluye pintura	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
Baño niñas	2.10	0.50			1.05				-	1.05
Baño niñas	1.66	0.50			0.83					0.83
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	1.88

CROQUIS

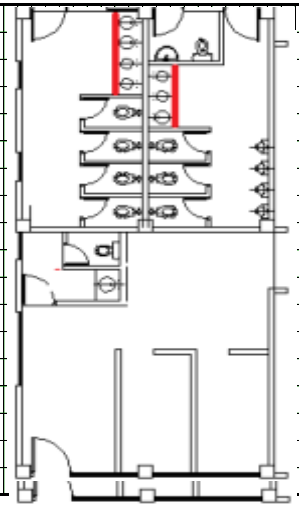

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

4.2.4 MEMORIAS DE CÁLCULO IED PANAMÁ SEDE C.

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño niñas 2do pido	5.06	3.87			19.58				-	19.58
Baño niños 2do pido	5.06	3.87			19.58				-	19.58
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	39.16

CROQUIS

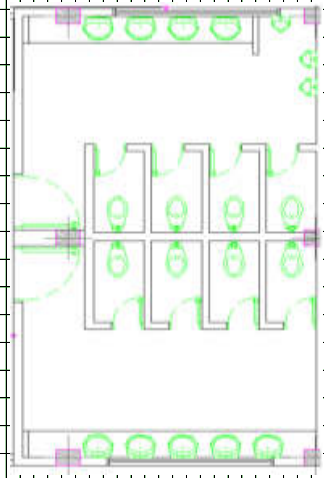

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras				1.00	1.00				-	1.00
Cuarto frio				1.00	1.00				-	1.00
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	2.00

CROQUIS

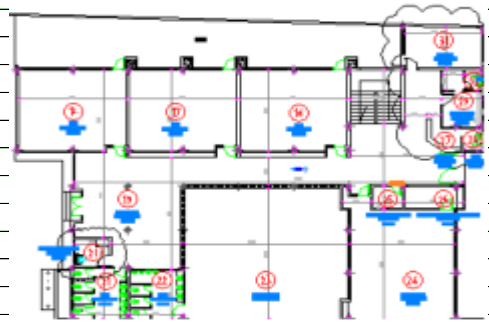

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras	1.60	0.4		1.00	0.64				-	0.64
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	0.64

CROQUIS

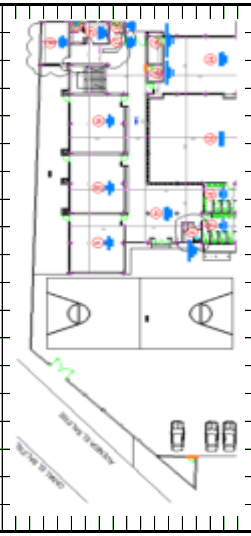

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA FINAL


INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño niñas primer piso				2.00	2.00				-	2.00
Baño niños primer pido				2.00	2.00				-	2.00
cuarto frio				1.00	1.00					1.00
cuarto de deportes				1.00	1.00					1.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	6.00

CROQUIS

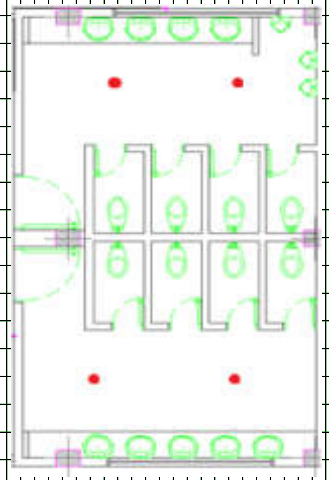

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CARCAMO CUARTO DE BASURAS	2.20	0.5	0.50		0.55				-	0.55
					-				-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	0.55

CROQUIS

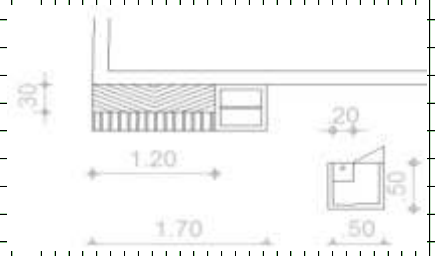

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto frio	2.10	1.9			3.99				-	3.99
					-				-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	3.99

CROQUIS

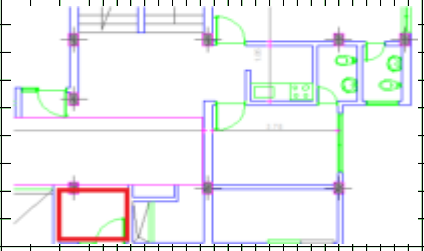

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto frio	2.10	1.9		2.08	8.30				-	8.30
					-				-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	8.30

CROQUIS

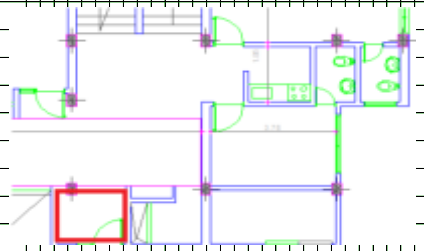

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA FINAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	3	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto frio	7.90				7.90				-	7.90
					-				-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	7.90

CROQUIS

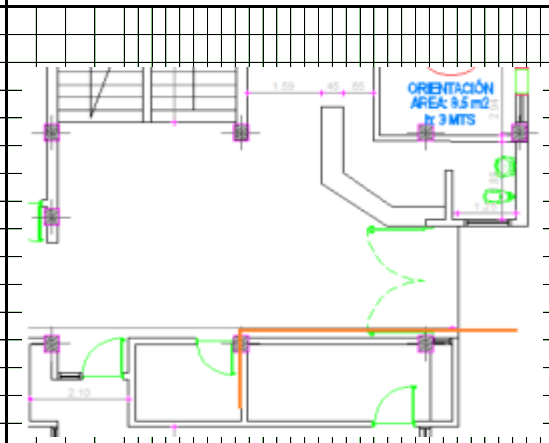

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de deportes	3.50		2.35		8.23				-	8.23
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	8.23

CROQUIS

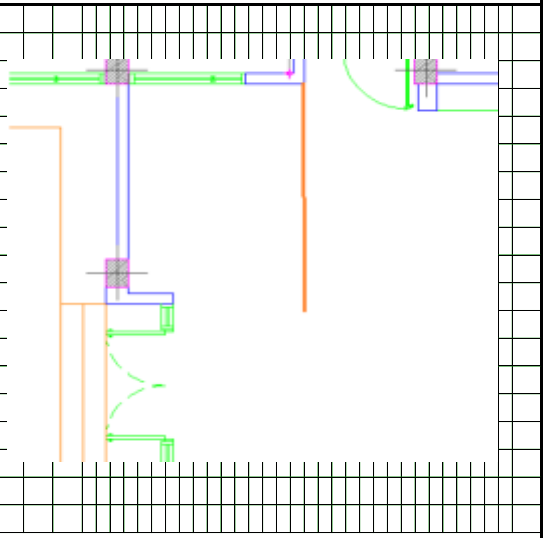

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		


CAPITULO	5	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UND	CM	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUARTO DE BASURAS	11.00			8.00	88.00				-	88.00
CUARTO DEPORTIVO	11.00			4.00	44.00				-	44.00
										-
										-
										-
									TOTAL	132.00

CROQUIS

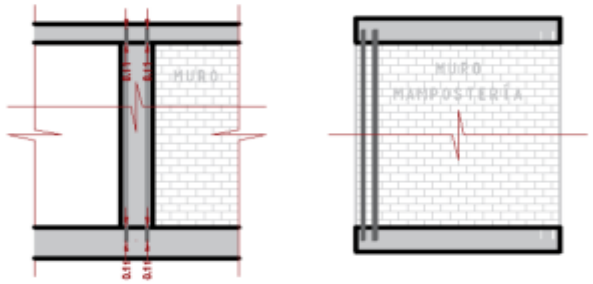

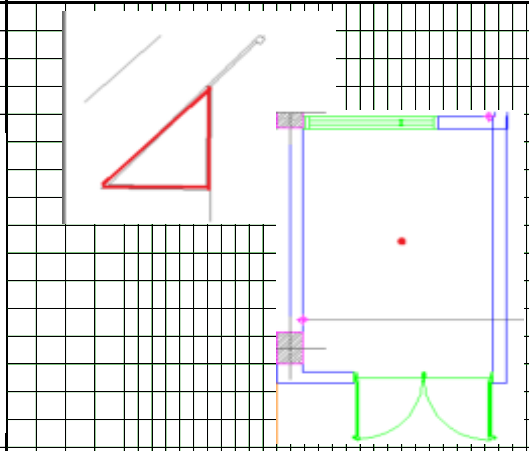

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto frio	11.80				11.80				-	11.80
Cuarto de basuras	33.81				33.81				-	33.81
CANTIDADES ACTAS ANTERIORES										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	45.61

CROQUIS

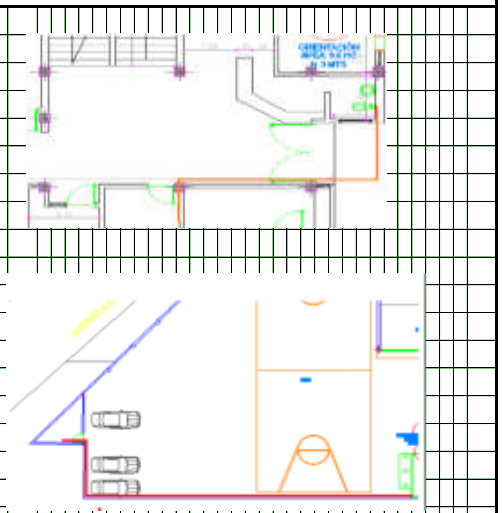

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.4.31	REGISTRO PASO DIRECTO DE 2" KITZ O SIMILAR	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
baño niñas 2do piso				1	1.00				-	1.00	
baño niños 2do piso				1	1.00				-	1.00	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	2.00	

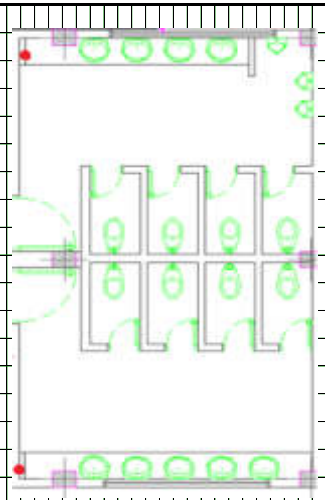

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto frio				1	1.00				-	1.00
Cuarto de basuras				1	1.00				-	1.00
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	2.00

CROQUIS

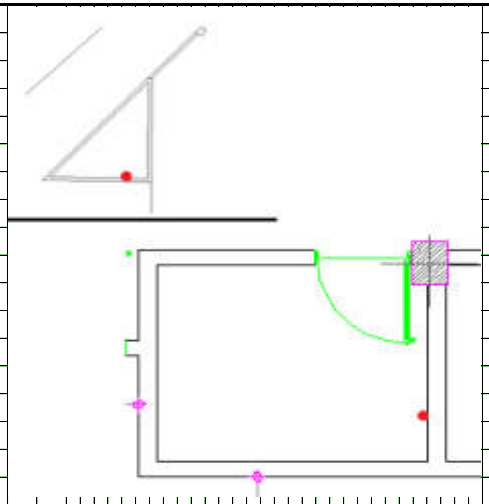

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Cuarto frio				1	1.00				-	1.00	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	1.00	

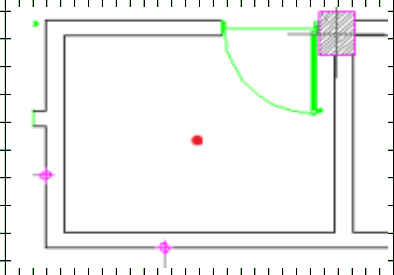

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño niñas primer piso				8.00	8.00				-	8.00
Baño niños primer pido				8.00	8.00				-	8.00
cuarto frio				1.00	1.00					1.00
cuarto de deportes				1.00	1.00					1.00
baños discapacitados				2.00	2.00					2.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	20.00

CROQUIS

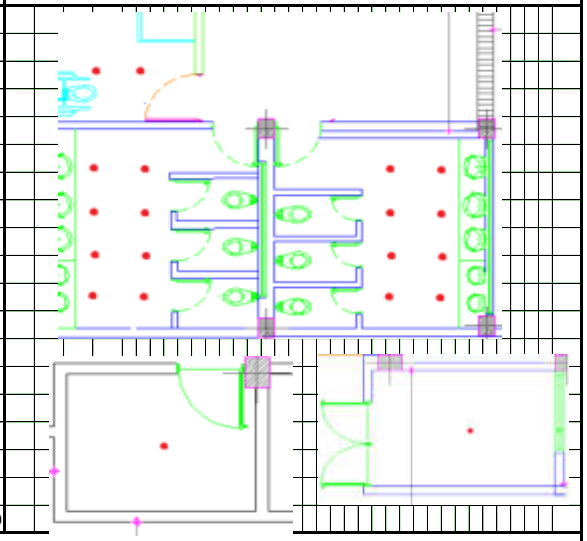

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.14.17	INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
cuarto frio				1.00	1.00				-	1.00
cuarto de deportes				1.00	1.00				-	1.00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	2.00

CROQUIS

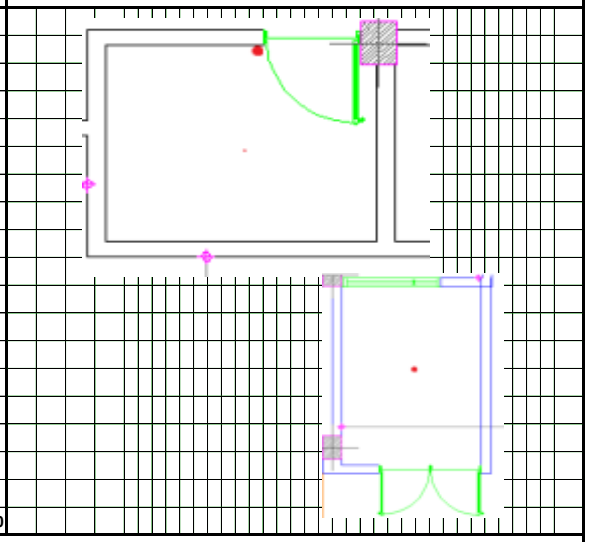

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	9	PAÑETES	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras	12.00	2.95			35.40				-	35.40
cuarto frio	7.24	2.95			21.36				-	21.36
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	56.76

CROQUIS

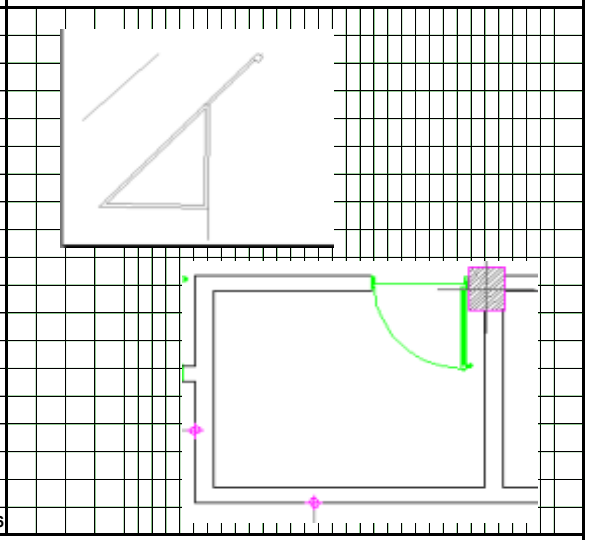

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras	18.00				18.00				-	18.00
cuarto frio	2.10	1.90			3.99				-	3.99
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	21.99

CROQUIS

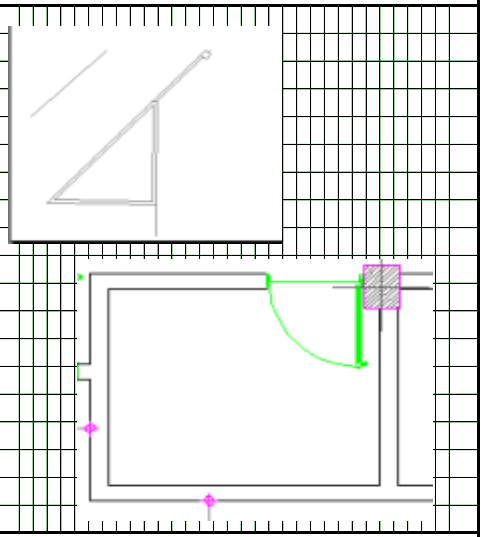

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.2.12	CERAMICA 33 X 33	UND	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras	18.00				18.00				-	18.00
cuarto frio	2.10	1.90			3.99				-	3.99
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	21.99

CROQUIS

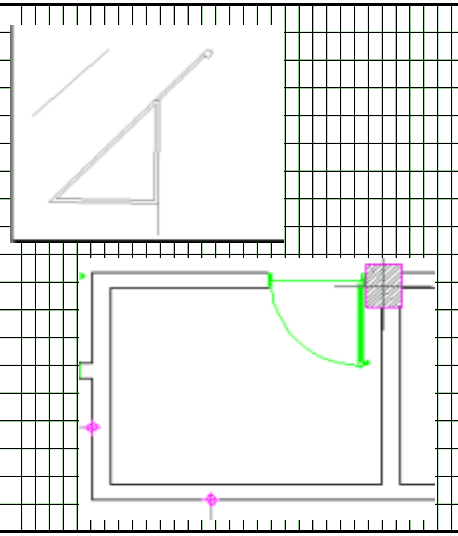

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño niñas 2do pido	5.06	3.87			19.58				-	19.58
Baño niños 2do pido	5.06	3.87			19.58				-	19.58
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	39.16

CROQUIS

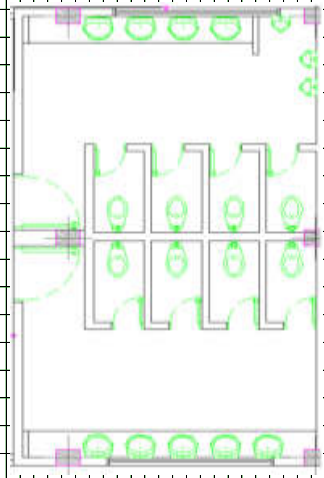

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras	31.00				31.00				-	31.00
cuarto frio	7.00				7.00				-	7.00
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	38.00

CROQUIS

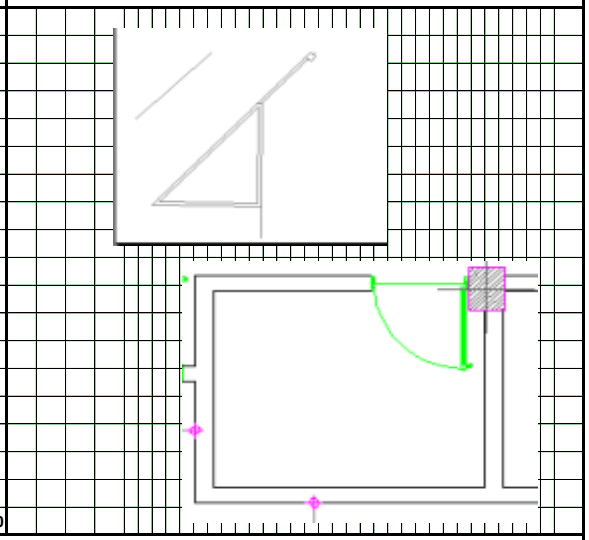

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	10.3.14	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA	UND M	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de deportivo	18.00				18.00				-	18.00
					-				-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	18.00

CROQUIS

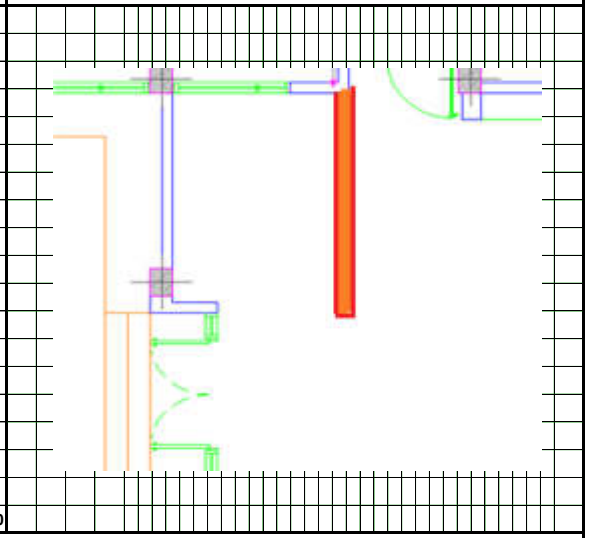

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	11	PISOS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	area	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de deportivo	18.00				18.00				-	18.00
					-				-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	18.00

CROQUIS

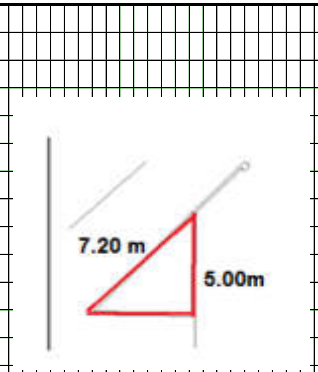

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	12	CARPINTERIA DE METÁLICA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.1.8	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	area	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Cuarto de deportivo	3.20	0.70			2.24				-	2.24	
					-				-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	2.24	

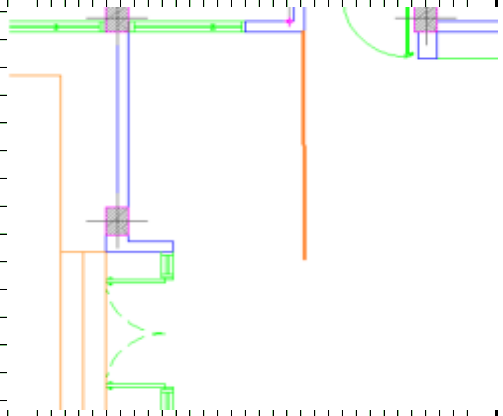

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	12	CARPINTERIA DE METÁLICA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	area	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Cuarto de deportivo				1.50	1.50				-	1.50	
cuarto frio				1.00	1.00				-	1.00	
cuarto de basuras				1.50	1.50					1.50	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	4.00	

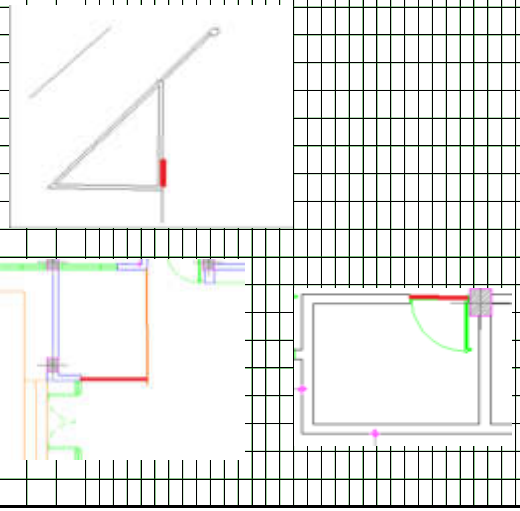

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	12	CARPINTERIA DE METÁLICA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	area	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de deportivo		1.20	3.05		3.66				-	3.66
cuarto frio		0.80	3.05		2.44				-	2.44
cuarto de basuras		1.22	3.05		3.72					3.72
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	9.82

CROQUIS

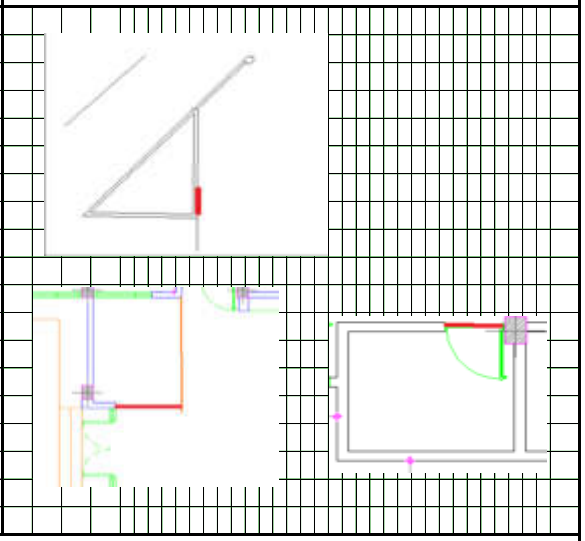

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA FINAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	12	CARPINTERIA DE METÁLICA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.2.11	VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	area	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Cuarto de basuras	3.40	0.50			1.70				-	1.70	
					-				-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	1.70	

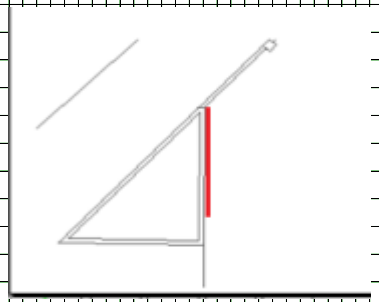

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	14	ENCHAPES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	area	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
cuarto Refrigerios	7.31		1.95		14.25				-	14.25
					-				-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	14.25

CROQUIS

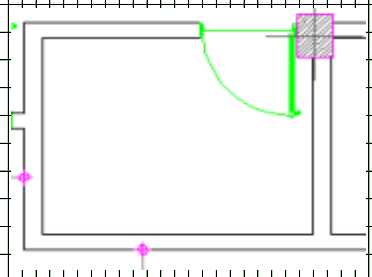

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	15	ILUMINACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
cuarto frio				1.00	1.00					1.00
cuarto de deportes				1.00	1.00					1.00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	2.00

CROQUIS

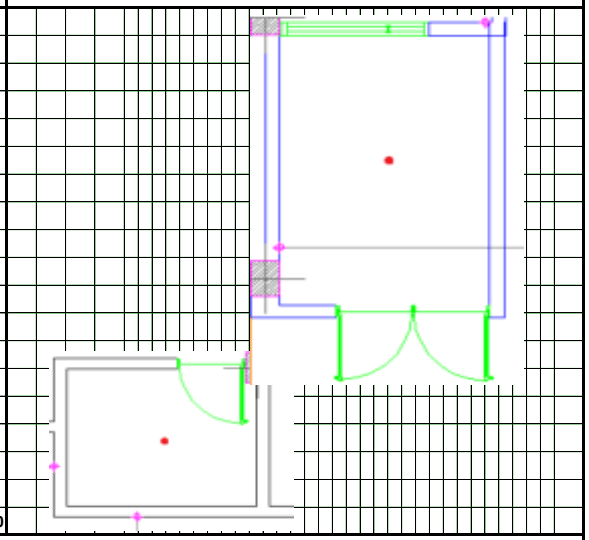

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA FINAL


INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO	15	ILUMINACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.2.1	BALA FLUORESCENTE DE 50 W	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño niñas primer piso				8.00	8.00				-	8.00
Baño niños primer pido				8.00	8.00				-	8.00
Baño discapacitados				2.00	2.00					2.00
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	18.00

CROQUIS

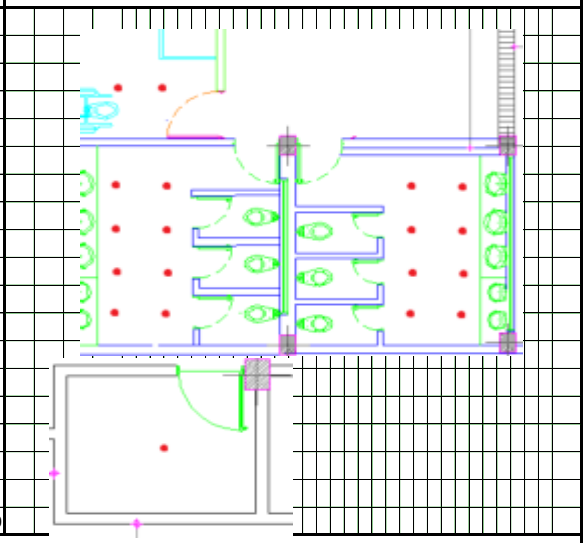

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Baño niñas primer piso				8.00	8.00				-	8.00	
Baño niños primer pido				8.00	8.00				-	8.00	
					-					-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	16.00	

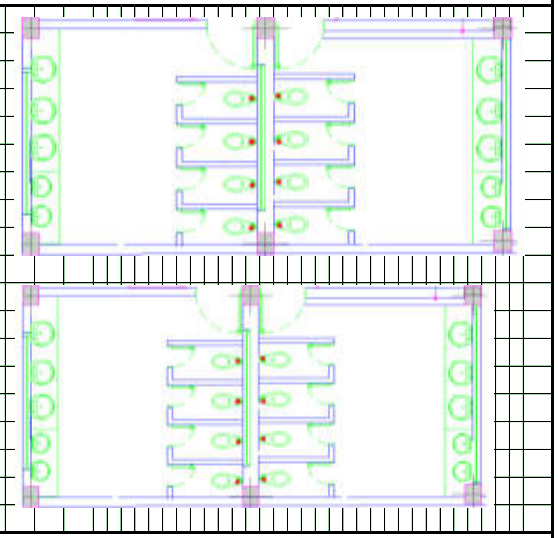

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.4.10	PINTURA EPOXICA	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
cuarto de basuras pared		4.15	3.05	2	25.32				-	25.32
cuarto de basuras pared		6.14	3.05	2	37.45				-	37.45
cuarto de basuras pared		3.31	3.05	2.00	20.19	3.40	0.50			18.49
cuarto de basuras techo	18.00			1.00	18.00					18.00
cuarto de refrigerios		1.80	2.25	1.00	4.05					4.05
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	103.31

CROQUIS

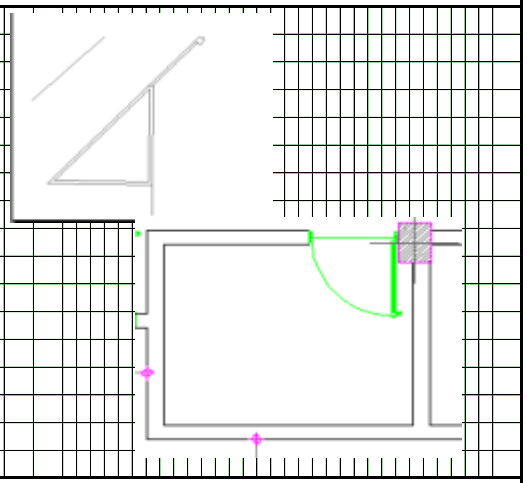

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	19	CERRADURAS Y VIDRIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	19.1.12	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
caurto de refrigerios				1.00	1.00				-	1.00
cuarto deportivo				1.00	1.00				-	1.00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	2.00

CROQUIS

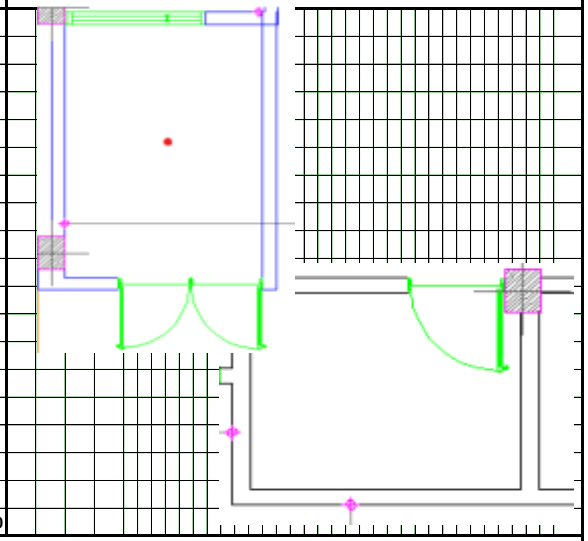

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	19	CERRADURAS Y VIDRIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	largo	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño niñas primer piso	2.10		0.80	1.00	1.68				-	1.68
Baño niños primero psio	1.05		0.80	1.00	0.84				-	0.84
Baño niñas primer piso	3.18		0.80	1.00	2.54					2.54
Baño niños primero psio	1.20		0.80	1.00	0.96					0.96
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	6.02

CROQUIS

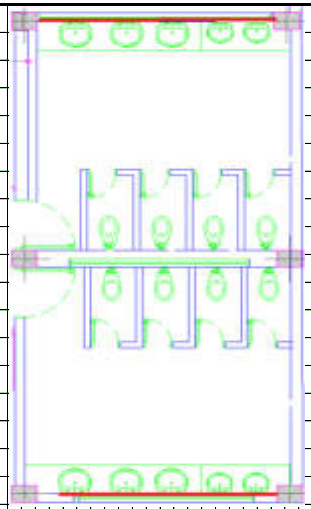

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	19	CERRADURAS Y VIDRIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	19.3.4	VIDRIO CRUDO INCOLORO 5 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
caurto de refrigerios		1.20	0.50	1	0.60				-	0.60
cuarto deportivo		0.80	0.50	1	0.40				-	0.40
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	1.00

CROQUIS

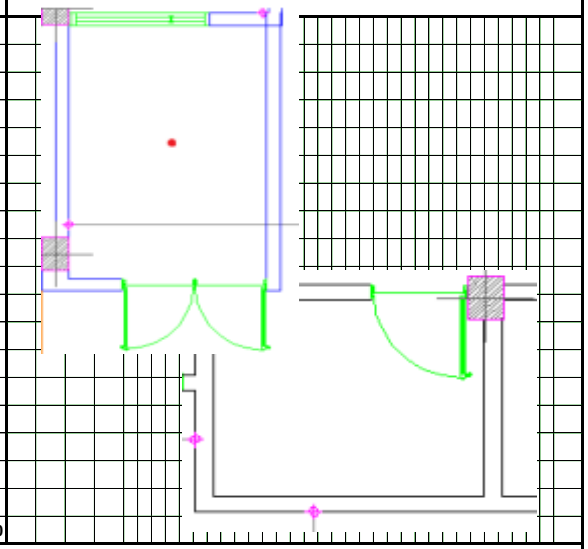

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	21	ASEO Y VARIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	21.1.1	ASEO GENERAL	UND	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
caurto de refrigerios	4.05				4.05				-	4.05
cuarto deportivo	6.73				6.73				-	6.73
cuarto de basuras	18.00				18.00					18.00
Baño niñas 2do piso	19.58				19.58					19.58
Baño niños 2do piso	19.58				19.58					19.58
Baño niñas 1er piso	19.58				19.58					19.58
Baño niños 1er piso	19.58				19.58					19.58
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	107.10

CROQUIS

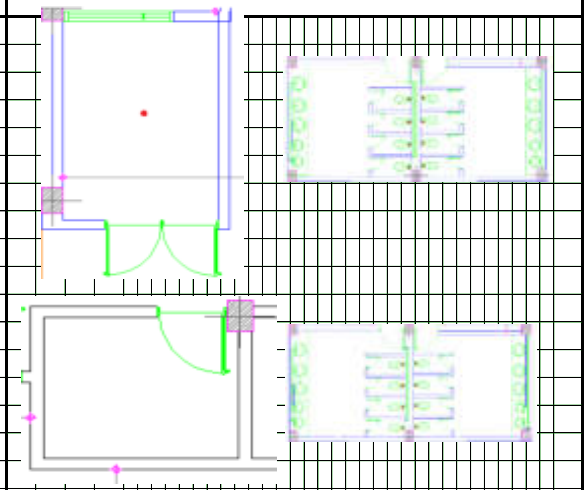

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	21	ASEO Y VARIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	21.1.15	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
cuarto de basuras	1.20				1.20				-	1.20
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	1.20

CROQUIS

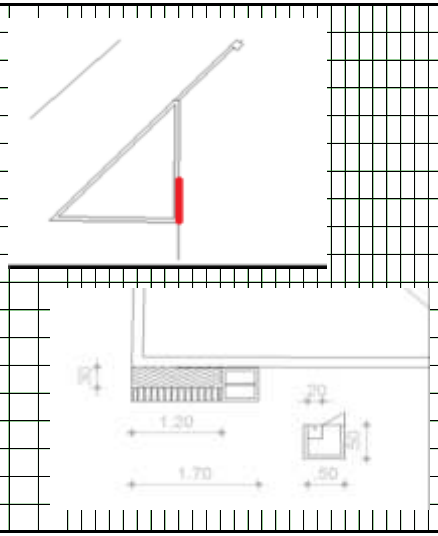

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA FINAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	NP3	Columneta en concreto dimensiones 0,15M x 0,20M de 3.000 PSI	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras	3.05				3.05				-	3.05
					-				-	-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	3.05

CROQUIS

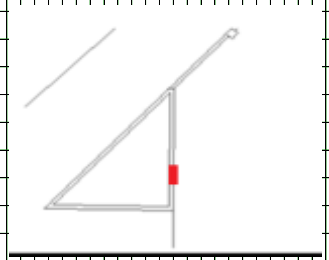

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	NP6	Impermeabilizacion de pisos baños con membrana y aditivo	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño niñas 2do piso	5.06	4.17			21.10				-	21.10
Baño niños 2do piso	5.06	4.17			21.10				-	21.10
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	42.20

CROQUIS

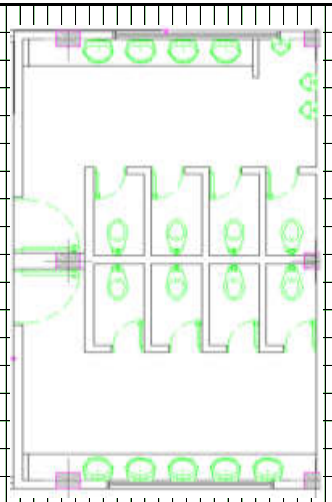

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	NP7	Cieloraso en láminas de pvc	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño niñas 1er piso	5.06	3.87			19.58				-	19.58
Baño niños 1er piso	5.06	3.87			19.58				-	19.58
Baño de discapacitados 1er piso	2.60	2.60			6.76					6.76
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	45.92

CROQUIS

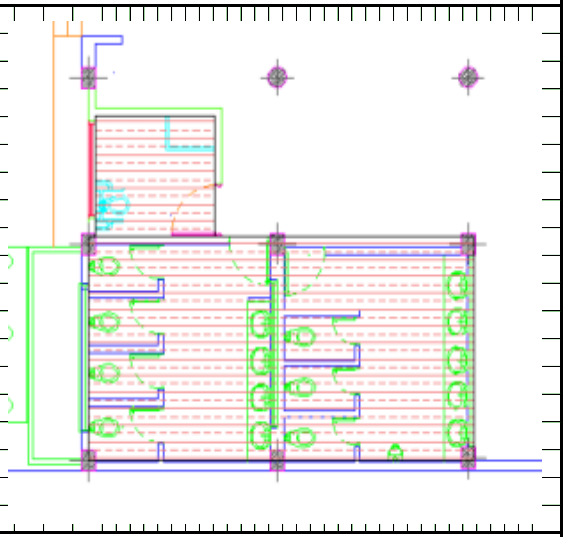

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	NP8	Suministro e instalacion de valvula empotrada de 1 1/4" de 4,8 litros para sanitario (Incluye demolicion de enchape y muro en el sector requerido para la correcta instalacion del aparato)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño niñas 2do piso				4.00	4.00				-	4.00
Baño niños 2do piso				5.00	5.00				-	5.00
Baño niñas 1er piso				4.00	4.00					4.00
Baño niños 1er piso				5.00	5.00					5.00
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	18.00

CROQUIS

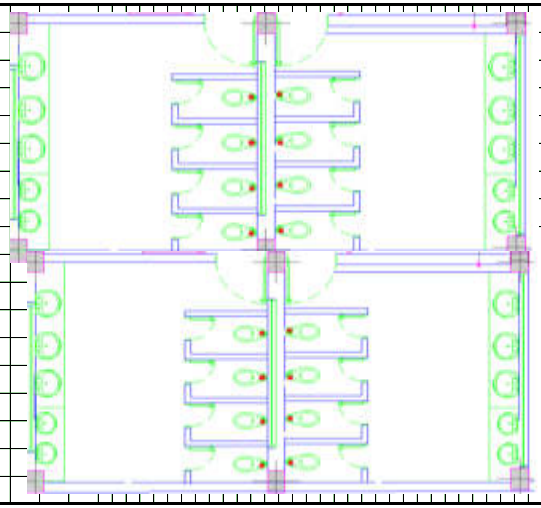

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	NP11	Suministro e instalacion de valvula empotrada de 1 1/4" pico largo para lavamanos (Incluye demolicion de enchape y muro en el sector requerido para la correcta instalacion del aparato)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño niñas 2do piso				5.00	5.00				-	5.00
Baño niños 2do piso				5.00	5.00				-	5.00
Baño niñas 1er piso				5.00	5.00					5.00
Baño niños 1er piso				5.00	5.00					5.00
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	20.00

CROQUIS

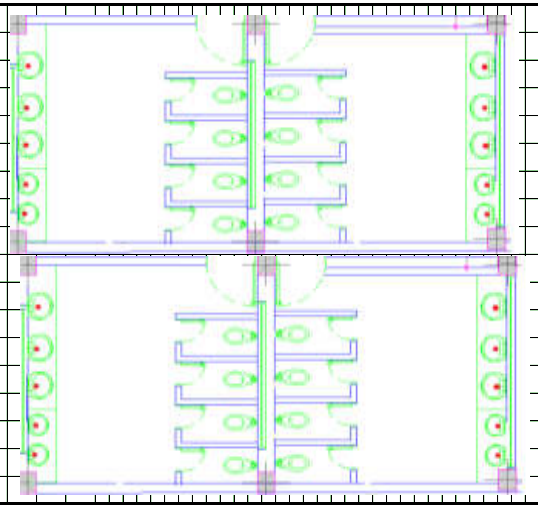

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE C

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	10	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	NP13	emulsion asfaltica sika o similar, sellante de mortero existente	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras	18.00				18.00				-	18.00
					-				-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	18.00

CROQUIS

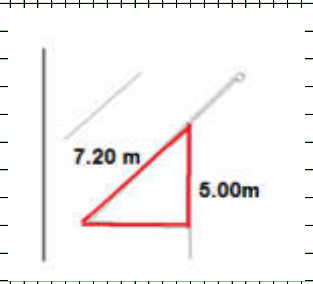

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

4.2.5 MEMORIAS DE CÁLCULO IED AQUILEO PARRA SEDE A.

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños	33.42		2.40		80.20				-	80.20
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	80.20

CROQUIS

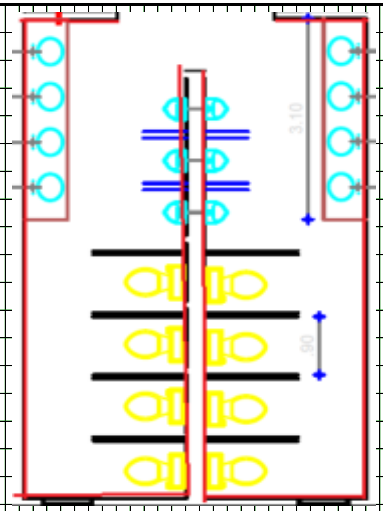

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños	3.10	-		2.00	6.20				-	6.20
					-				-	-
					-					-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	6.20

CROQUIS

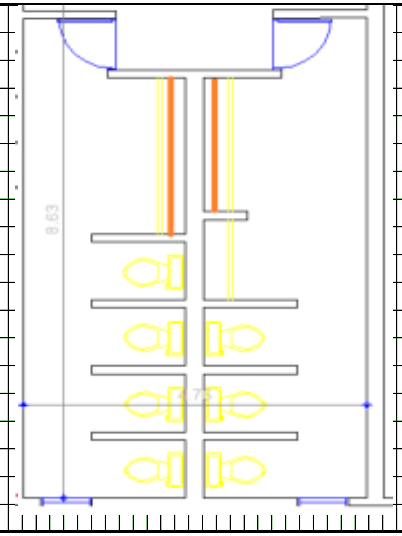

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños	1.30	1.80		7.00	16.38				-	16.38
bateria de baños	2.30	0.40		2.00	1.84				-	1.84
					-					-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	18.22

CROQUIS

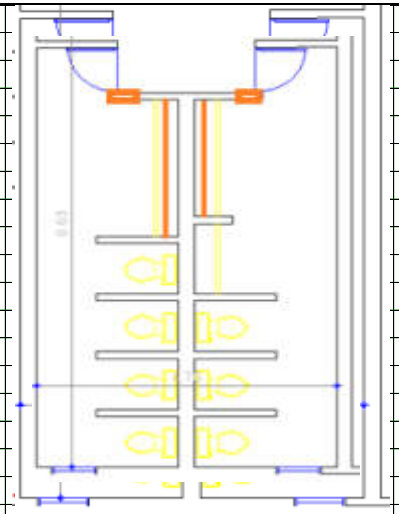

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	1.94	1.10			2.13				-	2.13
2. pasillo costado Occidental	17.40	0.50			8.70				-	8.70
3. pasillo costado oriental	2.30	0.50			1.15					1.15
					-					-
5. acceso baño de niñas	5.74	0.45			2.58					2.58
6. bateria de baños niñas	5.48	0.50			2.74					2.74
					-				subtotal	17.30
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	17.30

CROQUIS

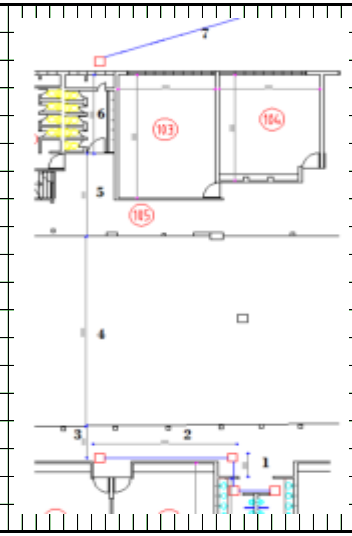

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	1.94	0.50			0.97				-	0.97
2. pasillo costado oriental	9.02	0.50			4.51				-	4.51
3. pasillo costado oriental	2.24	0.50			1.12					1.12
4.Cancha deportiva	15.30	3.00			45.90					45.90
5. acceso baño de niñas	5.74	0.45			2.58					2.58
6. bateria de baños niñas	5.48	0.50			2.74					2.74
7. costado occidental	15.00	0.50			7.50					7.50
bateria baño niños	7.20	5.66			40.75					40.75
actividades actas anteriores					-					
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	106.07

CROQUIS

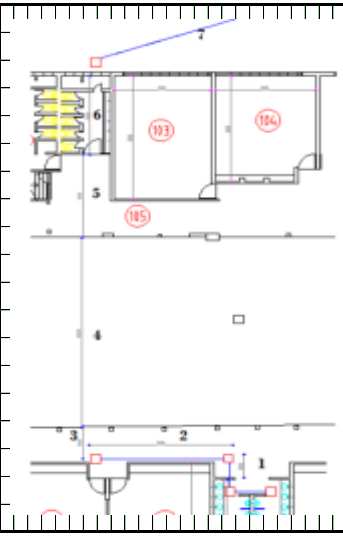

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.21	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños sanitarios				7.00	7.00				-	7.00
bateria de baños orinales				7.00	7.00				-	7.00
					-					-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	14.00

CROQUIS

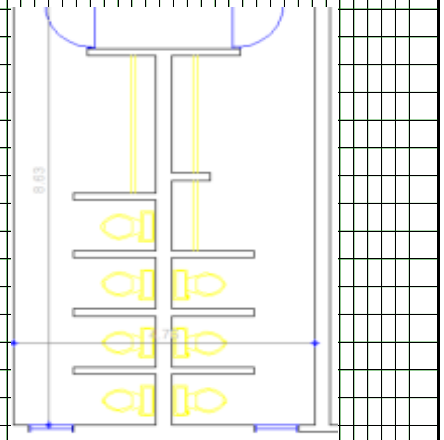

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. sección primaria	42.00	3.02			126.84				-	126.84
2. sección primaria	5.40	5.50			29.70				-	29.70
3. sección primaria	11.00	3.30			36.30					36.30
4. sección primaria	28.00	3.30			92.40					92.40
4. sección primaria	3.84	0.45			1.73					1.73
5. sección primaria	11.80	7.10			83.78					83.78
6.sección bachillerto	12.45	10.50			130.73					130.73
7. sección bachillerto	12.45	10.60			131.97					131.97
8. sección primaria	17.00	3.60			61.20					61.20
8. sección primaria	2.90	3.40			9.86					9.86
					-					-
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	704.51

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	UND	M3	REF.	HOJA 1	DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	1.94	0.50	0.55		0.53				-	0.53
2. pasillo costado oriental	9.02	0.50	0.60		2.71				-	2.71
3. pasillo costado oriental	2.24	0.50	0.70		0.78					0.78
4.Cancha deportiva	12.30	3.00	0.80		29.52					29.52
5. acceso baño de niñas	5.74	0.45	0.80		2.07					2.07
6. bateria de baños niñas	5.48	0.50	1.00		2.74					2.74
7. costado occidental	15.00	0.50	1.10		8.25					8.25
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	46.60

CROQUIS

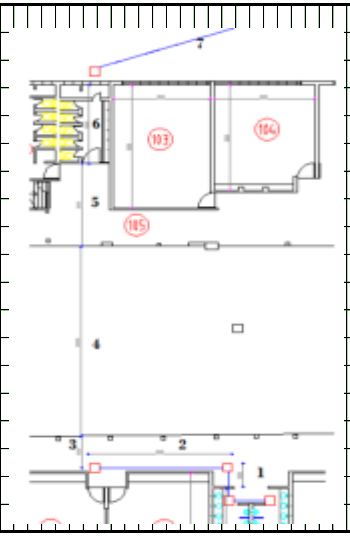

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	1.94	0.50			0.97				-	0.97
2. pasillo costado oriental	9.02	0.50			4.51				-	4.51
3. pasillo costado oriental	2.24	0.50			1.12					1.12
4.Cancha deportiva	15.30	3.00			45.90					45.90
5. acceso baño de niñas	5.74	0.45			2.58					2.58
6. bateria de baños niñas	5.48	0.50			2.74					2.74
bateria baño niños	7.20	5.66			40.75					40.75
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	98.57

CROQUIS

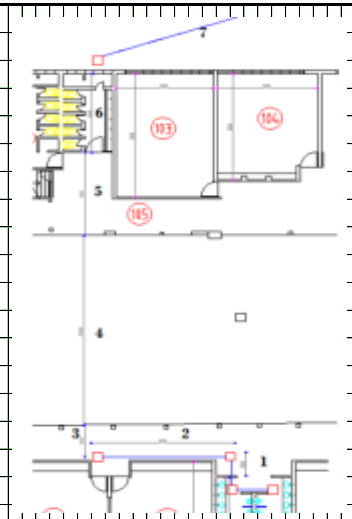

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	1.94	1.10			2.13				-	2.13
2. pasillo costado oriental	8.40	0.50			4.20				-	4.20
3. pasillo costado oriental	2.30	0.50			1.15					1.15
					-					-
5. acceso baño de niñas	5.74	0.45			2.58					2.58
6. bateria de baños niñas	5.48	0.50			2.74					2.74
placa cancha	15.20	3.00			45.60					45.60
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	58.40

CROQUIS

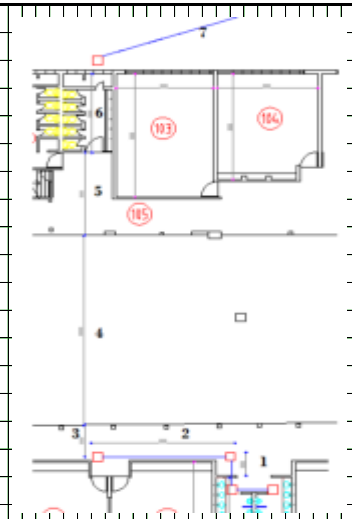

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	kg		L	a	h		
1.acceso baño de niños	1.94	1.10		2.08	4.44				-	4.44
2. pasillo costado oriental	8.40	0.50		2.08	8.74				-	8.74
3. pasillo costado oriental	2.30	0.50		2.08	2.39					2.39
				2.08	-					-
5. acceso baño de niñas	5.74	0.45		2.08	5.37					5.37
6. bateria de baños niñas	5.48	0.50		2.08	5.70					5.70
placa cancha	15.20	3.00		2.08	94.85					94.85
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	121.49

CROQUIS

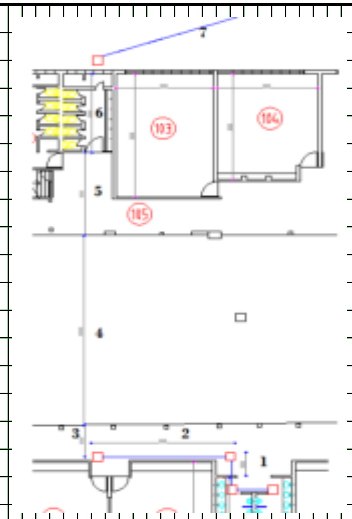

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	UNIDAD	ANCHO	ALTO	kg		L	a	h		
SECCIÓN primaria primer piso	5.00									5.00
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	5.00

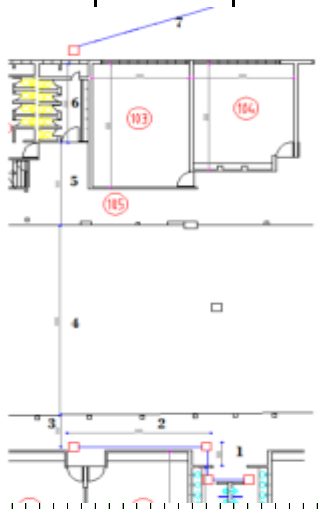

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
SECCIÓN primaria primer piso	56.00				56.00				-	56.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	56.00

CROQUIS

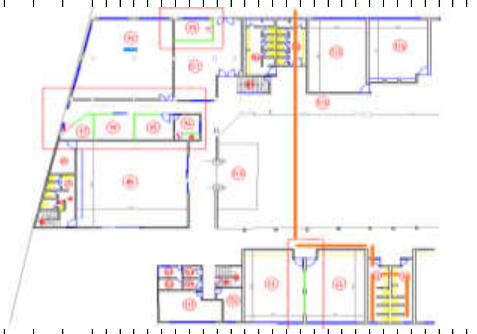

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	3.20				3.20				-	3.20
1.acceso baño de niños	3.20				3.20				-	3.20
										-
										-
										-
										-
										-
					-					
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	6.40

CROQUIS

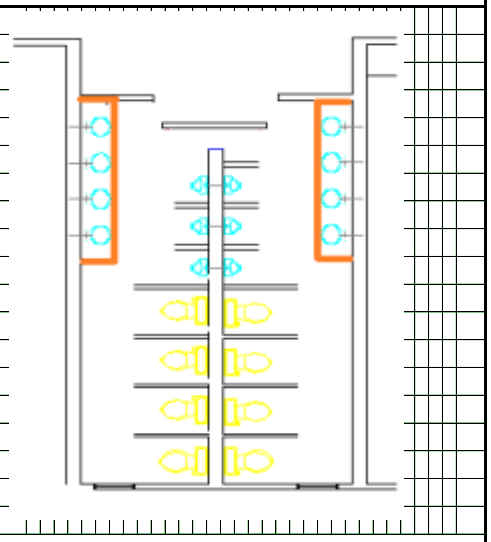

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FNAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Sección primaria				8.00	8.00				-	8.00
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	8.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FNAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.4.35	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
baños niños				2.00	2.00				-	2.00
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-			

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.4.46	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños	18.98			8.00	18.98				-	18.98
sifones de piso					-				-	-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	18.98

CROQUIS

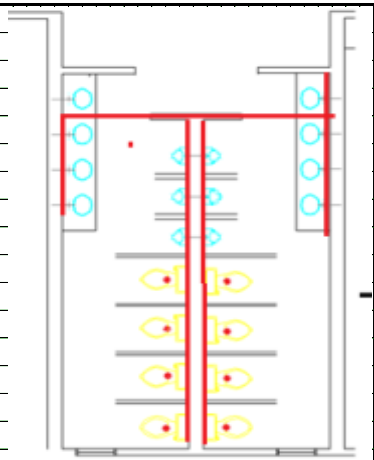

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.4.50	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1"	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
pasillo primer piso	22.30			8.00	22.30				-	22.30	
					-				-	-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
					-						
									TOTAL	22.30	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños				22.00	22.00				-	22.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	22.00

CROQUIS

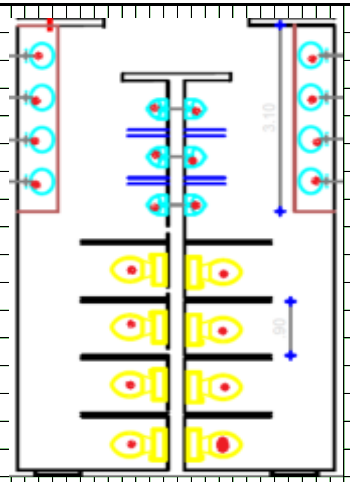

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños				26.00	26.00				-	26.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	26.00

CROQUIS

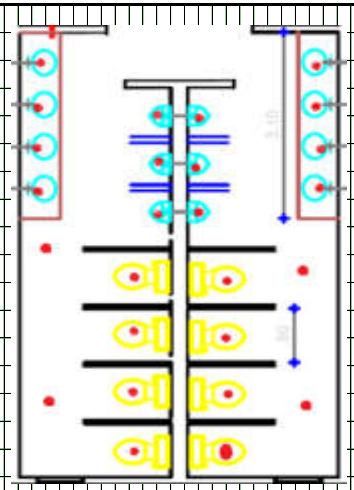

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.8.5	VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
pasillo primer piso	3.22			8.00	3.22				-	3.22
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	3.22

CROQUIS

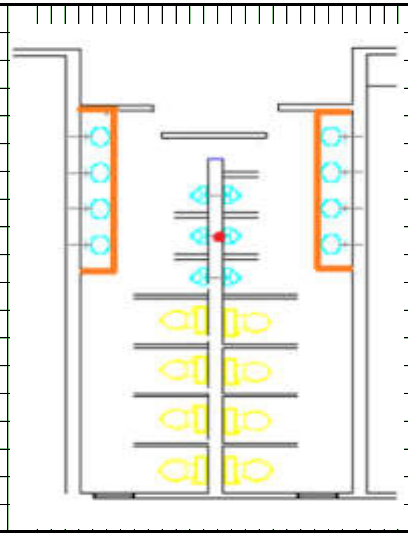

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
pasillo primer piso				5.00	5.00				-	5.00
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-			

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.14.17	INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
pasillo primer piso				2.00	2.00				-	2.00
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	2.00

CROQUIS

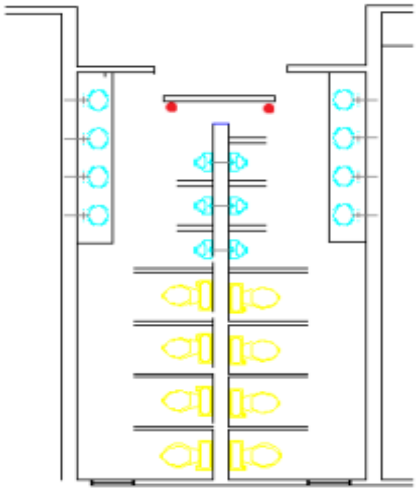

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA FINAL


INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO	9	PAÑETES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños	33.42		2.32		77.52				-	77.52
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	77.52

CROQUIS

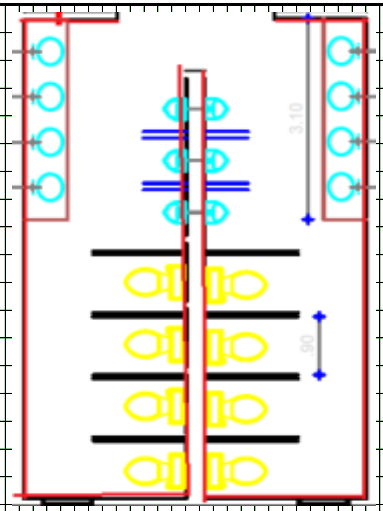

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA FINAL


INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria baño niños	7.20	5.56			40.03					40.03
Bateria baño niñas	6.00	1.00			6.00				-	6.00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	46.03

CROQUIS

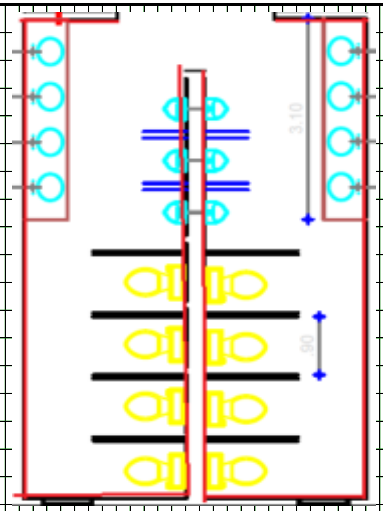

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.2.25	TABLETA NATURAL 20 X 10 MOORE O EQUIVALENTE	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	1.94	1.10			2.13				-	2.13
2. pasillo costado Occidental	17.40	0.50			8.70				-	8.70
3. pasillo costado oriental	2.30	0.50			1.15					1.15
					-					-
5. acceso baño de niñas	5.74	0.45			2.58					2.58
6. bateria de baños niñas	5.48	0.50			2.74					2.74
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	17.30

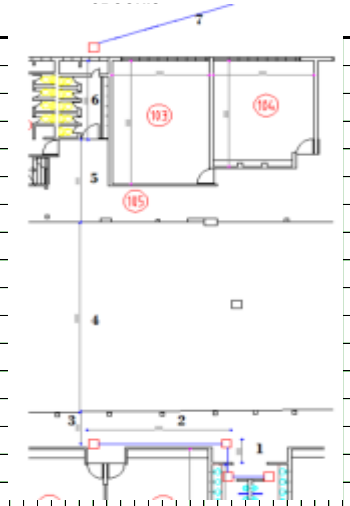

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria baño niños	5.66	7.20			40.75				-	40.75
Bateria baño niñas	6.00	1.00			6.00				-	6.00
					-					-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	46.75

CROQUIS

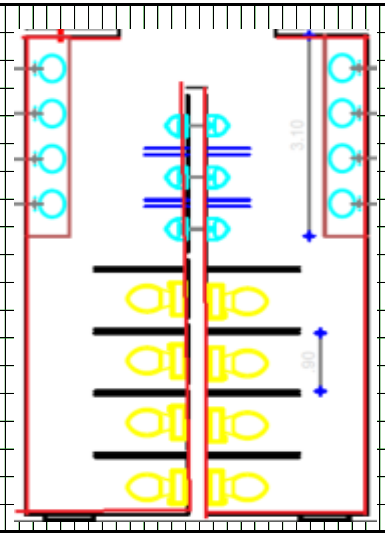

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria baño niños	34.09				34.09				-	34.09
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	34.09

CROQUIS

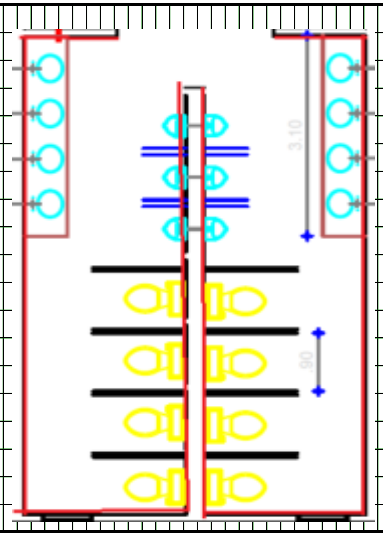

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA	DIA	26	MES	12	AÑO	2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	11	CUBIERTAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. sección primaria	42.00	3.02			126.84				-	126.84
2. sección primaria	5.40	5.50			29.70				-	29.70
3. sección primaria	11.00	3.30			36.30					36.30
4. sección primaria	28.00	3.30			92.40					92.40
4. sección primaria	3.84	0.45			1.73					1.73
5. sección primaria	11.80	7.10			83.78					83.78
6.sección bachillerto	12.45	10.50			130.73					130.73
7. sección bachillerto	12.45	10.60			131.97					131.97
8. sección primaria	17.00	3.60			61.20					61.20
8. sección primaria	2.90	3.40			9.86					9.86
					-					-
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	704.51

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	14	ENCHAPES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria baño niños	34.09	2.20			75.00				-	75.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	75.00

CROQUIS

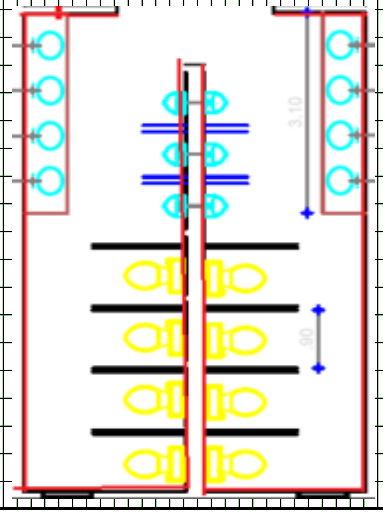

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA FINAL


INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO	14	ENCHAPES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	14.2.5	GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 60 cm.	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	3.20				3.20				-	3.20
1.acceso baño de niños	3.20				3.20				-	3.20
										-
										-
										-
										-
										-
					-					
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	6.40

CROQUIS

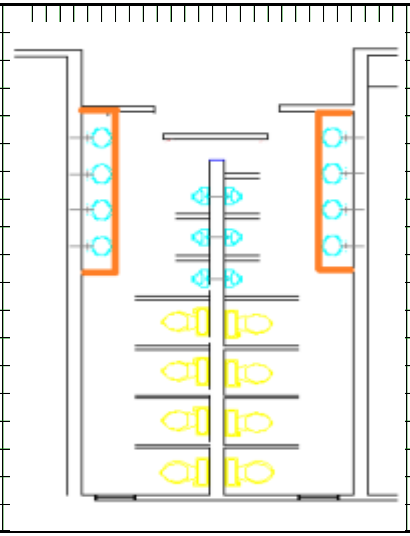

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	15	ILUMINACION	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria baño niños				5.00	5.00				-	5.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	5.00

CROQUIS

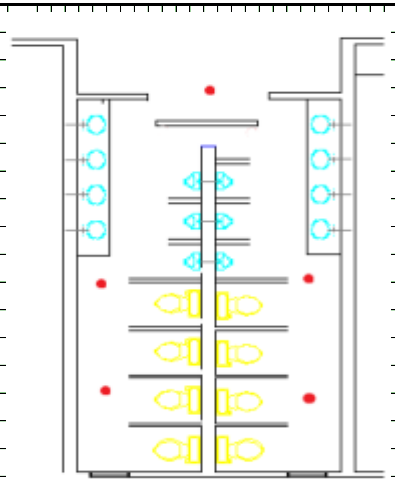

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	16.1.5	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL Ó SIMIL. (SUM E INSTALACION)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria baño niños				8.00	8.00				-	8.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	8.00

CROQUIS

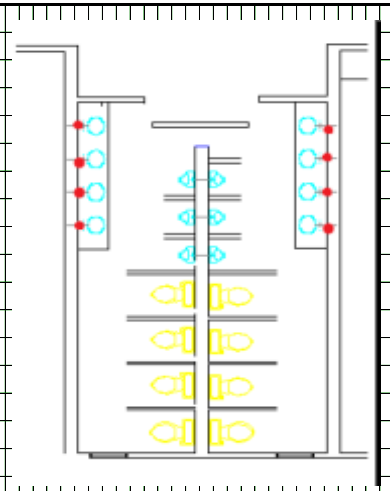

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER.	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria baño niños				8.00	8.00				-	8.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	8.00

CROQUIS

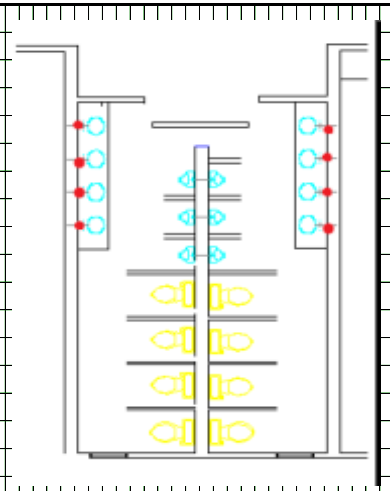

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	16.1.25	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR.	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria baño niños				6.00	6.00				-	6.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	6.00

CROQUIS

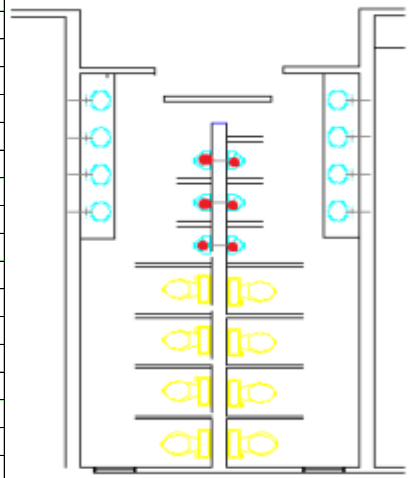

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	16.1.42	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria baño niños				8.00	8.00				-	8.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	8.00

CROQUIS

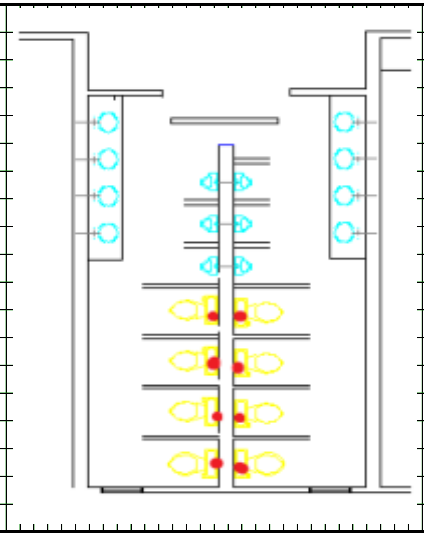

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ NIT. 901384066-1 CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO ACTA FINAL


INTERVENTORIA ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA DIRECTOR DE INTERVENTORIA MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO	17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria baño niños	1.49	0.28		8.00	3.34				-	3.34
bateria baño niños	1.49	1.60		8.00	19.07				-	19.07
bateria baño niños	1.80	0.15		4.00	1.08					1.08
bateria baño niños	1.80	0.36		6.00	3.89					3.89
bateria baño niños	1.30	0.40		6.00	3.12					3.12
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	30.50

CROQUIS

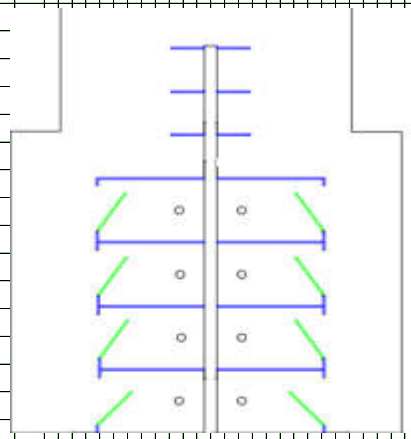

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	18	PINTURAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria baño niños	5.66	7.20			40.75				-	40.75
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	40.75

CROQUIS

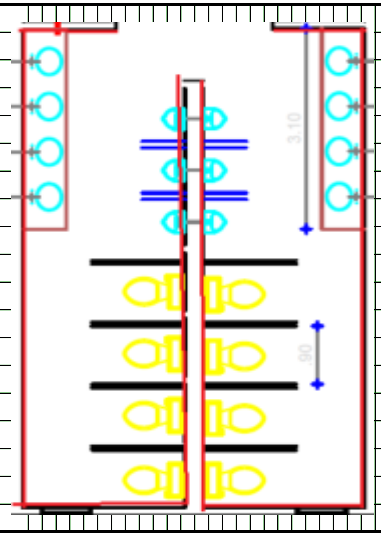

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA FINAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	19	CERRADURAS Y VIDRIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.baño de niños	3.20		0.80		2.56				-	2.56
1.baño de niños	3.20		0.80		2.56				-	2.56
										-
										-
										-
										-
										-
					-					
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	5.12

CROQUIS

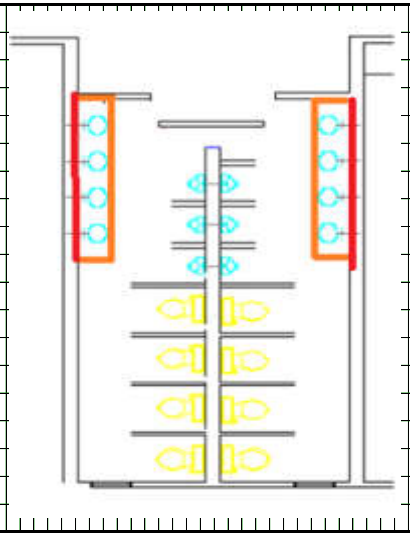

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA FINAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	21	ASEO Y VARIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	21.1.1	ASEO GENERAL	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. cubierta sección primaria	40.50	3.00			121.50				-	121.50
2. cubierta sección primaria	5.00	5.50			27.50				-	27.50
3. cubierta sección primaria	11.30	3.30			37.29					37.29
4. cubierta sección primaria	28.00	3.30			92.40					92.40
5. cubierta sección primaria	11.40	8.20			93.48					93.48
5. cubierta sección primaria	16.40	3.60			59.04					59.04
5. cubierta sección primaria	3.85	0.45			1.73					1.73
5. cubierta sección primaria	2.90	3.40			9.86					9.86
6. cubierta sección bachillerto	12.45	10.50			130.73					130.73
7. cubierta sección bachillerto	12.45	10.60			131.97					131.97
area baño niñas	6.00	1.00			6.00					6.00
area baño niños	5.66	7.20			40.75					40.75
area posterior	10.00	0.80			8.00					8.00
placa	15.00	3.00			45.00					45.00
					-					-
					-					-
									TOTAL	805.25

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	NP13	emulsion asfaltica sika o similar, sellante de mortero existente	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. sección primaria	42.00	3.02			126.84				-	126.84
2. sección primaria	5.40	5.50			29.70				-	29.70
3. sección primaria	11.00	3.30			36.30					36.30
4. sección primaria	28.00	3.30			92.40					92.40
4. sección primaria	3.84	0.45			1.73					1.73
5. sección primaria	11.80	7.10			83.78					83.78
6.sección bachillerto	12.45	10.50			130.73					130.73
7. sección bachillerto	12.45	10.60			131.97					131.97
8. sección primaria	17.00	3.60			61.20					61.20
8. sección primaria	2.90	3.40			9.86					9.86
					-					-
					-					-
									TOTAL	704.51

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

4.2.6 MEMORIAS DE CÁLCULO IED DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO.



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
area segundo piso aula multiple	2.85	4.37			12.46				-	12.46
area segundo piso aula multiple	2.85	4.37			12.46				-	12.46
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	24.92

CROQUIS

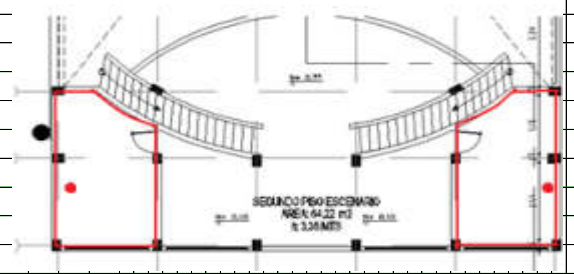

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
area segundo piso aula multiple				2.00	2.00				-	2.00	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	2.00	

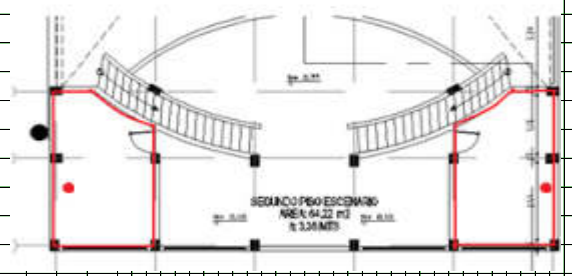

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
area segundo piso aula multiple				10.00	10.00				-	10.00
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	10.00

CROQUIS

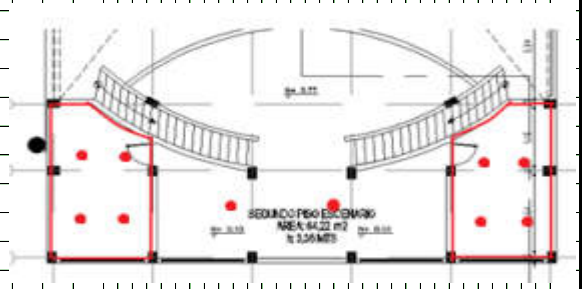

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.14.17	INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
area segundo piso aula multiple				3.00	3.00				-	3.00	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	3.00	

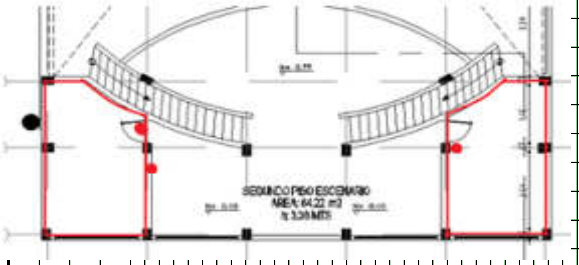

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CUBIERTA AULA MULTIPLE	24.28	14.56			353.52				-	353.52	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	353.52	

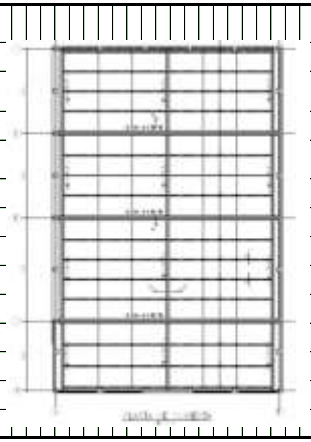

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.2.23	DESMONTE CANALETA 43/90	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	Doble o sencillo	Peso por m		L	a	h			
CUBIERTA AULA MULTIPLE	24.28	14.56			353.52				-	353.52	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	353.52	

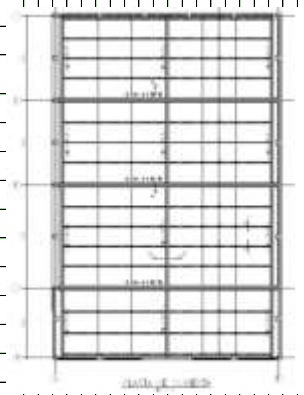

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	peso	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUBIERTA AULA MULTIPLE	7,933.00				7,933.00				-	7,933.00
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	7933.00

CROQUIS


TRACOL

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT. 900.962.813-3
CERTIFICA QUE:

La empresa CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE identificado con NIT No. 9 0 1 3 8 4 0 6 6-1 de la sede Colegio Domingo Faustino Sarmiento , por intermedio de SOLUCIONES AMBIENTALES DAFITCH SAS quien realizo el recolección y transporte, identificado con NIT No. 901307224, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes ítems.

El material se trato de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR 1. Resolución 909 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA, para" Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de residuos peligrosos" 2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1521 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP NI.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes (Diciembre) de 2020. Cualquier información adicional relacionado con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Identificador:

Jonathan Rodriguez
GERENTE

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA	26	MES	12	AÑO	2020			
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681				
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO	ACTA PARCIAL							
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ						

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	Tipo perfil	Doble o sencillo	Peso por m		L	a	h		
Eje F entre ejes 1 y 9 cerchas secundarias	24.10	305*80*1.5mm	2.00	5.86	282.45				-	282.45
									-	-
Eje centro entre ejes 1 y 9 cerchas secundarias	24.10	305*80*1.5mm	2.00	5.86	282.45					282.45
										-
Eje A entre ejes 1 y 9 cerchas secundarias	24.10	305*80*1.5mm	2.00	5.86	282.45					282.45
					-					-
					-					-
Correas en sentido transversal son 12	14.05	305*80*1.5mm	1.00	5.86	988.00					988.00
					-					-
Angulos y plantinas Y TEMPLETES					120.50					120.50
					-					-
Soldadura 3%					58.68					58.68
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	2014.53

CROQUIS

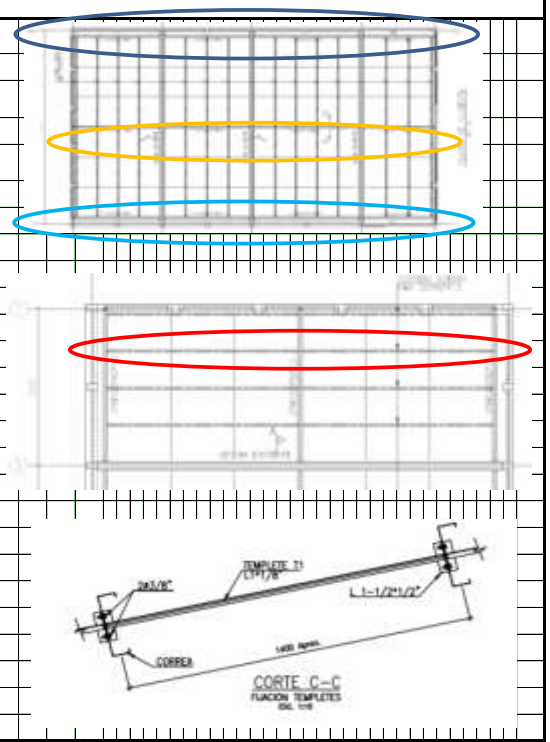

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO


PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.3.11	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	UND M	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	Doble o sencillo	Peso por m		L	a	h			
CUBIERTA AULA MULTIPLE	80.00				80.00				-	80.00	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	80.00	

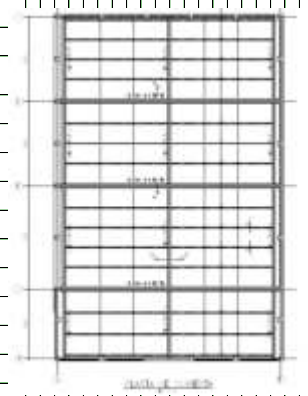

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	15	ILUMINACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
area segundo piso aula multiple				2.00	2.00				-	2.00
					-				-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	2.00

CROQUIS

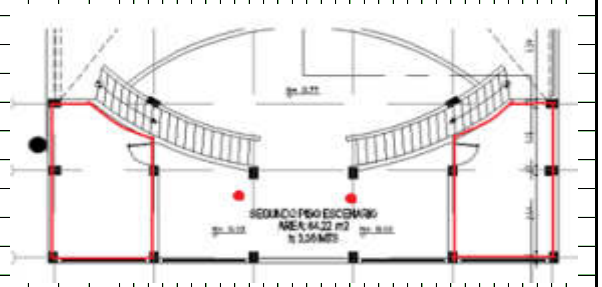

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	15	ILUMINACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.2.1	BALA FLUORESCENTE DE 50 W	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
area segundo piso aula multiple				8.00	8.00				-	8.00
					-				-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	8.00

CROQUIS

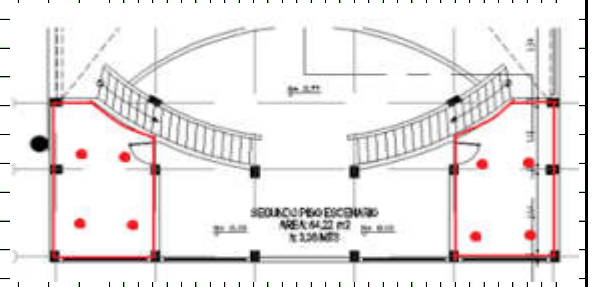

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
area segundo piso aula multiple	14.28			8.00	114.24				-	114.24	
					-				-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	114.24	

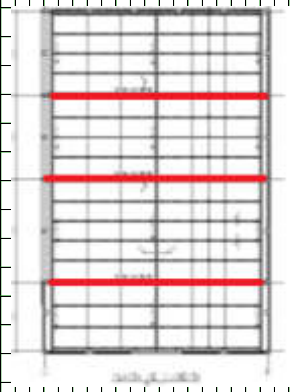

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	21	ASEO Y VARIOS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	21.1.1	ASEO GENERAL	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUBIERTA AULA MULTIPLE	24.28	14.56			353.52				-	353.52
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	353.52

CROQUIS

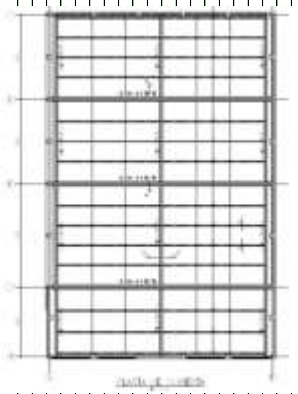

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	21	ASEO Y VARIOS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUBIERTA AULA MULTIPLE	15.00				15.00				-	15.00
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	15.00

CROQUIS

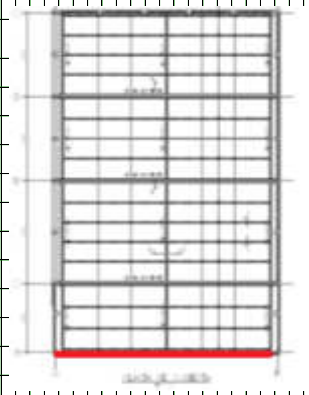

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	NP7	Cieloraso en láminas de pvc	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
area segundo piso aula multiple	2.85	4.53			12.92				-	12.92
area segundo piso aula multiple	2.85	4.53			12.92				-	12.92
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	25.84

CROQUIS

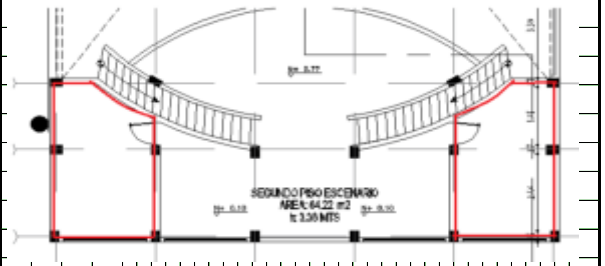

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

4.2.7 MEMORIAS DE CÁLCULO IED AGUSTIN FERNANDEZ.

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
muro costado orienral	1.20	2.80			3.36				-	3.36
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	3.36

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA Ó ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
costado oriental	60.50		1.50		90.75				-	90.75
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	90.75

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
costado oriental	12.10	0.90	0.89		9.68				-	9.68
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	9.68

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
costado oriental	60.50	0.22	0.40		5.32				-	5.32
					-				-	-
					-					-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	5.32

CROQUIS

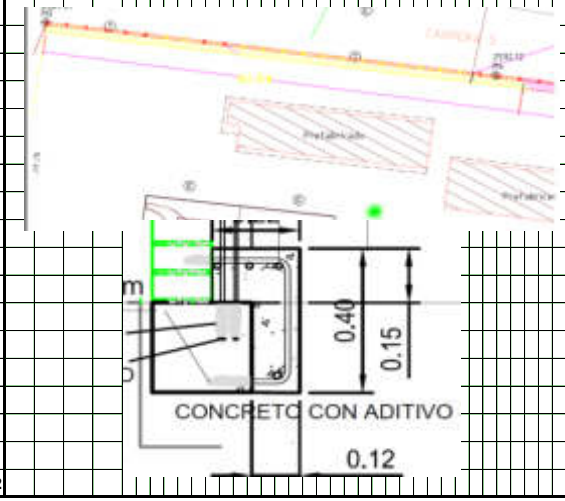

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL


ITEM:	2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS peso	ANCHO	long	CANTIDAD	V. PARCIAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
muro costado oriental	1,839.98				1,839.98				-	1,839.98

Cuantía de refuerzos

Diametro	ID	Longitud de barra	Cantidad	Longitud Total	kg	Forma
#3		0.660 m	728	480.480 m	267.278 kg	
#3		1.060 m	408	432.480 m	240.577 kg	
#3		3.300 m	52	171.600 m	95.457 kg	
#3		3.650 m	26	94.910 m	52.796 kg	
#3		3.656 m	26	95.052 m	52.875 kg	
#4		0.896 m	400	358.259 m	356.160 kg	
#4		64.950 m	12	779.400 m	774.834 kg	
Grand total: 140			1652	2412.180 m	1839.977 kg	

CROQUIS



					-					-	
Cantidades tomadas de cuadro de despieces en planos					-						
					-						
									TOTAL	1839.98	

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				


CAPITULO	5	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL


ITEM:	5.4.1	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UND	CM	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
		ANCHO	long	CANTIDAD		L	a	h		
viga (LONGITUD DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN 60.5M) SE HACEN ANCLAJES CADA 15 CM COMO LO ESTABLECE EL PLANO, UNO A LA VIGA antigua DE 11 CM, Y OTRO A MURO DE 6CM	60.5/.15		11.00	403.00	4,433.00				-	4,433.00
	60.5/.15		6.00	403.00	2,418.00					2,418.00
										-
en cada machon se hace dos aclajes cada dos ladrillos o cada 16 cm	alto	cantidad de machones	long	cantidad flejes						-
Columneta costado oriental	3.00	2.00	6.00	19.00	456.00					456.00
Columneta costado oriental	2.73	1.00	6.00	17.00	204.00					204.00
Columneta costado oriental	2.65	3.00	6.00	17.00	612.00					612.00
Columneta costado oriental	2.75	3.00	6.00	17.00	612.00					612.00
Columneta costado oriental	2.70	2.00	6.00	17.00	408.00					408.00
Columneta costado oriental	2.44	1.00	6.00	15.00	180.00					180.00
Columneta costado oriental	2.54	1.00	6.00	16.00	192.00					192.00
Columneta costado oriental	2.73	1.00	6.00	17.00	204.00					204.00
Columneta costado oriental	2.61	2.00	6.00	16.00	384.00					384.00
Columneta costado oriental	2.58	2.00	6.00	16.00	384.00					384.00
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	10487.00

CROQUIS





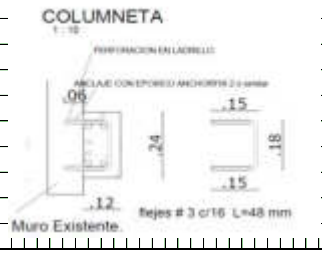

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.7	VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muro costado oriental	12.30		2.35		28.91				-	28.91	
muro costado oriental	5.45		1.93		10.52					10.52	
muro costado oriental	24.15		1.80		43.47					43.47	
muro costado oriental	15.25		2.15		32.79					32.79	
muro costado oriental	3.35		2.00		6.70					6.70	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	122.39	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	20	OBRAS EXTERIORES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
costado oriental	60.50		1.50		90.75				-	90.75
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	90.75

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	21	ASEO Y VARIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	21.1.1	ASEO GENERAL	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
costado oriental	60.50	2.40			145.20				-	145.20
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	145.20

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ


PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	25	ASEO Y VARIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	25.7.6	PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
costado oriental	60.50	0.40			24.20				-	24.20	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									TOTAL	24.20	

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	NP3	COLUMNETA EN CONCRETO DIMENSIONES 0,15M x 0,20M DE 3000 PSI.	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Columneta costado oriental			3.00	2.00	6.00				-	6.00
Columneta costado oriental			2.73	1.00	2.73					2.73
Columneta costado oriental			2.65	3.00	7.95					7.95
Columneta costado oriental			2.75	3.00	8.25					8.25
Columneta costado oriental			2.70	2.00	5.40					5.40
Columneta costado oriental			2.44	1.00	2.44					2.44
Columneta costado oriental			2.54	1.00	2.54					2.54
Columneta costado oriental			2.73	1.00	2.73					2.73
Columneta costado oriental			2.61	2.00	5.22					5.22
Columneta costado oriental			2.58	2.00	5.16					5.16
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	48.42

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO			REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	NP4	VIGUETA CONCRETO DE 3000 PSI DE DIMENSIONES 0,25M x 0,25M.	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Viga de cimentación	60.50				60.50				-	60.50
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	60.50

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

4.2.8 MEMORIAS DE CÁLCULO IED FRIEDRICH NAUMANN

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h		
Salón 34	6.99	6.76		1.00	47.25				-	47.25
salón 35	6.89	6.76		1.00	46.58				-	46.58
	AREA								-	-
ESCALERA	11.60				11.60				-	11.60
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					-
									TOTAL	105.43

CROQUIS

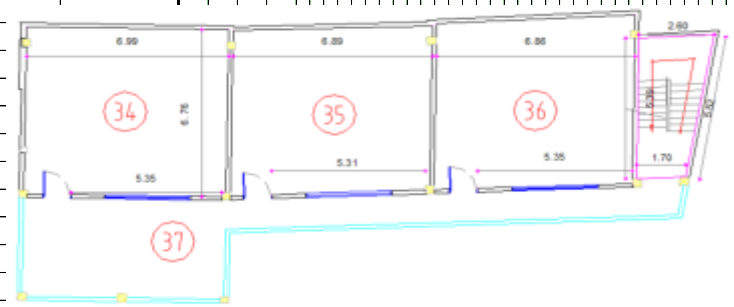

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h		
salones	2.00		0.60	6.00	7.20				-	7.20
										-
									-	-
									-	-
									-	-
										-
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	7.20

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	area	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
salones				12.00	12.00					12.00
escalera				2.00	2.00					2.00
circulacion				5.00	5.00					5.00
					-					-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	19.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Tanque sobre cubierta area de escalera				1.00	1.00				-	1.00
				1.00	-				-	-
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
										-
									TOTAL	1.00

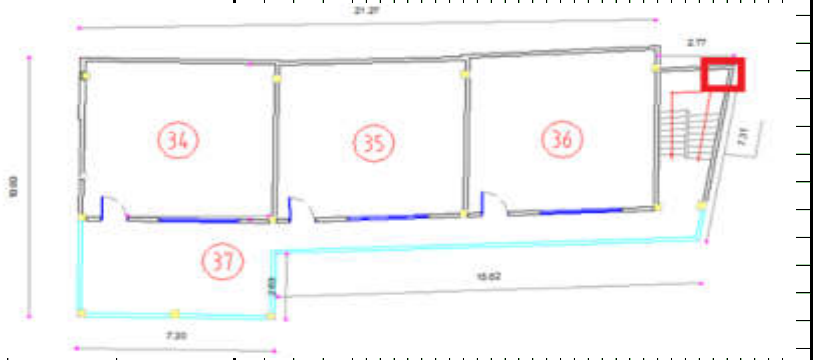

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.1.12	SALIDA SONIDO EN 3/4 L=5M CON CABLE POLARIZADO 2X14	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h		
salones				3.00	3.00				-	3.00
escaleras				1.00	1.00				-	1.00
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					-
									TOTAL	4.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h		
salones				12.00	12.00					12.00
escalera				2.00	2.00					2.00
circulacion				5.00	5.00					5.00
					-					-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	19.00

CROQUIS

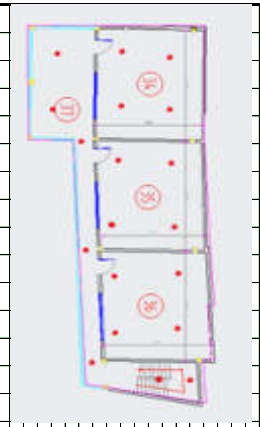

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h			
salones	91.00				91.00				-	91.00	
escaleras	5.60				5.60				-	5.60	
terraza y hall de circulación	24.00				24.00				-	24.00	
									TOTAL	120.60	

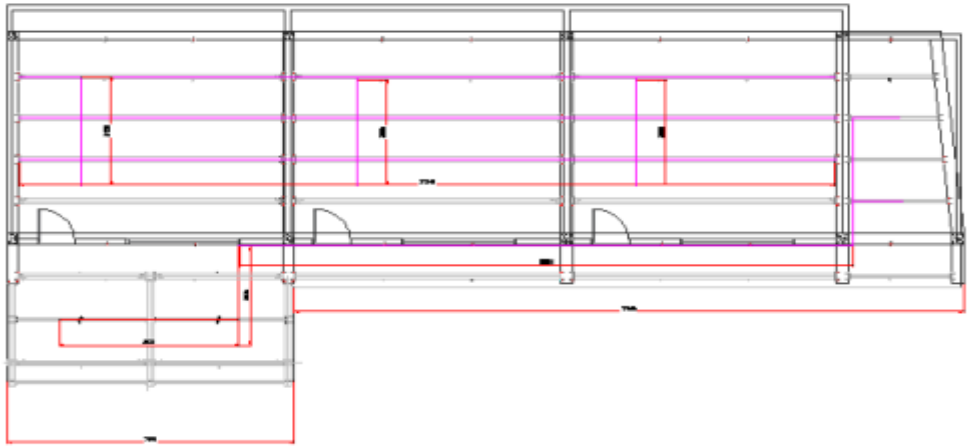

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA FINAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.3.14	CABLEADO 1#12	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h			
cable # 12 rojo	200.00			1.00	200.00				-	200.00	
cable # 12 blanco	200.00			1.00	200.00				-	200.00	
cable # 12 verde	200.00			1.00	200.00				-	200.00	
cable # 12 azul	100.00			1.00	100.00				-	100.00	
					-				-	-	
									TOTAL	700.00	

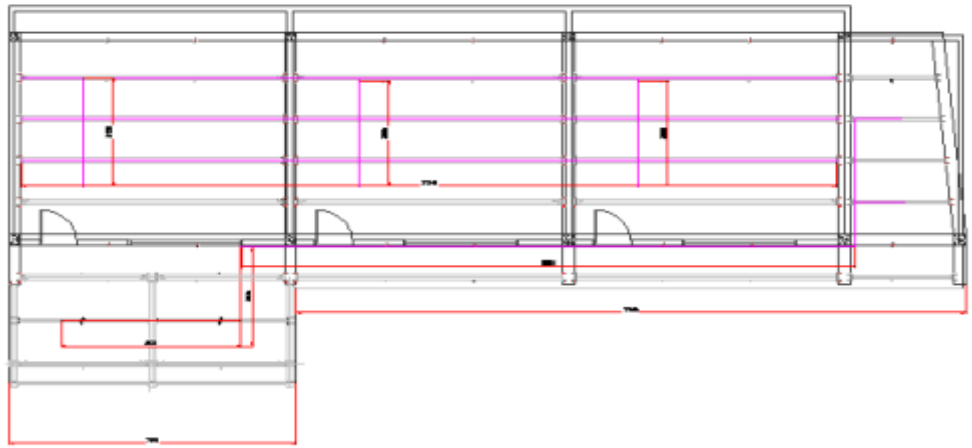

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.4.3	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h			
Primer piso bloque				1.00	1.00				-	1.00	
					-				-	-	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
										-	
									TOTAL	1.00	

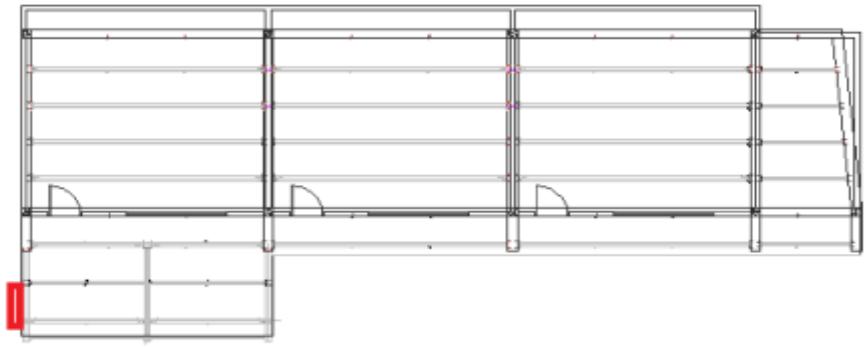

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA FINAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h			
TABLERO				17.00	17.00				-	17.00	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
									TOTAL	17.00	

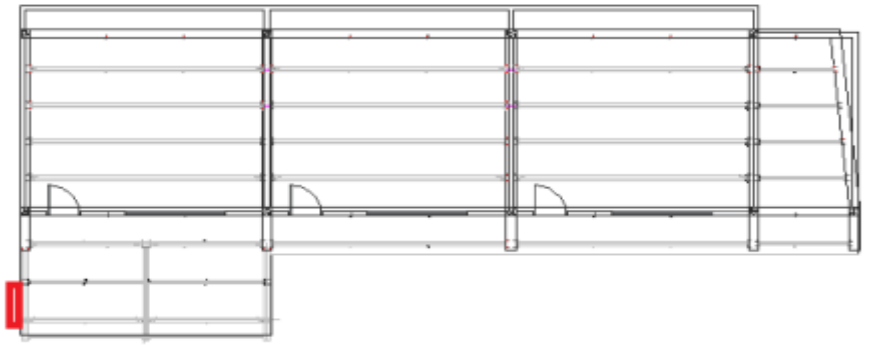

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h			
TABLERO				1.00	1.00				-	1.00	
					-				-	-	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-					-	
									TOTAL	1.00	

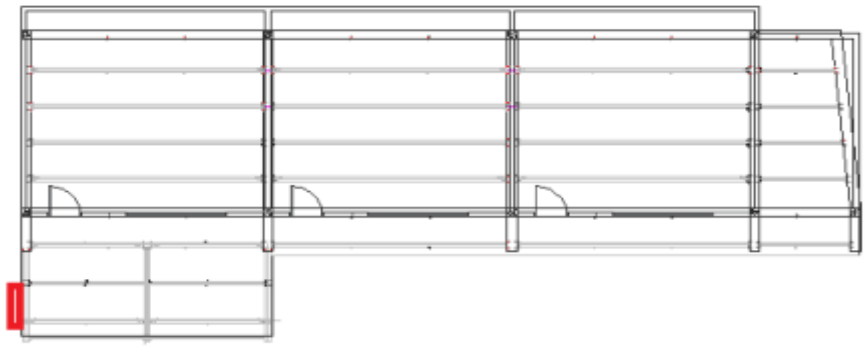

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.6.1	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO CERTIFICADO	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h			
SALONES				25.00	25.00				-	25.00	
a salón informatica primer piso				10.00	10.00				-	10.00	
					-					-	
									TOTAL	35.00	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.6.4	SALIDA DE VOZ O DATOS EN CANALETA	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h			
SALONES				4.00	4.00				-	4.00	
ESCALERAS				1.00	1.00				-	1.00	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
									TOTAL	5.00	

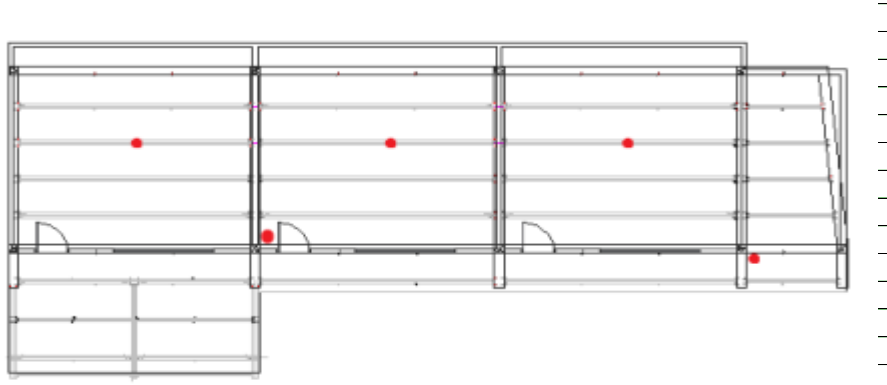

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.14.17	INTERRUPTOR SENC Clas.C L/NEX LX-010C	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h			
SALON 1				1.00	1.00				-	1.00	
SALON 2				1.00	1.00				-	1.00	
SALON 3				1.00	1.00				-	1.00	
escaleras				1.00	1.00						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
									TOTAL	4.00	

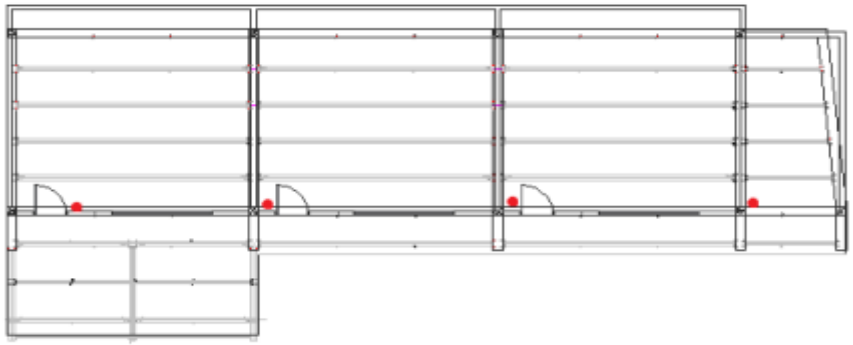

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.14.19	TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO666 -N	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h			
SALON 1				4.00	4.00				-	4.00	
SALON 2				4.00	4.00				-	4.00	
SALON 3				4.00	4.00				-	4.00	
					-				-	-	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-					-	
									TOTAL	12.00	

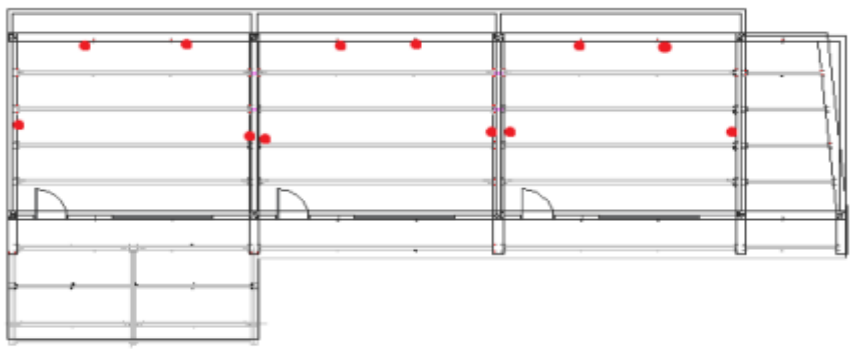

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	9	PAÑETES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h		
salon 1					-				-	-
ventanas costado oriental	5.20			2.00	10.40				-	10.40
ventanas costado ccidental	7.90			1.00	7.90				-	7.90
columnas	7.00			2.00	14.00				-	14.00
puerta	2.50			1.00	2.50				-	2.50
viga	27.60			1.00	27.60					27.60
salon 2					-				-	-
ventanas costado oriental	5.20			2.00	10.40				-	10.40
ventanas costado ccidental	7.90			1.00	7.90				-	7.90
columnas	7.00			2.00	14.00				-	14.00
puerta	2.50			1.00	2.50				-	2.50
viga	27.60			1.00	27.60					27.60
salon 3					-				-	-
ventanas costado oriental	5.20			2.00	10.40				-	10.40
ventanas costado ccidental	7.90			1.00	7.90				-	7.90
columnas	7.00			2.00	14.00				-	14.00
puerta	2.50			1.00	2.50				-	2.50
viga	27.60			1.00	27.60					27.60
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	187.20

CROQUIS

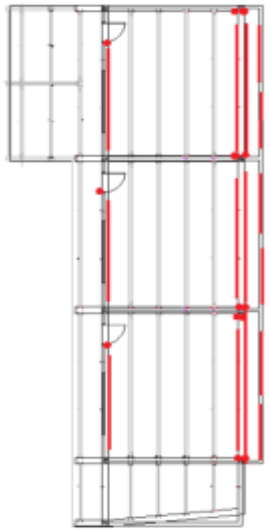

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA	26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA FINAL					
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	9	PAÑETES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h			
SALON 35	7.99		3.50	1.00	27.97	2.00	2.00	0.60	-2.40	25.57	
SALON 36	7.89		3.50	1.00	27.62	2.00	2.00	0.60	-2.40	25.22	
CALON 37	7.86		3.50	1.00	27.51	2.00	2.00	0.60	-2.40	25.11	

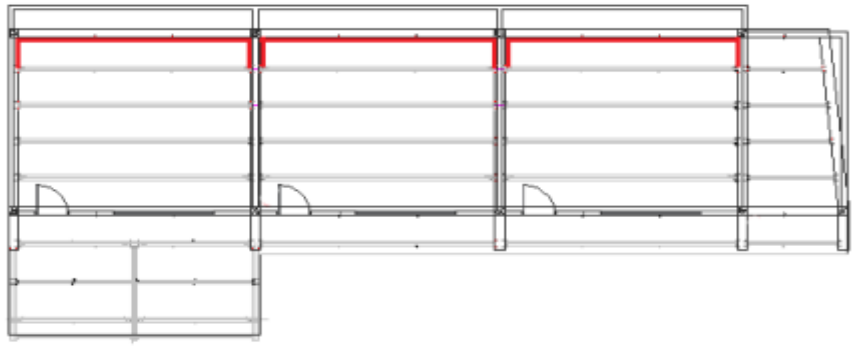

TOTAL 75.90

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	9	PAÑETES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h		
SALON 34 -35- 36	6.76		3.16	6.00	128.17				-	128.17
SALONES	5.35		1.10	3.00	17.66				-	17.66
SALONES	0.50		2.60	3.00	3.90				-	3.90
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	149.73

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.3.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ancho	ALTO	CANTIDAD		CANT	a	h			
SALON 34					-				-	-	
SALON35	6.89			1.00	6.89				-	6.89	
SALONM36	7.86			1.00	7.86				-	7.86	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
									TOTAL	14.75	

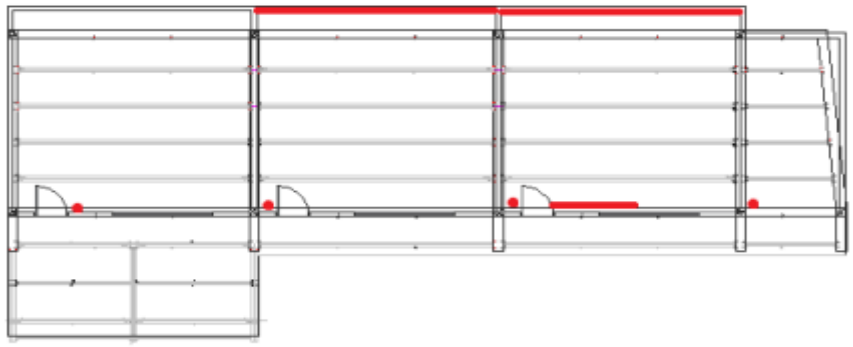

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN


PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA	26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL						
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			REF.	CONTRACTUAL			
ITEM:	11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	area	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
salones	234.00				234.00					234.00	
									TOTAL	234.00	

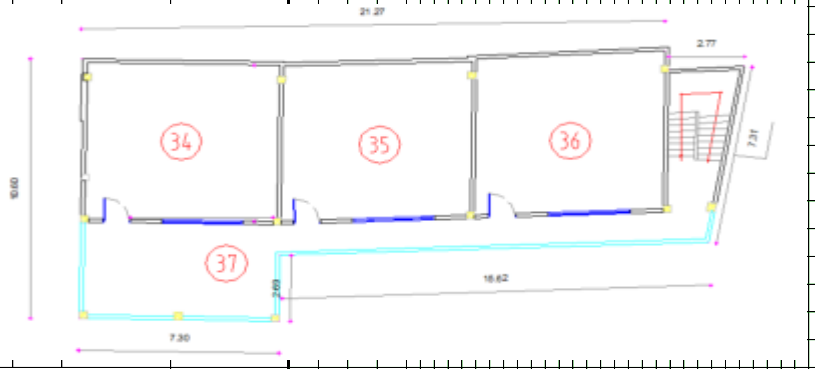

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	area	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
salones	234.00				234.00					234.00	
									TOTAL	234.00	

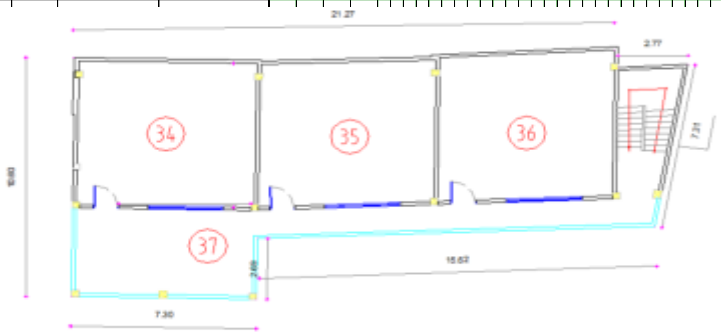

Observaciones	

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN


PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			REF.	CONTRACTUAL			
ITEM:	11.2.29	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	area	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
salones, escalera, terraza y hall de circulacion		120.45			120.45					120.45	
										-	
									TOTAL	120.45	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

						FECHA	DIA	26	MES 12	AÑO	2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1			CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681			
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA FINAL							
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ					

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	area	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
cubierta				5,000.00	5,000.00					5,000.00	
									TOTAL	5000.00	

TRACOL

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3
CERTIFICA QUE:

La empresa CONSORCIO SANTA FE identificado con NIT No. 9 0 0 3 8 8 0 6 6 Colegio Frederich Neumann, por intermedio de SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. 901344223, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Corresponde Y	Corresponde A
TRA12203	TEJA DE ETERNIT	13/01/2021	5000	POLVOS DE ASBESTO	Y36 POLVOS DE ASBESTO	NO APLICA

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	PESO	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CORREA CO1	6.45	6.90		18.00	801.09				-	801.09	
CORREA CO2	5.83	3.50		8.00	163.24				-	163.24	
CORREA CO3	4.67	3.50		8.00	130.76				-	130.76	
CORREA CO4	6.45	6.95		10.00	448.28				-	448.28	
CORREA CO5	4.67	2.26		2.00	21.11					21.11	
CORREA CO6	4.67	2.38		2.00	22.23					22.23	
CORREA CO7	4.67	2.60		2.00	24.28					24.28	
CORREA CO8	4.67	2.60		2.00	24.28					24.28	
CORREA CO9	4.67	2.70		2.00	25.22					25.22	
CORREA CO10	6.45	6.90		2.00	89.01					89.01	
TEMPLETE 1	1.00	1.17		7.00	8.19					8.19	
TEMPLETE 2	1.00	1.46		21.00	30.66					30.66	
TEMPLETE 3	1.00	1.04		7.00	7.28					7.28	
TEMPLETE 4	1.00	1.45		4.00	5.80					5.80	
CORTAVIENTO	1.55	8.10		6.00	75.33					75.33	
CORTAVIENTO	1.55	4.70		4.00	29.14					29.14	
CORTAVIENTO	7.40	0.10		4.00	2.96					2.96	
BROCHAL	3.69	0.22		68.00	55.20					55.20	
BROCHAL	3.69	0.09		36.00	12.49					12.49	
BROCHAL	3.69	0.16		22.00	12.99					12.99	
PLATINA	76.74	0.05		3.00	11.51					11.51	
PASADOR	1.55	0.33		36.00	18.41					18.41	
PASADOR	1.55	0.15		18.00	4.19					4.19	
ANGULOS Y PERNOS	250.00	1.00		1.00	250.00					250.00	
										2,273.65	
SOLDADURA 3%					68.21					68.21	
									TOTAL	2341.86	

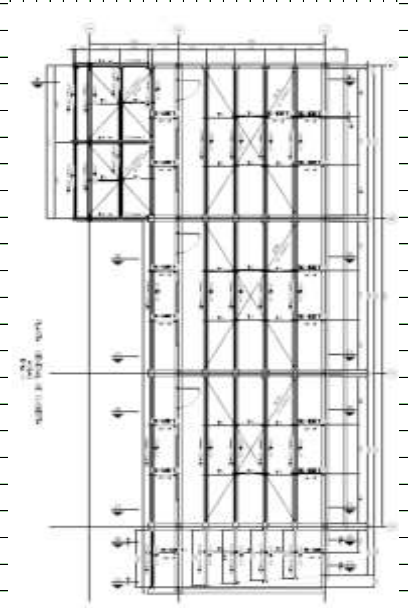

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.3.5	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	area	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
cubierta		25.00			25.00					25.00	
										-	
									TOTAL	25.00	

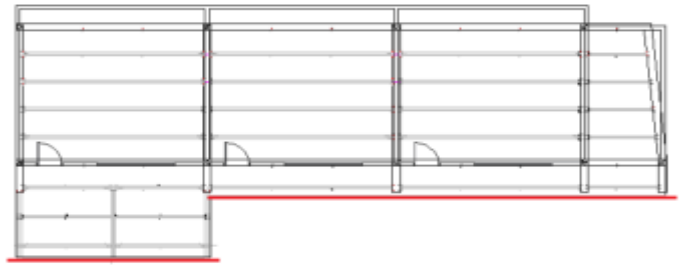

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.3.14	BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	area	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
cubierta		14.00			14.00						
									TOTAL	14.00	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	12	CARPINTERIA DE METÁLICA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.1.1	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	area	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
salones	2.00		0.60	6.00	7.20				-	7.20
					-					
					-					
					-					
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	7.20

CROQUIS

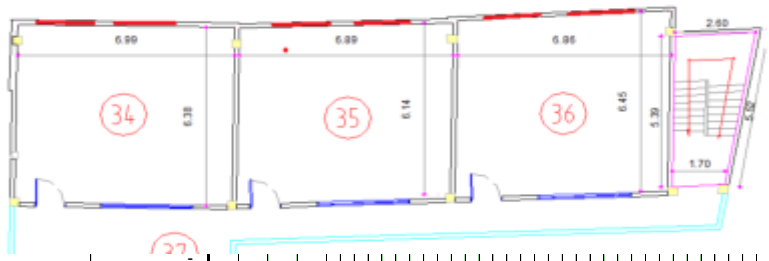

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	15	ILUMINACION	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	area	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
salones				12.00	12.00					12.00
escalera				2.00	2.00					2.00
circulacion				5.00	5.00					5.00
					-					-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	19.00

CROQUIS

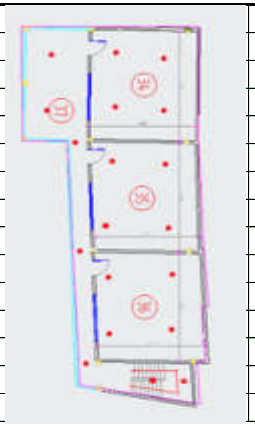

Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.3	ESTUCO	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	area	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
SALON 34	6.99		3.72	1.00	26.00	2.00	0.60	2.00	-2.40	23.60	
SALON 35	6.89		3.72	1.00	25.63	2.00	0.60	2.00	-2.40	23.23	
SALON 35	6.96		3.72	1.00	25.89	2.00	0.60	2.00	-2.40	23.49	
SALON 34 -35- 36	6.76		3.16	6.00	128.17				-	128.17	
SALONES	5.35		1.10	3.00	17.66				-	17.66	
SALONES	0.50		2.60	3.00	3.90				-	3.90	
VIGA SALON 34	6.99		1.00	1.00	6.99					6.99	
VIGA SALON 35	6.89		1.00	1.00	6.89					6.89	
VIGA SALON 36	6.86		1.00	1.00	6.86					6.86	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
									TOTAL	240.79	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	area	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
SALON 34	6.99		3.72	1.00	26.00	2.00	0.60	2.00	-2.40	23.60
SALON 35	6.89		3.72	1.00	25.63	2.00	0.60	2.00	-2.40	23.23
SALON 35	6.96		3.72	1.00	25.89	2.00	0.60	2.00	-2.40	23.49
SALON 34 -35- 36	6.76		3.16	6.00	128.17				-	128.17
SALONES	5.35		1.10	3.00	17.66				-	17.66
SALONES	0.50		2.60	3.00	3.90				-	3.90
VIGA SALON 34	6.99		1.00	1.00	6.99					6.99
VIGA SALON 35	6.89		1.00	1.00	6.89					6.89
VIGA SALON 36	6.86		1.00	1.00	6.86					6.86
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	240.79

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	largo		ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
SALON 34	0.95		2.50	2.00	4.75				-	4.75	
SALON 35	0.95		2.50	2.00	4.75				-	4.75	
SALON 36	0.95		2.50	2.00	4.75				-	4.75	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
									TOTAL	14.25	

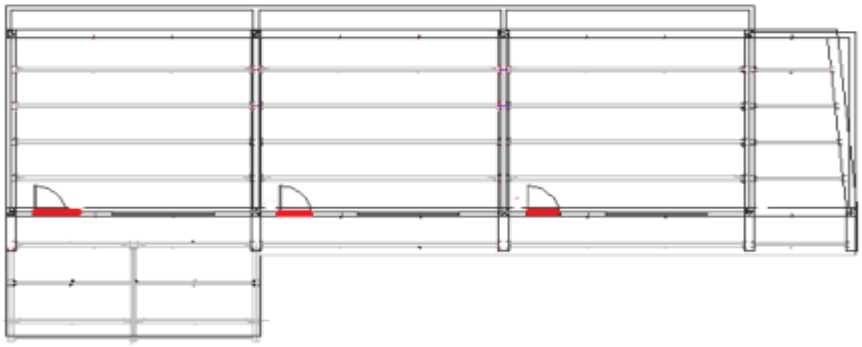

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 12	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.2.5	ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	largo	ALTO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
SALON 34	5.95			1.00	5.95				-	5.95	
SALON 35	5.95			1.00	5.95				-	5.95	
SALON 35	5.95			1.00	5.95				-	5.95	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
									TOTAL	17.85	

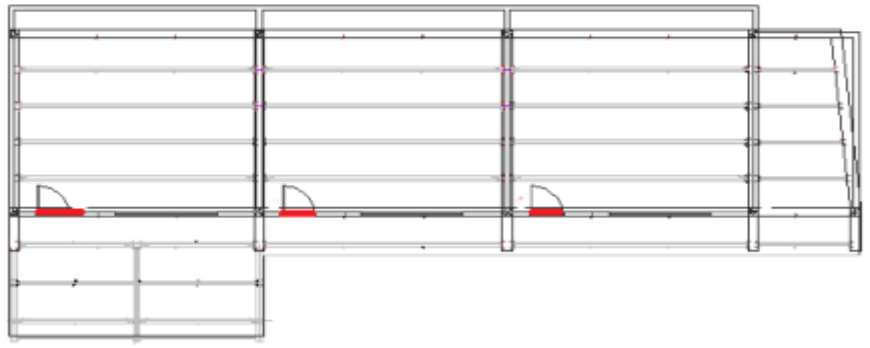

Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
IED FRIEDRICH NAUMANN

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 12 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA FINAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	21	ASEO Y VARIOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	21.1.1	ASEO GENERAL	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	AREA	ALTO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
area cubierta	234.00			1.00	234.00				-	234.00	
				1.00	-				-	-	
				1.00	-				-	-	
					-				-	-	
					-				-		
					-				-		
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
									TOTAL	234.00	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1. IED Usaquén sede A



Demolición placa existente cancha



Excavación



Relleno en sub-base granular tipo c (suministro, extendido, humedecimiento y compactación)



Caja inspección 100 x 100 x 100 cm (inc. Base y cañuela y tapa con marco metálico)




Placa contrapiso de 12 cm - concreto 3000 psi



Bordillo prefabricado en concreto a – 50 y filtro perimetral



Adoquín ladrillo macizo

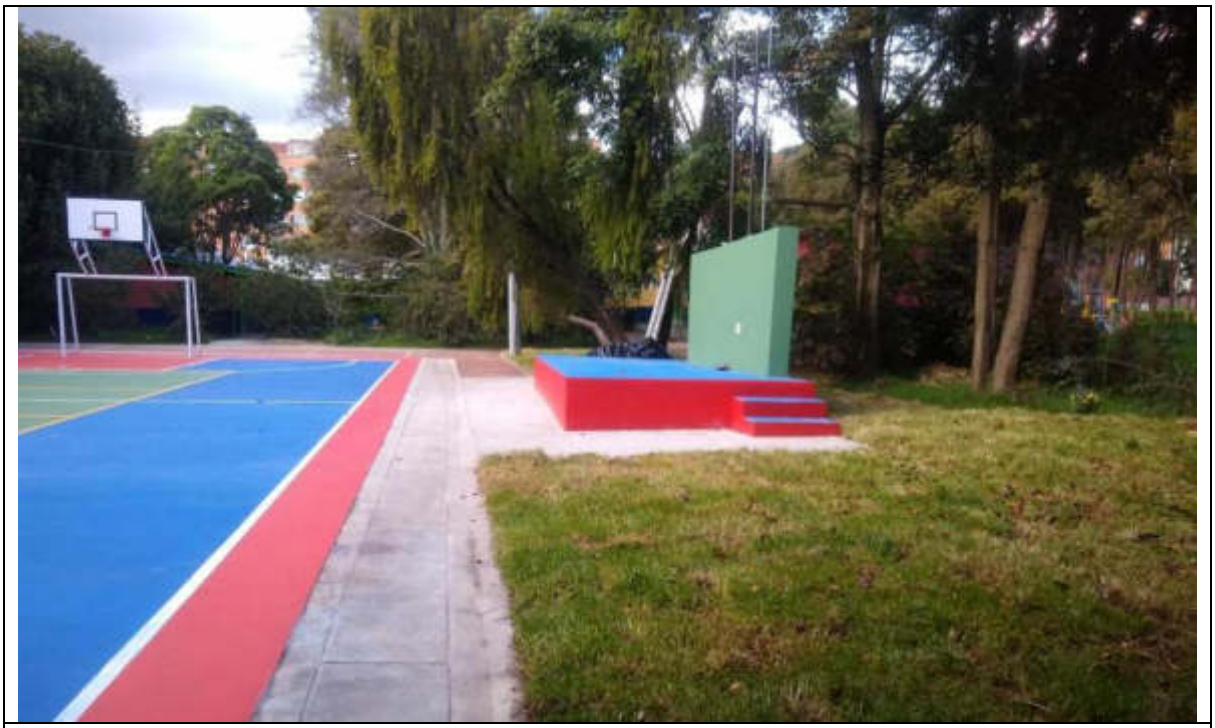

Pradización jardines (inc. Tierra negra



Obra final

5.2. IED Panamá sede A



Espacio para adecuación cuarto de basuras



Adecuación cuarto de basuras, con enchape de pared y piso cieloraso en P.V.C y lámparas led



Puerta metálica cuarto de basuras






Condiciones iniciales cerramiento en malla



Cerramiento en malla eslabonada sobre muro de perimetral costado oriental

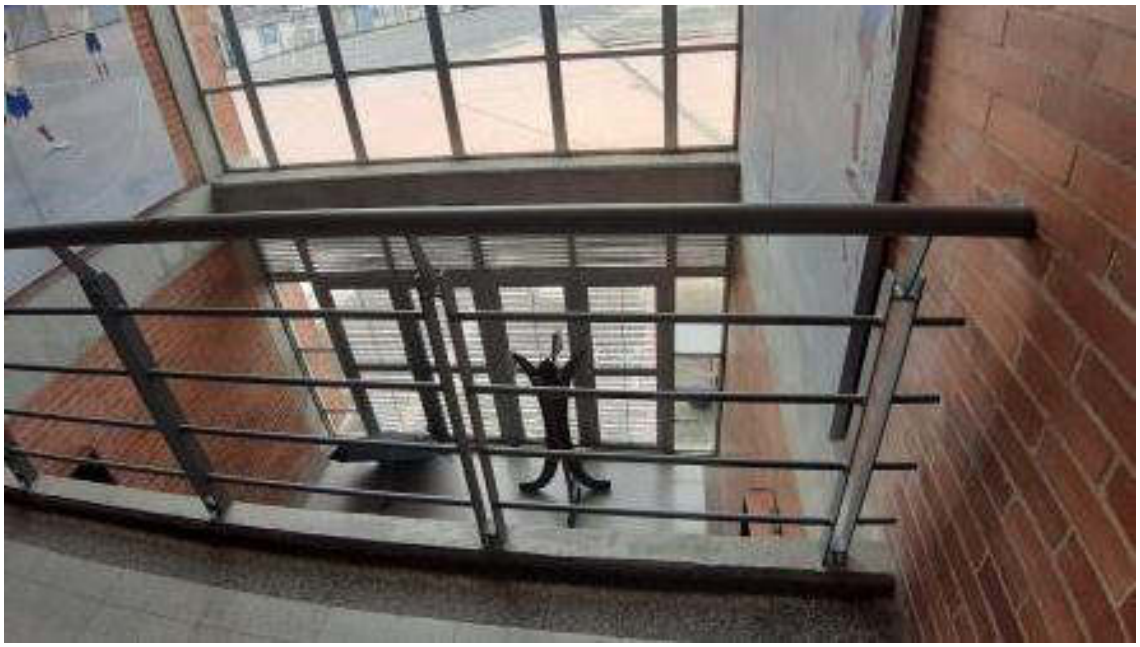

Espacio para adecuación escalera metálica



Escalera metálica



Escalera metálica



Condiciones iniciales acceso peatonal al colegio



Acceso peatonal

5.3. IED Panamá sede B



Condiciones iniciales sala de profesores



Adecuación Sala de profesores



Remodelacion baño sala de profesores con istalacion de enchape de piso y parded, ademas de aparatos sanitarios.



Condiciones iniciales baño de niñas



Adecuación lavamanos baño niñas



Enchape de pared baño niñas



Condiciones iniciales baño niños



Adecuación lavamanos baño niños



Enchape de pared baño niños



Adecuación orinales baño de noños, con divisiones en acero inoxidable

5.4. IED Panamá sede C



Condiciones iniciales acceso cuarto de basuras



Acceso cuarto de acceso



Adecuación cuarto de basuras con punto hidráulico, con instalación de enchape de piso, aplicación de pintura epóxica en pared y techo, puerta y vetaneria en rejilla metálica y mediacaña en granito pulido



Construcción cárcamo con rejilla en acceso a cuarto de basuras



Condiciones iniciales cuarto frio



Adecuación cuarto frío, con instalación de enchape de piso y de pared, punto de desagüe y punto hidráulico



Adecuación cuarto frío, lámpara hermética de sobreponer en techo, puerta metálica



Condiciones iniciales espacio para adecuación para cuarto de almacenamiento de elementos deportivos



Adecuación cuarto para almacenamiento de elementos deportivos, con construcción de muro en ladrillo a la vista, instalación de lámpara hermética ventanearía en aluminio y puerta metálica



Impermeabilización piso batería de baños segundo piso



Enchape de piso baño niñas segundo piso



Cambio válvulas topo push de lavamanos



Condiciones iniciales techo batería de baños primer piso



Instalación cieloraso en PVC batería de baños primer piso

5.5. I.E.D. AQUILEO PARRA SEDE A



Condiciones iniciales cubierta pasillos



aplicación de emulsión asfáltica



Instalación de manto asfaltico en cubierta de pasillos



Condiciones iniciales batería de baño de niños




Demolición de muros y enchape de pared batería de baño niños



Adecuación red sanitaria baño niños



Adecuación red hidráulica baño niños

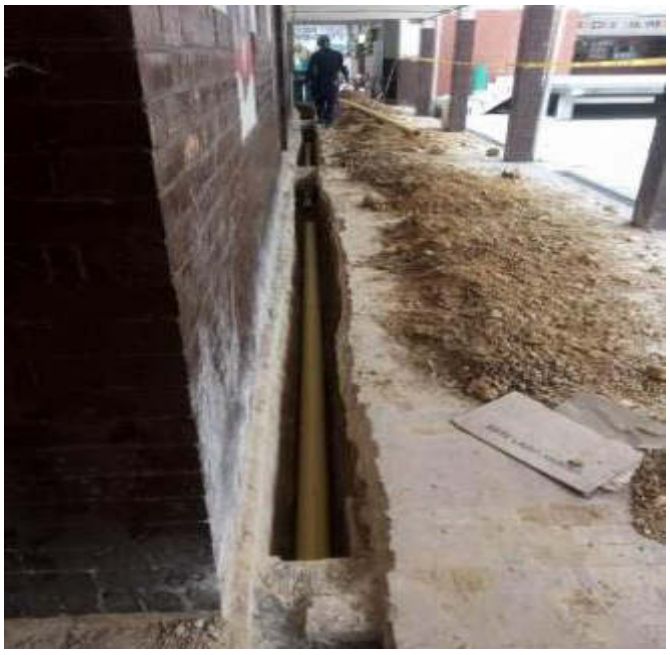

Adecuación red sanitaria en pasillos



Condiciones finales del pasillo luego de la intervención




Construcción de mesones en granito pulido para lavamanos batería de baño niños



Enchape de pared y piso batería de baño niños



Instalación de divisiones en acero inoxidable para sanitarios y orinales batería de baño niños

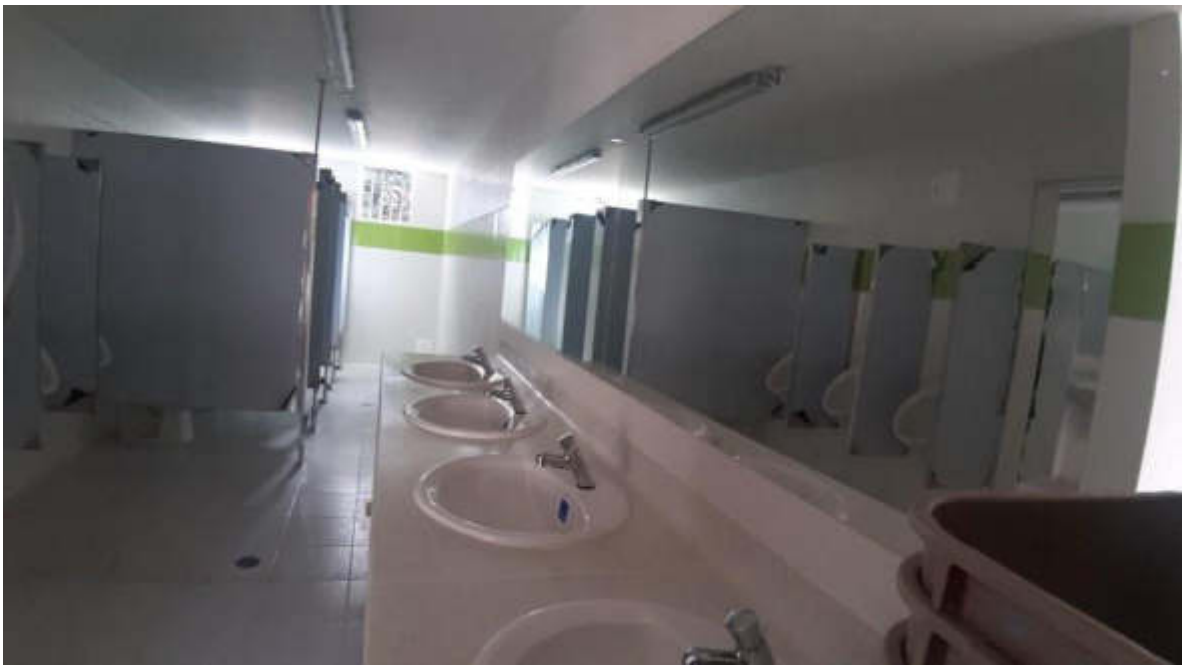

Obra terminada batería de baño niños

5.6. I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ



Condiciones iniciales muro de cerramiento



reforzamiento estructural de viga de cimentación y anclajes con epóxido



reforzamiento estructural de columnetas con anclajes con epóxido



empalme reforzamiento estructural columentas y viga de cimentación con cambio de nivel



Aplicación sikadur 32 para puente de adherencia concreto fresco con concreto endurecido



fundida reforzamiento de viga de cimentación



desencofrado reforzamiento de viga de cimentación



Fundida de columnetas



Acero de refuerzo y encofrado de viga de amarre superior



Fundida de viga de amarre superior



Pintura de muro fachada exterior y cerramiento en malla eslabonada



Condiciones finales obra terminada

5.7. I.E.D. DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO



Condiciones iniciales Cubierta aula múltiple



Pintura estructura de cubierta



Instalación estructura de cubierta



Desmonte de teja



Desmonte de teja



Instalación de cubierta teja tipo sándwich



Instalación de cieloraso PVC mezanine aula múltiple



Instalación de lámparas herméticas mezanine aula múltiple



Condiciones finales cubierta aula múltiple



Condiciones finales cubierta aula múltiple

5.8. I.E.D. FRIEDRICH NAUMANN



Condiciones iniciales Cubierta



Condiciones iniciales salones de clase



Instalación estructura de cubierta



Instalación de cubierta teja tipo sándwich



Instalación redes eléctricas y lámparas herméticas



Instalación de ventana corrediza en aluminio



pañete y pintura sobre muros



Pintura sobre lámina llena en marcos y pertas de los salones



Instalación de tablero eléctrico



Condiciones finales salones

6. BITACORAS

6.1 BITACORA I.E.D USAQUEN SEDE A

Bogotá D.C 1 de septembre 2020.

- Se inicia actividades en el Colegio de demolición de placa de concreto para posterior apiques Geotécnicos.

- Se realizan apiques en la cancha, quedan pendientes los resultados los cuales deben ser enviados a la interventoria con la respectiva propuesta para la construcción de la Cancha.

AB.

Bogtoi D.C 2 de septhembre 2020.

- Se continua con demolición de placa de Concreto. avanzando en la actividad para no presentar atrazos.

AB.

Bogotá D.C 3 de Septhembre 2020

- No se presentó personal en el Colegio realizando actividades
- Se realiza reunión con la rectora para informar

Escaneado con CamScanner

por donde se va a ingresar el botcat y asi mismo se realiza recorrido para actu de vecindad.

AB.

Bogotá DC 5 de septiembre 2020.

- Ingresa Botcat. para inicio de trabajos el dia lunes.

AB.

Bogotá DC 7 de septiembre 2020.

- Inician actividades de Retiro de Capa de Concreto con el botcat, se encuentran 3 operarios en el colegio.

AB.

Bogotá DC. 09 de septiembre

Se continua con labores de excavación y retiro de placa superficial de concreto, se adicional retiro de juegos existentes

. Se solicita realizar el cubrimiento del material de excavación y de la concha

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Bogotá DC. miercoles 09 de septiembre

- se continua con excavación y retiro de la capa de concreto de la cancha
- hasta el momento no se ha realizado el respectivo cerramiento del acopio del material granular

Ricardo Hernandez

Bogotá DC. jueves 10 de septiembre

- se realiza comite de obra con acompañamiento de secretaria e interventoria
- se solicita al contratista realizar los esquemas de evacuacion de aguas
- se continua con labores de excavación y retiro de capa de concreto

Ricardo Hernandez

Bogotá DC. viernes 11 de septiembre

- se realiza retiro de escombros y material de excavación
- se continua con labores de excavación

Escaneado con CamScanner

Sábado 12 de septiembre
- Se continua con labores de excavación y.
Copias Pers. Retiro ESCOMBROS.
Ricardo Hernandez

Lunes 14 de septiembre
- Se realiza inspección de cajas y excavaciones.
Ricardo Hernandez

- Martes 15 de septiembre
- Se continua excavación con BOTICAT y se realiza cerramiento en el costado occidental de la cancha, se encuentran 3 trabajadores en el colegio
Ricardo Hernandez -

- miercoles 16 de septiembre
- Se continua con excavación
- Se realiza comite de obra y se solicita al contratista la definición de los Altos de la cancha

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Jueves 17 de septiembre

- Por condiciones del terreno y el tiempo el día de ayer 16 de septiembre se encuentran trabajando dos operarios el día de hoy, realizando excavación y conducción del agua que se encuentra en la cancha

FUERTE AGUACERO QUE OBLIGÓ SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES. CALLES POR AGUA. SE ESPERA. CAMBIE TIEMPO. PARA PODER INGRESAR BOBCAT. Y CONTINUAR ACTIVIDADES.

RESIDENTE OBRA.

VIERNES 18-SEPT.

SE REALIZO ACOPIO MATERIAL DE RELLENO. MEDIO DIA. * ESTADO TERRENO. NO PERMITE EXCAVACIÓN.

Escaneado con CamScanner

SABADO 19-SEPT.
TRABAJADORES - 6.
SE CONTINUO. CON ACOPIO MATERIAL DE RELLENO Y RECIBOS 2 VIAJES.
ESCOMBROS. EN DOBLETROQUE.
SE LABORES 1/2 - DIA.

Lunes 21 de septiembre
- Se continua labor de excavación con botcat.
- Se realiza recolección de escombros

Ricardo Hernandez

Martes 22 de septiembre
- Se continua con labor de excavación y acopio de material

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Miercoles 23 de septiembre 2020

.Se continua con trabajo de excavación no se realizo excavación por condiciones climaticas

Ricardo Hernandez

Jueves 24 de Sephembe 2020.

• El colegio solicita material de excavación para realizar mejoramiento en canchas del colegio por lo cual se realizara disposición de material en las canchas. con el fin de tener ese material como reutilización y reportarlo al pin Ambental.

Se continua realizando excavación de material en la cancha con Bobcat: realizando Acopio en la zona Norte del colegio.

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

25-SEPT/20.

SE ACOPIA MATERIAL DE EXCAVACIONES EN ARES. DE CAUCHOS ALEDAÑOS. S/N. SOLICITUD. DE. PEONES Y PODER DE FLS. CON COSTO DIARIO. DE INTERVENTORIA APROXIMADAMENTE 35 M³. A 30 113

Ricardo Hernandez.

28-SEPT/20.

SE COMPLETA EXCAVACIÓN ARES. CAUCHOS SE RENIVELA Y SE. INICIA EXCAVACIÓN PARA ESTAS. RECOLECCIÓN AGUAS. FILTRO.

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 29 de septiembre 2020

- Se realiza excavación para caja en el costado norte de la cancha
- La excavación en el área de la cancha se da por terminada
- Se realiza disposición del material a restituir en la cancha ser. del colegio

Ricardo Hernandez

Miercoles 30 de septiembre 2020

- Se continua con excavación para caja de la red de filtros

Ricardo Hernandez

Jueves 01 de Octubre 2020

- Se evidencia la falta de personal en el colegio ya que no se ha avanzado en la ejecución de la cancha.
- Se Solicitan la entrega de los esquemas para la ejecución de las mismas.

Escaneado con CamScanner

• Si se va a realizar la ejecución de la cancha con personal externos es necesario enviar la documentación del personal para revisar pagos de parafiscales.

-Ricardo Hernandez 

Viernes 02 de octubre
-se registra llegada del subcontratista para inicio labores en la cancha

Ricardo Hernandez 

Sabado 03 de octubre
-se registra llegada de material y se realiza firma y cierre de terreno
Ricardo Hernandez 

Lunes 05 de octubre
-se realiza replanteo topografico
-se realiza instalación de yee textil
-se realiza instalación de material granular

Escaneado con CamScanner

y se inicia compactación
Ricardo Hernandez

Martes 06 de octubre
- se realiza relleno con material granular tipo C
- se realiza la instalación del filtro perimetral

Ricardo Hernandez

Miercoles 07 de octubre
- se realiza nivelación de terreno
- compactación de material granular
- se registra ingreso de material

Ricardo Hernandez

Jueves 08 de octubre del 2020
- se realiza comite de obra y se acuerda realizar las Pruebas de densidad el dia viernes 09 de octubre
- se solicita humectación de la cancha para

11

Escaneado con CamScanner

Si compactación

- Se solicita presentar flujo de inversión con propuesta de pisos en concreto alrededor de la cancha
- el flujo del filtro queda como está reflejado en el esquema presentado por el contratista

Ricardo Hernandez

Viernes 09 de octubre

- Se realiza actividades de compactación

Ricardo Hernandez

Sabado 10 de octubre

- Se realiza intalación de Bordillo para Confinamiento de Cancha
- Se realiza Compactación de Cancha para realizar pruebas de densidad.

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 13 de Octubre.

- Se realiza excavación para la instalación de. Cuneta prefabricada.
- Llega viaje de material particulado para finalizar Capa y posterior prueba de Densidades.
- Se Solicita tener en cuenta Arreglos de la Cancha en Zona perimetral.
- Preparar Nivelación perimetral.

Ricardo Hernandez

Miercoles 14 de octubre del 2020

- Se realizaron pruebas de compactación
Se realizaron 3 perforaciones (Hoyitos)

Ricardo Hernandez

Jueves 15 de octubre del 2020


- Se extiende material particular y se continua con compactación

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Viernes 16 de Octubre de 2020.

- Se realiza recorrido en obra, se evidencia ingreso de material. Base Granular.
- Se hace instalación de perimetral de cañuela
- se Solicitan esquemas para la fundida de las placas y su respectivas dilataciones,
- se hace retiro de adoquín en ingreso para futura pradización e instalación del material reutilizado.

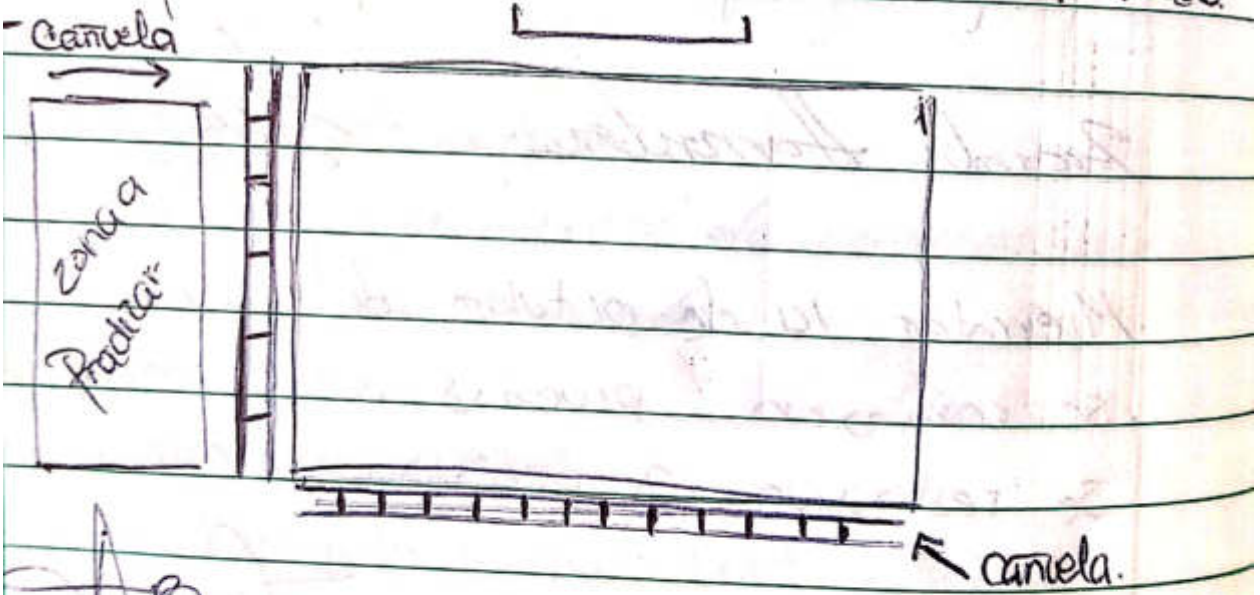

16/octubre/2020

Escaneado con CamScanner

Sabado 17 de Octubre de 2020

-

- Se realiza Compactación de la Cancha en Agregado segunda Capa de 20 cm.
- Se realiza instalación de Canveta costado Norte.

17/oct/2020. 11:30 Am

Lunes 19 de Octubre de 2020

- Se evidencia ingreso final de Base Granular para costado norte de la cancha.
- Se hace Compactación de Base
- Ingresa mobiliario de Canchas.

19/oct/2020. 2:00pm

Martes 20 de octubre de 2020


- Se toman muestras de densidad de la cancha Base teniendo Cumplimiento con los parametros Según normatividad ejecutados por la empresa DAICON.

20/oct/2020. 7:40 PM

Escaneado con CamScanner


Miercoles 21 de Octubre de 2020.

- Se hace instalación de malla con separadores.
- Se inicia fundida de la cancha.
- Se realiza esquema de fundida y detalle de instalación de malla.

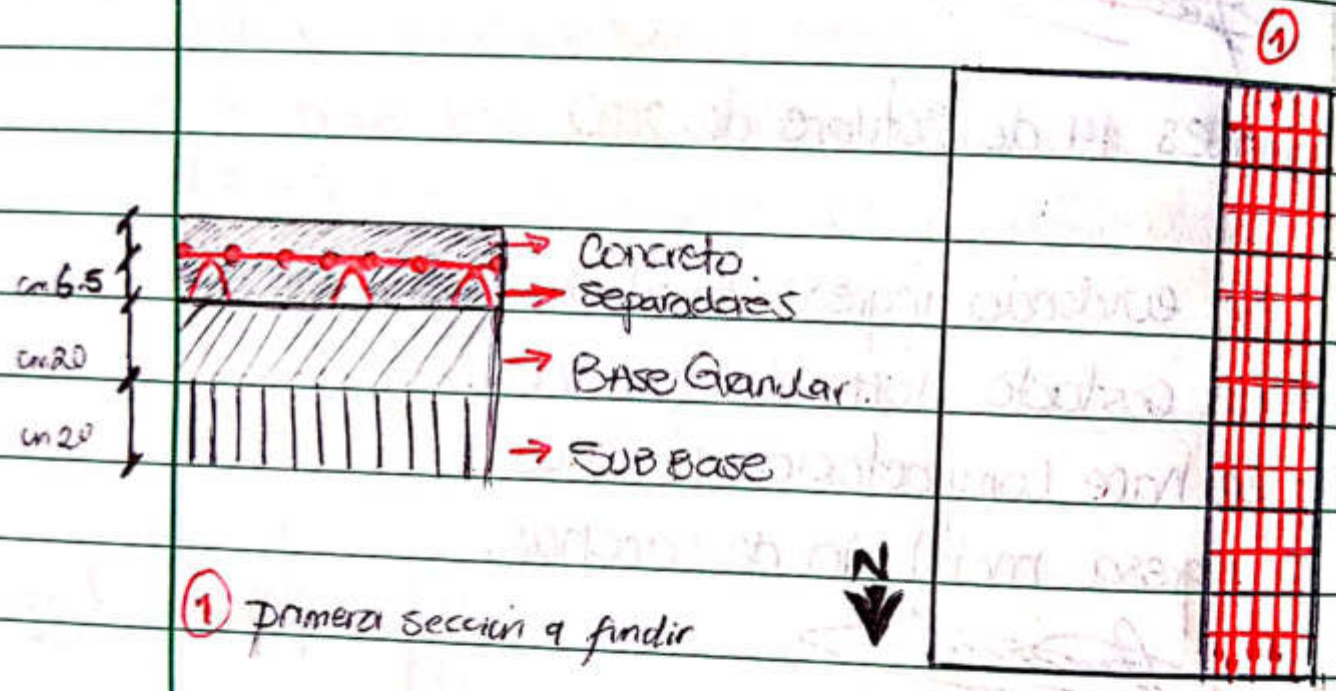

- La fundida se realiza con mixer las cuales llegan hasta porterior y el trasiego del material hasta la cancha se realiza en Bobcat.
- Se realiza instalación de canchas de microfutbol niveladas Bajo las siguientes medidas.

Escaneado con CamScanner

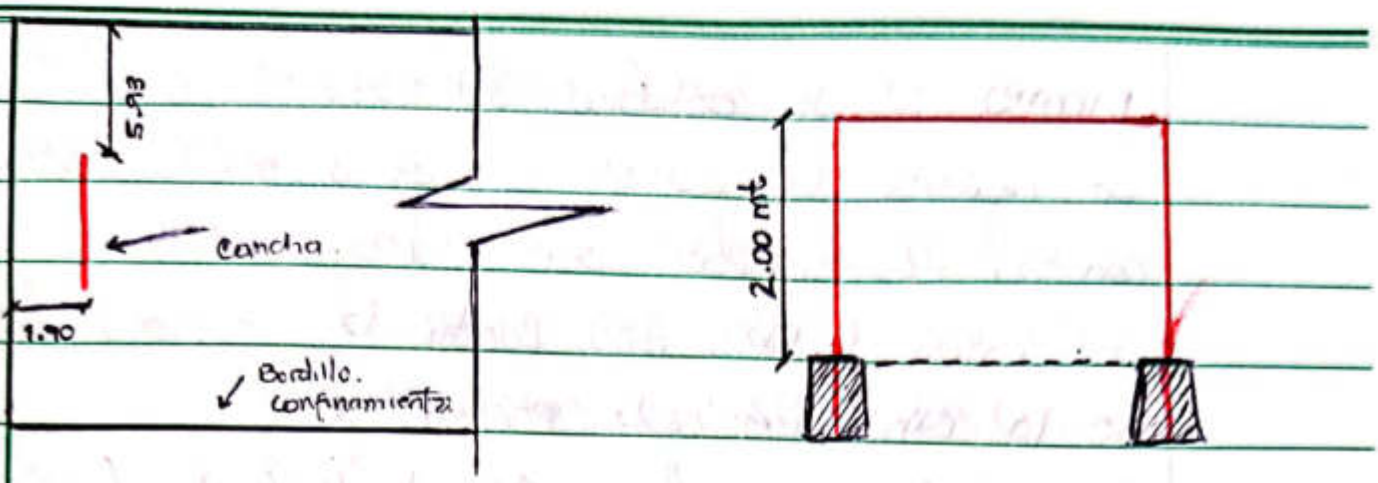

- Se finde franja No. 1. faltando concreto para la zona en el costado sur.
- Se programa concreto para el día de mañana 22 de octubre de 2020 a las 9:00am.
- Es necesario Aplicar aditivo para la unión del concreto en la zona faltante.

AB. 21/oct/2020 5:00pm.

SE DEJA LA PLACA CUBIERTA CON PLASTICO PARA PROTECCION EN CASO DE LLUVIA.

Jueves 22 de octubre del 2020

- se finde segunda franja de la cancha y se completa el costado sur de la primera franja, se realiza dilataciones con corte entre una franja y otra
- se aplica el antisol a la placa

17

Escaneado con CamScanner

Viernes 23 de octubre del 2020

- se realiza la instalacion de la malla electrosoldada con sus respectivas separadores
- se inicia la labor de fundir la tercera franja de la cancha y cinta perimetral
- de igual forma se funde 1/8 de la Cuarta franja de la cancha en el costado sur y se inicia a fundir la zona perimetral de la tarima

AB 23/de 10/2020

Sabado 24 de Octubre de 2020

- No se realiza fundida.
- se hace instalacion de malla y separadores para fundida programado el día lunes 26 de octubre en horas de la mañana.
- se informa que las muestras deben estar sumergidas en Agua Constante para hacer un curado efectivo.
- se hace fundida de marcos de Cajas

AB 24/oct/2020

Escaneado con CamScanner

Lunes 26 de octubre 2020.

- Se inicia fundida de Cancha franja final.
- Se realiza observación de malla en tarima
- Se realiza observación de concreto en Curbs costado Norte.
- Se escoje Adoquin en Acera. AB.26/oct/2020. para perimetral dela tarima.

Martes 27 de octubre del 2020

- Se instalan sifones en las esquinas de las cañuelas
- el acabado de la franja final no es homogeneo Presenta marcas de lluvia y se ve muy rustico en comparación a las otras
- Se instalo malla electrosoldada con sus separadores junto a la tarima.

AB 27/oct/200

Escaneado con CamScanner

Miercoles 28 de octubre de 2020.

- se inicia con relleno y compactacion costado Norte de la cancha para ingreso a la misma.
- se inicia corte de juegos para respectivas soldaduras, se recuerda que se debe aplicar Anticorrosivo para evitar daños en la estructura
- se hace instalacion de malla y distanciadores al lado de la tarima.

A B. 28/10/2020.

Jueves 29 de octubre

- se continua con compactacion de recebo al acceso de la cancha
- se plantea instalar el adoquin de forma trabada
- se realiza labor de soldadura en los juegos.

A B 29/10/2020.

Escaneado con CamScanner

Viernes 30 de Octubre de 2020.

→ Costado Norte se inicia instalación de Adoquín
→ costado Oriental se hace Relleno de relleno en B400.
→ se hace recorrido de obra con la secretaria de Educación, No se tienen observaciones, se solicita presupuestar pintura de tarima de la cancha.

AB 30/10/2020

Sabado 31 de octubre del 2020.

→ se realiza fundida al rededor de la tarima
→ Compactacion de costado oriental e instalacion de Adoquin en costado Norte.

AB 30/10/2020

Martes 03 de Noviembre de 2020.
→ Ingresa Adoquin para cancha.
→ se realiza aseo de cancha e ingreso del colegio.
→ se realiza extendido de material de excavacion.

AB 03/11/2020

Escaneado con CamScanner

Miercoles 04 de Noviembre 2020

→ se realiza recorrido con la Residente de forza. Arq. Diana. Cardina.
→ se hacen memorias de entrega del colegio.
→ se informa de documentación a entregar.
→ Rematar Copas de la cancha en ponton y cortar Ubeira.
→ es necesario hacer poda de la cancha por las zonas Rusticas que se presentan.
→ se solicita Arreglo de Soldaduras engegas.
→ falta definir Pasos Tajima costado Norte

Ricardo Fernandez B 04/11/2020.

Jueves 05 de Noviembre
- Se realiza comite de obra con secretaria de educación e interventoria → contratista y se evidencia que se estan realizando las observaciones realizadas anteriormente

Ricardo Fernandez

Escaneado con CamScanner

Viernes 06 de Noviembre

- Se continua con instalación de adoquin y se funde cinta de dilatación en concreto.
- Se mejora el acabado de la soldadura en los juegos y se realiza labor de pintura esmaltada sobre los mismos

FB 06/11/2020.

Sabado 07 de Noviembre 2020.

- Según folio 22 se realizan correcciones de la cancha.
- Se rematan cajas de la cancha y se instalan tapas
- se realizo pulida en concreto de la tarima
- Se realiza pintura de juegos y se instalan aros de Baloncesto.
- Se realiza instalación de Adoquin y se realiza fundida de cintas en concreto.
- Se hace tendido de tierra.

FB 07/Noviembre/2020

Escaneado con CamScanner

Jueves 19 de Noviembe de 2020.

Se inician actividades en cancha, sellado de juntas.
Aseo y preparación de superficie.

Viernes 20 de Noviembe de 2020.

Continua actividad sello de juntas con emulsion Asfaltica.
Se realiza Aseo y preparación de pintura para aplicación.
Se reitera la necesidad de verificar niveles de toda la cancha para que no se presenten encharcamientos.

Sabado 21 de Noviembe de 2020
se inicia aplicación de emulsión Asfaltica en Cancha para nivelación final

Escaneado con CamScanner

Lunes 23 de Noviembre de 2020

Se Continua con aplicación de emolsión Asfaltica para nivelación de Cancha.
Se Aplica emolsión en tanima.
Se realizan observaciones de lugares No Nivelados.

Sl.

Martes 24 de Noviembre de 2020.

Se inicia Aplicación de sellante superficial de emolsión Asfaltica en 3/4 Aplicado en la cancha se suspende por lluvias

Sl.

Miercoles 25 de Noviembo de 2020.

Se aplica sellante superficial y se continua tratamiento con emolsión Asfaltica encostado sus. por condiciones climaticas.

Sl.

Escaneado con CamScanner

Jueves 26 de Noviembre 2020

Se realiza aplicación de sellante superficial se hace Aplicación en costado sur de Emulsión Asfaltica

Viernes 27 de Noviembre 2020

Reparación superficial de Cancha con micro Nivelación.

Martes 01 de Diciembre

Se realiza Aplicación final de sellante superficial.

Escaneado con CamScanner

Miercoles 02 de Diciembre 2020

Se realiza limpieza de cancha y se hace demarcación para iniciar pintura final de la cancha primera mano.

Jueves 03 de Diciembre 2020.

Se realiza Aplicación de primera mano de pintura en un 60% de la cancha.

Viernes 04 de Diciembre

Se continua con Aplicación de pintura y tratamiento en zona sur de Cancha. esperando secado para posterior Aplicación de pintura.
Avance del 80% en pintura.

Escaneado con CamScanner

Miercoles 09 de Diciembre 2020

- Se realiza pintura de Cancha.
- Se realiza Instalación de Cesped.
- Se encuentra personal laborando 2 personas Instalación de Cesped.

Jueves 10 de Diciembre 2020.

Se realiza aplicación de 2da mano de pintura Roja en costado sur de la Cancha.
Se inicia pintura de tarima.
Se solicita al consorcio Colegios Santa Fe realizar las respectivas actividades del Acta de vecindad ya que la fecha no se han realizado y las actividades ya estan Colminando

Escaneado con CamScanner

Viernes 11 de Diciembre 2020

Se Aplica pintura en tarima. se hace tratamiento en cancha costado Sur.

Lunes 14 de Diciembre 2020

Se inicia demarcación de cancha
Se Aplica 2da mano costado Sur Cancha

Martes 15 de Diciembre 2020

Continua demarcación de la cancha con pintura final

.

Escaneado con CamScanner

Miercoles 16 de Diciembre de 2020.

Se realiza pintura de tarima y retoques.
se realiza demarcación según plano.

Jueves 17 de Diciembre de 2020

Se termina demarcación de la cancha.
se hace recorrido de auto de seguridad solicitando los respectivos arreglos según Actas

Viernes 18 de Diciembre de 2020.

Se solicitan reparar arreglos en cancha de pintura y costado sur en cancha

Lunes 21 de Diciembre de 2020
se hacen retoques de pintura y reparaciones el dia 20 de diciembre se asiste al colegio para realizar labores

Escaneado con CamScanner

pero no hay autorización de ingreso.

Martes 22 de Diciembre de 2020

Se continua con Detallado de la cancha. en zonas afectadas.
Se realiza Aplicación de pintura a toda la cancha
Se realiza Sellado nuevo de juntas.
A la fecha no se ha realizado actividades correspondientes al acta de vecindad

Escaneado con CamScanner

6.2 BITACORA I.E.D PÁNAMA SEDE A

INICIO ACTIVIDADES.

31-AGOSTO/20.

PERSONAL.

1-RESIDENTE INTERVENTORIA.

1- " OBRA.

1- SISO.

2-TRABAJADORES.

HERRAMIENTAS MENOR.

DEMOLICIONES AREA RAMPA.

ACOPIO ESCOMBROS DE RAMPA Y DE CUARTO PARA BASURAS.

SEPTIEMBRE 1º/20.

SE ACUERDA CON INTERVENTORIA EL AREA A INTERVENIR. RAMPA - CUARTO DE BASURAS - SITIO CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS ACCESO AL 2º Y 3ER PISO.

Escaneado con CamScanner

Septiembre 02, 03 2020

. Se realizan actividades de excavación y demolición de placa

. Se realiza el desmonte del cuarto de bombas

Ricardo Hernandez



Septiembre 04, [illegible] 2020

se continuan con labores de demolicion de Placa y excavación, y se realiza el acopio de material y se hace su respectivo cubrimiento


Ricardo Hernandez



Septiembre 05 2020

se continua con labores de excavación y demolicion

Ricardo Hernandez



2

Escaneado con CamScanner

Septiembre 07

- se continua con labores de excavación y se inicia labor de demolicion de placa en la zona asignada para el cuarto de basuras
- se solicita al contratista por parte de interventoria que uno de los ayudantes suspenda sus actividades al no contar con sus elementos de protección casco, botas de seguridad, guantes.

Ricardo Hernandez

septiembre 08

- se realiza entrega de dotación al ayudante que no contaba con todos elementos
- se continua labor de excavación y demolicion de placa en zona del cuarto de basuras
- se realiza el acopio de material de excavación y demolición

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Septiembre 09

- se registra llegada de recebo, el cual no es aceptado por interventoría. y se solicita un material que sea mas grueso para evitar el mismo problema que se presenta en la zona

Ricardo Hernandez

Septiembre 09

- se continua con labores de excavación
- se registra llegada de material granular, Arena y Recebo B200
- no se autoriza el retiro de material de excavación debido a que aun no se cuenta con el pin ambiental

Ricardo Hernandez

Septiembre 10

- se realiza comite de obra con acompañamiento de secretaría de educación e interventoría

Escaneado con CamScanner

- Se acuerda realizar el curso de basura con eterboard y realizar el NP correspondiente
- Se inicia labor de relleno con recebo de compactación B200
- Se realiza la apertura del Pin ambiental

Ricardo Hernandez

Septiembre 11

- Se continua con labor de relleno con recebo de compactación B200, hasta el momento se han aplicado y compactado con ruma 2 capas de 10 cm
- Se realiza el retiro de material de excavación

Ricardo Hernandez

Septiembre 12

- Se presenta lluvia en tubería de aguas el cual ha realizo una taponamiento del colegio este ocasiono encharcamiento mientras realizaba su funciones la lluvia genero inundación en parte del recebo que se había utilizado para relleno

Escaneado con CamScanner

el cual se vio afectado y se realizo el retiro del material

- el contratista realizó la reposición de la tubería afectada

- mientras se realizaba el retiro del recebo afectado por el agua se rompe otra tubería de agua, la cual fue subsanada el mismo día

- se realiza retiro de material de escombros y excavación

Ricardo Hernandez

Lunes 14 de septiembre

- Se continua con ~~esta~~ demolición de placa muerta de al acceso del colegio

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 15 de septiembre

- Se realizó demolición de pisos, muros y excavación para instalación de tuberías para el desagüe del cuarto de basura.

Ricardo Hernandez

Miércoles 16 de septiembre

- Se realiza comité de obra y se solicita al contratista por parte de SED e interventoría, ~~se~~ el esquema para la continuación de la escalera desde el primer piso hasta el segundo y el tercero. este esquema es por cambio de la ubicación de la escalera del segundo a tercer piso
- Se continúa con labor de excavación para deberá de desagües
- Se continua con relleno de recebo base

Ricardo Hernandez

Jueves 17 de septiembre

- Se continua con labores de relleno -

7

Escaneado con CamScanner

con recebo B200
- se continu con excavación

Viernes 18 de septiembre
- Se realiza retiro de recebo, ya que se vio afectado por la lluvia.
- Se realiza excavación para instalación de tubería de desagüe en el área del cuarto de basuras

-Ricardo Hernandez

Sabado 101 de septiembre
- Se realiza rellens con recebo de compactación B200, en la zona que se vio afectada por la lluvia
- Se realiza cubrimiento de material granular

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Lunes 21 de septiembre


- se continua con labor de relleno con recebo B200 y se realiza su respectiva compactación con rana.

Ricardo Hernandez

Martes 22 de septiembre 2020

- se mira armado de estructura para vaciado del cuerpo de bóveda

Dimensión hierro de 1/2" con flejes de 3/8 cada 20cm



Ricardo Hernandez

Miercoles 23 de septiembre

- se realizo la ubicación de hierros para la viga del cuerpo de bóveda.
- se realiza ruptura de caja de inspección de aguas lluvias y negras para la instalación de bajantes y desagües.

9.

Escaneado con CamScanner

- Se realiza la reparación de tub-nvl electrico e hidraulica
- Se realiza la instalación de tuberia de bajante de aguas lluvias y desagües
- Se realiza la conexión a los respectivos ajus de inspección

Ricardo Hernandez

Jueves 24 de septiembre 2020
- Se continua con la instalación de bajante de aguas lluvia
- Se realiza relleno con recebo B200 en la zona del cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Viernes 25 de septiembre
- Se realiza vaciado de obra
- Se continua con armado de estructura para las vigas del cuarto de basuras y la rampa

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Sabado 26 de septiembre

- Se continua con armado de estructura y vaciado de la misma. y se realiza la formaleta para las vigas

Ricardo Hernandez

Lunes 29 de septiembre

- Se realizo labor de fundir la viga perimetral de la ~~viga~~ rampa.
- Se continua armado de estructura para la losa del cuarto de basuras
- Se inicia labor de corte de estructura metalica para el cerramiento

Ricardo Hernandez

Martes 29 de septiembre

- Se continua con armado de estructura para viga del cuarto de basuras
- Se continua con relleno en recebo B200 y se realiza su respectiva compactación.
- Se continua con labores de corte de estructura metalica para el cerramiento del colegio. 11

Escaneado con CamScanner

- se realiza intervención en el muro de contrimiento que presenta una fractura

Ricardo Hernandez

Miercoles 30 de septiembre

- se realiza labor de fundir viga para el cuarto de basuras.
- se realiza llenado de ordinarios certificados
- se realiza labor de pintura de estructura metalica para el cerramiento

Ricardo Hernandez

Jueves 01 de octubre de 2020.

- Se realiza compactación de la zona de shot de basuras, se solicita malla para fundida de paso.
- se solicita pruebas de compactación antes de realizar fundidas.
- se solicitan pruebas de concreto para la fundida.

Escaneado con CamScanner

- Se recorda/el señalización de la parte externa en la ejecución de la malla en el muro costado oriental.

SE SEÑALIZO EL DOS EXTERNOS Y SE USO ESPACIADO.

Ricardo Hernandez

Viernes 02 de octubre del 2020

- Se realizan anclajes con hierro de 1/2" cada 70cm a 15cm de profundidad para confinamiento de la rampa y el anden al acceso del colegio
- Se continua con el armado del confinamiento
- Se realiza labor de fundir el confinamiento con los anclajes sobre la vía de la rampa -

Ricardo Hernandez

Sabado 03 de octubre del 2020

- Se realiza labor de relleno en recebo bzo, en el espacio de la rampa y el anden al acceso del colegio

Ricardo Hernandez

13

Escaneado con CamScanner

Lunes 05 de octubre

-Se realiza instalación de malla electrosoldada y se funde placa en concreto para el cuarto de basuras, se continua con corte de estructura para instalación de corrugado

Ricardo Hernandez

Martes 06 de octubre

-Se continua con instalación de malla electrosoldada de 4mm para rampa y placa

-Se inicia levantamiento de muro en ladrillo en el cuarto de basuras

-Se continua con corte de estructura metalica para instalación de corrugado

Ricardo Hernandez

Miercoles 07 de octubre

-Se continua con levantamiento de muro en el cuarto de basuras.

-Se continua con compactación de recebo en la losa de la rampa y placa

Escaneado con CamScanner

- se recuerda al contratista utilizar panales o separadores plásticos para separar la malla del terreno, y se deberán colocar las dilataciones en taladrillo
- se continua con instalación de cerramiento hasta la fecha se han instalado 11 modulos

- se solicita que los postes del cerramiento todos queden a plomo ya que algunos están quedando desnivelados, de igual forma la primera malla que se instalo se encuentra curvada
- se recuerda que toda la estructura y malla debe llevar anticorrocivo antes de pintar la

Ricardo Hernandez

Jueves 08 de octubre

- se realiza visita de obra y se solicita corrección en los postes del cerramiento ya que los postes no se encuentran a plomo y la malla se encuentra flechada
- se acuerda demolar el ~~tota~~ muro que se encuentra afectado y hacerlo nuevamente con sus dilataciones laterales a una cinta separada

15.

Escaneado con CamScanner

- Se realiza anclajes para la cinta superior del muro del cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Viernes 09 de octubre

- Se realiza cubrimiento de material granular
- Se realiza la formaleta para las columnetas y la cinta superior del muro del cuarto de basuras
- Se realiza corte con pulidora para empotrar la canaleta y tambien que se realizo para la instalación de la tuberia de bajante de aguas lluvias y desagüe.

Ricardo Hernandez

Sabado 10 de octubre

- Se funde columnetas y cinta en concreto del cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 13 de octubre del 2020

- Se inicia ubicación de ladrillo macizo para las dilataciones de la placa, se solicita que estos ladrillos cuenten con buen acabado y no tengan bordes picados, ya que estos quedarán visibles cuando se funda la placa
- Se realiza demolición de muro de cerramiento haciendo la observación de que esta actividad se debe terminar hoy mismo, ya que no se puede dejar esa abertura por seguridad del colegio

Ricardo Hernandez

Miercoles 14 de octubre del 2020

- Se continua con levantamiento de muro en ladrillo con sus respectivos anclajes.
- Se continua con la ubicación de ladrillos para las dilataciones de las placas de concreto

17

- SE DETIENE ACTIVIDAD DE PINTURA ya que el personal estaba realizando esta actividad sin ningun elemento de protección no poseia casco, no se encuentra instalado andamios certificados, el trabajador se encontraba sin arnes, esto es considerado trabajo en alturas. a mas de 1.5m del suelo se detiene la actividad.

- de igual forma se recalca que la estructura debe contar con anticorrosivo antes de iniciar la Pintura, y se evidencia que hay zonas donde carece de anticorrosivo y la malla carece en su totalidad del mismo
- algunos postes no se encuentran a plomo y la malla sigue flectada al interior.

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Jueves 15 de octubre del 2020

- se continua con ubicación de ladrillos para las dilataciones de la placa
- se finaliza levantamiento del muro del cerramiento. se realiza dilatación con icopor al costado derecho y se realiza viga superior y se anda al lado izquierdo
- se realiza relleno con material granular para la instalación del adoquín y se va retirando
- se realiza labores en el cerramiento metálico para poner a nivel los postes como se solicita

Ricardo Hernandez

Viernes 16 de octubre

- se realiza labor de fundir placa y rampa al acceso del adoquín
- se decide no instalar baranda en la rampa por el ancho de la misma
- se solicita entregar los esquemas de anclaje de la escalera.

19

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

- Se solicita realizar la toma de muestras de concreto para su presentación ante interventoría con los resultados

Ricardo Hernandez

Sabado 17 de octubre
- se realiza picheteo sobre el muro del cerramiento en el costado interno y el costado externo se embaquillo
- se realiza hidratación de placa
- se realizan cortes en la placa para dilataciones

Ricardo Hernandez

Lunes 19 de octubre
- Se realiza labores de limpieza y recolección de escombros

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner


Martes 20 de octubre

- Se realiza alistado de pisos en el cuarto de basuras
- Se solicita sumergir los cilindros de las muestras de concreto en agua
- Se solicita realizar la limpieza de los ladrillos de confinamiento de la placa para evitar la formación de moho
- Se inicia la actividad de fundida del escalón de acceso al bloque.
- El muro en mampostería se va a pintar internamente color azul oscuro (REY)

Ricardo Hernandez

Miercoles 21 de octubre

- Se realizan anclajes para el escalon al acceso del edificio y se realiza la instalación del ladrillo perimetral para el confinamiento del escalon (9:30 am)
- Se solicita realizar el escalon a escuadra con el orden



21:

Escaneado con CamScanner

-Se registra llegada de material (arena y perfilería) al lote mismo del cuarto de basuras.

SE REALIZAN DUCTOS EN USHILLA 1/2" A 3 A 12cm. PROFUNDIDAD. SE PINTA MURO NUEVO ELECTRICO PARTE EXTERNA. EN AZUL OSCURO. TIBO VINILO. Y SE RETIRAN FORMALETAS MADERA. VIGENTE.

Ricardo Hernandez

Jueves 22 de octubre del 2020.

-Se realiza instalación de perfilería en aluminio y se inicia instalación de superboard en el cuarto de basuras

-Se funde escalón al acceso del bloque

-Se continua con labor de pintura sobre el muro nuevo de cerramiento


-Se realiza el retiro de escombros 9:30am

22 Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

viernes 23 de octubre

- se solicita que el empate de la esquina del cuarto de basuras se haga de tal forma que no implique picar las columnas existentes

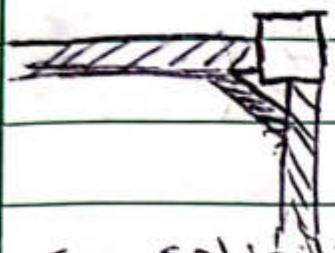

- se continua con la instalacion de superboard

- se solicita al contratista que las dilataciones de la placa de concreto se deben limpiar y sellar con colchon y zikel, de igual forma hacer el lavado de las placas y los ladrillos de confinamiento 9:40am

Ricardo Hernandez

SABADO 24/20

SE INICIA EDUCACION MUROS CUARTO DE ASEO. E INSTALACION TABLETA PISO.

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Lunes 26 de octubre

- Se inicia instalación de estructura para la cobierta del cuarto de basuras, se recuerda que se debe aplicar el anticorrosivo antes de instalarla

-Ricardo Hernandez

Martes 27 de octubre

-Se realiza instalación de puerta

-Se pinta con anticorrosivo estructura de la cobierta y la puerta

-Se realiza medio caño en granizo

-Se pintan tejas de fibrocemento para su instalación

-Se Solicita detener actividad de pintura en teja ya que la teja de fibrocemento no esta aprobada en la lista de secretaria

-secretaria aprueba instalación de la teja de fibrocemento con la condición de instalar caballete rojo

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES. 28 - OCTUBRE.

- SE CONTINUA LABOR CUARTO BASURAS. PINTURA ESCALERA.
- Se realiza instalación de estructura para el cielo raso
- Se recuerda que el cuarto de basuras debe contar con su punto de agua y registro

Ricardo Hernandez

JUEVES 29-OCTUBRE/20.

- SE CONTINUA INSTALACION TECHO FALSO.
SE REALIZO RECOGIDA DE ESCOMBROS.

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Viernes 30 de octubre

- Se solicitó nuevamente realizar el punto de agua con su registro en el cuarto de basuras
- Se solicitó pulir la media caña ya que se encuentra muy rustica
- Se realizó la instalación de 2 lámparas tipo led empotrada en el cielo raso
- Se realizo labor de pintura sobre la puerta

Ricardo Hernandez

Sábado 31 de ~~noviembre~~ octubre

- Se pinta de blanco el muro bajo en su cara exterior en el cuarto de basuras
- Se pinta de gris la viga del cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 03 de ~~octubre~~ Noviembre del 2020

- Se realizo la instalación del punto de agua con su registro. Pero la tubería quedo expuesta.
- Se solicita realizar la instalación de la tubería de tal forma que esta no quede expuesta
- Se realizo labor de polir la media caña

Ricardo Hernandez

Miercoles 04 de Noviembre

- no se encuentra personal en la obra
- aun no se ha realizado la corrección de la red de agua del cuarto de basura, la cual se encuentra expuesta y no se recibirá de esa forma
- Se debe mejorar el acabado del Punto de Agua ya que este sobresale demasiado del muro. lo unico que debe sobresalir es el grifo
- la Mediacaña se encuentra en gran porcentaje cubierta de estuco, y no se ve la grapilla

27

Escaneado con CamScanner

esta debe hacerce de tal manera que quede el terminado en gravilla y sea pulida en el estado actual no se recibe

Ricardo Hernandez

Jueves 05 de Noviembre

- Se solicita demolar mediación y realizarla nuevamente
- Se solicita el adoquinamiento de la red de suministro de agua del cuarto de basuras que se encuentra expuesta
- Se solicita reducir el largo del punto de agua del cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Viernes 06 de noviembre

- Se realiza la demolición de la mediación en el cuarto de basuras

Escaneado con CamScanner

Lunes 9-Nov/20.

- SE HIZO UN POYO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN ALIMENTACIÓN S. CUARTO DE TABLEROS.

Martes 10 de Noviembre 2020.

- Se realiza demolición y fundida en rampa por fisura que se presentó por falta de dilatación

Miercoles 11 de Noviembre 2020.

- Se terminan actividades y no se encuentra personal en la Institución.

Escaneado con CamScanner

Jueves 12 de Noviembre 2020.

- Se da respuesta por parte de la SEO para la ejecución de la escalera, donde se debe Cambiar los peldaños el perfil en ~~Y~~ Angulo de la escalera a 2" X 1/8" y la malla electrosoldada debe ir soldada a este angulo en el centro.
- Esta información es enviada por Correo donde debe ser actualizado el respectivo esquema.

Martes 17 de Noviembe 2020.

- No hay personal realizando actividades.

Miercoles 18 de Noviembre 202

- No hay personal realizando actividades
- Aun no se modifica el punto de agua que esta muy bajo, y no se ha realizado la medida con

Ricardo Hernandez

30

Escaneado con CamScanner

Jueves 14 de Noviembre del 2024
- no se realizan actividades

Ricardo Hernandez

Viernes 20 de noviembre
- se inicia mediacaña del cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Sabado 21 de Noviembre
- se continua con elaboracion de media caña

Ricardo Hernandez

Lunes 23 de Noviembre
- se realiza labor de pulido de mediacaña
- se realizan reparaciones de corredor al acceso del colegio

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Lunes 14 de diciembre 202

-Se retoman actividades, se pinta placa de concreto al acceso del colegio

-Ricardo Hernandez

Martes 15 de diciembre del 2020

- Se inicia instalación de estructura metalica de la escalera

Ricardo Hernandez

Miercoles 16 de Noviembre

-Se inicia excavacion de material comun al acceso del colegio, Rampa adecuacion con material granular

-Se continua con instalación de estructura metalica para la escalera

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Jueves 17 de diciambre

- Se continua con excavación
- Se continua con instalación de estructura metálica para la escalera se sacan moldes usados y puestos de otras sedes. Para entregar a rector.

Ricardo Hernandez

Viernes 18 de Diciembre

- Se continua con instalación de estructura metálica de la escalera hasta el tercer pas-

Ricardo Hernandez

Sabado 19 de diciembre del 2025

- Se continua con instalacion de estructura metalica de la escalera

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Lunes 21 de diciembre del 2020

- Se continua con instalación de la estructura metalica, huellas y barandal de la escalera

Ricardo Hernandez

Martes 22 de diciembre del 2020

se continua con instalación de estructura metalica de la escalera

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

6.3 BITACORA I.E.D PANAMA SEDE B

Bogotá DC. Martes 09 de septiembre

Se inicia obra en el colegio república de panamá sede B

Se inicia labores de demolición de mesones en los baños de niños y niñas

Se realiza el retiro de puertas metálicas

Ricardo Hernandez

Miércoles 09 de septiembre

- Se continua con labores de demolición en los baños de niños y niñas, y se inicia demolición del baño de la zona administrativa
- Se realiza la recolección de escombros y se hacen labores de limpieza.

Ricardo Hernandez

Jueves 11 de septiembre

- Se continua con labores de demolición
- Se realiza la recolección de escombros

1

Escaneado con CamScanner

se realiza comite de obra por parte de contratista interventoria y secretaria de educacion

- se aprueba la demolicion de pisos en la zona administrativa y se propone piso laminado de alto trafico. demolicion unicamente donde estaba el baño
- se plantea 3 lavamanos y 3 orinales en el baño de niños y cambio de enchape en los muros indicados
- se plantea 4 lavamanos en el baño de niñas y cambio de enchape donde se indica.

Ricardo Hernandez

viernes 11 de septiembre

- se inicia retiro de enchape en baños de niños y niñas

Sabado 12 de septiembre

no se realizan actividades

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Lunes 14 de septiembre
- Se realiza recolección de escombros en bruto

Ricardo Hernandez

Martes 15 de septiembre
- Se continua con labores de recolección de escombros en bruto
Ricardo Hernandez

Miercoles 16 de septiembre
- Se realiza comite de obra y se solicita por parte de interventoria y SED aumentar el personal en el frente
- Se inicia demolición de piso en la zona administrativa
Ricardo Hernandez

Jueves 17 de septiembre
- Se realiza retiro de material de ~~escombros~~ escombros
- Se realiza demolición de piso en la zona administrativa que no se acordo, esta demolicion se realizara en el piso de los baños de la zona administrativa
- el baño ubicado al acceso que se demolio inicialmente

Escaneado con CamScanner

-Se realiza el desmonte de divisiones en madera
- Ricardo Hernandez

Viernes 18 de septiembre 2020

- Se realizan muestras para patete de baños
- Se encuentra personal de trabajo sin EPPS, Por tal razon se detienen actividades hasta no tener las medidas necesarias para realizar cada una de las actividades

Ricardo Hernandez

Sabado 19 de septiembre

- Se reanudan actividades y se continua con la demolicion de piso en la zona administrativa
- Se continua con labor de patete sobre muros de los baños

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Lunes 21 de septiembre

- Se continua con pañete sobre los muros de los baños de niños y niñas
- Se realiza el desmonte de los aparatos sanitarios de la zona administrativa

Ricardo Hernandez

Martes 22 de septiembre

- Se continua con labor de pañete sobre los muros del baño de niñas
- Se realizan labores de limpieza.

Ricardo Hernandez

Miercoles 23 de septiembre

- Se realiza corte en el muro divisor entre lavamanos e inodoros del baño de niñas y se continua con labor de pañete
- Se inicia corte en el piso de baño de niñas para instalación de redes de los aparatos

5

Escaneado con CamScanner

.se realiza labor de limpieza

Ricardo Hernandez

Jueves 24 de septiembre 2020

.se realiza cortes en muros y piso para instalacion de redes hidraulicas y sanitarias

Viernes 25 de septiembre

.se realiza comite de obra y se acuerda cambiar piso laminado por ceramica, demoler muro interno del baño de la zona administrativa

.se solicita correccion de los cortes para instalacion de redes de los drenajes 3 drenajes de 70cm.

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner


Sabado 26 de septiembre 2020

- Se continua con labor de picheteo y cortes para instalacion de retor de luminarias y orinales

Ricardo Hernandez 

Lunes 28 de septiembre 2020


- Se solicita nuevamente la correccion de los cortes para instalacion de orinales (3 cada 70 cm) y correcion instalacion de luminari 4 en el baño de niñas
- Se realiza la demolicion del muro interno del baño de la zona administrativa
- Se realiza labor de picheteo en el baño de la zona administrativa

Ricardo Hernandez 

Escaneado con CamScanner


Martes 29 de septiembre

- Se continua con labor de pañete sobre el muro de los baños de la zona administrativa

Ricardo Hernandez 

Miercoles 30 de septiembre

- Se continua con instalacion de redes para lavamanos en el baño de niñas.

Ricardo Hernandez 

Jueves 01 de octubre

- Se realizo comite de obra y se solicito nuevamente corregir la instalacion para redes de los lavamanos, ya que se realizaron de 60cm y no de 70cm como se solicito.
- Se solicita aumentar el personal

Ricardo Hernandez 

Escaneado con CamScanner

Viernes 02 de octubre del 2020

- Se inicia corrección de redes de los orinales

Ricardo Hernandez

Sabado 03 de octubre del 2020

- Se continua con corrección de redes de los orinales
- Se realizan cortes en el muro para la instalacion de los mesones para lavamanos

Ricardo Hernandez

Lunes 05 de octubre del 2020

- Se realiza demolición de piso en el baño de la zona administrativa
- Se realiza formaleta para mesones
- Se realiza instalación sanitaria y suministro de agua para los orinales

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 06 de octubre

- Se realiza labor de repello para cubrir instalaciones de 60 oficinas
- Se realiza recolección de escombros

Ricardo Hernandez

Miercoles 07 de octubre

- Se continua labor de repello para cubrir instalaciones de 60 oficinas
- Se continua con recolección de escombros

Jueves 08 de octubre


- Se realiza comite y se solicita aumento personal
- Se realiza instalación de accesorios para los desagües
- Se continua con labor de repello sobre muro de la zona administrativa
- Se solicita entrega esquemas de los mosaicos de los lavamanos

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Viernes 09 de octubre

- Se continua con labor de resane en la zona administrativa
- Se registra llegada de material
- Se realiza recolección de escombros

Ricardo Hernandez 


Sabado 10 de octubre

- Se realiza labor de fundir pisos en la zona administrativa y el baño de la misma zona

Ricardo Hernandez 

Martes 13 de octubre

- Se inicia labor de estuco en la zona administrativa
- Se inicia a fundir mezclas de concreto en el baño de niñas de 15 cm de ancho

Ricardo Hernandez 

Escaneado con CamScanner

Miercoles 14 de octubre del 2020

- Se funde mezón para lavamanos del baño de niños
- Se abren tuberías de suministro de agua de los lavamanos 10cm en los baños de niños ya que su ubicación actual no permite la instalación del mezón

Ricardo Hernandez

Jueves 15 de octubre del 2020


- Se continua con recolocación de tubería de suministro de agua de los lavamanos del baño de niños
- Se retira parte del codo de los lavamanos administrativos, ya que se encuentra barrenado
- Se demuele tabique en los baños de niños que se encuentra fracturado

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Viernes 16 de octubre

- se finde mesón de lavamanos en el baño de niñas
- se acuerda realizar solo 2 oficinas en la zona administrativa.

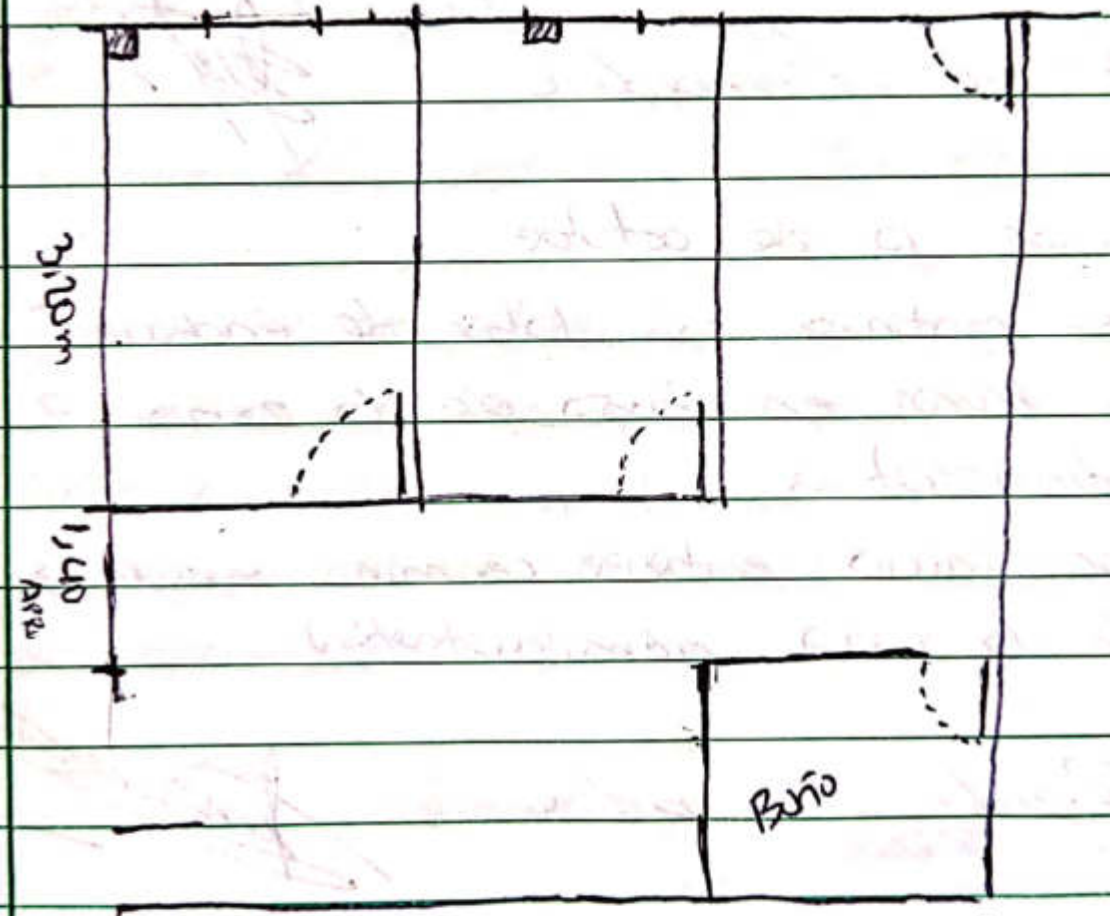

el ancho de las oficinas se debe modular deacuerdo a las ventanas (3 ventanas para cada oficina)
1,90 m Aproximados

Escaneado con CamScanner

Sabado 17 de octubre

- Se inicio labor de enchape en muros interiores del bano de la zona administrativa
- Se finale mesun de concreto en el bano de mujeres

Ricardo Hernandez



Lunes 19 de octubre

- Se continua con labor de enchape de muros en bano de la zona administrativa
- Se inicio enchape ceramico en pasillo de la zona administrativa

Ricardo Hernandez



Martes 20 de octubre

- Se continua con labor de enchape en muro de bano administrativo y pasillo de la zona administrativa

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Miercoles 21 de octubre

- Se continua con labor de enchape en el baño de la zona administrativa, enchape en muros y piso
- Se inicia labor de enchape en los baños de niños

Ricardo Hernandez

Jueves 22 de octubre

- Se continua con labor de enchape en los baños de niños y niñas.
- Se registra llegada de material para divisiones de oficinas (superboard y perfileria) 9:30 am

Ricardo Hernandez

Viernes 23 de octubre

- Se continua con labor de enchape en los baños de niños y niñas


Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Sabado 24 de octubre

-se realiza aplanado de piso en una parte de la zona administrativa para poder nivelar con la pendiente que se estaba instalando el piso ceramico

Ricardo Hernandez




Lunes 26 de octubre

-se continua con labor de enchape de muro en los baños de niños y niñas

-se realiza este en pisos de los baños para realizar media caña

-se continua con instalación de piso ceramico para la zona administrativa

Ricardo Hernandez



Martes 27 de octubre del 2020

-se finaliza piso ceramico en la zona administrativa y se inicia instalación de guardaescoba en el mismo material

Escaneado con CamScanner

- Se continua con cortes en el piso de los baños para la mediania
- Se realizan remates en el anchope de los baños 9:21 am

Ricardo Hernandez

MIERCOLES 28-OCTUBRE/20

- SE CONTINUA CON EMBOQUILLADO Y ACABADO - PORCELANATO PISO.
COLOCADO PISO. MEDIA CAÑA EN UNIDADES SANITARIAS.
- Se inicia instalacion de perfiles de aluminio para las divisiones de la zona administrativa
- Se realiza cambio de tuberia que se ha afectado en la demolicion de piso 2:00PM

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

JUEVES 29-OCTUBRE/20:

- SE CONTINUA INSTALACIÓN DE PERFILERIA PARA DIVISIONES EN DRYWALL
- SE REALIZA EL VANO DE LAS PUERTAS CON UN ANCHO DE 90 cm.
- SE REALIZA BASE PARA LA CANCELA DE LOS BAÑOS

Ricardo Hernandez

Viernes 30 de ~~noviembre~~ octubre

- SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE PERFILES EN DOMINIO PARA LAS DIVISIONES DE LA ZONA ADMINISTRATIVA

Ricardo Hernandez

Sábado 31 de octubre

SE INICIA INSTALACIÓN DE DRYWALL EN LA ZONA ADMINISTRATIVA

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 03 de noviembre

- Se continua con la instalacion de drywall
- Se realiza union entre el piso ceramico y baldosin con granilla lisa
- Se instalan los fluxometros de los orinales
- aun no se han realizado labores electricas

Ricardo Hernandez

Miercoles 04 de noviembre

- Se inicia labor de estuco en muro en drywall
- Se realiza union en granilla lisa
- Se instala fleje en muro del baño de niñas

Ricardo Hernandez

Jueves 05 de noviembre

- Se continua con labor de estuco y lijado en los muros de dry wall

Ricardo Hernandez

19

Escaneado con CamScanner

Viernes 06 de Noviembre

- Se inicio labor de pintura sobre los muros de drywall
- Se realiza pulido de medidas en el baño de la zona administrativa

Ricardo Hernandez

- Sabado 07 de Noviembre
- Se continua con labor de pulido de media caña

Ricardo Hernandez

Lunes 09 de Noviembre

- Se inicio media caña en el baño de niñas
- Se continua con labor de pintura sobre los muros de dry wall

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 10 de Noviembre

- Se realizo labor de pintura bajo placa de la zona administrativa.
- Se inicia instalación de piso en baldosin en los baños de niños y niñas
- Se aplica granito a los mesones de los lavamanos

Ricardo Hernandez

Miercoles 11 de Noviembre

- Se instala inodoro y lavamanos de Pedestal en el baño de la zona administrativa
- Se continua con instalación de piso en baldosin en los baños de niños y niñas

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Jueves 12 de Noviembre

- inicia instalación de orinales en el baño de niños
- se realiza embarquillado de PVC en el baño de niñas y niños

Ricardo Hernandez

Viernes 13 de Noviembre

- se recuerda iniciar las actividades eléctricas ya que hasta la fecha no se han iniciado
- retocar pintura en los muros de drywall
- después de pulir realizar la respectiva limpieza
- se pulen mesones en granito

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 17 de Noviembre de 2020.
se hace Instalación de lavamanos con grifería
se pintan Columnas de entrada a Baños
se terminan media Cañas en baños.
No se evidencian trabajos electricos.
es Importante que a la hora de realizar las Conexiones hidraulicas de los lavamanos lo realicen de forma que queden a escuadra.

Miercoles 18 de Noviembre del 2020
- Se realiza Pulido de mediacaña en el baño de niños
- Se realiza ligado de muros en la zona administrativa

Ricardo Hernandez

Jueves 19 de Noviembre
- Se inicia instalación de tuberia emt y tomas electricas en la zona administrativa
- Se realiza Pulido de piso en baldosin

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Viernes 20 de Noviembre

- Se continua con instalacion de tuberia emt
- Se inicia labor de cableado
- Se realiza embozillado de media cañ

Ricardo Hernandez

SABADO 21-NOV/20.

SE REALIZA INSTALACIÓN DE POSTES EN ALUMINIO.

Lunes 23 de Noviembre

- NO se encuentra Personal de trabajo

7:36 PM

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 24 de Noviembre

- Se realiza el cambio de 2 yrifas de lavamanos del baño de niñas que no funcionaron
- Se instala rejilla de los sifones de los baños

Ricardo Hernandez

Miercoles 25 de Noviembre

- Se inicia instalación de bajantes de los lavamanos en el baño de niñas

Ricardo Hernandez

Es necesario Verificar. las escuadras en zona administrativa ya que hay ditaciones exageradas es necesario rectificar o sellar.
en puerta principal de zona administrativa es necesario hacer acabado (en columna de concreto en color Azul actualmente), se debe pintar-estucar a color Blanco para dar homogeneidad.

Escaneado con CamScanner

Se deben fijar rejillas de piso
. a la fecha no se han realizado todas las instalaciones electricas.
. falta iluminación en las zonas.
. No se ha ameglado el terminado superior en baños con respecto al enchape de pared se debe delinear la dilatación.
. No se han instalado las divisiones de Orinales en baño de niños.
. hace falta puerta en baño de profesores
. hace falta espejos.
. hace falta Aseo en todas las zonas.
. es necesario realizar mano de pintura final en drywall ya que esta manchado por instalación de puertas.

25/11/2020. 10:05 am

Jueves 26 de noviembre
- No se encuentra personal de trabajo

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Viernes 27 de Noviembre

- No se registran actividades

Ricardo Hernandez

Sabado 28 de Noviembre

- No se registran actividades

Ricardo Hernandez

Lunes 30 de Noviembre

- No se encuentra Personal ni se registran actividades

Ricardo Hernandez

Martes 01 de ~~Noviembre~~ Diciembre 01

- No se realizaron actividades

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Miercoles 02 de diciembre
- se inicia instalacion de lamparas tipo led

Ricardo Hernandez

Jueves 03 de diciembre
- Se realizo la instalación de lamaras tipo led en la zona administrativa
- al acceso las lamparas no estan instaladas de forma simetrica, una esta a 33cm del muro y la otra a 51 cm, estas deben quedar igual
- los agujeros sobre los cuales fueron instaladas las lamparas tambien se deben cubrir con tapas

Se inicia labor de limpieza de muros
- SE CORRIGIO INSTALACION LAMPARAS
Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

07 de Diciembre 2020

Se Solicita el respectivo Aseo delas Zonas Intervenidas al igual que la instalación de los Divisiones de los orinales.
Se Solicita realizar retiro de material sobrante de Obra.
No hay personal hoy.

15 de Diciembre 2020

Hace falta Aseo en baños.
Hacen falta divisiones metalicas
Se debe hacer Aseo en orinales ya que se aplico silicona a los empages.
a la fecha no se ha instalado el cajon bajo lavamanos Según Solicitud de la SSP.
No hay personal trabajando.

Escaneado con CamScanner

16 de Diciembre 2020

No se encuentra Personal de trabajo

Ricardo Hernandez

17 de Diciembre 2020

- Se encuentra Pendiente reparacion del muro del baño de niños
- No se encuentra Personal en el colegio

Ricardo Hernandez

18 DE DICIEMBRE 2020

- Se trae material para la taqueria en drywall debajo de escaleras solicitado por la Arq. Carol

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

19 de diciembre del 2020
- No se realizan actividades

Ricardo Hernandez

21 de diciembre del 2020
- Se realiza instalación de bebederos bajo los lavamanos
- Se realiza reparación del muro del baño de niños.

Ricardo Hernandez

22 de diciembre del 2020
- No se encuentra personal de trabajo
- La espiga del bebedero del baño de niñas está y fuera
Ricardo Hernandez
- Se realiza instalación de divisiones en acero inoxidable en orinales baño de niños

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

6.4 BITACORA I.E.D PANAMA SEDE C

INICIO DE OBRA PANAMA SEDE C

03 de septiembre del 2020

- Se realiza el ingreso de personal
- se inicia labor de demolición de placa de techo en los baños del primer piso

Ricardo Hernandez

Septiembre 04

- se continua con labores de demolición de placa de techo en los baños
- se realiza el retiro de elementos de clase de educación física como colchonetas del salón ubicado en la parte posterior de la cancha y se retiran estos elementos en uno de los salones internos del primer piso

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Septiembre 05

- Se continuaron labores de demolición de placa de techo y se realizó la identificación de filtraciones de agua

Ricardo Hernandez

Septiembre 07

- Por parte de interventoría se solicita la de actividades que correspondan al trabajo en alturas hasta que el contratista haya entregado la documentación de cursos de alturas y permisos de los trabajadores en el sitio.

Ricardo Hernandez

Septiembre 09

- Se realiza labor de recolección de escombros y limpieza de las zonas intervenidas
- No se realizan actividades de alturas

SE RECOLECTAN. CERTIFICADOS DE ALTURAS.

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Septiembre 09

no se registran actividades

Ricardo Hernandez

Septiembre 10

- se realiza comite de obra con acompañamiento de interventoria
- se identifica filtraciones en la placa sobre los baños
- se propone llevar el punto hidraulico hasta el cuarto de basuras de forma elevada
- se inicia labor de pañete sobre los muros internos del cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Septiembre 11

se continua con labor de pañete sobre muro interno del cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Septiembre 12

- No se registran actividades

Ricardo Hernandez

Lunes 14 de septiembre

- Se realiza el desmonte de la puerta del cuarto de basura y se realiza corte en el muro para ampliar el vano de la puerta
- Se evidencia que el pañete realizado en los muros internos del cuarto de basura no está adherido al muro y se desprende con facilidad, se detiene esta actividad y se solicita al contratista realizar nuevamente el pañete y revisar el muro que ya fue pañetado y repellado (lateral derecho) ya que el pañete fue hecho con el mismo material que se está desprendiendo.

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

martes 15 de septiembre

- se realiza el desmonte de la contra superior en el cuarto de basura;
- se inicia el retiro de parte de los muros interiores del cuarto de basura ya que el que se realizo no esta adherido y se desprende con facilidad

Ricardo hernandez

Miercoles 16 de septiembre

- se realiza comite de obra y se solicita al contratista entregar la propuesta de impermeabilizacion
- se solicita cambiar accesorios de tuberia hidraulica los cuales son galvanizados por que se instalaron. realizar el cambio.
- verifica que el registro no sobresalga del muro

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Jueves 17 de septiembre

- se realizo cambio de accesorios galvanizados a PVC en el cuarto de basuras
- se introdice mas en el muro el registro para que no sobre salga del muro
- se realiza nuevamente el firete en los muros interiores del cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Viernes 18 de septiembre 2020.

- Se continua con base de firete sobre los muros del cuarto de basuras.

Ricardo Hernandez

Sabado 19 de septiembre 2020

- no se realizaron actividades, el residente se encontraba en capacitación

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Lunes 21 de septiembre del 2020

- Se inicia labor de peñete en muros internos del cuarto de refrigerios
- Se continua con labor de peñete sobre muros internos del cuarto de basura
- Se realiza resane con pulidora para el repintado de muros del cuarto de almacenamiento de ed. Fisica
- Se inicia demolición de piso en los baños del segundo piso

Ricardo Hernandez

Martes 22 de septiembre del 2020

- Se continua con labor de peñete sobre muros internos del cuarto de basuras
- Se continua con demolición de piso en los baños del segundo piso

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Miercoles 23 de septiembre

- se continua con cortes para el replanteo del muro del cuarto de almacenamiento de ed. física
- se continua con demolición de pisos en los baños del segundo piso y se realiza el desmonte de los aparatos sanitarios del baño de niños
- se realiza la recolección de escombros

Ricardo Hernandez

Jueves 24 de septiembre

- se realiza anclajes para el levantamiento del muro en mampostería del cuarto de ed. física
- se inicia el levantamiento del muro en mampostería
- se realiza anclajes de hierro para columnas del muro del cuarto de baños
- se continua con demolición de piso

Ricardo Hernandez

8

Escaneado con CamScanner

Viernes 25 de septiembre del 2020

- Se realiza comite y se acuerda retirar los aluxantes y realizar pruebas de presion de la tuberia
- Pintar con epoxico todo el cuarto de basura
- Se revisan actividades realizadas
- Se continua con levantamiento del muro del cuarto de almacenamiento de el. Fisica

Ricardo Hernandez

Sabado 26 de septiembre

- Se finaliza levantamiento del muro

Ricardo Hernandez

Lunes 28 de septiembre

- Se funde columna del muro del cuarto de basura
- Se continua labor de pañete
- Se realiza desmonte de redes electricas (TVNS) del cuarto de refrigeracion

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 29 de septiembre

- Se continua con labor de picado sobre los muros del cuarto de refrigerios
- Se realiza el desmonte de los tomas electricos en el cuarto de refrigerios
- Se inicia demolicion y corte con pulidora en el granito para instalacion de desagüe y Puntos de agua
- Se inicia desmonte de gotteras en techo del segundo piso para realizar la prueba de Presion

Ricardo Hernandez


Miercoles 30 de septiembre 2020

- Se continua con corte sobre granito y se realiza retiro de adyuin en el exterior del colegio para instalacion de desagües y red hidraulica en el cuarto de refrigerios
- Se realiza el retiro de filtromotos de los lavamanos de los baños del segundo piso

10


Escaneado con CamScanner

- Se realiza el retiro de escombros

Ricardo Hernandez 

Jueves 01 de octubre

- Se realiza la instalación de desagüe y punto hidráulico en el cuarto de refrigerios
- Se realiza comité y se solicita entregar esquema de la Rueda del cuarto de almacenamiento de ed. física
- Se solicita cambiar la tubería de suministro de agua de los sanitarios del segundo piso

Ricardo Hernandez 

Viernes 02 de octubre

- Se realiza el cubrimiento de las instalaciones de agua y desagüe del cuarto de refrigerios en granito
- Se realiza la instalación del registro de agua en el cuarto de refrigerios

Escaneado con CamScanner

- se realiza el desmonte de los electrodos de los columnas e inodoros de los baños del segundo piso
- se realiza cambio de tubería en el baño de niños

Ricardo Hernandez

sábado 03 de octubre
- se realiza la demolición del alistado de piso del cuarto de basuras
- se realizan las mediciones para realizar el corcamo y el degüenadero junto al cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Lunes 05 de octubre
- se funde piso en el cuarto de refrigerios con un espesor de 10cm y en el cuarto de basuras con espesor de 3cm

12 Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

- martes 06 de octubre
- se tuzan niveles en los baños del segundo piso para fundir e impermeabilizar
- se funde piso en el baño de niñas con un espesor de 7.5 cm

Ricardo Hernandez

Miercoles 07 de octubre
- se inicia aplicación de mortero de impermeabilización en la placa del piso del baño de niñas
se funde piso de 7.5cm en el baño de niñas

Ricardo Hernandez

Jueves 08 de octubre
- se realiza comite y se acuerda iniciar la impermeabilizacion de la placa una vez terminado el cambio de tuberia y fluxometros de los baños del segundo piso

Escaneado con CamScanner

- Se inicia corte con pulidora para realizar la excavación del arcamo o el desarenador ante el cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Viernes 09 de octubre

- Se inicia demolición de placa y excavación para el arcamo y desarenador del cuarto de basuras
- Se inicia colocamiento del tubo de suministro de agua del cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Sabado 10 de octubre

- Se inicia enchape de muro en el cuarto de refrigeradores

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 13 de octubre del 2020
-Se continua con labor de enchape de muros en el cuarto de refrigerios

Ricardo Hernandez

Miercoles 14 de octubre del 2020
-Se continua con labor de enchape en el cuarto de refrigerios
-Se reinicia demolicion de placa para realizar el carcamo y el desarenador para el cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Jueves 15 de octubre del 2020
-Se continua con demolicion de placa para el carcamo y el desarenador
-Se realiza retiro de enchape que se cambiara en el baño de niños y niñas

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Viernes 16 de octubre

- Se continua con labor de enchapes sobre muro y piso del cuarto de refrigerios
- Se inicia excavación para carcamo y desarenador
- Se solicita incrementar el avance en las otras actividades

Ricardo Hernandez

Sabado 17 de octubre

- Se continua con excavación para el carcamo y desarenador
- Se continua labor de enchape

Ricardo Hernandez

Lunes 19 de octubre

- Se continua labores en carcamo y desarenador
- Se inicia desmonte de tuberia de suministro de Cr inodoro
- Se realiza demolicion en muro por descubrimiento de tuberia de suministro de los Calentadores

Ricardo Hernandez

16

Escaneado con CamScanner

Martes 20 de octubre

- Se finde derrerador
- se inicia labor de ornamentación para puertas del cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

- Es necesario la actividad de desmonte de los espejos en las baterias sanitarias del primer y segundo piso para la instalación de las nuevas valvulas de push para los lavamanos

RESIDENTE.

Miercoles 21 de octubre

- Se realiza abastecimiento en concreto del carcamo y del derrenadero
- Se realiza ramos en el cuarto de basuras
- Se continua con labor de ornamentación de puertas del cuarto de basuras 17

Escaneado con CamScanner

se realiza cambio de tubería de suministro de agua de los lavamanos para instalación de flexómetros de 1/2" y los flexómetros de los inodoros serán de 1"

se realiza la instalación de las válvulas push antivandálicas soldables con entrada y salida de 1" y se acuerda con interventoría la utilización de todos los materiales de la salida de válvulas en lavamanos.

Ricardo Hernández

Jueves 22 de octubre del 2020

- se inicia labor de medida corta en el cuarto de refrigerios
- se continua con labor de ornamentación para las puertas y ventanas del cuarto de basuras
- se continua con instalación de tubería de suministro y flexómetros de ornamentos y sanitarios

Escaneado con CamScanner

- hasta la fecha se han instalado los fluxometros de los lavamanos del segundo piso y está en proceso de instalación en los sanitarios. 9:14 am

SE DESINFECTARON LOS SANITARIOS DEL PRIMER PISO. PARA CAMBIO TUBERIAS E INSTALACIÓN PUSH.

Ricardo Hernandez

Viernes 23 de octubre

- se continua con cambio de tuberia y fluxometros de lavamanos y sanitarios en el primer piso
- se continua labores de ornamentación 9:25 am

Ricardo Hernandez

Sabado 24 de octubre

- se continua con labor de ornamentación
- se continua con cambio de tuberia de suministro e instalación de fluxometros.

Ricardo Hernandez

191

Escaneado con CamScanner

Lunes 26 de octubre del 2020

- Se continua con labores de ornamentación
- Se realiza retiro de enchape en los baños del segundo piso 1:49 Pm

Ricardo Hernandez

Martes 27 de octubre del 2020

- Se continua con labores de ornamentación
- Se continua con instalación de fluxometros
- Se continua con retiro de enchape en los baños

* Se solicita desmontar lampara del baño de niños del primer piso, ya que representa un riesgo por caida. 9:50 am
* SE COMPLETA LA INSTALACION DE VALVULAS EN LA SEDE Y SE PROBO CON PRESION

20

Miercoles 28 de octubre

- se realiza el cambio de los flotometros en los baños del primer y segundo piso,
- se inicia instalacion de enchape en los baño del segundo piso
- continua labor de ornamentacion

Ricardo Hernandez

JUEVES 29 OCTUBRE/20.

- SE CONTINUA CON ENCHAPE. MUROS. EN AREAS. INSTALACION VALVULAS. AUTORIZADO POR INTERVENTORIA. LUEGO DE REALIZADAS LAS PRUEBAS DE PRESION.
- SE APLICAS ANTICORROSIVO Y PINTURA ORNAMENTACION.
- Se realiza retiro de escombros.

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Viernes 30 de octubre
- Se realiza aplicación de impermeabilizante en la placa de piso de los baños de mirador del segundo piso
- Se continua con el retiro del enchape

Ricardo Hernandez

Sabado 31 de octubre del 2020
- Se continua con el retiro del enchape afectado
- Se solicita recibir los pluviometros y el punto de salida de agua de tal forma que quede alineado

Ricardo Hernandez

Martes 03 de noviembre del 2020
- Se realiza labor de limpieza en la cubierta del cuarto de basuras y se levantan unas hiladas de ladrillo en la pared posterior de la misma

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

(Jueves) 04 de noviembre Miercoles

- Se inicio labor de enchape de piso en el baño de niños del segundo piso
- Se realizo base para (guardiescoba) y se prepara para impermeabilizacion del piso del baño de niños del segundo piso
- Se recalca que los flurometros se deben ALINEAR antes de enchapar 10:00 am

Ricardo Hernandez

Jueves 05 de Noviembres

- se realizo la aplicacion e instalacion de manta para impermeabilizar
- se realizo instalacion de enchape de piso en el baño de niños
- se instalan los grifos del baño de niños

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Viernes 06 de Noviembre

- Se continua con instalación de muro de impermeabilización en ejes y ejes del Box de niveles del segundo piso

Ricardo Hernandez

Sabado 07 Noviembre

- Se aplica segunda capa de impermeabilizante en el box de niveles del segundo piso, se inicia impermeabilización de losa cubierta del cuarto de basura

Ricardo Hernandez

Lunes 09 de Noviembre

- Se inicia nivelación de fluxómetro de Glamour e inodoros

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 10 de Noviembre
- Se continua con la nivelacion de
Aluminados de las losas

Ricardo Hernandez

Miercoles 11 de Noviembre
- se inicia instalación de enchape en
el baño de niños del segundo piso

Ricardo Hernandez

Jueves 12 de Noviembre
Se continua con instalación de enchape
Ricardo Hernandez

Viernes 13 y sabado 14
se continua con instalacion de enchape
de muro

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 17 de Noviembe de 2020.

- se hace instalación de ceramica en piso en baño de niños en el segundo piso.
- se hacen reparaciones en redes hidraulicas ya que no estaban dentro del muro y el enchape no pasaba.
- se solicita hacer Aseo a carcamo de cuarto de Basuras.

Miercoles 18 de Noviembree

- Se continua con instalacion de piso en el baño de niños del segundo piso
- Se realiza emboquillado del enchape de muro en el baño de niños

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Jueves 19 de Noviembre

- Se inicia instalación de puertas y persianas a las cuales se le deben realizar sus respectivas correcciones
- Se continua con instalación de enchape de muro

Ricardo Hernandez

Viernes 20 de Noviembre

- Se realiza la instalación de la puerta de refrigerios
- Se instala la persiana del cuarto de basura, la cual presenta golpes y partes desprendidas, se debe reparar

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Sabado 21 de Noviembre

- se instalo la cortina de aluminio del aula de educación física

Ricardo Hernandez

Lunes 23 de Noviembre

- no se encuentra personal de trabajo 3:03 PM

Ricardo Hernandez

MARTES 24-NOV/20.

- SE CONTINUA CHEQUEO RESANE PAREDES UNID. SANITARIAS.
- SE INSTALA MASTIC. IMPERMEABILIZANTE EN TERRAZA CUARTO DE BASURAS.
- Se debe realizar el cambio de un enchape de piso el baño de niños del segundo piso

28

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Miercoles 25 de Noviembre de 2020.

- Se realizan acabados en carpintería metalica.
- Se inicia aplicación de pintura epoxica en cuarto de basuras.
- a la fecha no se ha instalado rejilla y tapa de Carcamo.
- No se han realizado actividades de cielo raso en baños de primer piso.
- No se ha realizado media caña en baños de segundo piso ni en cuarto de refrigeras.
- A la fecha no se ha realizado la reparación en baño de vigilancia.
- Se continua con enchape en baños de segundo piso Sanitarios.
- No se ha realizado parte electrica.
- Hacen falta espejos en baños. 25/11/2020. 10:35 am.

- Jueves 26 de Noviembre
- Se inicia instalación de media caña en los baños de niños del segundo piso, esta no se encuentra nivelada en los empates entre una pieza y otra, se deben nivelar 29

Escaneado con CamScanner

- la media caña del cuarto de refrigeriios se realizara insito, no se utilizara la Prefabricada

- Se realizo la instalación de angulos en los rejillos de las puertas para cabrir los puntos de soldadura, no obstnk estos angulos se encuentran golpeados y con irregularidades.

- Se inicio labor de pintura sobre las Puertas del cuarto de refrigeriios y de educación fisica

- Se realiza aplicación de pintura epoxica en muros y placa de techo del cuarto de basuras.

- Se realizan remates de enchape en los baños del segundo piso

30: Ricardo Hernandez 10:09 am

Escaneado con CamScanner

viernes 27 de Noviembre
- se continua con instalación de enchape de muro y media cana

Ricardo Hernandez

Sabado 28 de Noviembre
se continua con instalación de cañuela y enchapes de muro

Ricardo Hernandez

Lunes 30 de Noviembre
- se continua con instalación de enchape de muro en los baños del primer PISO y media caña en el baño de niños del segundo PISO

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Martes 01 de Diciembre
- Se continua con instalación de enchapc y medio cañal
- Se inician reparaciones de las puertas de acuerdo a las observaciones realizadas

Ricardo Hernandez

Miercoles 02 de diciembre
- Se instalaron los inodoros del baño de niños del segundo piso
- Se continua con instalación de madera
- Se continua con reparaciones de las puertas

Ricardo Hernandez

Jueves 03 de (Noviembre) DICIEMBRE
- Se realizan nuevamente observaciones respecto a las puertas, como pulir y/o lijar las soldaduras, instalar topaluces, y en el caso de la Puerta del cuarto de refrigerios se debe reparar el ala, y si esta

Escaneado con CamScanner

no queda de forma aceptable en sus filos, se deberá realizar toda la pieza nuevamente

- Se continua con instalación de medidores

Ricardo Hernandez

15 de Diciembre de 2020.

- Se solicita tapa ciega en Almacen de depotes
- en cuarto de refrigeras es importante desmontar la lampara y pintar el techo.
- Se inicia Aplicación de estuco en cuarto de Basuras
- la carpintería metalica tiene muchos detalles por arreglar.
- hace falta puerta en cuarto de refrigeras
- hace falta reparación en barra de vigilancia.
- hace falta Aseo, hacer falta espejos.
- hace falta tapa en Cercamo de cuarto de Basuras
- hace falta hacer retiro de material sobrante 33

Miercoles 16 de Diciembre

- se realizan observaciones en story
La puerta del cuarto de almacenamiento
del cuarto de basuras y refrigeración
los cuales deben ser substituidos
Las puertas tienen golpes, no cierran bien, mayor
pintura

Ricardo Hernandez

Jueves 17 de diciembre

- se inicia reparación de puertas, se
instalan tapajuntas en la puerta del
cuarto de basuras, se instala la puerta
del cuarto de refrigerantes, y se
instalan cerraduras
- se instala medio baño en el cuarto de
basuras y se inicia labor de lijado
en el cuarto de basuras, se estuco
paredes. y se inicia pintura epoxica.

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Viernes 18 Dic/20.

* Se recoge boletas y ventanas. Antiguas. Pasa a copiado en sede A. S/a. conversación con. Rector.
* Se pinto puerta. cuarto de refrigerio.

[observaciones]

* la puerta del cuarto de refrigerios tiene peladuras en la pintura en los bordes de la bisagras
- en el cuarto de refrigerios se marco la media cerca con pintura verde y se fractura el acceso del cuarto
- la puerta del cuarto de educación física tiene peladuras en la pintura en los bordes
- la media cerca del baño de niños del segundo piso hace falta reparar la

Ricardo Hernandez

35

Escaneado con CamScanner

Sabado 19 de diciembre

- Se continuo con labor en Puertas
- Se pinto con Pintura epoxica el cuarto de basuras

Ricardo Hernandez

Lunes 21 de diciembre

Puertas

- tienen Peladuras en la pintura.
- el muro de la puerta del cuarto de refrigeracion tiene varios ladrillos rotos en el muro
- el cable en la parte superior de la Puerta no estaba expuesto como decia

- Cuarto de refrigerios

- esta manchado el enchape, medida cm
- tapa registro en pintura verde

- Baños

- baño de niños del primer y segundo piso duran mucho tiempo abierto el flujo de agua

Escaneado con CamScanner

- los sifones están mal acabados
- los botones de los pluromotores están rotos
- un lavamanos está tapado
- pintar carátula del patio sobre el muro

Se deben subsanar todas las observaciones realizadas

Ricardo Hernández

Martes 22 de diciembre

- en el baño de niños del primer piso un grifo presenta fuga y hay un lavamanos tapado

- se están reparando las regillas de los baños

- se está intentando desmanchar el cuarto de refrigerios

37.

Ricardo Hernández

Escaneado con CamScanner

Se dejan las llaves de las chapas del cuarto frio y cuarto de deportes en su respectiva chapa. se informa a vigilancia para que las mantengan en las chapas


El.

Escaneado con CamScanner


I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ.

VIERNES 23-OCTUBRE/20.

INICIO ACTIVIDADES.
DESPEJE AREA A INTERVENIR.



SABADO 24-OCTUBRE.
DOS TRABAJADORES.
SE CONTINUA DESPEJE MURO:
RETIRO MOBILIARIO DE ACOPIO
CONTRA MURO.




LUNES 26-OCTUBRE.
3 TRABAJADORES.
INICIO EXCAVACION DESPEJE.
NIGA CIMENTACION



Escaneado con CamScanner

MARTES 27-OCT/20.

SE CONTINUA EXCAVACIÓN PARA DESPEJE CIMENTACIÓN E INTERVENIR.




MIERCOLES 28 OCT/20.

- CONTINUA EXCAVACIÓN DESPEJE. VIGA CIMENTACIÓN. Y APERTURA AREA DE TRABAJO.



VIERNES 30 OCT/20

- REPLANTEO. RESPECTIVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN VIGA CIMENTACIÓN.
LIMPIEZA VIGA CON ÁCIDO MURIÁTICO.
ARMADO ARMADURA AREA TRABAJO.



Escaneado con CamScanner

SABADO 31-OCT/20.

PERFORACIONES VIGA PARA DOVELAS. ACERO 3/8".

- COLOCAR UN VISTE MIXTO.
- INICIO DOVELAS ESTRIBOS.

SE ACORDO CON INTERVENTORIA LA DEMOLICION DE L MURO. QUE PRESENTA GRIETAS. TRANSVERSAL.

MARTES 3 NOVIEMBRE.

- ADECUACION TUBERIA ELECTRICA
- DEMOLICION COLUMNETAS EN LADRILLO. (VIGA) PARA INSTALACION DE ESTRIBOS. DOVELAS PARA FUNDIR EN CONCRETO
- Se tiene programado fundir el dia de mañana una seccion de la viga, la cual sera con concreto mezclado en el sitio, por lo cual

Escaneado con CamScanner

Se solicita al contratista Presentar el diseño de mezcla, sin este no se autoriza lo Pedido.

Ricardo Hernandez 4:13 Pm

~~(Jueves)~~ 04 de noviembre Miercoles
- se continua con instalación de fleyes para anclajes entre vigas y muro, de igual forma se instalan los fleyes de las columnas

Ricardo Hernandez

Jueves 05 de noviembre
- se realizan los fleyes de anclaje y se instala la brida de anclajes para armar los fleyes

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 06 de Noviembre

- Se continua con instalación de flejes para anclaje de Losa y muro.
- Se instala barilla de amarre.

AB 06/11/2020.

Sabado 07 de Noviembre 2020.

- Se continua con instalación de flejes para anclaje de viga a muro.
- Se instala varilla en vigas y Columnas.

AB 07/11/2020

Lunes 09 de Noviembre 2020

- Se continua con perforaciones para anclajes de vigas y Columnas
- Se figura Acero.
- Se recuerda la necesidad del diseño de mescla para fundida de vigas y Columnas!

AB 07/11/2020.

Escaneado con CamScanner

MARTES 10-NOV/20.

- SECCIONES CON ENCOFRADO. VIGS.
- DEMOLICIÓN COLUMNETAS EN LADRILLO.

Ricardo Hernandez

MIERCOLES 11/NOV/20.

- ARMADO ESTRIBOS VIGS Y COLUMNETAS.
ALISTADO ENCOFRADO.

Ricardo Hernandez

JUEVES 12-NOV/20.

- SE HACE APLICACIÓN DE ADITIVO SIKADUR 32 PRIMER PARA ADHERENCIA CONCRETO ENDURECIDO CON CONCRETO FRESCO.
- SE INICIA FUNDIDA VIGA DE CIMENTACIÓN
- SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (CILINDROS)

Ricardo Hernandez Paola Ponce A.

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 13 de Noviembre de 2020.

- Se realizan testeros para seguir con fundida.
- Se autorizan Labores para fin de Semana

Martes 17 de Noviembre de 2020.

- Se realiza revisión de amarres en Columnas y se autoriza fundida. teniendo en cuenta el siguiente criterio:

Ya que el muro esta desplomado, es necesario que en aquellas zonas donde el desplome sea mayor a 5cm. se haga una reparticion y la Columna quede en cuña apoyada en la Viga decimentacón.

- Se reviza acero amarado el día Lunes 16 de Noviembre.

Norma

Escaneado con CamScanner

Miercoles 18 de Noviembre del 2020

- Se continua con formuleteo para las columnas del muro, para fundir en enero.

Jueves 19 de Noviembre del 2020.

- Se realiza amarre de columnas y testereada para fundida, se toman medidas para ubicación de testeros según despiece de muro.
- Se está a la espera de material granular para fundir columnas.

Viernes 20 de Noviembre del 2020.

Se Continua con amarre de Columnas y vigas.
Se realizan anclajes para Viga cinta.
Se está a la espera para ingreso de material granular ingreso por puerta provisional costado oriental.

Escaneado con CamScanner

Sabado 21 de Noviembre. 2020.

Se realiza fundida de columnas las cuales se autoriza.
Se solicita el vibrador para las fundidas para evitar el hormigueo de las zonas a fundir

Lunes 23 de Noviembe 2020.

Se realiza armado de Repero de viga y armado de Columnas.
Se esta a la espera de material, Acero y Epoxico para continuar con labores

Martes 24 de Noviembe 2020
Llega material Acero para vigas y columnas.
Se testerea. Viga para fundida.
Luis Eduardo Tsoroe

Escaneado con CamScanner

Miercoles 25 de Noviembre de 2020

- Se realiza fundida de Vigas el día 24, se recomienda realizar afinado de Viga superficial por lluvias.
- Se realizan anclajes para viga y columnas.
- Se solicita destapar zona Norte del Muro para Confirmar si hay viga para columna final
- Se Solicita Esquema que a la fecha no se ha realizado para la terminación del Muro.

Jueves 26 de Noviembre de 2020

- Se realiza Zapata en costado Norte del muro donde se realiza anclaje del acero del costado Oriental y las del costado occidental se hace parrilla.
- Se Continua Con anclajes en vigas y en columnas.
- Se Continua Con armame de acero para columnas y Vigas
- Se solicita esquema de Columa final que a la fecha no se ha realizado y ya esta ejecutada en Viga Principal

Norma


Escaneado con CamScanner

Martes 01 de Diciembre 2020.

Se inicia Retiro de malla ella el costado oriental se solicita Herramienta ya que el personal ha perdido dos dias en los cuales no se ha ejecutado actividades representativas.
Se solicita acompañamiento de vigilancia por desmonte.

1/12/2020 10:05 Am

MIERCOLES 2-DIC/20.

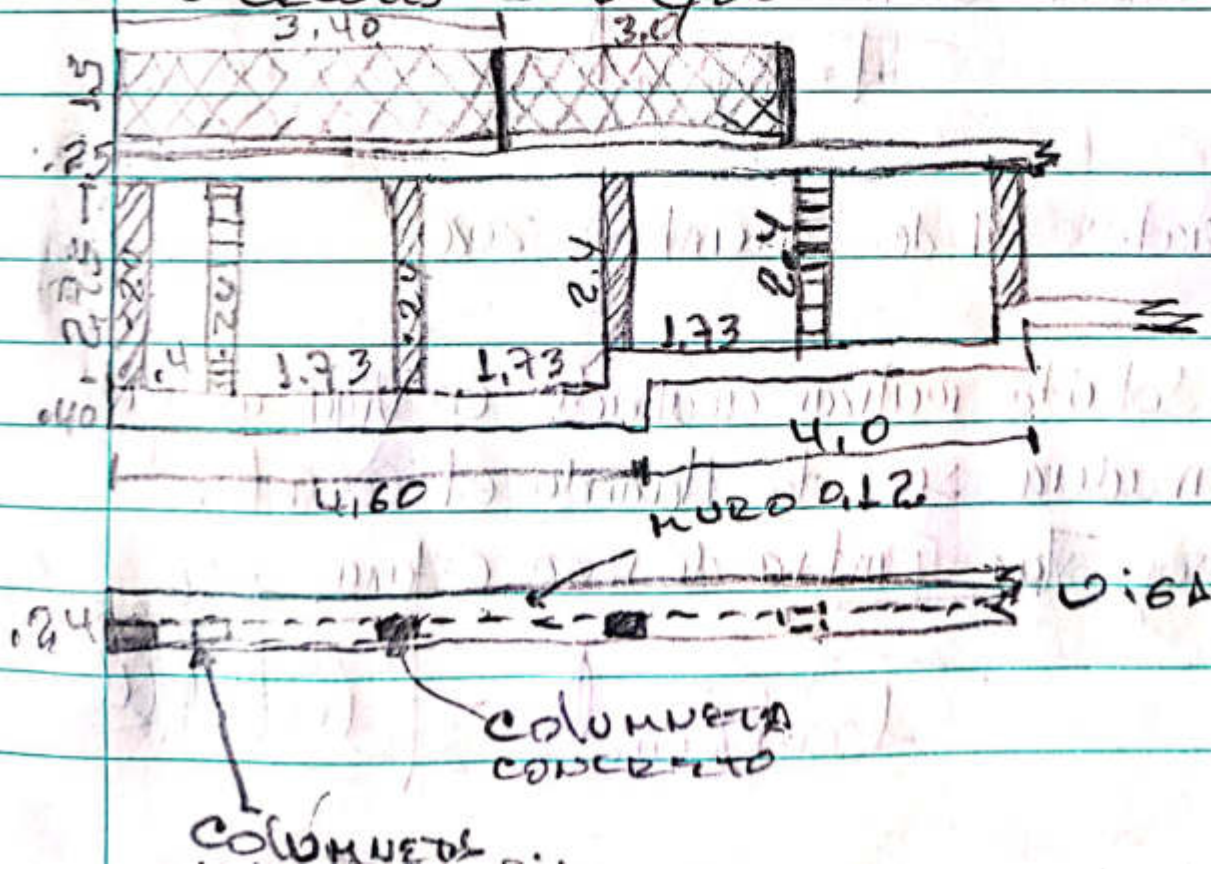

Norma

Escaneado con CamScanner

Jueves 03 de Diciembre 2020.

Se hace fundida de columnas y se hace armare de Acero para Columna final.
Se solicita acabado de Viga Inferior, Propuesta para determinar entrega.

Viernes 04 de Diciembre 2020.

Se Continua con figuración de viga superior ingresa personal para Ornamentación para Cerramiento de malla

Miercoles 09 de Diciembre 2020.

Se Solicita realizar acabado en Viga ya que La madera se esta llevando el concreto.
Presupuestar Pintura de muro externa.

Norma

Escaneado con CamScanner

Jueves 10 de Diciembre 2020.

Se hace acabado de jga parte externa el cual queda autorizado.
Se solicita el detalle de la columna final ya que a la fecha no se ha realizado.
Se solicita iniciar con arreglos locativos del Acta de vecindad teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato.

Viernes 11 de Diciembre 2020.

Se solicita aplicar 1. capa de Anticorrosivo a los postes Correspondientes al cerramiento en malla ya que al estar incrustados en el concreto y en contacto con el acero provocara un par Galvanico y se producuran Postventas.

LOS POSTES YA TIENEN ANTICORROSIVO NEGRO.

Escaneado con CamScanner

Lunes 14 de Diciembre 2020.

Se realiza armado, testereado y fundido de vigas y columnas.
Se solicita sacar muestras de concreto para realizar pruebas respectivas.

MARTES 15 DE DICIEMBRE 2020
- SE FUNDIO VIGA DE AMARRE.
- TESTEREADA VIGA DE AMARRE.
- DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA
- ?

- MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE 2020
- AFINADO DE VIGA
- DESENCOFRADO DE VIGA

- JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020
- MAMPOSTERIA
- DESENCOFRADO DE VIGAS
- RETIRO DE MADERA DE SOPORTE

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 18 de Diciembre de 2020.

Se termina muro en mampostería.
se realiza amarre de acero para viga cerca.
Se realiza amarre de acero columnas.
se hace retiro de material de obra.
se realizan anclajes de Acero con epoxico a muro existente.

Lunes 21-Dic/20.

- DESENCOFRE ULTIMO TRAMO - VIGA - CINTA.
- DOMINGO SE INICIO INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA.
- A la fecha no se han sacado los muestras de concreto del colegio
- A la fecha no se ha presentado detalle de la terminación de la columna y el muro.
- Ingresa pintura para muro color Atol.

Escaneado con CamScanner

Martes 22 de Diciembre de 2020

Se hace instalación de Cerramiento faltando un modulo.
Se Solicitan correcciones de soldaduras en cerramiento
Se inicia pintura de muro externa al colegio
Se solicita Limpieza de cancha fogueada por pintura de modulos de Cerramiento.

NOTA: NO SE HA REALIZADO ACTIVIDADES DE ACTA DE VECINDAD, NO SE HAN CORREGIDO REDES ELECTRICAS LAS CUALES DEBEN QUEDAR COMO SE ENCONTRARON. Y ESTO RETRASA LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA DEL COLEGIO.
22/Diciembre/2020

MIERCOLES 23/12/20
- SE HACE INSTALACION DE REDES ELECTRICAS

Sl.

Norma

Escaneado con CamScanner

6.5 BITACORA I.E.D AQUILEO PARRA

I.E.D. AQUILEO PARRA

SEPT. 11/20.

INICIO LABORES.

2-TRABAJADORES.

INICIAMOS NIVELACION DESAGUE.

UNIDADES SANITARIAS.

Ricardo Hernandez

SEPT. 14/20.

2-TRABAJADORES.

DEMOLICION PLACA PISO. UNIDADES.

SANITARIAS.

Ricardo Hernandez

SEPT. 16/20.

SE CONTINUA CON DEMOLICION PISOS.

Y LEVANTAMIENTO ASBESTOS. SANITARIOS.

SE ACORDO CON INTERVENTORIA.

LA CONSTRUCCION TOTAL DE LA RED.

DE DESAGUES.

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

SEPT. 17/20.
SE CONTINUA CON. DEMOLICIÓN.
LINEA DESAGUE. DE UNIDADES.
Y CAJA DESAGUE UBICADA FUERA.
DEL. BLOQUE DE AULAS.

Ricardo Hernandez

SEPT. 18/20.
4 TRABAJADORES.
SE CONTINUA DEMOLICIÓN. CON MARTILLO-
DEMOLEDOR. Y SE. INSPECCIONA.
AREAS. A IMPERMEABILIZAR.

Ricardo Hernandez

SEPT. 21/20.
4 TRABAJADORES.
SE REALIZA EXCAVACIÓN. LINEA DE.
CONDUCCION AGUA SANITARIA. SE.
ENCUENTRAN CAJAS DE INSPECCIÓN
LAS CUALES SE DEBEN DEMOLER Y

Norma

Escaneado con CamScanner

LUEGO VOLVER A CONSTRUIR. S/a.
FOTOS. DE REGISTROS.

Ricardo Hernández

SEBT. 22/20.
4 - TRABAJADORES.
SE RECIBE MATERIALES, PARA OBRA.
RECIBO - TUBERIA Y ACCESORIOS.
Y SE CONTINUA. EXCAVACIÓN.

Ricardo Hernández

SEBT. 23/20.
4 - TRABAJADORES.
CONTINUA EXCAVACIÓN.
SE ACUERDA CON INTERVENTORÍA.
LA REUBICACIÓN DE LA TUBERIA DE.
DESAGÜES. DE LOS LAVAMANOS.
(EN CONCRETO). Y EL LEVANTAMIENTO-
DE LOS OBJETOS. EXISTENTES.

Norma

Escaneado con CamScanner

PARA LA NUEVA INSTALACIÓN DE DESAGÜES.

Ricardo Hernandez

SEPT. 24/20.

4 - TRABAJADORES.

SE CONTINUA. EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN. OBRAS. VARIAS.

SANITARIAS.

SE VERIFICA. NIVELACIÓN TABIQUES. QUE SE VAN A IMPERMEABILIZAR. LOS CORTES. TIENEN UNA PENDIENTE ENTRE EL 2% Y 3%.

Ricardo Hernandez

25 SEPT/20.

4 TRABAJADORES.

SE CONTINUA. DEMOLICIÓN. PISOS CONFORME SE ACUERDA EN COMITÉ TÉCNICO. QUE SE DEMOLERÁ TODAS LAS DIVISIONES

Norma

Escaneado con CamScanner

DE LA UNIDAD SANITARIA. LOS CASOS ESTAN EN MUROS LADRILLO. Y SE VA A DEMOLER EL LADRILLO MENOS CONCRETO ARMADO. PARA RECONSTRUIRLO TODO NUEVO.

SEPT. 26/20.

SE CONTINUA DEMOLICION EN CHAPES. PAREDES Y PISOS EN UNIDADES SANITARIAS. EN EXCAVACION DE RED. SANITARIA. APARECE UN NIVEL FREATICO.

SE RECIBE VISITA DE RECIBO PARA RED SANITARIA

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

SEPT. 28/20.

3 - TRABAJADORES.

SE ACORDO. CON INTERVENTORES.
EL PRIMER TRAMO DE LA RED. SALIDA
DEPTO DE LA UNIÓN. UNA PENDIENTE
BAJO VÍAS DE CANALIZACIÓN DE 35 cms.
LOCAL. EN LA LONG. TOTAL DE 70 mts
EQUIVALE. A LA MITAD. DE. PENDIENTE
DE ENTRE NOS DOS POSTES. LO CUAL.
NOS LLEVA A. PENDIENTES DEL 0,05%
EN UNOS DE 60 MTS. PARA PASAR POR
DEBAJO DE TODAS LAS VÍAS DE
CANALIZACIÓN.
SE SEÑALIZO. DRENAJE INTERVENIDO
EN CIERTA SEÑALIZACIÓN.

Ricardo Hernández

Norma

Escaneado con CamScanner

4 E.

Martes 29 de septiembre 2020

- Se continua con excavacion para instalacion de redes sanitarias

Ricardo Hernandez

Miercoles 30 de septiembre 2020

- Se continua con excavacion y demolicion en unidad sanitaria.

Jueves 01 de octubre 2020.

- Se identifica que la excavacion realizada para la red de desagües no funciona, por lo cual se solicita nuevo esquema para la definicion de la intervencion a realizar.
- Se debe entregar propuesta el dia 01 de octubre de 2020 al finalizar para tomar desicion.
- Se debe actualizar cronograma de actividades para tener claro los presupuestos del colegio y asi saber las zonas a intervenir.

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

viernes 02 de octubre

- Se realiza excavación en zona verde en la parte posterior del colegio en busca de una tubería principal a la cual conectarse, se excavó 1.5 m. NO! se encontró tubería
- Se realizan pruebas con tinto para identificar donde desagüa una de las cajas, y así lograr identificar una caja intermedia a una profundidad de 1m. la caja está ubicada en el andén de los salones prefabricados
Relleno de excavación.

Ricardo Hernandez

Sabado 03 de Octubre 2020

- Se identifica Caja y profundidad para realizar replanteo y propuesta para la intervención actual.
- Se realiza limpieza de Barras y se trazan niveles para piso acabado de Baños.

Ricardo Hernandez

Norma.

Escaneado con CamScanner

5

Lunes 05 de Octubre de 2020.

- se realiza demolición y Corte de muro al ingreso de Baños de niños.
- se realiza replanteo para la Excavación de Sanitarios y Oficinales

Ricardo Hernandez

Martes 06 de Octubre de 2020

- se realiza relleno de la excavación que se va a utilizar.
- se realiza Demolición de piso en baño de niños

Ricardo Hernandez

Miercoles 07 de Octubre de 2020.

- se realizan observaciones de la Construcción Sanitarias: se debe dejar tapar de inspección para las redes.
- se deben Ventilar las redes.
- se debe realizar instalación de red nueva para todos los puntos.

Norma

Escaneado con CamScanner

- Se deben realizar las pruebas pertinentes de flujo, Prueba de Estanqueidad.

- Los Baños deben quedar con Registro independiente
- se debe realizar. mejoramiento de piso de los Baños ya que el existente es relleno!

Ricardo Hernandez

Jueves 03 de octubre del 2020
- Se dejara al 1% la tubería y se realizara caja a la salida del baño y se realizara la conexión a la caja que se encuentra junto al salon ... la tubería pasara por la concha. esto se acordo en el comite de obra. se perforara donde buscando ejes. y se verificara profundidad.
Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

6 ##.

Viernes 09 de octubre del 2020
Se inicia labores de resane en los baños de niños
- Se realiza demolición de la tapa de la caja final.
Ricardo Hernandez

Sabado 10 de octubre del 2020.
- Se realiza observación de medidas de las Salidas Sanitarias con respecto al muro ya que no son iguales.
- Se realiza imprimación de cubiertas sobre baño de niños con Emulsión Asfaltica. se verifica medidas y se ajusto.
Ricardo Hernandez

Martes 13 de octubre del 2020.
- Se vuelve a realizar observación con respecto a las medidas de las Salidas Sanitarias con respeto al muro ya que no son iguales.
- Se inicia instalacion de Stall de Aluminio en Cubierta

Norma

Escaneado con CamScanner

- Se solicita Extintor a las personas de la cubierta ya que estan trabajando con tanques de Gas.
- Se realiza Capacitación por parte del Area SST. del Consorcio.
- Se realiza excavación para Caja antes de intervenir Cancha.

Ricardo Hernandez

Miercoles 14 de octubre del 2020

- Se continua con instalación de redes sanitarias
- Se realiza levantamiento de muro para confinamiento de las redes sanitarias
- Se continua con labor de picada sobre muro

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

7 E

Jueves 15 de octubre del 2020

- Se continua con labor de Panete
- Se continua con instalación del Fall de aluminio (Manto) RN impermeabilización

Ricardo Hernandez

Viernes 16 de octubre del 2020

- Se solicita esquema de Planos para verificar medidas
- Se sigue Con el panete, sin las redes de suministro.
- Se continua con la instalación de manto - Asfaltico con Fall de Aluminio Costado Oriental. segundo piso.
- No se ha realizado instalación de Lluvia
- En el patio Trasero no se ha realizado Conexión de Cajas ni la Construcción de la misma.
- Se autoriza el colación de placas de concreto de cancha.

AP 16/octubre/2020 2:42 pm.

Norma

Escaneado con CamScanner

SABADO 17-OCTUBRE.
SE CONTINUA DEMOLICIÓN PLACAS DE CONCRETO CON MARTILLO, SE REALIZO. PRUEBA ESTANQUEIDAD. EN UNIDADES. Y SE CONTINUA CON PAÑETES.
Ricardo Hernandez
AB 19/oct/2020

Se inicia instalación de manto asfaltico en zona occidental, se solicita especificación de cotas grevan a ser instaladas para realizar la medición de los puntos hidraulicos
Es necesario definir reutilización de Aguas lluvias con el fin de realizar las Instalaciones hidraulicas
- Se Sugiere Retirar manto Asfaltico de la zona occidental ya que esta mal instalado Revisar presupuesto y ejecutar de ser posible.
AB 19/oct/2020
Ricardo Hernandez

Lunes 19 octubre 2020
- Se revisa modulación de Barras los ejes no coinciden con el plano enviado, es necesario tener claro la distribución de estos
- Continuar con excavación por la Cancha

Norma

Escaneado con CamScanner

8 ✓.

para paso de tubería.

19/oct/2020.
1:00 pm

Martes 20 de Octubre. 2020

- Se Continua con excavación en patio, para Once de Tubería.
- Se Continua con Impermeabilización de Zona occidental Con manto Asfaltico.
- Se continua con pañete de baño de niños.

20/oct/2020
11:10 AM

MIERCOLES 21-OCTUBRE/20.

-EN EXCAUSCIÓN PATIO SE ENCONTRO. OTRO TUBO. GRES. DE DESAGUES AGUAS. LLUVIAS LOS CUALES. ESTAN TAPADOS. ENTREGASTAS DE INSPECCIÓN. Y SE. CONTINUA EXCAUSCIÓN PARTE FINAL..

- SE CONTINUA CON. LIMPIEZA TERRAZA IMPERMEABILIZAR. SE ENCONTRO. CANAL METALICA. CAIDA DEBIDO A LA.

Norma

Escaneado con CamScanner

LLUVIA DEL DIA ANTERIOR.
- PANELES PISOS CAJAS. INSPECCION INTERNAS.

Ricardo Hernandez
RES. OBRA.

Jueves 22 de octubre
- se realiza la excavacion del agua que se estaba en la excavacion por la lluvia
- se prepara excavacion para instalacion de tuberia de 4"
se instala TUBERIA 4" TRAMO FINAL. PARTE EXTERNA.

Norma

Escaneado con CamScanner

9 €

viernes 23 de octubre

- se solicita destapar tuberia que se cubrio, ya que la base que se aplico se encontraba humeda y se solicita que sea con arena amarilla.
de igual forma se solicita extender el nailon para verificar la pendiente de la tuberia
- la arena que se utilice debe estar seca, y verificar que la excavacion tambien. Para evitar el humedecimiento de la misma.
- se utilizara la base de arena amarilla encima la tuberia y de nuevo el cubrimiento con la arena amarilla

- se continua con impermeabilizacion asfaltica y foil de aluminio en las cubiertas planas

AB.

Norma

Escaneado con CamScanner

SABADO 24/20.

- SE CONTINUA CON. LEVANTADO DE. MURO TERRAZA. BLOQUE NUEVO. Y SE. REALIZA LIMPIEZA Y ARREGLO. FISURAS.
- SE CONTINUA CON. CONSTRUCCION ESTAS DE INSPECCION.
- SE CAMBIA REGISTRO CORTINA 3/4 YA QUE EL EXISTENTE NO SELLA.

AB 24/20/2020

JUEVES 26-OCT/20.

- SE CONTINUA. PINTURA Y CAÑUELA CASAS INSPECCION.
- RETIRO ESCOMBROS..
- INSTALAC. MURO.

AB 26/oct/2020

Escaneado con CamScanner

10 $\frac{A}{E}$.

27-OCTUBRE/20. (MARTES).

- SE INICIO RELLENO. REGRESO B-200. LIMPIEZA CONDUCCION TUBERIAS SANITARIAS. PARTE EXTERNA. CONCRETADO. Y SECA DESENCOFRADA.

AB 29/oct/2020.

28 de octubre de 2020 Miercoles.

- Se da instructivo para conexión red pucp. la cual no puede quedar expuesto o visible en la caja.
- Se verifica conexión de red de suministro en baño de niños.
- Se encuentra humedad en muro en los ductos, se solicita realizar las respectivas pruebas para asegurar las perfectas conexiones.
- es necesario hacer modificación en la parte del suelo de la caja final (cañuela).
- se debe hacer reparación de placa en la caja final.

Norma

Escaneado con CamScanner

- Se solicita nivelación de cajas
- Se realiza instalación de monto en zona primaria

AP 28/oct/2020 11:35 am

29 de octubre Jueves
- Se continua con labor de relleno en recebo y su compactación
- Se continua con acondicionamiento de las cajas de inspección
- Se recuerda utilizar separadores en la malla electrosoldada antes de fundir, ya sean Panelas o separadores plásticos

AP 28/oct/2020

Viernes 30 de octubre 2020.
⇒ Se realiza relleno en cancha.
→ Se realiza excavación para meter tubería PVC.
→ Se hacen observaciones de humedades en baño
→ Se solicita prueba de presión.
→ Se continua con impermeabilización en zona Bloque Nuevo.

AP 30/oct/2020

Escaneado con CamScanner

11

Sabado 31 de octubre 2020.

- se realiza corte de Adoquin en patio (Pasillo).
- se continua con Impermeabilización bloque Nuevo

AB/31/oct/2020

Martes 03 de ~~octubre~~ 2020 Noviembre.

- se instala tubería pvcp en pasillo

AB 3/Noviem/2020

Miercoles 04 Noviembre de 2020.

- se hace relleno de material sobre tubería Pvcp.
- se destapa ventilación en Baño de niños. en Muro

AB 04/Nov/2020

Jueves 05 Noviembre de 2020.

- se hace, polida de Muro de ingreso en Baño niños
- se inicia prueba de presión
- se hace corte de Adoquin en pasillo
- se debe realizar el reparación de la ventilación del Baño de forma correcta.

Norma

Escaneado con CamScanner

Jueves 05 de Noviembre

- Se funde placa en la excavación perimetral de 7cm Aproximados

Ricardo Hernandez

Viernes 06 de Noviembre

- NO se realizaron las muestras de concreto como se solicito el dia 05 de noviembre, el cual era un requisito para autorizar la fundida en concreto de la excavación Perimetral.
- Se solicita retirar toda la capa del material que se vio afectado por la lluvia, no se aceptara que se retire por partes, se debe retirar de forma completa, para garantizar la uniformidad del material.

Ricardo Hernandez.

- Se realiza Pañete solare ~~(los muros)~~ el muro al acceso de los buses
- Se continua con labor de instalación de

Norma

Escaneado con CamScanner

Bil de aluminio.

Lunes 9 de Noviembre 2020.

- se realiza corte en muro para redes electricas en Baño de niños.
- se evidencia humedade en Baño de niños costado Sur Orinales.
- se evidencia perdida de presión en red hidraulica.
- Se recuerda que la ventilación en Baño de niños costado Norte se debe realizar con los Accesorios que hay en el mercado ya que el día de hoy ya estaban tapando sin realizar el respectivo cambio.
- La tubería pvcp 1" que esta en el pasillo tiene accesorios en donde la soldadura esta fracturada por la posición del accesorio y la tubería.

Bs 09/ Noviembre/2020

MARTES 10 DE NOVIEMBRE 2020

- SE HACE ARREGLO EN LA TUBERIA DE 1" DEL PASILLO. SE SOLICITA A INTERVENTORIA AUTORIZACION PARA RELLENAR Y FUNDIR

Norma

Escaneado con CamScanner

PLACA DEL PASILLO.

- SE INICIA LA REPARACIÓN EN TUBERIA DE REVENTILACIÓN EN BAÑO DE NIÑOS.

Ricardo Hernandez

MIERCOLES 11-NOVIEMBRE/20.

- SE DEJA EN OBRA. TABLETAS DE PISO. PARA APROBACIÓN POR PARTE INTERVENTORIA.
- SE CONTINUA FUNDIDA PISO. Y SE DEMAS ELEMENTOS CONCRETO.
- SE INICIA LABORES ELECTRICAS.

Ricardo Hernandez

Jueves 12 de Noviembre

- Se continua con fundido de piso en la excavación Perimetral
- Se realiza retiro de recebo afectado por la lluvia
- Se realiza el cubrimiento de la tuberia de ventilación.

Norma

Escaneado con CamScanner

13 #

Se aprueba tableada de 6.5mx 26cm y tablr. 1
de 7cm x 23.7cm todo mas oscuro
Ricardo Fernandez Juan Carlos A.

Viernes 13 de Noviembre 2020.

Se hace llamado de atención al contratista por demoras en la ejecución de actividades en fundidas de piso en Baño de niños y cancha ya que la demora era el diseño de mezcla para fundir; el día de hoy no se ha realizado fundida y finalmente el concreto sera por mixer.
Se hace elección de piezas para pasillo según elección dela secretaría de educación
se solicita remplazar B200 de cancha.

Martes 17 de Noviembre de 2020
- Se revisa fundida de placa de patio.
Se inicia labor de enchape en pasillo
- Se evidencia fundida en Baños la cual no fue completa

Norma

Escaneado con CamScanner

portal razón en las zonas perimetrales de los baños se ve la falta de concreto donde las redes sanitarias estan expuestas.

Miercoles 18 de Noviembre

- se continua con la instalación de adoquín en la excavación perimetral
- se realiza cerramiento de preventivos

Ricardo Hernandez

Jueves 19 de Noviembre. de 2020.

- Se realiza enchape de pasillo.
- Se inicia afinado de piso en baño de niños.

Viernes 20 de Noviembre de 2020.

- se hace enchape de pasillo, afinado de cajas en baño de niños por condiciones de niveles.

Norma

Escaneado con CamScanner

se determina dejar ingreso con cartel en granito.

Lunes 23 de Noviembre de 2020

Se realiza testero para mesones de Baño de niños
se continua con enchape en pasillo
No se realizan trabajos de impermeabilización de cubiertas.

Martes 24 de Noviembre de 2020

Se continua con enchape en pasillo.
Se funden mesones de Baño de niños
Llega enchape para baños.
No se evidencia trabajo en cubiertas impermeabilización.

Norma

Escaneado con CamScanner

Miercoles 25 de noviembre

- Se inicia instalación de enchape de muros en los baños
- Se registra llegada de insumos
- No se evidencia trabajo en cubierta
-

Ricardo Hernandez

- LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN CUBIERTA (REMATES) NO SE HAN PODIDO REALIZAR POR MAL CLIMA

Ramon Ponce A.

Jueves 26 de noviembre

- Se continua con instalacion de enchape de muro en el baño de niños
- Se realiza retiro de parte de la Placa que se fundio en el baño de niños se realizara martelo para instalación de Piso en el baño de niños

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 27 de Noviembre

- Se continua con instalación de enchape de muro en los baños
- aun no se realiza la reparación de la placa en la parte posterior del colegio que se rompio para ubicar la caja de inspección
- no se realizan trabajos de impermeabilización de cubierta.

Ricardo Hernandez 10:51 am

Sabado 29 de noviembre

- Se emboquilla el enchape de muro en los baños

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

Lunes 30 de Noviembre
- Se aplica mezcla de granito sobre las juntas de los lavamanos

Ricardo Hernandez

Martes 01 de Diciembre
- se inicia instalación de medio canal prefabricado.

- aún no se funde placa en la parte posterior del alegio

Ricardo Hernandez

Sábado 5 - Dic/Diciembre/20.

- SE INICIA INSTALACIÓN DE TABLETA PISO EN BAÑOS.

Escaneado con CamScanner

Lunes 7-Dic/20.

- SE CONTINUA. INSTALSE TABLETAS DE PISO.
- SE CONTINUA INSTALACION MEDIACAÑAS Y PULIDAS. MESADAS EN GRANITO.
- SE FUNDE TABIS 70 x 70.

Miércoles 9/20 (Dic)!

- SE CONTINUA. INSTALACION TABLETAS PISO.
- SE RESANAN REMATES. IMPERMEABILIZACION PENDIENTE.
- Instalación de marcos de tapas de inspección

Norma

Escaneado con CamScanner

Jueves 10 de Diciembre

- Polido de media caña y mesones de lavamanos
- Emboquillado de enchape de muros

Ricardo Hernandez

Viernes 11 de diciembre

- Enchape base muros mesones
- Emboquillar media caña.

Ricardo Hernandez

Sabado 12 de diciembre

- Enchape bases muros de lavamanos

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

17

Lunes 14 de Diciembre
- Se hace instalacion de sanitarios
- Resane de techos.
- Instalacion de tapas cajas.

Ricardo Hernandez

Martes 15 de diciembre
- Se realiza embequillado de muros y sanitarios. aplicacion de sellante de los resanes de tuvanos.
- corte dilatacion tapa en concreto de caja de recoleccion de Aguas
- Pintura de techo

Miercoles 16 de diciembre
- Se continua con labores de remate de enchape y modulo cash
- Se registra llegada de los orinales
- Se encuentra sin realizar la instalacion de piso en el baño de ninos

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

Jueves 17 de Diciembre

- Se realiza reparación de bajantes de los orinales ya que se habían realizado con orinales con sifón y no fijos como los que van a instalar

- Se inicia la instalación de las divisiones en los baños

Ricardo Hernández

Viernes 18 de Diciembre

- Se realiza la instalación de los orinales en los baños de niños

Ricardo Hernández

Norma

Escaneado con CamScanner

18 E

Lunes 21 de Diciembre de 2020

Se hace firme piso en baño de niñas.
se hace instalación de soportes en divisiones de Baños.
Se hace instalación de divisiones en orinales

MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 202
SE INSTALAN LAMPARAS LUMINARIAS EN BAÑO
-Se instalaron luminarios
-Se realizo instalación de piso en el baño de niñas

Ricardo Hernandez

Norma


Escaneado con CamScanner

6.6 BITACORA I.E.D AGUSTIN FERNANDEZ


I.E.D. AGUSTIN FERNANDEZ.

VIERNES 23-OCTUBRE/20.

INICIO ACTIVIDADES.
DESPEJE AREA A INTERVENIR.



SABADO 24-OCTUBRE.
DOS TRABAJADORES.
SE CONTINUA DESPEJE MURO.
RETIRO MOBILIARIO DE ACOPIO
COSTADO MURO.




LUNES 26-OCTUBRE.
3 TRABAJADORES.
INICIO EXCAVACION DESPEJE.
NIGA CIMENTACION



Escaneado con CamScanner


MARTES 27-OCT/20.

SE CONTINUA EXCAVACIÓN PARA DESPEJE CIMENTACIÓN E INTERVENIR.




MIERCOLES 28OCT/20.

- CONTINUA EXCAVACIÓN DESPEJE. VIGA CIMENTACIÓN. Y APERTURA AREA DE TRABAJO.



VIERNES 30 OCT/20.

- REPLANTEO. RESPECTIVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN VIGA CIMENTACIÓN.
LIMPIEZA VIGA CON ÁCIDO MURIÁTICO.
RETIRO ESCOMBRO AREA TRABAJO.



Escaneado con CamScanner

SABADO 31-OCT/20.

PERFORACIONES VIGAS PARA DOVELAS. ACERO 3/8".

- ADICIONAR UN VIGUETE MIXTO.
- INICIO ANCLAJE ESTRIBOS.

SE ACORDO CON INTERVENTORIA LA DEMOLICION DE L MURO. QUE PRESENTA GRIETAS. TRASVERSAL.

MARTES 3 NOVIEMBRE.

- ADECUACION TUBERIA ELECTRICA
- DEMOLICION COLUMNETAS EN LADRILLO. (MITAD) PARA INSTALACION DE ESTRIBOS. ANCLAJES. PARA FUNDIDA EN CONCRETO
- Se tiene programado fundir el dia de mañana una seccion de la viga, la cual sera con concreto mezclado en el sitio, Por lo cual

Norma 3

Escaneado con CamScanner

Se solicita al contratista Presentar el diseño de mezcla, sin este no se autoriza la Fundido.

Ricardo Hernandez 4:13 Pm

~~(Jueves)~~ 04 de Noviembre Miercoles
- se continua con instalación de flejes para anclajes entre muros y muro, de igual forma se instalan los flejes de las columnas

Ricardo Hernandez

Jueves 05 de Noviembre
- se realizan los flejes de anclaje y se instala la brida de anclajes para armar los flejes

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 06 de Noviembre

- Se continua con instalación de flejes para anclaje de viga y muro,
- Se instala varilla de amarre.

AB 06/11/2020

Sabado 07 de Noviembre 2020.

- Se continua con instalación de flejes para anclaje de viga a muro.
- Se instala varilla en vigas y Columnas

AB 07/11/2020

Lunes 09 de Noviembre 2020

- Se continua con perforaciones para anclajes de vigas y Columnas
- Se figura Acero.
- Se recuerda la necesidad del diseño de mescla para fundida de vigas y Columnas.

AB 07/11/2020.

Escaneado con CamScanner

MARTES 10-NOV/20.

- SECCIONES CON ENCOFRADO. VIGS.
- DEMOLICIÓN COLUMNETAS EN LADRILLO.

Ricardo Hernandez

MIERCOLES 11/NOV/20.

- ARMADO ESTRIBOS VIGS Y COLUMNETAS.
ALISTADO ENCOFRADO.

Ricardo Hernandez

JUEVES 12-NOV/20.

- SE HACE APLICACIÓN DE ADITIVO SIKADUR 32 PRIMER PARA ADHERENCIA CONCRETO ENDURECIDO CON CONCRETO FRESCO.
- SE INICIA FUNDIDA VIGA DE CIMENTACIÓN
- SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (CILINDROS)

Ricardo Hernandez

Paola Ponce A.

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 13 de Noviembre de 2020.

- Se realizan testeros para seguir con fundida.
- Se autorizan Labores para fin de Semana

Martes 17 de Noviembre de 2020.

- Se realiza revisión de amarres en Columnas y se autoriza fundida. teniendo en cuenta el siguiente criterio:
Ya que el muro esta desplomado, es necesario que en aquellas zonas donde el desplome sea mayor a 5cm. se haga una reparticion y la Columna quede en cuña apoyada en la Viga decimentacón.

- Se reviza acero amarado el día Lunes 16 de Noviembre.

Norma

Escaneado con CamScanner

Miercoles 18 de Noviembre del 2020

- Se continua con formaleteo para las columnas del muro, para fundir en cuadro

Jueves 19 de Noviembre del 2020.

- Se realiza amarre de columnas y testereada para fundida, se toman medidas para ubicación de testeros según despiome de muro.
- Se está a la espera de material granular para fundir columnas.

Viernes 20 de Noviembre del 2020.

Se continua con amarre de columnas y vigas.
Se realizan anclajes para Viga cinta.
Se está a la espera para ingreso de material granular ingreso por puerta provisional costado oriental.

Escaneado con CamScanner

Sabado 21 de Noviembre. 2020.

Se realiza fundida de columnas las cuales se autoriza.
Se solicita el vibrador para las fundidas para evitar el hormigueo de las zonas a fundir

Lunes 23 de Noviembe 2020.

Se realiza armado de Refuerzo de Viga y armado de Columnas.
Se esta a la espera de material, Acero y Epoxico para continuar con labores

Martes 24 de Noviembe 2020
Llega Material Acero para vigas y columnas.
Se tesbera. Viga para fundida.
Luis Enrique Tsorde

Escaneado con CamScanner

Miercoles 25 de Noviembre de 2020

- Se realiza fundida de Vigas el día 24, se recomienda realizar afinado de Viga superficial por lluvias.
- Se realizan anclajes para viga y columnas.
- Se solicita destapar zona Norte del Muro para Confirmar si hay viga para columna final
- Se Solicita Esquema que a la fecha no se ha realizado para la terminación del Muro.

Jueves 26 de Noviembre de 2020

- Se realiza zapata en costado Norte del muro donde
- Se realiza anclaje del acero del costado oriental y las del costado occidental se hace parrilla.
- Se Continua Con anclajes en vigas y en columnas.
- Se Continua Con armame de acero para columnas y Vigas
- Se solicita esquema de Columa final que a la fecha no se ha realizado y ya esta ejecutada en Viga Principal

Norma


Escaneado con CamScanner

Maites 01 de Diciembre 2020.

Se inicia Retiro de malla ella el costado oriental se solicita Herramienta ya que el personal ha perdido dos dias en los cuales no se ha ejecutado actividades representativas.
Se solicita acompañamiento de vigilancia por desmonte.

9/12/2020 10:05 pm

MIERCOLES 2-DIC/20.

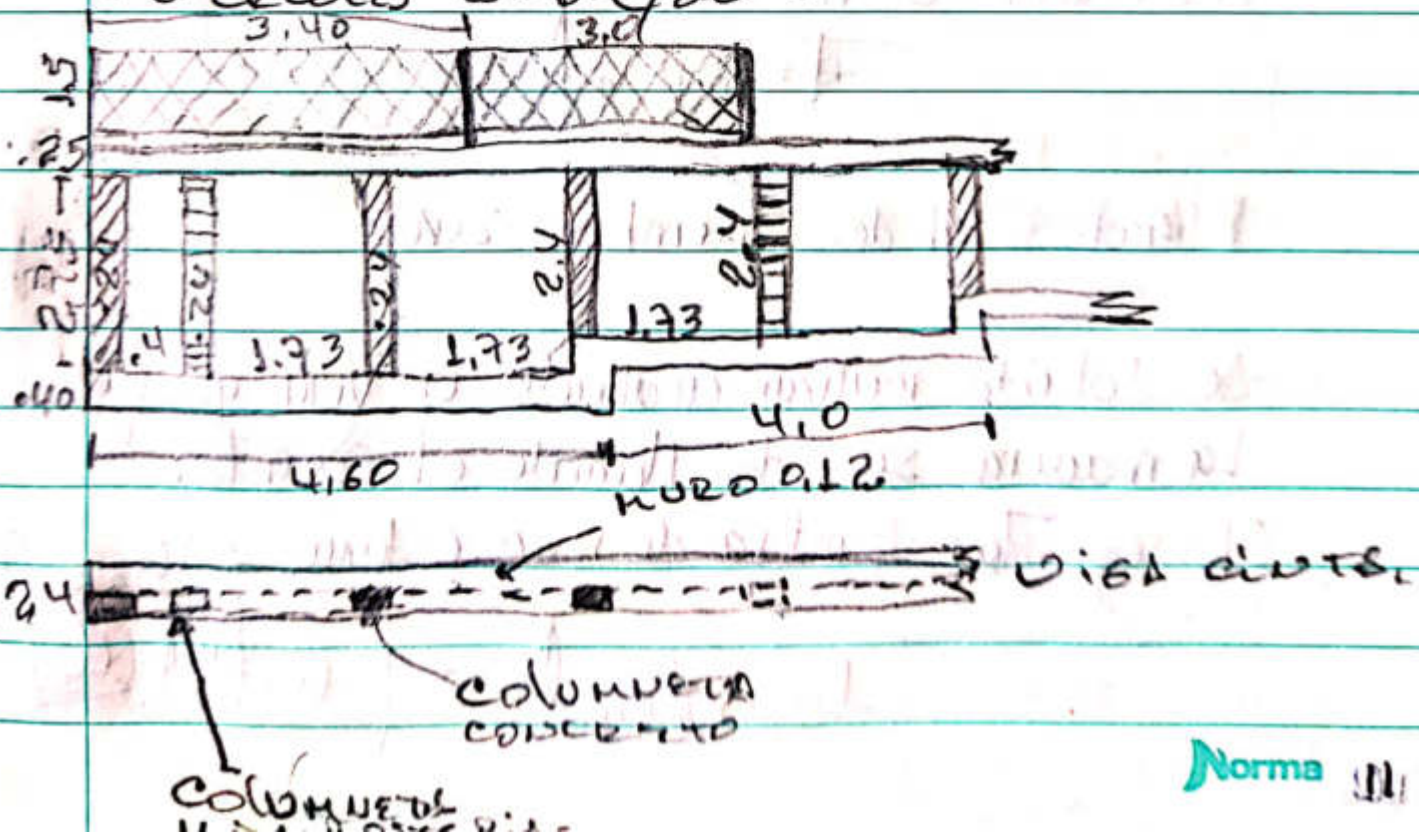

Norma

Escaneado con CamScanner

Jueves 03 de Diciembre 2020.

Se hace fundida de columnas y se hace armare de Acero para Columna final.
Se solicita acabado de Viga inferior, Propuesta para determinar entrega.

Viernes 04 de Diciembre 2020.

Se Continua con figuración de viga superior
Ingresa personal para Ornamentación para Cerramiento de malla

Miercoles 09 de Diciembre 2020.

Se Solicita realizar acabado en Viga ya que La madera se esta llevando el concreto.
Presupuestar Pintura de muro externa.

Norma

Escaneado con CamScanner

Jueves 10 de Diciembre 2020.

Se hace acabado de liga parte externa el cual queda autorizado.
Se solicita el detalle de la columna final ya que a la fecha no se ha realizado.
Se solicita iniciar con arreglos locatuos del Acta de vecindad teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato.

Viernes 11 de Diciembre 2020.

Se solicita aplicar 1. capa de anticorrosivo a los postes correspondientes al cerramento en malla ya que al estar incrustados en el concreto y en contacto con el acero provocara un par galvánico y se producuran postventas.

LOS POSTES YA TIENEN ANTICORROSIVO NEGRO.

Escaneado con CamScanner

Lunes 14 de Diciembre 2020.

Se revisa armado, testereado y fundido de vigas y columnas.
Se solicita sacar muestras de concreto para realizar pruebas respectivas.

MARTES 15 DE DICIEMBRE 2020
- SE FUNDIO VIGA DE AMARRE.
- TESTEREADA VIGA DE AMARRE.
- DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA
- ?

- MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE 2020
- AFINADO DE VIGA
- DESENCOFRADO DE VIGA

- JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020
- MAMPOSTERIA
- DESENCOFRADO DE VIGAS
- RETIRO DE MADERA DE SOPORTE

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 18 de Diciembre de 2020.

Se termina muro en mampostería.
se realiza amarre de acero para viga aerea.
Serealiza amarre de acero columnas.
Se hace retiro de material de obra.
Se realizan anclajes de Acero con epoxico a muro existente:

Lunes 21-Dic/20.

- DESENCOFRE ULTIMO TRAMO - VIGA.
CINTAS.
- DOMINGO SE INICIO INSTALACION MALLA ESTRUCTURAL.
- A la fecha no se han sacado los muestras de concreto del colegio
- A la fecha no se ha presentado detalle de la terminación de la columna y el muro.
- Ingresa pintura para muro color Azul.

Escaneado con CamScanner

Martes 22 de Diciembre de 2020

Se hace instalación de Cerramiento faltando un modulo.
Se Solicitan correcciones de soldaduras en Cerramiento
Se inicio pintura de muro externa al colegio
Se solicita Limpieza de cancha fogueada por pintura de modulos de Cerramiento.

NOTA: NO SE HA REALIZADO ACTIVIDADES DE ACTA DE VECINDAD, NO SE HAN CORREGIDO REDES ELECTRICAS LAS CUALES DEBEN QUEDAR COMO SE ENCONTRARON. Y ESTO RETRASA LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA DEL COLEGIO.
22/Diciembre/2020

MIERCOLES 23/12/20
- SE HACE INSTALACION DE REDES ELECTRICAS

Norma

Escaneado con CamScanner

6.7 BITACORA I.E.D DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

I.E.D. DOMINGO FAUSTINO

MARTES 17 DE NOVIEMBRE/20.

- SE RECIBE ESTRUCTURA - (CORREAS). EN OBRA. Y SE APLICADO DOS MANOS DE PINTURA. BLANCO ESMALTE.

MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE/20.

- SE INICIA INSTALACIÓN SOPORTES. SOLDADO ESTRUCTURA EXISTENTE.
- Se solicita detener actividades de altura ya que no se cuenta con andamios certificados, hasta no contar con estos no se autoriza continuar con las actividades de trabajo en alturas

Ricardo Hernandez

Escaneado con CamScanner

Jueves 19 de Noviembre del 2020
- Se reanuda actividades ya con andamios certificados
- Se continua con instalación de soportes en la estructura existente

Ricardo Hernandez

Viernes 20 de Noviembre del 2020
- Se continua con instalación de soportes en la estructura existente
- Se inicia instalación de estructura metalica

Ricardo Hernandez

Sabado 21 de Noviembre
- Se continua con instalación de estructura metalica e instalacion de soportes soldados a la estructura existente
- Se continua con desmonte de cielo raso en el mezzanine

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

Lunes. 23 de Noviembre del 2020.

Se continua con instalación de estructura metalica
se realizan respectivos anclajes.
se rectifican anclajes expansivos y soldaduras.

Martes 24 de Noviembe del 2020.

- Se Rechican pinturas en estructura y se mica pintura en estructura existente.

Ricardo Hernandez

Miercoles 25 de Noviembre
- Se registra acopio de material para los techos tipo sandwich
- se inicia desmonte de teja canaleta 71 90

Ricardo Hernandez

- JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
- Se realiza pintura de estructura de cubierta (cerchas) y estructura nueva.

Ricardo Hernandez.

Escaneado con CamScanner

Viernes 27 de Noviembre del 2020
- Se continuara con labor de pintura sobre estructura metalica

Ricardo Hernandez

Sabado 28 de Noviembre
- Se continua con desmonte de teja y se inicia instalación de teja tipo sandwich

Ricardo Hernandez

Lunes 30 de Noviembre
- Se realiza desmonte del teja de asbesto y se realiza instalación de teja tipo sandwich, la actividad se realiza por tramos

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

Martes 01 de diciembre del 2020

- se continua con desmonte de teja de asbesto y se realiza su acopio en la parte posterior del colegio
- se realiza la instalación de la teja tipo sandwich.

Ricardo Hernandez

Miercoles 02 de diciembre

- se continua con instalación de teja tipo sandwich

- se realiza observación de protocolos de seguridad para la disposición de residuos toxicos como traje completo, mascara y lentes de protección

Ricardo Hernandez

Norma

Escaneado con CamScanner

Jueves 03 de diciembre
- Se realiza el retiro de material teja
- Se continua con instalacion de tejas tipo sandwich.

Ricardo Hernandez

Jueves 10 de Diembre de 2020

Se trabaja el fin de semana completando actividades relacionadas a la instalación de la cubierta.
Se verifican anclajes y soldaduras las cuales estan pintadas a la fecha.
Se solicita Aseo en toda el Área intervenida.
es necesario ajustar las redes electricas para dejarlas como estaban.
en la parte esterior de la cubierta se deben hacer ajustes enviados al grupo de whatsapp.
Se solicita Información Con respecto al Hanche del costado sur ya que no se cambia

Norma
Escaneado con CamScanner

26 DE DICIEMBRE 2020

- SE REALIZA LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN LA CUBIERTA, Y SE INSTALAN LOS FLANCHES ADICIONALES SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA

Norma

Escaneado con CamScanner

6.8 BITACORA I.E.D FRIEDRICH NAUMANN

J.E.D. FRIEDRICH NAUMAN

MIERCOLES 25-NOV/20.

- INICIO DESMONTAJE ESTRUCTURA TECHO FALSO - RETIRO CORTELERAS Y TABLEROS.

JUEVES 26-NOV/20.

- INICIO PAÑETES MUROS DUROS.
- SE CONTINUA RETIRO ESTRUCTURA TECHO FALSO

VIE

Martes 01 de Diciembre.

Llegada de estructura metalica para cubierta, se continua con pañete en Salon Sur.

2 personas realizando labores.

Norma

Escaneado con CamScanner

Miercoles 02 de Diciembre 2020

Se inicia desmonte de Cubierta en Salones.
Se realiza recorrido de obra y se solicita trabajos en lo bano extendido para cumplir con el tiempo del Contrato

Jueves 03 de Diciembre 2020
Se inicia instalacion de estructura metalica.
se Sopire ventana en la parte oriental por debajo de la viga realizando apoyos ya que la vigeta quedaria en Voladizo.
Se solicita detalle o Esquema planteado para la ejecución de obra.

Viernes 04 de Diciembre 2020

Se Continua con instalación de estructura metalica
se Continua con Paneles en muro de Salones

Escaneado con CamScanner

Mercdes 09 de Diciembre 2020

- se hace retiro de teja en escaleras y en Balcon.
- se hace la instalación de la estructura metalica en un 90%
- se inicia labor de filas de vigas.
- se hace recomendación a personal por no tener elementos de protección personal.

Jueves 10 de Diciembre 2020.

- Se hace instalación de estructura metalica 100%
- Se Continua con filas de vigas.

Viernes 11 de Diciembre 2020

- Se Continua con actividades como filas y Componentes de estructura metalica
- Se Continua con paretes Normales en Salones.

Escaneado con CamScanner

Lunes 14 de Diciembre 2020

- Se instalan templetes de estructura metalica
- Se inica labor de paredes impermeabilizadas con Sika 1.
- Se encuentra una persona electrica, realizando labores en el Colegio

Martes 15 de Diciembre 2020.

- Se realiza labor de pared impermeabilizado en segundo salon.
- Se recuerdo que el pared del muro oriental es hasta arriba.
- Se autoriza. Cambio de tablero a 2K.

Miercoles 16 de Diciembre 2020.

- Se continues con filas para instalación de alberta
- Se continua con pared muro oriental salon 1 y 2.
- Se realiza Cambio de tablero electrico

Norma

Escaneado con CamScanner

Jueves 17 de Diciembre de 2020.

- Se realiza Cableado de tablero.
- se realiza pintura de salon 1 en estructura metalica
- se continua con pisos.
- se hace retiro de Drywall.
- se continua con pared impermeabilizada.
- personal en obra 4 personas

Viernes 18 de Diciembre de 2020.

- Se Continua Con pintura de estructura metalica salon 2
- se instala estructura metalica en escaleras sin anticorrosivo para lo cual se hace llamado de Atención.
- se continua Con pared impermeabilizada en Salon 3.
- A la fecha no se ha iniciado instalación de teja ya que no ha llegado al colegio.
- personal realizando labores 5 personas

Escaneado con CamScanner

Lunes 21 de Diciembre de 2020.

- Se continua labor de pañete impermeabilizado
- Se inicia actividad de estuco en salon 1.
- Se aben ventanas en salones según solicitud
- Se hace instalación de fibra mt 1% avance 80%.
- Se solicita por el Grupo de la SED a la Arq Carol Nieto apertura del salon de sistemas para realizar empalmes del tablero electrico.
- Se solicita retiro de material sobrante del colegio
- Se hace llamado de atención por Agua que se riega en salon por dejar llave abierta teniendo en cuenta que pueden haber filtraciones las cuales afecten el primer piso las cuales son responsabilidad del contratista.

- No hay personal trabajando en obra hoy.
- No ha llegado la teja al colegio.

Norma

Escaneado con CamScanner

Martes 22 de Diciembre de 2020.

- Se realizan filos en Ventanaria realizada en Salon 3.
- A la fecha no se ha instalado Ventaneria.
- Primer Salon Costado Norte Pintado en Blanco.
- Segundo Salon en estuco.
- hace falta instalación de tuberia mt para red de Audio
- A la fecha y hora (22/12/2020 – 11:30 am) No ha llegado materia/ de cobierta.
- No hay personal realizando labores en cobierta del colegio.

MIERCOLES 23 DICIEMBRE/20.

- SE CONTINUA ESTUCO Y PINTURA.
- FILOS Y DILATACIONES.

Norma

Escaneado con CamScanner

Lunes 28-Dic/20.

- Secciones. Instalación Tets.
  Pinturas estructuras.
- Estuco y pinturas.
- Instalaciones Eléctricas.

.

Norma

Escaneado con CamScanner

7. RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO.

ITEM	NOMBRES DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO	7176318	DIRECTOR DE OBRA
2	DIANA ANDREA GAONA ÁVILA	40048703	RESIDENTE DE OBRA
3	LUIS EDUARDO VARGAS	19465056	RESIDENTE DE OBRA
4	LIDA MAYERLY DIAZ PIRAZAN	53132223	ING. AMBIENTAL
5	FRANCY LORENA TORRES ARIZA	1024528508	COORD. SST
6	JOSUE OMAR POVEDA PRIETO	80365964	OFICIAL
7	RODRIGO MESA RINCON	80743374	OFICIAL
8	JEAN CARLOS LEAL RODRIGUEZ	1032513089	AYUDANTE
9	JHONY SEGUNDO PEREZ RODRIGUEZ	1032513107	AYUDANTE
10	JORGE LEONARDO ARDILA MORA	1007045283	AYUDANTE
14	LUIS JAMIE RUIZ MOZO	7179305	OFICIAL
16	JORGE MARIO YEPES	1003716143	AYUDANTE
17	ELBIS MARTINEZ	73139451	OFICIAL
18	LUIS ANTONIO PEREZ	4211782	OFICIAL

8. INFORME SG-SST

15-1-2021

INFORME FINAL DE GESTIÒN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por: Francy Lorena Torres Ariza
CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

Contenido

INTRODUCCIÓN....3
ALCANCE....3
OBJETIVOS....3
Objetivo General....3
Objetivos específicos....4
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....4
Tabla 1. Identificación del proyecto....4
RELACIÒN DE PERSONAL....5
RELACIÒN TOTAL DE PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO....5
RELACIÒN DETALLADA DE PERSONAL DIRECTO DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO....5
RELACIÒN DE PERSONAL SUB CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO....6
RELACIÒN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS....7
RELACIÒN DE VEHICULOS....7
ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD....7
INDICADORES SST....8
Frecuencia de accidentalidad....8
Severidad de accidentalidad....8
Ausentismo por causa médica.....8
RELACIÒN DOCUMENTAL DEL PERSONAL....8
INGRESO DE PERSONAL....8
EGRESO DEL PERSONAL....8
RELACION ENTREGA DE CARNET....9
RELACION DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....10
IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE PAPSO....11
INFORMES DE GESTION MES A MES....14
ANEXOS FOTOGRAFICOS....14
BIOSEGURIDAD....14
TOMA DE TEMPERATURA....15
ASPERSION EN AREAS DE TRABAJO....16

ASPERSION EN PERSONAL 17
USO IDONEO DE EPP 19
SEÑALIZACIÒN 20
INDUCCIONES Y CAPACITACIONES 21
BIOSEGURIDAD 22
BIENESTAR LABORAL 24
INSPECCIONES 24
ANEXOS DOCUMENTALES DEL PERSONAL 26
AVAL 26

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene toda la información referida a la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollada durante el 27 de agosto al 26 de diciembre de 2020 dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en contrato de obra denominado:

“Bu-Proy Mejoras Sed, Grupo 7 Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.

En este, se describen las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas de acuerdo con los pliegos de condiciones y/o términos de referencia de SST y un registro fotográfico de las actividades adelantadas por nuestra compañía.

ALCANCE

Consorcio Colegios Santa Fe SAS a través de la elaboración del informe de Seguridad y Salud en el Trabajo relaciona y describe las actividades implementadas durante el periodo comprendido entre el 27 de agosto al 26 de diciembre de 2020, con el fin de dar Cumplimiento A Las Obligaciones Establecidas En El Contrato

“Bu-Proy Mejoras Sed, Grupo 7 Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.

OBJETIVOS

Objetivo General

Presentar el informe, que contiene las actividades, acciones, programas y herramientas empleadas para el desarrollo y aplicación del área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de los trabajos contratados.

Objetivos específicos

- Presentar los documentos soporte de la información obtenida en campo, incluyendo Pagos de seguridad social al día, conceptos médicos ocupacionales, inducciones a los trabajadores, y otros registros de gestión desarrollados durante el periodo evaluado.

- Presentar las medidas de manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas durante el período mostrado en este informe.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Tabla 1. Identificación del proyecto

Contrato Numero	CO1.PCCNTR.1577681-2020
Objeto del Contrato:	"Bu-Proy mejoras sed, grupo 7 adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.
Localización:	**Usaquén Aquileo Parra Sede A - Aquileo Parra** **Sede A - Colonia Vacacional De Usaquén** **Friedrich Neumann Sede B - El Codito** **Agustín Fernández Sede A - Agustín Fernández** **Sede A - Domingo Faustino Sarmiento** **Sede A - República De Panamá** **Sede B - Avenida Chile** **República De Panamá Sede C - Simón Bolívar**

Interventoría:	Andrés Martínez

RELACIÒN DE PERSONAL

RELACIÒN TOTAL DE PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO

EVENTO	PERIODO	ACUMULADO
Número Total De Trabajadores	28 De agosto Al 26 De diciembre	37
Número Total Trabajadores Directos Consorcio Colegios Santafé	28 De agosto Al 26 De diciembre	15
Número Total Trabajadores Sub Contratistas	28 De agosto Al 26 De diciembre	22

RELACIÒN DETALLADA DE PERSONAL DIRECTO DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA
1	Jean Carlos Leal Rodríguez	1032513089	Ayudante	07-09-2020	23/12/2020
2	Arbey Gaitán Zúñiga	79630005	Ayudante	07-09-2020	15/11/2020
3	Francy Lorena Torres Ariza	1024528508	Residente Sst	31 -08-2020	31/12/2020
4	Luis Antonio Pérez Medina	4211782	Oficial	18-09-2020	23/12/2020
5	Jorge Mario Yepes Sariego	1003716143	Ayudante	18-09-2020	23/10/2020
6	Luis Alfredo Samudio García	6766038	Ayudante	31-08-2020	10/10/2020
7	Luis Jaime Ruiz Mozo	7179305	Oficial	31-08-2020	10/10/2020
8	Johnny Segundo Pérez Rodríguez	1032513107	Ayudante	07-09-2020	3/12/2020
9	Jorge Leonardo Ardila Mora	1007045283	Ayudante	07-09-2020	31/12/2020

10	Josué Omar Poveda Prieto	80365964	Oficial	31-08-2020	26/10/2020
11	Elbis Martínez Sanmartín	73139452	Oficial	21-09-2020	23/12/2020
12	Oscar González Talero	4210625	Oficial	18-09-2020	19/11/2020
13	Rodrigo Mesa Rincón	80743374	Oficial	31-08-2020	23/10/2020
14	Daniel Alejandro Espino	26811666	Ayudante	07-09-2020	10/10/2020
15	Carlos David Tapiero Ariza	1024591064	Ayudante	07-09-2020	17/11/2020

RELACIÒN DE PERSONAL SUB CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CONTRATISTA	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA
1	Jorge Enrique Vela Ostos	Andrés Casallas	1049646457	Auxiliar De Soldadura	28-10-2020	31/12/2020
2	Edison Ricardo Rodríguez Becerra	Andrés Casallas	80896184	Soldador	28-10-2020	**31/12/2020**
3	José Reyes	Forza Sas	79782465	Ing. Asesor	05 /10/2020	7/11/2020
4	Diógenes Ramírez	Forza Sas	83239119	Maestro	05 /10/2020	7/11/2020
5	Amer Blanco	Forza Sas	1 101444678	Ayudante	05 /10/2020	7/11/2020
6	Edgar Peña	Forza Sas	1101019436	Ayudante	05 /10/2020	7/11/2020
7	Myfriends Blanco	Forza Sas	1.024.037240	Ayudante	05 /10/2020	7/11/2020
8	Francisco Moya	Forza Sas	8138354	Ayudante	05 /10/2020	7/11/2020
9	Pedro León	Forza Sas	80495950	Ayudante	05 /10/2020	7/11/2020
10	Julián Bocanegra	Forza Sas	1106397345	Operador	05 /10/2020	7/11/2020
11	Walter Medellín	Armetalco (Mataza Sas)	80206312	Ayudante	09/11/2020	05/12/2020
12	Nelson González	Armetalco (Mataza Sas)	80800603	Dir. de Proyectos	09/11/2020	05/12/2020
13	Oswaldo Martínez	Armetalco (Mataza Sas)	80140247	Oficial	09/11/2020	05/12/2020
14	Álvaro Ariza	Armetalco (Mataza Sas)	1075625000	Oficial	09/11/2020	05/12/2020
15	Efraín Eslipa	Armetalco (Mataza Sas)	79900993	Ayudante	09/11/2020	05/12/2020
16	Yeison Martínez	Armetalco (Mataza Sas)	1050091799	Ayudante	09/11/2020	05/12/2020
17	Fredy Benites	Armetalco (Mataza Sas)	1070943448	Ayudante	09/11/2020	05/12/2020
18	keiner Ortiz	Armetalco (Mataza Sas)	1016744105	Oficial	09/11/2020	05/12/2020

19	Martha Ricaurte	Armetalco (Mataza Sas)	52384981	Residente Sst	09/11/2020	05/12/2020
20	Carlos Valbuena	Imperplacas Sas	79870409	encargado	13/10/2020	31-12-2020
21	Yassir Trujillo	Imperplacas Sas	1012449970	Ayudante	13/10/2020	31-12-2020
22	Cesar Calle	Imperplacas Sas	80012509	Oficial	13/12/2020	31-12-2020

RELACIÒN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ITEM	MAQUINA	MARCA	LUGAR DE USO
1	Equipo de soldadura	Bauker	Colegios: Panamá sede A y B, Agustín Fernández,
2	Soplete de propano	Fiber glass	Colegio Aquileo Parra
3	Gas propano	AGA	Colegio Aquileo Parra
4	Rotomartillo	BOSCH	Colegio Aquileo Parra, Panamá sede B
5	Pulidora	Maquita, dewalt, Bosch	Todos
6	Taladro	Maquita, dewalt, Bosch	Todos

RELACIÒN DE VEHICULOS

ITEM	TIPO DE VEHICULO	PLACA	USO
1	Carro	MBN 454	Personal
2	Camioneta	BCP 192	Transporte en Obra
3	Moto	GLC 64B	Transporte Personal
4	Moto	YQB79C	Transporte Personal
5	Moto	SZY96E	Transporte Personal

ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

Durante la ejecución del contrato:

“Bu-Proy mejoras sed, grupo 7 adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.

No se presentaron accidentes laborales en todo el periodo de ejecución de las diferentes actividades, aunque los resultados cierran en cero se referencian los indicadores pertinentes.

INDICADORES SST

Frecuencia de accidentalidad.

Fa = (n° de accidente en el mes / n° trabajadores en el mes) *100
Fa= (0 / 19) *100
Fa= 0

Severidad de accidentalidad

Sa= (No de días de incapacidad en el mes + No días cargados en el mes) / (n° trabajadores en el mes) *100

Sa= (0 + 0/19) *100

Sa= 0

Ausentismo por causa médica.

%ATM= (No de días de ausencia por incapacidad en el mes/No de días de trabajados programados en el mes) * 1000
%ATM = (0/19) *100
%ATM =0

RELACIÒN DOCUMENTAL DEL PERSONAL

Durante la ejecución total del Proyecto y en fechas acordes al evento se presentaba una serie de documentos a interventoría los cuales eràn cargados a una carpeta en DRIVE a la que cada integrante tenia acceso, para efectos de entrega final en la parte digital se contara con un carpeta comprimida por cada colaborador en la cual podran encontrar la siguiente informaciòn y como soporte fisico en a-z al presente informe.

INGRESO DE PERSONAL

- ✓ Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social
- ✓ Examen médico ocupacional de ingreso
- ✓ Ficha de ingreso a la empresa
- ✓ Curso para trabajo seguro en alturas (a quien le competa)

EGRESO DEL PERSONAL

- ✓ Carta de remisión a examen de egreso
- ✓ Liquidación laboral por el tiempo laborado en la compañía
- ✓ Examen de egreso ocupacional
- ✓ Paz y salvo

RELACION ENTREGA DE CARNET

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FECHA SALIDA	DEVUELVE CARNET
1	Jean Carlos Leal Rodríguez	1032513089	Ayudante	23/12/2020	X
2	Arbey Gaitán Zúñiga	79630005	Ayudante	15/11/2020	X
3	Francy Lorena Torres Ariza	1024528508	Residente Sst	31/12/2020	X
4	Luis Antonio Pérez Medina	4211782	Oficial	23/12/2020	X
5	Jorge Mario Yepes Sariego	1003716143	Ayudante	23/10/2020	X
6	Luis Alfredo Samudio García	6766038	Ayudante	10/10/2020	X
7	Luis Jaime Ruiz Mozo	7179305	Oficial	10/10/2020	X
8	Johnny Segundo Pérez Rodríguez	1032513107	Ayudante	3/12/2020	X
9	Jorge Leonardo Ardila Mora	1007045283	Ayudante	31/12/2020	X
10	Josué Omar Poveda Prieto	80365964	Oficial	26/10/2020	X
11	Elbis Martínez Sanmartín	73139452	Oficial	23/12/2020	X
12	Oscar González Talero	4210625	Oficial	19/11/2020	X
13	Rodrigo Mesa Rincón	80743374	Oficial	23/10/2020	X
14	Daniel Alejandro Espino	26811666	Ayudante	10/10/2020	X
15	Carlos David Tapiero Ariza	1024591064	Ayudante	17/11/2020	X

RELACION DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha	Temas Tratados	Duración	Instructor	Cargo
31-08-2020	Inducción Sg-Sst	60 min	Francy Torres	Residente SST
07-09-202	Inducción Sg-Sst	60 min		
18-09-2020	Inducción Sg-Sst	60 min		
28-09-2020	Inducción Sg-Sst	60 min		
05-10-2020	Inducción Sg-Sst	60 min		
07-10-2020	Inducción Sg-Sst	60 min		
13-10-2020	Inducción Sg-Sst	60 min		
17-11-2020	Inducción Sg-Sst	60 min		
16-12-2020	Inducción Sg-Sst	60 min		
24-09-2020	Papso	30 min	Francy Torres	Residente SST
18-09-2020	Limpieza Y Desinfección De Epp	30 min		
29-09-2020	Reincorporación Laboral (Alternancia En Actividades)	60 min		
08-10-2020	Orden Y Aseo	30 min		
20-10-2020	Rotación Y Alternancia En Las Actividades	30 min		
04-11-2020	Estilos De Vida Saludable (Pausas Activas	20 min		
Durante todo el proyecto	Toma De Temperaturas Y Desinfección Total En Áreas De Trabajo	30 min		
17-10-2020	Armado De Andamio	60 min		
19-10-2020	Cuidado De Las Manos	30 min		
4-11-2020	Epp Idóneo	30 min		
20-11-2020	Orden Y Aseo	60 min		
17-12-2020	Instalaciones Eléctricas	60 min		

IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE PAPSO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Aplicación de Protocolo de Seguridad para Obras (PAPSO), se realizaban una serie de actividades lideradas por la Residente del área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa la cual tenía una dedicación del 100% del tiempo en las diferentes obras, las actividades desarrolladas eran:

- ✓ Aspersión personal
- ✓ Aspersión áreas de trabajo y herramientas
- ✓ Capacitación e Inducciones
- ✓ Uso de EPP
- ✓ Bioseguridad (elementos)
- ✓ Inspecciones
- ✓ Toma de temperatura

Continuación se realiza una relacion de los elementos adquiridos y suministrados durante todo el periodo con evidencia fotográfica en los diferentes frentes de trabajo.

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	PRESENTACION	FOTOGRAFIA
1	Alcohol industrial concentración del 90%	3	Galones	
2	Gel antibacterial al 70% de concentración	30	500 ml	
3	Jabón liquido antibacterial para manos	60	500 ml	

4	Toallas de papel en empaque individual	160	Paquete x 150 toallas	
5	Frascos dispensadores con splash (para reenvasar alcohol a cada frente de trabajo)	10	Frasco de 1 litro	
6	Juego de dispensador tipo push (para frascos de jabón antibacterial)	6	Dispensador tipo push	
7	Frasco dispensador de alcohol (para cuando se realizaba aspersión en personal, áreas de trabajo, vehículos, maquinas, herramientas y equipos)	1	2 Litros	

8	Juego de embudos (para facilitar el trabajo de reenvasado)	2	Medianos	
9	Termómetro de lectura infrarrojo digital	1	Unica	
10	Traje de bioseguridad enterizo (se entregó a la señorita encargada de SST)	1	Azul oscuro	
11	Tapabocas (este se suministraba a todo el personal para cambio máximo cada dos días)	918 (3x18x17) tapabocas semanales por trabajador X estimado de personal X total semanas laboradas	Azul oscuro	

12	Bolsas para para el resguardo de ropas y uniformes	100	Blancas, negras y rojas	

INFORMES DE GESTION MES A MES

Para control de las actividades del área de seguridad y salud en el trabajo se presentan informes de gestión mensual del día 1 al día 30 (o 31) de cada mes, donde se evidencia control de temas como:

- ✓ Control de personal (ingreso y salidas a corte de entrega de informe
- ✓ Información del contratista cuando aplique y actividades a desarrollar a determinado colegio
- ✓ Detalle de las actividades desarrolladas correspondientes a SST a lo largo de su intervención
- ✓ Índices de accidentalidad o incapacidades que se hayan presentando
- ✓ Evidencias fotográficas de actividades de seguridad industrial en los colegios
- ✓ Evidencias de gestión correspondientes al PAPSO

Para soporte se anexan en el cuerpo de la entrega digital los informes presentados en meses anteriores y anexo en AZ de entrega física.

ANEXOS FOTOGRAFICOS

BIOSEGURIDAD

Para el evento que se esta viviendo a nivel mundial bajo la emergencia sanitaria denominada **SARS-COV-2 COVID – 19** (Coronavirus) y según lo establecido en el **PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN OBRAS (PAPSO)**, se debía realizar una serie de procedimientos que aun que aleatorios (por la cantidad de colegios y de personal distribuidos en diferentes partes de la ciudad) garantizara de manera oportuna y eficaz el control, mitigación y contención de dicho virus en cada frente de trabajo, en dicho protocolo el **CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE** asumió la responsabilidad y compromiso de suplir de manera oportuna e idónea todos los elementos para dar cumplimento al mismo y a su vez garantizar de manera segura en desarrollo de las actividades contratadas. En este tipo de actividades incluimos también a nuestro personal sub contratistas

TOMA DE TEMPERATURA







ASPERSION EN AREAS DE TRABAJO












ASPERSION EN PERSONAL







USO IDONEO DE EPP








SEÑALIZACIÒN












INDUCCIONES Y CAPACITACIONES










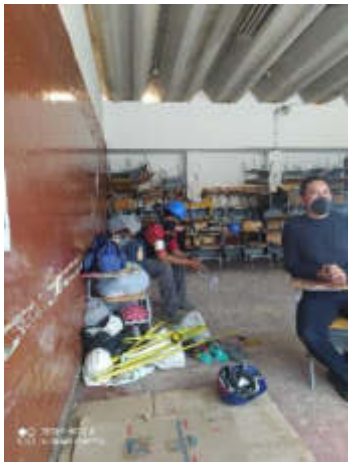

BIOSEGURIDAD

BIENESTAR LABORAL

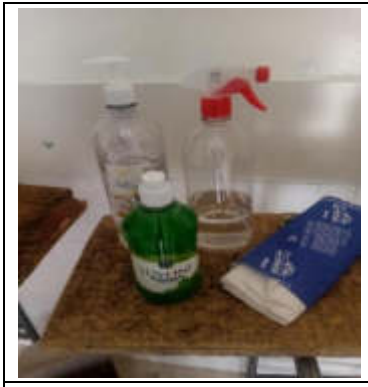








INSPECCIONES






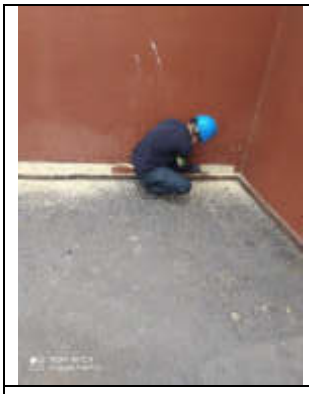


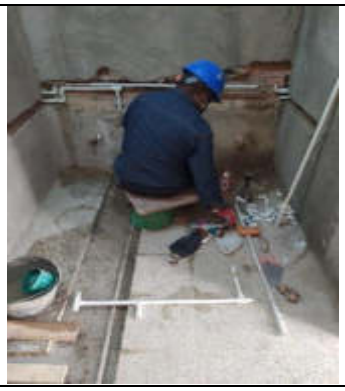



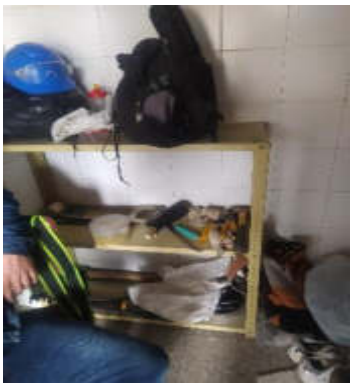



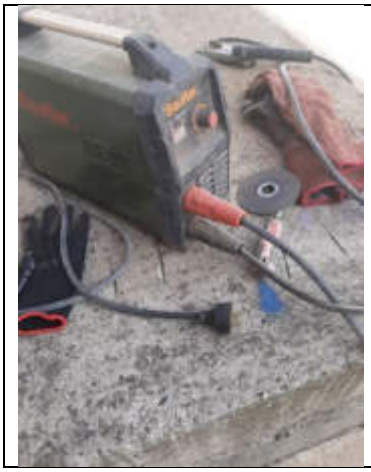



ANEXOS DOCUMENTALES DEL PERSONAL

Para este caso en el correo de envió del presente informe digital se entregará como anexo en el cuerpo del correo todo según se relaciona a continuación.

Carpeta por cada colaborador la cual contiene y en el siguiente orden:

- ✓ Ficha de ingreso a la empresa
- ✓ Cedula
- ✓ Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, AFP)
- ✓ Examen médico ocupacional de ingreso
- ✓ Curso para trabajo seguro en alturas (a quien le competa)
- ✓ Carta de remisión a examen de egreso
- ✓ Examen de egreso ocupacional
- ✓ Liquidación laboral por el tiempo laborado en la compañía
- ✓ Paz y salvo

AVAL

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	FRANCY TORRES	Coordinadora SG-SST	
REVISÓ	RAFAEL ALZATE	Director de Obra	

9. SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14873073
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 N 9 34	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7760872325**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/08/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		722135240

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 312.500
SUBTOTALES:													**$ 312.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 312.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 14873073	QUINTERO CORZO JOSE	INDEPEND	PENS VEJ ACT	$ 5.000.000				NO								01-30												$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0																	

TOTAL	**$ 312.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14873073
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 N 9 34	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7764455796**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	743054425

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 312.500
SUBTOTALES:													**$ 312.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 312.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 14873073	QUINTERO CORZO JOSE	INDEPEND	PENS VEJ ACT	$ 5.000.000				NO								01-30												$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 312.500**

Planilla Pagada

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9001564 correspondiente a la empresa Consorcio Colegio Santa Fe.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
LUIS SAMUDIO GARCIA	C.C.	6.766.038	28/08/2020
LUIS RUIZ MOZO	C.C.	7.179.305	28/08/2020
LUIS VARGAS LOPEZ	C.C.	19.465.056	28/08/2020
DIANA GAONA AVILA	C.C.	40.048.703	28/08/2020
ARBEY GAITAN ZUNIGA	C.C.	79.630.005	03/09/2020
PEDRO LUIS ARIZA SAABVEDRA	C.C.	80.281.528	03/09/2020
JOSUE POVEDA PRIETO	C.C.	80.365.964	28/08/2020
RODRIGO MEZA RINCON	C.C.	80.743.374	28/08/2020
FREDY DIAZ SANCHEZ	C.C.	1.000.806.000	28/08/2020
JORGE LEONARDO ARDILA MORA	C.C.	1.007.045.283	03/09/2020
FRANCY TORRES ARIZA	C.C.	1.024.528.508	28/08/2020
CARLOS DAVID TAPIERO ARIZA	C.C.	1.024.591.064	04/09/2020
JEAN CARLOS LEAL RODRIGUEZ	C.C.	1.032.513.089	03/09/2020
JHONY SEGUNDO PEREZ RODRIGUEZ	C.C.	1.032.513.107	03/09/2020
DANIEL ALEJANDRO ESPINO	PEP	80.706.593.107	04/09/2020

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 08:33:46 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

AXA COLPATRIA

Cordialmente,



NANCY SEQUERA VERGARA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 08:33:46 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40048703
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA ANDREA GAONA AVILA GAONA AVILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 3 NO 32-20 APTO 202 TC	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7766170691**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		762408430

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										**$ 140.500**	**$ 0**	**$ 140.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
SUBTOTALES:													**$ 109.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 109.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 40048703	GAONA AVILA DIANA ANDREA	INDEPEND		$ 877.803				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 250.300**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-09	781205412	9411840682	Y	2020/10/16	2020/10/26	BANCOLOMBIA	10	$61,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	40048703	GAONA DIANA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$877,803	$61,100	0	$0	$0	No	$61,100
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$877,803	$61,100		$0	$0		$61,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-09	781205412	9411840682	Y	2020/10/16	2020/10/26	BANCOLOMBIA	10	$61,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,100	$0	$0	$61,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$61,100	$0	$0	$61,100
TOTAL				1	$61,100	$0	$0	$61,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	781210297	9411840850	E	2020/10/16	2020/10/26	BANCOLOMBIA	10	$3,627,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007045283	ARDILA JORGE	X																	230301	28	$819,283	$131,100	EPS017	28	$819,283	$32,800	CCF22	28	$819,283	$32,800	14-4	28	$819,283	$57,100	28	$0	$0	Si	$253,800
2	CC	80281528	ARIZA PEDRO	X	X																25-14	29	$848,543	$135,800	EPS005	29	$848,543	$34,000	CCF22	29	$848,543	$34,000	14-4	29	$848,543	$59,100	29	$0	$0	Si	$262,900
3	CC	1000806000	DIAZ FREDY		X																230301	1	$29,261	$4,700	EPSC34	1	$29,261	$1,200	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
4	PE	807065931071996	ESPINO DANIEL	X	X																230301	28	$819,283	$131,100	EPS017	28	$819,283	$32,800	CCF22	28	$819,283	$32,800	14-4	28	$819,283	$57,100	28	$0	$0	Si	$253,800
5	CC	79630005	GAITAN ARBEY	X																	230301	28	$819,283	$131,100	EPS002	28	$819,283	$32,800	CCF22	28	$819,283	$32,800	14-4	28	$819,283	$57,100	28	$0	$0	Si	$253,800
6	CC	4210625	GONZALEZ OSCAR	X	X																25-14	14	$409,642	$65,600	EPSC34	14	$409,642	$16,400	CCF22	14	$409,642	$16,400	14-4	14	$409,642	$28,600	14	$0	$0	Si	$127,000
7	CC	1032513089	LEAL JEAN	X																	230201	28	$819,283	$131,100	EPS005	28	$819,283	$32,800	CCF22	28	$819,283	$32,800	14-4	28	$819,283	$57,100	28	$0	$0	Si	$253,800
8	CC	73139452	MARTINEZ ELBIS	X																	230301	13	$380,382	$60,900	EPS017	13	$380,382	$15,300	CCF22	13	$380,382	$15,300	14-4	13	$380,382	$26,500	13	$0	$0	Si	$118,000
9	CC	80743374	MEZA RODRIGO																		230301	30	$877,803	$140,500	CCFC53	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
10	CC	1032513107	PEREZ JHONY	X																	230201	28	$819,283	$131,100	EPS005	28	$819,283	$32,800	CCF22	28	$819,283	$32,800	14-4	28	$819,283	$57,100	28	$0	$0	Si	$253,800
11	CC	4211782	PEREZ LUIS	X																	230201	12	$351,122	$56,200	EPS017	12	$351,122	$14,100	CCF22	12	$351,122	$14,100	14-4	12	$351,122	$24,500	12	$0	$0	Si	$108,900
12	CC	80365964	POVEDA JOSUE																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
13	CC	7179305	RUIZ LUIS																		231001	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
14	CC	6766038	SAMUDIO LUIS		X																230201	1	$29,261	$4,700	EPSC34	1	$29,261	$1,200	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
15	CC	1024591064	TAPIERO CARLOS	X																	230301	27	$790,023	$126,500	EPS008	27	$790,023	$31,700	CCF22	27	$790,023	$31,700	14-4	27	$790,023	$55,000	27	$0	$0	Si	$244,900
16	CC	1024528508	TORRES FRANCY																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
17	CC	19465056	VARGAS LUIS																		231001	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
18	CC	1003716143	YEPES JORGE	X																	230301	13	$380,382	$60,900	ESSC07	13	$380,382	$15,300	CCF22	13	$380,382	$15,300	14-4	13	$380,382	$26,500	13	$0	$0	Si	$118,000
Total	**Afiliados(18)**																						$11,704,046	$1,873,300			$11,704,046	$469,200			$11,704,046	$469,200			$11,704,046	$815,400		$0	$0		$3,627,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	781210297	9411840850	E	2020/10/16	2020/10/26	BANCOLOMBIA	10	$3,627,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,873,300	$0	$0	$1,873,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$281,000	$0	$0	$281,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$341,900	$0	$0	$341,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$786,800	$0	$0	$786,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$463,600	$0	$0	$463,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$815,400	$0	$0	$815,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$815,400	$0	$0	$815,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$469,200	$0	$0	$469,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$469,200	$0	$0	$469,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				18	$469,200	$0	$0	$469,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$18,800	$0	$0	$18,800
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$31,700	$0	$0	$31,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$95,000	$0	$0	$95,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$35,200	$0	$0	$35,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$15,300	$0	$0	$15,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$103,200	$0	$0	$103,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$99,600	$0	$0	$99,600
TOTAL				18	$3,627,100	$0	$0	$3,627,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	781200454	9411840662	Y	2020/09/15	2020/10/26	BANCOLOMBIA	41	$6,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	40048703	GAONA DIANA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	3	$87,781	$6,200	0	$0	$0	No	$6,200
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$87,781	$6,200		$0	$0		$6,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	781200454	9411840662	Y	2020/09/15	2020/10/26	BANCOLOMBIA	41	$6,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,200	$0	$0	$6,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$6,200	$0	$0	$6,200
TOTAL				1	$6,200	$0	$0	$6,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	781243964	9411840896	E	2020/09/15	2020/10/26	BANCOLOMBIA	41	$192,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000806000	DIAZ FREDY	X																	230301	3	$87,781	$14,100	EPSC34	3	$87,781	$3,600	CCF22	3	$87,781	$3,600	14-4	3	$87,781	$6,200	3	$0	$0	Si	$27,500
2	CC	80743374	MEZA RODRIGO	X																	230301	3	$87,781	$14,100	CCFC53	3	$87,781	$3,600	CCF22	3	$87,781	$3,600	14-4	3	$87,781	$6,200	3	$0	$0	Si	$27,500
3	CC	80365964	POVEDA JOSUE	X																	25-14	3	$87,781	$14,100	EPS002	3	$87,781	$3,600	CCF22	3	$87,781	$3,600	14-4	3	$87,781	$6,200	3	$0	$0	Si	$27,500
4	CC	7179305	RUIZ LUIS	X																	231001	3	$87,781	$14,100	EPS044	3	$87,781	$3,600	CCF22	3	$87,781	$3,600	14-4	3	$87,781	$6,200	3	$0	$0	Si	$27,500
5	CC	6766038	SAMUDIO LUIS	X																	230201	3	$87,781	$14,100	EPSC34	3	$87,781	$3,600	CCF22	3	$87,781	$3,600	14-4	3	$87,781	$6,200	3	$0	$0	Si	$27,500
6	CC	1024528508	TORRES FRANCY	X																	230201	3	$87,781	$14,100	EPS002	3	$87,781	$3,600	CCF22	3	$87,781	$3,600	14-4	3	$87,781	$6,200	3	$0	$0	Si	$27,500
7	CC	19465056	VARGAS LUIS	X																	231001	3	$87,781	$14,100	EPS037	3	$87,781	$3,600	CCF22	3	$87,781	$3,600	14-4	3	$87,781	$6,200	3	$0	$0	Si	$27,500
Total	**Afiliados(7)**																						$614,467	$98,700			$614,467	$25,200			$614,467	$25,200			$614,467	$43,400		$0	$0		$192,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	781243964	9411840896	E	2020/09/15	2020/10/26	BANCOLOMBIA	41	$192,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$98,700	$0	$0	$98,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$28,200	$0	$0	$28,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$14,100	$0	$0	$14,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$28,200	$0	$0	$28,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$28,200	$0	$0	$28,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$43,400	$0	$0	$43,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$43,400	$0	$0	$43,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$25,200	$0	$0	$25,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	$25,200	$0	$0	$25,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$25,200	$0	$0	$25,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$7,200	$0	$0	$7,200
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$3,600	$0	$0	$3,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$3,600	$0	$0	$3,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$3,600	$0	$0	$3,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$7,200	$0	$0	$7,200
TOTAL				7	$192,500	$0	$0	$192,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14873073
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 N 9 34	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7767420527**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/10/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		781318970

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 312.500
SUBTOTALES:													**$ 312.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 312.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 14873073	QUINTERO CORZO JOSE	INDEPEND	PENS VEJ ACT	$ 5.000.000				NO								01-30												$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0													

TOTAL	**$ 312.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40048703
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA ANDREA GAONA AVILA GAONA AVILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 3 NO 32-20 APTO 202 TC	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7767940938**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/10/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	778598662

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										**$ 140.500**	**$ 0**	**$ 140.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
SUBTOTALES:													**$ 109.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 109.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADOR																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7176318
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 11 Nº 24-22	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7767890884**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/10/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		777942506

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES:										**$ 240.000**	**$ 0**	**$ 240.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 187.500
SUBTOTALES:													**$ 187.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 187.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD							ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7176318	ALZATE MORENO RAFAEL EDUARDO	INDEPEND		$ 1.500.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 187.500	$ 0	$ 187.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 427.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14873073
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 N 9 34	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7770577135**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	803141568

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 312.500
SUBTOTALES:													**$ 312.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 312.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP											
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 14873073	QUINTERO CORZO JOSE	INDEPEND	PENS VEJ ACT	$ 5.000.000				NO								01-30												$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 312.500**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	805122921	9412822918	E	2020/11/18	2020/11/20	BANCOLOMBIA	2	$3,826,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007045283	ARDILA JORGE																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
2	CC	80281528	ARIZA PEDRO		X																25-14	1	$29,261	$4,700	EPS005	1	$29,261	$1,200	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
3	CC	7187917	CUCHIVAGUEN FRANCISCO	X	X																230201	2	$58,521	$9,400	EPS044	2	$58,521	$2,400	CCF22	2	$58,521	$2,400	14-4	2	$58,521	$4,100	2	$0	$0	Si	$18,300
4	PE	807065931071996	ESPINO DANIEL		X																230301	1	$29,261	$4,700	EPS017	1	$29,261	$1,200	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
5	CC	79630005	GAITAN ARBEY																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
6	CC	4210625	GONZALEZ OSCAR		X																25-14	1	$29,261	$4,700	EPSC34	1	$29,261	$1,200	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
7	CC	1032513089	LEAL JEAN																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
8	CC	73139452	MARTINEZ ELBIS																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
9	CC	80743374	MEZA RODRIGO																		230301	30	$877,803	$140,500	CCFC53	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
10	CC	1032513107	PEREZ JHONY																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
11	CC	4211782	PEREZ LUIS																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
12	CC	80365964	POVEDA JOSUE																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
13	CC	7179305	RUIZ LUIS																		231001	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
14	CC	1024591064	TAPIERO CARLOS																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
15	CC	1024528508	TORRES FRANCY																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
16	CC	7182076	VARGAS ELKIN	X																	230301	27	$790,023	$126,500	EPS017	27	$790,023	$31,700	CCF22	27	$790,023	$31,700	14-4	27	$790,023	$55,000	27	$0	$0	Si	$244,900
17	CC	19465056	VARGAS LUIS																		231001	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
18	CC	1003716143	YEPES JORGE																		230301	30	$877,803	$140,500	ESSC07	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
Total	**Afiliados(18)**																						$12,347,766	$1,976,500			$12,347,766	$495,300			$12,347,766	$495,300			$12,347,766	$859,700		$0	$0		$3,826,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	805122921	9412822918	E	2020/11/18	2020/11/20	BANCOLOMBIA	2	$3,826,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,976,500	$0	$0	$1,976,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$281,000	$0	$0	$281,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$149,900	$0	$0	$149,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$974,200	$0	$0	$974,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$571,400	$0	$0	$571,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$859,700	$0	$0	$859,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$859,700	$0	$0	$859,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$495,300	$0	$0	$495,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$495,300	$0	$0	$495,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				18	$495,300	$0	$0	$495,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$1,200	$0	$0	$1,200
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$138,500	$0	$0	$138,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$37,600	$0	$0	$37,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$105,600	$0	$0	$105,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$71,600	$0	$0	$71,600
TOTAL				18	$3,826,800	$0	$0	$3,826,800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40048703
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA ANDREA GAONA AVILA GAONA AVILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 3 NO 32-20 APTO 202 TC	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7771412326**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/11/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		813492037

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										**$ 140.500**	**$ 0**	**$ 140.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
SUBTOTALES:													**$ 109.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 109.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES											
																												PENSIÓN									SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 40048703	GAONA AVILA DIANA ANDREA	INDEPEND		$ 877.803				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 250.300**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14873073
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 N 9 34	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7774109527**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	839485456

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 312.500
SUBTOTALES:													**$ 312.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 312.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 14873073	QUINTERO CORZO JOSE	INDEPEND	PENS VEJ ACT	$ 5.000.000				NO								01-30												$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0													

TOTAL	**$ 312.500**

Planilla Pagada

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	ASESORAMOSWJSAS@GMAIL.COM	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3208588834

Clave: 9414716585

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2021/01/04	19	$0	$1,795,900
2021/01/05	0	$0	$1,795,900
2021/01/06	0	$0	$1,795,900
2021/01/07	0	$0	$1,795,900
2021/01/08	0	$0	$1,795,900
2021/01/12	0	$0	$1,795,900
2021/01/13	0	$0	$1,795,900
2021/01/14	0	$0	$1,795,900
2021/01/15	0	$0	$1,795,900
2021/01/18	0	$0	$1,795,900

Periodo Pensión: 2020-11 **Periodo Salud: 2020-12**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	4	14	$927,500
COLFONDOS		2	$252,900
COLPENSIONES		1	$4,700
PORVENIR		7	$276,400
PROTECCION		4	$393,500
ARL	1	14	$403,800
COLPATRIA ARP		14	$403,800
CCF	1	14	$232,300
COLSUBSIDIO		14	$232,300
EPS	8	14	$232,300
COMPENSAR		1	$1,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	$1,200
FAMISANAR		4	$92,600
MEDIMAS EPS		1	$28,100
MUTUAL SER		1	$1,200
NUEVA E.P.S.		1	$35,200
SALUD TOTAL		3	$37,600
SANITAS		2	$35,200
SUBTOTAL			$1,795,900
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$1,795,900

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12		9414716585	E	2020/12/16			19	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)																							**$5,793,508**	**$927,500**			**$5,793,508**	**$232,300**			**$5,793,508**	**$232,300**			**$5,793,508**	**$403,800**		**$0**	**$0**		**$1,795,900**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (14 Afiliados)																							**$5,793,508**	**$927,500**			**$5,793,508**	**$232,300**			**$5,793,508**	**$232,300**			**$5,793,508**	**$403,800**		**$0**	**$0**		**$1,795,900**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																							**$5,793,508**	**$927,500**			**$5,793,508**	**$232,300**			**$5,793,508**	**$232,300**			**$5,793,508**	**$403,800**		**$0**	**$0**		**$1,795,900**
1	CC	1007045283	ARDILA JORGE																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
2	CC	79630005	GAITAN ARBEY		X																230301	1	$29,261	$4,700	EPS002	1	$29,261	$1,200	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
3	CC	1032513089	LEAL JEAN		X																230201	15	$438,902	$70,300	EPS005	15	$438,902	$17,600	CCF22	15	$438,902	$17,600	14-4	15	$438,902	$30,600	15	$0	$0	Si	$136,100
4	CC	73139452	MARTINEZ ELBIS		X																230301	24	$702,243	$112,400	EPS017	24	$702,243	$28,100	CCF22	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$48,900	24	$0	$0	Si	$217,500
5	CC	80743374	MEZA RODRIGO		X																230301	1	$29,261	$4,700	EPS010	1	$29,261	$1,200	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
6	CC	1032513107	PEREZ JHONY		X																230201	15	$438,902	$70,300	EPS005	15	$438,902	$17,600	CCF22	15	$438,902	$17,600	14-4	15	$438,902	$30,600	15	$0	$0	Si	$136,100
7	CC	4211782	PEREZ LUIS		X																230201	24	$702,243	$112,400	EPS017	24	$702,243	$28,100	CCF22	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$48,900	24	$0	$0	Si	$217,500
8	CC	80365964	POVEDA JOSUE		X																25-14	1	$29,261	$4,700	EPS002	1	$29,261	$1,200	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
9	CC	7179305	RUIZ LUIS		X																231001	24	$702,243	$112,400	EPS044	24	$702,243	$28,100	CCF22	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$48,900	24	$0	$0	Si	$217,500
10	CC	1024591064	TAPIERO CARLOS		X																230301	1	$29,261	$4,700	EPS008	1	$29,261	$1,200	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
11	CC	1024528508	TORRES FRANCY																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
12	CC	7182076	VARGAS ELKIN		X																230301	1	$29,261	$4,700	EPS017	1	$29,261	$1,200	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
13	CC	19465056	VARGAS LUIS		X																231001	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
14	CC	1003716143	YEPES JORGE		X																230301	1	$29,261	$4,700	ESSC07	1	$29,261	$1,200	CCF22	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
Total			**Afiliados(14)**																				$5,793,508	$927,500			$5,793,508	$232,300			$5,793,508	$232,300			$5,793,508	$403,800		$0	$0		$1,795,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384066	1	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 N 6 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12		9414716585	E	2020/12/16			19	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$927,500	$0	$0	$927,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$252,900	$0	$0	$252,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$4,700	$0	$0	$4,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$276,400	$0	$0	$276,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$393,500	$0	$0	$393,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$403,800	$0	$0	$403,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	14	$403,800	$0	$0	$403,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$232,300	$0	$0	$232,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	$232,300	$0	$0	$232,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				14	$232,300	$0	$0	$232,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,200	$0	$0	$1,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,200	$0	$0	$1,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$92,600	$0	$0	$92,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$28,100	$0	$0	$28,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$1,200	$0	$0	$1,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$37,600	$0	$0	$37,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				**14**	**$1,795,900**	**$0**	**$0**	**$1,795,900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40048703
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA ANDREA GAONA AVILA GAONA AVILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 3 NO 32-20 APTO 202 TC	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7775666314**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/01/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	851108080

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										**$ 140.500**	**$ 0**	**$ 140.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
SUBTOTALES:													**$ 109.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 109.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES											
																													PENSIÓN										SALUD							ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																
1	CC 40048703	GAONA AVILA DIANA ANDREA	INDEPEND		$ 877.803				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800			$ 0		$ 0		$ 0	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7176318
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 11 Nº 24-22	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7773804094**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	831576109

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES:										**$ 240.000**	**$ 0**	**$ 240.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 187.500
SUBTOTALES:													**$ 187.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 187.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES											
																													PENSIÓN										SALUD							ARP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7176318	ALZATE MORENO RAFAEL EDUARDO	INDEPEND		$ 1.500.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 187.500	$ 0	$ 187.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 427.500**

Planilla Pagada
