MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM°: 2,40	EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGAS DE CIMIENTO		UNIDAD: M3

Nombre - Viga de Cimentación	Ubicación	Longitud de viga (ml)	Longitud (ml)
ESTRUCTURA PRINCIPAL - CAMU			
VC-102	C9-C15	23,75	23,75
VC-104	D9-D15	23,75	23,75
VC-106	E15-E18	12,95	12,95
VC-107	F9-G18	36,53	36,53
VC-108	I9-I18	36,41	36,41
VC-110	K9-K18	36,41	36,41
VC-112	M9-M15	22,55	22,55
VC-113	M17-M18	4,3	4,30
VC-115	P8-O15	25,79	25,79
VC-116	O17-O18	4,3	4,30
VC-118	R8-Q15	25,89	25,89
VC-119	Q17-Q18	4,3	4,30
VC-121	S14-S18	14,1	14,10
VC-122	T8-T15	25,75	25,75
VC-123	T17-T18	4,3	4,30
VC-124	U8-U18	39,67	39,67
VC-125	V8-W13	12,05	12,05
VC-126	X12-X18	27,95	27,95
VC-137	P8-V8	19,35	19,35
VC-138	C9-P9	29,8	29,80
VC-139	C11-W10	50	50,00
VC-140	C13-X12	51,97	51,97
VC-141	C14-X14	51,85	51,85
VC-142	C15-X15	52	52,00
VC-143	E16-K16	12,86	12,86
VC-144	U16-X16	5,25	5,25
VC-145	E17-X17	44,5	44,50
VC-146	E18-X18	44,5	44,50
VC-100	A-A	23,75	23,75
VC-101	B-B	23,75	23,75
VC-103	C-C	23,75	23,75
VC-105	D-D	22,23	22,23
VC-109	J-J	22,23	22,23
VC-111	L-L	25,7	25,70
VC-114	N-N	25,7	25,70
VC-117	Q-Q	25	25,00
VC-120	S-S	24,13	24,13
VC-127	L1-S1	16,48	16,48

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021

ITEM:	2,40	EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGAS DE CIMIENTO			UNIDAD
					M3
		VC-128	A2-S2	48,53	48,53
		VC-129	A4-D4	15,85	15,85
		VC-130	J4-S4	19,35	19,35
		VC-131	A5-D5	15,85	15,85
		VC-132	J5-S5	19,36	19,36
		VC-133	A6-D6	15,85	15,85
		VC-134	J6-S6	19,35	19,35
		VC-135	N7-S7	10,723	10,72
		VC-136	A7-N7	36,85	36,85
		AUDITORIO			
		VC-100 (SON 2)	A-C	13,15	26,30
		VC-101 (SON 2)	1-3	10,35	20,70
		CASETA - VIGILANTE			
		VIGA CASETA		11,64	11,64
		CUARTO ELÉCTRICO			
			CANT	Longitud de viga (ml)	
		VC-1	3	8,08	24,24
		VC-2	3	7,11	21,33
				TOTAL ML	1281,47
		SECCIÓN VIGA	LONG. 1	LONG. 2	ÁREA
		0,25X0,3	0,25	0,3	0,08
		TOTAL m3			96,11

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO

Kathleen Díaz H. S.S.A

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.		PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	2,5	EXCAVACIONES MANUALES PARA ZAPATAS	UNIDAD: M3

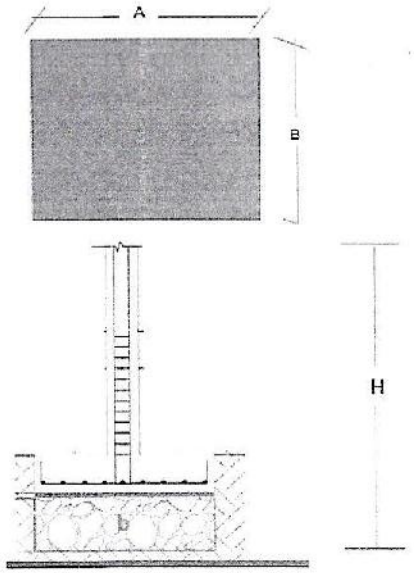

Tipo de Zapata	A (m)	B(m)	H (m)	Cant	Total (m3)
Z1	1,3	1,3	2,5	45	190,125
Z 2	1,6	1,6	2,5	85	544
Z 3	1,8	1,8	2,5	6	48,6
Z4	2	2	2,5	10	100
Z-5	2	1,2	2,5	1	6
Z-6	2,4	1,4	2,5	1	8,4
CUARTO ELECTRICO	1	1	2,5	6	15
	1,5	1,5	2,5	3	16,88
Z1 - CERRAMIENTO	1,3	1,3	2,5	4	16,9
				TOTAL	945,90

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO

Kathleen Díaz H. S.S.A

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0090

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


PROYECTO:


CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO
FECHA:	JULIO DE 2020

ITEM:	2.6	LLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE HASTA DE DOCE (12) KM.	UNIDAD: M3

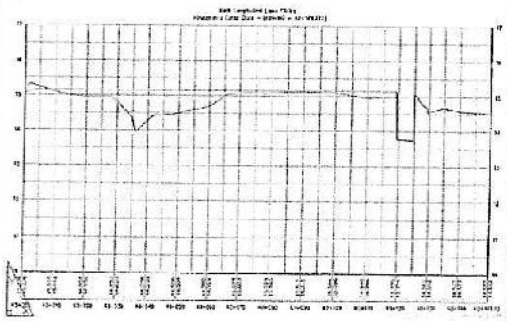

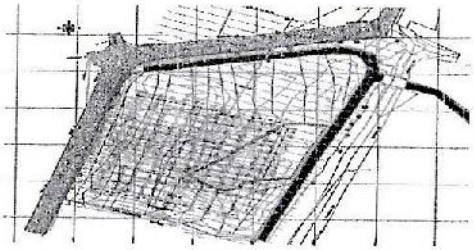

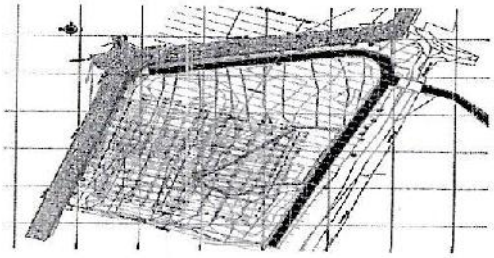

P.K.	Área de Lleno(m2)	Área Promedio de Lleno(m2)	Volumen de Lleno (m3)	Vol. Lleno acumul. (m3)
K0+000,00	2,56	0	0	0
K0+005,00	15,32	8,94	44,7	44,7
K0+010,00	21,55	18,435	92,175	136,875
K0+015,00	27,04	24,295	121,475	258,35
K0+020,00	30,07	28,555	142,775	401,125
K0+025,00	32,57	31,32	156,6	557,725
K0+030,00	39,78	36,175	180,875	738,6
K0+035,00	58,38	49,08	245,4	984
K0+040,00	62,71	60,545	302,725	1286,725
K0+045,00	64,92	63,815	319,075	1605,8
K0+050,00	61,68	63,3	316,5	1922,3
K0+055,00	52,08	56,88	284,4	2206,7
K0+060,00	43,91	47,995	239,975	2446,675
K0+065,00	36,46	40,185	200,925	2647,6
K0+070,00	33,65	35,055	175,275	2822,875
K0+075,00	28,2	30,925	154,625	2977,5
K0+080,00	23,46	25,83	129,15	3106,65
K0+085,00	18,14	20,8	104	3210,65
K0+090,00	13,87	16,005	80,025	3290,675
K0+095,00	13,12	13,495	67,475	3358,15
K0+100,00	13,35	13,235	66,175	3424,325
K0+105,00	15,11	14,23	71,15	3495,475
K0+110,00	15,11	15,11	75,55	3571,025
K0+115,00	13,71	14,41	72,05	3643,075
K0+120,00	12,19	12,95	64,75	3707,825
K0+125,00	10,59	11,39	56,95	3764,775
K0+130,00	8,51	9,55	47,75	3812,525
K0+135,00	3,246	5,878	29,39	3841,915
K0+140,00	0	1,623	8,115	3850,03
K0+145,00	0	0	0	3850,03
K0+149,72	0	0	0	3850,03

TIPO ZAPATA	NÚMERO DE ZAPATAS	SECCIÓN EXCAV.	ALT EXCAV.	SECCIÓN COLUMNA	VOL UNIT EXCAV	VOL. COLUMN A DESCONT	VOLUM UNITARIO DESCON	VOLUMEN PARCIAL
Z-1	49	1,3X1,3	1,15	0,3X0,3	1,94	0,10	1,84	90,16
Z-2	85	1,6X1,6	1,15	0,3X0,3	2,94	0,10	2,84	241,4425
Z-3	6	1,8X1,8	1,15	0,3X0,4	3,73	0,14	3,59	21,528
Z-4	10	2X2	1,15	0,3X0,4	4,60	0,14	4,46	44,62
Z-5	1	2X1,2	1,15	0,3X0,4	2,76	0,14	2,62	2,622
Z-6	1	2,4X1,4	1,15	0,3X0,4	3,86	0,14	3,73	3,726
CUARTO ELÉCTRICO								
ZC-1	5	1X1	1,25	0,3X0,3	1,25	0,11	1,14	6,825
ZC-2	3	1,5X1,5	1,2	0,3X0,3	2,70	0,11	2,59	7,776

Descripcion	Area(m2)	H (m)	Volumen
Material seleccionado para rellenar desde cota superior de viga de cimiento hasta cota superior sobrecimiento	3259,09	0,12	391,0908
	TOTAL		4659,82

OBSERVACIONES:


Kathleen Díaz H s.s.g

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE V/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH Hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM:	2,7	MEJORAMIENTO DE SUELO CON RELLENO DE MATERIAL TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR	UNIDAD M3

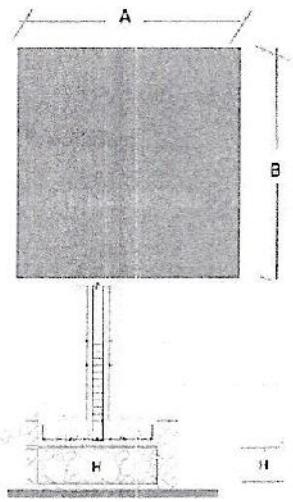

Tipo de Zapata	A	B	H	Cant	Total
Z1	1,3	1,3	1	49	82,81
Z 2	1,6	1,6	1	85	217,6
Z 3	1,8	1,8	1	6	19,44
Z4	2	2	1	10	40
Z-5	2	1,2	1	1	2,4
Z-6	2,4	1,4	1	1	3,36
					365,61
CUARTO ELÉCTRICO					
ZC-1	1	1	1	3	3,00
ZC-2	1,5	1,5	1	6	13,50
TANQUE DE ALMACENAMIENTO					
	22,85	4,5	0,5	1	51,41
PLANTA DE TRATAMIENTO FAFA					
	6,6	1,8	0,5	1	5,94
TOTAL					439,46

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO

Kathleen Díaz H.S.S.A


V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		1
ITEM°: 3,1	SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, ED= 5 CM.		UNIDAD: m2

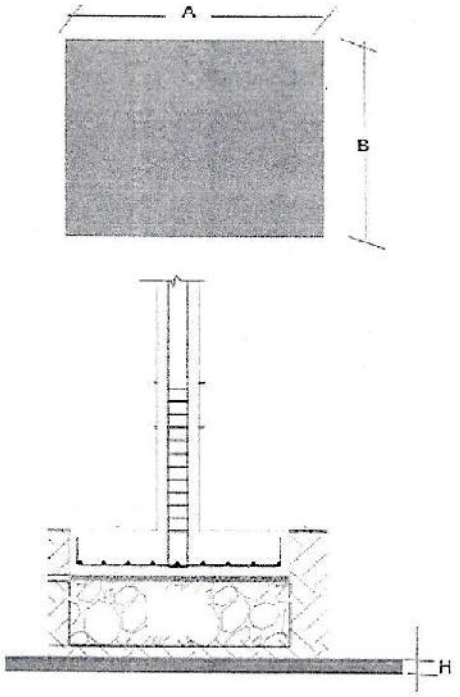

PTAR



Tipo de Zapata	A	B	Cant	Total
Z1	1,3	1,3	45	76,05
Z 2	1,6	1,6	85	217,6
Z 3	1,8	1,8	6	19,44
Z4	2	2	10	40
Z5	2	1,2	1	2,4
Z6	2,4	1,4	1	3,36
PTAR	6,6	1,8	1	11,88
TANQUE SUBTERRÁNEO	22,85	4,5	1	102,83
Z7-Cuarto Electrico	1	1	6	6
Z8-Cuarto eléctrico	1,5	1,5	3	6,75
Z1 - Cerramiento	1,3	1,3	4	6,76

0072

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		1

ITEM°:	3,1	SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, ED= 5 CM.	UNIDAD
			m2

PLANTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO

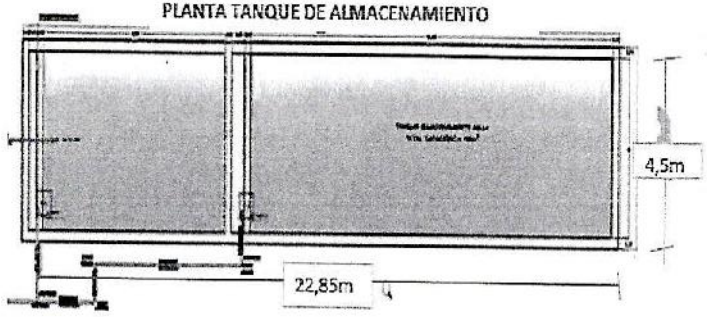

TOTAL	493,07

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO

Kathleen Díaz Hoyos

V0 B0 KATHLEEN DIAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0073

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM:	3,6	REFUERZO DE ACERO DE 60000 PSI PARA VIGA DINTEL COLGANTE DE .10 M X .20 M Y VIGA DE 10X30	UNIDAD: Kg

DESCRIPCIÓN	CANT. DE VIGA	ACERO LONGIRUDINAL DE 3/8"	ACERO TRANSVERSAL DE 1/4"	ACERO TOTAL
VIGA DINTEL DE 10X30	278,01	2,46	1,05	975,76
VIGA DINTEL DE 10X20	1535,99	2,46	1,05	5391,02
				6366,78

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Díaz Hoyos

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS

Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6

0030


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 3,7	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA ZAPATA, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO		UNIDAD: kg

ZAPATA TIPO 1

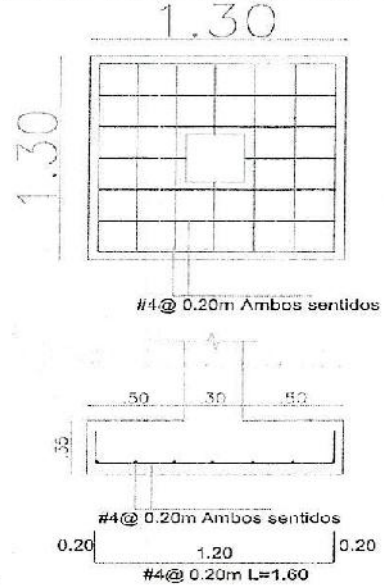

ZAPATA TIPO 2

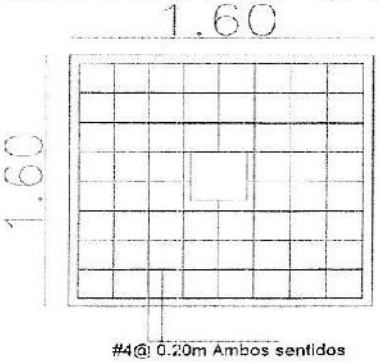


Tipo de Zapata	Ubicación	Número de varillas Ø=1/2"	Longitud de varilla Ø=1/2"	Long. Total	Peso Kg
ESTRUCTURA PRINCIPAL - CAMU					
Z-1	8P	14	1,6	22,4	22,27
	8V	14	1,6	22,4	22,27
	9P	14	1,6	22,4	22,27
	9W	14	1,6	22,4	22,27
	11C	14	1,6	22,4	22,27
	11D	14	1,6	22,4	22,27
	11F	14	1,6	22,4	22,27
	11I	14	1,6	22,4	22,27
	11K	14	1,6	22,4	22,27
	10P	14	1,6	22,4	22,27
	10W	14	1,6	22,4	22,27
	13C	14	1,6	22,4	22,27
	13D	14	1,6	22,4	22,27
	13F	14	1,6	22,4	22,27
	13I	14	1,6	22,4	22,27
	13K	14	1,6	22,4	22,27
	W12	14	1,6	22,4	22,27
	15E	14	1,6	22,4	22,27
	15X	14	1,6	22,4	22,27
	16E	14	1,6	22,4	22,27
	16G	14	1,6	22,4	22,27
	16I	14	1,6	22,4	22,27
	16K	14	1,6	22,4	22,27
	16S	14	1,6	22,4	22,27
	16X	14	1,6	22,4	22,27
	17E	14	1,6	22,4	22,27
	17G	14	1,6	22,4	22,27
	17I	14	1,6	22,4	22,27
	17K	14	1,6	22,4	22,27
	17T	14	1,6	22,4	22,27
	17U	14	1,6	22,4	22,27
	17X	14	1,6	22,4	22,27
	18X	14	1,6	22,4	22,27
	18U	14	1,6	22,4	22,27
	18T	14	1,6	22,4	22,27

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


MEMORIA DE CANTIDADES


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 3,7	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA ZAPATA, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO		UNIDAD: kg

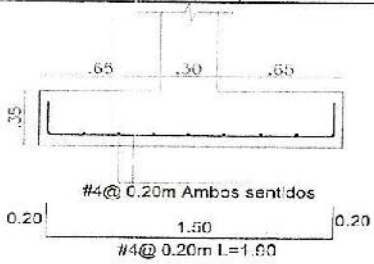

ZAPATA TIPO 3

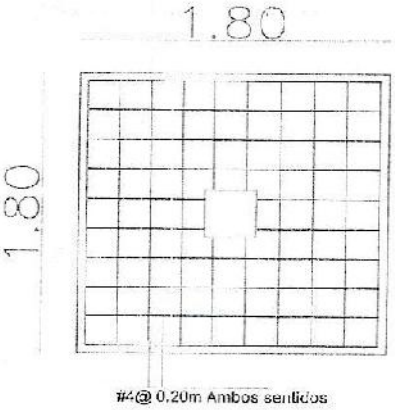

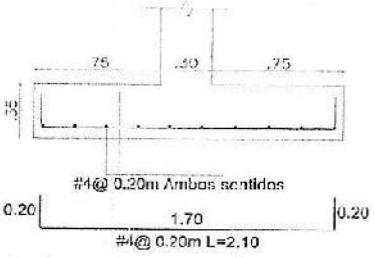

18S	14	1,6	22,4	22,27
18Q	14	1,6	22,4	22,27
18O	14	1,6	22,4	22,27
18M	14	1,6	22,4	22,27
18K	14	1,6	22,4	22,27
18I	14	1,6	22,4	22,27
18G	14	1,6	22,4	22,27
18E	14	1,6	22,4	22,27
2A	18	1,9	34,2	33,99
2B	18	1,9	34,2	33,99
2C	18	1,9	34,2	33,99
1L	18	1,9	34,2	33,99
1N	18	1,9	34,2	33,99
1Q	18	1,9	34,2	33,99
3D	18	1,9	34,2	33,99
3H	18	1,9	34,2	33,99
3N	18	1,9	34,2	33,99
3L	18	1,9	34,2	33,99
3Q	18	1,9	34,2	33,99
3S	18	1,9	34,2	33,99
4A	18	1,9	34,2	33,99
4B	18	1,9	34,2	33,99
4C	18	1,9	34,2	33,99
4D	18	1,9	34,2	33,99
4J	18	1,9	34,2	33,99
4L	18	1,9	34,2	33,99
4N	18	1,9	34,2	33,99
4Q	18	1,9	34,2	33,99
4S	18	1,9	34,2	33,99
5A	18	1,9	34,2	33,99
5B	18	1,9	34,2	33,99
5C	18	1,9	34,2	33,99
5D	18	1,9	34,2	33,99
5J	18	1,9	34,2	33,99
5L	18	1,9	34,2	33,99
5Q	18	1,9	34,2	33,99


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM:	3,7	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA ZAPATA, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	UNIDAD: kg

ZAPATA TIPO 4

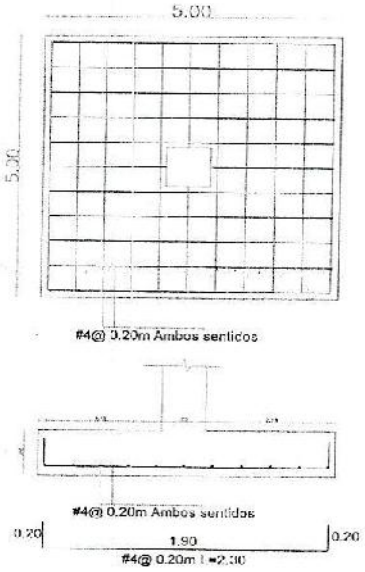

ZAPATA TIPO 5

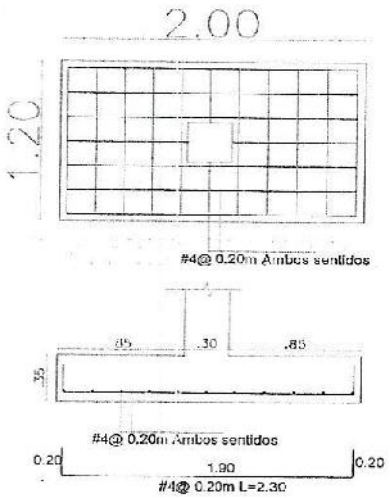


Z-2	5S	18	1,9	34,2	33,99
	6A	18	1,9	34,2	33,99
	6B	18	1,9	34,2	33,99
	6C	18	1,9	34,2	33,99
	6D	18	1,9	34,2	33,99
	6J	18	1,9	34,2	33,99
	6L	18	1,9	34,2	33,99
	6N	18	1,9	34,2	33,99
	6Q	18	1,9	34,2	33,99
	6S	18	1,9	34,2	33,99
	7A	18	1,9	34,2	33,99
	7B	18	1,9	34,2	33,99
	7C	18	1,9	34,2	33,99
	7D	18	1,9	34,2	33,99
	7H	18	1,9	34,2	33,99
	7J	18	1,9	34,2	33,99
	7L	18	1,9	34,2	33,99
	7N	18	1,9	34,2	33,99
	7S	18	1,9	34,2	33,99
	9C	18	1,9	34,2	33,99
	9D	18	1,9	34,2	33,99
	9F	18	1,9	34,2	33,99
	9I	18	1,9	34,2	33,99
	9K	18	1,9	34,2	33,99
	9M	18	1,9	34,2	33,99
	11M	18	1,9	34,2	33,99
	12X	18	1,9	34,2	33,99
	12U	18	1,9	34,2	33,99
	12T	18	1,9	34,2	33,99
	12R	18	1,9	34,2	33,99
	12P	18	1,9	34,2	33,99
	12M	18	1,9	34,2	33,99
	14C	18	1,9	34,2	33,99
	14I	18	1,9	34,2	33,99
	14K	18	1,9	34,2	33,99
	14M	18	1,9	34,2	33,99
	14P	18	1,9	34,2	33,99
	14R	18	1,9	34,2	33,99
	14U	18	1,9	34,2	33,99
	14X	18	1,9	34,2	33,99
	15C	18	1,9	34,2	33,99
	15I	18	1,9	34,2	33,99
	15K	18	1,9	34,2	33,99
	15S	18	1,9	34,2	33,99
	15T	18	1,9	34,2	33,99

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


MEMORIA DE CANTIDADES


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	167	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO DH HOSPITALARIO		
ITEM: 3,7	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA ZAPATA, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO		UNIDAD kg



ZAPATA TIPO 6

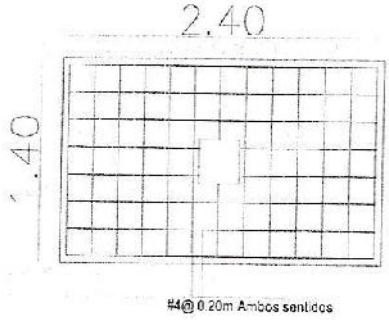





	15U	18	1,9	34,2	33,99
	16U	18	1,9	34,2	33,99
	17S	18	1,9	34,2	33,99
	17Q	18	1,9	34,2	33,99
	17O	18	1,9	34,2	33,99
	17M	18	1,9	34,2	33,99
Z-3	14F	20	2,1	42	41,75
	14I	20	2,1	42	41,75
	15G	20	2,1	42	41,75
	15M	20	2,1	42	41,75
	15O	20	2,1	42	41,75
	15Q	20	2,1	42	41,75
Z-4	1S	22	2,3	50,6	50,30
	3J	22	2,3	50,6	50,30
	8U	22	2,3	50,6	50,30
	8T	22	2,3	50,6	50,30
	10U	22	2,3	50,6	50,30
	10T	22	2,3	50,6	50,30
	10R	22	2,3	50,6	50,30
	5S	22	2,3	50,6	50,30
	14D	22	2,3	50,6	50,30
	15D	22	2,3	50,6	50,30
Z-5	7Q	7	2,3	16,1	16,00
		11	1,5	16,5	16,40
Z-6	8R	8	2,7	21,6	21,47
		13	1,7	22,1	21,97
AUDITORIO					
Z-2	A-1	18	1,9	34,2	33,99
	B-1	18	1,9	34,2	33,99
	C-1	18	1,9	34,2	33,99
	B-3	18	1,9	34,2	33,99
	A-3	18	1,9	34,2	33,99
	C-3	18	1,9	34,2	33,99
Z-1	A-2	14	1,6	22,4	22,27
	C-2	14	1,6	22,4	22,27


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 3,7	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA ZAPATA, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO		UNIDAD: kg



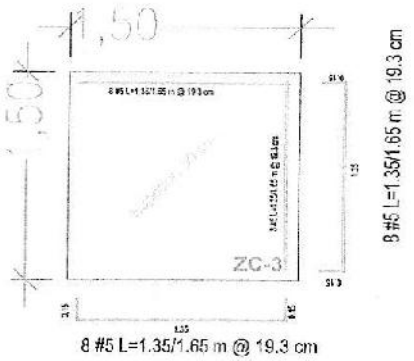

CERRAMIENTO					
Z-1	4	14	1,6	22,4	89,06

CUARTO ELÉCTRICO					
	Cant Zapatas	No Varillas	longitud de varilla Ø=5/8"	Long. Total	Peso Kg
ZC 2	3	16	1,65	79,2	122,92
ZC 1	6	12	1,15	82,8	128,51
				TOTAL	5061,29

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO

Kathleen Díaz Hoyos

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE V/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	3,11	COLUMNAS DE 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD ml



Tipo de Columna	Ubicación	Longitud (cota +0,00 hasta cota + 3,6)	Longitud pedestal	Longitud Total (ml)
ESTRUCTURA PRINCIPAL - CAMU				
CL-04	L-07	3,6	0,85	4,45
	N-04	3,6	0,85	4,45
	L-04	3,6	0,85	4,45
	N-01	3,6	0,85	4,45
	C-04	3,6	0,85	4,45
	B-04	3,6	0,85	4,45
CL-05	N-06	3,6	0,85	4,45
	L-06	3,6	0,85	4,45
	Q-05	3,6	0,85	4,45
	N-05	3,6	0,85	4,45
	B-06	3,6	0,85	4,45
	C-02	3,6	0,85	4,45
	B-02	3,6	0,85	4,45
CL-06	S-04	3,6	0,85	4,45
	L-03	3,6	0,85	4,45
CL-07	N-07	3,6	0,85	4,45
	Q-06	3,6	0,85	4,45
	J-04	3,6	0,85	4,45
	Q-03	3,6	0,85	4,45
	N-03	3,6	0,85	4,45
	D-06	3,6	0,85	4,45
	A-07	3,6	0,85	4,45
	C-06	3,6	0,85	4,45
	A-04	3,6	0,85	4,45
	Q-07	3,6	0,85	4,45
	S-07	3,6	0,85	4,45
	S-06	3,6	0,85	4,45
	S-05	3,6	0,85	4,45
	L-05	3,6	0,85	4,45


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM:	3,11	COLUMNAS DE 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN			UNIDAD
					ml
		CL-08	J-05	3,6	0,85	4,45
			J-06	3,6	0,85	4,45
			L-01	3,6	0,85	4,45
			Q-01	3,6	0,85	4,45
			C-07	3,6	0,85	4,45
			B-07	3,6	0,85	4,45
			B-05	3,6	0,85	4,45
			C-05	3,6	0,85	4,45
			D-05	3,6	0,85	4,45
			D-04	3,6	0,85	4,45
		CL-09	A-05	3,6	0,85	4,45
			Q-04	3,6	0,85	4,45
		CL-10	S-03	3,6	0,85	4,45
			A-06	3,6	0,85	4,45
			A-02	3,6	0,85	4,45
		CL-18	Q-15	3,6	0,65	4,25
			U-12	3,6	0,65	4,25
			G-15	3,6	0,65	4,25
			F-14	3,6	0,65	4,25
			X-18	3,6	0,65	4,25
			X-17	3,6	0,65	4,25
			X-16	3,6	0,65	4,25
			X-15	3,6	0,65	4,25
			X-14	3,6	0,65	4,25
			W-12	3,6	0,65	4,25
			W-10	3,6	0,65	4,25
			W-09	3,6	0,65	4,25
			V-08	3,6	0,65	4,25
			U-14	3,6	0,65	4,25
			U-15	3,6	0,65	4,25
			U-16	3,6	0,65	4,25
			U-17	3,6	0,65	4,25
			U-18	3,6	0,65	4,25

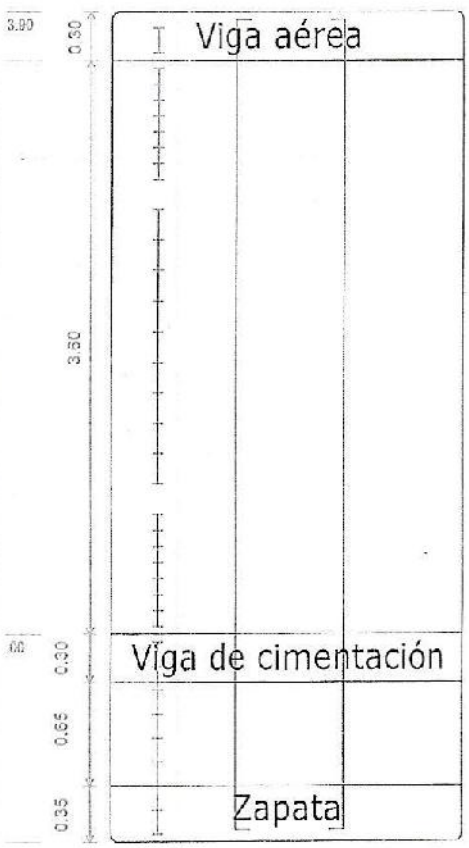


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	3,11	COLUMNAS DE 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD
			ml

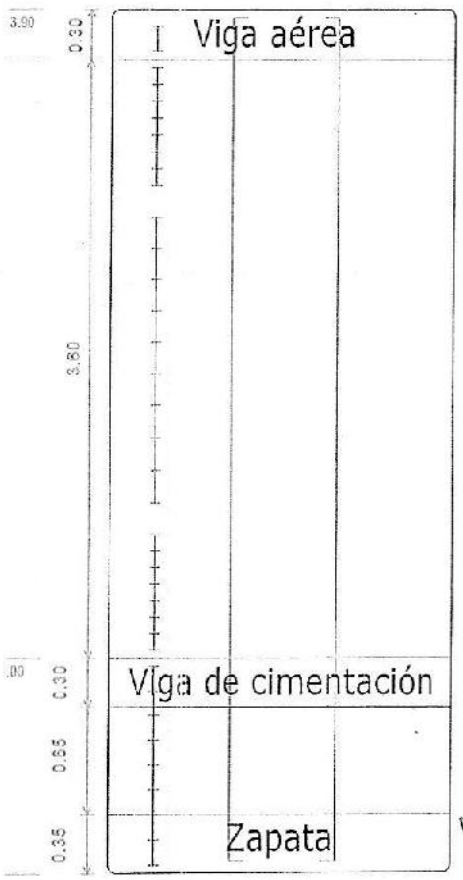

	T-14	3,6	0,65	4,25
	T-17	3,6	0,65	4,25
	T-18	3,6	0,65	4,25
	S-15	3,6	0,65	4,25
	S-16	3,6	0,65	4,25
	S-17	3,6	0,65	4,25
	S-18	3,6	0,65	4,25
	R-14	3,6	0,65	4,25
	P-08	3,6	0,65	4,25
	P-09	3,6	0,65	4,25
	P-10	3,6	0,65	4,25
	P-12	3,6	0,65	4,25
	P-14	3,6	0,65	4,25
	M-11	3,6	0,65	4,25
	M-13	3,6	0,65	4,25
	M-14	3,6	0,65	4,25
	K-09	3,6	0,65	4,25
	K-11	3,6	0,65	4,25
	K-13	3,6	0,65	4,25
	K-14	3,6	0,65	4,25
CL-19	I-09	3,6	0,65	4,25
	I-11	3,6	0,65	4,25
	I-13	3,6	0,65	4,25
	I-14	3,6	0,65	4,25
	I-15	3,6	0,65	4,25
	F-09	3,6	0,65	4,25
	F-11	3,6	0,65	4,25
	F-13	3,6	0,65	4,25
	E-15	3,6	0,65	4,25
	D-09	3,6	0,65	4,25
	D-11	3,6	0,65	4,25
	D-13	3,6	0,65	4,25
	C-09	3,6	0,65	4,25
	C-11	3,6	0,65	4,25


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	3,11	COLUMNAS DE 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD
			ml

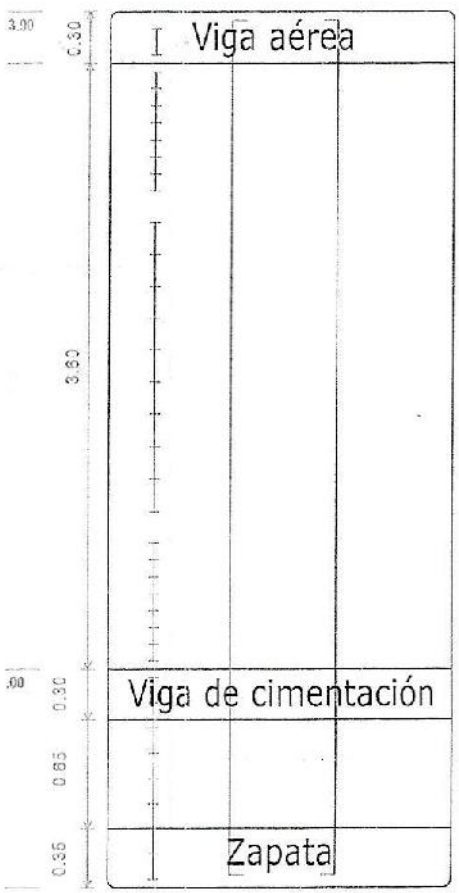

	C-13	3,6	0,65	4,25
	Q-17	3,6	0,65	4,25
	Q-18	3,6	0,65	4,25
	O-17	3,6	0,65	4,25
	O-18	3,6	0,65	4,25
	M-17	3,6	0,65	4,25
	M-18	3,6	0,65	4,25
	K-16	3,6	0,65	4,25
	K-17	3,6	0,65	4,25
	K-18	3,6	0,65	4,25
	I-16	3,6	0,65	4,25
	I-17	3,6	0,65	4,25
	I-18	3,6	0,65	4,25
	G-16	3,6	0,65	4,25
	G-17	3,6	0,65	4,25
	G-18	3,6	0,65	4,25
	E-16	3,6	0,65	4,25
	E-17	3,6	0,65	4,25
	E-18	3,6	0,65	4,25
CL-20	O-15	3,6	0,65	4,25
CL-21	M-15	3,6	0,65	4,25
	T-15	3,6	0,65	4,25
CL-22	K-15	3,6	0,65	4,25
	M-09	3,6	0,65	4,25
CL-23	T-12	3,6	0,65	4,25
CL-24	R-12	3,6	0,65	4,25
	AUDITORIO			
GL-01	A-1	3,6	0,85	4,45
	B-1	3,6	0,85	4,45
	C-1	3,6	0,85	4,45
	A-2	3,6	0,85	4,45
	C-2	3,6	0,85	4,45

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	3,11	COLUMNAS DE 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN				UNIDAD
						ml
			B-3	3,6	0,85	4,45
		CL-02	A-3	3,6	0,85	4,45
			C-3	3,6	0,85	4,45
		CUARTO ELÉCTRICO				
			CANT.			
			3	3,5	1,2	14,10
			6	3,5	1,25	28,50
		CERRAMIENTO				
			CANT.			
			4	3,2	0,85	16,20
					TOTAL ML	621,70
			SECCIÓN COLUMNA	LONG. 1	LONG. 2	ÁREA
			0,3X0,3	0,3	0,3	0,09
					TOTAL m3	55,95

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO

Kathleen Díaz H-55.1

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	MEMORIA DE CANTIDADES				CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
		PROYECTO:			
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ			FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6				ABRIL DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO				Unidad
ITEM: 3,15	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE ENTERRADO				m3
		LONG	ANCHO	ESP	TOTAL M3
	LOSA SUPERIOR	22,85	4,5	0,25	25,71
	LOSA INFERIOR	26,25	4,5	0,25	29,53
	MUROS	4	1,25	0,25	1,25
		4	1,25	0,25	1,25
		4	1,25	0,25	1,25
		22,85	1,25	0,25	7,14
		22,85	1,25	0,25	7,14
	CUÑAS	0,85	0,3	0,25	0,06
		0,85	0,5	0,25	0,11
	CUÑAS	0,85	0,3	0,25	0,06
		0,85	0,5	0,25	0,11
	TAPAS DE TANQUE				-0,45
	TOTAL CONCRETO TANQUE m3				73,16


OBSERVACIONES : VER PLANO DE DESPIECE DE TANQUE

Kathleen Díaz H.S.S.A

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0091

PERFIL LONGITUDINAL

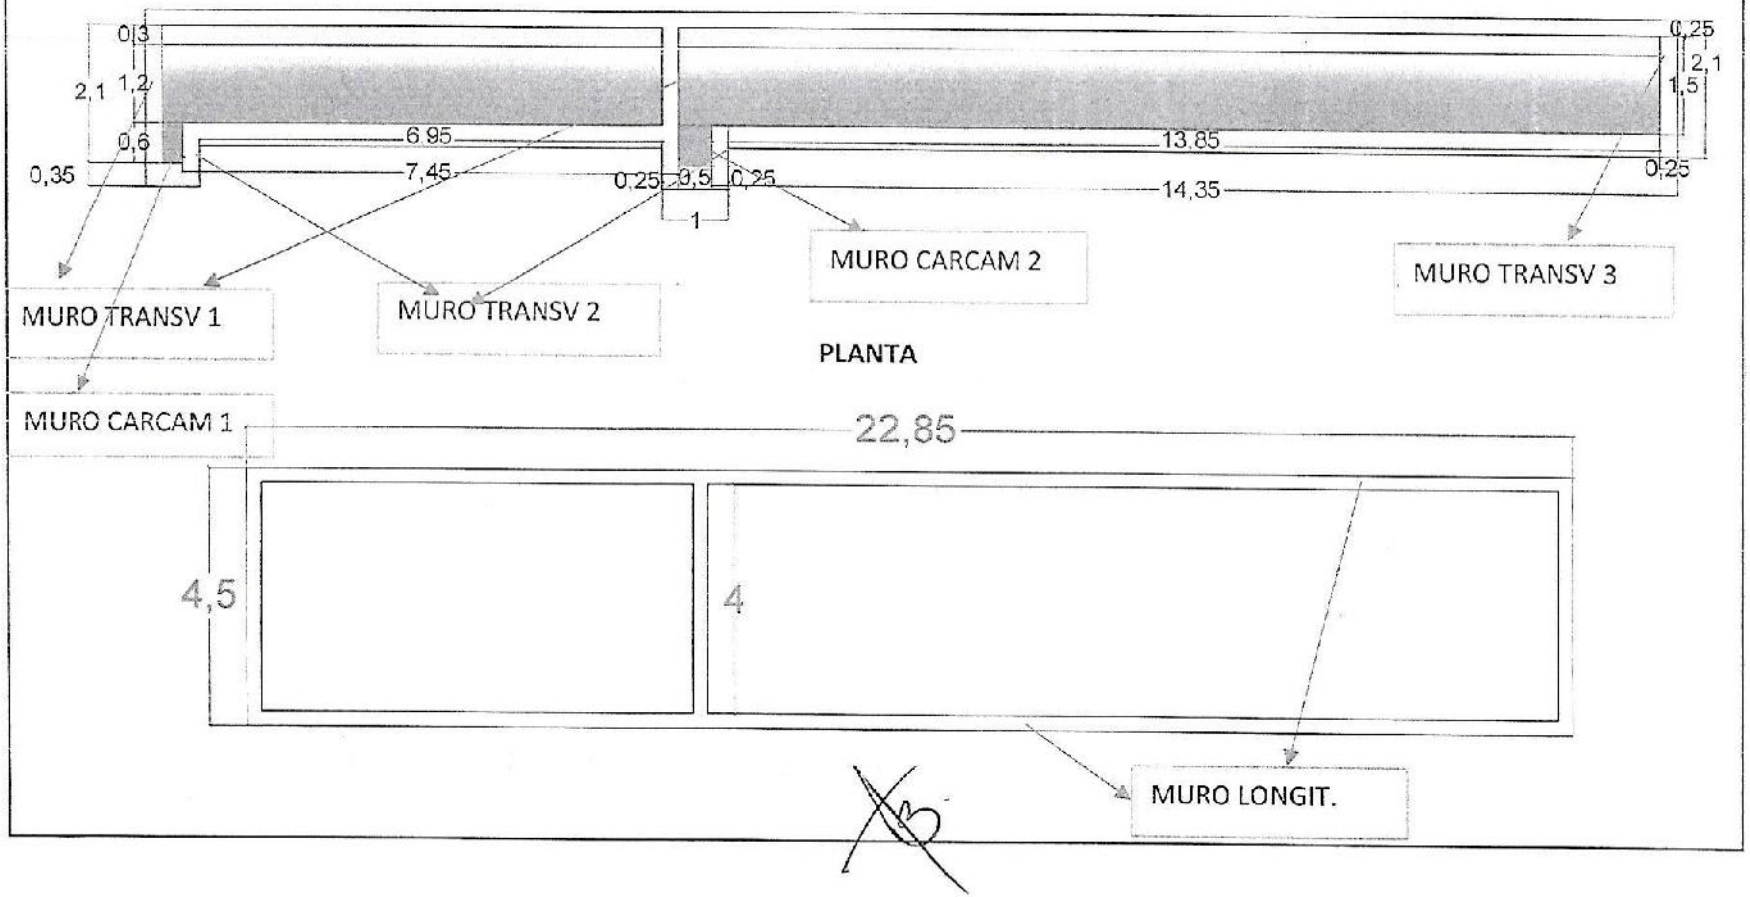

PLANTA

0092


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM': 3,22	ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		UNIDAD: m3

ZAPATA TIPO 1

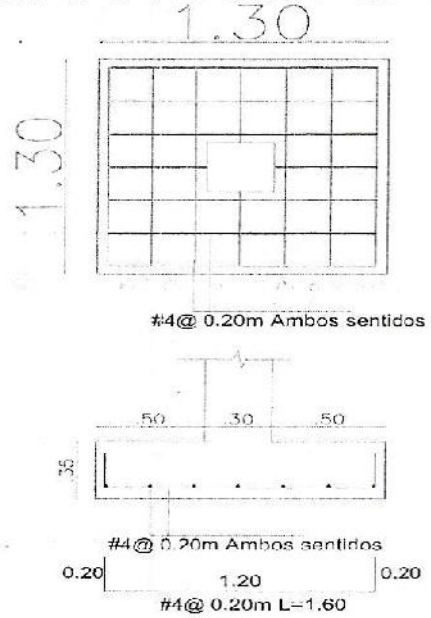

ZAPATA TIPO 2

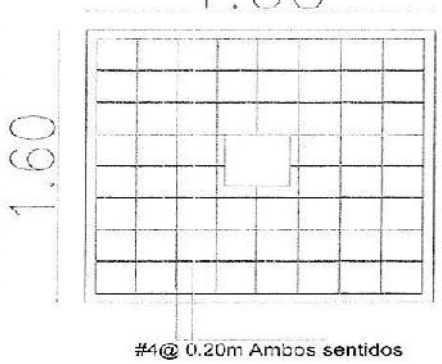


Tipo de Zapata	Ubicación	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Concreto (m3)
ESTRUCTURA PRINCIPAL - CAMU					
Z-1	8P	1,3	1,3	0,35	0,59
	8V	1,3	1,3	0,35	0,59
	9P	1,3	1,3	0,35	0,59
	9W	1,3	1,3	0,35	0,59
	11C	1,3	1,3	0,35	0,59
	11D	1,3	1,3	0,35	0,59
	11F	1,3	1,3	0,35	0,59
	11I	1,3	1,3	0,35	0,59
	11K	1,3	1,3	0,35	0,59
	10P	1,3	1,3	0,35	0,59
	10W	1,3	1,3	0,35	0,59
	13C	1,3	1,3	0,35	0,59
	13D	1,3	1,3	0,35	0,59
	13F	1,3	1,3	0,35	0,59
	13I	1,3	1,3	0,35	0,59
	13K	1,3	1,3	0,35	0,59
	W12	1,3	1,3	0,35	0,59
	15E	1,3	1,3	0,35	0,59
	15X	1,3	1,3	0,35	0,59
	16E	1,3	1,3	0,35	0,59
	16G	1,3	1,3	0,35	0,59
	16I	1,3	1,3	0,35	0,59
	16K	1,3	1,3	0,35	0,59
	16S	1,3	1,3	0,35	0,59
	16X	1,3	1,3	0,35	0,59
	17E	1,3	1,3	0,35	0,59
	17G	1,3	1,3	0,35	0,59
	17I	1,3	1,3	0,35	0,59
	17K	1,3	1,3	0,35	0,59
	17T	1,3	1,3	0,35	0,59
	17U	1,3	1,3	0,35	0,59
	17X	1,3	1,3	0,35	0,59
	18X	1,3	1,3	0,35	0,59
	18U	1,3	1,3	0,35	0,59

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM°: 3,22	ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		UNIDAD: m3

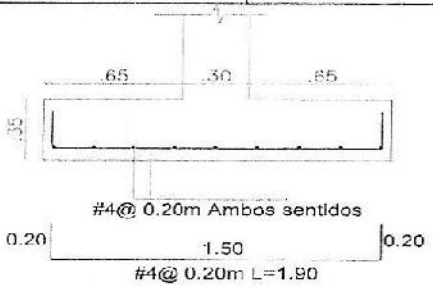

ZAPATA TIPO 3

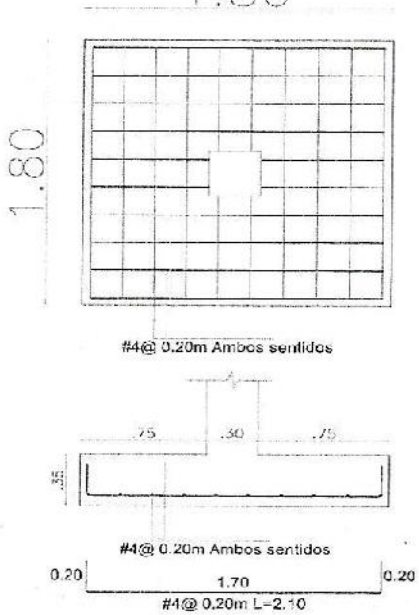

	18T	1,3	1,3	0,35	0,59
	18S	1,3	1,3	0,35	0,59
	18Q	1,3	1,3	0,35	0,59
	18O	1,3	1,3	0,35	0,59
	18M	1,3	1,3	0,35	0,59
	18K	1,3	1,3	0,35	0,59
	18I	1,3	1,3	0,35	0,59
	18G	1,3	1,3	0,35	0,59
	18E	1,3	1,3	0,35	0,59
	2A	1,6	1,6	0,35	0,90
	2B	1,6	1,6	0,35	0,90
	2C	1,6	1,6	0,35	0,90
	1L	1,6	1,6	0,35	0,90
	1N	1,6	1,6	0,35	0,90
	1Q	1,6	1,6	0,35	0,90
	3D	1,6	1,6	0,35	0,90
	3H	1,6	1,6	0,35	0,90
	3N	1,6	1,6	0,35	0,90
	3L	1,6	1,6	0,35	0,90
	3Q	1,6	1,6	0,35	0,90
	3S	1,6	1,6	0,35	0,90
	4A	1,6	1,6	0,35	0,90
	4B	1,6	1,6	0,35	0,90
	4C	1,6	1,6	0,35	0,90
	4D	1,6	1,6	0,35	0,90
	4J	1,6	1,6	0,35	0,90
	4L	1,6	1,6	0,35	0,90
	4N	1,6	1,6	0,35	0,90
	4Q	1,6	1,6	0,35	0,90
	4S	1,6	1,6	0,35	0,90
	5A	1,6	1,6	0,35	0,90
	5B	1,6	1,6	0,35	0,90
	5C	1,6	1,6	0,35	0,90
	5D	1,6	1,6	0,35	0,90
	5J	1,6	1,6	0,35	0,90
	5L	1,6	1,6	0,35	0,90

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM:	3,22	ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD
			m3

ZAPATA TIPO 4

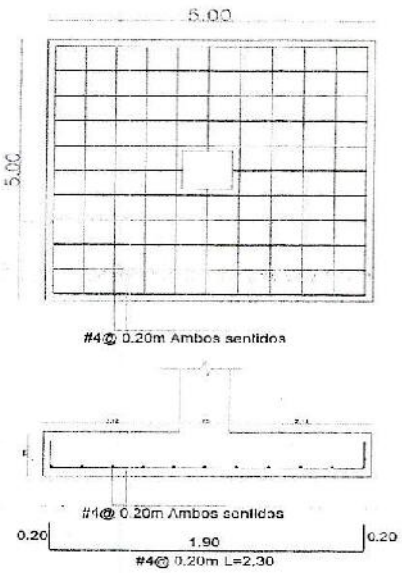

	5Q	1,6	1,6	0,35	0,90
	5S	1,6	1,6	0,35	0,90
	6A	1,6	1,6	0,35	0,90
	6B	1,6	1,6	0,35	0,90
	6C	1,6	1,6	0,35	0,90
	6D	1,6	1,6	0,35	0,90
	6J	1,6	1,6	0,35	0,90
	6L	1,6	1,6	0,35	0,90
	6N	1,6	1,6	0,35	0,90
	6Q	1,6	1,6	0,35	0,90
	6S	1,6	1,6	0,35	0,90
	7A	1,6	1,6	0,35	0,90
Z-2	7B	1,6	1,6	0,35	0,90
	7C	1,6	1,6	0,35	0,90
	7D	1,6	1,6	0,35	0,90
	7H	1,6	1,6	0,35	0,90
	7J	1,6	1,6	0,35	0,90
	7L	1,6	1,6	0,35	0,90
	7N	1,6	1,6	0,35	0,90
	7S	1,6	1,6	0,35	0,90
	9C	1,6	1,6	0,35	0,90
	9D	1,6	1,6	0,35	0,90
	9F	1,6	1,6	0,35	0,90
	9I	1,6	1,6	0,35	0,90
	9K	1,6	1,6	0,35	0,90
	9M	1,6	1,6	0,35	0,90
	11M	1,6	1,6	0,35	0,90
	12X	1,6	1,6	0,35	0,90
	12U	1,6	1,6	0,35	0,90
	12T	1,6	1,6	0,35	0,90
	12R	1,6	1,6	0,35	0,90
	12P	1,6	1,6	0,35	0,90


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 3,22	ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		UNIDAD: m3

ZAPATA TIPO 5

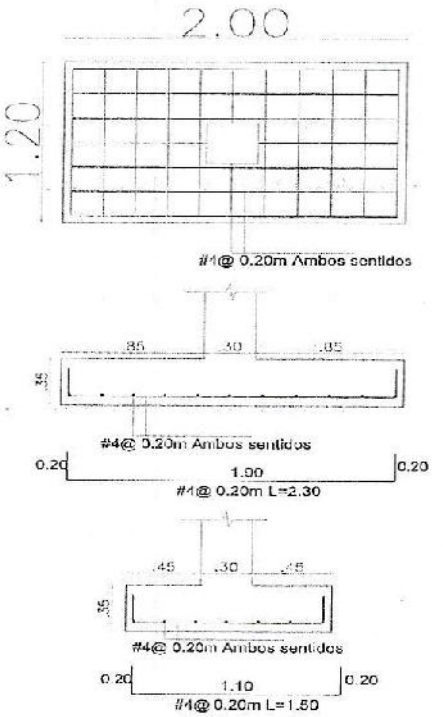

Z-1	12M	1,6	1,6	0,35	0,90
	14C	1,6	1,6	0,35	0,90
	14I	1,6	1,6	0,35	0,90
	14K	1,6	1,6	0,35	0,90
	14M	1,6	1,6	0,35	0,90
	14P	1,6	1,6	0,35	0,90
	14R	1,6	1,6	0,35	0,90
	14U	1,6	1,6	0,35	0,90
	14X	1,6	1,6	0,35	0,90
	15C	1,6	1,6	0,35	0,90
	15I	1,6	1,6	0,35	0,90
	15K	1,6	1,6	0,35	0,90
	15S	1,6	1,6	0,35	0,90
	15T	1,6	1,6	0,35	0,90
	15U	1,6	1,6	0,35	0,90
	16U	1,6	1,6	0,35	0,90
	17S	1,6	1,6	0,35	0,90
	17Q	1,6	1,6	0,35	0,90
	17O	1,6	1,6	0,35	0,90
	17M	1,6	1,6	0,35	0,90
Z-3	14F	1,8	1,8	0,35	1,13
	14T	1,8	1,8	0,35	1,13
	15G	1,8	1,8	0,35	1,13
	15M	1,8	1,8	0,35	1,13
	15O	1,8	1,8	0,35	1,13
	15Q	1,8	1,8	0,35	1,13
Z-4	1S	2	2	0,35	1,40
	3I	2	2	0,35	1,40
	8U	2	2	0,35	1,40
	8T	2	2	0,35	1,40
	10U	2	2	0,35	1,40
	10T	2	2	0,35	1,40


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM°: 3,22	ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		UNIDAD: m3

ZAPATA TIPO 6

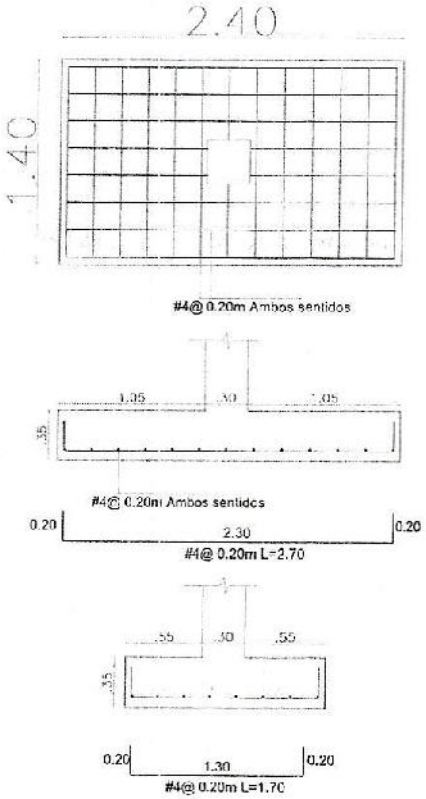

	10R	2	2	0,35	1,40
	5S	2	2	0,35	1,40
	14D	2	2	0,35	1,40
	15D	2	2	0,35	1,40
Z-5	7Q	1,2	2	0,35	0,84
Z-6	8R	1,4	2,4	0,35	1,18
AUDITORIO					
Z-2	A-1	1,6	1,6	0,35	0,90
	B-1	1,6	1,6	0,35	0,90
	C-1	1,6	1,6	0,35	0,90
	B-3	1,6	1,6	0,35	0,90
	A-3	1,6	1,6	0,35	0,90
	C-3	1,6	1,6	0,35	0,90
Z-1	A-2	1,3	1,3	0,35	0,59
	C-2	1,3	1,3	0,35	0,59
Cuarto eléctrico	6	1	1	0,25	1,50
	3	1,5	1,5	0,3	2,03
CERRAMIENTO					
Z-1	4	1,3	1,3	0,35	2,37
				TOTAL	131,49

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO

Kathleen Díaz H.S.S

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO N°.		PROYECTO:	FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CCB	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		Unidad
ITEM=5.1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 D=2CM.		M2

AREA	Descripción	L=longitud	H= Altura	B=ancho	A= area	Cantidad	(m2)
1	BAÑOS+ASEO+DUCHA+LAVAPATO+BAÑOS DE CONSULTORIOS+BAÑOS VESTIER+BAÑOS NIÑOS+BAÑOS DISCAPACITADOS MIXTOS+BAÑOS ENFERMERAS	541,44	2,8				1516,0
	P1		2,5	1	2,5	1	-2,5
	P5		2,5	0,9	2,25	13	-29,3
	P6		2,5	0,8	2	1	-2,0
	V03		0,6	1,2	0,72	17	-12,2
	V04		0,9	1,8	1,62	7	-11,3
						SUBTOTAL	1458,7
2	GARITA+AUDITORIO+CONSULTORIO 1-CRECIMIENTO Y DESARROLLO + CONSULTORIO 2-CITOLOGIA+ CONSULTORIO 3 - VACUNACION + HALL + RESIDUO + DISPENSACION + HALL DE CONSULTORIOS, SALA DE ESPERA+ OFICINA ADMINISTRATIVA + CONSULTORIO 4 + CONSULTORIO 5 + CONSULTORIO 6 + CONSULTORIO 7 + RESIDUOS + CONSULTORIO 8 + CONSULTORIO 9 + CONSULTORIO 10 + ODONTOLOGIA+ RAYOS X + COMPRESORES + ESTERILIZACION + CONSULTORIO 11 + CONSULTORIO 12 + HALL + CONSULTORIO 13 + CONSULTORIO 14 + CONSULTORIO 15 + CONSULTORIO 16 + CONSULTORIO 17+SALA DE ESPERA PRINCIPAL + TOMA DE MUESTRAS + TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES –TBC +URO ANALISIS – COLORACION + ORINA – VESTIER + RECEPCION Y ENTREGA DE RESULTADOS + CIRCULACION + SEROLOGIA + QUIMICA + HEMATOLOGIA + DEPOSITO DE REACTIVOS + TRANSITORIO DE RESIDUOS + AREA DE ESPERAS DE CAMILLAS + SALA DE RAYOS X + AREA CIRCULACION SUCIA E INSUMOS + DESCANSO MEDICO + LAVADO VESTERIZACION + MICROBIOLOGIA + SALA DE LECTURA + VESTIER PARA PERSONAL + SALA DE ESPERA PACIENTES DE RAYOS X + AREA DE DISPARO + ARCHIVO DE PERSONAL + RECEPCION RAYOS X+DEPOSITOS DE MATERIAL ESTERIL + EMPAQUE + CIRCULACION + + EQUIPOS + ANTESALA + VESTIER PARA MATERNAS – TRABAJO DE PARTO + RECEPCION PACIENTE + AUTOCLAVE + ENFERMERIA Y PUERPERIO + LACTANCIA + TRAPOS LIMPIOS + EQUIPOS + CUARTO TECNICO + LAVAPATOS + TRAPOS SUCIOS + RESIDUOS + DEPARTAMENTO MEDICO + ROPA SUCIA + AREA DE ALMACENAMIENTO + EXTYP DE FORMULAS + SALA DE ESPERA TRIAGE + CUSTODIA – PROCEDIMIENTOS + RECEPCION Y FACTURACION + TRIAGE + SALA DE ESPERA CONSULTA URGENCIA – CONSULTORIO 1 + CONSULTORIO 2 + CONSULTORIO 3 + REANIMACION + RESIDUOS + ERA – EDA +SEVICIO DE MEDICAMENTOS+BOMBAS + AIRES ACONDICIONADOS + BODEGA + TABLEROS ELECTRICOS – RACK + RECEPCION DE ALIMENTOS + R. RECICLABLES + ACOPIO ROPA LIMPIA + NEVERAS + ACOPIO ROPA SUCIA + R. PELIGROSOS + SALA DE ESPERA+ CADAVERES+ CENTRAL DE GASES + R. ORDINARIOS + DESCANSO / CAFETIN MEDICOS + ROPA SUCIA – AREA DE OBSERVACION HOMBRES + CIRCULACION + RESIDUOS+ TRABAJOS SUCIOS + TRAPOS LIMPIOS + ROPA LIMPIA + EQUIPOS – MEDICAMENTOS + AREA DE OBSERVACION NIÑOS + AREA DE OBSERVACION MUJERES	2159,6	2,8				6046,9
	P1		2,5	2	5	1	-5,0
	P2		2,5	1,5	3,75	5	-18,8
	P4		2,5	1	2,5	26	-65,0
	P5		2,5	0,9	2,25	36	-81,0
	P6		2,5	0,8	2	16	-32,0
	P7		2,5	1,5	3,75	2	-7,5
	V01		0,6	0,5	0,3	7	-2,1
	V02		0,9	1	0,9	1	-0,9
	V03		0,6	1,2	0,72	24	-17,3
	V04		0,9	1,8	1,62	33	-58,5
	V05		1,35	2,4	3,24	9	29,2
	V06		1,35	3,2	4,32	10	-43,2
	Vano		2,82	3,45	9,729	1	-9,7
						SUBTOTAL	5681,8

0100

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO N°:		PROYECTO:	FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CCG	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINÚ	MAYO DE 2021
INTERVENTORIA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		Unidad
ITEM=5,1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 D=2CM.		M2

3	PASILLOS	101,69			3,45		350,8
	P3		2,5	1,1	2,75	1	-2,8
	P4		2,5	1	2,5	5	-12,5
	P5		2,5	0,9	2,25	1	-2,3
	V03		0,6	1,2	0,72	5	-3,6
	V04		0,9	1,8	1,62	9	-14,6
	V05		1,35	2,4	3,24	2	-6,5
	Vano		20,25	3,45	69,887	1	-69,9
						SUBTOTAL	238,8
	PUERTAS						
4	P1		0,35	2	0,7	1	0,7
	P2		0,35	1,5	0,525	16	8,4
	P3		0,35	1,1	0,385	3	1,2
	P4		0,35	1	0,35	66	23,1
	P5		0,35	0,9	0,315	7	2,2
	P6		0,35	0,8	0,28	26	7,3
						SUBTOTAL	42,84
5	MESON TIPO 1	10,21	1			2	20,4
		10,21	0,25			2	5,1
						SUBTOTAL	25,5
6	MESON TIPO 2	9,2	1			2	18,4
		9,2	0,25			2	4,6
						SUBTOTAL	23,0
7	MESON TIPO 3	27,9	1			2	55,8
8	MESON TIPO 4	79,2	1				79,2
9	SUBESTACIÓN ELECTRICA	59,5	3,38				201,1
	P4		2,5	1,9	4,75	3	-14,3
	P5		2,5	0,65	1,625	1	-1,6
						SUBTOTAL	185,2

ÁREA	ALTURA	ANCHO	(-) PUERTA (m2)	(-)VENTANA	(-) OTROS	CANTIDAD	
	MUROS EXTERIORES NIVEL 0+000 A 0+003.9						
FACHADA ESTE	3,9	44,53		10,08			163,59
FACHADA SUR	3,9	79,54	2,5	30,33			277,38
FACHADA NORTE	3,9	53,83	18,125	21,87			169,16
FACHADA OESTE	3,9	78,8	5	36,66			265,68
	AUDITORIO						
CONTORNO	3,9	46,95	5	1,44			176,67
	CUARTO ELÉCTRICO						
CONTORNO	3,85	34	10				120,90
	MUROS FACHADAS						
	CAMU						
FACHADA ESTE	1,99	44,53				2	177,23
FACHADA SUR	1,99	79,54				2	316,57
FACHADA NORTE	1,99	50				2	199,00
	0,72	14,5				2	20,88
	0,72	19,74				2	28,43
	1,99	77,66				2	309,17


CONSORCIO SAN MIGUEL CCG	MEMORIA DE CANTIDADES						CONSORCIO SAN MIGUEL CCG
		PROYECTO:					
CONTRATO N°.		CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ					FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CCG						MAYO DE 2021
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SH HOSPITALARIO						Unidad
ITEM=5,1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 0=2CM.						M2
FACHADA OESTE	0,72	15,85				2	22,82
	0,72	25,14				2	36,20
	AUDITORIO						
FACHADA ESTE - SUR	1,99	10,36				4	82,47
FACHADA NORTE - OESTE	1,99	13,12				4	104,44
	CUARTO ELÉCTRICO						
CONTORNO	0,54	34				2	36,72
	MUROS CULATA - TEJA TERMOACUSTICA						
	LARGO	ALTO 1	ALTO 2				
CUBIERTA 1	8,4	0,72				2	12,10
CUBIERTA 1 - CULATA	6,53	0,72	1,5			4	28,97
CUBIERTA 2	13	0,72				2	18,72
CUBIERTA 2 - CULATA	8,12	0,72	1,5			4	36,05
CUBIERTA 3	89,1	0,72				1	64,15
CUBIERTA 3	89,1	0,72				1	64,15
CUBIERTA 3	6,82	1,1				1	7,50
CUBIERTA 3 - CULATA	8,1	1,7	0,72			4	39,20
CUBIERTA 3 - CULATA	5,8	1,1	0,72			2	10,56
CUBIERTA 4	4,4	0,72				1	3,17
CUBIERTA 4	10,6	0,72				1	7,63
CUBIERTA 4	14,9	1,9				1	28,31
CUBIERTA 4 - CULATA	12,25	1,9	0,72			2	32,10
CUBIERTA 4 - CULATA	10,74	1,9	0,72			2	28,14
CUBIERTA 5	25,18	0,72				2	36,26
CUBIERTA 5 - CULATA	10,46	0,72	1,98			4	56,48
	MUROS CULATA - TEJA TRASLUCIDA						
	LARGO	ALTO 1	ALTO 2	AREA			
CUBIERTA 1	17,14	1,1				2	37,71
CUBIERTA 1 - CULATA				7,7		2	15,40
CUBIERTA 2	16,55	1,1				2	36,41
CUBIERTA 2 - CULATA				4,7		2	9,40
CUBIERTA 3	12,54	1,1				2	27,59
CUBIERTA 3 - CULATA				3,13		2	6,25
CUBIERTA 4	16,4	1,1				2	36,08
CUBIERTA 4 - CULATA				3,15		2	6,30
						SUBTOTAL	3155,9
	TOTAL PAÑETE m2						10946,78

0102

MEMORIA DE CANTIDADES

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.		CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CCS		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		Unidad
ITEM=5.1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 D=2CM.		M2

OBSERVACIONES : VER PLANO

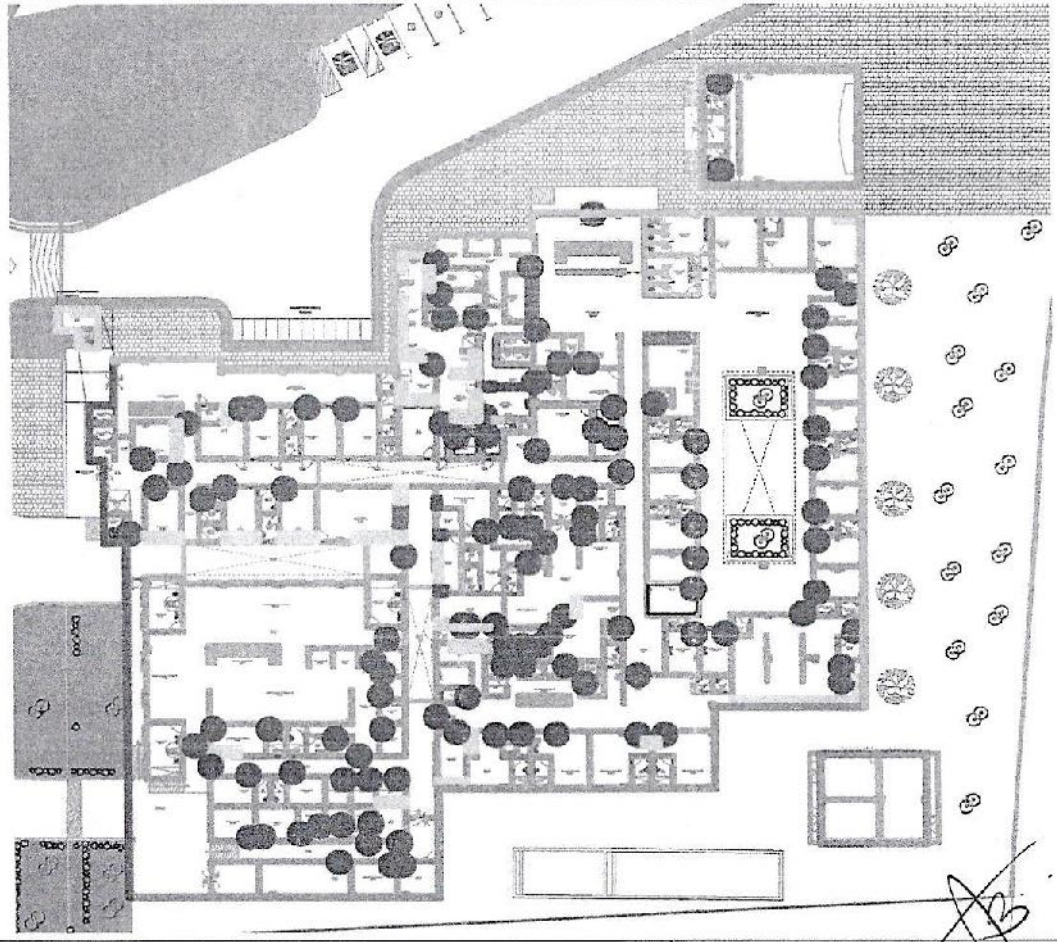

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CCS	Consorcio BH hospitalario

Kathleen Díaz Hoyos

0103

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	MEMORIA DE CANTIDADES		CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	5,4	PAÑETE MALLA LINEAL EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	UNIDAD
			ml

Localizacion	Cantidad de Filos	Largo Filo(m)	Total ml de pañete
EJES E-X ,NUMERAL 18	11	3,6	39,6
EJE X Y NUMERAL 12-18	7	3,6	25,2
EJE E Y NUMERAL 15-18	4	3,6	14,4
EJES C-E Y NUMERAL 15	2	3,6	7,2
EJE C Y NUMERAL 9-15	4	3,6	14,4
EJES A-C Y NUMERAL 9	1	3,6	3,6
EJE A Y NUMERAL 2-9	5	3,6	18
EJES A-L Y NUMERAL 2	3	3,6	10,8
EJES L-S Y NUMERAL 1	3	3,6	10,8
EJE S Y NUMERAL 1-7	6	3,6	21,6
EJES S-V Y NUMERAL 8	3	3,6	10,8
EJES V-W Y NUMERAL 8-12	3	3,6	10,8
AUDITORIO	12	3,6	43,2
TOTAL			230,4

OBSERVACIONES:

Kathleen Díaz H.S.S.

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	MEMORIA DE CANTIDADES		CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	5,5	FILOS EN ESTUCO PARA INTERIORES		UNIDAD ML
Localizacion		**Cantidad**	**H=3m**	**Metros Lineales de filo**
Eje X -Numeral 17-18		48	2,9	139,2
Ejes X-U y Numeral 15-17		4	2,9	11,6
Ejes T-I y Numeral 14-15		25	2,9	72,5
Ejes X-U y Numeral 14-15		2	2,9	5,8
Ejes T-E y Numeral 15-17		24	2,9	69,6
Ejes I-E y Numeral 14-15		12	2,9	34,8
Ejes X-P y Numeral 12-14		28	2,9	81,2
Ejes W-P y Numeral 8-12		52	2,9	150,8
Ejes K-P y Numeral 9-14		32	2,9	92,8
Ejes E-K y Numeral 9-14		36	2,9	104,4
Ejes D-C y Numeral 9-15		42	2,9	121,8
Ejes A-C y Numeral 2-9		38	2,9	110,2
Ejes C-H y Numeral 2-9		22	2,9	63,8
Ejes H-K y Numeral 2-9		28	2,9	81,2
Ejes L-N y Numeral 1-8		36	2,9	104,4
Ejes O-S y Numeral 1-7		35	2,9	101,5
Auditorio		21	2,9	60,9
Total ML de Filo de Estuco				**1406,50**

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	MEMORIA DE CANTIDADES							CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
					PROYECTO:			
CONTRATO Nº.	157				CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ			FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6							MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO							UNIDAD
ITEM:	5,7	ESTUCO PRESENTACIÓN PLASTICA PARA EXTERIORES, APLICADO EN 4 CAPAS, HD= DE 0 A 9,5 METROS, UTILIZANDO EQUIPOS CERTIFICADOS						M2
ÁREA	ALTURA	ANCHO	(-) PUERTA	(-)VENTANA	(-) OTROS	CANTIDAD		
MUROS EXTERIORES NIVEL 0+000 A 0+003,9								
FACHADA ESTE	3,9	44,53		10,06				163,59
FACHADA SUR	3,9	79,54	2,5	30,33				277,38
FACHADA NORTE	3,9	53,63	18,125	21,87				139,16
FACHADA OESTE	3,9	78,8	5	36,66				256,66
AUDITORIO								
CONTORNO	3,9	46,95	5	1,44				176,67
CUARTO ELÉCTRICO								
CONTORNO	3,85	34	10					120,90
MUROS FACHADAS								
CAMU								
FACHADA ESTE	1,99	44,53				2		177,23
FACHADA SUR	1,99	79,54				2		316,57
FACHADA NORTE	1,99	50				2		199,00
	0,72	14,5				2		20,88
	0,72	19,74				2		28,43
FACHADA OESTE	1,99	77,68				2		309,17
	0,72	15,85				2		22,82
	0,72	25,14				2		36,20
AUDITORIO								
FACHADA ESTE - SUR	1,99	10,36				4		82,47
FACHADA NORTE - OESTE	1,99	13,12				4		104,44
CUARTO ELÉCTRICO								
CONTORNO	0,54	34				2		36,72
MUROS CULATA - TEJA TERMOACUSTICA								
	LARGO	ALTO 1	ALTO 2					
CUBIERTA 1	8,4	0,72				2		12,10
CUBIERTA 1 - CULATA	6,53	0,72	1,5			4		28,97
CUBIERTA 2	13	0,72				2		18,72
CUBIERTA 2 - CULATA	8,12	0,72	1,5			4		36,05
CUBIERTA 3	89,1	0,72				1		64,15

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.		157		PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ				FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN MIGUEL CC6						
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO BH HOSPITALARIO						UNIDAD
ITEM:	5,7	ESTUCO PRESENTACIÓN PLASTICA PARA EXTERIORES, APLICADO EN 4 CAPAS, HD= DE 0 A 9,5 METROS, UTILIZANDO EQUIPOS CERTIFICADOS						M2
CUBIERTA 3	89,1	0,72				1		64,15
CUBIERTA 3	6,82	1,1				1		7,50
CUBIERTA 3 - CULATA	8,1	1,7	0,72			4		39,20
CUBIERTA 3 - CULATA	5,8	1,1	0,72			2		10,56
CUBIERTA 4	4,4	0,72				1		3,17
CUBIERTA 4	10,6	0,72				1		7,63
CUBIERTA 4	14,9	1,9				1		28,31
CUBIERTA 4 - CULATA	12,25	1,9	0,72			2		32,10
CUBIERTA 4 - CULATA	10,74	1,9	0,72			2		28,14
CUBIERTA 5	25,18	0,72				2		36,26
CUBIERTA 5 - CULATA	10,46	0,72	1,98			4		56,48
MUROS CULATA - TEJA TRASLUCIDA								
	LARGO	ALTO 1	ALTO 2	AREA				
CUBIERTA 1	17,14	1,1				2		37,71
CUBIERTA 1 - CULATA				7,7		2		15,40
CUBIERTA 2	16,55	1,1				2		36,41
CUBIERTA 2 - CULATA				4,7		2		9,40
CUBIERTA 3	12,54	1,1				2		27,59
CUBIERTA 3 - CULATA				3,13		2		6,26
CUBIERTA 4	16,4	1,1				2		36,08
CUBIERTA 4 - CULATA				3,15		2		6,30
								3155,91
TOTAL ESTUCO PARA EXTERIORES								
OBSERVACIONES: VER PLANO ARQUITECTONICO Y PLANOS DE CUBIERTAS								

Kathleen Díaz H.SS

VO BO KATHLEEN DÍAZ HOYOS
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6

VO BO RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Consorcio BH hospitalario


0107

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	FECHA
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 6,1	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA		UNIDAD m2

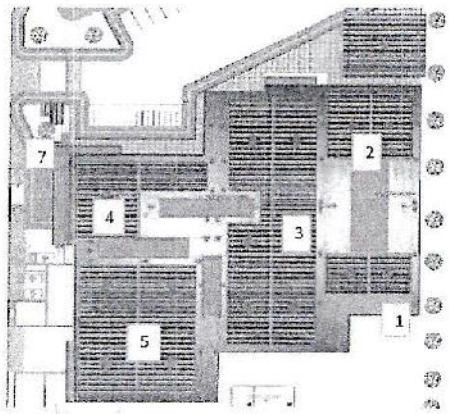

No	UBICACIÓN	L1	L2	CANTID	Total
	Auditorio	12,37	15,3	1	189,26
1	CUBIERTA 1	8,41	7,2	1	60,55
		8,41	6,3	1	52,98
2	CUBIERTA 2	13	8,3	2	215,80
3	CUBIERTA 3	18,25	8,3	1	151,48
		47,9	8,3	1	397,57
		23	8,3	1	190,90
		6,82	2,6	1	17,73
4	Urgencia	4,4	10,9	1	47,96
		14,9	12,25	1	182,53
5	CUBIERTA 5	25,2	10,9	2	549,36
7	Caseta de Vigilancia	4,2	2,7	1	11,34
		2,36	1,55	1	3,66
			TOTAL		2071,12

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANOS ARQUITECTONICOS.

Kathleen Diaz H.S.S

V0 B0 KATHLEEN DIAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO N°.		PROYECTO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM: 6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRY-WALL		Unidad: M2

ITEM	Descripción	L=longitud	B=ancho	A= area	Cantidad	(m2)
1	CONSULTORIO 1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO + CONSULTORIO 2-CITOLOGIA+ CONSULTORIO 3 - VACUNACION + HALL + RESIDUO + DISPENSACION + HALL DE CONSULTORIOS, SALA DE ESPERA+ OFICINA ADMINISTRATIVA + CONSULTORIO 4 + CONSULTORIO 5 + CONSULTORIO 6 + CONSULTORIO 7 + RESIDUOS + CONSULTORIO 8 + CONSULTORIO 9 + CONSULTORIO 10 + ODONTOLOGIA+ RAYOS X + COMPRESORES + ESTERILIZACION + CONSULTORIO 11 + CONSULTORIO 12 + HALL + CONSULTORIO 13 + CONSULTORIO 14 + CONSULTORIO 15 + CONSULTORIO 16 + CONSULTORIO 17+SALA DE ESPERA PRINCIPAL + TOMA DE MUESTRAS + TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES +TBC +URO ANALISIS + COLORACION + OFICINA + VESTIER + RECEPCION Y ENTREGA DE RESULTADOS + CIRCULACION + SEROLOGIA + QUIMICA + HEMATOLOGIA + DEPOSITO DE REACTIVOS + TRANSITORIO DE RESIDUOS + AREA DE ESPERAS DE CAMILLAS + SALA DE RAYOS X + AREA CIRCULACION SUCIA E INSUMOS + DESCANSO MEDICO + LAVADO Y ESTERILIZACION + MICROBIOLOGIA + SALA DE LECTURA + VESTIER PARA PERSONAL + SALA DE ESPERA PACIENTES DE RAYOS X + AREA DE DISPARO + ARCHIVO DE PERSONAL + RECEPCION RAYOS X+DEPOSITOS DE MATERIAL ESTERIL + EMPAQUE + CIRCULACION + + EQUIPOS + ANTESALA + VESTIER PARA METERNAS + TRABAJO DE PARTO + RECEPCION PACIENTE + AUTOCLAVE + ENFERMERIA Y PUEPERIO + LACTANCIA + TRAPOS LIMPIOS + EQUIPOS + CUARTO TECNICO + LAVAPATOS + TRAPOS SUCIOS + RESIDUOS + DEPARTAMENTO MEDICO + ROPA SUCIA + AREA DE A. AL RECINAC + EXT Y P DE FORMULAS + SALA DE ESPERA TRIAGE + CUSTODIA + PROCEDIMIENYOS + RECEPCION Y FACTURACION + TRIAGE + SALA DE ESPERA CONSULTA URGENCIA + CONSULTORIO 1 + CONSULTORIO 2 + CONSULTORIO 3 + REANIMACION + RESIDUOS + ERA + EDA +SEVICIO DE MEDICAMENTOS+BOMBAS + AIRES ACONDICIONADOS + BODEGA + TABLEROS ELECTRICOS + RACK + RECEPCION DE ALIMENTOS + R. RECICLABLES + ACOPIO ROPA LIMPIA + NEVERAS + ACOPIO ROPA SUCIA + R. PELIGROSOS + SALA DE ESPERA+ CADAVERES+ CENTRAL DE GASES + R. ORDINARIOS + DESCANSO / CAFETIN MEDICOS + ROPA SUCIA + AREA DE OBSERVACION HOMBRES + CIRCULACION + RESIDUOS+ TRABAJOS SUCIOS + TRAPOS LIMPIOS + ROPA LIMPIA + EQUIPOS + MEDICAMENTOS + AREA DE OBSERVACION NIÑOS + AREA DE OBSERVACION MUJERES+BAÑOS+ASEO+DUCHA+LAVAPATO+BAÑOS DE CONSULTORIOS+BAÑOS VESTIER+BAÑOS NIÑOS+BAÑOS DISCAPACITADOS MIXTOS+BAÑOS ENFERMERAS			3207,1		3207,1
2	AUDITORIO + BAÑOS			135,86		135,9
3	GARITA + BAÑO			10,2		10,2
4	SUBESTACION ELECTRICA			73,5		73,5
5		146,4	0,7	102,48		102,5
6	MAMPOSTERIA	1757,12	0,1	175,71		-175,7
7	CUBIERTA TRASLUCIDA #1			121,04		121,04
8	CUBIERTA TRASLUCIDA #2			66,50		66,50
9	CUBIERTA TRASLUCIDA #3			33,08		33,08
10	CUBIERTA TRASLUCIDA #4			43,52		43,52
COLUMNA	TIPO 1	0,4	0,3		13	-1,6
COLUMNA	TIPO 2	0,3	0,3		126	-11,3
	TOTAL CIELO RASO m2					**3605,00**

0109

OBSERVACIONES : VER PLANO

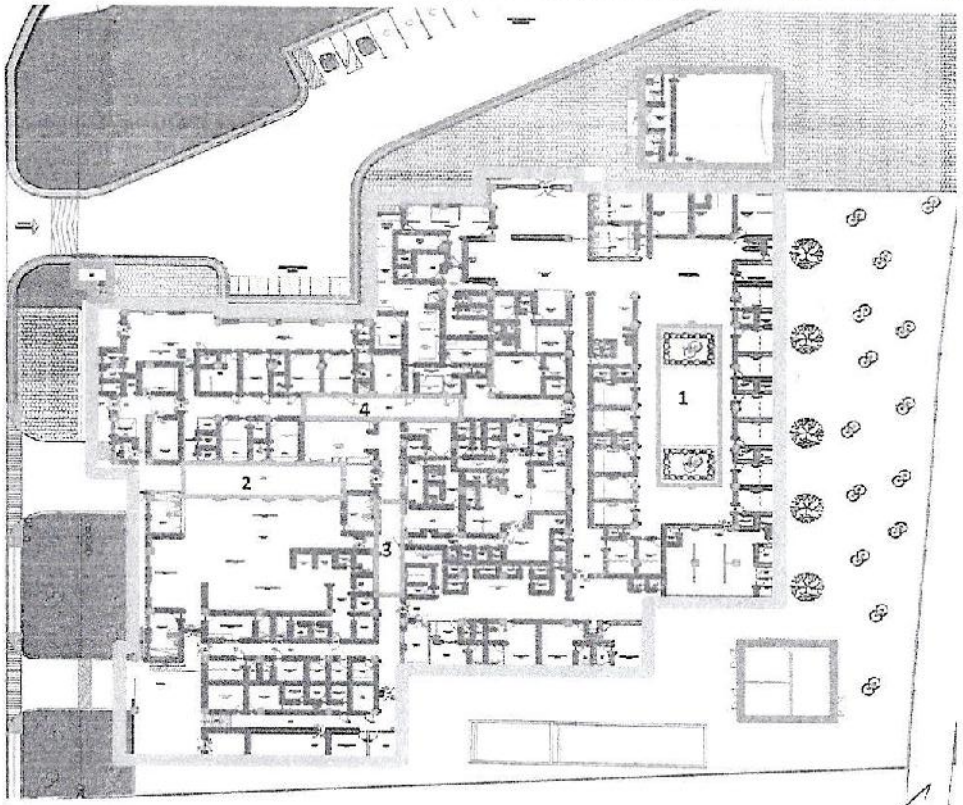

Kathleen Díaz H.S.S.f
V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6

V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Consorcio BH hospitalario

0110


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM:	6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL METALICO SEGÚN DISEÑO	UNIDAD Kg

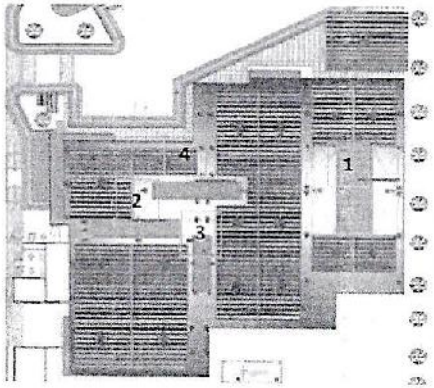

	ÁREA	ESPECIFICACIÓN	LONGITUD	CANT	Total ML	Peso Kg	Total Kg.
	Auditorio	PHR305mmx80mmx2mm e=2.50mm	12,36	8	98,88	9,77	966,06
	Consulta Externa 1	PHR C220mmx80mmx20mm e=2,0mm	12,77	20	255,4	6,37	1626,90
	consulta Externa 2		8,18	10	81,8	6,37	521,07
	Lab + Obstetricia		22,72	4	90,88	6,37	578,91
			47,67	8	381,36	6,37	2429,26
			17,98	4	71,92	6,37	458,13
	Servcios Generales		24,99	14	349,86	6,37	2228,61
	Urgencia		4,16	7	29,12	6,37	185,49
			14,61	8	116,88	6,37	744,53
	Caseta de Vigilancia	PHR C220mmx80mmx20mm e=2,0mm	2	3	6	6,37	38,22
			3,65	3	10,95	6,37	69,75
						SUB - TOTAL	9846,92

		UBIC.	Longuitud de Correa	Cantidad	Total ml Cubierta
PERFIL EN C 160X60X2	PERFILES PARA CUBIERTA TRASLUCIDA	CUBIERTA 1	17,45	8	139,6
		CUBIERTA 2	16,6	5	83
		CUBIERTA 3	10,9	4	43,6
		CUBIERTA 4	16,35	4	65,4
				TOTAL	331,60
				PESO	4,77
				SUB - TOTAL	1581,73
				TOTAL	11428,65

OBSERVACIONES: VER PLANOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA METALICA

Kathleen Díaz Hss.


V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0111

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 6,7	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO		UNIDAD: ml

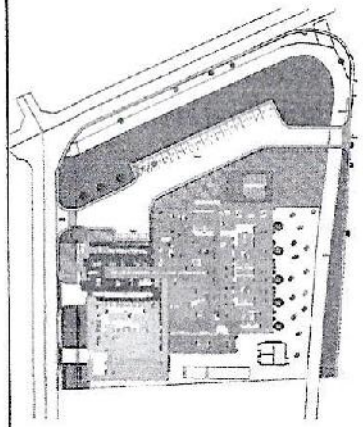

PUERTA	ANCHO	PUERTA	ANCHO
P-01	2	P-05	0,9
P-02	1,5	P-06	0,8
P-03	1,1	P-07	1,5
P-04	1		

ÁREA	UBICACIÓN	LONGITUD	PUERTAS Y/O VANOS	LONGITUD TOTAL
AUDITORIO	SALON - ENTRADA Y PASILLO	64,66	5,00	59,66
AUDITORIO	BAÑOS	24,46	2,00	22,46
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 1	17,8	1	16,8
CONSULTA EXTERNA	WC HOMBRES-WC MUJERES-HALL	44,56	4	40,56
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 3 - VACUNACIÓN	18,13	1,00	17,13
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 2 - CITOLOGÍA+BAÑO	23,43	1,00	22,43
CONSULTA EXTERNA	ASEO	5	0,80	4,2
CONSULTA EXTERNA	RESIDUOS	7,5	1,00	6,5
CONSULTA EXTERNA	OFICINA ADMINISTRATIVA	12,3	1,00	11,3
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 4+WC	19,6	1,00	18,6
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 5+WC	19,33	1,00	18,33
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 6+WC	18,8	1,00	17,8
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 7+WC	19,6	1,00	18,6
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 8+WC	18,96	1,02	17,94
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 9	18,05	1,00	17,05
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 10 +WC	18,76	1,00	17,76
CONSULTA EXTERNA	CUARTO (EJE I - EJE 18)	5,1	0,80	4,3
CONSULTA EXTERNA	RAYOS X	8,06	0,90	7,16
CONSULTA EXTERNA	COMPRESORES	6,7	1,00	5,7

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6,7

ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO

UNIDAD: ml

CONSULTA EXTERNA	ESTERILIZACIÓN	9,27	1,00	8,27
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	47,57	1,50	46,07
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 11	13,14	1,00	12,14
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 12	13,96	1,00	12,96
CONSULTA EXTERNA	WC HALL	5,69	0,80	4,89
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 13	13,76	1,00	12,76
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 14	14,21	1,00	13,21
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 15+WC	19,34	1,00	18,34
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 16	18,51	1,00	17,51
CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 17	19,52	1,00	18,52
CONSULTA EXTERNA	DISPENSACIÓN	37.00	2,6	34,4
CONSULTA EXTERNA	RESIDUOS	4,58	0,8	3,78
CONSULTA EXTERNA	ASEO	4,58	0,8	3,78
CONSULTA EXTERNA	JARDINERAS	38		38
CONSULTA EXTERNA	PASILLO CONS. EXTERNA	100,09	26,69	73,4
HOSPITALIZACIÓN	CUARTO HOSPITALIZACIÓN HOMBRES+WC	28,15	1,9	26,25
HOSPITALIZACIÓN	CUARTO HOSPITALIZACIÓN MUJERES+WC	29,01	1,9	27,11
HOSPITALIZACIÓN	CUARTO HOSPITALIZACIÓN NIÑOS+WC	29,32	1,9	27,42
HOSPITALIZACIÓN	CUARTO HOSPITALIZACIÓN AISLADOS+WC	26,1	1,00	25,1
HOSPITALIZACIÓN	ASEO AISLADO	6,51	0,8	5,71
HOSPITALIZACIÓN	RESIDUOS	6,45	0,8	5,65
HOSPITALIZACIÓN	CURACIONES	14,81	1,5	13,31
HOSPITALIZACIÓN	PASILLO HOS-EXT. Y P. DE FORMULAS-AREA DE CAMILLAS	97,32	17,4	79,92

013

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 6,7	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO		UNIDAD: ml

HOSPITALIZACIÓN	WC VESTIER-WC H Y M PASILLO	18,68	2,7	15,98
HOSPITALIZACIÓN	TRAPOS SUCIOS	6,8	0,8	6
HOSPITALIZACIÓN	LAVAPATOS	6,37	0,8	5,57
HOSPITALIZACIÓN	RESIDUOS	7,05	0,8	6,25
HOSPITALIZACIÓN	DEPARTAMENTO MÉDICO	6,7	0,8	5,9
HOSPITALIZACIÓN	EQUIPOS	6,73	0,8	5,93
HOSPITALIZACIÓN	TRAPOS LIMPIOS	6,8	0,8	6
HOSPITALIZACIÓN	ESTACIÓN DE ENFERMERÍAS	9,72		9,72
HOSPITALIZACIÓN	LACTANCIA	16,66	1	15,66
SERVCIOS GENERALES	BOMBAS	12,98	1	11,98
SERVCIOS GENERALES	AIRES ACONDICIONADOS	13,72	1	12,72
SERVCIOS GENERALES	BODEGA	21,84	1,5	20,34
SERVCIOS GENERALES	TABLERO ELÉCTRICO	14,06	1,5	12,56
SERVCIOS GENERALES	RACK	10,98	1	9,98
SERVCIOS GENERALES	R. RECICLABLES	7,76	0,8	6,96
SERVCIOS GENERALES	NEVERAS	7,76	0,8	6,96
SERVCIOS GENERALES	R. PELIGROSOS	8,16	0,8	7,36
SERVCIOS GENERALES	R. ORDINARIOS Y CIRCULACIÓN	25,59	6,4	19,19
SERVCIOS GENERALES	CENTRAL DE GASES	13,6	1	12,6
SERVCIOS GENERALES	PASILLO SERVICIOS GENERALES	67,28	10	57,28
SERVCIOS GENERALES	PASILLO DESCARGUE	38,72	2,1	36,62
OBSERVACIÓN URGENCIAS	PASILLO SERV. G/RAL CADAVERES, PROCEDIMIENTOS	36,86	7,6	29,26
OBSERVACIÓN URGENCIAS	CADAVERES+WC	18,42	1,24	17,18

0114

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 6,7	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO		UNIDAD: ml

	OBSERVACIÓN URGENCIAS	SALA DE ESPERA+WC	17,08	1,24	15,84
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	ACOPIO ROPA SUCIA	8,98	1	7,98
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	ACOPIO ROPA LIMPIA	8,98	1	7,98
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	RECEPCIÓN DE ALIMENTOS	9,96	1	8,96
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	DESCANSO DE MÉDICOS	22,22	1,24	20,98
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	ASEO	6,92	0,8	6,12
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	ROPA SUCIA	6,92	0,8	6,12
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	RESIDUOS	9,78	0,8	8,98
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	LAVAPATOS	8,22	0,8	7,42
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	TRAPOS SUCIOS	8,22	0,8	7,42
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	TRAPOS LIMPIOS	10,46	0,8	9,66
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	ROPA LIMPIA	6,36	0,8	5,56
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	WC +CIRCULACION ENFERMERIA	16,88	0,24	16,64
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	CIRCULACIÓN Y ÁREA - OBSERV+WC HOMBRE-MUJERES Y NIÑOS	167,9	16,18	151,72
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	ESTACIÓN DE ENFERMERIA	15,96		15,96
	OBSERVACIÓN URGENCIAS	PASILLO OBSER. URG	67,4	13,35	54,05
	OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	ASEO CONTIGUO A LA CICULACION DE LAVADO	5,6	0,8	4,8
	OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	CUARTO TÉCNICO CONTIGUO A LA CIRCULACION DE LAVADO	5,6	0,8	4,8
	OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	RESIDUOS	5,67	0,8	4,87
	OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	ROPA SUCIA	5,4	0,8	4,6
	OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	SALA DE PARTOS	23,08	2,6	20,48
	OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	CUARTO TÉNICO	5,6	0,8	4,8
	OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	CIRCULACIÓN LAVADO	22,47	6,4	16,07

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO
ITEM:	6,7

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 8 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO

UNIDAD: ml

OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	LAVADO	18,97	1	17,97
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	WC VESTIER	9,12	0,9	8,22
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	CIRCULACIÓN EMPAQUE	17,64	3,9	13,74
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	ASEO	5,98	1	4,98
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	EQUIPOS	8,02	1	7,02
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	EMPAQUE	15,05	1	14,05
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	AUTOCLAVE	8,77	1	7,77
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	ASEO TRABAJO DE PARTO	5,4	0,8	4,6
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	DEPÓSITO DE MATERIAL ESTERIL	17,71	2	15,71
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	ENFERMERÍA Y PUERPERIO, CIRCULACIÓN Y TRABAJO DE PARTO	53,06	7,8	45,26
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	WC TRABAJO DE PARTO	8,76	0,9	7,86
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	RECEPCIÓN DE PACIENTES	9,99	2	7,99
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	VESTIER PARA MATERNAS	7,59	2	5,59
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	ANTESALA	11,03	3	8,03
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	WC+VESTIER MUJERES CONTIGUO - ANTESALA-WC CIRCULACION WC M	26,56	4,6	21,96
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	VESTIER HOMBRES CONTIGUO - DEPÓSITO DE MATERIAL ESTERIL-CIRCULACION WC H	24,44	5,2	19,24
CONSULTA - URGENCIAS	SERVICIO DE MEDICAMENTOS	30,84	1	29,84
CONSULTA - URGENCIAS	EDA+WC	23,53	1,9	21,63
CONSULTA - URGENCIAS	ERA+WC	23,13	1,9	21,23
CONSULTA - URGENCIAS	RESIDUOS	6,78	0,8	5,98
CONSULTA - URGENCIAS	REANIMACIÓN	15,42	1,5	13,92
CONSULTA - URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	14,22	1,5	12,72
CONSULTA - URGENCIAS	TRIAGE	18,34	2	16,34

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	FECHA:
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM°: 6,7	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO		UNIDAD: ml

CONSULTA - URGENCIAS	CONSULTORIO 1+WC	22,77	3,8	18,97
CONSULTA - URGENCIAS	CONSULTORIO 2+WC	23,49	3,8	19,69
CONSULTA - URGENCIAS	CONSULTORIO 3+ASEO 3	21,96	3,8	18,16
CONSULTA - URGENCIAS	ASEO	6,08	0,9	5,18
CONSULTA - URGENCIAS	SALA DE ESPERA TRIAGE Y SALA DE ESPERA CONSULTA URGENCIAS	60,27	9,3	50,97
CONSULTA - URGENCIAS	RECEPCIÓN Y FACTURACIÓN SALA DE ESPERA TRIAGE	9,52		9,52
CONSULTA - URGENCIAS	WC MUJERES Y HOMBRES CONS URG	15,08	1,8	13,28
CONSULTA - URGENCIAS	WC MUJERES - HOMBRES Y MIXTO SALA TRIAGE	21,22	2,7	18,52
CONSULTA - URGENCIAS	CUSTODIA	6,9	0,83	6,07
CONSULTA - URGENCIAS	PASILLO+AREA DE CAMILLA	32,16	8,7	23,46
CONSULTA - URGENCIAS	WC EMERGENCIAS	8,64	1,5	7,14
CONSULTA - URGENCIAS	PASILLO SALA DE ESPERA URG	75,5	9,4	66,1
CONSULTA - URGENCIAS	WC HOMBRE Y MUJERES DE ESPERA URG-CIRCULACION	13,68	2,4	11,28
RAYOS X - LABORATORIO	SALA DE RAYOS X	19,08	3	16,08
RAYOS X - LABORATORIO	ARCHIVO DE PERSONAL	8,6	1	7,6
RAYOS X - LABORATORIO	ÁREA DE DISPARO	9,52	2,8	6,72
RAYOS X - LABORATORIO	SALA DE ESPERA PACIENTES RAYOS X	27,44	8	19,44
RAYOS X - LABORATORIO	ASEO	5,46	0,8	4,66
RAYOS X - LABORATORIO	SALA DE LECTURA	10,68	1	9,68

0117

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 6,7	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO		UNIDAD: ml

RAYOS X - LABORATORIO	VESTIER PARA PERSONAL	6,52	0,8	5,72
RAYOS X - LABORATORIO	RECEPCIÓN RAYOS X	12,36	1	11,36
RAYOS X - LABORATORIO	TRANSITORIO DE RESIDUOS	8,18	2	6,18
RAYOS X - LABORATORIO	ASEO-CIRCULACION	24,75	5,9	18,85
RAYOS X - LABORATORIO	DEPÓSITO DE REACTIVOS	9,37	1	8,37
RAYOS X - LABORATORIO	LAVADO Y DESINFECCION	15,57	1	14,57
RAYOS X - LABORATORIO	MICROBIOLOGÍA	14,22	1	13,22
RAYOS X - LABORATORIO	HEMATOLOGÍA, QUÍMICA, SEROLOGÍA, COLORACIÓN, UROANALISIS, TBC,RECEPCION Y CLASIFICACION DE MUESTRAS	55,17	4	51,17
RAYOS X - LABORATORIO	RACK	15,68	1	14,68
RAYOS X - LABORATORIO	PASILLO+AREA CAMILLA	81,41	20,8	60,61
RAYOS X - LABORATORIO	CIRCULACIÓN Y NEVERAS	31,09	7,2	23,89
RAYOS X - LABORATORIO	BODEGA	5,46	0,8	4,66
RAYOS X - LABORATORIO	WC VESTIER H- WC VESTIER M	18,08	1,6	16,48

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM°: 6,7

ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO

UNIDAD: ml

RAYOS X - LABORATORIO	RECEPCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS	13,64	0,8	12,84
RAYOS X - LABORATORIO	OFICINA+WC	18,81	3	15,81
RAYOS X - LABORATORIO	TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES+WC	13,81	3	10,81
RAYOS X - LABORATORIO	TOMA DE MUESTRAS	29,97	3	26,97
RAYOS X - LABORATORIO	SALA DE ESPERA PPAL+PASILLO	135,38	9,1	126,28
RAYOS X - LABORATORIO	CUARTO TECNICO	6,6	0,8	5,8
TERRAZA	TERRAZA GENERAL	30,65	5	25,65
GARITA	GARITA	16,1	2,4	13,7
SERVCIOS GENERALES	JARDINERAS	38		38
				0
			TOTAL	2812,38

OBSERVACIONES: Se anexa Planos acotado en Autocad en Magnetico

Kathleen Diaz H.SC 1

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6

V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Consorcio BH hospitalario

0119

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EH HOSPITALARIO

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM

Descripción	Localización	Ancho (m)	UNIDAD M2 Largo (m)	Area (m2)
	ENTRE EJES X-W Y NUMERAL 14-15-16-17	1,51	16,95	25,59
	ENTRE EJES X-S Y NUMERAL 17-18	1,2	12,77	15,32

0120

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA:
MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM		UNIDAD
				M2

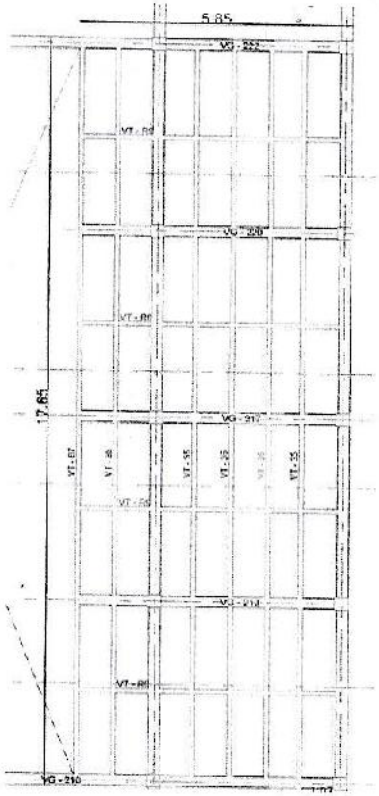

ENTRE EJES S-K Y NUMERAL 16-17-18	5,85	17,65	103,25

0121

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO 3H HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021



ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD: M2



ENTRE EJES K-G Y NUMERAL 17-18	1,07	8,18	8,75

01122

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MEMORIA DE CANTIDADES	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

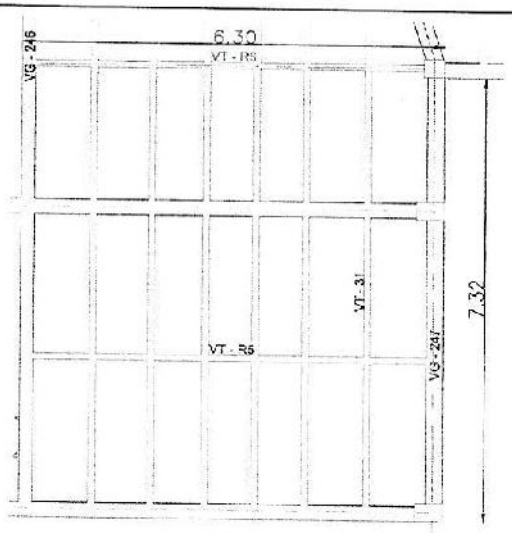ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM		UNIDAD	
				M2	
		ENTRE EJES G-E Y NUMERAL 14-15-16-17-18	18,94	4,44	84,09
		ENTRE EJES E-C Y NUMERAL 14-15	5,3	7,32	46,12

0123

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:


CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

FECHA: MAYO DE 2021

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO


ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD: M2



ENTRE EJES X-S Y NUMERAL 14-15	1,99	14,28	28,42



0124

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MEMORIA DE CANTIDADES	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

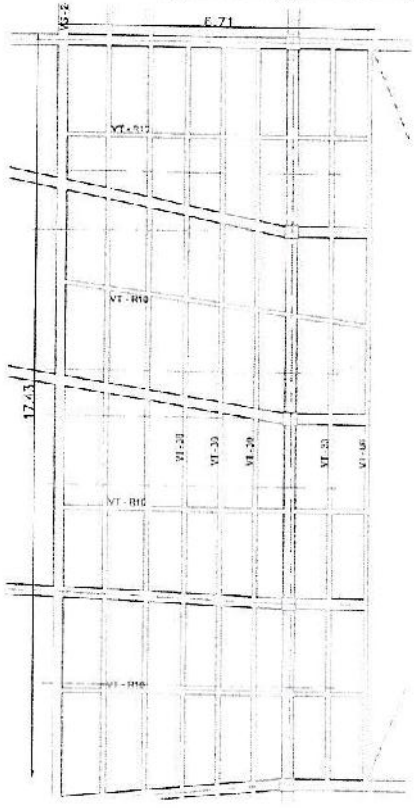ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM		UNIDAD	
				M2	
			ENTRE EJES S-K Y NUMERAL 14-15-16	6,71	17,43	116,96

0125

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MEMORIA DE CANTIDADES	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

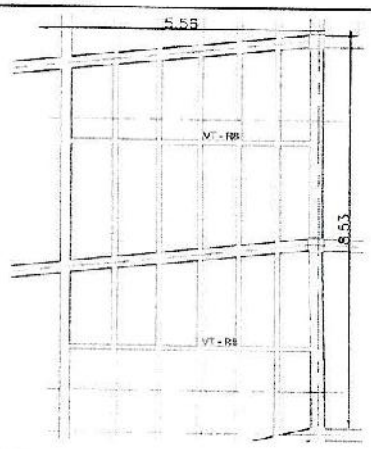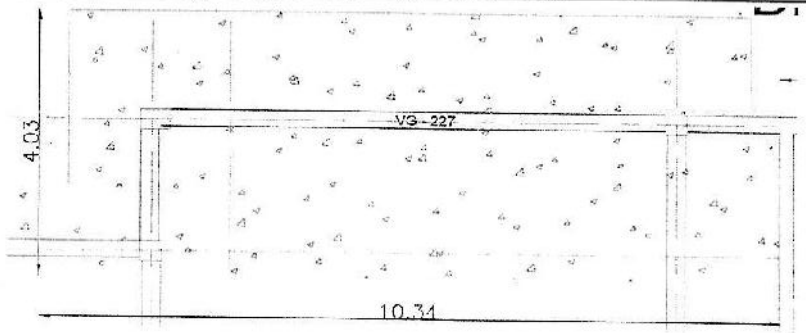ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM		UNIDAD	
				M2	
		ENTRE EJES K-G Y NUMERAL 14-15	5,56	8,53	47,43
		ENTRE EJES X-V Y NUMERAL 11-12-13-14-15	10,34	4,03	41,67

0126

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:


CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD	
				M2



ENTRE EJES X-V Y NUMERAL 8-9-10-11-12	10,61	1,38	14,64



ENTRE EJES W-P Y NUMERAL 8-9-10	4,75	19,79	94,00

0127

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6




CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD	
			M2	

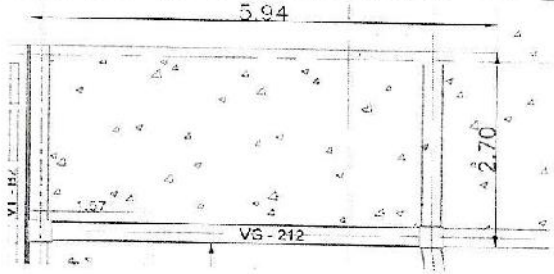	ENTRE EJES Q-P Y NUMERAL 9-10-12	5,68	1,81	10,28
	ENTRE EJES P-M Y NUMERAL 10-12	1,34	5,15	6,90
	ENTRE EJES N-M Y NUMERAL 9-11	5,94	2,7	16,04

0128

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:


CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD
			M2

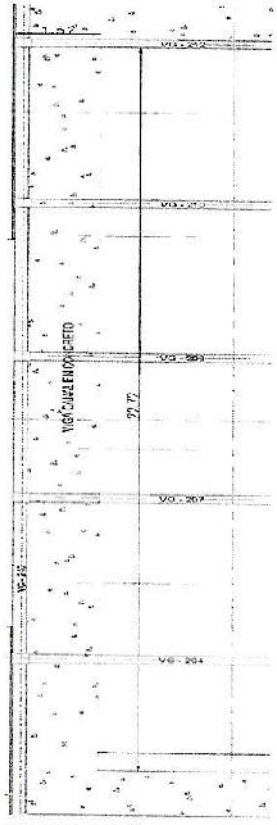

ENTRE EJES M-C Y NUMERAL 9-10	1,57	22,72	35,67

0129

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6



CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

FECHA:
MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM		UNIDAD	
				M2	
		ENTRE EJES D-C Y NUEMRAL 9-15	17,4	1,65	28,71
		ENTRE EJES D-A Y NUMERAL 6-9	4	15,82	63,28

0130

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:


CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM		UNIDAD	
				M2	



ENTRE EJES B-A Y NUMERAL 1-7	21,04	1,66	34,93




ENTRE EJES D-A Y NUMERAL 1-3	2,47	11,89	29,37

0131

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MEMORIA DE CANTIDADES	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	PROYECTO:	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ	MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD
			M2

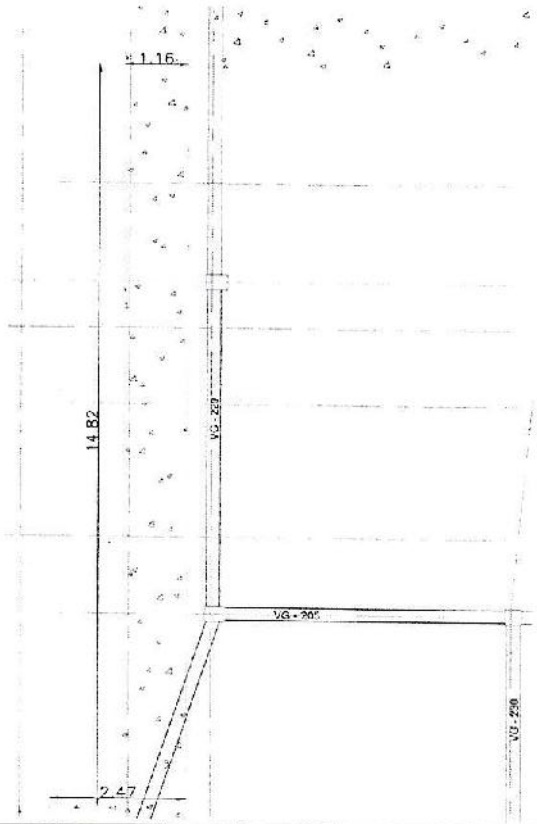

ENTRE EJES C-J Y NUMERAL 1-3	1,16	14,82	17,19	

0132

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD
			M2

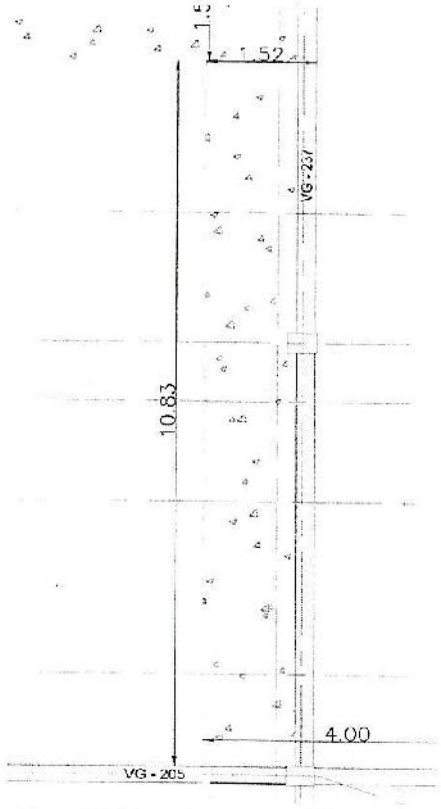

ENTRE EJES C-J Y NUMERAL 6-7	1,52	10,83	16,46

0133

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:


CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM		UNIDAD	
				M2	



ENTRE EJES I-K Y NUMERAL 1-7	23,71	1,57	37,22

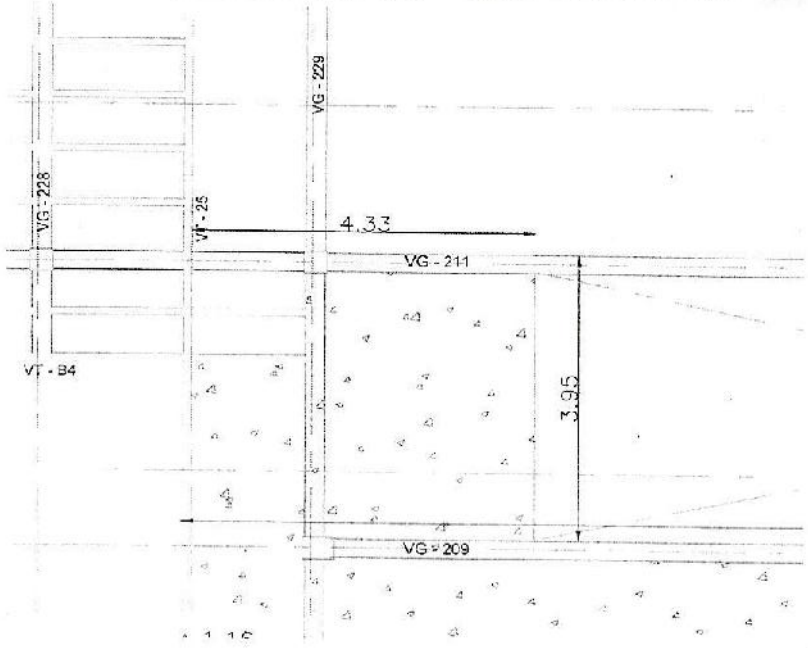

	4,33	3,95	17,10

0134

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD
			M2



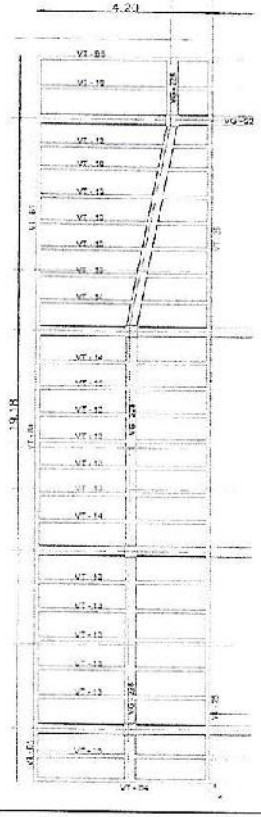


ENTRE EJES K-T Y NUEMRAL 2- FIN LOSA	4,2	19,18	80,56

0135

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	MEMORIA DE CANTIDADES	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	PROYECTO:	
CONTRATO N°. 157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA: CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD
			M2

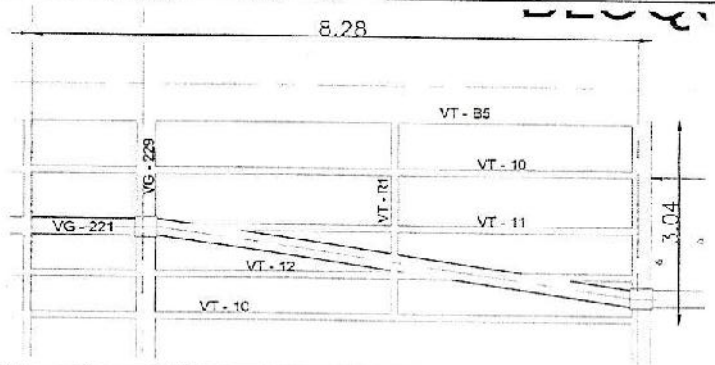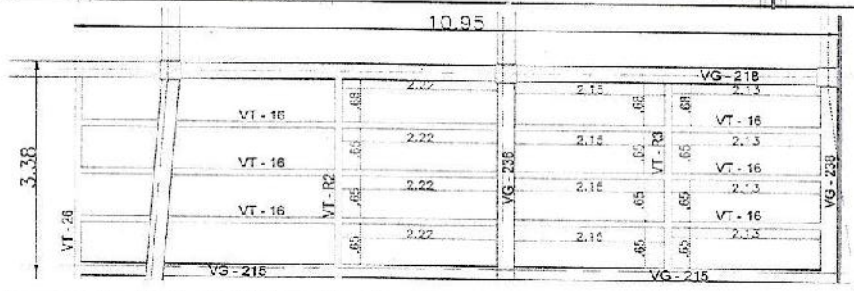	ENTRE EJES R-T Y NUMERAL 2-4	8,28	3,04	25,17
	ENTRE EJES R-T T NUMERAL 4-7	14,63	1,49	21,80
	ENTRE EJES Q-P Y NUMERAL 4-7	10,95	3,38	37,01

0136

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:


CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD		
				M2	

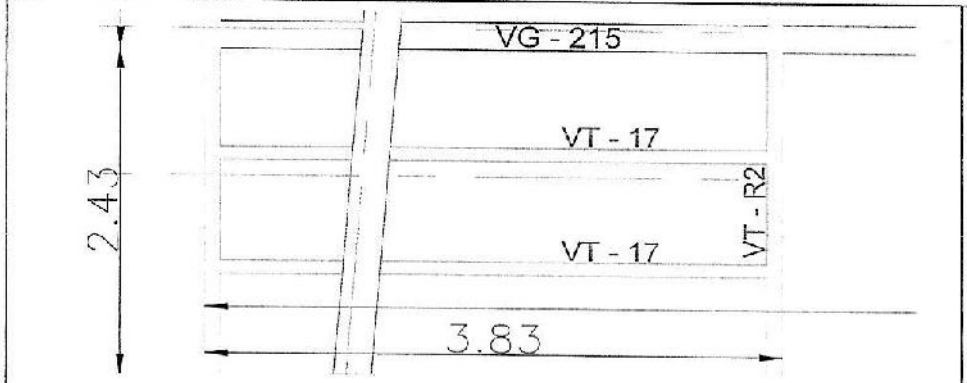

ENTRE EJES N-P Y NUMERAL 4-6	3,83	2,43	9,31

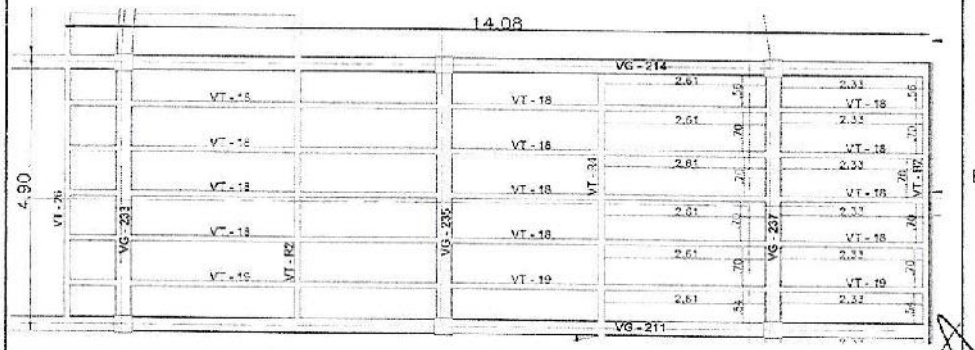

ENTRE EJES L-N Y NUMERAL 4-9	14,08	4,9	68,99

0137

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO


PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD: M2		

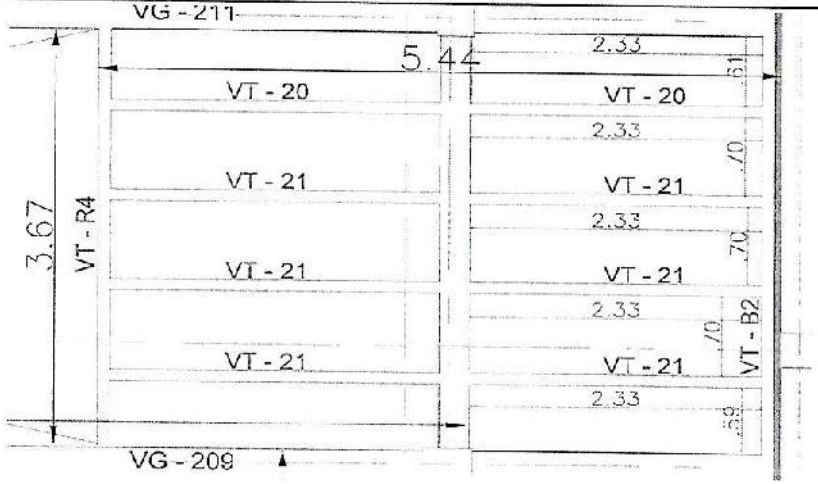

ENTRE EJES J-L Y NUMERAL 6-9	5,44	3,67	19,96
MUROS DE FACHADA OESTE	0,3	14,5	4,35
	0,3	36,13	10,84
	0,3	49,45	14,84
MUROS DE FACHADA ESTE	0,3	44,53	13,36
MUROS DE FACHADA SUR	0,3	79,55	23,87
MUROS DE FACHADA NORTE	0,3	76,9	23,07
	0,3	12,52	3,76

0138

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO


PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	UNIDAD M2	
CUBIERTA 1 TEJA TERMOACUSTICA		0,3	92,26	27,68
CUBIERTA 2 TEJA TERMOACUSTICA		0,3	77,04	23,11
CUBIERTA 3 TEJA TERMOACUSTICA		0,3	138,42	41,53
CUBIERTA 4 TEJA TERMOACUSTICA		0,3	46,8	14,04
CUBIERTA 5 TEJA TERMOACUSTICA		0,3	56,48	16,94
CUBIERTA 6 TEJA TRASLUCIDA DE POLICARBONATO		0,3	40,78	12,23
CUBIERTA 7 TEJA TRASLUCIDA DE POLICARBONATO		0,3	40,34	12,10

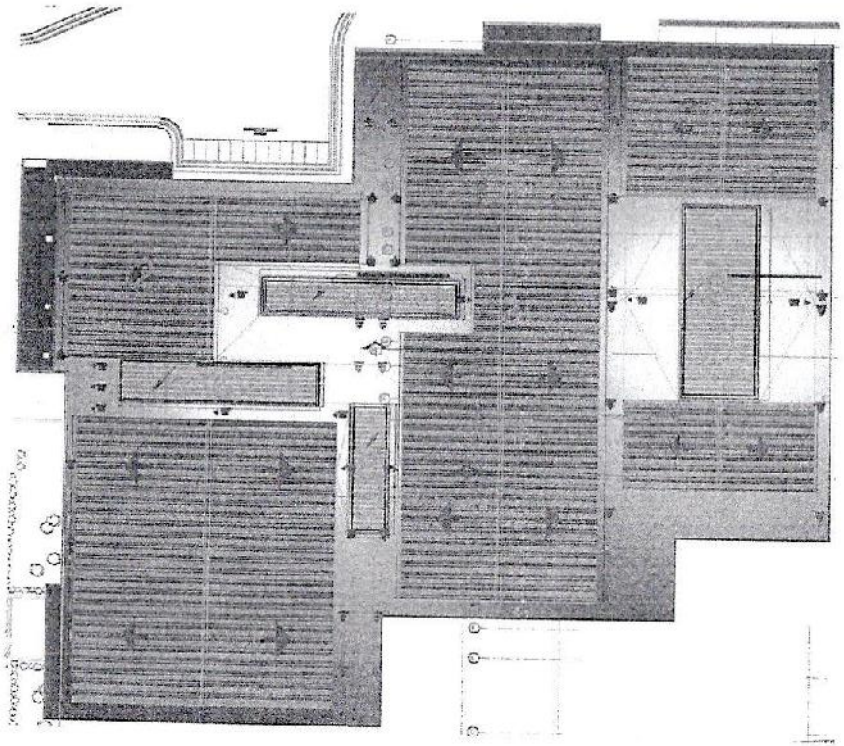

0139

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD: M2

Descripción	Localización	Ancho (m)	Largo(m)	Area (m2)
	ENTRE EJES X-W Y NUMERAL 14-15-16-17	1.51	16,95	25,59
	ENTRE EJES X-S Y NUMERAL 17-18	1,2	12,77	15,32

0140

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO


PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD: M2

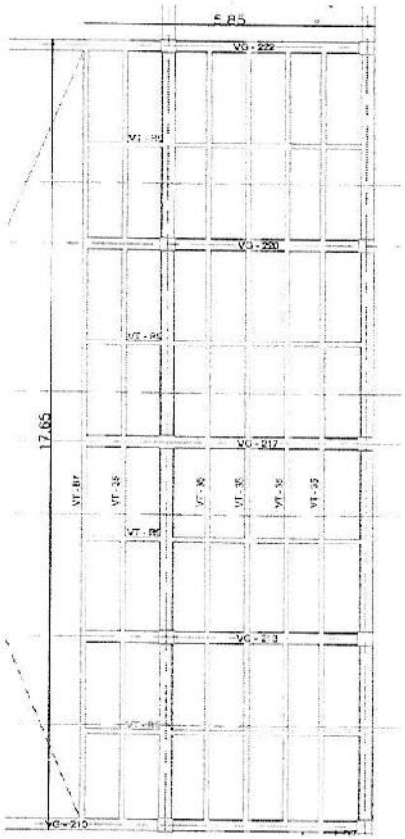

TRE EJES S-K Y NUMERAL 16-17	5,85	17,65	103,25

0141

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO


PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD: M2





ENTRE EJES K-G Y NUMERAL 17-18	1,07	8,18	8,75



ENTRE EJES G-E Y NUMERAL 14-15-16-17-18	18,94	4,44	84,09

0141

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MEMORIA DE CANTIDADES	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3		UNIDAD: M2

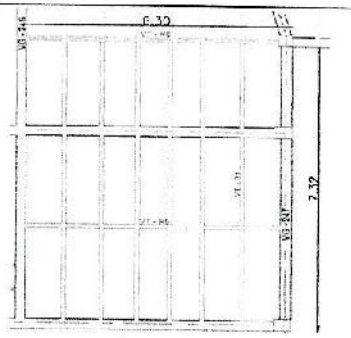	ENTRE EJES E-C Y NUMERAL 14-15	6,3	7,32	46,12
	ENTRE EJES X-S Y NUMERAL 14-15	1,99	14,28	28,42

0141
0141

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:


CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

FECHA:

MAYO DE 2021

ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD
			M2

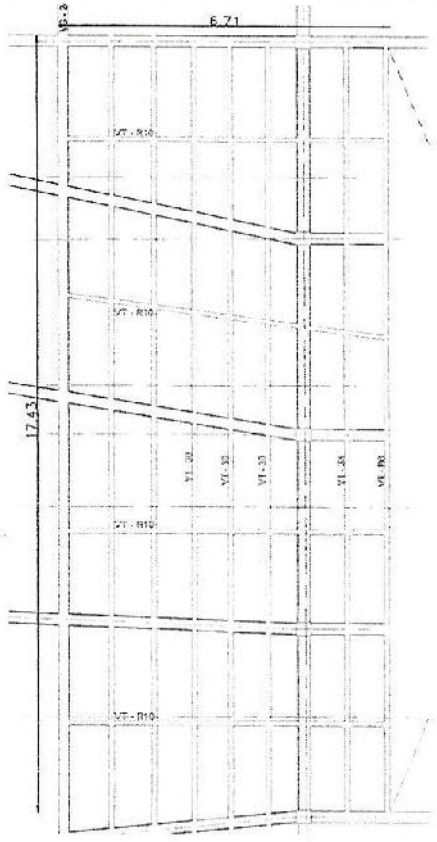

ENTRE EJES S-K Y NUMERAL 14-15-16	6,71	17,43	115,96

01423

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:


CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD
			M2

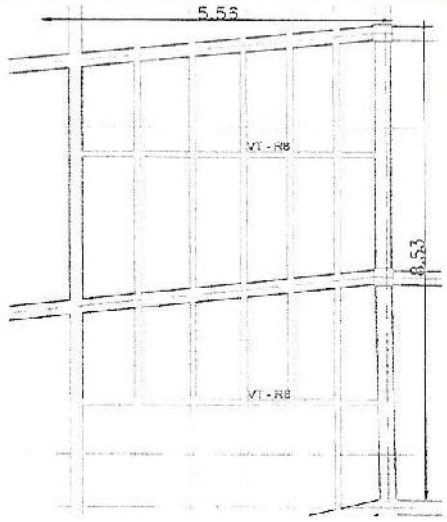

ENTRE EJES K-G Y NUMERAL 14-15	5,56	8,53	47,43

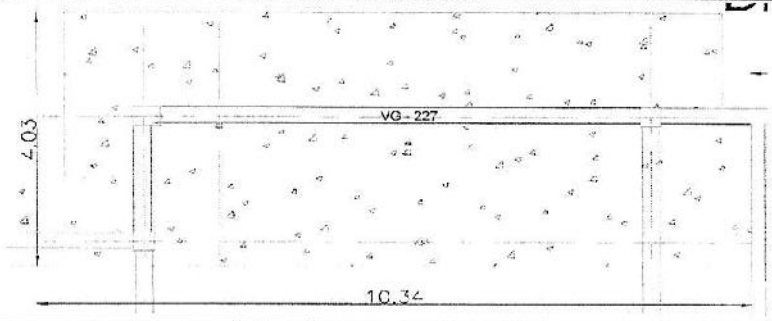

ENTRE EJES X-V Y NUMERAL 11-12-13-14-15	10,34	4,03	41,67

0144

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CCS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO


PROYECTO:


CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6,9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD: M2





ENTRE EJES X-V Y NUMERAL 8-9-10-11-12	10,61	1,38	14,64
ENTRE EJES W-P Y NUMERAL 8-9-10	4,75	19,79	94,00

0145

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6




CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD: M2

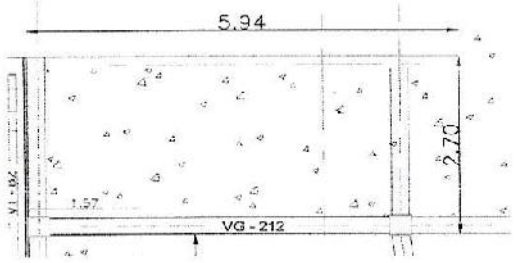	ENTRE EJES Q-P Y NUMERAL 9-10-12	5,68	1,81	10,28
	ENTRE EJES P-M Y NUMERAL 10-12	1,34	5,15	6,90
	NTRE EJES N-M Y NUMERAL 9-1	5,94	2,7	16,04

0146

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021



ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD: M2



NTRE EJES M-C Y NUMERAL 9-1	1,57	22,72	35,57

0147

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MEMORIA DE CANTIDADES	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
		PROYECTO:	FECHA:
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ	MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD M2

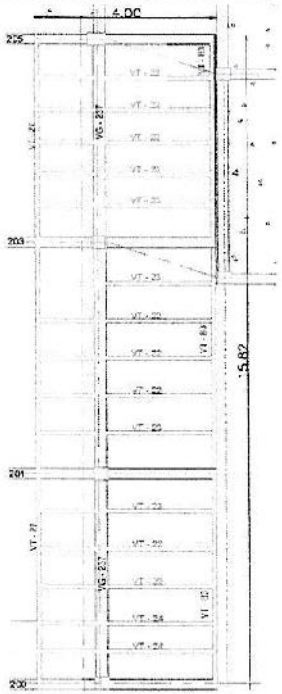	ENTRE EJES D-C Y NUEMRAL 9-15	17,4	1,65	28,71
	ENTRE EJES D-A Y NUMERAL 6-9	4	15,82	63,28

0148

CONSORCIO SAN MIGUEL CCG

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CCG


CONTRATO Nº.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VIGUEL CCS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:


CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD
			M2



ENTRE EJES B-A Y NUMERAL 1-7	21,04	1,66	34,93

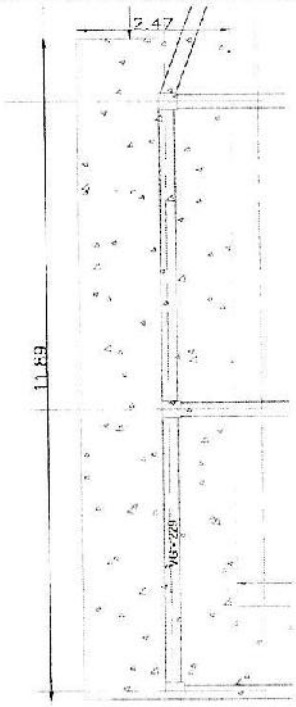

ENTRE EJES D-A Y NUMERAL 1-3	2,47	11,89	29,37

0149

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6



CONTRATO N°.	167
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN M GUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD: M2

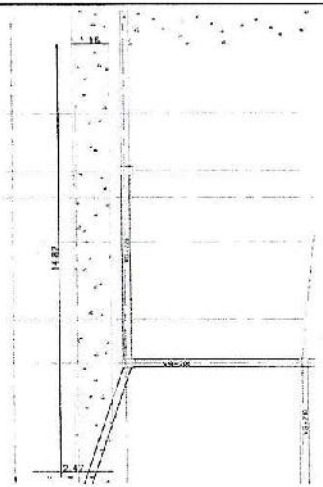	ENTRE EJES C-J Y NUMERAL 1-3	1,15	14,82	17,19
	ENTRE EJES C-J Y NUMERAL 6-7	1,52	10,83	16,46

0150

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES



CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO Nº.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

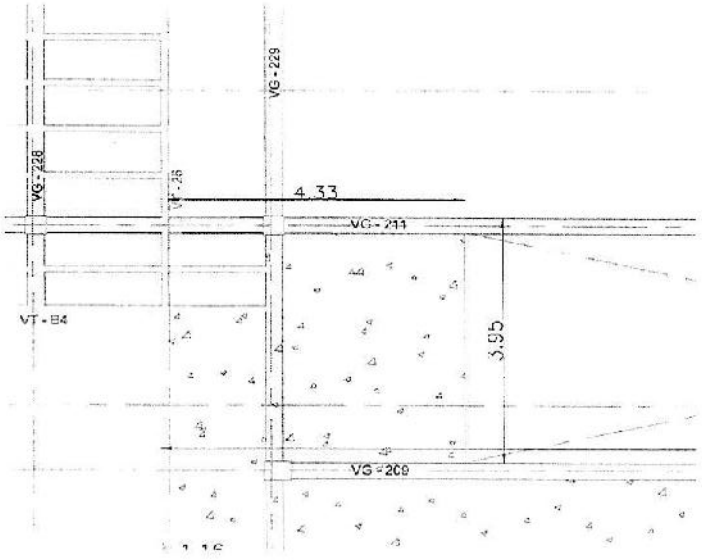ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD: M2		
		ENTRE EJES I-K Y NUMERAL 1-7	23,71	1,57	37,22
			4,33	3,95	17,10

0151

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°:	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO


PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA:

MAYO DE 2021

ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD
			M2



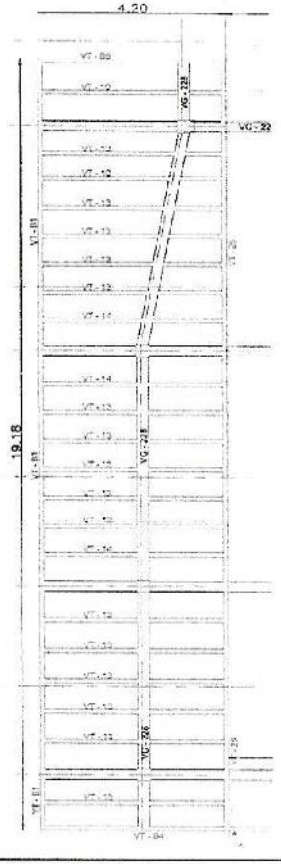


ENTRE EJES K-T Y NUEMRAL 2-FIN LOSA	4,2	19,18	80,56



0152

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	MEMORIA DE CANTIDADES	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°. 157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA: CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM:	6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD: M2

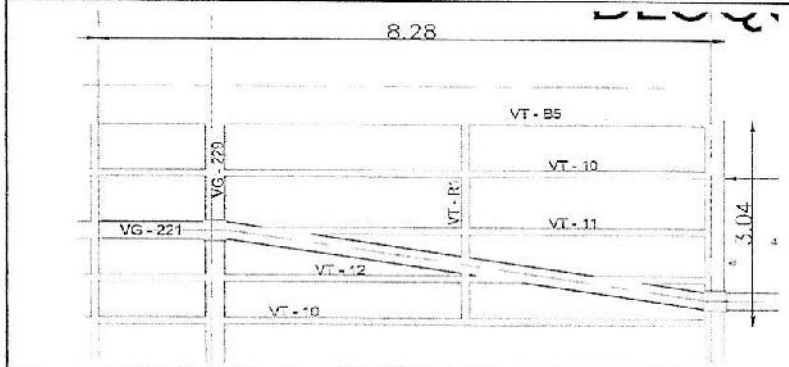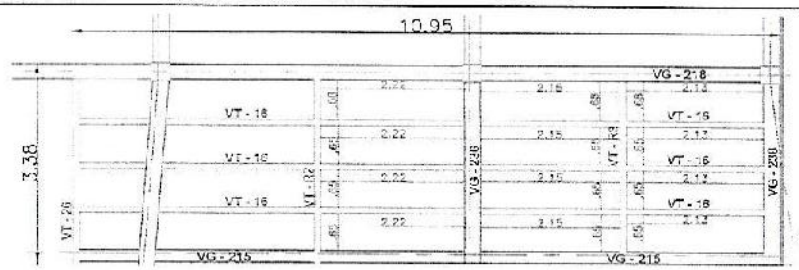	ENTRE EJES R-T Y NUMERAL 2-4	8,28	3,04	25,17
	ENTRE EJES R-T T NUMERAL 4-7	14,63	1,49	21,80
10.95 VG - 218 VT - 16 VT - 16 VT - 16

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MEMORIA DE CANTIDADES	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EH HOSPITALARIO		
ITEM: 6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3		UNIDAD M2

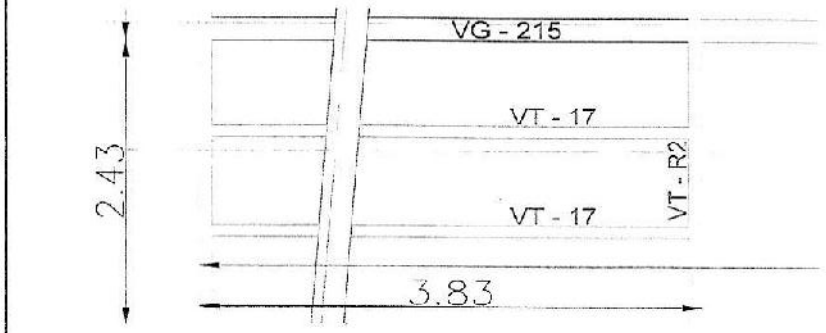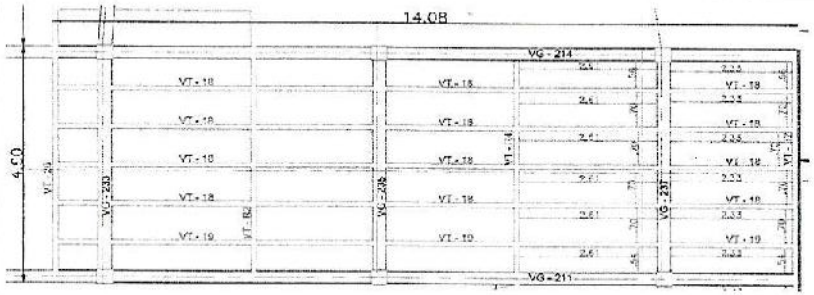	ENTRE EJES N-P Y NUMERAL 4-5	3,83	2,43	9,31
	ENTRE EJES L-N Y NUMERAL 4-9	14,08	4,9	68,99

0154

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°:	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	5.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	UNIDAD: M2

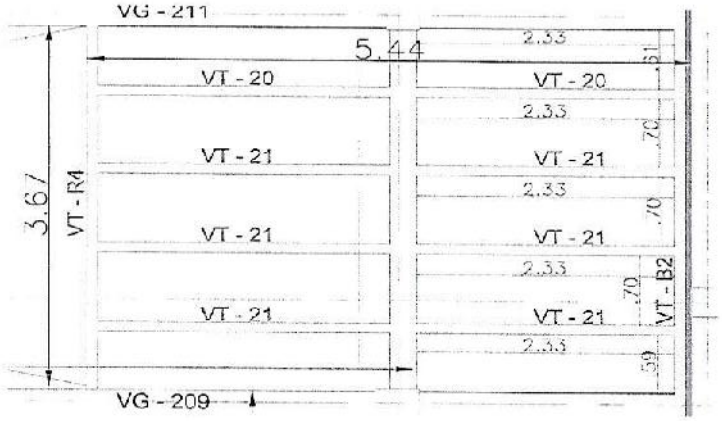

ENTRE EJES J-L Y NUMERAL 6-9	5,44	3,67	19,96

PLACA CUARTO ELÉCTRICO	UBICACIÓN	LONG 1	LONG. 2	
	EJES (T1-T3) Y EJES (TA-	8,01	10,7	85,71

TOTAL M2 DE IMPERMEBIALIZACION	1287,91

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Díaz H.S.S.A

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Rep. Leg.


0155

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM: 7,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO		UNIDAD: M2

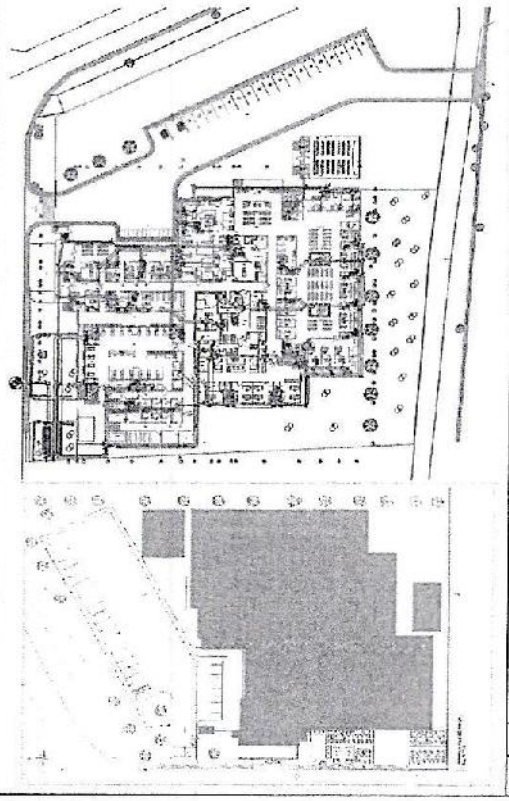

UBICACIÓN	M2
CAMU	3095,83
AUDITORIO	135,86
CASETA VIGILANTE	9,83
TOTAL	3241,52


OBSERVACIONES: VER PLANO SANITARIO

Kathleen Díaz Hoyos

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CCG		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CCG
CONTRATO No	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDASINU	Fecha: MAYO DE 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
INTERVENTORIA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM:	8,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC DE D=1" RDE 21	Unidad: ML

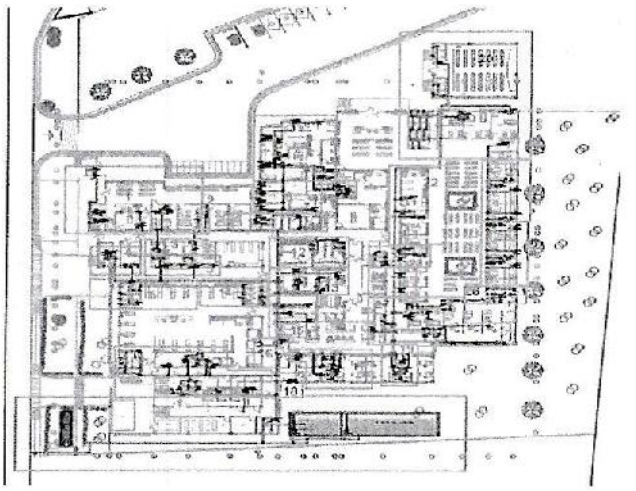

Descripción	Longitud
Detalle 1	1,95
Detalle 2	
Detalle 3	
Detalle 4	4,9
Detalle 5	
Detalle 6	6,45
Detalle 7	17,7
Detalle 8	12,8
Detalle 9	
Detalle 10	
Detalle 11	
Detalle 12	5,85
Detalle 13	7,9
Detalle 14	3,9
Detalle 15	2,25
Detalle 16	
Detalle 17	
Detalle 18	5,65
Detalle 19	1,4
Detalle 20	14,55
Detalle 21	2,45
Detalle 22	
Detalle 23	
Detalle 24	
Detalle 25	
Detalle 26	
Detalle 27	8,65
Detalle 28	

UBICACIÓN	TIPO DE AIRE	LONGITUD	CANT	TOTAL
ODONTOLOGÍA	MS 24000BTU	3,54	1	3,54
ODONTOLOGÍA	MS 24000BTU	7,62	1	7,62
ODONTOLOGÍA	MS 24000BTU	6,89	1	6,89
HOSPITALIZACIÓN HOMBRES	MS 18000BTU	8,19	1	8,19
HOSPITALIZACIÓN MUJERES	MS 18000BTU	11,27	1	11,27
HOSPITALIZACIÓN NIÑOS	MS 18000BTU	10,49	1	10,49
HOSPITALIZACIÓN AISLADO	MS 18000BTU	5,28	1	5,28
PASILLO HOSPITALIZACIÓN	MS 24000BTU	8,46	1	8,46
PASILLO HOSPITALIZACIÓN	MS 24000BTU	12,04	1	12,04
PASILLO HOSPITALIZACIÓN	MS 24000BTU	10,36	1	10,36
PASILLO HOSPITALIZACIÓN	MS 24000BTU	11,86	1	11,86
HALL CONSULTORIOS CE	MS 36000BTU	9,4	1	9,4
HALL CONSULTORIOS CE	MS 36000BTU	3,57	1	3,57
HALL CONSULTORIOS CE	MS 36000BTU	3,85	1	3,85
HALL CONSULTORIOS CE	MS 36000BTU	8,78	1	8,78
HALL CONSULTORIOS CE	MS 36000BTU	9,07	1	9,07
HALL CONSULTORIOS CE	MS 36000BTU	8,3	1	8,3
HALL CONSULTORIOS CE	MS 36000BTU	4,91	1	4,91
DISPENSACIÓN	MS 36000BTU	7,05	1	7,05
SALA DE ESPERA PRINCIPAL	MS 36000BTU	13,37	1	13,37
SALA DE ESPERA PRINCIPAL	MS 36000BTU	16,25	1	16,25

MEMORIA DE CANTIDADES


			PROYECTO:		
CONTRATO No	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDASINU			Fecha
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL				MAYO DE 2021
INTERVENTORIA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO				
ITEM:	8,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC DE D=1" RDE 21			Unidad: ML
SALA DE ESPERA PRINCIPAL		MS 36000BTU	20,1	1	20,1
SALA DE RAYOS X		MS 18000BTU	4,85	1	4,85
TOMA DE MUESTRAS		MS 18000BTU	2,89	1	2,89
SALA DE ESPERA TRIAGE		MS 24000BTU	3,2	1	3,2
SALA DE ESPERA TRIAGE		MS 36000BTU	3,33	1	3,33
SALA DE ESPERA TRIAGE		MS 24000BTU	9,47	1	9,47
SERVICIO DE MEDICAMENTOS		MS 24000BTU	8,34	1	8,34
				TOTAL	329,13

OBSERVACIONES : Revisar Plano Hidraulico

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No	157	PROYECTO	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDASINU	FECHA
INTERVENTORIA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM 8,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC DE D=3/4" RDE 21		UNIDAD ML

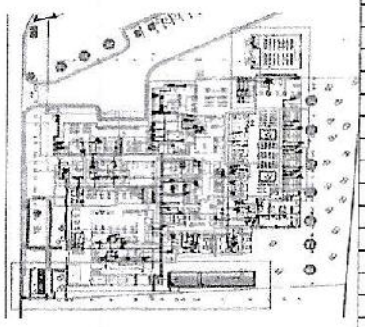

Descripcion	Tub 3/4" PVC RDE 21
Detalle 1	19,85
Detalle 2	3,45
Detalle 3	6,55
Detalle 4	3,9
Detalle 5	9,4
Detalle 6	1
Detalle 7	16,3
Detalle 8	15,2
Detalle 9	14,15
Detalle 10	2,25
Detalle 11	2,45
Detalle 12	4,35
Detalle 13	5,15
Detalle 14	2,9
Detalle 15	1,1
Detalle 16	
Detalle 17	11,74
Detalle 18	
Detalle 19	11,2
Detalle 20	27,2
Detalle 21	6,9
Detalle 22	6,35
Detalle 23	9,1
Detalle 24	
Detalle 25	5,35
Detalle 26	4
Detalle 27	23,35
Detalle 28	

UBICACIÓN	TIPO DE AIRE	LONGITUD	CANT	TOTAL
CONSULTORIO 3 VACUNACIÓN	MS 12000BTU	8,77	1	8,77
CONSULTORIO 2 CITOLOGÍA	MS 12000BTU	8,15	1	8,15
CONSULTORIO 1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO	MS 12000BTU	5,39	1	5,39
OFICINA ADMINISTRATIVA	MS 9000BTU	10,6	1	10,6
CONSULTORIO 4	MS 9000BTU	4,3	1	4,3
CONSULTORIO 5	MS 9000BTU	4,82	1	4,82
CONSULTORIO 6	MS 9000BTU	3,6	1	3,6
CONSULTORIO 7	MS 9000BTU	4,13	1	4,13
CONSULTORIO 8	MS 9000BTU	3,5	1	3,5
CONSULTORIO 9	MS 9000BTU	4,02	1	4,02
CONSULTORIO 10	MS 9000BTU	3,47	1	3,47
CONSULTORIO 11	MS 9000BTU	7,57	1	7,57
CONSULTORIO 12	MS 9000BTU	6,28	1	6,28
CONSULTORIO 13	MS 9000BTU	3,34	1	3,34
CONSULTORIO 14	MS 9000BTU	7,54	1	7,54
CONSULTORIO 15	MS 9000BTU	3,53	1	3,53
CONSULTORIO 16	MS 9000BTU	3,52	1	3,52
CONSULTORIO 17	MS 9000BTU	3,74	1	3,74
CURACIONES	MS 12000BTU	6,71	1	6,71
RECEPCIÓN RAYOS X	MS 9000BTU	8,99	1	8,99
SALA DE ESPERA RECEPCIÓN RAYOS X	MS 12000BTU	5,87	1	5,87
AREA DE DISPARO	MS 9000BTU	6,58	1	6,58
SALA DE LECTURA	MS 9000BTU	4,65	1	4,65
RECEPCIÓN ENTREGA DE RESULTADOS	MS 9000BTU	8,78	1	8,78
LAVADO Y DESINFECCIÓN	MS 12000BTU	4,3	1	4,3
TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES	MS 9000BTU	5,02	1	5,02
OFICINA - LABORATORIO	MS 9000BTU	4,52	1	4,52
CONSULTORIO 3 URGENCIAS	MS 9000BTU	4,33	1	4,33
CONSULTORIO 2 URGENCIAS	MS 9000BTU	4,65	1	4,65
CONSULTORIO 1 URGENCIAS	MS 9000BTU	4,69	1	4,69
TRIAGE	MS 12000BTU	6	1	6
PROCEDIMIENTOS	MS 12000BTU	11,36	1	11,36
REANIMACIÓN	MS 12000BTU	12,12	1	12,12

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No	157	PROYECTO	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDASINU	FECHA
INTERVENTORIA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021

ITEM	8,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC DE D=3/4" RDE 21	UNIDAD ML

ERA	MS 12000BTU	6,13	1	6,13
EDA	MS 12000BTU	9,05	1	9,05
ANTESALA - ZONA DE PARTOS	MS 12000BTU	3,71	1	3,71
DEPÓSITO DE MATERIAL ESTERIL	MS 12000BTU	4,58	1	4,58
EMPAQUE	MS 9000BTU	3,53	1	3,53
LAVADO - ESTERILIZACIÓN	MS 12000BTU	8,86	1	8,86
DESCANSO MEDICO	MS 12000BTU	4,58	1	4,58
				0
TOTAL TUBERIA PVC D=3/4" RDE 21	448,47			

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO HIDRAULICO

Kathleen Diaz H.SSA

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO


PROYECTO:

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU

FECHA:

MAYO DE 2021

ITEM:	9,1	DIVISIONES SANITARIAS A PISO. TIPO SOCODA O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304. INCLUYE PASADOR, PERCHERO, BISAGRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2

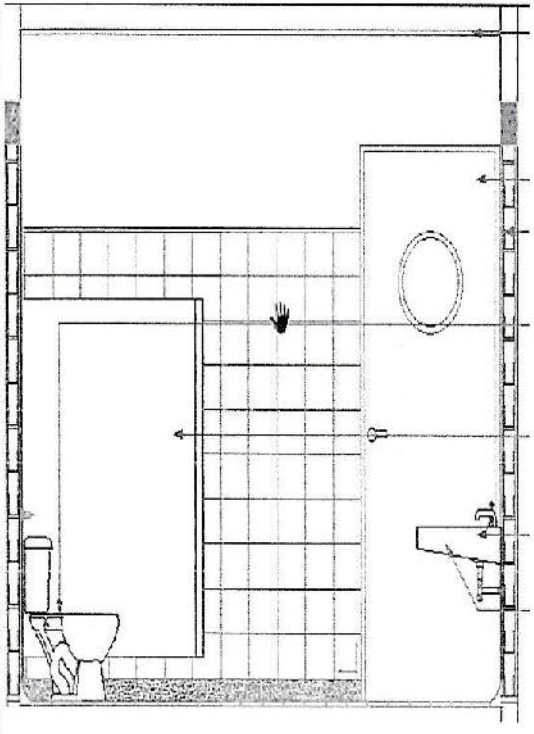

LOCALIZACION	UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO	Total
SALA DE ESPERA DE CONSULTORIO	W.C MUJERES	5,7	1,6	9,12
SALA DE ESPERA DE CONSULTORIO	W.C HOMBRES	5,7	1,6	9,12
OBSERVACION-URGENCIAS	W.C MUJERES	5,7	1,6	9,12
OBSERVACION - URGENCIAS	W.C HOMBRES	5,7	1,6	9,12
OBSERVACION - URGENCIAS	W.C NIÑOS	5,7	1,6	9,12
			TOTAL	45,60

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Díaz H.SS&


V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE V/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario


0161

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINU	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 9,7	PUERTA (P-05) , PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTABORADA CON MARCO METALICO Y CERRADURA DE BOTON		UNIDAD: UND

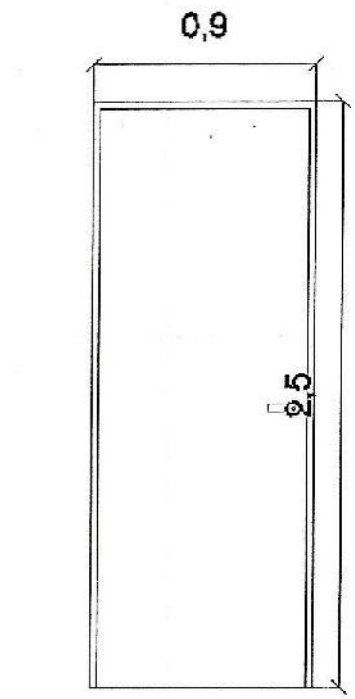

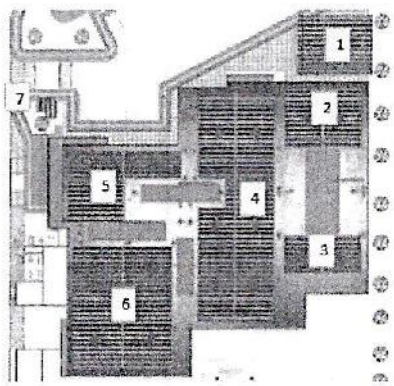

UBIC.	LOCALIZACION	UBICACIÓN	Total
1	AUDITORIO	W.C AUDITORIO MUJERES	1
1	AUDITORIO	W.C AUDITORIO HOMBRES	1
2	CONSULTA EXTERNA 1	CONSULTORIO 2-CITOLOGIA	1
4	LAB+OBSTETRICIA	ASEO	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C HOMBRES	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C MUJERES	1
4	LAB+OBSTETRICIA	VESTIER HOMBRES	1
4	LAB+OBSTETRICIA	VESTIER MUJERES	1
4	LAB+OBSTETRICIA	ASEO 1.80 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C VESTIER 3.63 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C VESTIER 3.44M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C 4.16 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C Y VESTIER 4.48M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C AISLADO	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C HOSP	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C 4.45 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C 4.46 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C PASILLO Z3	1
4	LAB+OBSTETRICIA	PASILLO 2.10 M2	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 15	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 16	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 17	1
2	LAB+OBSTETRICIA	W.C DISPENSACION	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C ODONTOLOGIA	2
3	CONSULTA EXTERNA 2	RAYOS X	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 10	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 9	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 8	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 7	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 6	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 5	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 4	1
5	CONSULTA EXTERNA 2	RESIDUOS 2.70 M2	1
5	URGENCIAS	W.C MUJERES 2.70 M2	1
5	URGENCIAS	W.C HOMBRES 3.81 M2	1
5	URGENCIAS	ASEO 2.25 M2	1
5	URGENCIAS	ASEO 2.31 M2	1
5	URGENCIAS	W.C CONS 1 3.35 M2	1
5	URGENCIAS	W.C CONS 2 3.35 M2	1
6	URGENCIAS	W.C DISCAPACITADOS MIXTO	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C MUJERES 3.21M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C HOMBRES 3.10 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C ERA	1

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINU	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM°: 9,7	PUERTA (P-05) , PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTABORADA CON MARCO METALICO Y CERRADURA DE BOTON		UNIDAD: UND

6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C EDA	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C ENFER 4.44 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C MED 4.44 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C CADAVERES	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	WC 2.98 M2	1
6	URGENCIAS+SER. GENERAL	PASILLO DETRÁS W.C MUJERES	1
		TOTAL	50

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO


Kathleen Díaz H.S.S


V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 9,8	PUERTA 1,50 X 2,0 (P-02). EN TRIPLE CON BARRERA DE APOYO EN ALUMINIO, VENTANILLA RECTANGULAR EN VIDRIO DE 5MM. INCLUYE MARCO METALICO DE VAIVÉN		UNIDAD: UND

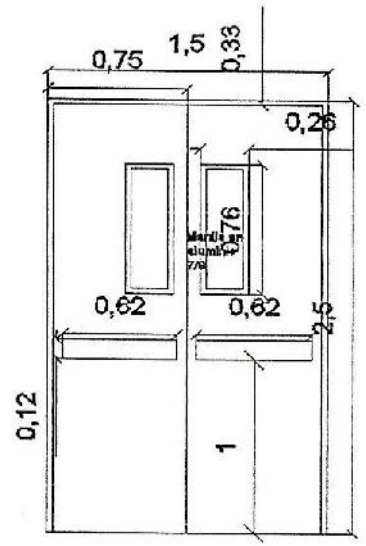

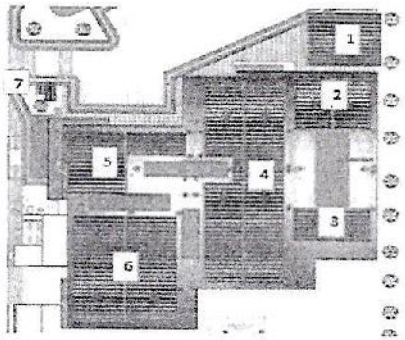

UBIC.	LOCALIZACION	UBICACIÓN	Total
4	LAB+OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS-	1
4	LAB+OBSTETRICIA	ANTESALA	2
3	LAB+OBSTETRICIA	PASILLO 70.10 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	CURACIONES	1
4	LAB+OBSTETRICIA	PASILLO 74.08 M2	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	ODONTOLOGIA 69.29 M2	1
5	URGENCIAS	SALA DE ESPERA-	1
5	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	1
5	URGENCIAS	TERRAZA URGENCIAS	1
5	URGENCIAS	REANIMACION	1
5	URGENCIAS	PASILLO-REANIMACION	1
5	URGENCIAS	W.C EMERGENCIAS	1
6	URGENCIAS+SER.GENERAL	DESCANSO/CAFTEIN	1
6	URGENCIAS+SER.GENERAL	CIRCULACION-PASILLO	2
6	URGENCIAS+SER.GENERAL	TABLEROS ELECTRICOS	1
4	LAB+OBSTETRICIA	PASILLO 97.72 M2	2
6	URGENCIAS+SER.GENERAL	PASILLO	1
		TOTAL	20,00

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Díaz H.S.S

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6

V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Consorcio BH hospitalario


0164

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 9,9	MESON EN ACERO INOXIDABLE		UNIDAD: M2

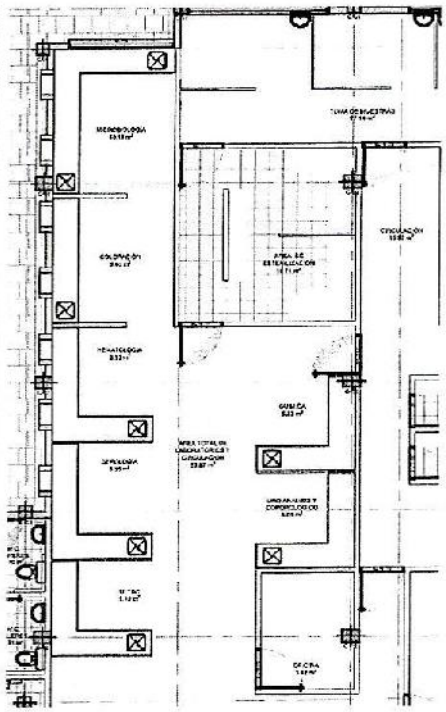

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	Total
CONS. 3, VACUNACIÓN - CONSULTA EXTERNA	2,08	0,63	1,31
ESTERILIZACIÓN - CONS. EXTERNA	4	0,63	2,52
ODONTOLOGÍA - CONS. EXTERNA	8,8	0,63	5,54
TBC - LABORATORIO	4,2	0,6	2,52
UROANALISIS - LABORATORIO	2,49	0,6	1,49
COLORACIÓN - LABORATORIO	2,42	0,6	1,45
SEROLOGÍA - LABORATORIO	4,21	0,6	2,53
QUÍMICA - LABORATORIO	5,27	0,6	3,16
HEMATOLOGÍA - LABORATORIO	4,21	0,6	2,53
LAVADO Y ESTERILIZACIÓN - LABORATORIO	3,84	0,61	2,34
TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES - LABORATORIO	1,9	0,6	1,14
CIRCULACIÓN - OBSTETRICIA	1,5	0,6	0,90
HOSPITALIZACIÓN	1,68	0,78	1,31
CURACIONES - HOSPITALIZACIÓN	2,4	0,63	1,51
EMPAQUE - OBSTETRICIA	4,52	0,6	2,71
RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - SERV. GENERALES	2,49	0,6	1,49
DESCANSO / CAFTEIN MÉDICOS - URGENCIA	2,5	0,6	1,50
REANIMACIÓN - URGENCIAS	3	0,6	1,80
ERA - URGENCIAS	2,88	0,6	1,73
EDA - URGENCIAS	3,08	0,6	1,85
OBSTETRICIA	2,8	0,6	1,68
LAVADO - OBSTETRICIA	4,48	0,6	2,69
SERVICIO DE MEDICAMENTOS - URGENCIAS	3,39	0,6	2,03
PASILLO - HOSPITALIZACIÓN	1,2	0,6	0,72
		TOTAL	48,46

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Díaz H.S.S.

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO Nº.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO


PROYECTO:


CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU


FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	9,10	BARANDAS METÁLICAS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2".	UNIDAD ML









UBIC.	LOCALIZACION	UBICACIÓN	LONGITUD (ML)	CANTIDAD	Total
1	AUDITORIO	W.C AUDITORIO MUJERES	1,59	1	1,59
1	AUDITORIO	W.C AUDITORIO HOMBRES	1,59	1	1,59
2	CONSULTA EXTERNA 1	CONSULTORIO 2-CITOLOGIA	1,54	1	1,54
2	CONSULTA EXTERNA 1	W.C MUJERES	1,63	1	1,63
2	CONSULTA EXTERNA 1	W.C HOMBRES	1,63	1	1,63
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 4	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 5	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 6	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 7	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 8	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 9	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 10	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C ODONTOLOGIA	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C ODONTOLOGIA	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C PASILLO Z 3	1,56	1	1,56
3	CONSULTA EXTERNA 2	PASILLO	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C HALL	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 15	1,66	1	1,66
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 16	1,53	1	1,53
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C CONS 17	1,66	1	1,66
3	CONSULTA EXTERNA 2	W.C DISPENSACION	1,53	1	1,53
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C 4.45 M2	1,04	1	1,04
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C 4.46 M2	1,04	1	1,04
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C AISLADO	1,04	1	1,04
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C HOSP	1,04	1	1,04
4	LAB+OBSTETRICIA	W. C 4.16 M2	1,04	1	1,04
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C MUJERES	1,04	1	1,04
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C HOMBRES	1,04	1	1,04
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C VESTIER	1,66	1	1,66
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C VESTIER	1	1	1
4	LABORATORIOS	W.C	1,66	1	1,66
4	LABORATORIOS	W.C VESTIER H	1,71	1	1,71
4	LABORATORIOS	W.C VESTIER M	1,71	1	1,71
5	URGENCIAS	W.C MUJERES	1,68	1	1,68
5	URGENCIAS	W.C CONS 1	1,68	1	1,68
5	URGENCIAS	W.C CONS 2	1,68	1	1,68
5	URGENCIAS	W.C HOMBRES	1,68	1	1,68
5	URGENCIAS	W.C MUJERES	1,68	1	1,68
7	CASETA VIGILANCA	W.C GARITA	1,68	1	1,68
5	URGENCIAS	W.C PERS HOMBRES	1,68	1	1,68
5	URGENCIAS	W.C PERS MUJERES	1,68	1	1,68
5	URGENCIAS	W.C ERA	1,68	1	1,68
5	URGENCIAS	W.C EDA	1,68	1	1,68
6	URGENCIAS+SER. GENERALES	W.C MUJERES	1,66	1	1,68
6	URGENCIAS+SER. GENERALES	W.C NIÑOS	1,68	1	1,68
6	URGENCIAS+SER. GENERALES	W.C HOMBRES	1,68	1	1,68
6	URGENCIAS+SER. GENERALES	W.C MED	1,04	1	1,04
6	URGENCIAS+SER. GENERALES	W.C ENFERMERIA	1,04	1	1,04
6	URGENCIAS+SER. GENERALES	W.C 3.01 M2	1,68	1	1,68
6	URGENCIAS+SER. GENERALES	W.C 2.98 M2	1,68	1	1,68
				TOTAL	75,05

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Diaz Hoyos


V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6


V0 B0 RESIDENTE V/O INTERVENTOR
Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

	157	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 9,11	PUERTA DE 0,80 X2,50 M (P-06), EN MADERA ENTAMBORADA. INCLUYE MARCO, MOLDURA Y CERRADURA DE BOTÓN.		UNIDAD: UND

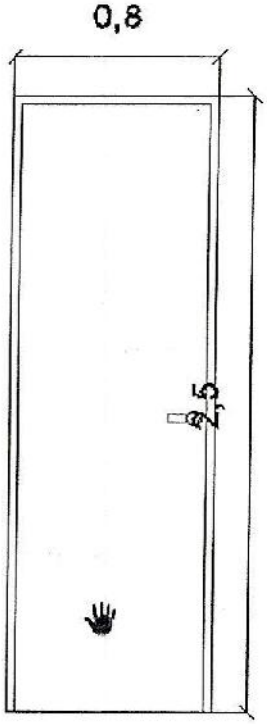

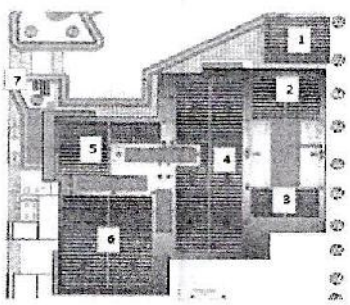

UBIC.	LOCALIZACION	UBICACIÓN	CANTIDAD
2	CONSULTA EXTERNA 1	ASEO 1.51 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	RECEPCION Y ENTREGA DE RESULTADOS	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C VESTIER H 3.14 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C VESTIER M 3.14 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	VESTIER PARA PERSONAL 2.64 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C PERSONAL	1
4	LAB+OBSTETRICIA	ASEO 1.82 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	AREA DE DISPARO 5.65M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	ASEO 1.95 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	CUARTO TECNICO 1.95M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	RESIDUOS 2M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	ROPA SUCIA 1.80M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	EQUIPOS 2.49 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	DEPARTAMENTO MEDICO 2.71	1
4	LAB+OBSTETRICIA	RESIDUOS 2.71 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	LAVAPLATOS 2.49 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	TRAPOS SUCIOS 2.88M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	TRAPOS LIMPIOS 2.88M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	CUARTO TECNICO 2.70 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	RESIDUOS 2.30 M2	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	RESIDUOS 1.30 M2	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	ASEO 1.30 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	ASEO 2.37 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	RESIDUOS 2.81 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C PERSON HOMBRES 2.88 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C PERSON MUJERES 2.88 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	ROPA LIMPIA 2.52M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	TRAPOS LIMPIOS 5.10M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	TRAPOS SUCIOS 4.21M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	LAVAPLATOS 4.21M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	RESIDUOS 5.86 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	ASEO 2.98 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	ROPA SUCIA 2.98 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	R. PELIGROSOS	1

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 9,11	PUERTA DE 0,80 X2,50 M (P-06), EN MADERA ENTAMBORADA. INCLUYE MARCO, MOLDURA Y CERRADURA DE BOTÓN.		UNIDAD
			UND

6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	NEVERAS	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	R. RECICLABLES	1
7	CASETA DE VIGILANCIA	GARITA	1
7	CASETA DE VIGILANCIA	W.C GARITA	1
2	CONSULTA EXTERNA	W.C HALL	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	ODONTOLOGIA	1
4	LAB+OBSTETRICIA	W.C SALA DE ESPERA	1
		TOTAL	41

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Díaz H.SS ♂

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		UNIDAD
ITEM: 9,12	PUERTA 1,0 X 2,50 M (P-04), EN MADERA ENTAMBORADA SENCILLA CON VENTANILLA REDONDA. INCLUYE MARCO, CERRADURA DE BOTÓN E INSTALACIÓN		UND


1

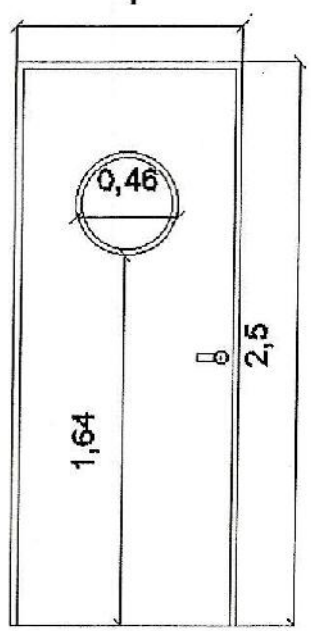

UBIC.	LOCALIZACION	UBICACIÓN	Total
2	CONSULTA EXTERNA 1	CONSULTORIO 3-	1
2	CONSULTA EXTERNA 1	CONSULTORIO 2-	1
2	CONSULTA EXTERNA 1	CONSULTORIO 1-	1
2	CONSULTA EXTERNA 1	W.C MUJERES 15.06 M2	1
2	CONSULTA EXTERNA 1	W.C HOMBRES 10.95 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	TOMA DE MUESTRAS	1
4	LAB+OBSTETRICIA	TOMA DE MUESTRAS	1
4	LAB+OBSTETRICIA	WC VESTIER 2.31 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	WC.2.51 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	OFICINA 8.82	1
4	LAB+OBSTETRICIA	CIRCULACION	3
4	LAB+OBSTETRICIA	MICROBIOLOGIA	1
4	LAB+OBSTETRICIA	LAVADO Y	1
4	LAB+OBSTETRICIA	DEPOSITO DE REACTVOS	1
4	LAB+OBSTETRICIA	AREA CIRCULACION	2
4	LAB+OBSTETRICIA	TRANSITORIO DE	1
4	LAB+OBSTETRICIA	SALA DE LECTURA	1
4	LAB+OBSTETRICIA	RECEPCION RAYOS X	1
4	LAB+OBSTETRICIA	SALA DE ESPERA	2
4	LAB+OBSTETRICIA	DECANTS MEDICO	1
4	LAB+OBSTETRICIA	AREA DE DISPARO 5.65M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	ARCHIVO DE PERSONAL	1
4	LAB+OBSTETRICIA	SALA DE RAYOS X-AREA	1
4	LAB+OBSTETRICIA	AUTOCLAVE	1
4	LAB+OBSTETRICIA	EMPAQUE	1
4	LAB+OBSTETRICIA	ASEO 2.23 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	DEPOSITO DE MATERIAL	1
4	LAB+OBSTETRICIA	CIRCULACION 10 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	LAVADO 16.57 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	CIRCULACION 3.88 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	CIRCULACION 6.03 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	EQUIPOS 3.49 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	RECEPCION PACIENTES	2
4	LAB+OBSTETRICIA	VESTIER PARA	1
4	LAB+OBSTETRICIA	LACTANCIA 9.53 M2	1
4	LAB+OBSTETRICIA	ANTECAMARA	1
4	LAB+OBSTETRICIA	HOSPITALIZACION NIÑOS	1
4	LAB+OBSTETRICIA	HOSPITALIZACION	1
4	LAB+OBSTETRICIA	HOSPITALIZACION	1
2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 12	1
2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 11	1
2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 13	1
2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 14	1
2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 15	1
2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 16	1
2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 17	1
2	CONSULTA EXTERNA	DISPENSACION	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	ESTERILIZACION	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	COMPRESORES	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	CONSULTORIO 10	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	CONSULTORIO 9	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	CONSULTORIO 8	1

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		UNIDAD
ITEM°: 9,12	PUERTA 1,0 X 2,50 M (P-04), EN MADERA ENTAMBORADA SENCILLA CON VENTANILLA REDONDA. INCLUYE MARCO, CERRADURA DE BOTÓN E INSTALACIÓN		UND

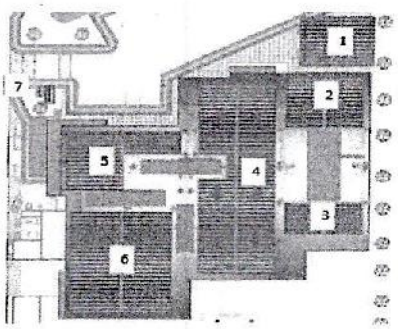

3	CONSULTA EXTERNA 2	CONSULTORIO 7	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	CONSULTORIO 6	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	CONSULTORIO 5	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	CONSULTORIO 4	1
3	CONSULTA EXTERNA 2	OFICINA ADMINISTRATIVA	1
5	URGENCIAS	CONSULTORIO 3	2
5	URGENCIAS	CONSULTORIO 2	2
5	URGENCIAS	CONSULTORIO 1	2
5	URGENCIAS	TRIAGE 13.50 M2	2
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	ERA 13.56 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	EDA	1
6	URGENCIAS	SERVICIO DE	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C MUJERES 14.22 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C NIÑOS 13.08 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	DESCANSO/CAFTEIN	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	W.C HOMBRES 14.94 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	CADAVERES	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	SALA DE ESPERA 7.81 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	ACOPIO ROPA SUCIA	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	ACOPIO ROPA LIMPIA	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	RECEPCION DE	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	CENTRAL DE GASES	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	R ORDINARIOS	2
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	CIRCULACION 6.44 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	RACK 7.46 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	BODEGA 22.62 M2	1
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	AIRES ACONDICIONADOS	1
1	AUDITORIO	W.C AUDITORIO	1
1	AUDITORIO	W.C.ADUTORIO MUJERES	1
5	LABORATORIOS	CIRCULACION 19.56	2
6	URGENCIAS+ SER.GENERAL	BOMBAS	1
		TOTAL	94

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERIA , ADSCRITO A LA RED DE SERVICIOS DE LA E.S.E VIDA SINÚ	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		FECHA: MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		UNIDAD: ML
ITEM: 10.1	PROTECTORES DE PARED TIPO ESQUINERO, MISMO MATERIAL Y COLOR DE GUARDA CAMILLA		

Localización	Numero de Esquineros	Longuitud de Esquineros (m)	LONGITUD TOTAL (ml)
Ejes E-X , Numeral 17-18	33	1,3	42,9
Ejes E-X , Numeral 16-17	24	1,3	31,2
Ejes E-C, Numeral 15-16	26	1,3	33,8
Ejes E-C, Numeral 14-15	27	1,3	35,1
Ejes P-X, Numeral 12-14	7	1,3	9,1
Ejes P-W , Numeral 8-12	45	1,3	58,5
Ejes N-C , Numeral 9-14	55	1,3	71,5
Ejes A-K, Numeral 2-9	64	1,3	83,2
Ejes K-S , Numeral 1-7	43	1,3	55,9
		TOTAL	421,2

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Díaz H.S

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM:	12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED 18W, MULTIVOLTAJE PARA INCRUSTAR, INCLUYE LUMINARIA. EN TUBERÍA EMT	UNIDAD: un

Aréa	Cantidad
W.C CONS 3	1
W.C CONS 4	1
W.C CONS 5	1
W.C CONS 6	1
W.C CONS 7	1
W.C CONS 8	1
W.C CONS 9	1
W.C CONS 10	1
W.C ODONTOLOGIA	2
ODONTOLOGIA	5
HALL CONSULTA EXTERNA	70
W.C MUJERES	4
W.C HOMBRES	4
PASILLO -CONSULTA EXTERNA -LABORATORIOS-OBSTETRICIA	25
SALA DE ESPERA PRINCIPAL	15
CIRCULACION LABORATORIO	20
W.C VESTIER H	1
W.C VESTIER M	1
W.C VEST LAB	1
W.C LAB	1
SALA DE ESPERA RAYOS X	6
W.C PERSONAL	1
AREA ESPERA DE CAMILLLA	1
DEPOSITO DE RREACTIVOS	2
PASILLO OBSTETRICIA	9
ARCHIVO DE PERSONAL	1
CIRCULACION OBSTETRICIA	7
PASILLOS HOSPITALIZACION	35
W.C Y VESTIER	1
CUARTO TECNICO	1
ASEO	2
RESIDUOS	2
GARITA	2
SALA DE ESPERA TRIAGE	32
PASILLO URGENCIAS	14
W.C EMERGENCIAS	2
PASILLOS OBSERVACION	60
PASILLO SERVICISO GENERALES	26
MEDICAMENTOS	1
EQUIPOS	1
ROPA LIMPIA	1
AUDITORIO	11
TOTAL	375

OBSERVACIONES: VER PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS Y DETALLES

Kathleen Diaz H.SS

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED DE 60X60, 45W, MULTIVOLTAJE PARA INCRUSTAR, INCLUYE LUMINARIA. EN TUBERÍA EMT		UNIDAD: un

Área	Cantidad
CONSULTORIO 3-VACUNACION	4
OFICINA ADMINISTRATIVA	2
CONSULTORIO 1	4
CONSULTORIO 2	3
CONSULTORIO 3	4
CONSULTORIO 4	2
CONSULTORIO 5	2
CONSULTORIO 6	2
CONSULTORIO 7	2
CONSULTORIO 8	2
CONSULTORIO 9	2
CONSULTORIO 10	2
CONSULTORIO 11	2
CONSULTORIO 12	2
CONSULTORIO 13	2
CONSULTORIO 14	2
CONSULTORIO 15	2
CONSULTORIO 16	2
CONSULTORIO 17	2
ODONTOLOGIA	9
SALA DE PARTOS	4
TRABAJO DE PARTO	3
PUERPERIO	3
LACTANCIA	1
SALA RAYOS X	5
LAVADO Y ESTERILIZACION	2
ZONA DE LABORATORIOS	10
TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES	2
TOMA DE MUESTRAS	3
PROCEDIMIENTOS	2
OBSERVACION MUJERES	8
OBSERVACION HOMBRES	6
OBSERVACION ADULTOS	4
REANIMACION	2
AUDITORIO	12
TOTAL	**121**

OBSERVACIONES: VER PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS Y DETALLES

Kathleen Diaz H.S.S.o

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM°: 12,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED DE 30X30, 25 W, MULTIVOLTAJE PARA INSCRUCTAR. EN TUBERÍA EMT		UNIDAD: un

Aréa	Cantidad
DISPENSACION	6
SALA DE LECTURA	4
RECEPECION RAYOS X	4
RECEPCION Y ENTREGA DE RESULTADOS	6
DESCANSO MEDICO	4
HOSPITALIZACION NIÑOS	3
HOSPITALIZACION HOMBRES	3
HOSPITALIZACION MUJERES	3
ANTECAMARA	4
CURACIONES	2
CONSULTORIO 1	2
CONSULTORIO 2	2
CONSULTORIO 3	2
TRIAGE	3
ERA	2
EDA	2
SERVICIONES DE MEDICAMENTOS	3
SALA DE OBSERVACIONES	30
CAFETIN MEDICO	2
CADAVERES	2
CENTRAL DE GASES	4
R.ORDINARIOS	4
R.PELIGROSS	1
NEVERAS	1
R. RECICLABLES	1
BODEGA	6
AIRES ACONDICIONADOS	4
BOMBAS	4
ESTERILIZACION	2
RACK	2
TOTAL	118

OBSERVACIONES: VER PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS Y DETALLES

Kathleen Díaz H.S.S

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
		CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATO N°.	157		MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 12,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA PANEL LED ,INCLUYE LUMINARIA. EN TUBERÍA EMT		UNIDAD: un

Aréa	Cantidad
HALL CONSULTORIOS	9
SALA DE ESPERA	4
ODONTLOGIA	1
LAVAOJOS	1
TOMA DE MUESTRAS	1
OFICINA	1
RECEPCION Y ENTREGA DE RESULTADOS	1
CIRCULACION 19,56M2	1
SALA DE ESPERA RAYOS X	1
RECEPCION RAYOS X	1
DESCANSO MEDICO	1
AREA SUCIA E INSUMOS	1
SALA DE RAYOS X	1
AREA DE DISPARO	1
PASILLO CONSULTA EXTERNA -OBSTETRICIA -LAB	4
PASILLO 39,78M2	6
CIRCULACION 3,88M2	1
ENFERMERIA Y PUERPERIO	3
TRABAJO DE PARTO	1
CIRCULACION 11,53	1
AREA REC.NACIDO	1
PASILLO 70,10	3
SALA DE PARTO	1
ESTACION ENFERMERIA	1
DEPARTAMENTO MEDICO	1
PASILLO 86,79	6
PASILLOS SERVICIOS GENERALES	8
SALA DE OBSERVACIONES	6
W.C MUJERES OBSERVACION	1
W.C HOMBRES OBSERVACION	1
W.C NIÑOS OBSERVACION	1
CUSTODIA	1
SAAL DE ESPERA TRIAGE	3
PASILLO 78,80M2	5
GARITA	1
AUDITORIO	7
TOTAL	88

Kathleen Díaz H.S.S.d

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO Nº.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM':	12,1,7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE BLANCO DOBLE CON POLO A TIERRA NORMAL 20 AMP. EN TUBERÍA EMT

UNIDAD: un

Aréa	Cantidad
OFICINA ADMINISTRATIVA	3
HALL DE CONSULTORIOS	16
RAYOS X ODONTOLIGIA	1
COMPRESORES	2
DISPENSACION	6
SALA DE ESPERA PRINCIPAL	11
SALA DE LECTURA	3
VESTIER PARA PERSONAL	1
SALA DE ESPERA RAYOS X	2
RECEPCION RAYOS X	3
AREA DE DISPARO	1
ARCHIVO DE PERSONAL	1
OFICINA	2
TOMA DE MUESTRAS	1
RECEPCION Y ENTREGA DE RESULTADOS	5
NEVERAS	3
DECANTS MEDICO	3
DEPOSITO DE REACTIVOS	2
AUTOCLAVE	1
DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	1
EMPAQUE	1
CIRCULACION 10M2	1
EQUIPOS 3.49M2	4
EQUIPOS 2.49M2	3
EXT Y P. DE FORMULAS	1
ASEO	1
DEPARTAMENTO MEDICO	2
ESTACION ENFERMERIA	8
PASILLO 74.06M2	3
AISLADO	1
HOSPITALIZACION NIÑOS	1
HOSPITALIZACION MUJERES	1
HOSPITALIZACION HOMBRES	1
GARITA	2
SALA DE ESPERA -URGENCIAS	3
SALA DE ESPERA TRIAGE	1
RECEPCION Y FACTURACION	6
CUSTODIA	1
PASILLO 97,72M2	3
MEDICAMENTOS	2
PASILLO 76.80M2	4
ESTACION ENFERMIA OBSERVACION	6
EQUIPOS 3,09M2	4
DESCANSO/ CAFETIN MEDICO	4
CADAVERES	1
SALA DE ESPERA 7,82M2	4
CENTRAL DE GASES	2

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	MEMORIA DE CANTIDADES		CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 12,1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE BLANCO DOBLE CON POLO A TIERRA NORMAL 20 AMP. EN TUBERÍA EMT		UNIDAD: un
	NEVERAS 3,76M2		2
	RACK		4
	PASILLO		1
	BODEGA		1
	CUARTO ELECTRICO		1
	PASILLO 70,10M2		2
	AUDITORIO		12
	TOTAL		162

OBSERVACIONES : VER PLANO ELECTRICO

Kathleen Díaz H. S.S

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°:	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM°: 12,1,9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO. EN TUBERÍA EMT	UNIDAD: un

Aréa	Cantidad
SALA DE RAYOS X	2
TRABAJO DE PARTO	4
ENFERMERIA Y PUERPERIO	4
SALA DE PARTO	4
AREA DE AL REC NAC	2
HOSPITALIZACION NIÑOS	4
HOSPITALIZACION HOMBRES	4
HOSPITALIZACION MUJERES	4
AISLADO	2
CURACIONES	2
TRIAGE	1
CONSULTORIO 1 URGENCIAS	1
CONSULTORIO 2 URGENCIAS	1
CONSULTORIO 3 URGENCIAS	1
REANIMACION	2
EDA	2
OBSERVACION MUJERES	16
OBSERVACION NIÑOS	8
OBSERVACION HOMBRES	12
PROCEDIMIENTOS	1
TOTAL	77

OBSERVACIONES : VER PLANO ELECTRICO

Kathleen Díaz H-SS d

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0179

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 12,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, REGULADO COLOR NARANJA. EN TUBERÍA EMT		UNIDAD: un

UBICACIÓN	LOCALIZACION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
		UN	62	62
			TOTAL	62

OBSERVACIONES: VER PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS Y DETALLES

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0180

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM°: 12,1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. EN TUBERÍA EMT		UNIDAD: un

Aréa	Cantidad
ASEO 1.51M2	1
RESIDUOS 2.7M2	1
W.C CONSULTORIO 2	1
W.C CONSULTORIO 3	1
W.C CONSULTORIO 4	1
W.C CONSULTORIO 5	1
W.C CONSULTORIO 6	1
W.C CONSULTORIO 7	1
W.C CONSULTORIO 8	1
W.C CONSULTORIO 9	1
W.C CONSULTORIO 10	1
W.C HALL	1
W.C CONSULTORIO 15	1
W.C CONSULTORIO 16	1
W.C CONSULTORIO 17	1
RESIDUOS 1.30 M2	2
ASEO1.30 M2	1
ODONTOLOGIA	5
RAYOS X 3.69M2	1
COMPRESORES	1
ESTERILIZACION	1
W.C ODONTLOGIA	1
W.C MUJERES 15,06M2	1
W.C HOMBRES 10.95M2	2
W.C PASILLO Z3	1
W.C PASILLO 2.1M2	1
TOMA DE MUESTRAS	3
TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES	1
W.C VEST 2.31M2	1
OFICINA	1
WC. 2.51M2	1
LABORATORIOS	8
DUCHA LAVA OJOS	1
MICROBIOLOGIA	1
LAVADO Y ESTERILIZACION	1
W.C VESTIER H 3.14M2	1
W.C VESTIER M 3.14M2	1
CIRCUALCION 19,56	1
VESTIER PARA PERSONAL	1
W.C PERSONAL	1
ASEO 1.82M2	1
W,C SALA DE ESEPRA RAYOS X	1
AREA DE DISPARO	1
ARCHIVO DE PERSONAL	1
ASEO 4.4M2	1
TRANSITORIO DE RESIDUOS	1
AUTOCLAVE	1
DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	1

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM°: 12,1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. EN TUBERÍA EMT		UNIDAD: un

VESTIER HOMBRSE	1
W.C HOMBRES 3,06M2	1
CIRCULACION 3,88M2	1
VESTIER MUJERES	1
W.C MUJERES 3,33M2	1
ANTESALA	1
RECEPCION PACIENTES	1
VESTIER PARA MATERNAS	2
EMPAQUE 10,44M2	1
ASEO 2,23M2	1
W.C VEST 3,63M2	1
CIRCULACION 10M2	2
W,C VESTIER 3,44M2	1
EQUIPOS 3,49M2	2
ASEO 1,80M2	1
TRABAJO DE PARTO	2
LAVADO	1
CIRCULACION 11,53M2	1
SALA DE PARTOS	1
EXT Y P FORMULAS	1
ASEO 1,95	2
RESIDUOS 2,0 M2	1
ROPA SUCIA	1
CUARTO TECNICO	1
W.C VESTIER 4,48 M2	1
EXT Y P FORMULAS	1
EQUIPOS 2,49 M2	1
TRAPOS LIMPIOS 2,88 M2	1
DEPARTAMENTO MEDICO	1
RESIDUOS 2,71 M2	1
ESTACION ENFERMERIA	1
LAVAPATOS	1
TRAPOS SUCIOS	1
CURACIONES	1
ASEO 2.37 M2	1
RESIDUOS 2,3 M2	1
W.C AISLADO	1
W.C HOSP NIÑOS	1
W.C HOSP HOMBRES	1
W.C HOSP MUEJRES	1
GARITA	2
W.C MUJERES 2,7 M2	1
W.C HOMBES 3,81 M2	1
ASEO 2,25 M2	1
ASEO 2,31	1
W.C CONS 1 URGENCIAS	1
W.C CONS 2 URGENCIAS	1
W.C MIXTO DISCAPACITADOS	1
RECEPCION Y FACTURACION	1
PROCEDIMIENTOS	1

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	12,1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. EN TUBERÍA EMT	UNIDAD: un
		W.C HOMBRES 3,10 M2	1
		W.C MUJERES 3,21 M2	1
		CUSTODIA	1
		DUCHA DE EMERGENCIAS	1
		W.C EMERGENCIAS	1
		REANIMACION	1
		RESIDUOS 2,81 M2	1
		W.C PERS. HOMBRES 2,88 M2	1
		W.C PERS. MUJERES 2,88 M3	1
		W.C ERA	1
		W.C EDA	1
		OBSERVACION MUJERES	8
		OBSERVACION HOMBRES	6
		W.C MUJERES 14,22 M2	1
		W.C NIÑOS 13,08 M2	2
		W.C HOMBRES 14,94 M2	1
		OBSERVACION NIÑOS	4
		MEDICAMENTOS	1
		EQUIPOS 3.09 M2	1
		ROPA LIMPIA	1
		TRAPSO LIMPIOS 5.10 M2	1
		TRAPOS SUCIOS 4,21 M 2	1
		LAVAPATOS 4,21M2	1
		RESIDUOS 5,86 M2	1
		W.C HOMBRES 14.94 M2	1
		DESCANSO MEDICO	1
		W.C MEDICO	1
		W.C ENFERMERIA	1
		ASEO 2,98 M2	1
		ROPA SUCIA 2,98 M2	1
		CADAVERES	2
		W.C 3.01M2	1
		W.C 2.96M2	1
		SALA DE ESPERA 7,82M2	1
		ACOPIO ROPA SUCIA	1
		ACOPIO ROPA LIMPIA	1
		R. PELIGROSOS	1
		NEVERAS	1
		R. RECICLABLES	1
		RACK	1
		CIRCULACION 6,44 M2	1
		AUDITORIO	2
		PASILLO INGRESO DE CAMILLAS	2
		TOTAL	181

OBSERVACIONES : VER PLANO ELECTRICO

Kathleen Díaz H.S.S

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 12,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP 10KA 220V		UNIDAD: un

UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
		UN	203	203
			TOTAL	203

OBSERVACIÓN:

Kathleen Díaz Hoyos

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0184

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM°: 12,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 8 F+1 X NO 8 N+1 X NO 8 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 1"		UNIDAD: ML

UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
	CAMU	ML	635	635
			TOTAL	635

OBSERVACIÓN:

Kathleen Díaz H. SSL

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0185

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM°: 12,3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 6 F+1 X NO 6 N+1 X NO 6 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 1"		UNIDAD: un

UBICACIÓN	LOCALIZACION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
	CAMU	ML	347	347
			TOTAL	347

OBSERVACIÓN:

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0186

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM°: 12,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 1/0 F+1 X NO 1/0 N+1 X NO 2 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 2"		UNIDAD: ML

UBICACIÓN	LOCALIZACION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
	CAMU	ML	177	177
			TOTAL	177

OBSERVACIÓN:

Kathleen Díaz H.SS

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0187

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 12,3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 1/0 F+1 X NO 1/0 N+1 X NO 2 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 2"		UNIDAD: ML

UBICACIÓN	LOCALIZACION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
	CAMU	ML	255	255
			TOTAL	255

OBSERVACIÓN:

Kathleen Díaz H.SS

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0168

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 12,6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN 3 XLPE1/0-AL-3X1.1/2" PVC		UNIDAD: ML

UBICACIÓN	LOCALIZACION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
	CAMU	ML	295	295
			TOTAL	295

OBSERVACIÓN:

Kathleen Díaz H.S.S

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM: 12,6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES TIPO INTERIOR PARA CABLE DE MT PREMOLDEADOS		UNIDAD: un

UBICACIÓN	LOCALIZACION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
	CUARTO ELÉCTRICO	UN	6	6
			TOTAL	6

OBSERVACIÓN:

Kathleen Díaz HSS.C

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0190

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM°:	13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DEL TIPO A10 IDU, MEDIDAS 800 X 200 X 500 MM (L X A X H), PIEZA ALIGERADA ACABADO LISO. INCLUYE BASE EN MORTERO 3 CM. F'D=3000 PSI.	UNIDAD: ML

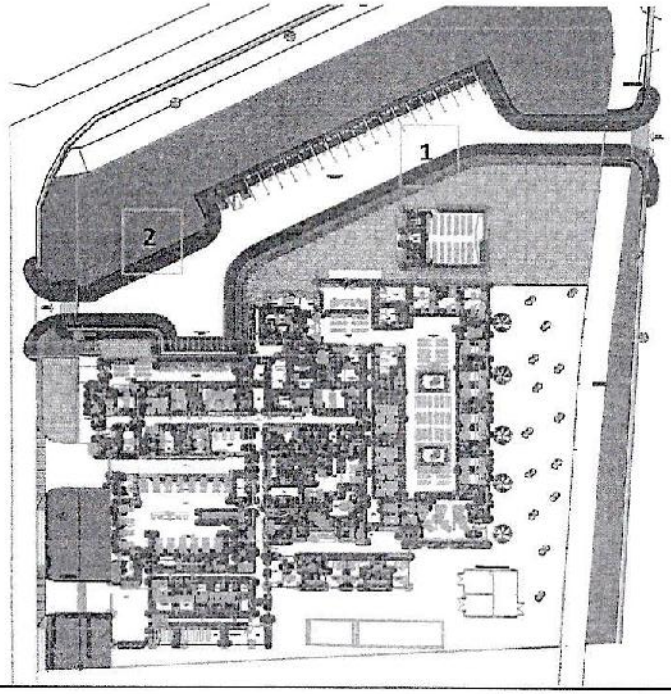

UBICACIÓN	LONGITUD (ML)
1	177,35
2	134,56
Total	311,91

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Díaz Hoyos


V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0191

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	13,2	PISO EN ADOQUIN RECTANGULAR DE 10*20*6 EN COLORES (ARENA-OCRE-ROJO-NEGRO-MARRÓN) SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CORTES Y ADECUACIÓN DE RELLENO EN ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD
			M2

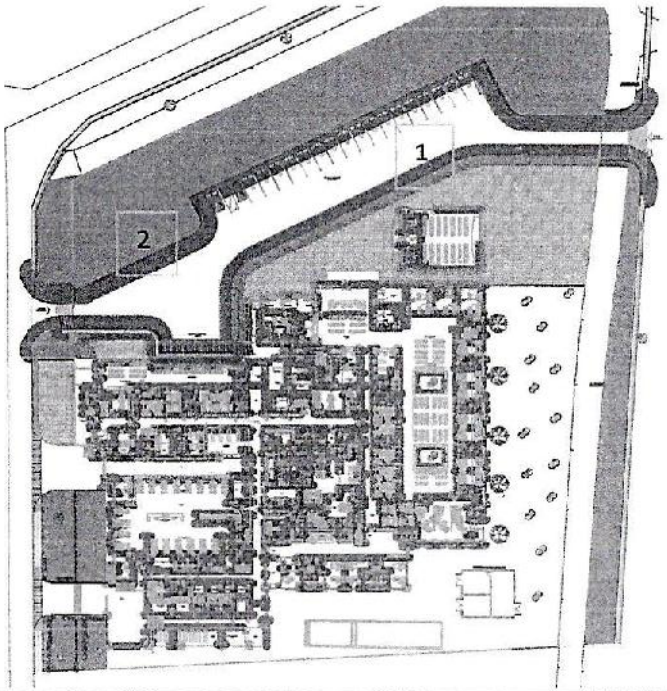

UBICACIÓN	AREA (m2)
1	181,25
2	135,85
Total	317,1

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario


0192

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	13,3	PISO EN ADOQUIN RECTANGULAR DE 10*20*6 EN COLOR GRIS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CORTES Y ADECUACIÓN DE RELLENO EN ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2

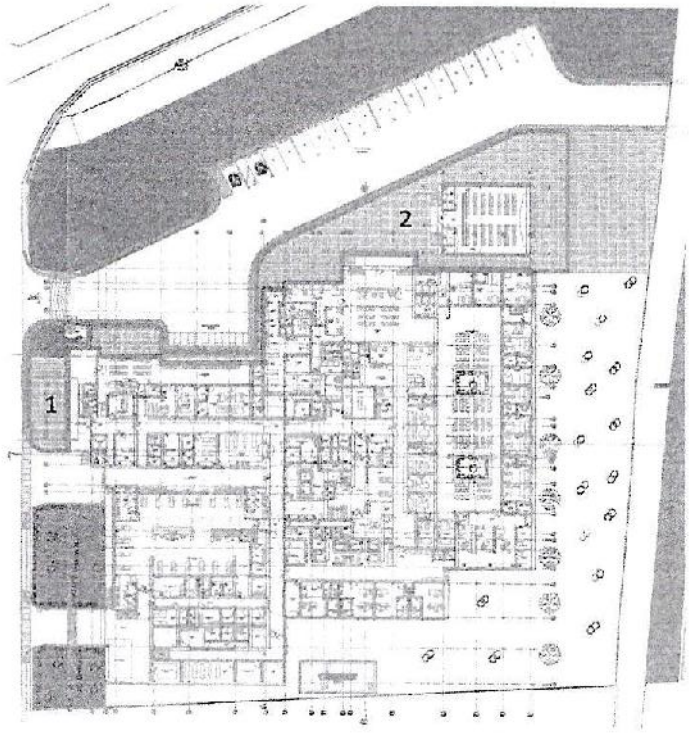

UBICACIÓN	AREA (m2)
1	82,01
2	635
Total	717,01

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO


V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0193

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	13,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA GUÍA PARA DISCAPACITADOS DE 0.20X.20M, COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA (UNA HILERA) SOBRE MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA DE SELLO.	UNIDAD
			ML

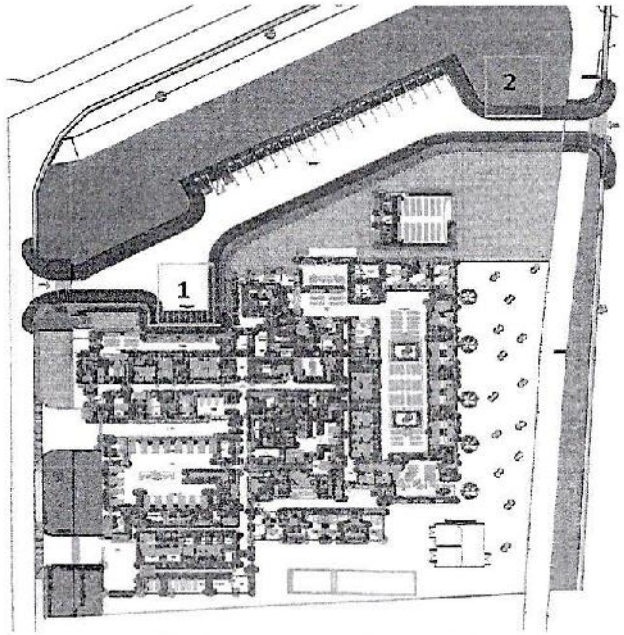

UBICACIÓN	LONGITUD (ML)
1	167,48
2	116,57
Total	284,05

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO


V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0194

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	13,5	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.10M PARA ANDENES EXTERIORES EN CONCRETO DE 3,000 PSI.	UNIDAD: ML

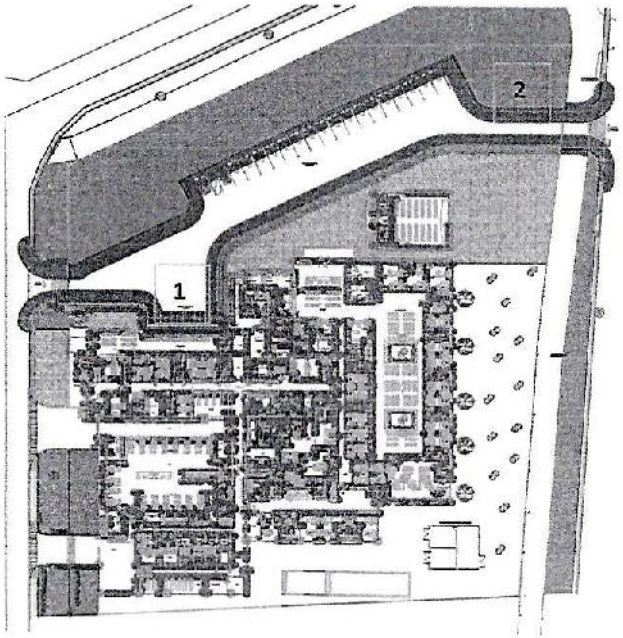


UBICACIÓN	LONGITUD (ML)
1	284,15
2	152,33
Total	436,48


OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO


V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM°: 14,1	ENCHAPE CERAMICO PARED DE 0,20 X 0,2 MTS O SIMILAR		UNIDAD M2

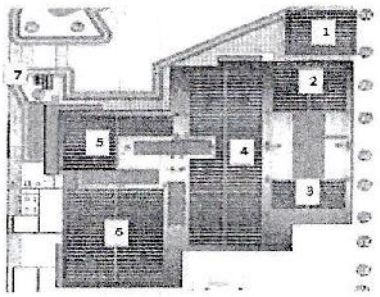

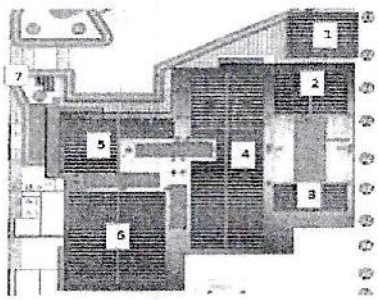

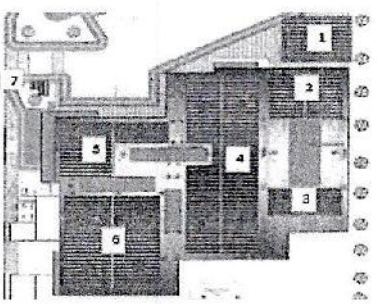



UBIC.	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN	TOTAL ÁREA
	URGENCIAS	NEVERAS	5,22
6		R. RECICLABLES	14,96
6		RECEPCION DE ALIMENTOS	19,26
6		WC CADAVERES	13,76
6		WC SALA DE ESPERA	13,72
5		WC CAFETIN MEDICOS	16,68
5		WC. ENFERMERAS	16,68
5		ASEO - OBSERVACION	13,16
5		LAVAPLATOS - OBSERVACION	15,85
5		WC HOMBRES - OBSERVACION	41,32
5		LACTANCIA N°1 - OBSERVACION	39,17
5		LACTANCIA N°2 - OBSERVACION	35,09
5		WC. EMERGENCIA	15,52
5		WC. PERS. MUJERES	12,99
5		WC. PERS. HOMBRES	12,99
5		RESIDUOS - ERA	11,63
5		W.C ERA	14,94
5		W.C EDA	14,94
5		W.C MUJERES - SALA DE ESPERA TRIAGE	13,44
5		CUSTODIA - SALA DE ESPERA TRIAGE	13,31
5		ASEO - TRIAGE	10,23
5		WC. TRIAGE	10,23
5		WC. CONSULTORIO 1	13,91
5		WC. CONSULTORIO 2	13,91
5		WC. CONSULTORIO 2	11,65
5		WC. HOMBRES SALA DE ESPERA CONSULTA URGENCIA	12,04
5		WC. MUJERES SALA DE ESPERA CONSULTA URGENCIA	12,38
4	LABORATORIO	RESIDUOS	15,91
4		ASEO	15,91
4		WC. - OFICINA	11,52
4		WC. VEST. - TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES	11,01
4		WC. VESTIER HOMBRES	14,45

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM: 14,1	ENCHAPE CERAMICO PARED DE 0,20 X 0,2 MTS O SIMILAR		UNIDAD M2

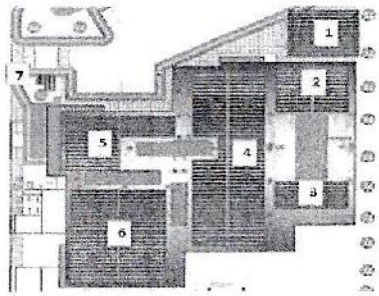


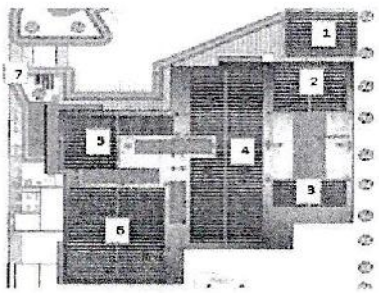

4		WC. VESTIER MUJERES	14,45
4	RAYOS X	WC. VESTIER - SALA DE ESPERA PACIENTES DE RAYOS X	13,93
4		ASEO - SALA DE ESPERA PACIENTES DE RAYOS X	10,02
4	CONSULTA EXTERNA	WC. HOMBRES	26,40
4		WC. MUJERES	37,60
4		WC. CONSULTORIO 1	12,19
4		WC. CONSULTORIO 4	13,05
4		WC. CONSULTORIO 5	12,47
4		WC. CONSULTORIO 6	12,34
4		WC. CONSULTORIO 7	11,57
4		WC. CONSULTORIO 8	12,34
4		WC. CONSULTORIO 9	11,57
4		WC. CONSULTORIO 10	12,56
4		WC. 1 ODONTOLOGIA	11,78
4		WC. 2 ODONTOLOGIA	11,78
5		ESTERILIZACION - ODONTOLOGIA	16,83
5		WC. HALLA - CONSULTORIO 13	10,49
5		WC. CONSULTORIO 15	12,13
5		WC. CONSULTORIO 16	10,62
5		WC. CONSULTORIO 17	12,98
5		WC. DISPENSACION	11,48
5		ASEO - DISPENSACION	8,17
5		RESIDUOS - DISPENSACION	8,17
6	HOSPITALIZACION	WC. HOMBRES - SALA DE ESPERA	10,34
6		WC. MUJERES - SALA DE ESPERA	10,34
6		RESIDUOS - ESTACION DE ENFERMERIA	12,66
6		LAVAPLATOS - ESTACION DE ENFERMERIA	11,98
6		WC. Y VESTIER	15,50
6		WC. HOSPITALIZACION HOMBRES	16,66
6		WC. HOSPITALIZACION MUJERES	16,66
6		WC. HOSPITALIZACION HNIÑOS	16,30
6		WC. AISLADOS	15,91

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		PROYECTO:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATO Nº.	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM: 14,1	ENCHAPE CERAMICO PARED DE 0,20 X 0,2 MTS O SIMILAR		UNIDAD: M2

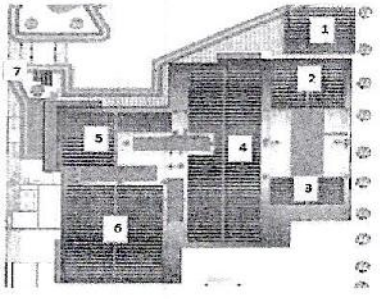

6		ASEO - FRENTE DE ESTACION DE ENFERMERAS	12,28
6		RESIDUOS - FRENTE DE ESTACION DE ENFERMERAS	12,15
4	OBSTETRICIA	ASEO - SALA DE PARTO	10,32
4		WC. VESTIER - ENFERMERIA Y PEUPERRIO	14,49
4		WC. - TRATO DE PARTO	15,91
4		ASEO - FRENTE TRATO DE PARTO	9,46
4		WC. VESTIER - EMPAQUE	14,92
4		ASEO - EMPAQUE	10,71
4		WC. HOMBRES	12,90
4		WC. MUJERES	12,90
1	AUDITORIO	WC. HOMBRES	24,08
1		WC. MUJERES	24,08
7	PORTERIA	WC	10,60
		TOTAL	1133,88

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Díaz H.S.S

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Rep. Leg.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO N°.		PROYECTO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL COS	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMI, COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EN HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM: 15,2	ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PARA INTERIORES, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL		Unidad M2

AREA	Descripción	L=longitud	H= Altura	B=ancho	A= area	Cantidad	(m2)
1	BAÑOS+ASEO+DUCHA+LAVAPATO+BAÑOS DE CONSULTORIOS+BAÑOS VESTIER+BAÑOS NIÑOS–BAÑOS DISCAPACITADOS MIXTOS+BAÑOS ENFERMERAS	541,44	0,6				324,9
	P4		2,5	1	2,5	1	-2,5
	P5		2,5	0,9	2,25	13	-29,3
	P6		2,5	0,8	2	1	-2,0
	V03		0,6	1,2	0,72	17	-12,2
	V04		0,9	1,8	1,62	7	-11,3
						SUBTOTAL	267,5
2	GARITA+AUDITORIO+CONSULTORIO 1-CRECIMIENTO Y DESARROLLO – CONSULTORIO 2-CITOLOGIA+ CONSULTORIO 3 - VACUNACION + HALL + RESIDUO – DISPENSACION + HALL DE CONSULTORIOS, SALA DE ESPERA+ OFICINA ADMINISTRATIVA + CONSULTORIO 4 + CONSULTORIO 5 + CONSULTORIO 6 + CONSULTORIO 7 + RESIDUOS – CONSULTORIO 8 + CONSULTORIO 9 – CONSULTORIO 10 + ODONTOLOGIA+ RAYOS X + COMPRESORES – ESTERILIZACION + CONSULTORIO 11 + CONSULTORIO 12 + HALL + CONSULTORIO 13 + CONSULTORIO 14 – CONSULTORIO 15 + CONSULTORIO 16 + CONSULTORIO 17+SALA DE ESPERA PRINCIPAL + TOMA DE MUESTRAS + TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES –TBC +URO ANALISIS + COLORACION + OFICINA + VESTIER + RECEPCION Y ENTREGA DE RESULTADOS + CIRCULACION – SEROLOGIA + QUIMICA + HEMATOLOGIA – DEPOSITO DE REACTIVOS + TRANSITORIO DE RESIDUOS + AREA DE ESPERAS DE CAMILLAS + SALA DE RAYOS X + AREA CIRCULACION SUCIA E INSUMOS + DESCANSO MEDICO + LAVADO Y ESTERILIZACION + MICROBIOLOGIA + SALA DE LECTURA + VESTIER PARA PERSONAL + SALA DE ESPERA PACIENTES DE RAYOS X + AREA DE DISPARO + ARCHIVO DE PERSONAL + RECEPCION RAYOS X+DEPOSITOS DE MATERIAL ESTERIL + EMPAQUE – CIRCULACION + + EQUIPOS + ANTESALA + VESTIER PARA METERNAS – TRABAJO DE PARTO + RECEPCION PACIENTE + AUTOCLAVE + ENFERMERIA Y PUERPERIO + LACTANCIA – TRAPOS LIMPIOS + EQUIPOS + CUARTO TECNICO + LAVAPATOS + TRAPOS SUCIOS + RESIDUOS – DEPARTAMENTO MEDICO + ROPA SUCIA + AREA DE A. AL REC.NAC + EXT Y P DE FORMULAS + SALA DE ESPERA TRIAGE + CUSTODIA + PROCEDIMIENTOS + RECEPCION Y FACTURACION + TRIAGE + SALA DE ESPERA CONSULTA URGENCIA + CONSULTORIO 1 + CONSULTORIO 2 + CONSULTORIO 3 + REANIMACION + RESIDUOS + ERA + EDA +SEVICIO DE MEDICAMENTOS+BOMBAS + AIRES ACONDICIONADOS + BODEGA + TABLEROS ELECTRICOS + RACK + RECEPCION DE ALIMENTOS + R. RECICLABLES + ACOPIO ROPA LIMPIA + NEVERAS + ACOPIO ROPA SUCIA + R. PELIGROSOS + SALA DE ESPERA+ CADAVERES+ CENTRAL DE GASES + R. ORDINARIOS + DESCANSO / CAFETIN MEDICOS + ROPA SUCIA + AREA DE OBSERVACION HOMBRES + CIRCULACION – RESIDUOS+ TRABAJOS SUCIOS + TRAPOS LIMPIOS – ROPA LIMPIA + EQUIPOS + MEDICAMENTOS + AREA DE OBSERVACION NIÑOS + AREA DE OBSERVACION MUJERES	2539,5	2,6				6603,0
	P1		2,5	2	5	1	-5,0
	P2		2,5	1,5	3,75	5	-18,8
	P4		2,5	1	2,5	26	-65,0
	P5		2,5	0,9	2,25	36	-81,0
	P6		2,5	0,8	2	16	-32,0
	P7		2,5	1,5	3,75	2	-7,5
	V01		0,6	0,5	0,3	7	-2,1
	V02		0,9	1	0,9	1	-0,9
	V03		0,6	1,2	0,72	24	-17,3
	V04		0,9	1,8	1,62	33	-53,5
	V05		1,35	2,4	3,24	9	-29,2
	V06		1,35	3,2	4,32	10	-43,2
	Vano		2,82	3,45	9,729	1	-9,7
						SUBTOTAL	6237,9

0139

MEMORIA DE CANTIDADES


CONTRATO Nº.		PROYECTO:					FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CCG	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 5 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ					MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EH HOSPITALARIO						Unidad
ITEM: 15,2	ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PARA INTERIORES, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL						M2
3	PASILLOS	101,69			3,45		350,8
	P3		2,5	1,1	2,75	1	-2,8
	P4		2,5	1	2,5	5	-12,5
	P5		2,5	0,9	2,25	1	-2,3
	V03		0,6	1,2	0,72	5	-3,6
	V04		0,9	1,8	1,62	9	-14,6
	V05		1,35	2,4	3,24	2	-6,5
	Varo		20,25	3,45	69,837	1	-69,9
						SUBTOTAL	238,8
4	PUERTAS						
	P1		0,25	2	0,5	1	0,5
	P2		0,25	1,5	0,375	16	6,0
	P3		0,25	1,1	0,275	3	0,8
	P4		0,25	1	0,25	66	16,5
	P5		0,25	0,9	0,225	7	1,6
	P6		0,25	0,8	0,2	26	5,2
						SUBTOTAL	30,6
5	MESON TIPO 1	10,22	1			2	20,4
		10,22	0,25			2	5,1
						SUBTOTAL	25,5
6	MESON TIPO 2	9,2	1			2	18,4
		9,2	0,25			2	4,6
						SUBTOTAL	23,0
7	MESON TIPO 3	27,9	1			2	55,8
8	MESON TIPO 4	79,2	1				79,2
9	SUBESTACIÓN ELECTRICA	59,5	3,38				201,1
	P4		2,5	2	5	3	-15,0
	P5		2,5	0,55	1,625	1	-1,6
	LOSA	8,5		10,8			91,8
						SUBTOTAL	276,3
	TOTAL ESTUCO m2						7234,50

0200

MEMORIA DE CANTIDADES

		PROYECTO:	
CONTRATO Nº.		CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EH HOSPITALARIO		Unidad
ITEM: 15,2	ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PARA INTERIORES, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL		M2

OBSERVACIONES : VER PLANO

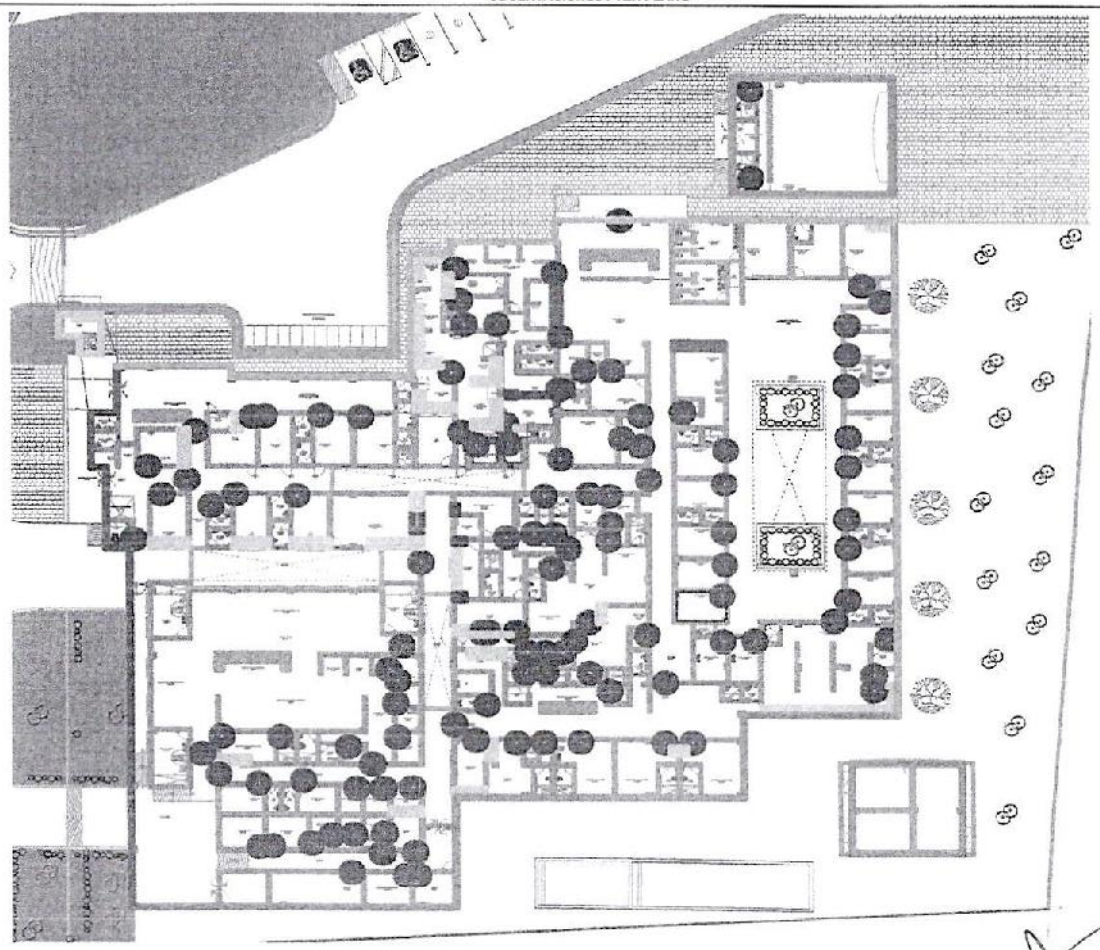

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Rep. Leg.

Kathleen Díaz H.S.S

0201

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.		157	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO BH HOSPITALARIO	
ITEM:	15,3	PINTURA ESPECIAL + BASE EN PINTURA VINILO PARA AREAS DE PROCEDIMIENTOS DE ALTA ASEPCIA O SIMILAR PARA CIELORASO Y MUROS EN ÁREAS ESPECIALES	

FECHA: MAYO DE 2021

Unidad: m2

PINTURA DE MUROS INTERNOS (Pintura tipo acrílica + Pintura Especial)

MUROS INTERNOS			PUERTAS							VENTANAS						AREA NETA DE PINTURA (m2)
			5	3,75	2,75	2,5	2,25	2	3,75	0,3	0,9	0,72	1,215	3,24	4,32	
LOCALIZACION	LONGUITUD DE MURO	ALTURA DE MURO	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	V01	V02	V03	V04	V05	V06	
EJES T-X Y NUMERAL 14-18	67,97	2,7				6	2	1								324,088
EJES M-T Y NUMERAL 17-18	30,58	2,7				5	4									122,132
EJES E-M Y NUEMRAL 17-18	32,91	2,7				4	5	1								131,214
EJES E-I Y NUMERAL 15-17	31,46	2,7		1		2	3					1				137,444
EJES M-T Y NUMERAL 14-15	62,21	2,7				3	3	2								299,434
EJES F-M Y NUMERAL 14-15	51,47	2,7		1		4	1	1				1				240,498
EJES T-X Y NUMERAL 8-16	65,19	2,7				7		1								313,026
EJES P-T Y NUMERAL 8-14	138,29	2,7				14	1	7								644,266
EJES K-P Y NUMERAL 9-14	109,22	2,7		3		10	4				1		1			495,058
EJES E-K Y NUMERAL 9-14	114,03	2,7		1	2	3	2	11					2			524,402
EJES C-E Y NUMERAL 9-15	77,99	2,7		2		4	4	2					2			355,286
EJES A-B Y NUMERAL 2-9	50,8	2,7		1	3											250,32
EJES B-C Y NUMERAL 2-7	89,05	2,7				10	2	3								409,87
EJES C-H Y NUMERAL 2-7	125,29	2,7		1	1	2	2	7				2	5			590,736
EJES H-L Y NUMERAL 2-7	55,51	2,7		2		2						1	9			257,384
EJES L-N Y NUMERAL 1-9	84,14	2,7		2		3	2	3				2		2		387,516
EJES N-S Y NUMERAL 1-9	107,23	2,7		3	1	8	9					6				461,902
AUDITORIO	22,4	2,7				2	2									101,96
PORTERIA	1,51	2,7						1								4,154
CUARTO ELECTRICO	59,87	3,5				8						2				198,845
MUROS PERIMETRALES LADO INTERNO																
EJES E-X ,NUMERAL 18	39,83	2,7										14				97,596
EJE X Y NUMERAL 12-18	25,73	2,7											8			66,751
EJE E Y NUMERAL 15-18	11,5	2,7										1		2		23,69
EJESC-E Y NUMERAL 15	6,72	2,7											1			16,929
EJE C Y NUMERAL 9-15	8,55	2,7										4		4		7,245
EJES A-C Y NUMERAL 9	9,51	2,7											1		1	20,142
EJE A Y NUMERAL 2-9	24,52	2,7											3			62,559
EJES A-L Y NUMERAL 2	30,9	2,7													4	66,15
EJES L-S Y NUMERAL 1	15,17	2,7		1								3	2			32,619
EJE S Y NUMERAL 1-7	23,3	2,7											2		4	43,2
EJES S-V Y NUMERAL 8	10,11	2,7								7						25,197
EJES V-W Y NUMERAL 8-12	13,28	2,7												1	2	23,975
PORTERIA	13,05	2,7						1								33,235
AUDITORIO	46,98	2,7	1									2				129,403

0202

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°:	157	PROYECTO:	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM:	15,3	PINTURA ESPECIAL + BASE EN PINTURA VINILO PARA AREAS DE PROCEDIMIENTOS DE ALTA ASEPCIA O SIMILAR PARA CIELORASO Y MUROS EN ÁREAS ESPECIALES	Unidad: m2

ÁREA	UBICACIÓN	LONGITUD	ALTO	PUERTA	AREA A RESTAR POR PUERTA									
AUDITORIO	WC HOMBRES	12,2	0,85	P-05	0,315									10,055
AUDITORIO	WC MUJERES	12,2	0,85	P-05	0,315									10,055
CONSULTA EXTERNA	WC CONSULTORIO 2 - CITOLOGÍA	6,74	0,85	P-05	0,315									5,414
CONSULTA EXTERNA	ASEO	4,96	0,85	P-06	0,28									3,936
CONSULTA EXTERNA	WC CONSULTORIO 5	7,17	0,85	P-05	0,315									5,7795
CONSULTA EXTERNA	WC CONSULTORIO 4	7,11	0,85	P-05	0,315									5,7285
CONSULTA EXTERNA	WC CONSULTORIO 6	6,74	0,85	P-05	0,315									5,414
CONSULTA EXTERNA	WC CONSULTORIO 7	6,74	0,85	P-05	0,315									5,414
CONSULTA EXTERNA	WC CONSULTORIO 8	6,74	0,85	P-05	0,315									5,414
CONSULTA EXTERNA	WC CONSULTORIO 9	6,74	0,85	P-05	0,315									5,414
CONSULTA EXTERNA	WC CONSULTORIO 10	6,84	0,85	P-05	0,315									5,499
CONSULTA EXTERNA	WC ODONTOLOGÍAS EJE I EJES (7-18)	6,84	0,85	P-05	0,315									5,499
CONSULTA EXTERNA	WC ODONTOLOGÍAS EJE I EJES (15-16)	6,48	0,85	P-05	0,315									5,193
CONSULTA EXTERNA	WC HALL	5,69	0,85	P-06	0,28									4,5535
CONSULTA EXTERNA	WC CONSULTORIO 15	6,64	0,85	P-05	0,315									5,329
CONSULTA EXTERNA	WC CONSULTORIO 16	6,3	0,85	P-05	0,315									5,04
CONSULTA EXTERNA	WC CONSULTORIO 17	7,04	0,85	P-05	0,315									5,659
CONSULTA EXTERNA	WC DISPENSACIÓN	6,7	0,85	P-05	0,315									5,38
CONSULTA EXTERNA	ASEO DISPENSACIÓN	4,58	0,85	P-06	0,28									3,813
CONSULTA EXTERNA	WC PUBLICO HOMBRES	13,64	0,85	P-04	0,35									11,244
CONSULTA EXTERNA	WC PUBLICO MUJERES	18,75	0,85	P-04	0,35									15,5875
HOSPITALIZACIÓN	WC HOSPITALIZACIÓN HOMBRES	8,8	0,85	P-05	0,315									7,165
HOSPITALIZACIÓN	WC HOSPITALIZACIÓN MUJERES	8,8	0,85	P-05	0,315									7,165

0203

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°:		157			PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA S.N.D								FECHA: MAYO DE 2021	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN MIGUEL CC6												
INTERVENTORIA:		CONSORCIO BH HOSPITALARIO												
ITEM:	15,3	PINTURA ESPECIAL + BASE EN PINTURA VINILO PARA AREAS DE PROCEDIMIENTOS DE ALTA ASEPCIA O SIMILAR PARA CIELORASO Y MUROS EN ÁREAS ESPECIALES											Unidad: m2	
HOSPITALIZACIÓN	WC HOSPITALIZACIÓN NIÑOS	8,66	0,85	P-05	0,315									7,046
HOSPITALIZACIÓN	WC HOSPITALIZACIÓN AISLADOS	8,46	0,85	P-05	0,315									6,876
HOSPITALIZACIÓN	WC VESTIER	7,06	0,85	P-05	0,315									5,686
HOSPITALIZACIÓN	ASEO	6,51	0,85	P-06	0,28									5,2535
HOSPITALIZACIÓN	WC PASILLOS Z3 EJE F Y EJES 15	5,81	0,85	P-05	0,315									4,6235
HOSPITALIZACIÓN	WC PASILLOS EJE F Y EJES 16	5,81	0,85	P-05	0,315									4,6235
SERVICIOS GENERALES	WC SALA DE ESPERA	7,38	0,85	P-05	0,315									5,958
SERVICIOS GENERALES	WC CADAVERES	7,4	0,85	P-05	0,315									5,975
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	WC ENFERMERAS	8,75	0,85	P-05	0,315									7,131
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	WC DESCANSO MÉDICO	8,75	0,85	P-05	0,315									7,131
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	ASEO	6,92	0,85	P-06	0,28									5,602
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	WC PUBLICO HOMBRES	20,22	0,85	P-04	0,35									16,837
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	WC PUBLICO MUJERES	19,78	0,85	P-04	0,35									16,463
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	WC PUBLICO NIÑOS	17,9	0,85	P-04	0,35									14,865
CONSULTA URGENCIAS	WC PERS. MUJERES	6,84	0,85	P-06	0,28									5,534
CONSULTA URGENCIAS	WC PERS. HOMBRES	6,84	0,85	P-06	0,28									5,534
CONSULTA URGENCIAS	WC ERA	7,95	0,85	P-05	0,315									6,4425
CONSULTA URGENCIAS	WC EDA	7,95	0,85	P-05	0,315									6,4425
CONSULTA URGENCIAS	WC EMERGENCIAS	8,64	0,85	P-02	0,525									6,819
CONSULTA URGENCIAS	DUCHA EMERGENCIAS	6,38	0,85											5,423
CONSULTA URGENCIAS	WC MUJERES - SALA DE ESPERA DE TRIAGE	7,19	0,85	P-05	0,315									5,7905
CONSULTA URGENCIAS	WC MUJERES - SALA DE ESPERA DE TRIAGE	7,5	0,85	P-05	0,315									6,06
CONSULTA URGENCIAS	WC DISCAPACITADO MIXTO	6,9	0,85	P-05	0,315									5,55
CONSULTA URGENCIAS	WC CONSULTORIO 1	7,83	0,85	P-05	0,315									6,3405
CONSULTA URGENCIAS	WC CONSULTORIO 2	7,47	0,85	P-05	0,315									6,0345

2020

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MEMORIA DE CANTIDADES												CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
					PROYECTO:									
CONTRATO N°.		157			CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 5 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ									FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN MIGUEL CC6												
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO EH HOSPITALARIO												Unidad
ITEM:	15,3	PINTURA ESPECIAL + BASE EN PINTURA VINILO PARA AREAS DE PROCEDIMIENTOS DE ALTA ASEPCIA O SIMILAR PARA CIELORASO Y MUROS EN ÁREAS ESPECIALES												m2
CONSULTA URGENCIAS	WC SALA DE ESPERA - CONSULTA URGENCIAS - HOMBRES	8,12	0,85	P-05	0,315									6,587
CONSULTA URGENCIAS	WC SALA DE ESPERA - CONSULTA URGENCIAS - MUJERES	6,96	0,85	P-05	0,315									5,601
CONSULTA URGENCIAS	ASEO	6,08	0,85	P-05	0,315									4,853
CONSULTA URGENCIAS	WC CONSULTORIO 3	6,36	0,85	P-05	0,315									5,091
LABORATORIO - RAYOS X	WC VESTIER TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES	6,12	0,85	P-04	0,35									4,862
LABORATORIO - RAYOS X	WC OFICINA	6,36	0,85	P-04	0,35									5,056
LABORATORIO - RAYOS X	WC VESTIER H	9,04	0,85	P-06	0,28									7,404
LABORATORIO - RAYOS X	WC VESTIER M	9,04	0,85	P-06	0,28									7,404
LABORATORIO - RAYOS X	WC PERSONAL	5,46	0,85	P-06	0,28									4,361
LABORATORIO - RAYOS X	ASEO - RAYOS X	5,46	0,85	P-06	0,28									4,361
LABORATORIO - RAYOS X	ASEO - LABORATORIO	9,37	0,85	P-05	0,315									7,6495
LABORATORIO - RAYOS X	WC SALA DE ESPERA RAYOS X	9,2	0,85	P-06	0,28									7,54
ESTERILIZACIÓN - OBSTETRICIA	WC VESTIER	7,74	0,85	P-05	0,315									6,264
ESTERILIZACIÓN - OBSTETRICIA	ASEO CONTIGUO SALA DE PARTOS	5,06	0,85	P-06	0,28									4,021
ESTERILIZACIÓN - OBSTETRICIA	WC ENFERMERIA Y PUERPERIO	7,74	0,85	P-05	0,315									6,264
ESTERILIZACIÓN - OBSTETRICIA	WC VESTIER - LAVADO	7,94	0,85	P-05	0,315									6,434
ESTERILIZACIÓN - OBSTETRICIA	ASEO - CIRCULACION	5,06	0,85	P-06	0,28									4,021
ESTERILIZACIÓN - OBSTETRICIA	ASEO - TRABAJO DE PARTO	5,4	0,85	P-05	0,315									4,275
ESTERILIZACIÓN - OBSTETRICIA	WC TRABAJO DE PARTO	8,75	0,85	P-05	0,315									7,1225
ESTERILIZACIÓN - OBSTETRICIA	ASEO - EMPAQUE	5,98	0,85	P-04	0,35									4,733

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO Nº.		157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	FECHA: MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO BH HOSPITALARIO	Unidad
ITEM:	15,3	PINTURA ESPECIAL + BASE EN PINTURA VINILO PARA AREAS DE PROCEDIMIENTOS DE ALTA ASEPCIA O SIMILAR PARA CIELORASO Y MUROS EN ÁREAS ESPECIALES	m2

ESTERILIZACIÓN - OBSTETRICIA	WC MUJERES VESTIER CONTIGJO A DEPÓSITO DE MATERIALES	7	0,85	P-05	0,315								5,635
ESTERILIZACIÓN - OBSTETRICIA	WC HOMBRES VESTIER CONTIGJO A DEPÓSITO DE MATERIALES	7	0,85	P-05	0,315								5,635
GARITA	WC GARITA	6,08	0,85	P-05	0,28								4,888
CAMU ESE VIDA SINU	SOPORTES PARA MESONES	79,4	1										79,4

Total Pintura (m2)	7421,403
Total Pintura Tipo acrilica (m2)	1073,2
Total Pintura Especial Para Muros (m2)	6348,203
PINTURA DE CIELO RASO (Pintura Especial)	3341
TOTAL PINTURA ESPECIAL + BASE EN PINTURA VINILO	9689,20

OBSERVACIONES: VER PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Diaz PSS

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

9020

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.		157		PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ			FECHA:	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN MIGUEL CC6					MAYO DE 2021	
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO BH HOSPITALARIO					UNIDAD	
ITEM:	15,5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (HIDROREPELENTE), DE PRIMERA CALIDAD. MÍNIMO 3 MANOS. COLOR A DEFINIR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. SOBRE ESTUCO					M2	
ÁREA	ALTURA	ANCHO	(-) PUERTA	(-)VENTANA	(-) OTROS	CANTIDAD		
MUROS EXTERIORES NIVEL 0+000 A 0+003,9								
FACHADA ESTE	3,9	44,53		10,08				163,59
FACHADA SUR	3,9	79,54	2,5	30,33				277,38
FACHADA NORTE	3,9	53,63	18,125	21,87				169,16
FACHADA OESTE	3,9	78,8	5	33,86				235,86
AUDITORIO								
CONTORNO	3,9	46,95	5	1,44				176,67
CUARTO ELÉCTRICO								
CONTORNO	3,85	34	10					120,90
MUROS FACHADAS								
CAMU								
FACHADA ESTE	1,99	44,53				2		177,23
FACHADA SUR	1,99	79,54				2		316,57
FACHADA NORTE	1,99	50				2		199,00
	0,72	14,5				2		20,88
	0,72	19,74				2		28,43
FACHADA OESTE	1,99	77,68				2		309,17
	0,72	15,85				2		22,82
	0,72	25,14				2		36,20
AUDITORIO								
FACHADA ESTE - SUR	1,99	10,36				4		82,47
FACHADA NORTE - OESTE	1,99	13,12				4		104,44
CUARTO ELÉCTRICO								
CONTORNO	0,54	34				2		36,72
MUROS CULATA - TEJA TERMOACUSTICA								
	LARGO	ALTO 1	ALTO 2					
CUBIERTA 1	8,4	0,72				2		12,10
CUBIERTA 1 - CULATA	6,53	0,72	1,5			4		28,97
CUBIERTA 2	13	0,72				2		18,72
CUBIERTA 2 - CULATA	8,12	0,72	1,5			4		36,05
CUBIERTA 3	89,1	0,72				1		64,15
CUBIERTA 3	89,1	0,72				1		64,15

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	57	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		UNIDAD

ITEM:	15,5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (HIDROREPELENTE), DE PRIMERA CALIDAD. MÍNIMO 3 MANOS. COLOR A DEFINIR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. SOBRE ESTUCO						M2
CUBIERTA 3	6,82	1,1				1		7,50
CUBIERTA 3 - CULATA	8,1	1,7	0,72			4		39,20
CUBIERTA 3 - CULATA	5,8	1,1	0,72			2		10,56
CUBIERTA 4	4,4	0,72				1		3,17
CUBIERTA 4	10,6	0,72				1		7,63
CUBIERTA 4	14,9	1,9				1		28,31
CUBIERTA 4 - CULATA	12,25	1,9	0,72			2		32,10
CUBIERTA 4 - CULATA	10,74	1,9	0,72			2		28,14
CUBIERTA 5	25,18	0,72				2		36,26
CUBIERTA 5 - CULATA	10,46	0,72	1,98			4		56,48
MUROS CULATA - TEJA TRASLUCIDA								
	LARGO	ALTO 1	ALTO 2	AREA				
CUBIERTA 1	17,14	1,1				2		37,71
CUBIERTA 1 - CULATA				7,7		2		15,40
CUBIERTA 2	16,55	1,1				2		36,41
CUBIERTA 2 - CULATA				4,7		2		9,40
CUBIERTA 3	12,54	1,1				2		27,59
CUBIERTA 3 - CULATA				3,13		2		6,26
CUBIERTA 4	16,4	1,1				2		36,08
CUBIERTA 4 - CULATA				3,15		2		6,30
						TOTAL PINTURA KORAZA		3155,91

OBSERVACIONES: VER PLANO ARQUITECTONICO Y PLANOS DE CUBIERTAS

Kathleen Diaz Hoyos

V0 B0 KATHLEEN DIAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0208

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO Nº.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM:	15,6

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA MUROS INTERIORES. COLOR A DEFINIR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. SOBRE ESTUCO

UNIDAD: m2

PUERTA	ÁREA	PUERTA	ÁREA	VENTANAS	ÁREA
P-01	5	P-05	2,25		
P-02	3,75	P-06	2	V-06	5,76
P-03	2,75	P-07	3,75	V-04	1,62
P-04	2,5				

ÁREA	UBICACIÓN	LONGITUD	ÁREA PUERTAS	ÁREA VENTANAS	ALTO	ÁREA TOTAL
AUDITORIO	SALON - AUDITORIO	87,00	9,50		2,90	242,8
AUDITORIO	WC AUDITORIO HOMBRES	12,20	0,32		0,85	10,055
AUDITORIO	WC AUDITORIO MUJERES	12,20	0,32		0,85	10,055
CONSULTA EXTERNA	PASILLOS	675,32	75	13,55	2,90	1869,87
SERVCIOS GENERALES	PASILLO DESCARGUE	63,6	6	31,86	2,90	146,56
GARITA	GARITA	10,02	2		2,90	27,058
GARITA	WC GARITA	6,08	0,28		0,85	4,888
CAMU ESE VIDASINU	CUARTO ELECTRICO	59,27	8		3,50	199,445
					TOTAL	2510,75

OBSERVACIONES: Se anexa Planos acotado en Autocad en Magnetico

Kathleen Díaz H-S S &


V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6


V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Consorcio BH hospitalario


0209


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No	157	PROYECTO	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDASINU	FECHA
INTERVENTORIA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM 17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RED CONTRA INCENDIOS ACERO AL CARBON SCH 10 DE 4"		UNIDAD ML





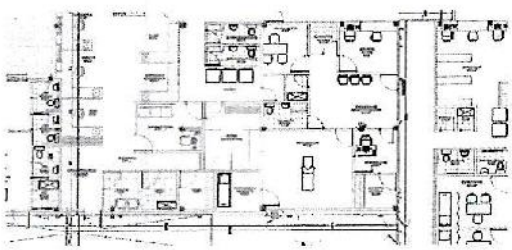

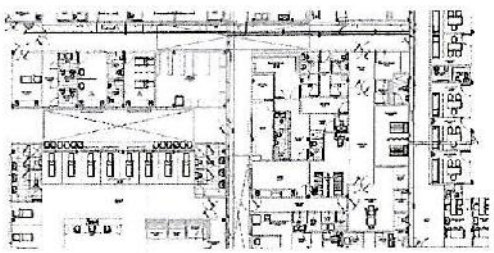


Descripcion	TUBERIA
Detalle 1	5,91
Detalle 2	14,79
Detalle 3	42,11
Detalle 4	0
Detalle 5	36,96
Detalle 6	35,68
Detalle 7	20,99
Detalle 8	19,09
Detalle 9	6,86
Detalle 10	24,3
Detalle 11	19,66
TOTAL TUBERIA	226,35

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO RCI Y DETALLES

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No	157	PROYECTO	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E	FECHA
INTERVENTORIA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM 17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RISER 4"		UNIDAD: UND

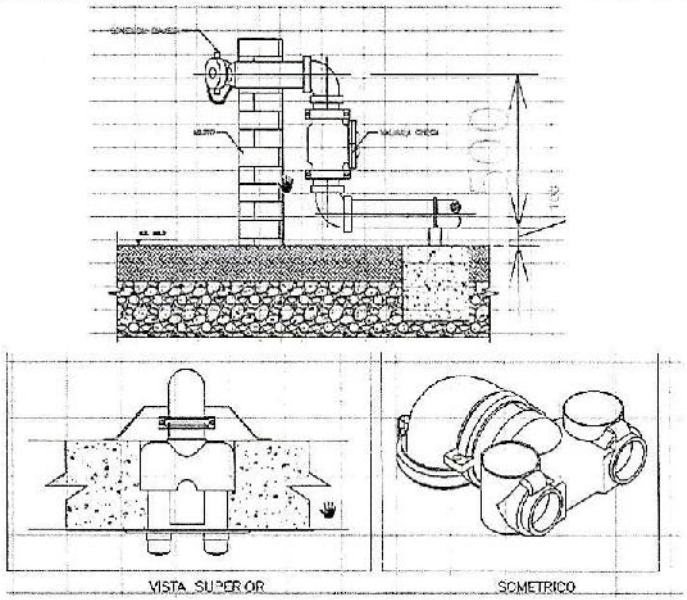

Descripcion	SIAMESA
Detalle 1	
Detalle 2	
Detalle 3	
Detalle 4	
Detalle 5	
Detalle 6	
Detalle 7	
Detalle 8	2
Detalle 9	2
Detalle 10	3
Detalle 11	
TOTAL	7


OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO RCI

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0211

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No	157	PROYECTO	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDASINU	FECHA
INTERVENTORIA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM 17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA 2 1/2" RANURADA		UNIDAD: UND

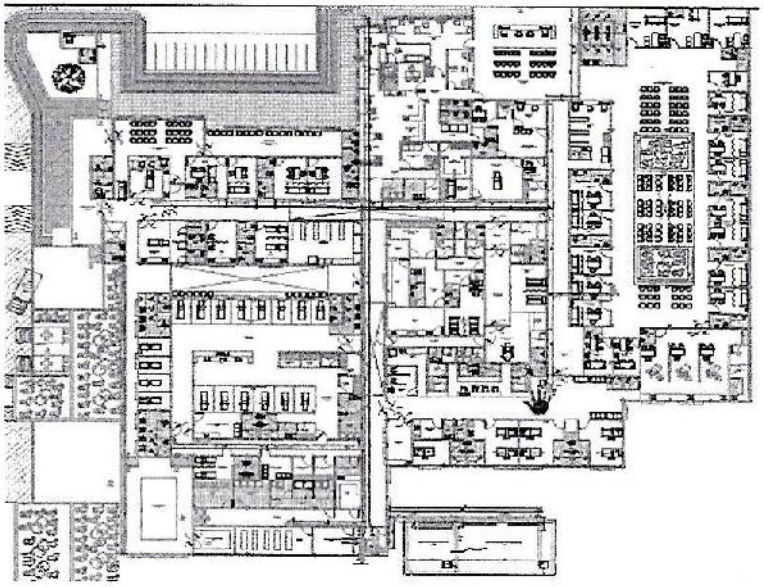

Descripcion	
Detalle 1	0
Detalle 2	0
Detalle 3	1
Detalle 4	0
Detalle 5	1
Detalle 6	0
Detalle 7	0
Detalle 8	1
Detalle 9	1
Detalle 10	0
Detalle 11	0
Detalle 12	0
TOTAL	4

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO RCI


Kathleen Diaz H.S.S.d

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0212

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No	157	PROYECTO	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDASINU	FECHA
INTERVENTORIA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM 17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA 4" RANURADA		UNIDAD: UND

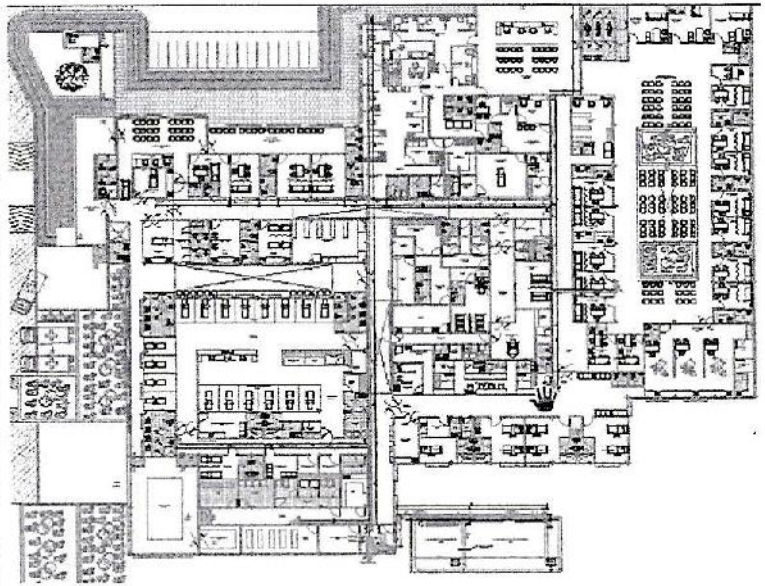

Descripcion	
Detalle 1	0
Detalle 2	0
Detalle 3	2
Detalle 4	0
Detalle 5	0
Detalle 6	0
Detalle 7	0
Detalle 8	0
Detalle 9	0
Detalle 10	0
Detalle 11	0
Detalle 12	0
TOTAL	2

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO RCI

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario


0213

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO No	157	PROYECTO	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDASINU	FECHA
INTERVENTORIA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM 17,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA OS&Y		UNIDAD: UND

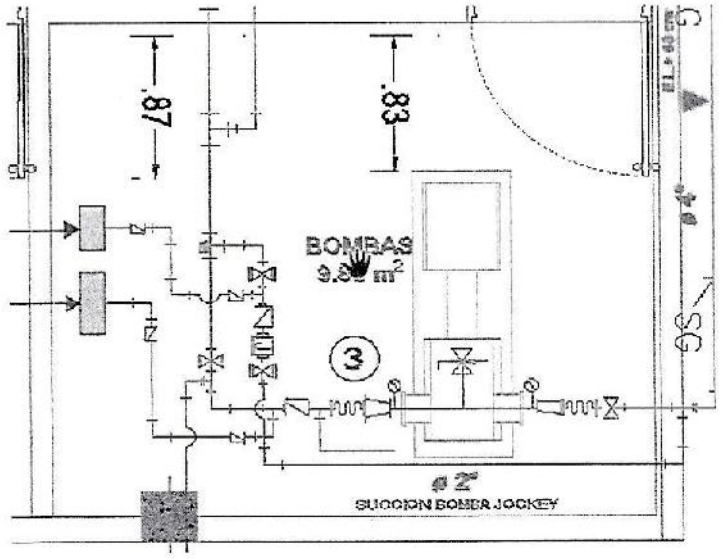

Descripcion	RISER DE 4"
Detalle 1	
Detalle 2	
Detalle 3	
Detalle 4	
Detalle 5	
Detalle 6	
Detalle 7	
Detalle 8	
Detalle 9	
Detalle 10	4
Detalle 11	1
TOTAL TUBERIA	5

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO RCI


Kathleen Diaz H.S.S.I

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0214

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No	157	PROYECTO	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDASINU	FECHA
INTERVENTORIA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM 18,17	LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24		UNIDAD M2

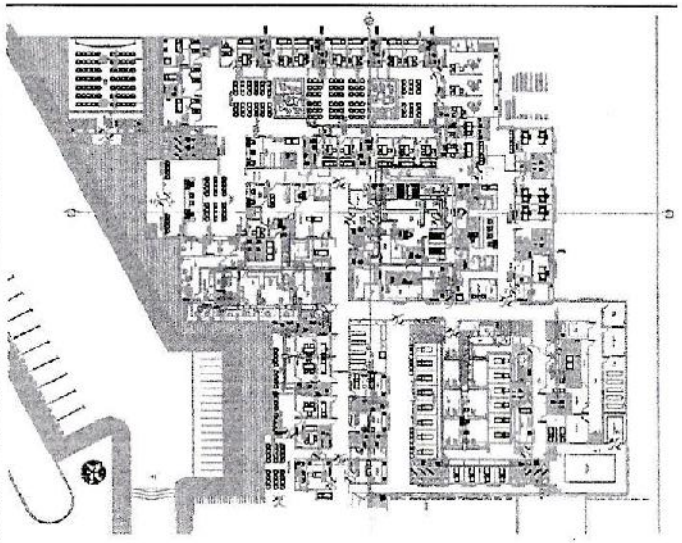

UBICACIÓN	M2
URGENCIAS	252
LABORATORIO - RAYOS X	153
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	190
CONSULTA EXTERNA	75
TOTAL TUBERIA	670

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO AA


Kathleen Díaz H.SS &

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0215

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No	157	PROYECTO	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDASINU	FECHA
INTERVENTORIA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM 18,18		LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	UNIDAD: M2

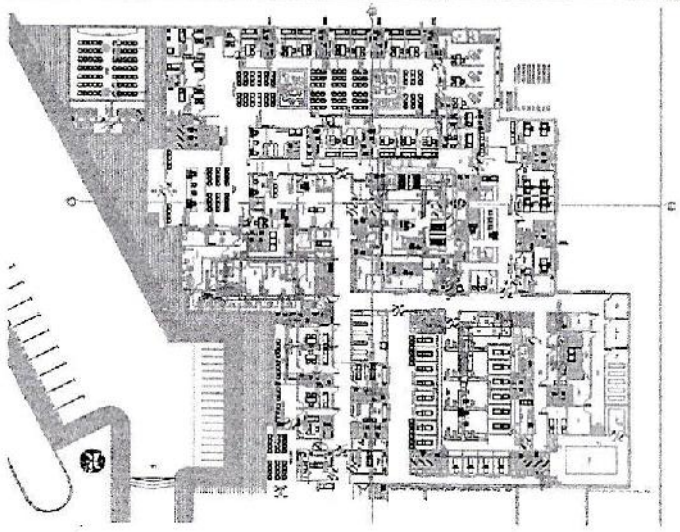

UBICACIÓN	M2
URGENCIAS	302
LABORATORIO - RAYOS X	203
OBSTETRICIA - ESTERILIZACIÓN	240
CONSULTA EXTERNA	125
TOTAL TUBERIA	870

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO AA

Kathleen Díaz H.S.S.d

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0216


MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

		PROYECTO:	
CONTRATO N°.	157	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU	FECHA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		

ITEM°:	19,1	PRADIZACIÓN EN GRAMA KIKUYO / KIKUYU / PASTO AFRICANO (PENNISETUM CLANDESTINUM), CAPA VEGETAL DE COBERTURA YA ENRAIZADA. INCLUYE TIERRA NEGRA ALUVIÓN Y CASCARILLA DE ARROZ.	UNIDAD
			UND

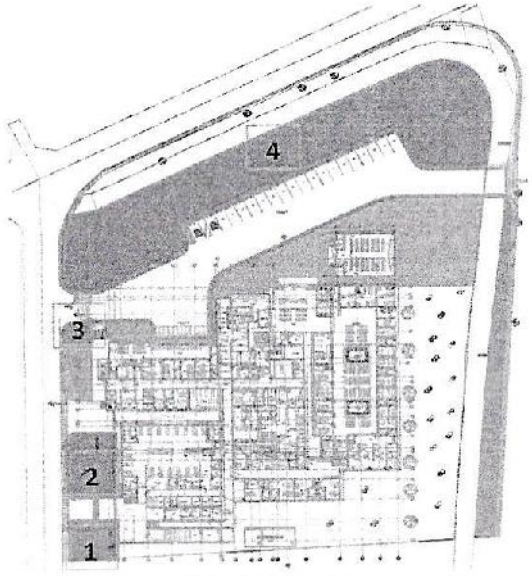

UBICACIÓN	AREA (m2)
Praderizacion 1	96,2
Praderizacion 2	163,7
Praderizacion 3	24,64
Praderizacion 4	1558,12
Total	1842,66

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Díaz H.SSL

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

0217

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO N°.	157
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA ESE VIDA SINU

FECHA: MAYO DE 2021

ITEM°:	19,2	TALUDES Y RELLENOS EN TIERRA NEGRA-ALUVIÓN Y CASCARILLA DE ARROZ- ABONADA	UNIDAD

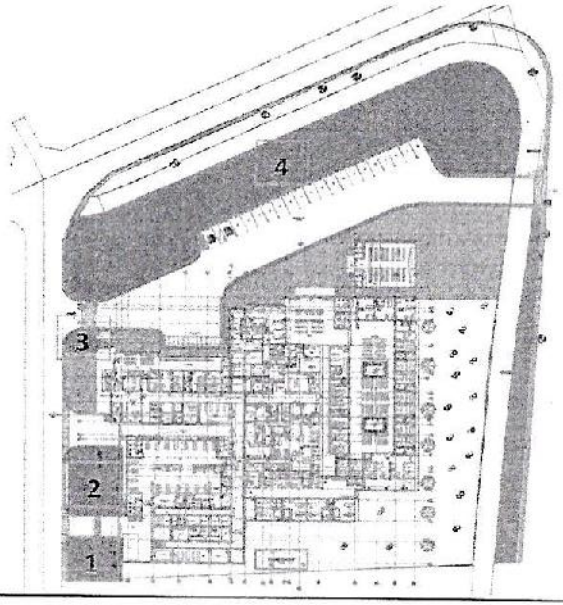

UBICACIÓN	AREA (m2)	H=0.05	UND Volumen (m3)
Praderizacion 1	96,2	0,05	4,8
Praderizacion 2	163,7	0,05	8,2
Praderizacion 3	24,64	0,05	1,2
Praderizacion 4	1558,12	0,05	77,9
TOTAL			92,13

OBSERVACIONES: VER ESQUEMA ANEXO Y PLANO ARQUITECTONICO

Kathleen Díaz H.

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6

V0 B0 RESIDENTE Y/O INTERVENTOR
Rep. Leg.







0218

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6






CONTRATO N°.	157	PROYECTO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM:	19,5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE PARQUEADEROS ESPESOR 0,2M	UNIDAD: M2

Tipo de Losa	B	L	Area	Cantidad	Total Area
	3,5	4	14	26	364,00
	3,5	4,09	14,315	2	28,63
	3,5	3,91	13,685	2	27,37
	3	3,5	10,5	14	147,00
	3	3	9	34	306,00
			28,65	2	57,30

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6






CONTRATO N°.	157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	FECHA: MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM:	19,5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE PARQUEADEROS ESPESOR 0,2M	UNIDAD: M2

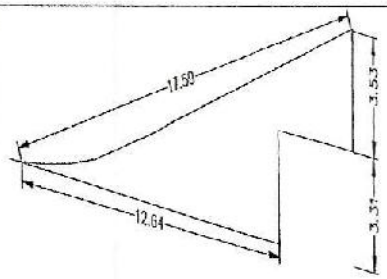			45,7	1	45,70
			48,47	1	48,47
			24,7	1	24,70
	3	2,4	7,2	4	28,80
			37,2	1	37,20

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6


CONTRATO Nº:	157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		FECHA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		MAYO DE 2021
ITEM:	19,5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE PARQUEADEROS ESPESOR 0,2M	UNIDAD: M2

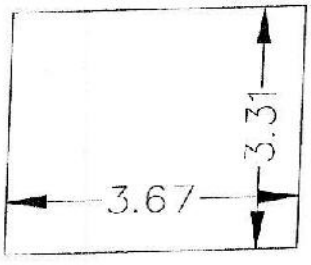			15,7	1	15,70
			48,3	1	48,30
	3,31	3,59	11,8829	2	23,77
	3,31	3,67	12,1477	1	12,15
	3,53	3,59	12,6727	1	12,67

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°:	157	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6		FECHA: MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		
ITEM:	19,5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE PARQUEADEROS ESPESOR 0,2M	UNIDAD: M2



	3,53	3,67	12,9551	1	12,96
ACCESO 1					94,45
ACCESO 2					67,37
Total m2 de Concreto Pavimento					1402,53


OBSERVACIONES: VER PLANO DE MODULACION DE LOSAS

V0 B0 KATHLEEN DIAZ HOYOS	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6	Consorcio BH hospitalario

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

CONTRATO N°.	157	PROYECTO:	FECHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E VIDA SINÚ	MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO		UNIDAD
ITEM: 20,1	PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO CON ANCHO MAXIMO DE 0.15M		ML

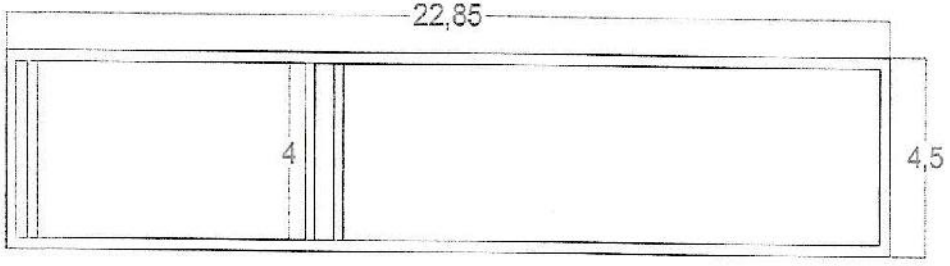

LARGO	ANCHO	PERIMETRO	MURO INTERMEDIO	TOTAL ML DE PUENTE ADHERENCIA
22,85	4,5	54,7	4	58,7

TOTAL ML DE PUENTE ADHERENCIA	58,70

OBSERVACIONES: VER PLANOS DIGITAL - Autocad

Kathleen Díaz Hoyos

V0 B0 KATHLEEN DÍAZ HOYOS
Rep. Leg. Consorcio San Miguel CC6

V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR
Consorcio BH hospitalario

0223
