	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 6 (Día) / 9 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA PICHUNA -NAZARET — TRAMO Y/O SECTOR(S): PICHUNA - NAZARET(K0 +000 AL K5+700)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LETICIA -AMAZONAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 13 del 30/08/2021 al 05/09/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. CAROL KATHERINE VAZQUEZ PINTO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARETH-MUNICIPIO DE LETICIA, (DEPARTAMENTO DE AMAZONAS) "PROGRAMA COLOMBIA RURAL" — FECHA DE INICIO: 03/02/2021

KM A MEJORAR: 0,108 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: O,108 — No. PUENTES: — OTROS: 1 BOX COULVERT

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL R&R SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO CAC		
INTEGRANTES:	R/L CAMILO ALBERTO RODRIGUEZ ESTUPIÑAN			INTEGRANTES:	ANA ISABEL HENDE CARREÑO Con un porcentaje de participación del 50% Y CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ Con un porcentaje de participación del 50%		
CONTRATO No.	528 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 538.192.814,40	CONTRATO No.	1523 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 107.044.711,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (04) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 538.192.814,40	PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES Y VEINTIDOS(22) DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 107.044.711,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021		
RECURSOS POR VIGENCIA			$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ 83.622.063,89	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 538.192.814,40
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 88.389.735,57
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 83.622.063,89
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	15,54%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 83.622.063,89

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO:

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X


MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	1	1
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):		
KM MANTENIDOS (Km):	0,108	0,108
KM BASE/SUBBASE (Km)		
KM PAVIMENTADOS (Km)		
BOXCULVERT (Un)	1	1
OTROS		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: k0+080 - k0+188

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ___ NO ___
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ___ NO ___
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ___ NO ___
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (EXPLOTACION DE MATERIAL)	SI		NO		N/A	x

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EJECUCION

OBSERVACIONES:
NINGUNA, SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

V. GESTION PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
NO APLICA LA GESTION PREDIAL EN EL PRESENTE CONTRATO.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 8 # 7-58 Leticia

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El dia 30/08/2021 Se instalo 14,59 M3 base arena -cemento desde el PR 0+092,50 al PR 0+110 carril izquierdo via Pichuna -Nazaret.

tDurante la semana se corto y figuro 1292,67 kg de Acero de refuerzo para la construcción del Box coulvert

El dia 31/08/2021 Se realizo la demolición de 48 m2 de cinta de concreto en el PR 0+080 al PR 0+110 carril derecho via Pichuna -Nazaret.

El dia 01/09/2021 Se instalo 11,29 M3 base arena -cemento desde el PR 0+110 al PR 0+120 carril izquierdo via Pichuna -Nazaret.

El dia 02/09/2021 Se instalo 13,30 M3 base arena -cemento desde el PR 0+120 al PR 0+130 carril izquierdo via Pichuna -Nazaret.

El dia 02/09/2021 Se instalo 115,5 M2 de geotextil tejido 2100 desde el PR 0+110 AL PR 0+130 carril izquierdo via Pichuna -Nazaret.

El dia 02/09/2021 Se instalo 16,92 M3 base arena -cemento en el fallo PR 0+130 carril izquierdo via Pichuna -Nazaret.

El dia 03/09/2021 Se instalo 10,50 M3 base arena -cemento desde el PR 0+130 al PR 0+140 carril izquierdo via Pichuna -Nazaret. .

El dia 04/09/2021 Se realizaron excavaciones varias de 21 M3 de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento base arena -cemento desde el PR 0+160 al PR 0+190 carril izquierdo via Pichuna -Nazaret. .

Durante la semana se realizo el curado de la capa de la base arena-cemento .

Se realizaron charlas sobre riesgos laborales

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua con la instalación de la capa de Base Arena-Cemento.

Se continua con la instalación del Geotextil Tejido 2100.

Se continua con las excavaciones Varias en el carril izquierdo para la construcción de la estructura del pavimento rigido

IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO



PR 0+080 — PR 0+188

El esquema gratico sera definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR0+095 INSTALACIÓN BASE (ARENA-CEMENTO) PR0+092,5 AL PR 0+110 CARRIL IZQUIERDO



PR0+130 INSTALACIÓN BASE (ARENA-CEMENTO) PR0+130 AL PR 0+140 CARRIL IZQUIERDO



PR0+190 EXCAVACIONES VARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PR0+160 AL PR0+190 CARRIL IZQUIERDO



PR0+190 EXCAVACIONES VARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PR0+160 AL PR0+190 CARRIL IZQUIERDO




PR0+140 CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO BOX COULVERT



PR0+140 CAPACITACIÓN RIESGOS LABORALES


XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Solicitud al Contratista de la entrega de la información para el control de la ejecución de la obra mediante oficios	
Comunicar al Supervisor del contrato las dudas sobre tramites, documentación y ejecución de las actividades dando al Contratista una solución y respuesta oportunas.	
Revisar en los plazos establecidos la documentación que radique el Contratista.	FIRMA
Apoyo técnico en las actividades que ejecute el Contratista	NOMBRE: ANA ISABEL HENDE CARREÑO
	No. MAT: 25202-084564 CND

RELACIÓN EJECUTADO / PROGRAMADO SEMANAL CONSTRUCCIÓN

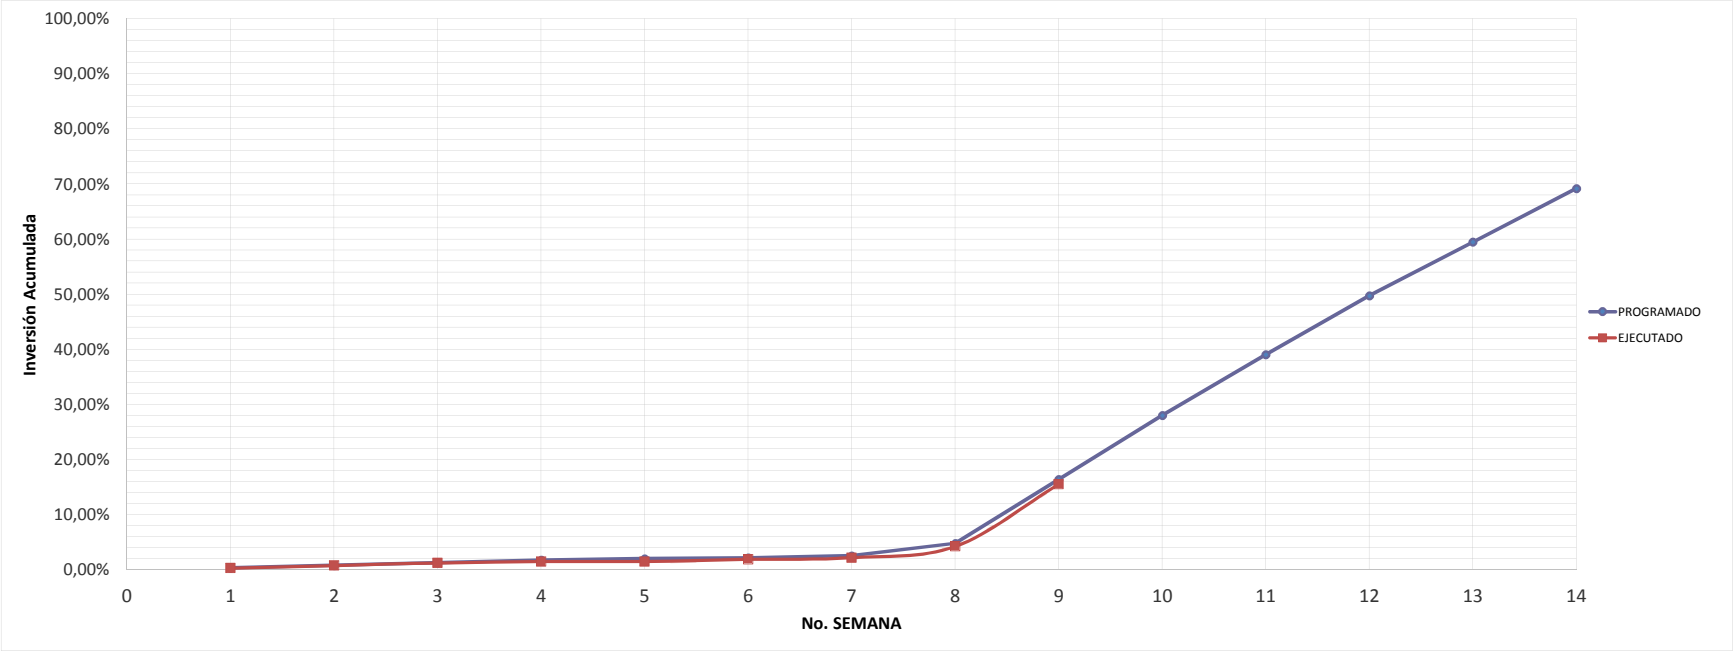

SEMANA	PERIODO				SEMANA No. 13		ACUMULADO		
					INVERSION	VALOR **BASICO**	INVERSION	VALOR **BASICO**	%
13	DE:			30/08/2021	EJECUTADO (E)	$ 11.114.923,23	EJECUTADO (E)	$ 22.944.535,02	4,26%
					PROGRAMADO (P)	$ 12.054.942,81	PROGRAMADO (P)	$ 25.868.637,14	4,81%
	A:			05/09/2021	E - P	-$ 940.019,58	E - P	-$ 2.924.102,12	
					RELACION E/P	92,20%	RELACION E/P	88,70%	**88,696%**

RELACIÓN EJECUTADO / PROGRAMADO SEMANAL CONSTRUCCIÓN

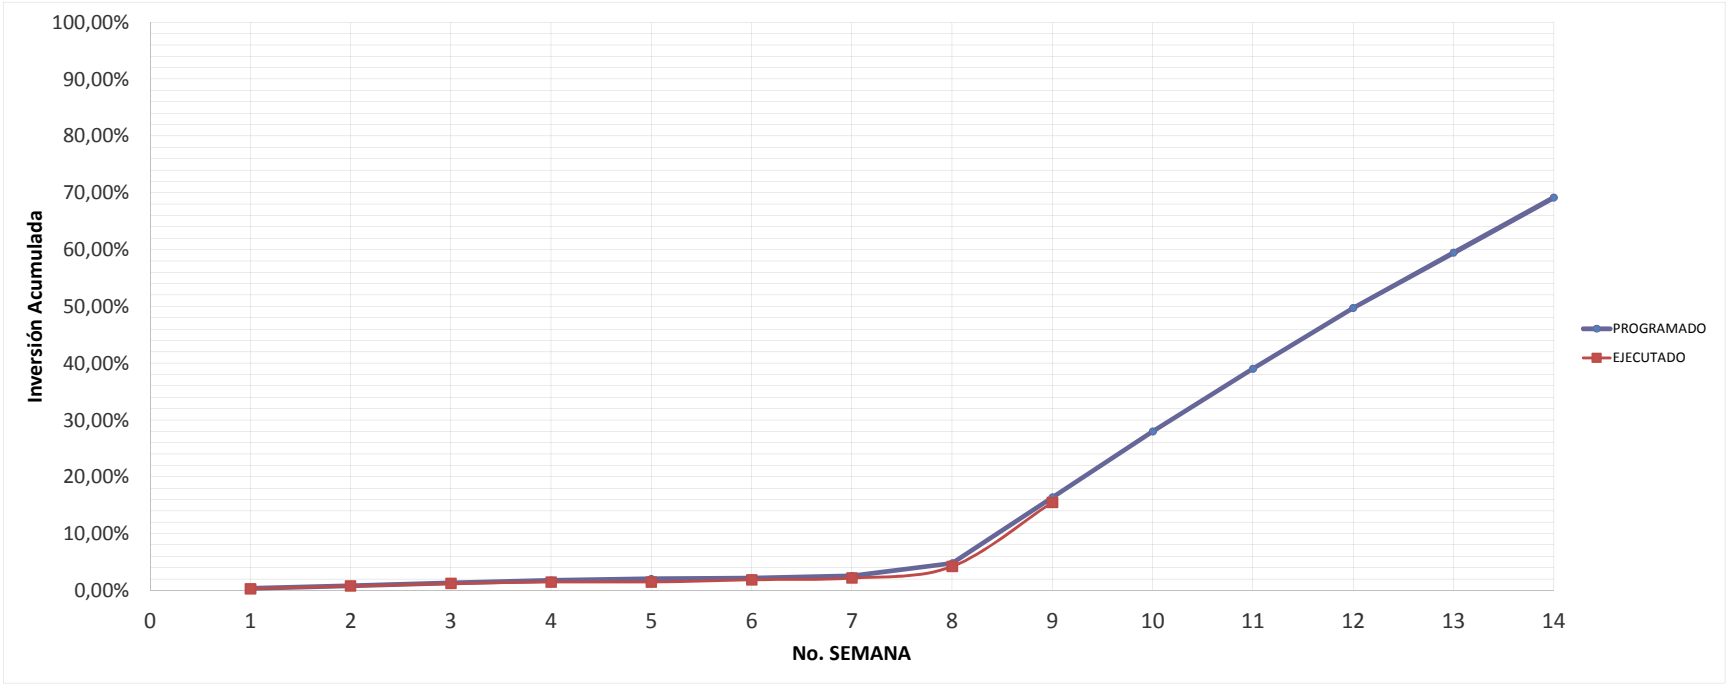

SEMANA	PERIODO				SEMANA No. 13		ACUMULADO		
					INVERSION	VALOR **BASICO**	INVERSION	VALOR **BASICO**	%
13	**DE:**			**30/08/2021**	EJECUTADO (E)	$ 11.114.923,23	EJECUTADO (E)	$ 22.944.535,02	4,26%
					PROGRAMADO (P)	$ 12.054.942,81	PROGRAMADO (P)	$ 25.868.637,14	4,81%
	A:			**05/09/2021**	E - P	**-$ 940.019,58**	E - P	**-$ 2.924.102,12**	
					RELACION E/P	92,20%	RELACION E/P	88,70%	**88,70%**

ATRASO DE OBRA

0,54%	EL CONTRATISTA PRESENTA ATRASO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRACTUAL	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
	CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX COULVERTH: (1) de 1m x 1m							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	25,60	$20.009,00	$512.230,40	0,00	$0,00	0,00%
2	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	1,80	$781.600,00	$1.406.880,00	0,00	$0,00	0,00%
3	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D)	M3	19,06	$1.144.858,00	$21.820.993,48	0,00	$0,00	0,00%
4	ACERO DE REFUERZO FY=4200MPa	KG	1.292,67	$8.317,00	$10.751.175,11	646,34	$5.375.587,56	1,00%
5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	8,00	$106.608,00	$852.864,00	0,00	$0,00	0,00%
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada: 357,32 metros							
6	DEMOLICIÓN DE CINTAS DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	86,40	$19.982,00	$1.726.444,80	48,00	$959.136,00	0,18%
7	**PAVIMENTOS**							
8	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	321,24	$20.009,00	$6.427.691,16	106,71	$2.135.160,39	0,40%
9	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M3	950,40	$13.832,00	$13.145.932,80	231,00	$3.195.192,00	0,59%
10	BASE (ARENA-CEMENTO)	KG	206,03	$784.267,90	$161.581.260,06	77,56	$60.827.818,32	11,30%
11	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR=3,80 MPA ,E=0,19 M	M3	123,12	$1.784.173,30	$219.667.416,70	0,00	$0,00	0,00%
12	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	KG	540,00	$35.912,50	$19.392.750,00	0,00	$0,00	0,00%
13	CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU	M3	19,44	$1.192.547,20	$23.183.117,57	0,00	$0,00	0,00%
14	BORDILLO DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITUUELO CEMENTO	KG	216,00	$74.253,40	$16.038.734,40	0,00	$0,00	0,00%
	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	432,00	$4.767,10	$2.059.387,20	0,00	$0,00	0,00%
	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UN	4,00	$660.618,40	$2.642.473,60	0,00	$0,00	0,00%
	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA PARA PASA JUNTAS Y ANCLAJES	KG	1.392,43	$9.168,00	$12.765.798,24	0,00	$0,00	0,00%
7	**OTRAS ACTIVIDADES**							
	REMOCIÓN DE ALCANTARILLA	M	5,07	$80.947,00	$410.401,29	1,50	$121.420,50	0,02%
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	63,60	$34.007,00	$2.162.845,20	10,80	$367.275,60	0,07%
	IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19							
15	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	GL	1	$1.577.229,00	$1.577.229,00	0,00	$371.112,71	0,07%
	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA							
16	CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR VIAL POSTULADO + iva	KM	5,70	$638.338,00	$3.638.527,00	0,00	$0,00	0,00%
17	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS BA	GL	1,00	$8.508.100,00	$8.508.100,00	1,00	$8.508.100,00	1,58%
	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENT	GL	1	$5.612.703,40	$5.612.703,40	0,00	$0,00	0,00%
	VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19%)	%	19,00%	$12.146.627,00	$2.307.859,00	14,50%	$1.761.260,816	0,33%
	VALOR TOTAL VALOR TOTAL (C+E+D)				**$538.192.814,40**		**$83.622.063,89**	**15,54%**

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE INVERSIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
CONSORCIO LA ESMERALDA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL ACTIVIDAD	SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						SEM 01 07/07/2021 - 11/07/2021	SEM 02 12/07/2021 - 18/07/2021	SEM 03 19/07/2021 - 25/07/2021	SEM 04 26/07/2021 - 01/08/2021	SEM 05 02/08/2021 - 08/08/2021	SEM 06 09/08/2021 - 15/08/2021	SEM 07 16/08/2021 - 22/08/2021	SEM 08 23/08/2021 - 29/08/2021	SEM 09 30/08/2021 - 05/09/2021	SEM 10 06/09/2021 - 12/09/2021	SEM 11 13/09/2021 -19/09/2021	SEM 12 20/09/2021 -26/09/2021
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX COULVERTH: (1) de 1m x 1m				**$ 35.344.142,99**													
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	25,60	$20.009,00	$512.230,40	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$256.115,20	$256.115,20		$ -	$ -	$ -	$ -
					Dias Laborados	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	1,80	$781.600,00	$1.406.880,00	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-		$ 468.960,00	$ 468.960,00	$ 468.960,00	$ -	$ -
					Dias Laborados												
					Ejecución Semanal	0	0	$0,00	0	0	0	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D)	M3	19,06	$1.144.858,00	$21.820.993,48	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ 4.364.199	$ 4.364.199	$ 4.364.199	$ 4.364.199	$ 4.364.199
					Dias Laborados	0										0	0
					Ejecución Semanal	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=4200MPa	KG	1.292,67	$8.317,00	$10.751.175,11	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-		$ 2.687.794	$ 2.687.794	$ 2.687.794	$ 2.687.794	$ -
					Dias Laborados	0											
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.375.587,56	$ -	$ -	$ -
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	8,00	$106.608,00	$852.864,00	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ 852.864
					Dias Laborados	0											
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada: 357,32 metros				**$ 1.726.444,80**													
DEMOLICIÓN DE CINTAS DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	86,40	$19.982,00	$1.726.444,80	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-		$ 575.481,60	$ 575.481,60	$ 575.481,60	$ -	$ -
					Dias Laborados	0											
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 959.136	$ -	$ -	$ -
PAVIMENTOS				**$ 476.904.561,7200**													
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	321,24	$20.009,00	$6.427.691,16	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-		$ 2.142.563,72	$ 2.142.563,72	$ 2.142.563,72	$ -	$ -
					Dias Laborados	0											
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 885.999	$ 828.973	$ 420.189	$ -	$ -	$ -
GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	950,40	$13.832,00	$13.145.932,80	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.460.659,20	$ 1.460.659,20	$ 1.460.659,20	$ 1.460.659,20
					Dias Laborados	0											
					Ejecución Semanal	$ -							$ 1.597.596	$ 1.597.596			
BASE (ARENA-CEMENTO)	M3	206,03	$784.267,90	$161.581.260,06	Inversión Semanal	$ -		$ -	$ -	$ -				$ 17.953.473,34	$ 17.953.473,34	$ 17.953.473,34	$ 17.953.473,34
					Dias Laborados	0											
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.595.576	$ 52.232.242	$ -	$ -	$ -
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR=3,80 MPA ,E=0,19 M	M3	123,12	1.784.173,30	$219.667.416,70	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 24.407.490,74	$ 24.407.490,74	$ 24.407.490,74	$ 24.407.490,74
					Dias Laborados	0											
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M	540,00	$35.912,50	$19.392.750,00	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.154.750,00	$ 2.154.750,00	$ 2.154.750,00	$ 2.154.750,00
					Dias Laborados												
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU	M3	19,44	$1.192.547,20	$23.183.117,57	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.575.902	$ 2.575.902	$ 2.575.902	$ 2.575.902
					Dias Laborados												
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BORDILLO DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITUUELO CEMENTO	M	216,00	$74.253,40	$16.038.734,40	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.782.082	$ 1.782.082	$ 1.782.082	$ 1.782.082
					Dias Laborados												
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	432,00	$4.767,10	$2.059.387,20	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
					Dias Laborados												
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UNIDAD	4,00	$660.618,40	$2.642.473,60	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
					Dias Laborados												
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA PARA PASA JUNTAS Y ANCLAJES	KG	1.392,43	$9.168,00	$12.765.798,24	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.418.422	$ 1.418.422	$ 1.418.422	$ 1.418.422
					Dias Laborados												
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS ACTIVIDADES				**$ 2.573.246,49**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
REMOCIÓN DE ALCANTARILLA	M	5,07	$80.947,00	$410.401,29	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 205.200,65	$ 205.200,65	$ -	$ -	$ -	$ -
					Dias Laborados												
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 121.421	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	63,60	$34.007,00	$2.162.845,20	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1.081.423	$ 1.081.423	$ -	$ -	$ -	$ -
					Dias Laborados												
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 367.275,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				**$1.577.229,00**													
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	Glb	1,00	$1.577.229,00	$1.577.229,00	Inversión Semanal	$ 66.270	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18
					Dias Laborados	0											
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 185.556	$ 92.778	$ 92.778	$ -	$ -	$ -
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA				**$12.146.627,00**													
CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR VIAL POSTULADO + Iva	KM	5,70	$638.338,00	$3.638.527,00	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Dias Laborados												
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS BASE	GLb	1,00	$8.508.100,00	$8.508.100,00	Inversión Semanal	$ 1.466.914	$ 2.053.679	$ 2.053.679	$ 2.053.679	$ 880.148	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Dias Laborados	5	7	7	7	0		0	0	0	0	0	0
					Ejecución Semanal	**$ 1.466.914**	**$ 2.053.679**	$ 2.053.679,310	$ 1.026.840	$ -	$ 1.906.988		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$7.920.562,40													
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIA	GL	1,00	$5.612.703,40	$5.612.703,40	Inversión Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$249.453,48	$436.543,60	$436.543,60	$436.543,60	$436.543,60	$436.543,60	$436.543,60	$436.543,60
					Dias Laborados												
					Ejecución Semanal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19%)	%	19,00%	$12.146.627,00	$2.307.859,00	Inversión Semanal	$ 303.666	$ 425.132	$ 425.132	$ 425.132	$ 182.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Dias Laborados	5	7	7	7	3							
					Ejecución Semanal	**$ 303.666**	**$ 425.132**	**$ 425.132**	**$ 425.132**	$ -	$ 182.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA + SIG CONTRATO PRINCIPAL				**$ 538.192.814,4000**													
					PROGRAMADO SEMANAL	$1.836.849,57705	$2.571.589,40787	$2.571.589,40787	$2.571.589,40787	$1.404.579,33151	$785.436,97425	$2.072.060,21925	$12.054.942,81275	$62.521.098,42997	$62.521.098,42997	$59.334.093,10997	$57.499.163,33247
					ACUMULADO PROGRAMADO	$1.836.849,57705	$4.408.438,98492	$6.980.028,39278	$9.551.617,80065	$10.956.197,13217	$11.741.634,10642	$13.813.694,32566	$25.868.637,13841	$88.389.735,56838	$150.910.833,99835	$210.244.927,10832	$267.744.090,44079
					% PROGRAMADO SEMANAL	0,34%	0,48%	0,48%	0,48%	0,26%	0,15%	0,39%	2,24%	11,62%	11,62%	11,02%	10,68%
					% PROGRAMADO ACUMULADO	0,34%	0,82%	1,30%	1,77%	2,04%	2,182%	2,567%	4,81%	16,423%	28,04%	39,06%	49,75%
					EJECUTADO SEMANAL	$1.770.579,45	$2.478.811,23	$2.478.811,23	$1.451.971,58	$0,00	$2.089.187,32577	$1.560.250,97	$11.114.923,23	$60.677.528,67			
					EJECUTADO ACUMULADO	$1.770.579,45	$4.249.390,68	$6.728.201,91	$8.180.173,49	$8.180.173,49	$10.269.360,82	$11.829.611,79	$22.944.535,02	$83.622.063,69			
					% EJECUTADO ACUMULADO	0,33%	0,79%	1,25%	1,52%	1,52%	1,91%	2,20%	4,26%	15,54%	0,00%	0,00%	0,00%

13	14	15	16	17	18
SEM 13 27/09/2021 -03/10/2021	**SEM 14 04/10/2021 -10/10/2022**	**SEM 15 11/10/2021 -17/10/2021**	**SEM 16 18/10/2021 -24/10/2021**	**SEM 17 25/10/2021 -31/10/2021**	**SEM 18 01/11/2021 -02/11/2021**
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
0		0			0
$ -		$ -			$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$0,00		$0,00			$0,00
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
0		0			0
$ -		$ -			$ -
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
0		0			0
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1.460.659,20	$ 1.460.659,20	$ 1.460.659,20	$ 1.460.659,20	$ 1.460.659,20	$ -
0,00		0,00			0,00
0,00		0,00			0,00
$ 17.953.473,34	$ 17.953.473,34	$ 17.953.473,34	$ 17.953.473,34	$ 17.953.473,34	$ -
0		0			0
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 24.407.490,74	$ 24.407.490,74	$ 24.407.490,74	$ 24.407.490,74	$ 24.407.490,74	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 2.154.750,00	$ 2.154.750,00	$ 2.154.750,00	$ 2.154.750,00	$ 2.154.750,00	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 2.575.902	$ 2.575.902	$ 2.575.902	$ 2.575.902	$ 2.575.902	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1.782.082	$ 1.782.082	$ 1.782.082	$ 1.782.082	$ 1.782.082	
				$ 2.059.387	
				$ 2.642.474	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1.418.422	$ 1.418.422	$ 1.418.422	$ 1.418.422	$ 1.418.422	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 92.778,18	$ 26.508
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.829.965,44	$ 808.561,56
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
0,00		0,00			0,00
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
$436.543,60	$436.543,60	$436.543,60	$436.543,60	$436.543,60	$124.726,74
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 425.132	$ 121.466
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
$52.282.100,63647	$52.282.100,63647	$52.282.100,63647	$52.282.100,63647	$60.239.058,80197	$1.081.262,61136
$320.026.191,07727	$372.308.291,71374	$424.590.392,35021	$476.872.492,98668	$537.111.551,78864	$538.192.814,40000
9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	11,19%	0,20%
59,46%	69,18%	78,89%	88,61%	99,80%	100,00%
0,00%		0,00%			0,00%
