

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020	
ELABORÓ:	ARQ. JHOAN RUIZ		**REVISÓ:**	ARQ. GERMÁN GARZÓN			
OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.						

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	4. MAMPOSTERÍA Y CIELO RASO	ITEM	4.1	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE No. 4 E=12 MM EL VALOR INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES, ANCLAJES DE REFUERZOS NECESARIOS, APLICACIÓN DE ESTUCO, PAÑETE Y PINTURAVINILO TIPO 1 A TRES MANOS COMO ACABADO FINAL	UNID.	UN

UBICACIÓN

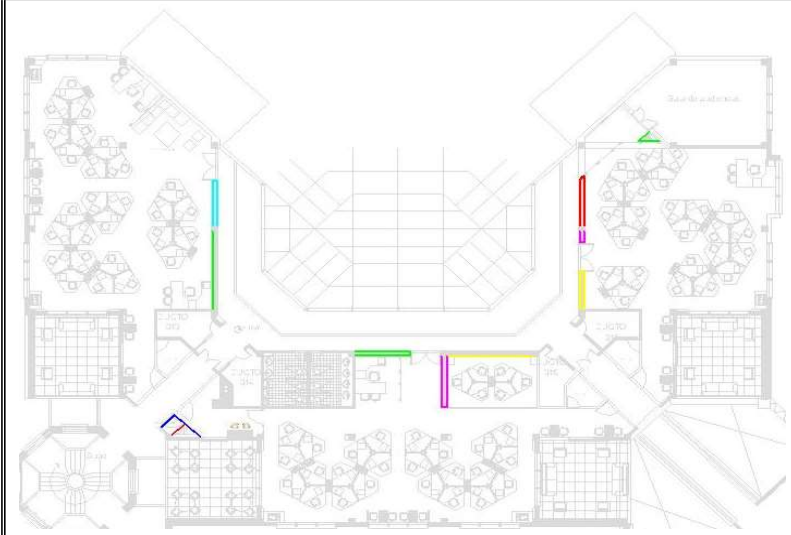



	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B - Sala de Juntas	8.32	0.35	2.91	1.00	2.91
2	Torre B	5.10	0.35	1.79	2.00	3.57
3	Torre B	6.75	0.35	2.36	1.00	2.36
4	Torre B - Lava traperos	3.10	2.90	8.99	1.00	8.99
4	Torre B - Lava traperos	0.80	2.20	1.76	-1.00	-1.76
6	Torre B - Lava traperos	0.91	0.40	0.36	1.00	0.36
7	Torre C - Sur	6.15	0.35	2.15	1.00	2.15
8	Torre C - Sur	5.10	0.35	1.79	1.00	1.79
9	Torre C - Central	5.10	0.35	1.79	1.00	1.79
10	Torre C - Central - Sala de Juntas	6.96	0.35	2.44	1.00	2.44
11	Torre C - Central	6.76	0.35	2.37	1.00	2.37
12	Torre C - Central - Lava traperos	3.30	2.90	9.57	1.00	9.57
12	Torre C - Central - Lava traperos	0.80	2.20	1.76	-1.00	-1.76
14	Torre C - Central - Lava traperos	0.98	0.40	0.39	1.00	0.39
15	Torre C - Norte	1.72	0.35	0.60	1.00	0.60
16	Torre C - Norte	5.19	0.35	1.82	1.00	1.82
17	Torre C - Norte	6.67	0.35	2.33	1.00	2.33
18	Torre C - Norte	2.09	0.35	0.73	1.00	0.73
	Subtotal					40.65
	0%					0.00
	TOTAL					**40.65**

REGISTRO FOTOGRAFICO


OBSERVACIONES:

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020	
ELABORÓ:	ARQ. JHOAN RUIZ		**REVISÓ:**	ARQ. GERMÁN GARZÓN			
OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.						

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	4. MAMPOSTERÍA Y CIELO RASO	ITEM	4.2	MAMPOSTERIA EN DRY WALL ESPESOR 12 CMS A DOS CARAS, EL VALOR INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES, ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22,AISLAMIENTO TIPO FRESCASA DE 2" DE ESPESOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, ESTABILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASI MISMO INCLUYE APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO, RESANES Y	UNID.	UN

UBICACIÓN

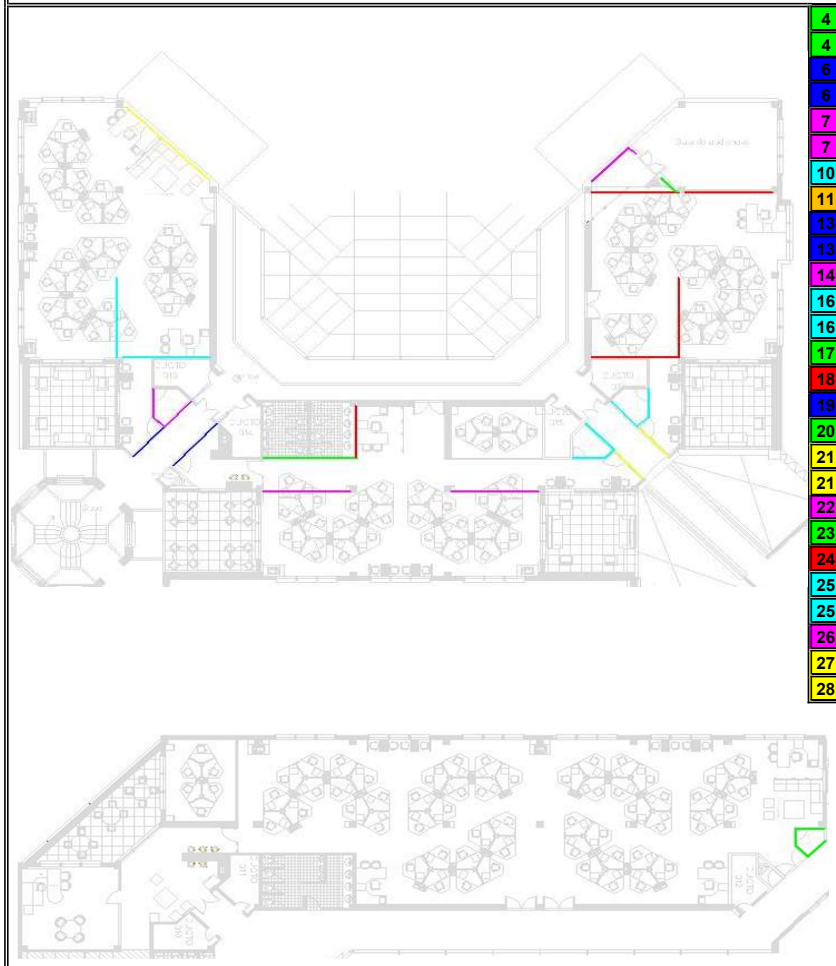

	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
4	Torre B - Archivo	5.33	2.90	15.46	1.00	15.46
4	Torre B - Archivo	0.80	2.20	1.76	-1.00	-1.76
6	Torre C - Sur	2.52	2.90	7.31	1.00	7.31
6	Torre C - Sur	1.00	2.20	2.20	-1.00	-2.20
7	Torre C - Sur - Archivo	5.02	2.90	14.56	1.00	14.56
7	Torre C - Sur - Archivo	0.80	2.20	1.76	-1.00	-1.76
10	Torre C - Sur - Cubierta	5.10	2.90	14.79	0.60	8.87
11	Torre C - Sur - Cubierta	6.83	1.20	8.20	0.15	1.23
13	Torre C - Central	3.66	2.90	10.61	1.00	10.61
13	Torre C - Central	1.00	2.90	2.90	-1.00	-2.90
14	Torre C - Central - Cubierta	5.10	2.90	14.79	0.60	8.87
16	Torre C - Central - Archivo	4.95	2.90	14.36	1.00	14.36
16	Torre C - Central - Archivo	0.80	2.20	1.76	-1.00	-1.76
17	Torre C - Central - Baños	5.50	2.90	15.95	1.00	15.95
18	Torre C - Central - Baños	3.25	1.45	4.71	0.50	2.36
19	Torre C - Central - Cubierta	4.20	2.50	10.50	0.30	3.15
20	Torre C - Central - Cubierta - Acceso	0.90	0.65	0.59	2.00	1.17
21	Torre C - Central	2.44	2.90	7.08	1.00	7.08
21	Torre C - Central	1.00	2.20	2.20	-1.00	-2.20
22	Torre C - Norte	3.63	3.00	10.89	0.60	6.53
23	Torre C - Norte	1.35	3.00	4.05	0.60	2.43
24	Torre C - Norte - Cubierta	5.10	2.90	14.79	1.20	17.75
25	Torre C - Norte - Archivo	5.02	2.90	14.56	1.00	14.56
25	Torre C - Norte - Archivo	0.80	2.20	1.76	-1.00	-1.76
26	Torre C - Norte - Ducto	1.20	2.90	3.48	0.60	2.09
27	Torre C - Norte	2.52	2.90	7.31	1.00	7.31
28	Torre C - Norte	1.00	2.20	2.20	-1.00	-2.20
	Subtotal					145.10
	0%					0.00
	TOTAL					**145.10**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que el ítem se constituye por un muro a dos caras, los muros que solo tienen una cara, se cuentan como 0,6 muros.

FECHA:	**DD**	**9**	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	**9**	**MM**	12	**AA**	2020	


ELABORÓ:	**ARQ. JHOAN RUIZ**	**REVISÓ:**	**ARQ. GERMÁN GARZÓN**


OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.**

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	**4. MAMPOSTERÍA Y CIELO RASO**	**ITEM**	4.3	CIELO RASO EN DRY WALL. EL VALOR INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES, DESCOLGADOS E INDIRECTOS EN DRY WALL, APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS COMO ACABADO FINAL.	**UNID.**	**UN**

UBICACIÓN

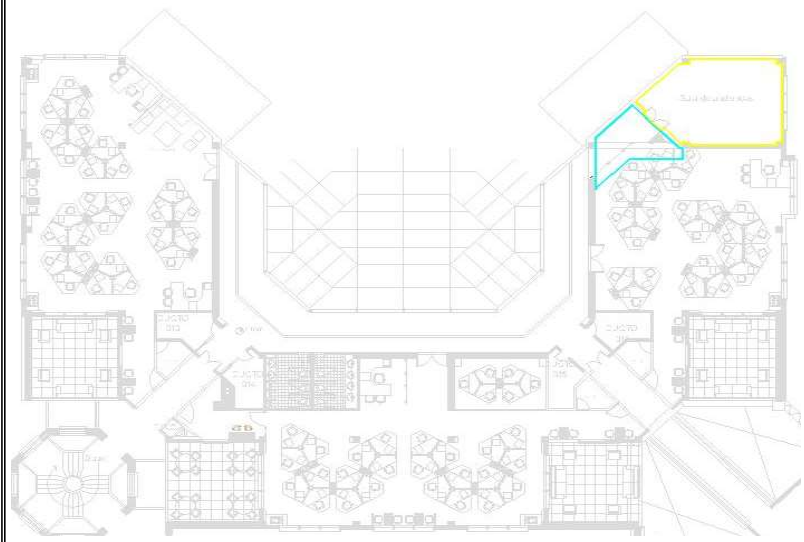



	ACTIVIDAD	**Dimensiones**			**Cantidad**	**Subtotal**
		Longitud	**Altura**	**Area**		
1	Torre C - Norte - Acceso			17.04	1	17.04
2	Torre C - Norte - Sala de Audiencias			40.22	1	40.22
3	Torre B - Acceso			1.26	1	1.26
4						
5						
6						
7						
8						
9						
	Subtotal					58.52
	0%					0.00
	TOTAL					**58.52**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

Superintendencia Financiera de Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FECHA:	**DD**	**9**	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	**9**	**MM**	12	**AA**	2020	


ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ **REVISÓ:** ARQ. GERMÁN GARZÓN


OBJETO DEL CONTRATO Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	5. ELÉCTRICO VOZ Y DATOS	ITEM	5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS CORRIENTE NORMAL Y REGULADA INCLUYE 2 TOMAS REGULADAS, UNA NORMAL Y DOS PUNTOS DOBLES DE VOZ Y DATOS (COMBO) EN MUROS O PISO SEGÚN NECESIDAD. PARA LOS PUNTOS EN PISO SE INCLUYE EN EL VALOR LA RESPECTIVA REGATA	UNID.	UN

UBICACIÓN

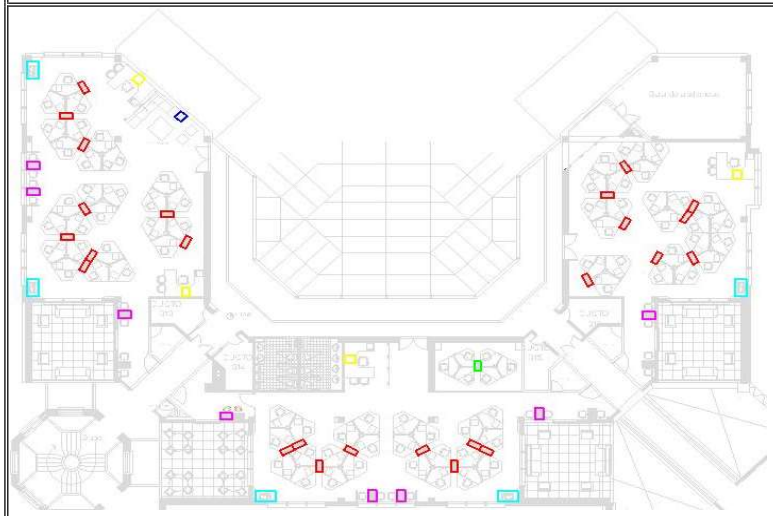



	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B - Sala de Juntas			1.00	4.00	4.00
2	Torre B - Puestos de Trabajo			18.00	3.00	54.00
3	Torre B - Puesto Asesores			3.00	1.00	3.00
4	Torre B - Puesto practicantes			4.00	1.00	4.00
5	Torre B - Impresoras			3.00	1.00	3.00
6	Torre B - Sala de espera			2.00	1.00	2.00
7	Torre C - Sur - Sala de espera			1.00	1.00	1.00
8	Torre C - Sur - Puestos de trabajo			9.00	3.00	27.00
9	Torre C - Sur - Puesto asesores			2.00	1.00	2.00
10	Torre C - Sur - Puesto practicantes			3.00	1.00	3.00
11	Torre C - Sur - Impresoras			2.00	1.00	2.00
12	Torre C - Central - Impresoras			2.00	1.00	2.00
13	Torre C - Central - Sala de Juntas			1.00	4.00	4.00
14	Torre C - Central - Puestos de trabajo			8.00	3.00	24.00
15	Torre C - Central - Puesto Asesor			1.00	1.00	1.00
16	Torre C - Central - Puesto practicantes			4.00	1.00	4.00
17	Torre C - Norte - Impresoras			1.00	1.00	1.00
18	Torre C - Norte - Puesto asesor			1.00	1.00	1.00
19	Torre C - Norte - Puesto practicantes			1.00	1.00	1.00
20	Torre C - Norte - Puestos de trabajo			7.00	3.00	21.00
	Subtotal					164.00
	0%					0.00
	TOTAL					**164.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

FECHA:	DD	9	MM	6	AA	2020	AL
	DD	9	MM	12	AA	2020	


ELABORÓ:	ARQ. JHOAN RUIZ	REVISÓ:	ARQ. GERMÁN GARZÓN


OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	5. ELÉCTRICO VOZ Y DATOS	ITEM	5.2	PUNTO ELECTRICO PARA ILUMINACION EL CUAL DEBE QUEDAR ASOSCIADO CON SENSORES DE MOVIMIENTO Y TEMPERATURA, CONECTORIZADO AL ACTUAL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE ALUMBRADO (KNX). INCLUYE DUCTERIA EN TUBERIA MT, REGATAS, RESANES, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UNID.	UN

UBICACIÓN

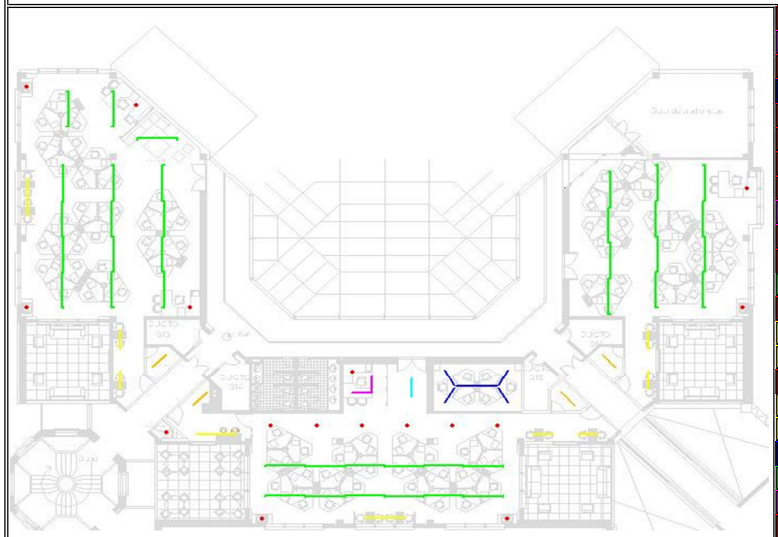



	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B - Puestos de trabajo			18.00	3	54.00
2	Torre B - Puestos de asesor			3.00	3	9.00
3	Torre B - Puestos practicantes			4.00	1	4.00
4	Torre B - Sala de Juntas			1.00	6	6.00
5	Torre B - Archivo			1.00	1	1.00
6	Torre B - Cocina			1.00	2	2.00
7	Torre B - Cocina -Circulación			1.00	5	5.00
8	Torre B - Lava traperos			1.00	1	1.00
9	Torre B - Sala de espera			2.00	5	10.00
11	Torre B - Impresoras			2.00	1	2.00
12	Torre B - Circulaciones			24.00	1	24.00
13	Torre C - Sur - Puestos de trabajo			15.00	1	15.00
14	Torre C - Sur - Puestos de asesor			2.00	1	2.00
15	Torre C - Sur - Puestos practicantes			4.00	1	4.00
16	Torre C - Sur - Archivo			1.00	1	1.00
17	Torre C - Sur - Impresoras			2.00	1	2.00
18	Torre C - Central - Archivo			1.00	1	1.00
19	Torre C - Central - Cocina			1.00	1	1.00
20	Torre C - Central - Sala de Juntas			1.00	6	6.00
21	Torre C - Central - Puestos de trabajo			12.00	1	12.00
22	Torre C - Central - Puestos de asesor			1.00	3	3.00
23	Torre C - Central - Impressoras			2.00	1	2.00
24	Torre C - Central - Puestos practicantes			6.00	1	6.00
25	Torre C - Central - Lava traperos			1.00	1	1.00
26	Torre C - Central - Circulación			1.00	6	6.00
27	Torre C - Central - Acceso			1.00	1	1.00
28	Torre C - Norte - Puestos de trabajo			12.00	1	12.00
29	Torre C - Norte - Puestos de asesor			1.00	1	1.00
30	Torre C - Norte - Puestos practicantes			2.00	1	2.00
31	Torre C - Norte - Archivo			1.00	1	1.00
32	Torre C - Norte - Impresora			1.00	1	1.00
	Subtotal					198.00
	0%					0.00
	TOTAL					**198.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

FECHA:	**DD**	**9**	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**	
	DD	**9**	**MM**	12	**AA**	2020		


ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ **REVISÓ:** ARQ. GERMÁN GARZÓN


OBJETO DEL CONTRATO Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	6. ILUMINACIÓN	ITEM	6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA UNIVERSAL LED CON SUPLEMENTO EN VIDRIO – L2 DE 24 WATTS. Tipo ULTRA RT6 LED	UNID.	UN

UBICACIÓN

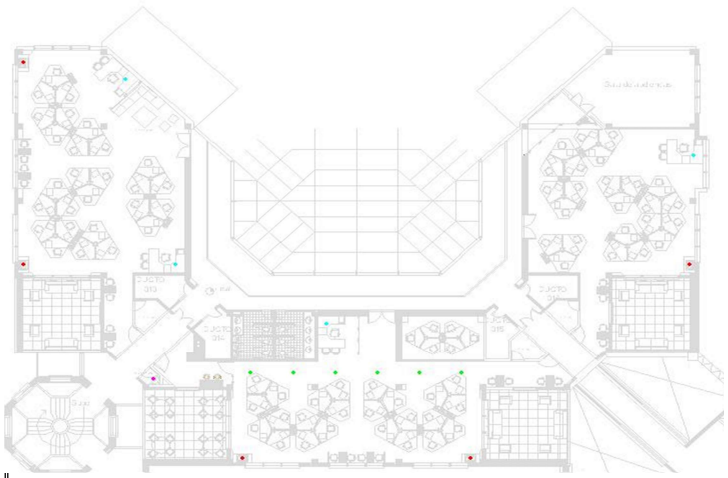



	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B - Circulaciones			24.00	1.00	24.00
2	Torre B - Impresoras			2.00	1.00	2.00
3	Torre B - Sala de espera			2.00	1.00	2.00
4	Torre B - Cocina			2.00	1.00	2.00
5	Torre B - Puesto asesores			3.00	1.00	3.00
6	Torre B - Lava traperos			1.00	1.00	1.00
7	Torre C - Sur - Impreosras			2.00	1.00	2.00
8	Torre C - Sur - Puestos asesores			2.00	1.00	2.00
9	Torre C - Central - Lavatraperos			1.00	1.00	1.00
10	Torre C - Central - Impresoras			2.00	1.00	2.00
11	Torre C - Central - puesto asesor			1.00	1.00	1.00
12	Torre C - Central - Criculacion			6.00	1.00	6.00
13	Torre C - Norte - Impresora			1.00	1.00	1.00
14	Torre C - Norte - Puesto asesor			1.00	1.00	1.00
	Subtotal					50.00
	0%					0.00
	TOTAL					**50.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

FECHA:	DD	9	MM	6	AA	2020	AL
	DD	9	MM	12	AA	2020	


ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ | REVISÓ: ARQ. GERMÁN GARZÓN


OBJETO DEL CONTRATO: Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	6. ILUMINACIÓN	ITEM	6.2	LUMINARIA LED DE 1.50 METROS CHASIS DE ALUMINIO, CON DIFUSOR TRANSPARENTE OPALIZADO, APERTURA DE 130 GRADOS DE ALTA EFICIENCIA, 45 WATTS	UNID.	UN

UBICACIÓN

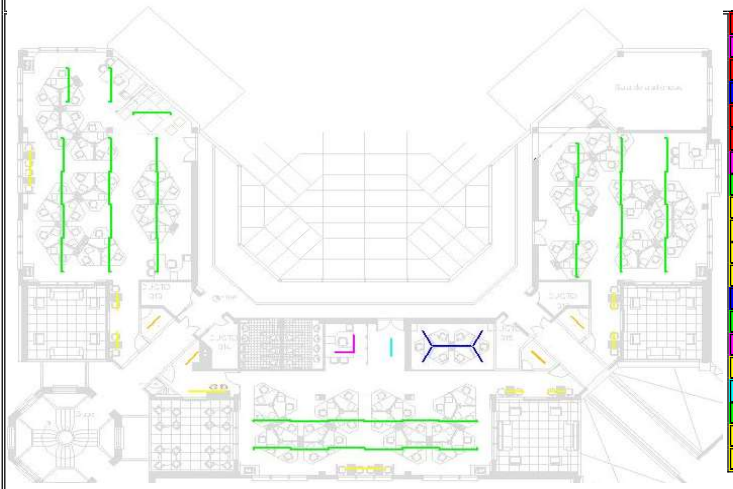



	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B - Puestos de trabajo			18.00	3	54.00
2	Torre B - Puestos de asesor			3.00	2	6.00
3	Torre B - Puestos practicantes			4.00	1	4.00
4	Torre B - Sala de Juntas			1.00	6	6.00
5	Torre B - Archivo			1.00	1	1.00
7	Torre B - Cocina -Circulación			1.00	5	5.00
9	Torre B - Sala de espera			2.00	4	8.00
13	Torre C - Sur - Puestos de trabajo			15.00	2	30.00
15	Torre C - Sur - Puestos practicantes			4.00	1	4.00
16	Torre C - Sur - Archivo			1.00	1	1.00
18	Torre C - Central - Archivo			1.00	1	1.00
19	Torre C - Central - Cocina			1.00	1	1.00
20	Torre C - Central - Sala de Juntas			1.00	6	6.00
21	Torre C - Central - Puestos de trabajo			12.00	2	24.00
22	Torre C - Central - Puestos de asesor			1.00	2	2.00
24	Torre C - Central - Puestos practicantes			6.00	1	6.00
27	Torre C - Central - Acceso			1.00	1	1.00
28	Torre C - Norte - Puestos de trabajo			12.00	2	24.00
30	Torre C - Norte - Puestos practicantes			2.00	1	2.00
31	Torre C - Norte - Archivo			1.00	1	1.00
	Subtotal					187.00
	0%					0.00
	TOTAL					**187.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

Superintendencia Financiera de Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**	
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020		


ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ **REVISÓ:** ARQ. GERMÁN GARZÓN

OBJETO DEL CONTRATO Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	7. PINTURA	ITEM	7.1	PINTURA PARA MUROS INTERIORES EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS, EN EL COSTO SE DEBE INCLUIR VALORES LINEALES DE LA EJECUCIÓN, ESÍ COMO LOS FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO QUE SE REQUIERAN	UNID.	M2

UBICACIÓN

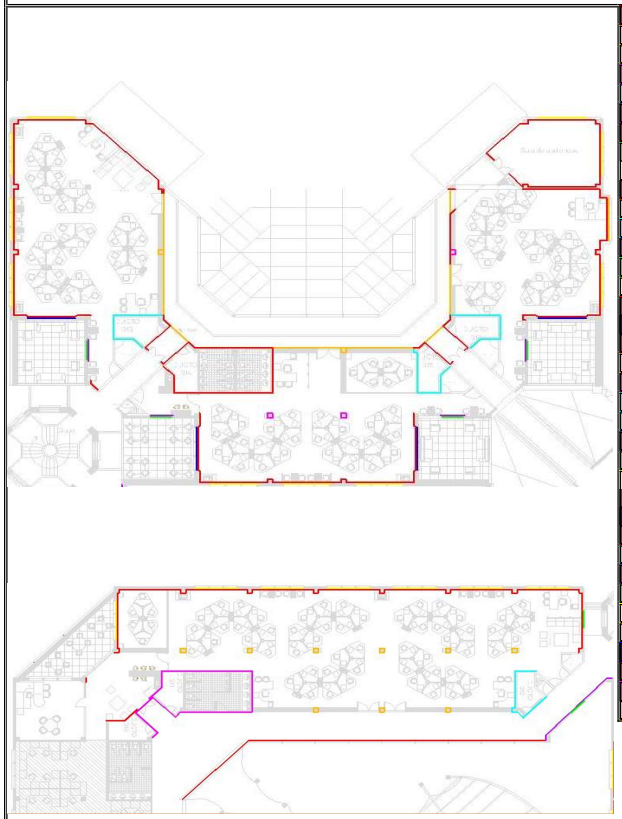

	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B	57.95	2.90	168.06	1.00	168.06
2	Torre B - Columnas	1.60	2.70	4.32	2.00	8.64
2	Torre B - Columnas	1.60	2.90	4.64	7.00	32.48
3	Torre B - Baño	28.69	2.90	79.24	1.00	79.24
4	Torre B - Ducto	9.65	2.90	26.45	1.00	26.45
5	Torre B - Acceso	8.20	2.90	23.78	1.00	23.78
6	Torre B - Ventana - Ante pecho	32.29	0.50	16.15	2.00	32.29
7	Torre B - Ventana - Puesto Asesor	1.55	1.20	1.86	-2.00	-3.72
8	Torre B - Ventanas	3.60	1.20	4.32	-7.00	-30.24
9	Torre C - Sur	39.42	2.90	114.32	1.00	114.32
10	Torre C - Sur - Columna	1.60	2.20	3.52	1.00	3.52
11	Torre C - Sur - Ducto	8.34	2.90	24.19	1.00	24.19
12	Torre C - Sur - Ventana Terraza	1.85	2.90	5.37	1.00	5.37
13	Torre C - Sur - Ventana Terraza	1.55	1.20	1.86	-1.00	-1.86
14	Torre C - Sur - Ventanas	3.60	1.20	4.32	-4.00	-17.28
15	Torre C - Surl - Ducto 2	4.00	2.40	8.06	1.00	8.06
16	Torre C - Sur - Puerta	3.60	2.05	7.38	-1.00	-7.38
17	Torre C - Central	43.77	2.90	126.93	1.00	126.93
18	Torre C - Central - Columna	1.60	2.20	3.52	1.00	3.52
19	Torre C - Central - Columnas	1.60	2.90	4.64	2.00	9.28
20	Torre C - Central - Ducto	8.37	1.20	10.04	1.00	10.04
20	Torre C - Central - Ducto	3.00	0.50	1.50	-1.00	-1.50
21	Torre C - Central - Ventanas Terraza	1.85	2.90	5.37	2.00	10.73
22	Torre C - Central - Ventanas Terraza	1.55	1.20	1.86	-2.00	-3.72
23	Torre C - Central - Ventanas Terraza	3.60	1.20	4.32	-3.00	-12.96
24	Torre C - Central - Ducto 2	13.51	2.40	33.30	1.00	33.30
25	Torre C - Central - Puertas	3.60	2.05	7.38	-2.00	-14.76
26	Torre C - Norte	46.98	2.90	136.24	1.00	136.24
27	Torre C - Norte - Ducto	8.34	2.90	24.19	1.00	24.19
28	Torre C - Norte - Ventana Terraza	1.85	2.90	5.37	1.00	5.37
29	Torre C - Norte - Ventana Terraza	1.55	1.20	1.86	-1.00	-1.86
30	Torre C - Norte - Ventana	3.60	1.20	4.32	-3.00	-12.96
31	Torre C - Norte - Puerta ventana	3.60	2.80	10.08	-1.00	-10.08
32	Torre C - Norte - Puerta	3.60	2.05	7.38	-1.00	-7.38
33	Torre C - Norte - Ducto 2	4.56	2.40	9.40	1.00	9.40
35	Torre C - Norte - Columna	1.60	2.20	3.52	1.00	3.52
34	Torre C - Dintel	45.54	0.44	18.50	2.00	37.00
	Subtotal					810.20
	0%					0.00
	TOTAL					**810.20**

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO







Superintendencia Financiera de Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**	
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020		


ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ **REVISÓ:** ARQ. GERMÁN GARZÓN

OBJETO DEL CONTRATO Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	7. PINTURA	ITEM	7.2	PINTURA PARA CIELO RASO EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES A 2 MANOS, EN EL COSTO SE DEBE INCLUIR VALORES LINEALES DE LA EJECUCIÓN, ESÍ COMO FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO QUE SE REQUIERAN	UNID.	M2

UBICACIÓN

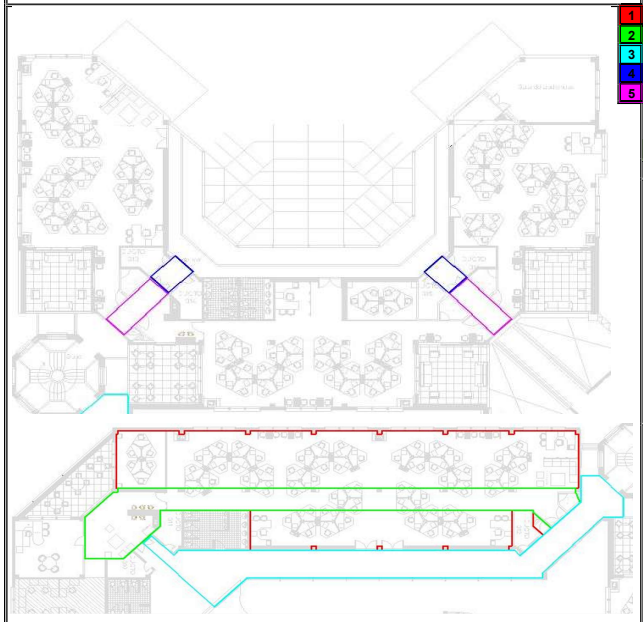

	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B			400.09	1	400.09
2	Central			108.82	-1	-108.82
3	Circulación externa			115.42	2	230.84
4	Torre C - Circulación			5.01	2	10.02
5	Torre C - Circulación			9.40	2	18.80
	Subtotal					550.93
	0%					0.00
	TOTAL					**550.93**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**	
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020		
ELABORÓ:	ARQ. JHOAN RUIZ		**REVISÓ:**	ARQ. GERMÁN GARZÓN				
OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.**							

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	7. PINTURA	ITEM	7.2	PINTURA PARA CIELO RASO EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES A 2 MANOS, EN EL COSTO SE DEBE INCLUIR VALORES LINEALES DE LA EJECUCIÓN, ESÍ COMO FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO QUE SE REQUIERAN	UNID.	M2

UBICACIÓN



	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B - Circulación General			115.42	2	230.84
2	Torre B - Sur			66.49	1	66.49
3	Torre B - Sur			22.19	1	22.19
4	Torre B - Sur			7.34	1	7.34
5	Torre B - Sur			54.45	1	54.45
6	Torre B - Sur			46.07	1	46.07
7	Torre B - Sur			11.87	1	11.87
8	Torre B - Sur			7.38	1	7.38
9	Torre B - Sur			65.28	1	65.28
10	Torre B - Oriental			15.04	1	15.04
11	Torre B - Oriental			34.58	1	34.58
12	Torre B - Oriental			12.67	1	12.67
13	Torre B - Oriental			15.65	1	15.65
14	Torre B - Oriental			13.33	1	13.33
15	Torre B - Oriental			8.47	1	8.47
16	Torre B - Oriental			11.15	1	11.15
17	Torre B - Oriental			17.33	1	17.33
18	Torre B - Oriental			17.93	1	17.93
19	Torre B - Oriental			25.13	1	25.13
20	Torre B - Oriental			28.08	1	28.08
21	Torre B - Oriental			5.41	1	5.41
22	Torre B - Oriental			17.25	1	17.25
	Subtotal					733.93
	0%					0.00
	TOTAL					**733.93**

OBSERVACIONES: El primer piso de la torre B, se debe pintar todo, tanto interior como exterior; ya que se debe desocupar la casa azul (esquina de la entidad), por lo tanto, las que actualmente están en la casa azul, pasaran a ocupar el primer piso de la torre B y las personas que se encuentran trabajando en el 1b, pasaran a usar el tercer piso.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Superintendencia Financiera de Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020	

ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ **REVISÓ:** ARQ. GERMÁN GARZÓN

OBJETO DEL CONTRATO Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	7. PINTURA	ITEM	7.1	PINTURA PARA MUROS INTERIORES EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS, EN EL COSTO SE DEBE INCLUIR VALORES LINEALES DE LA EJECUCIÓN, ESÍ COMO LOS FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO QUE SE REQUIERAN	UNID.	M2

UBICACIÓN



	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B - Sur	41.71	2.30	95.93	1	95.93
2	Torre B - Sur	22.90	2.30	52.67	1	52.67
3	Torre B - Sur	17.26	2.15	37.11	1	37.11
4	Torre B - Sur	13.43	2.15	28.87	1	28.87
5	Torre B - Sur	11.83	2.30	27.21	1	27.21
6	Torre B - Sur	6.11	2.15	13.14	1	13.14
7	Torre B - Sur	39.94	2.30	91.86	1	91.86
8	Torre B - Sur	32.87	2.30	75.60	1	75.60
9	Torre B - Sur	3.97	2.15	8.54	1	8.54
10	Torre B - Sur	15.55	2.30	35.77	1	35.77
11	Torre B - Sur	11.66	2.30	26.82	1	26.82
12	Torre B - Sur	35.02	2.30	80.55	1	80.55
13	Torre B - Oriental	9.30	2.15	20.00	1	20.00
14	Torre B - Oriental	43.31	2.30	99.61	1	99.61
15	Torre B - Oriental	37.90	2.15	81.49	1	81.49
16	Torre B - Oriental	27.23	2.15	58.54	1	58.54
17	Torre B - Oriental	9.67	2.30	22.24	1	22.24
18	Torre B - Oriental	13.80	2.30	31.74	1	31.74
19	Torre B - Oriental	10.37	2.15	22.30	1	22.30
20	Torre B - Oriental	15.89	2.30	36.55	1	36.55
21	Torre B - Oriental	17.22	2.30	39.61	1	39.61
22	Torre B - Oriental	53.43	2.30	122.89	1	122.89
23	Torre B - Oriental	18.08	2.30	41.58	1	41.58
24	Torre B - Oriental	11.90	2.30	27.37	1	27.37
25	Torre B - Oriental	36.94	2.30	84.96	1	84.96
26	Torre B - Oriental	10.04	2.30	23.09	1	23.09
27	Torre B - Oriental	17.00	2.30	39.10	1	39.10
28	Torre B - Circulación general	75.64	2.90	219.36	1	219.36
29	Torre B - Circulación general	7.79	2.90	22.59	1	22.59
30	Torre B - Circulación general	2.92	2.90	8.47	2	16.94
31	Torre B - Circulación general	4.73	2.90	13.72	3	41.15
32	Torre B - Circulación general	56.87	0.50	28.44	1	28.44
33	Ventanas Fachadas	3.60	1.20	4.32	-11	-47.52
34	Puertas - Sur	0.90	2.20	1.98	-29	-57.42
35	Puertas - Oriental	0.90	2.20	1.98	-29	-57.42
36	Ventanas Fachadas e Internas	1.55	1.20	1.86	-6	-11.16
37	Ventana interna - Sur	1.85	1.40	2.59	-2	-5.18
38	Ventana interna - Sur	3.25	1.40	4.55	-2	-9.10
39	Ventana interna - Sur	1.70	1.40	2.38	-2	-4.76
40	Ventana interna - Sur	1.87	1.40	2.62	-2	-5.24
41	Ventana interna - Sur	1.17	1.40	1.64	-2	-3.28
42	Ventana interna - Oriental	5.10	1.40	7.14	-2	-14.28
43	Ventana interna - Oriental	1.75	1.40	2.45	-2	-4.90
44	Ventana interna - Oriental	0.70	1.40	0.98	-2	-1.96
45	Ventana interna - Oriental	3.45	1.40	4.83	-2	-9.66
46	Ventana interna - Oriental	0.65	1.40	0.91	-2	-1.82
47	Ventana interna - Oriental	1.60	1.40	2.24	-2	-4.48
48	Ventana interna - Oriental	2.35	1.40	3.29	-2	-6.58
	Subtotal					1,408.84
	0%					0.00
	TOTAL					**1,408.84**

REGISTRO FOTOGRAFICO


OBSERVACIONES: El primer piso de la torre B, se debe pintar todo, tanto interior como exterior; ya que se debe desocupar la casa azul (esquina de la entidad), por lo tanto, las que actualmente están en la casa azul, pasaran a ocupar el primer piso de la torre B y las personas que se encuentran trabajando en el 1b, pasaran a usar el tercer piso.

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020	
ELABORÓ:	ARQ. JHOAN RUIZ		**REVISÓ:**	ARQ. GERMÁN GARZÓN			
OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.						

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	8. PISOS	ITEM	8.1	ALISTADO DE PISOS DE HASTA 8 CMS DE ALTURA IMPERMEABILIZADO. INCLUYE AFINADO ESMALTADO PARA ACABADO DE PISO VINILICO.	UNID.	UN

UBICACIÓN

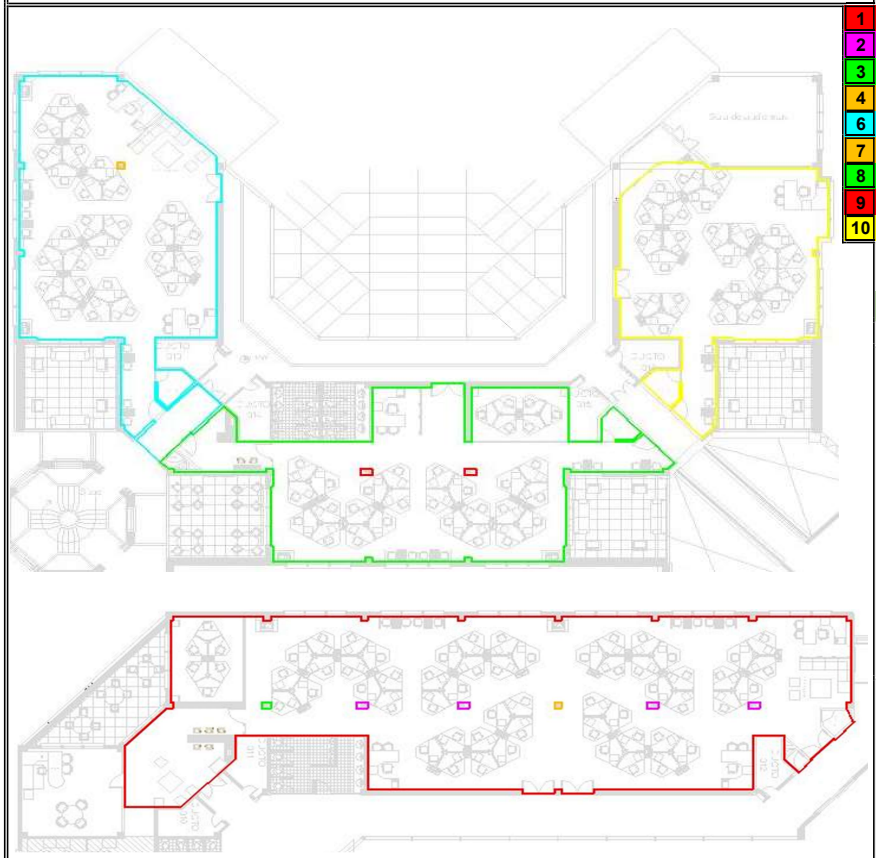


	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B			392.72	1	392.72
2	Torre B - Columnas			0.26	-4	-1.04
3	Torre B - Columna			0.20	-1	-0.20
4	Torre B - Columna			0.16	-1.00	-0.16
6	Tore C - Sur			190.87	1.00	190.87
7	Tore C - Sur - Columna			0.16	-1.00	-0.16
8	Tore C - Central			187.48	1.00	187.48
9	Tore C - Central - Columnas			0.26	-2	-0.52
10	Tore C - Norte			133.13	1.00	133.13
	Subtotal					902.12
	0%					0.00
	TOTAL					**902.12**

REGISTRO FOTOGRAFICO





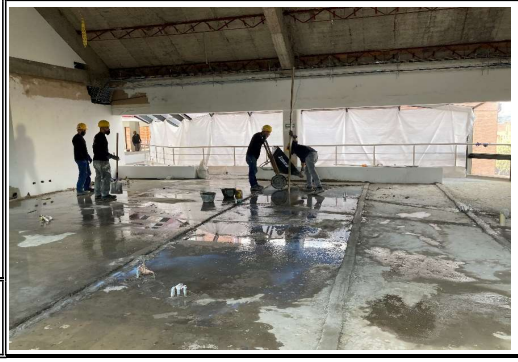



OBSERVACIONES:

FECHA:	DD	9	MM	6	AA	2020	AL
	DD	9	MM	12	AA	2020	


ELABORÓ:	ARQ. JHOAN RUIZ	REVISÓ:	ARQ. GERMÁN GARZÓN

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	8. PISOS	ITEM	8.2	PISO EN VINILO TRAFICO COMERCIAL ALTO, FORMATO 18 CMS X 92 CMS COLOR A ESCOGER. INCLUYE REMATES EN PERFIL DE 3 CM CONTRA MURO O VIDRIO Y PIRLAN TRAFICO COMERCIAL DE 5 CMS EN MADERA PARA PUERTAS	UNID.	UN

UBICACIÓN

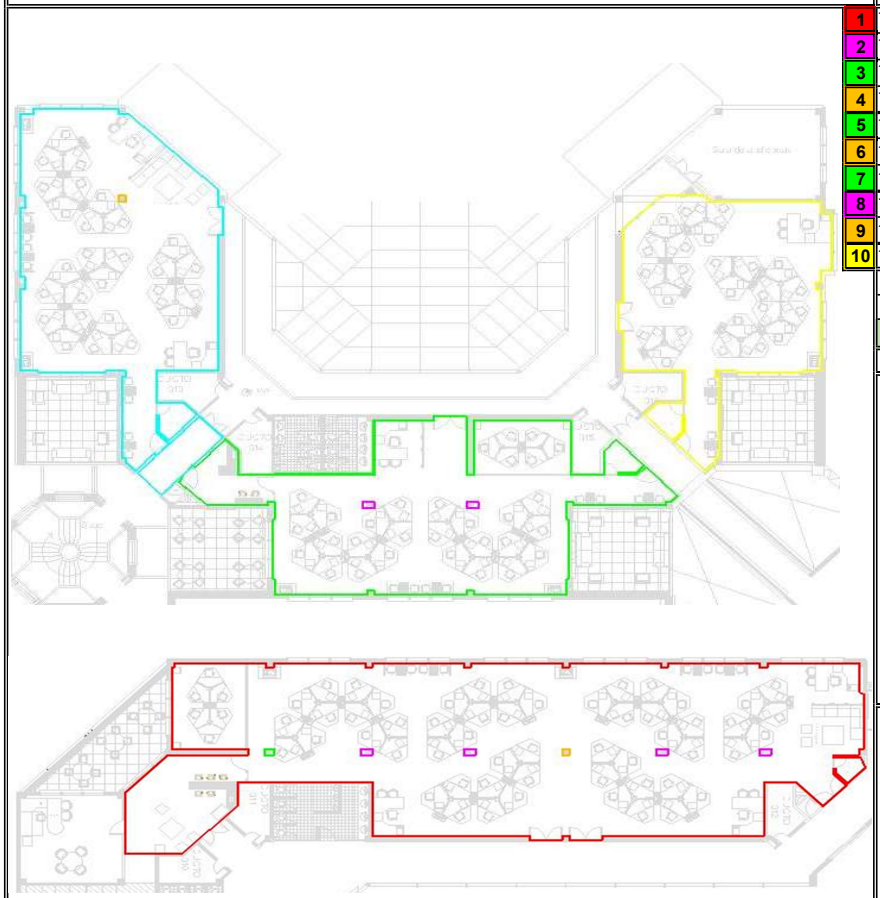

	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B			388.15	1	388.15
2	Torre B - Columnas			0.26	-4	-1.04
3	Torre B - Columna			0.20	-1	-0.20
4	Torre B - Columna			0.16	-1.00	-0.16
5	Tore C - Sur			181.10	1.00	181.10
6	Tore C - Sur - Columna			0.16	-1.00	-0.16
7	Tore C - Sur - Acceso			9.40	1.00	9.40
8	Tore C - Central			185.42	1.00	185.42
9	Tore C - Central - Columnas			0.26	-2	-0.52
10	Tore C - Norte			133.09	1.00	133.09
	Subtotal					895.08
	0%					0.00
	TOTAL					**895.08**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020	


ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ **REVISÓ:** ARQ. GERMÁN GARZÓN

OBJETO DEL CONTRATO Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	8. PISOS	ITEM	8.3	PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL 32. REMATES EN PERFIL DE 3 CM CONTRA MURO O VIDRIO, PIRLAN TRAFICO COMERCIAL DE 5 CMS EN MADERA PARA PUERTAS.	UNID.	UN

UBICACIÓN

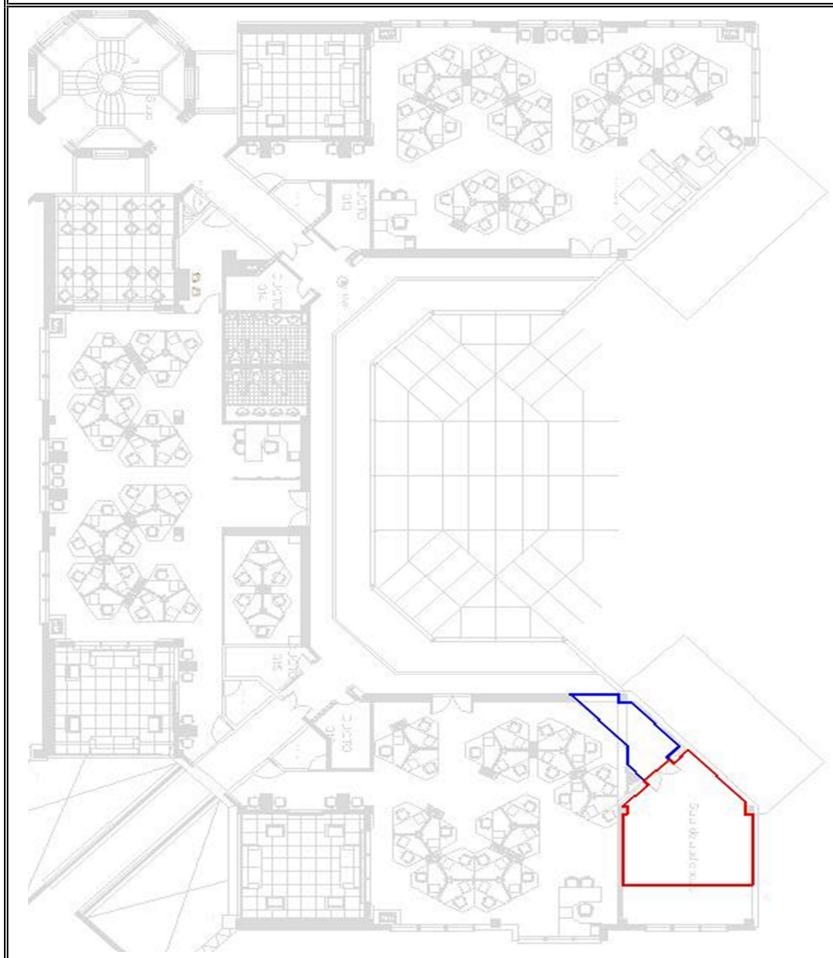

	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre C - Sur - Sala de audiencias			29.23	1	29.23
2	Torre C - Sur - Acceso - Sala de audiencias			7.70	1	7.70
3						0.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
	Subtotal					36.93
	0%					0.00
	TOTAL					**36.93**

REGISTRO FOTOGRAFICO


OBSERVACIONES:

FECHA:	**DD**	**9**	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	**9**	**MM**	12	**AA**	2020	
ELABORÓ:	**ARQ. JHOAN RUIZ**		**REVISÓ:**	**ARQ. GERMÁN GARZÓN**			
OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.**						

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	9. CARPINTERÍA METÁLICA	ITEM	9.1	FACHADA EN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM. INCCLUYE HERRAJES Y DILATADORES EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 30 MM DE DIAMETRO Y PARED DE 1.50 MTS. ASI MISMO, INCLUYE ACABADO EN PELÍCULA VINILICA TRASLUCIDA SEGUN INDICACIONES DE LA ENTIDAD Y PUERTAS DE BOTELLA.	UNID.	UN

UBICACIÓN

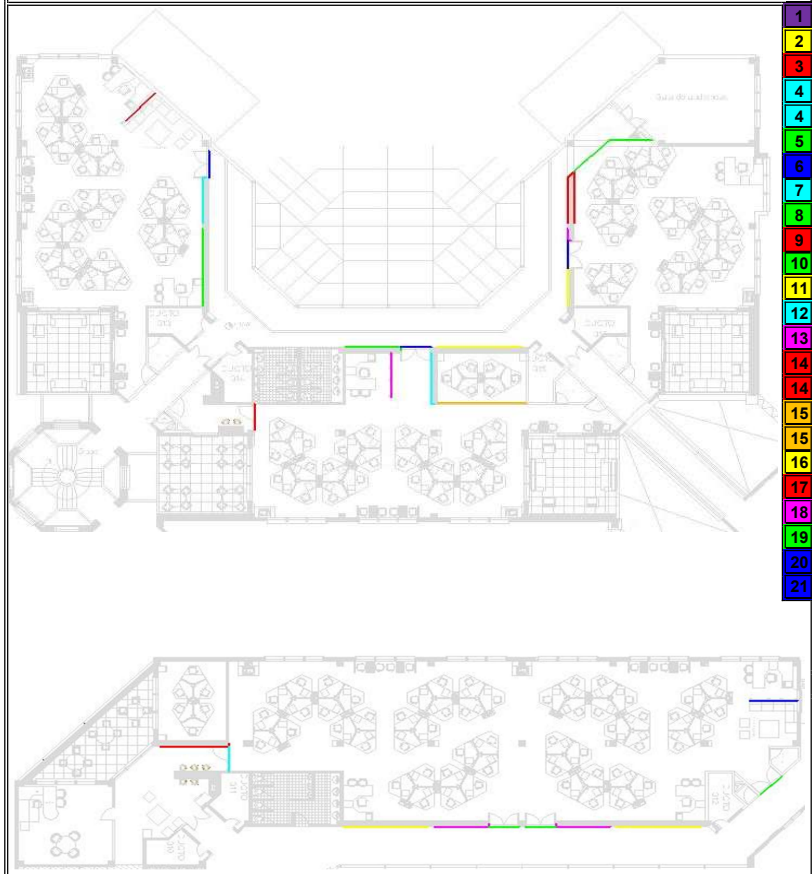

	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B	3.50	2.50	8.75	4.00	35.00
2	Torre B	5.10	2.50	12.75	4.00	51.00
3	Torre B - Sala de Juntas	4.28	2.50	10.70	2.00	21.40
4	Torre B - Cocina	0.78	2.28	1.78	1.00	1.78
4	Torre B - Cocina	0.84	2.65	2.23	1.00	2.23
5	Torre B - Puertas	1.80	2.90	5.22	3.00	15.66
6	Torre B - Puesto Asesor	2.90	2.90	8.41	1.00	8.41
7	Torre C - Sur	3.19	2.00	6.38	2.00	12.76
8	Torre C - Sur	5.10	2.00	10.20	2.00	20.40
9	Torre C - Sur - Puesto Asesor	2.90	2.90	8.41	1.00	8.41
10	Torre C - Central	3.50	2.00	7.00	2.00	14.00
11	Torre C - Central	5.10	2.00	10.20	2.00	20.40
12	Torre C - Central - Hall Acceso	3.60	2.00	7.20	2.00	14.40
13	Torre C - Central - Puesto asesor	2.90	2.90	8.41	1.00	8.41
14	Torre C - Central - Cocina	0.70	2.30	1.61	1.00	1.61
14	Torre C - Central - Cocina	1.00	2.90	2.90	1.00	2.90
15	Torre C - Central - Sala de Juntas	4.50	2.90	13.05	1.00	13.05
15	Torre C - Central - Sala de Juntas	0.84	2.30	1.93	1.00	1.93
16	Torre C - Norte	2.71	2.00	5.42	2.00	10.84
17	Torre C - Norte	7.01	2.00	14.02	1.00	14.02
18	Torre C - Norte	0.98	2.00	1.96	2.00	3.92
19	Torre C - Norte	5.55	2.70	14.99	1.00	14.99
20	Torre C - Puertas	1.80	2.40	4.32	3.00	12.96
21	Torre C - Puertas	1.00	2.20	2.20	4.00	8.80
	Subtotal					319.27
	0%					0.00
	TOTAL					**319.27**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

Superintendencia Financiera de Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020	


ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ **REVISÓ:** ARQ. GERMÁN GARZÓN

OBJETO DEL CONTRATO Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	9. CARPINTERÍA METÁLICA	ITEM	9.2	MANTENIMIENTO PUERTA VENTANA EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, ENGRASE Y AJUSTES DE LAS HOJAS, CAMBIO DE CERRADURAS, VIDRIOS ROTOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNID.	UN

UBICACIÓN

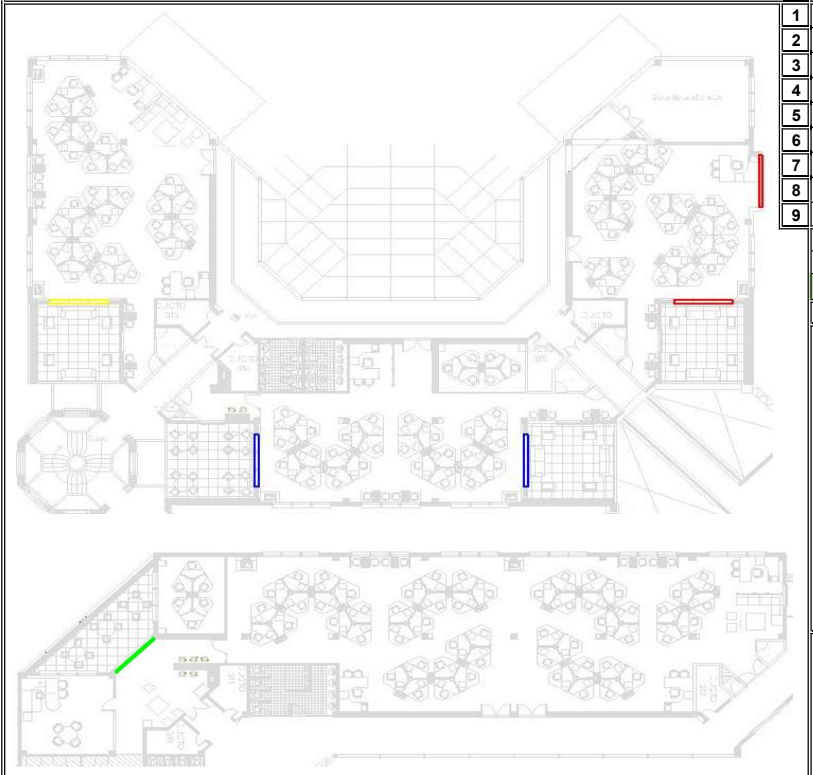

	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B	3.32	10.05	33.37	1	33.37
2	Torre C - Sur	3.60	2.05	7.38	1	7.38
3	Torre C - Central	3.60	2.05	7.38	2	14.76
4	Torre C - Norte	3.60	2.05	7.38	1	7.38
5	Torre C - Norte	3.60	2.70	9.72	1	9.72
6						
7						
8						
9						
	Subtotal					72.61
	0%					0.00
	TOTAL					**72.61**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020	


ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ **REVISÓ:** ARQ. GERMÁN GARZÓN

OBJETO DEL CONTRATO Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	10. CARPINTERÍA MADERA	ITEM	10.2	PANEL ACUSTICO	UNID.	UN

UBICACIÓN

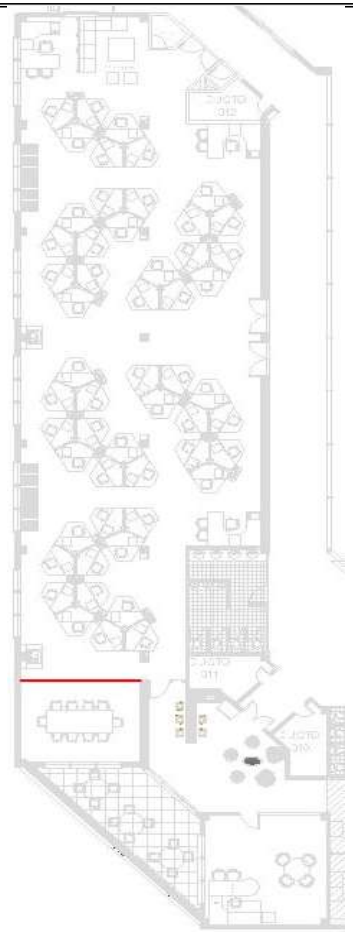

	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B - Sala de juntas	5.40	2.90	15.66	1	15.66
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
	Subtotal					15.66
	0%					0.00
	TOTAL					**15.66**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

Superintendencia Financiera de Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020	


ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ **REVISÓ:** ARQ. GERMÁN GARZÓN


OBJETO DEL CONTRATO Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	10. CARPINTERÍA MADERA	ITEM	10.3	GUARDA ESCOBA EN MADERA MDF DE 15 CMS DE ALTURA, ACABADO EN PINTURA EN ACEITE MATE, COLOR IGUAL AL EXISTENTE.	UNID.	ML

UBICACIÓN

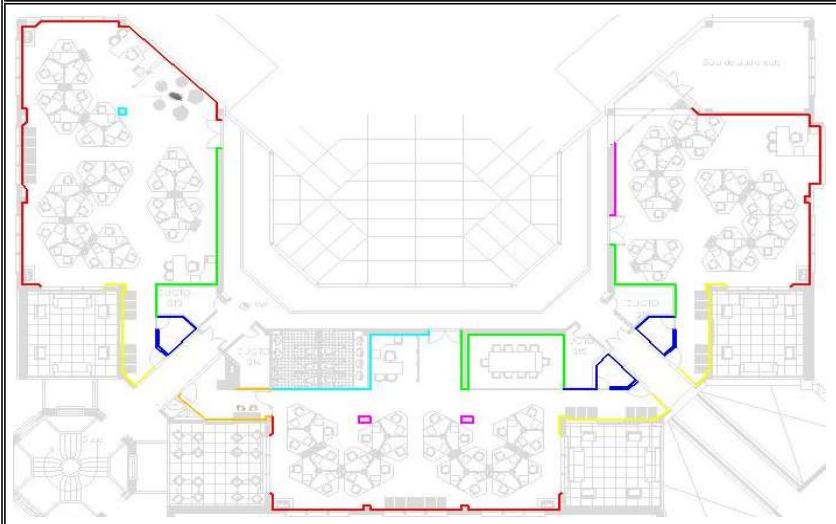



	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B	45.59	1.00	45.59	1.00	45.59
2	Torre B - Sala de Juntas	14.02	1.00	14.02	1.00	14.02
3	Torre B - Cocina	12.44	1.00	12.44	1.00	12.44
4	Torre B - Fachada vidrio	36.00	1.00	36.00	1.00	36.00
5	Torre B - Columnas	12.80	1.00	12.80	1.00	12.80
6	Torre B - Archivo	6.25	1.00	6.25	1.00	6.25
7	Torre C - Sur	33.14	1.00	33.14	1.00	33.14
8	Torre C - Sur - Fachada vidrio	14.17	1.00	14.17	1.00	14.17
9	Torre C - Sur - Archivo	8.37	1.00	8.37	1.00	8.37
10	Torre C - Sur- Puestos practicantes	9.63	1.00	9.63	1.00	9.63
11	Torre C - Sur - Columnas	1.60	1.00	1.60	1.00	1.60
12	Torre C - Central	20.73	1.00	20.73	1.00	20.73
13	Torre C - Central - Sala de Juntas	15.98	1.00	15.98	1.00	15.98
14	Torre C - Central - Archivo	8.14	1.00	8.14	1.00	8.14
15	Torre C - Central - Puestos practicantes	9.36	1.00	9.36	1.00	9.36
16	Torre C - Central - Columnas	4.20	1.00	4.20	1.00	4.20
17	Torre C - Central - Baño	12.48	1.00	12.48	1.00	12.48
18	Torre C - Central - Cocina	9.50	1.00	9.50	1.00	9.50
19	Torre C - Norte	8.18	1.00	8.18	1.00	8.18
20	Torre C - Norte	4.76	1.00	4.76	1.00	4.76
21	Torre C - Norte	22.40	1.00	22.40	1.00	22.40
22	Torre C - Norte - Archivo	8.36	1.00	8.36	1.00	8.36
23	Torre C - Norte - Practicantes	9.63	1.00	9.63	1.00	9.63
	Subtotal					327.73
	0%					0.00
	TOTAL					**327.73**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020	


ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ **REVISÓ:** ARQ. GERMÁN GARZÓN

OBJETO DEL CONTRATO Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	11. ACTIVIDADES VARIAS	ITEM	11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ARTIFICIALES PARA MATERAS EN PUESTOS DE TRABAJO. INCLUYE BASE PARA SU CORRECTO ANCLAJE EN LAS MATERAS. LAS PLANTAS ARTIFICIALES DEBEN SER DE DIFERENTES TAMAÑOS Y AL MENOS TRES (3) VARIEDADES DISTINTAS . INCLUIDAS EN EL COSTO UNITARIO, ALTURA 20 CMS Y 30 CMS.	UNID.	UN

UBICACIÓN

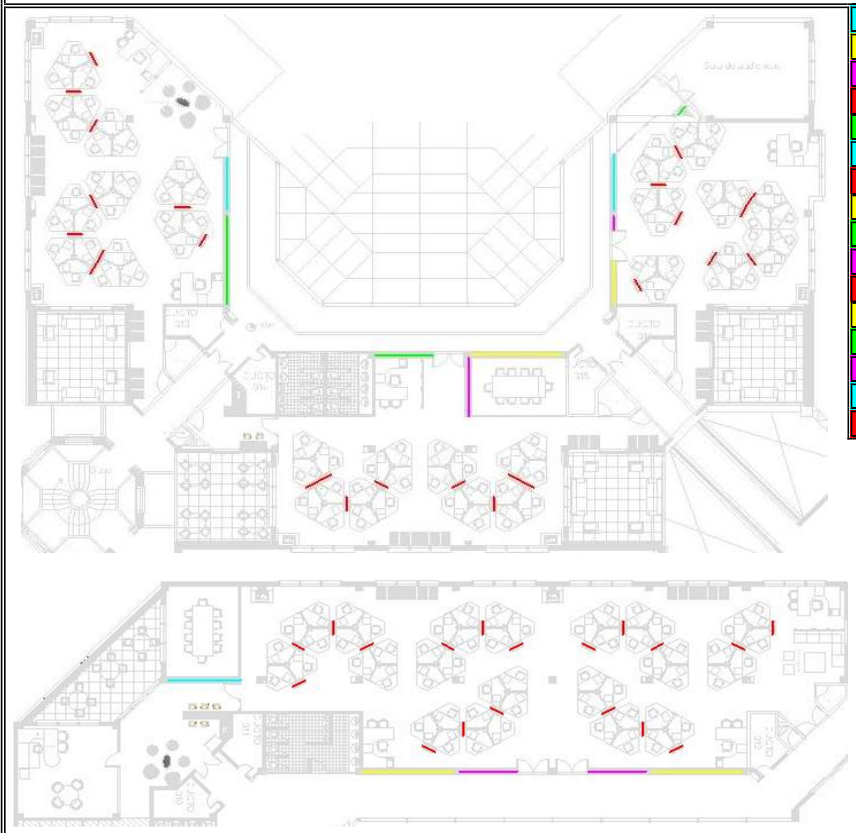

	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B - Sala de Juntas	4.08	0.65	6.28	1.67	10.45
2	Torre B	5.10	0.65	7.85	3.33	26.13
3	Torre B	3.30	0.65	5.08	3.33	16.91
4	Torre B - Materas - Superficie de trabajo	0.65	0.65	1.00	19.00	19.00
5	Torre C - Sur	5.10	0.65	7.85	1.67	13.06
6	Torre C - Sur	2.99	0.65	4.60	1.67	7.66
7	Torre C - Sur - Materas - Superficie de trabajo	0.65	0.65	1.00	9.00	9.00
8	Torre C - Central	5.10	0.65	7.85	1.67	13.06
9	Torre C - Central	3.40	0.65	5.23	1.67	8.71
10	Torre C - Central - Sala de Juntas	3.30	0.65	5.08	1.67	8.45
11	Torre C - Central - Materas - Superficie de trabajo	0.65	0.65	1.00	9.00	9.00
12	Torre C - Norte	2.51	0.65	3.86	1.67	6.43
13	Torre C - Norte - Sala de audiencias	0.74	0.65	1.14	1.67	1.90
14	Torre C - Norte	0.78	0.65	1.20	1.67	2.00
15	Torre C - Norte	3.22	0.65	4.95	1.67	8.25
16	Torre C - Norte - Materas - Superficie de trabajo	0.65	0.65	1.00	8.00	8.00
	Subtotal					168.01
	0%					0.00
	TOTAL					**168.01**

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que en las fachadas de vidrio se colocan dos tipos de plantas artificiales descolgadas (tipo enredadera) adicionales, y que la unidad se contempla como cada 65cm, por tres tipos de plantas, se paga un 70% adicional al valor unitario.

FECHA:	**DD**	9	**MM**	6	**AA**	2020	**AL**
	DD	9	**MM**	12	**AA**	2020	


ELABORÓ: ARQ. JHOAN RUIZ **REVISÓ:** ARQ. GERMÁN GARZÓN


OBJETO DEL CONTRATO Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

MEMORIA DE CANTIDADES - LICITACIÓN PÚBLICA SF.LP-001-2020

CAPÍTULO	13. MOBILIARIO	ITEM	13.5	CAJONERA MOVIL	UNID.	UN

UBICACIÓN

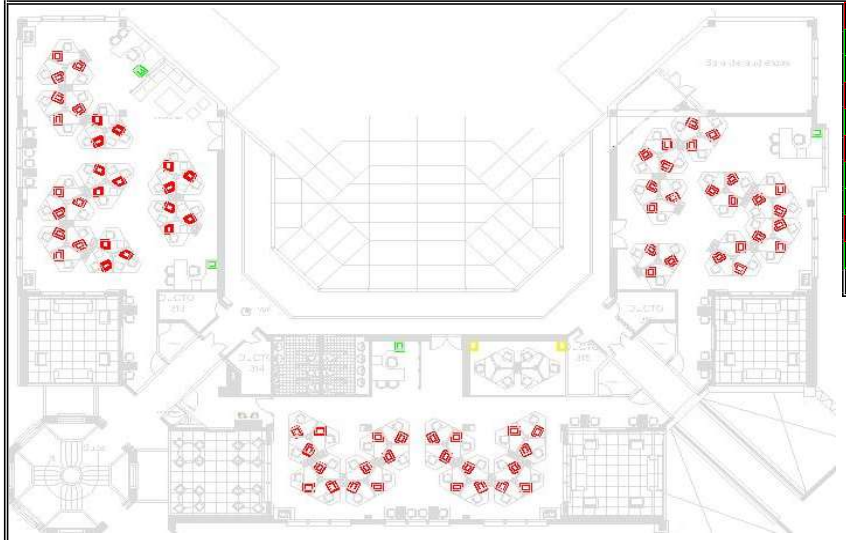

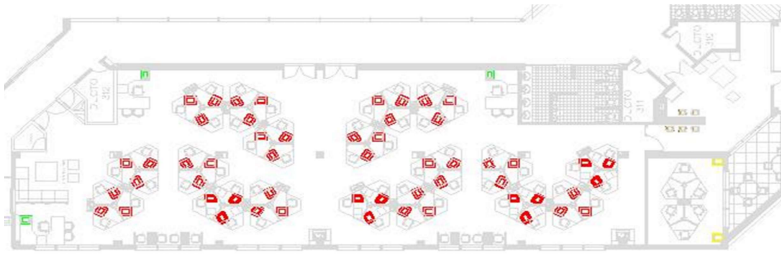

	ACTIVIDAD	Dimensiones			Cantidad	Subtotal
		Longitud	Altura	Area		
1	Torre B			54.00	1	54.00
2	Torre B - Asesores			3.00	1	3.00
	Torre B - Sala de Juntas			2.00	1	2.00
3	Torre C - Sur			27.00	1	27.00
4	Torre C - Sur -Asesores			2.00	1	2.00
5	Torre C - Central			24.00	1	24.00
6	Torre C - Central -Asesores			1.00	1	1.00
	Torre C - Sala de Juntas			2.00	1	2.00
7	Torre C - Norte			24.00	1	24.00
8	Torre C - Norte -Asesores			1.00	1	1.00
9						
	Subtotal					140.00
	0%					0.00
	TOTAL					**140.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:
