Popayán, dia 16 mes 07 año 2021

INFORME FINAL DE OBRA
CONVENIO SOLIDARIO No. 20201800021037 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2020.

De conformidad con el Contrato Solidario No.20201800021037 *CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES, literal B. numeral 6.2 DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL,* obligación *4. Elaborar y presentar los informes que sean solicitados por el Municipio de Popayán a través del interventor designado y en los formatos establecidos para ello.* Por lo anterior se presenta a continuación el informe final de obra que debe ser presentado por la Junta de Acción Comunal, y firmado por su representante legal y el Ingeniero de apoyo técnico.

Orden del Informe:

1.) Información general y específica sobre el desarrollo del contrato

2.) Seguimiento cronológico de la ejecución del contrato

1.) Información general y específica sobre el desarrollo del contrato

1.1) Información General del contrato

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE POPAYÁN**
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR
NIT Y/O CEDULA:	800.214.869-1
VALOR:	*SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($7.135.992)*
OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA J.A.C. DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA SOBRE EL RAMAL DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA MINA A 120MTS DE LA VÍA PRINCIPAL EN LA VEREDA EL HOGAR
ACTA DE INICIO:	23-12-2020
PLAZO INICIAL:	HASTA 30 DE DIECIEMBRE DE 2020

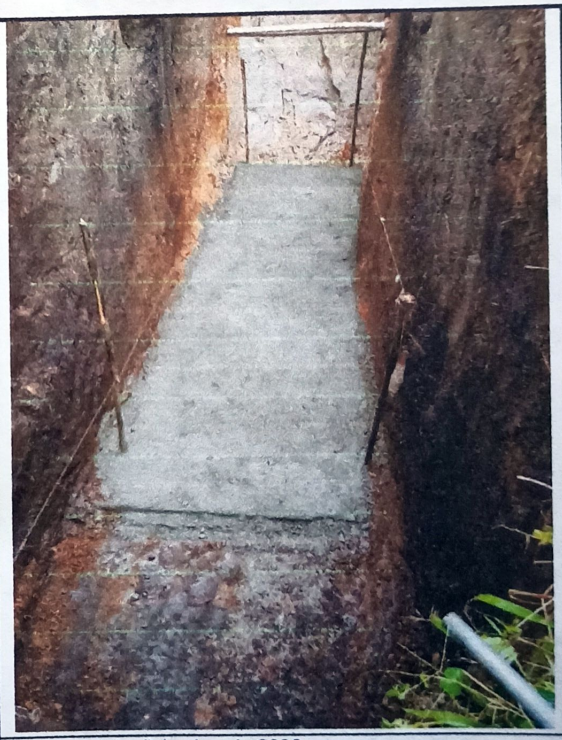
ACTA DE SUSPENSION No.1:	29-12-2020
ACTA DE REINICIO No.1	26-04-2021
MODIFICATORIO No.1	UN (1) MES
FECHA PAGO DE ANTICIPO:	18-05-2021
FECHA ACTAS PARCIALES Y/ FINAL	16-07-2021
FECHA DE TERMINACIÓN	28-05-2021

2.) Seguimiento cronológico de la ejecución del contrato

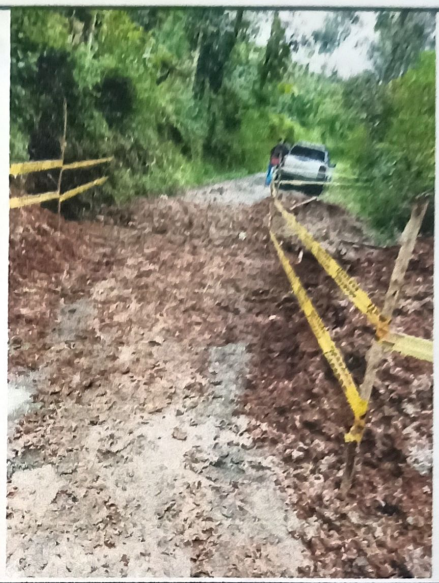
2.1.) Registro Fotográfico



Fecha: 22 de diciembre de 2020
Descripción: Excavación y fundición de solado de limpieza en concreto de 14Mpa.
Observación:
Requerimiento de fecha_____



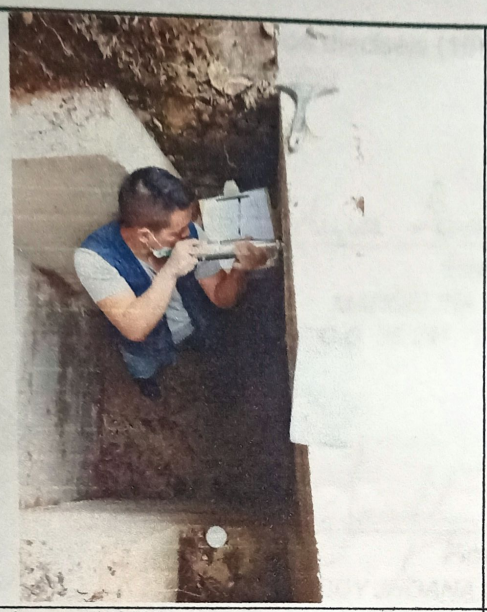
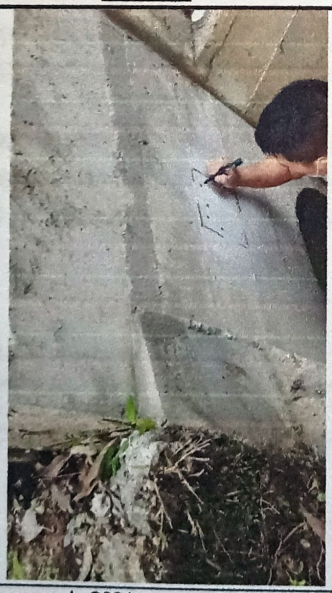
Fecha: 22 de diciembre de 2020
Descripción: Excavación y fundición de solado de limpieza en concreto de 14Mpa.
Observación:
Requerimiento de fecha_____

	
Fecha: 23 de diciembre de 2020 Descripción: Instalación tubería en concreto de 36" Observación: Requerimiento de fecha_____	Fecha: 23 – 24 de diciembre de 2020 Descripción: Relleno de zanja excavada y señalización de cabezales Observación: Se seleccionó el material de excavación para realizar el relleno de la zanja Requerimiento de fecha_____
	
Fecha: 26 -27 de diciembre de 2020 Descripción: Instalación de formaleta y fundición de cabezal de entrada Observación: Se presentaron inconvenientes con	Fecha: 26 -27 de diciembre de 2020 Descripción: Instalación de formaleta y fundición de cabezal de entrada Observación: Se presentaron inconvenientes con

deslizamientos de suelo, debido a las frecuentes lluvias Requerimiento de fecha_____	deslizamientos de suelo, debido a las frecuentes lluvias Requerimiento de fecha_____
	
Fecha: 28-29 de diciembre de 2020 Descripción: Instalación de formaleta y fundición de cabezal de salida Observación: Requerimiento de fecha_____	Fecha: 28-29 de diciembre de 2020 Descripción: Instalación de formaleta y fundición de cabezal de salida Observación: Requerimiento de fecha_____
	
Fecha: 30 de diciembre de 2020 Descripción: Desencofrado cabezal de entrada Observación:	Fecha: 30 de diciembre de 2020 Descripción: Desencofrado cabezal de entrada Observación:

Requerimiento de fecha_____	Requerimiento de fecha_____
	
Fecha: 30 de diciembre de 2020 Descripción: Desencofrado cabezal de salida Observación: Requerimiento de fecha_____	Fecha: 30 de diciembre de 2020 Descripción: Desencofrado cabezal de salida Observación: Requerimiento de fecha_____
	
Fecha: 30 de diciembre de 2020 Descripción: Cabezal de entrada terminado Observación: Requerimiento de fecha_____	Fecha: 30 de diciembre de 2020 Descripción: Cabezal de salida terminado Observación: Requerimiento de fecha_____

 Fecha: 30 de diciembre de 2020 Descripción: Cabezal de salida terminado Observación: Requerimiento de fecha_____	 Fecha: 13 de mayo de 2021 Descripción: Vista de obra terminada Observación: Requerimiento de fecha_____
 Fecha: 21 de mayo de 2021 Descripción: Limpieza de superficie para toma de resistencia en cabezal de entrada. Observación: Se tomó resistencia en concreto endurecido con esclerómetro. Requerimiento de fecha_____	 Fecha: 21 de mayo de 2021 Descripción: Identificación de puntos sobre superficie para toma de resistencia en cabezal de entrada. Observación: Se tomó resistencia en concreto endurecido con esclerómetro. Requerimiento de fecha_____

	
Fecha: 21 de mayo de 2021 Descripción: Toma de resistencia en cabezal de entrada. Observación: Se tomó resistencia en concreto endurecido con esclerómetro. Requerimiento de fecha_____	Fecha: 21 de mayo de 2021 Descripción: Toma de resistencia en cabezal de entrada. Observación: Se tomó resistencia en concreto endurecido con esclerómetro en otro punto también. Requerimiento de fecha_____
	
Fecha: 21 de mayo de 2021 Descripción: Identificación de puntos sobre la superficie para toma de resistencia en cabezal de salida. Observación: Se tomó resistencia en concreto endurecido con esclerómetro. Requerimiento de fecha_____	Fecha: 21 de mayo de 2021 Descripción: Toma de resistencia en cabezal de salida. Observación: Se tomó resistencia en concreto endurecido con esclerómetro en otro punto también. Requerimiento de fecha_____

Se firma el presente informe, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2021

Firma
MARCELINA LAME PAME
C.C. 25.291.723 de Popayán

Firma
LEIDY JHOANA ORDOÑEZ PAZ
No MATRICULA PROFESIONAL:19202-387674CAU

NOTA: La presentación de este informe es requisito para poder tramitar el acta final de pago, el cual debe presentarse en medio físico y digital.

Nota aclaratoria; no se presentan la totalidad de las fotos debido a fallas técnicas del dispositivo utilizado para dicho registro por tal motivo LA INGENIERA de apoyo da fe del cumplimiento de las normas constructivas de la alcantarilla, y se hace responsable del buen funcionamiento de la obra

Proyectó: Ing. Leidy Jhoana Ordoñez Paz
Anexos: Resultados resistencia y comprobante egreso tesoreria
Copia: Carpeta convenio de obra del Interventor y/o Supervisor
Archivado en: Carpeta del Convenio Oficina Asesora Jurídica

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

NÚMERO DE REBOTE (ÍNDICE ESCLEROMÉTRICO) EN EL CONCRETO ENDURECIDO I.N.V. E - 413 - 13	FGSAR-04 Versión 03 Página 1 de 1

CLIENTE:	Junta de Acción Comunal Vereda El Hogar	ORDEN SERVICIO No.:	760
OBRA:	Alcantarilla		
LOCALIZACIÓN OBRA:	Vereda El Hogar		
CONTRATISTA:	JAC Vereda El Hogar		
INTERVENTORÍA:	Alcaldía de Popayán		
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA:	Alcantarilla		
EQUIPO USADO:	Esclerómetro controls serie No. 70066224, Modelo 58 - C0181/N1, Código de eq: MC124		
FECHA DE ENSAYO:	21-may-2021	HORA DE ENSAYO:	09:00:00 a. m.
CONDICIÓN DE HUMEDAD SUPERFICIAL:	Húmedo	EDAD DEL CONCRETO:	>28 dias

ENSAYO No.	LECTURA No.										Angulo grados	Indice esclerométrico
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	26	24	24	26	24	26	24	26	24	28	0	26
2	24	22	24	26	24	22	24	22	24	22	0	24

ENSAYO No.	Ángulo grados	Índice esclerométric	Resistencia estimada (MPa)		Resistencia estimada (P.S.I.)	
			Promedio	Variación	Promedio	Variación
1	0	26	18,8	5,77	2686,3	824,4
2	0	24	15,9	5,43	2264,4	775,2

UBICACIÓN DE LOS ENSAYOS

ENSAYO No.	UBICACIÓN Y/O ELEMENTO PARTICULAR
1	Alcantarilla, cabezal de salida
2	Alcantarilla, cabezal de entrada

OBSERVACIONES:

REVISÓ	APROBÓ
Karen Sofia Mosquera G.	
KAREN SOFIA MOSQUERA	FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GEOTECNOLOGO - Mat. Profesional # 19516030791CAU	SUBGERENTE TÉCNICO - Mat. Profesional # 19516001294CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co e-mail:info@geofisica.com.co

MUNICIPIO DE POPAYÁN

ORDEN DE PAGO RESERVA No. 2021.CEN.01.0323

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

-CREO EN- POPAYÁN

CÓDIGO: F-GF-TES-15 – Ver.01

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 DE MAYO DE 2021

BENEFICIARIO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR	**NIT/CC**	800214869
DIRECCIÓN	VEREDA EL HOGAR	**CIUDAD**	
CONCEPTO	ANTICIPO 50%-AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA SOBRE EL RAMAL DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA MINA A 120MTS DE LA VÍA PRINCIPAL EN LA VEREDA EL HOGAR		
VALOR BRUTO	**$ 3.317.996,00**	TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	
FONDO	36 - SGP INFRAESTRCUTURA		
NO. CONTRATO	20202103		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR
2020.CEN.01.5261	0108.2.51.2504.62.233050404032427	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA SOBRE EL RAMAL DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA MINA A 120 MTS DE LA VÍA PRINCIPAL VEREDA EL HOGAR.	3.317.996,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
19060103	ANTICIPOS CONVENIOS INFRAESTRUCTURA	800214869 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR	3.317.996,00	0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	800214869 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR	0,00	3.317.996,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CARGOS	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

NETO A PAGAR	**$ 3.317.996,00**	TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

ELABORA	REVISA	RECIBE
CHAVES ALARCON PAOLA ANDREA *TESORERO(A) GENERAL*	BALCAZAR MURGUEITIO SANDRA *CONTADOR MUNICIPAL*	
