CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 21000624- H4 DE 2021.
CLASE DE CONTRATO	Obra.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.
OBJETO	RVLC0955 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES DEL AEROPUERTO DE POPAYAN.
VALOR	$115,598,480.77
PLAZO	Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 31 de diciembre de 2021.
CDP	15821 de 14- 04-2021
RP	48321 de 23-06-2021
FECHA LEGALIZACIÓN	23 de Junio de 2021.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

En la ciudad de Palmira (V), a los 17 dias del mes de Agosto de 2021, se reunieron:
El Ing. **Néstor Freddy Ramos Rodríguez.** representante legal de **SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.**obrando como contratista, **Milton Cesar Sanchez Perez** como Supervisor y **Juan David Rodriguez Suancha** en apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil, con el propósito de efectuar la Entrega y Recibo de **ACTA DE COBRO PARCIAL No.1,** de las obras el Contrato 21000624-H4

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

30/06/2021

SUSPENSIONES:

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N/A

PRÓRROGAS

N/A

ADICIONES EN VALOR

N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

30/09/2021

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	MANTENIMIENTO EN EL CUARTEL SEI						
1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M²	237,00	$ 5.545,00	$1.314.165,00		$ -
1,02	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M³	537,00	$ 4.405,00	$2.365.485,00		$ -
1,03	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M²	10.281,00	$ 1.088,00	$ 11.185.728,00		$ -
1,04	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN	M³	204,19	$ 108.591,00	$ 22.173.196,29		$ -
1,05	SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL	ML	60,00	$ 77.420,00	$4.645.200,00		$ -
1,06	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	1.547,14	$ 2.531,00	$3.915.811,34		$ -
2	MANTENIMIENTO SALA DE ABORDAJE						
2,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M²	167,13	$ 2.732,00	$456.599,16	167,13	$ 456.599,00
2,02	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M²	167,13	$ 40.311,00	$6.737.177,43	167,13	$ 6.737.177,00
2,03	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M²	167,13	$ 14.252,00	$2.381.936,76	167,13	$ 2.381.937,00
2,04	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M²	294,00	$ 1.638,00	$481.572,00	294,00	$ 481.572,00
2,05	PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO	ML	41,88	$ 27.066,00	$1.133.524,08	41,88	$ 1.133.524,00
3	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AREA DE EJERCITO NACIONAL						
3,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M³	21,21	$ 25.758,00	$546.327,18	21,21	$ 546.327,00
3,02	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M³	8,10	$ 72.804,00	$589.712,40	8,10	$ 589.712,00
3,03	TUB.PVC 2 SANI.	ML	90,00	$29.114,00	$2.620.260,00	90,00	$ 2.620.260,00
3,04	TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	4,00	$ 21.287,00	$ 85.148,00	4,00	$ 85.148,00
3,05	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	$ 10.326,00	$ 20.652,00	2,00	$ 20.652,00
3,06	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	2,00	$ 23.250,00	$ 46.500,00	2,00	$ 46.500,00
3,07	PUNTO SANITARIO PVC 2	UND	5,00	$ 39.409,00	$197.045,00	5,00	$ 197.045,00
3,08	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	UND	4,00	$ 59.559,00	$238.236,00	4,00	$ 238.236,00
3,09	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	96,00	$ 9.078,00	$871.488,00	96,00	$ 871.488,00
3,1	ORINAL PEQUEÑO	UND	1,00	$ 212.346,00	$212.346,00		$ -
3,11	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	JGO	1,00	$761.318,00	$761.318,00		$ -

3,12	MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA	UND	1,00	$135.054,00	$135.054,00	1,00	$ 135.054,00
3,13	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M²	0,35	$ 91.773,00	$ 32.120,55		$ -
3,14	INSTALACION ESPEJO	M²	0,35	$ 49.793,00	$ 17.427,55		$ -
3,15	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00	$ 58.284,00	$349.704,00	6,00	$ 349.704,00
3,16	TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ	UND	1,00	$153.662,00	$153.662,00	1,00	$ 153.662,00
3,17	ACOM.E.1F(2# 6) 1"	ML	86,00	$ 47.080,00	$4.048.880,00	86,00	$ 4.048.880,00
3,18	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	1,00	$207.184,00	$207.184,00	1,00	$ 207.184,00
3,19	SAL TOMA 120 EMT	UND	3,00	$165.046,00	$495.138,00	3,00	$ 495.138,00
3,2	PANEL LED 600X600CM 45-50W	UND	3,00	$227.975,00	$683.925,00		$ -
3,21	CAJA INSPECCION 60x60,HAST 1.0M CONC+EXC	UND	1,00	$312.315,00	$312.315,00	1,00	$ 312.315,00
3,22	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M³	0,32	$558.306,00	$178.657,92	0,32	$ 178.658,00
3,23	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M³	0,75	$856.865,00	$642.648,75	0,75	$ 642.649,00
3,24	VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM	M³	1,50	$1.285.896,00	$1.928.844,00	1,50	$ 1.928.844,00
3,25	COLUMNA AMARRE MURO	ML	9,60	$ 53.884,00	$517.286,40	9,60	$ 517.286,00
3,26	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M²	15,00	$ 31.636,00	$474.540,00	15,00	$ 474.540,00
3,27	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40P	M³	3,00	$372.944,00	$1.118.832,00	3,00	$ 1.118.832,00
3,28	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M²	9,50	$ 62.889,00	$597.445,50	9,50	$ 597.446,00
3,29	REPELLO MURO 1:3	M²	19,00	$ 29.480,00	$560.120,00	19,00	$ 560.120,00
3,3	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M²	34,00	$ 55.515,00	$1.887.510,00	34,00	$ 1.887.510,00
3,31	DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215	M²	12,00	$230.649,00	$2.767.788,00		$ -
3,32	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M²	30,00	$ 68.896,00	$2.066.880,00	30,00	$ 2.066.880,00
3,33	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M²	30,00	$ 42.576,00	$1.277.280,00	30,00	$ 1.277.280,00
3,34	TEJA CUBIERTA CINDUTEC	M²	30,00	$ 47.884,00	$1.436.520,00	30,00	$ 1.436.520,00
3,35	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	30,00	$ 61.755,00	$1.852.650,00	30,00	$ 1.852.650,00
3,36	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	15,00	$ 62.383,00	$935.745,00	15,00	$ 935.745,00
3,37	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M²	22,50	$ 95.196,00	$2.141.910,00	22,50	$ 2.141.910,00
3,38	MARCO ALUM. 0,61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	1,00	$337.817,00	$337.817,00		$ -
3,39	NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M²	2,00	$681.148,00	$1.362.296,00		$ -
3,4	CERRADURA BANO YALE REF.5302	UND	1,00	$108.922,00	$108.922,00		$ -
4	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO Y CERRAMIENTOS**						
4,01	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.01-2.5)	UND	8,00	$ 1.049.350,00	$8.394.800,00		$ -
4,02	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	8,00	$ 26.015,00	$208.120,00		$ -
4,03	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2"	M²	62,90	$ 6.204,00	$390.231,60		$ -
4,04	EXCAVACION TIERRA A MANO	M³	0,96	$ 25.758,00	$ 24.728,00		$ -
4,05	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M³	0,64	$558.306,00	$357.316,00		$ -
4,06	COLUMNA AMARRE MURO	ML	10,00	$ 53.884,00	$538.840,00		$ -
4,07	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.267,83	$ 5.510,00	$ 12.495.743,30	2267,83	$12.495.746,00
4,08	DEMOL.ANDEN-SARDINEL	M²	11,20	$ 9.206,00	$103.107,20	11,20	$ 103.107,00
4,09	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M²	11,20	$ 72.347,00	$810.286,40	11,20	$ 810.286,00

	COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU				**$ 114.931.702,81**		**$53.134.123,00**
	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU				**$ 87.734.124,28**		**$40.560.399,24**
	ADMINISTRACIÓN		21,00%		$ 18.424.166,10		$ 8.517.683,84
	IMPREVISTOS		6,00%		$5.264.047,46		$ 2.433.623,95
	UTILIDAD		4,00%		$3.509.357,68		$ 1.622.415,97
	TOTAL AIU		31,00%		$ 27.197.571,24		$12.573.723,76
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$666.777,96		$ 308.259,03
	TOTAL				$ 115.598.480,77		$53.442.382,03

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 115.598.480,77 M/CTE IVA INCLUIDO SOBRE LA UTILIDAD.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 115.598.480,77 M/CTE IVA INCLUIDO SOBRE LA UTILIDAD

FORMA DE PAGO:

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de **UN (1) ACTA PARCIAL, que se levantara a la mitad del plazo de ejecución y/o con un avance en la ejecución del 50% y UN (1) ACTA FINAL,** previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique). El último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Art. 50, inciso 3 Ley 789 de 2002) y la **Certificación del pago a la Contribución FIC**, conforme al Decreto 2375 de 1974 y sus decretos reglamentarios y normas concordantes.

NOTA: Los supervisores de los contratos deben informar a contratistas y proveedores que el tiempo máximo para el pago de sus facturas, será de 10 días hábiles para reconocimiento de obligaciones amparadas con recursos propios y de 31 días hábiles cuando se trate de obligaciones amparadas con Recursos de la Nación sujetos a cupo PAC. Este tiempo empezara a contar una vez la cuenta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos para el pago.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas: (Indicar entre otros, el número de acta, valor bruto, valor neto, valor IVA, valor otros descuentos).

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, Ica, Retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

(indicar si a la fecha de la presente acta de Recibo Final se adeuda al contratista valor alguno por concepto del contrato ejecutado).

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$115.598.480,77
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 53.442.382,03
VALOR NO EJECUTADO	$ 62.156.098,74

VALOR PAGADO	$0
VALOR DESCUENTOS	$0
VALOR PENDIENTE PAGO	$115.598.480,77

TOTALES	$115.598.480,77	$115.598.480,77	$115.598.480,77

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron.
(Para su validez, la presente acta de recibo final debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor, con el visto bueno del Ordenador del gasto de conformidad con las Resoluciones de delegación vigentes).

NÉSTOR FREDDY RAMOS RODRÍGUEZ
SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.
Contratista.

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.
Apoyo a la supervisión del Contrato
U.A.E.A.C.

VoBo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Valle.
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

Proyectó: Juan David Rodriguez Suancha- Infraestructura
Revisó: Diego Mauricio López. - Jurídico

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:	RVLC0955 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES DEL AEROPUERTO DE POPAYAN.	VALOR INICIAL	CANTIDADES DE OBRA
				$ 115.598.480,77	ACTA DE COBRO PARCIAL
DESARROLLO AEROPORTUARIO REGIONAL VALLE		CONTRATO No. 21000624-H4 de 2021		INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	FECHA: 17/08/2021
		AEROPUERTO		VALOR FINAL	CONTRATISTA: SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS
		GUILLERMO LEON VALENCIA (POPAYAN)		$ 115.598.480,77	
		PLAZO INICIAL: 30/06/2021 PLAZO FINAL: 30/09/2021		INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ. APOYO A SUPERVISION: JUAN DAVID RODRIGUEZ.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		EJECUTADO ACOMULADO		
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM
1	**MANTENIMIENTO EN EL CUARTEL SEI**									
1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M^2	237,00	$ 5.545,00	$ 1.314.165,00		$ -	0,00	$ -	0%
1,02	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M^3	537,00	$ 4.405,00	$ 2.365.485,00		$ -	0,00	$ -	0%
1,03	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M^2	10.261,00	$ 1.088,00	$ 11.185.726,00		$ -	0,00	$ -	0%
1,04	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN	M^3	204,19	$ 108.591,00	$ 22.173.196,29		$ -	0,00	$ -	0%
1,05	SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL	ML	60,00	$ 77.420,00	$ 4.645.200,00		$ -	0,00	$ -	0%
1,06	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	1.547,14	$ 2.531,00	$ 3.915.811,34		$ -	0,00	$ -	0%
2	**MANTENIMIENTO SALA DE ABORDAJE**									
2,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M^2	167,13	$ 2.732,00	$ 456.599,16	167,13	$ 456.599,00	167,13	$ 456.599,00	100%
2,02	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M^2	167,13	$ 40.311,00	$ 6.737.177,43	167,13	$ 6.737.177,00	167,13	$ 6.737.177,00	100%
2,03	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M^2	167,13	$ 14.252,00	$ 2.381.936,76	167,13	$ 2.381.937,00	167,13	$ 2.381.937,00	100%
2,04	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M^2	294,00	$ 1.638,00	$ 481.572,00	294,00	$ 481.572,00	294,00	$ 481.572,00	100%
2,05	PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO	ML	41,88	$ 27.066,00	$ 1.133.524,08	41,88	$ 1.133.524,00	41,88	$ 1.133.524,00	100%
3	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AREA DE EJERCITO NACIONAL**									
3,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M^3	21,21	$ 25.758,00	$ 546.327,18	21,21	$ 546.327,00	21,21	$ 546.327,00	100%
3,02	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M^3	8,10	$ 72.804,00	$ 589.712,40	8,10	$ 589.712,00	8,10	$ 589.712,00	100%
3,03	TUB.PVC 2 SANI.	ML	90,00	$ 29.114,00	$ 2.620.260,00	90,00	$ 2.620.260,00	90,00	$ 2.620.260,00	100%
3,04	TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	4,00	$ 21.287,00	$ 85.148,00	4,00	$ 85.148,00	4,00	$ 85.148,00	100%
3,05	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	$ 10.326,00	$ 20.652,00	2,00	$ 20.652,00	2,00	$ 20.652,00	100%
3,06	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	2,00	$ 23.250,00	$ 46.500,00	2,00	$ 46.500,00	2,00	$ 46.500,00	100%
3,07	PUNTO SANITARIO PVC 2	UND	5,00	$ 39.409,00	$ 197.045,00	5,00	$ 197.045,00	5,00	$ 197.045,00	100%
3,08	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	UND	4,00	$ 59.559,00	$ 238.236,00	4,00	$ 238.236,00	4,00	$ 238.236,00	100%
3,09	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	96,00	$ 9.078,00	$ 871.488,00	96,00	$ 871.488,00	96,00	$ 871.488,00	100%
3,1	ORINAL PEQUENO	UND	1,00	$ 212.346,00	$ 212.346,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,11	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	JGO	1,00	$ 761.318,00	$ 761.318,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,12	MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA	UND	1,00	$ 135.054,00	$ 135.054,00	1,00	$ 135.054,00	1,00	$ 135.054,00	100%
3,13	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M^2	0,35	$ 91.773,00	$ 32.120,55		$ -	0,00	$ -	0%
3,14	INSTALACION ESPEJO	M^2	0,35	$ 49.793,00	$ 17.427,55		$ -	0,00	$ -	0%
3,15	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00	$ 58.284,00	$ 349.704,00	6,00	$ 349.704,00	6,00	$ 349.704,00	100%
3,16	TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ	UND	1,00	$ 153.662,00	$ 153.662,00	1,00	$ 153.662,00	1,00	$ 153.662,00	100%
3,17	ACOM.E.1F(2# 6) 1"	ML	86,00	$ 47.080,00	$ 4.048.880,00	86,00	$ 4.048.880,00	86,00	$ 4.048.880,00	100%
3,18	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	1,00	$ 207.184,00	$ 207.184,00	1,00	$ 207.184,00	1,00	$ 207.184,00	100%
3,19	SAL TOMA 120 EMT	UND	3,00	$ 165.046,00	$ 495.138,00	3,00	$ 495.138,00	3,00	$ 495.138,00	100%
3,2	PANEL LED 600X600CM 45-50W	UND	3,00	$ 227.975,00	$ 683.925,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,21	CAJA INSPECCION 60x60,HAST 1.0M CONC+EXC	UND	1,00	$ 312.315,00	$ 312.315,00	1,00	$ 312.315,00	1,00	$ 312.315,00	100%
3,22	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M^3	0,32	$ 558.306,00	$ 178.657,92	0,32	$ 178.658,00	0,32	$ 178.658,00	100%
3,23	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M^3	0,75	$ 856.865,00	$ 642.648,75	0,75	$ 642.649,00	0,75	$ 642.649,00	100%
3,24	VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM	M^3	1,50	$ 1.285.896,00	$ 1.928.844,00	1,50	$ 1.928.844,00	1,50	$ 1.928.844,00	100%
3,25	COLUMNA AMARRE MURO	ML	9,60	$ 53.884,00	$ 517.286,40	9,60	$ 517.286,00	9,60	$ 517.286,00	100%
3,26	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M^2	15,00	$ 31.636,00	$ 474.540,00	15,00	$ 474.540,00	15,00	$ 474.540,00	100%
3,27	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40P	M^3	3,00	$ 372.944,00	$ 1.118.832,00	3,00	$ 1.118.832,00	3,00	$ 1.118.832,00	100%
3,28	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M^2	9,50	$ 62.889,00	$ 597.445,50	9,50	$ 597.446,00	9,50	$ 597.446,00	100%
3,29	REPELLO MURO 1:3	M^2	19,00	$ 29.480,00	$ 560.120,00	19,00	$ 560.120,00	19,00	$ 560.120,00	100%
3,3	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M^2	34,00	$ 55.515,00	$ 1.887.510,00	34,00	$ 1.887.510,00	34,00	$ 1.887.510,00	100%
3,31	DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215	M^2	12,00	$ 230.649,00	$ 2.767.788,00		$ -	0,00	$ -	0%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		EJECUTADO ACOMULADO		
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM
3,26	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M^2	15,00	$ 31.636,00	$ 474.540,00	15,00	$ 474.540,00	15,00	$ 474.540,00	100%
3,27	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40P	M^3	3,00	$ 372.944,00	$ 1.118.832,00	3,00	$ 1.118.832,00	3,00	$ 1.118.832,00	100%
3,28	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M^2	9,50	$ 62.889,00	$ 597.445,50	9,50	$ 597.446,00	9,50	$ 597.446,00	100%
3,29	REPELLO MURO 1:3	M^2	19,00	$ 29.480,00	$ 560.120,00	19,00	$ 560.120,00	19,00	$ 560.120,00	100%
3,3	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M^2	34,00	$ 55.515,00	$ 1.887.510,00	34,00	$ 1.887.510,00	34,00	$ 1.887.510,00	100%
3,31	DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215	M^2	12,00	$ 230.649,00	$ 2.767.788,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,32	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M^2	30,00	$ 68.896,00	$ 2.066.880,00	30,00	$ 2.066.880,00	30,00	$ 2.066.880,00	100%
3,33	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M^2	30,00	$ 42.576,00	$ 1.277.280,00	30,00	$ 1.277.280,00	30,00	$ 1.277.280,00	100%
3,34	TEJA CUBIERTA CINDUTEC	M^2	30,00	$ 47.884,00	$ 1.436.520,00	30,00	$ 1.436.520,00	30,00	$ 1.436.520,00	100%
3,35	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	30,00	$ 61.755,00	$ 1.852.650,00	30,00	$ 1.852.650,00	30,00	$ 1.852.650,00	100%
3,36	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	15,00	$ 62.383,00	$ 935.745,00	15,00	$ 935.745,00	15,00	$ 935.745,00	100%
3,37	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M^2	22,50	$ 95.196,00	$ 2.141.910,00	22,50	$ 2.141.910,00	22,50	$ 2.141.910,00	100%
3,38	MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	1,00	$ 337.817,00	$ 337.817,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,39	NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M^2	2,00	$ 681.148,00	$ 1.362.296,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,4	CERRADURA BANO YALE REF.5302	UND	1,00	$ 108.922,00	$ 108.922,00		$ -	0,00	$ -	0%
4	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO Y CERRAMIENTOS									
4,01	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.01-2.5)	UND	8,00	$ 1.049.350,00	$ 8.394.800,00		$ -	0,00	$ -	0%
4,02	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	8,00	$ 26.015,00	$ 208.120,00		$ -	0,00	$ -	0%
4,03	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2.1/2"-2"	M^2	62,90	$ 6.204,00	$ 390.231,60		$ -	0,00	$ -	0%
4,04	EXCAVACION TIERRA A MANO	M^3	0,96	$ 25.758,00	$ 24.728,00		$ -	0,00	$ -	0%
4,05	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M^3	0,64	$ 558.306,00	$ 357.316,00		$ -	0,00	$ -	0%
4,06	COLUMNA AMARRE MURO	ML	10,00	$ 53.884,00	$ 538.840,00		$ -	0,00	$ -	0%
4,07	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.267,83	$ 5.510,00	$ 12.495.743,30	2267,83	$ 12.495.746,00	2267,83	$ 12.495.746,00	100%
4,08	DEMOL.ANDEN-SARDINEL	M^2	11,20	$ 9.206,00	$ 103.107,20	11,20	$ 103.107,00	11,20	$ 103.107,00	100%
4,09	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M^2	11,20	$ 72.347,00	$ 810.286,40	11,20	$ 810.286,00	11,20	$ 810.286,00	100%
	COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU				$ 114.931.702,81		$ 53.134.123,00		$ 53.134.123,00	46,23%
	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU				$ 87.734.124,28		$ 40.560.399,24		$ 40.560.399,24	
	ADMINISTRACION		21,00%		$ 18.424.166,10		$ 8.517.683,84		$ 8.517.683,84	
	IMPREVISTOS		6,00%		$ 5.264.047,46		$ 2.433.623,95		$ 2.433.623,95	
	UTILIDAD		4,00%		$ 3.509.357,68		$ 1.622.415,97		$ 1.622.415,97	
	TOTAL AIU		31,00%		$ 27.197.571,24		$ 12.573.723,76		$ 12.573.723,76	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 666.777,96		$ 308.259,03		$ 308.259,03	
	TOTAL				$ 115.598.480,77		$ 53.442.382,03		$ 53.442.382,03	46,23%

SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS
NESTOR FREDDY RAMOS RODRIGUEZ
CONTRATISTA:

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a la supervision

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CESAR SÁNCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

RVLC0955 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES DEL AEROPUERTO DE POPAYAN.

1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TERMINAL POPAYAN

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
2,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,80		14,00		2,00		50,40		Tag (Dos Paredes)
			1,80		14,00		2,00		50,40		Avianca(Dos Paredes)
			1,80		14,00		2,00		50,40		Easy Fly (Dos Paredes)
			0,90		17,70		1,00		15,93		TC
						TOTAL			167,13		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
2,02	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,80		14,00		2,00		50,40		Tag (Dos Paredes)
			1,80		14,00		2,00		50,40		Avianca(Dos Paredes)
			1,80		14,00		2,00		50,40		Easy Fly (Dos Paredes)
			0,90		17,70		1,00		15,93		TC
						TOTAL			167,13		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
2,03	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Distancia (Km)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,80		14,00		2,00		50,40		Tag (Dos Paredes)
			1,80		14,00		2,00		50,40		Avianca(Dos Paredes)
			1,80		14,00		2,00		50,40		Easy Fly (Dos Paredes)
			0,90		17,70		1,00		15,93		TC
						TOTAL			167,13		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
2,04	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	Ancho (M)	Longitud (M)	Altura (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			7,00		14,00				98,00		Tag (Dos Paredes)
			7,00		14,00				98,00		Avianca(Dos Paredes)
			7,00		14,00				98,00		Easy Fly (Dos Paredes)
						TOTAL			294,00		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
2,05	PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					41,88			41,88			Pasamanos Baranda Torre de Control
						TOTAL		41,88			

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			4,00	0,30	5,00					6,00	Base Baño
			0,15	0,30	86,00					3,87	Agua
			0,30	0,30	86,00					7,74	Sanitaria
			0,15	0,30	80,00					3,60	Energia
						TOTAL				21,21	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,02	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,15	0,10	90,00					1,35	Agua
			0,30	0,10	90,00					2,70	Sanitaria
			0,15	0,30	90,00					4,05	Energia
						TOTAL				8,10	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,03	TUB.PVC 2 SANI.	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					90,00			90,00			Red Sanitaria a Caja Principal
						TOTAL		90,00			

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,04	TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					4,00			4,00			Red Interna Baño (Ducha + Sanitario)
						TOTAL		4,00			

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,05	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							2,00				Red Interna Baño (Ducha + Sanitario)
						TOTAL	2,00				

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,06	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							2,00				Red Interna Baño (Ducha + Sanitario)
						TOTAL	2,00				

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,07	PUNTO SANITARIO PVC 2	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							5,00				Orinal+Lavamanos+Sanitario+Ducha+Sifon Baño
						TOTAL	5,00				

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,08	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							4,00				Orinal+Lavamanos+Sanitario+Ducha
						TOTAL	4,00				

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,09	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					90,00			90,00			Red de Agua Potable
					6,00			6,00			Conexiones Internas (Sanitario+Orinal-Labamanos+Ducha
						TOTAL		96,00			

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,12	MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							1,00		0,35		Baño
						TOTAL	1,00		0,35		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,15	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND					6,00				Intalacion Electrica
						TOTAL	6,00				

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,16	TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ	UND					1,00				Intalacion Electrica
						TOTAL	1,00				

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,17	ACOM.E.1F(2# 6) 1"	ML			86,00			86,00			Intalacion Electrica
						TOTAL		86,00			

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,18	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND					1,00				Baño
						TOTAL	1,00				

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,19	SAL TOMA 120 EMT	UND					3,00				Containmer
						TOTAL	3,00				

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,21	CAJA INSPECCION 60x60,HAST 1,0M CONC+EXC	UND					1,00				Baño + Container
						TOTAL	1,00				

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,22	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	0,40	0,50	0,40		4,00			0,32	Cimiento
						TOTAL				0,320	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,23	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	0,25	0,30	10,00					0,75	Cimiento
						TOTAL				0,75	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,24	VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM	M3	0,25	0,30	10,00					0,75	Amarre
			0,25	0,30	10,00					0,75	
						TOTAL				1,50	

N° ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,25	COLUMNA AMARRE MURO	ML			2,50		2,00	5,00			Amarre
					2,30		2,00	4,60			
						TOTAL		9,60			

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,26	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,00		5,00				15,00		Cimiento Baño
						TOTAL			15,00		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,27	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40P	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,00	0,20	5,00					3,00	Cimiento Baño
						TOTAL				3,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,28	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,00	2,30					6,90		Paredes
			2,00	2,30					4,60		
			-1,00	2,00					-2,00		Puerta
						TOTAL			9,50		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,29	REPELLO MURO 1:3	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,00	2,30			2,00		13,80		Paredes
			2,00	2,30			2,00		9,20		
			-1,00	2,00			2,00		-4,00		Puerta
						TOTAL			19,00		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,3	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,00	2,30			2,00		13,80		Paredes
			2,00	2,30			2,00		9,20		
			-1,00	2,00			2,00		-4,00		Puerta
			3,00	5,00			1,00		15,00		Piso
						TOTAL			34,00		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,32	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,00		5,00		1,00		30,00		Placa Baño
						TOTAL			30,00		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,33	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,00		5,00		1,00		30,00		Placa Baño
						TOTAL			30,00		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,34	TEJA CUBIERTA CINDUTEC	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,00		5,00		1,00		30,00		Cubierta Baño
						TOTAL			30,00		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,35	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					6,00		3,00	18,00	0,00		Cubierta Baño
					4,00		3,00	12,00			
						TOTAL		30,00			

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,36	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					5,00		3,00	15,00	0,00		Cubierta Baño
						TOTAL		15,00			

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
4,04	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,40	0,60	0,40		4,00			0,38	Zapatas
			0,40	0,60	0,40		6,00			0,58	Puerta de Acceso Al terminal(2 centro + 2 Laterales+2 peatonales
						TOTAL				0,96	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACION
4,07	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	Diametro	Peso	Longitud (M)	@	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	KLS	LUGAR
			1/2"	0,9960	9,60		16			152,99	Columnas Puerta de Acseso Terminal
			3/8"	0,5560	12,00	60,00	2			800,64	
			1/2"	0,9960	0,40	2,67	4			4,25	
			1/2"	0,9960	0,40	2,67	4			4,25	
			1/2"	0,9960	9,60		16			152,99	
			3/8"	0,5560	10,00	50,00	1			278,00	
			1/2"	0,9960	10,00		16			159,36	
			3/8"	0,5560	10,00	50,00	1			278,00	
			1/2"	0,9960	10,00		16			159,36	
			3/8"	0,5560	10,00	50,00	1			278,00	
						TOTAL				2267,83	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
4,08	DEMOL.ANDEN-SARDINEL	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,00		1,80		2,00		3,60		Rampas de Acceso a PMR
			2,00		3,80		1,00		7,60		Rampas de Acceso a PMR
						TOTAL			11,20		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
4,09	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M3)	Peso	LUGAR
			1,00		1,80		2,00		3,60		
			2,00		3,80		1,00		7,60		
						TOTAL	3,00	0,00	11,20		

SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS
NESTOR FREDDY RAMOS RODRIGUEZ
CONTRATISTA:

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a la supervision

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE COBRO PARCIAL

NUMERO: 21000624-H4 de 2021

CONTRATISTA: SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS

SUPERVISOR DELEGADO UAEAC: **SUPERVISOR:** MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

COSTO TOTAL BRUTO (Costo Directo + A.I.U. + IVA SOBRE U)	$53.442.382,03
Porcentaje estimado para el A.I.U	31,0%
COSTO DIRECTO Costo Total Directo	$40.560.399,24
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado de Utilidad)	$1.622.415,97
	$1.622.415,97
IVA Utilidad x 19% estimado para el IVA	$308.259,03

SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS
NESTOR FREDDY RAMOS RODRIGUEZ
CONTRATISTA:

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ
Apoyo a la Suprervision

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE

AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	OBJETO: RVLC0955 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES DEL AEROPUERTO DE POPAYAN. AEROPUERTO: GUILLERMO LEON VALENCIA CONTRATO No. 21000624-H4 de 2021 PLAZO INICIAL: NOVENTA (90) DIAS PLAZO ADICIONAL: N/A PLAZO FINAL: NOVENTA (90) DÍAS	VALOR INICIAL: $ 115.598.480,77 $ 115.598.480,77 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD VALOR ADICIONAL: $ - INCLUIDO IVA SOBRE U. VALOR FINAL : $ 115.598.480,77 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	CONTRATISTA : SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A SUPERVISION: JUAN DAVID RODRIGUEZ

ACTA DE COBRO PARCIAL

El dia 17 de agosto de 2021 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon, se reunieron el Ingeniero NESTOR FREDDY RAMOS RODRIGUEZ representante legal del contratista de obra SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS, MILTON CESAR SANCHEZ, quién actúa como Supervisor, y JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA obrando en calidad de apoyo a la supervisión designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato 21000624-H4 de 2021 designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL; con el objeto de recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 30 de Junio de 2021 y el 17 de agosto, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el Contrato y según se relaciona en el cuadro anexo de cantidades de obra ACTA DE COBRO PARCIAL , las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor Inicial Contrato		$ 115.598.480,77
2.Valor Adicional		
3. Valor total del Contrato (1+2)		$ 115.598.480,77
4. Valor Pagado por Anticipo	0%	$ -
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 115.598.480,77
6. Valor Presente Acta No. 01		$ 53.442.382,03
7. Amortización en esta acta	0%	$ -
8. Otras retenciones (Acumuladas)		$ -
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		$ 53.442.382,03
10. Pagos Actas Anteriores		$ -
11. Valor pagado a la Fecha		$ -
12. Saldo por pagar del presente Contrato		$ 115.598.480,77
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		46,23%

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoria mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoria contratada por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los terminos de referencia del presente contrato. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 00589 del 12 de febrero de 2007 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoria y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C.

SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS
NESTOR FREDDY RAMOS RODRIGUEZ
Representante Legal


U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a la supervision


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CÉSAR SANCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE

RVLC0955 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES DEL AEROPUERTO DE POPAYAN.

A continuación, se realiza descripción de actividades programadas y ejecutadas durante el periodo comprendido en:30/06/2021 al 13/08/2021

ITEM 1: LOCALIZACIÓN REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA.

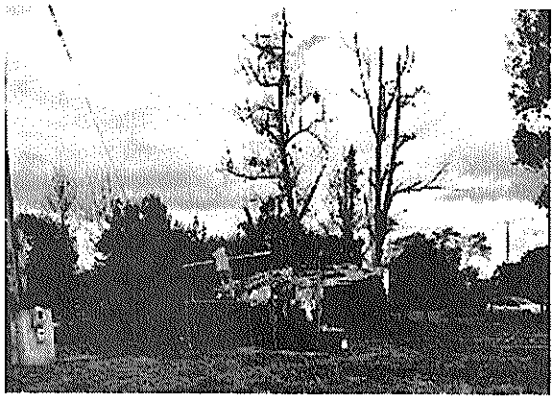

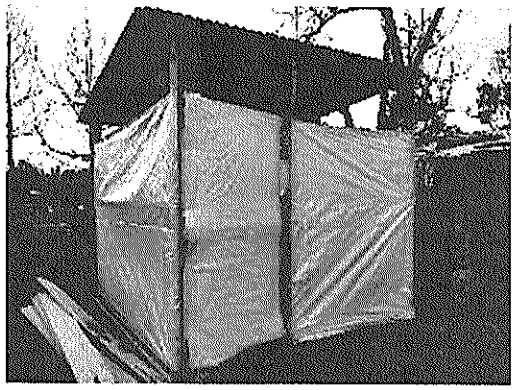

Se realiza construcción de campamento

1,03 - CONFIGURACION NIVELACION DE TERRENO










Se realiza descapote nivelación y compactación de terreno natural.


2- MANTENIMIENTO SALA DE ABORDAJE
2,1- RASQUETEO - LIJADA - RESANE.

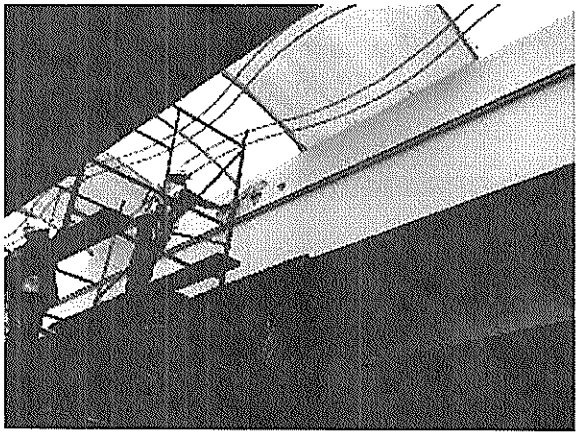


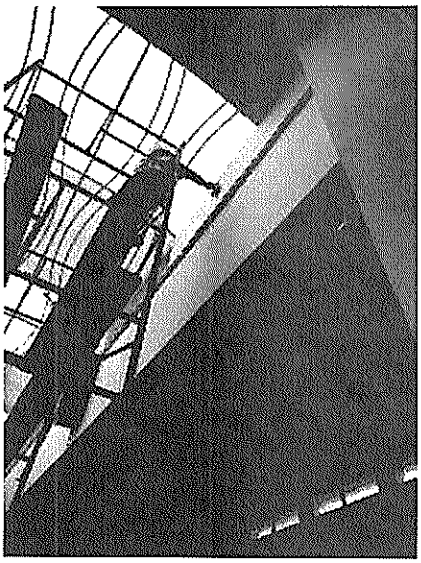

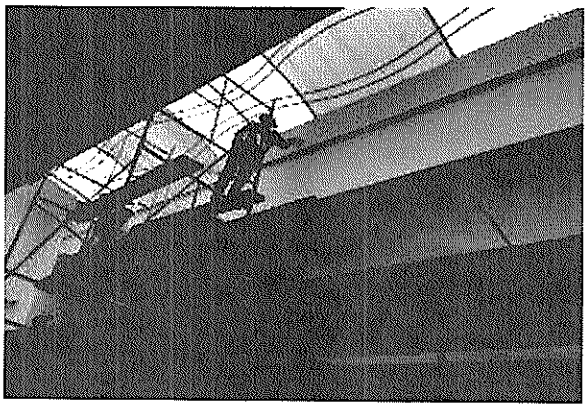

2,02- REPELLO MURO IMPERMEABLE

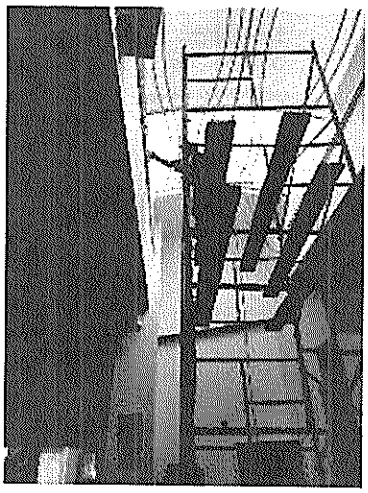


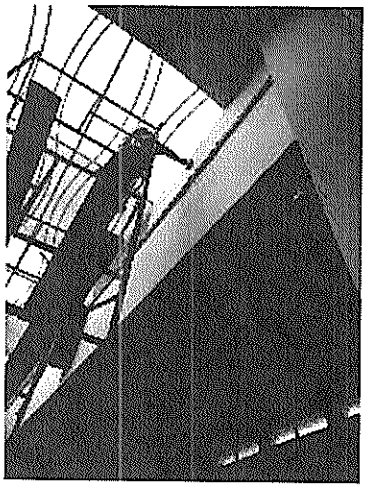

se realzo rasqueteo en las zonas afectadas por descamación del estuco y afectaciones generadas por humedad posterior al rasqueteo y se procedió a realizar impermeabilización, resanes y pulida de muros con lija.

2,3 VINILO MURO TIPO 1 (3 M)




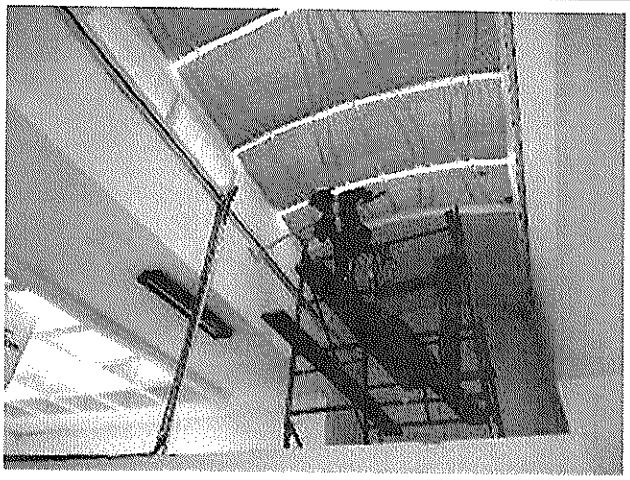

se realiza aplicación de pintura de los muros internos de la parte alta de bóvedas de la zona de abordaje, se aplican 3 manos de pintura tipo 1

2,04- LAVADA Y LIMPIEZA TEJA



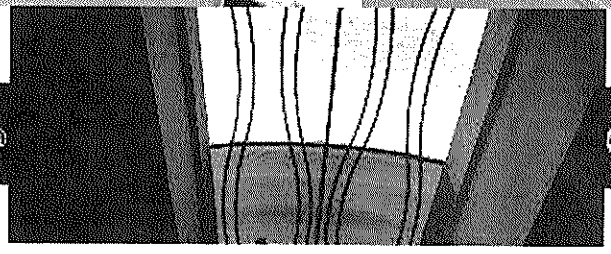

Se realiza limpieza y lavado de teja en la zona interna y zona externa de la teja en policarbonato existente.

2,5 - PASAMANOS METALICO TUBULAR – REDONDO










Se realiza lijada y limpieza de pasamanos para pulir y realizar el retiro de pintura existente.



3,03 - TUBERIA PVC 2 SANITARIA
3,04 - TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)

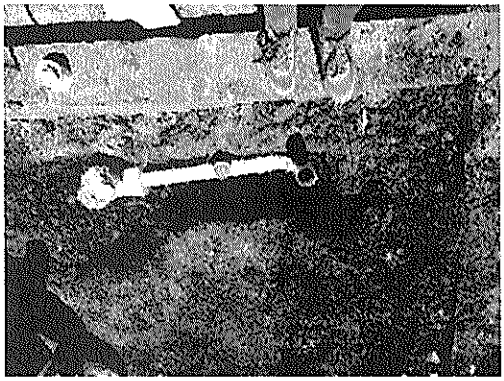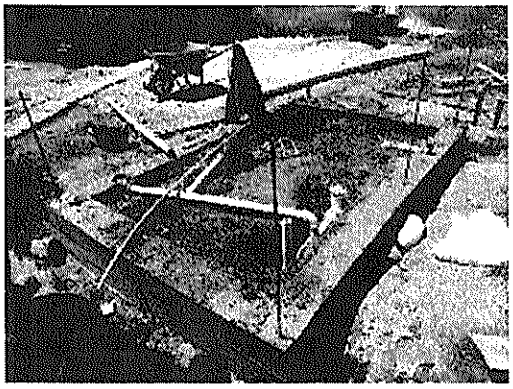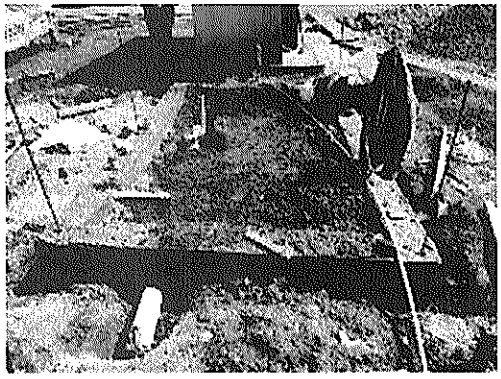
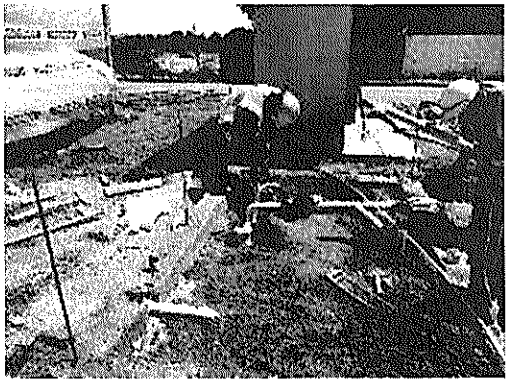


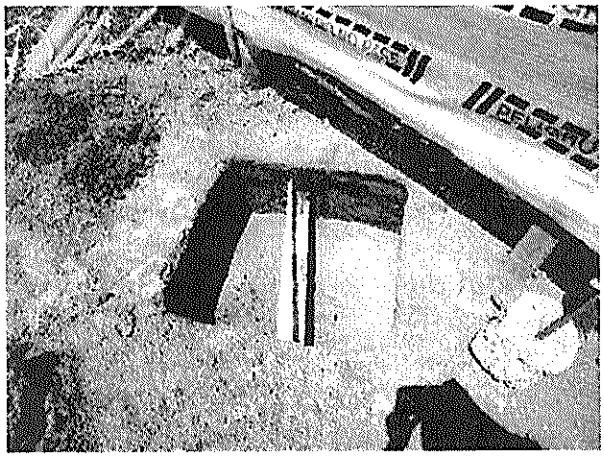


3,21- CAJA INSPECCION 60X60





Se realiza excavación de caja de inspección y se realiza solado de limpieza en concreto de 5cm de espesor.

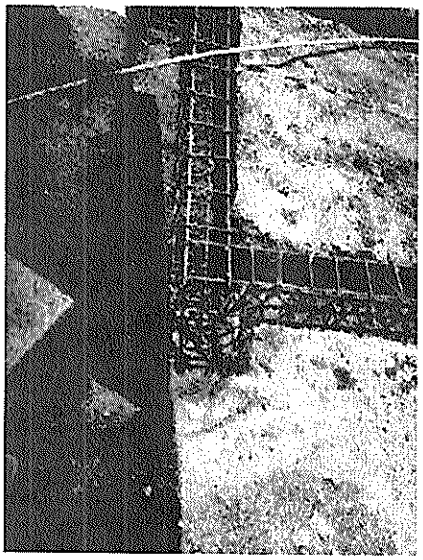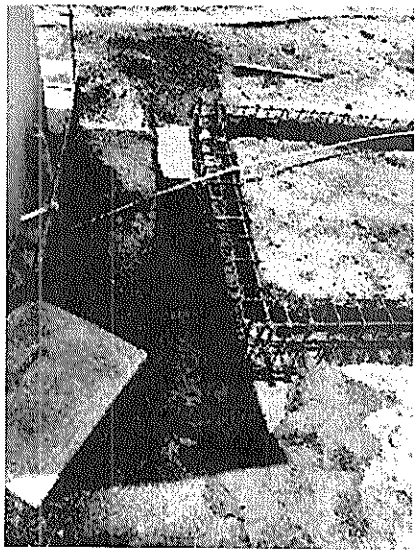
3,22- ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA.

se realiza excavación de zapatas se procede a fundir solado de limpieza y se realiza instalación de aceros y se funden zapatas en concreto 3000 psi.


3,23- VIGA CIMENTO ENLACE H:20-40CM




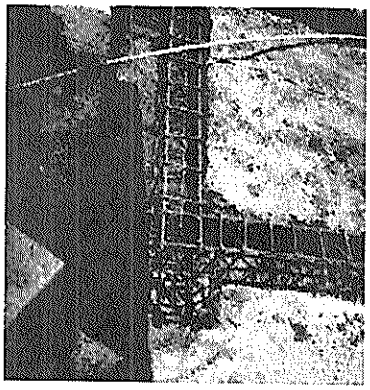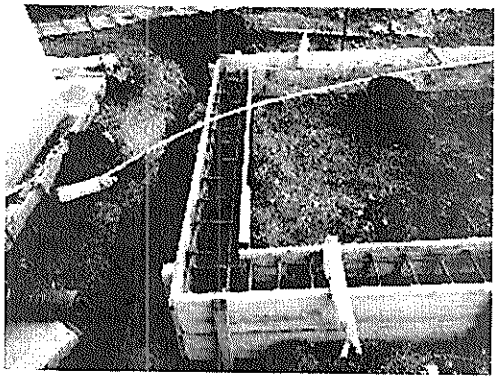

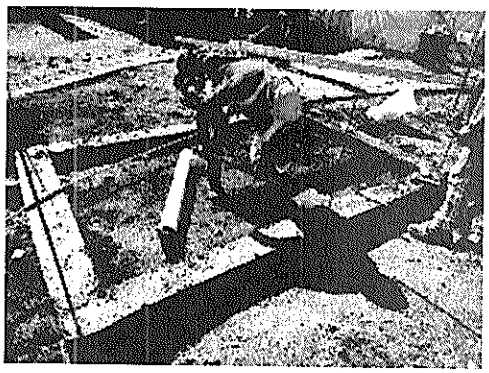
se realiza fundición de salados de vigas de cimentación y se procede a instalar formaleta y aceros y se procede a realizar fundición.


3,26- SOLADO ESPESOR 05 CM 3000 PSI 210 MPA

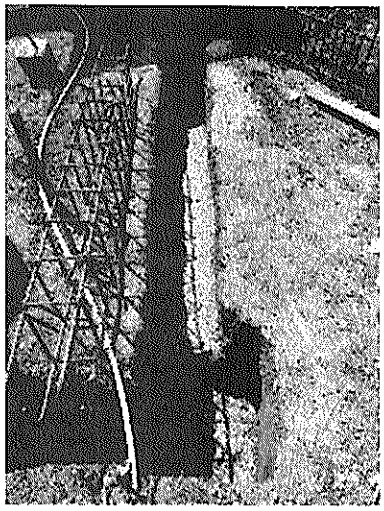


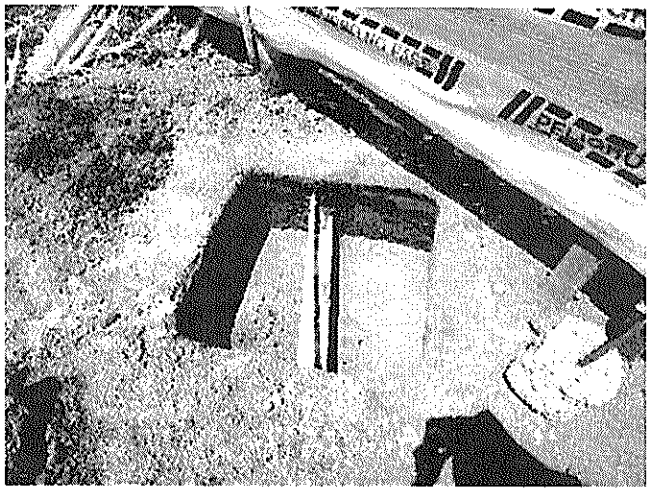

se realiza solado de limpieza en caja de inspección, zapatas y vigas de cimentación en concreto 3000 psi.

3,28 - MURO BLOQUE CONCRETO 10X19X39 CM.

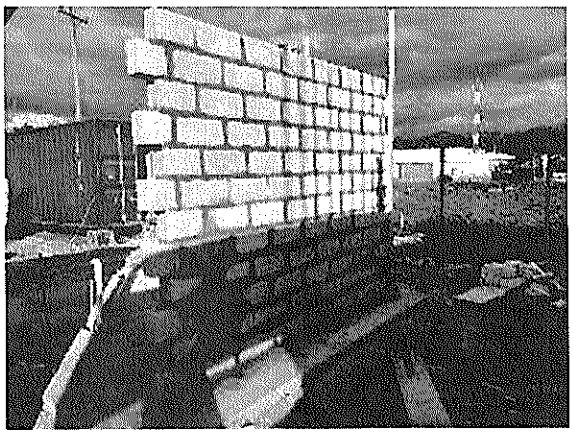


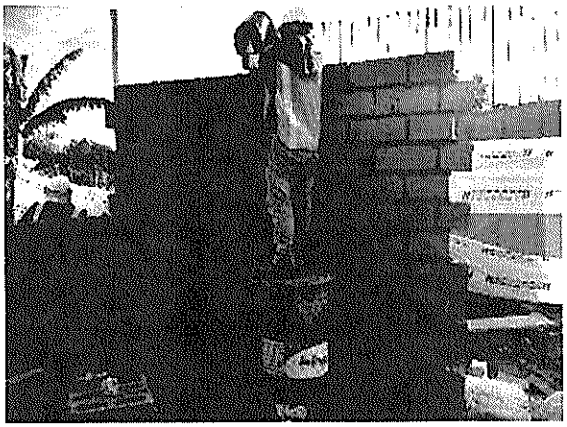






Se realiza construcción de muro en bloque de concreto para el cerramiento de la batería sanitaria.

3,22 - CONTRAPISO REFORZADO ESPESOR 10 CM.

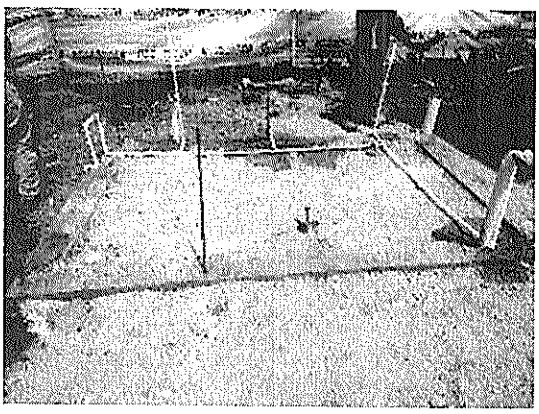


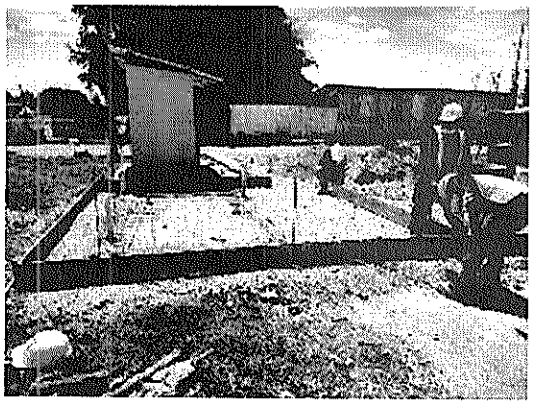


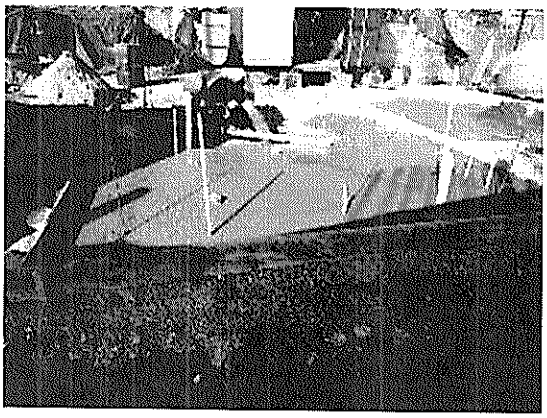

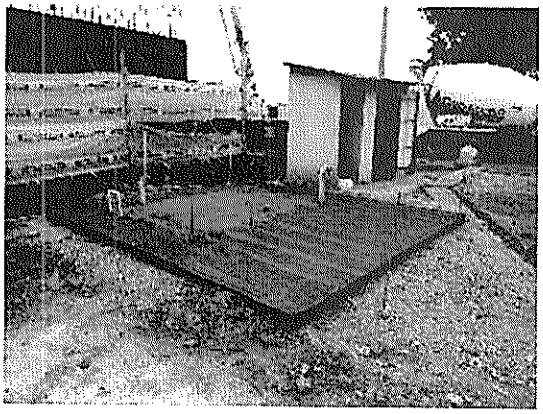





Se realiza compactación de terreno instalación de tubería hidráulica y sanitaria instalación de formaleta y se procede a realizar fundición de placa en concreto 3000 psi.

4,04 - EXCAVACION TIERRA A MANO.

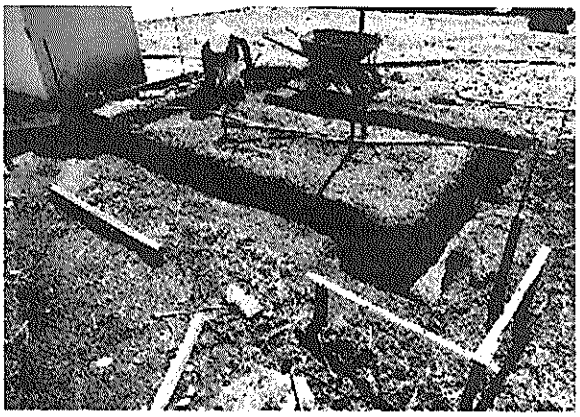
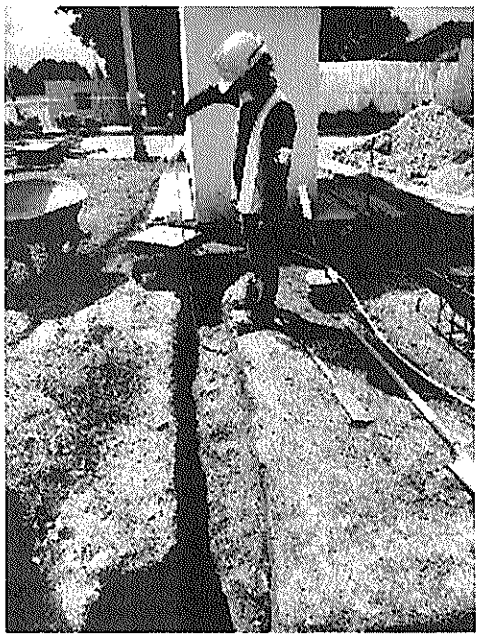

se realiza excavación de terreno natural a mano para zapatas vigas de cimentación, nivelación de terreno y caja de inspección.

4,05- ZAPATA CONCRETO 3000 PSI.




Se realiza fundición de zapatas en concreto de 3000 psi.

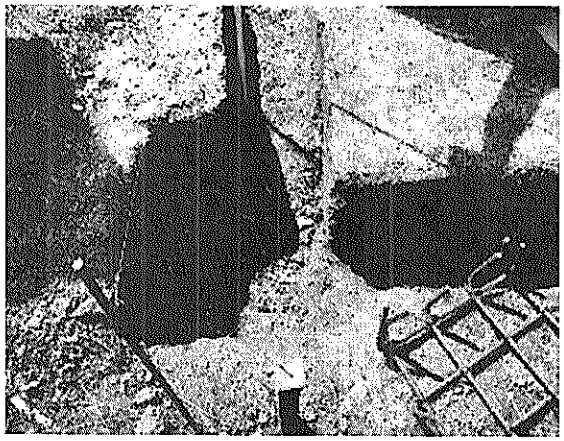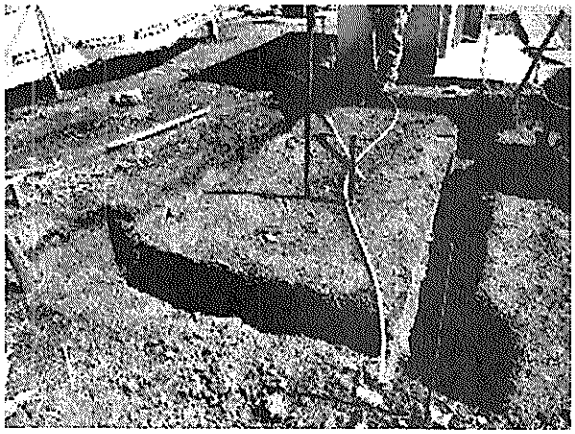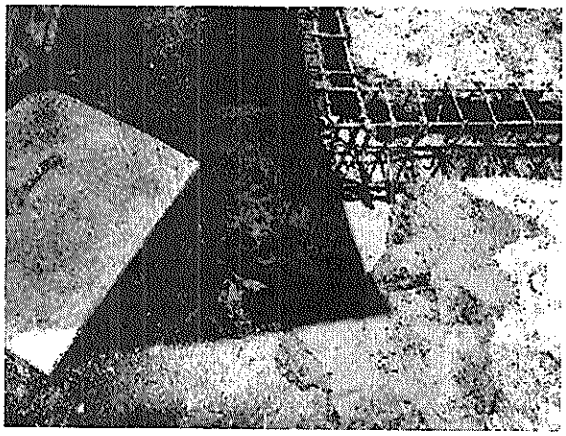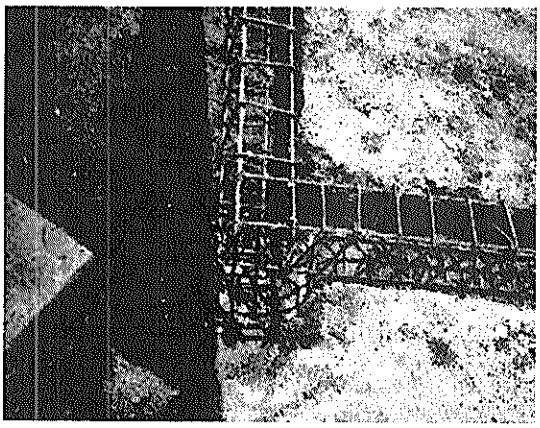4,07- ACERO DE REFUEZO LEJADO 6000 PSI 420 MPA.


Se realiza el corte y figurado de acero de zapatas vigas y dovelas y grafiles para la batería sanitaria.

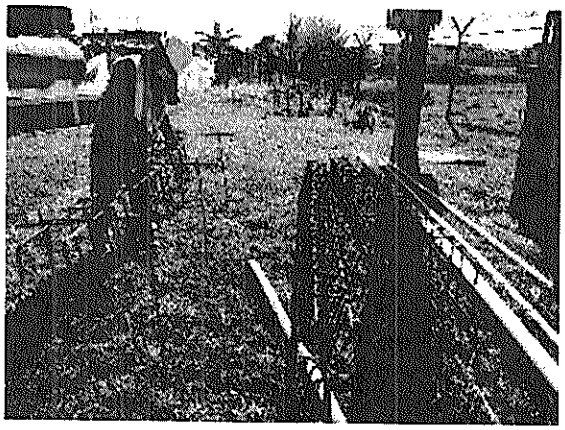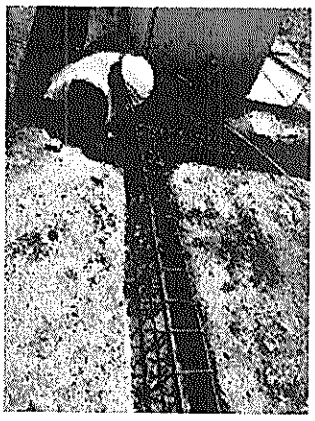
4,08 - DEMOLICION DE ANDEN SARDINEL.




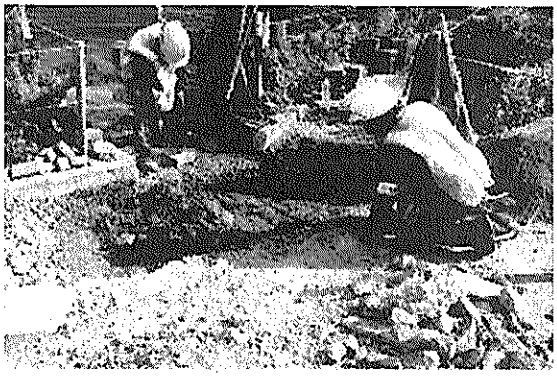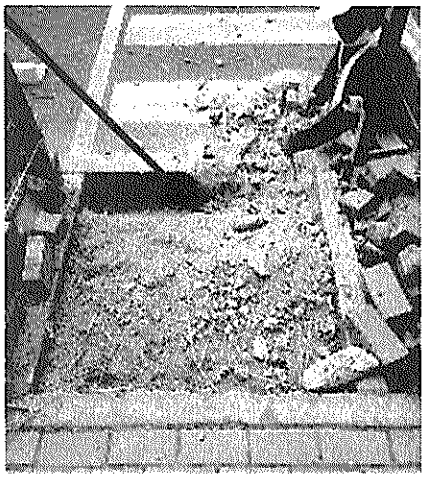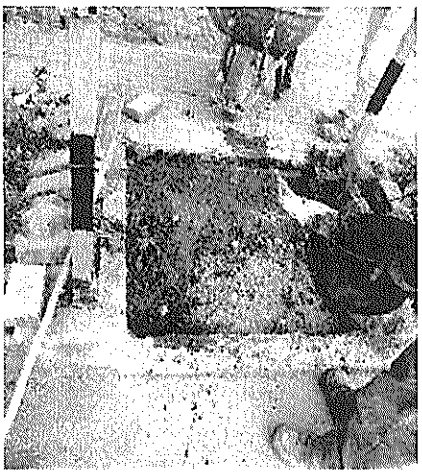


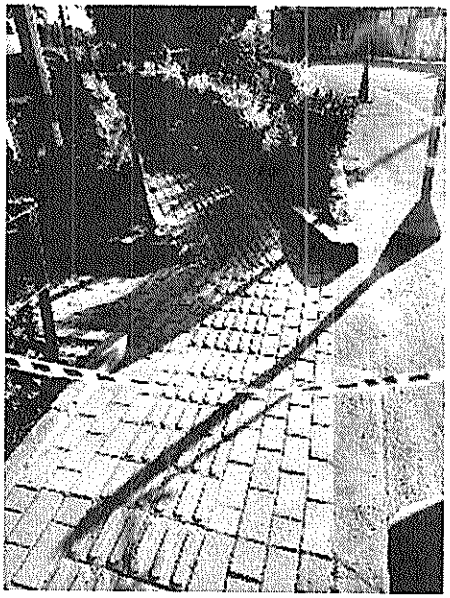
se realiza demolición de sardinel en concreto de andenes de zona del parqueadero.

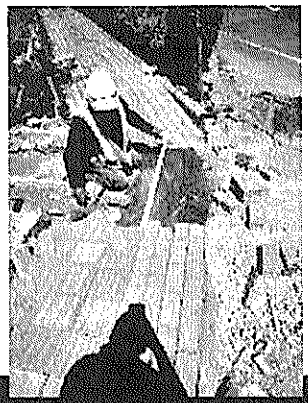4,09 - ANDEN CONCRETO 10 CM 3000 PSI.

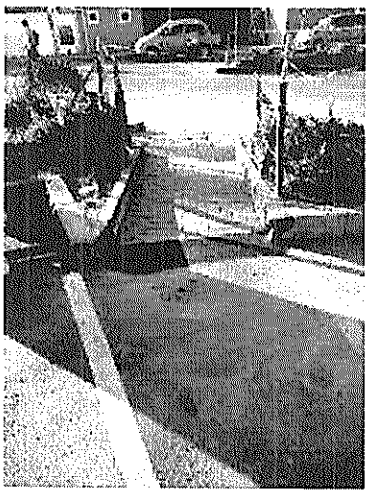

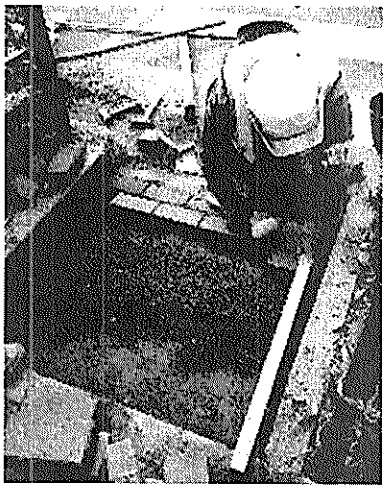



Se realiza nivelación de terreno dejando pendiente para rampa según la normatividad vigente de urbanismo en áreas para PMR, se realiza fundición de concreto y posterior mente se inicia instalación de bloque en adoquín.

NESTOR RAMOS R.
Representante Legal
SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

LUGAR Y FECHA: AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA 30/06/2021 al 13/08/2021.

OBJETIVO GENERAL

Definir las estrategias, alternativas y actividades necesarias para el impacto por la pandemia del Covid-19 que se presenten en las labores administrativas y operativas de la empresa ayudando a minimizar o mitigar la transmisión del virus, teniendo en cuenta también la protección necesaria y adecuada a los colaboradores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Implementar medidas que ayuden a la mitigación del virus.
- Promover todas las medidas preventivas para la no propagación del COVID-19.
- Establecer lineamientos para actuación, frente posibles casos de coronavirus.

A continuación adjunto registro seguimiento protocolo de bioseguridad en el cual encontramos lavado de manos, entrega de elementos de bioseguridad.


SEGEN

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Carrera 79 # 100-59 Torre 12 oficina 202

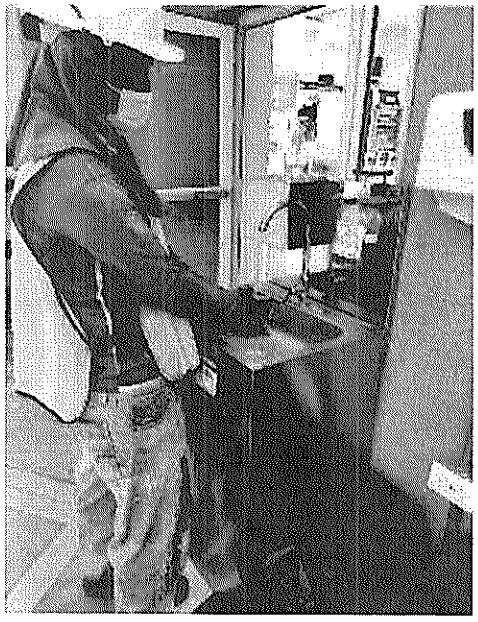





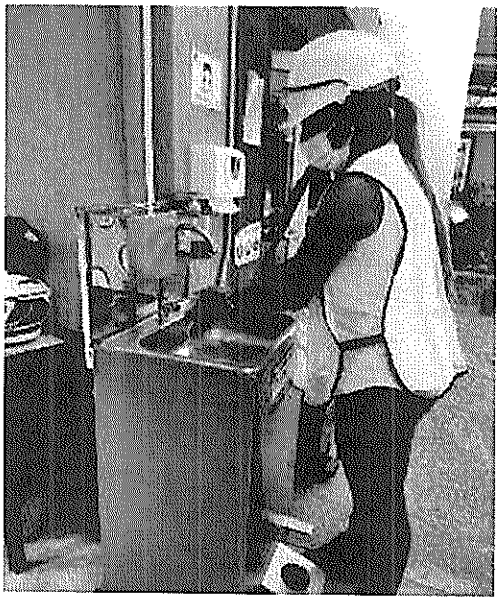





CONTÁCTANOS:
segenconstructor@gmail.com / 3103050205 4-3137046645

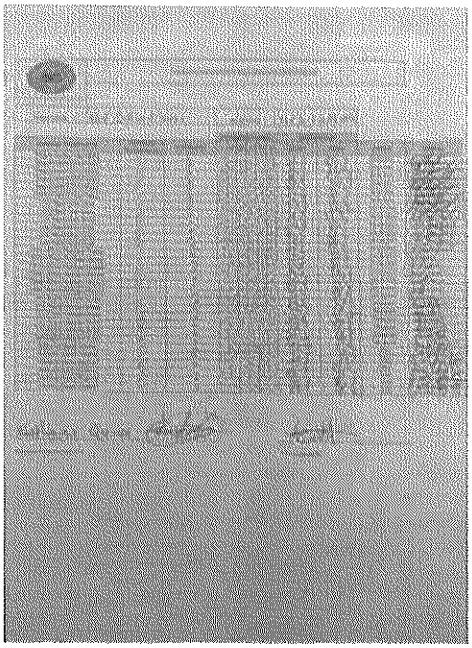

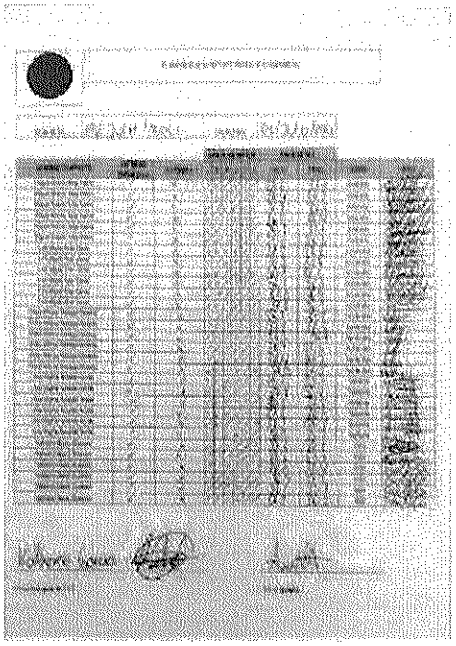

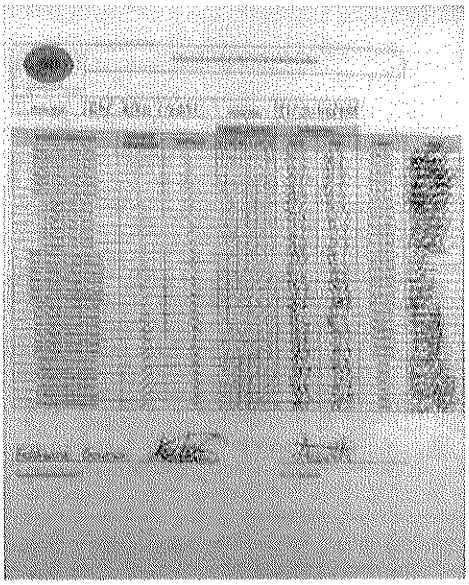

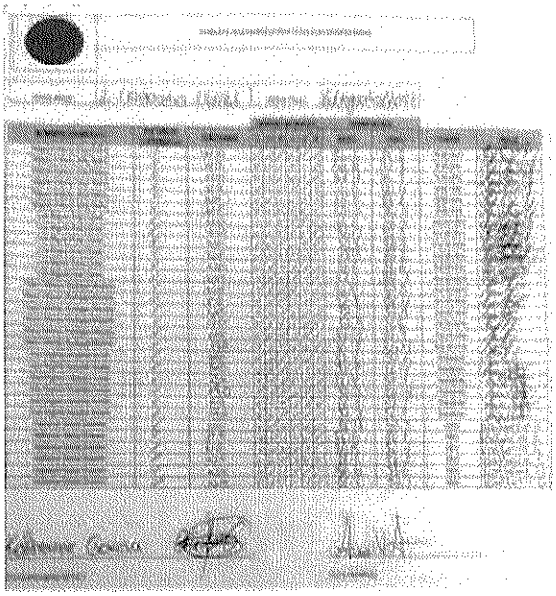


NESTOR RAMOS R.
Representante Legal
SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS


INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS


LUGAR Y FECHA: AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA 30/06/2021 al 13/08/2021.

En las distintas actividades realizadas por nuestros colaboradores se verifica las buenas prácticas para desarrollar la actividad el buen uso de herramientas, uso de elementos de protección personal,

1. **Actividades En Ejecucion**

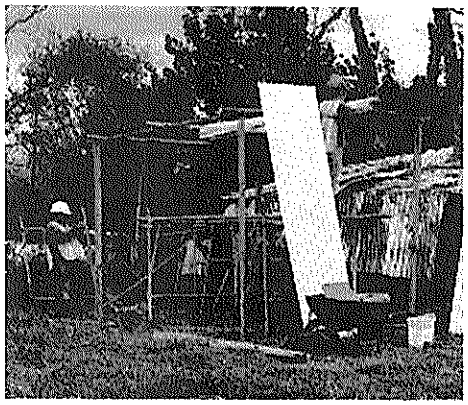

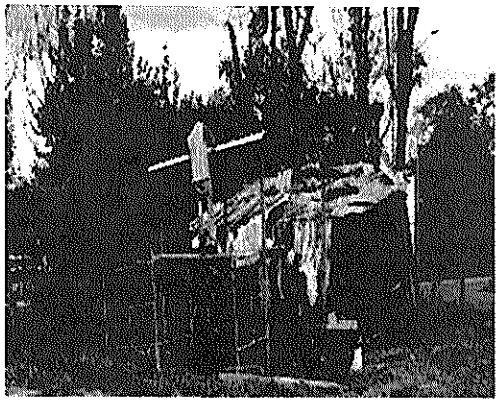

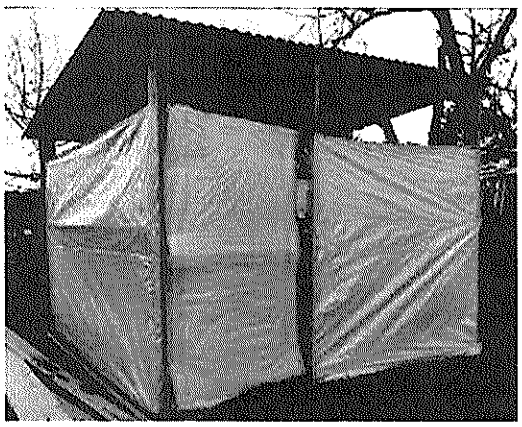






SEGEN

DISEÑO Y CONSTRUCCION


Carrera 79 # 10D-59 Torre 12 oficina 202

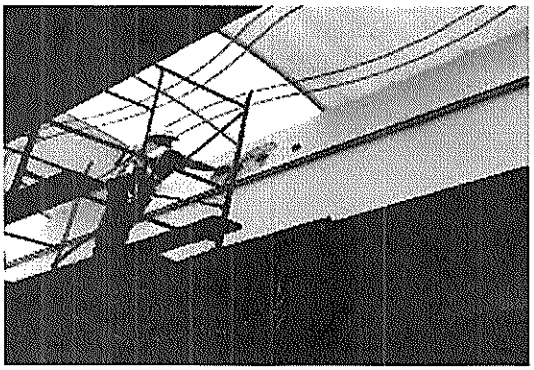


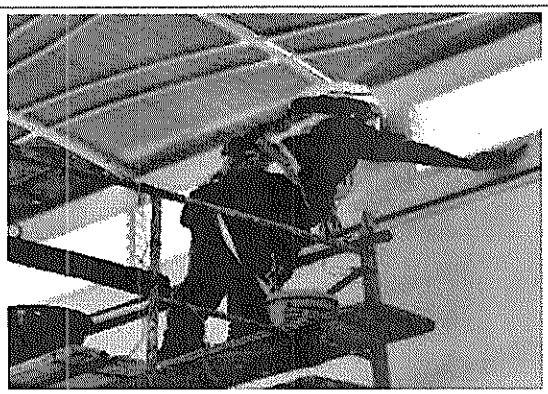

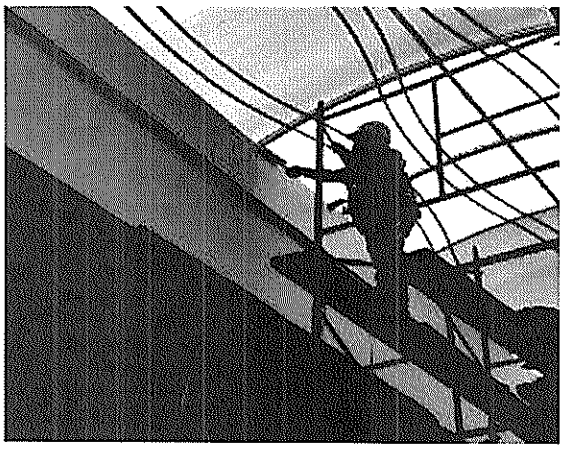



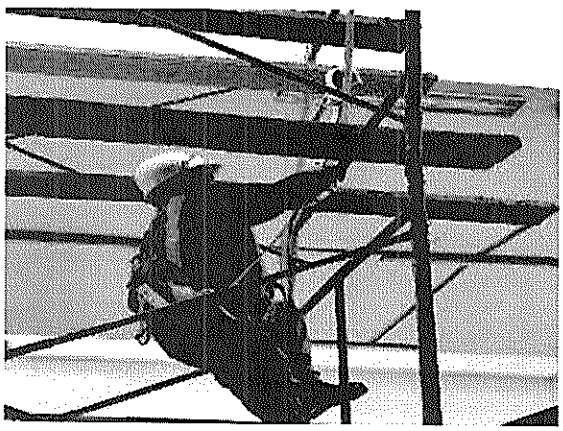


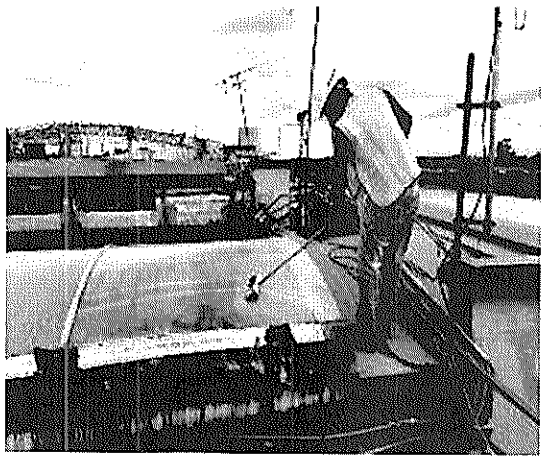



CONTÁCTANOS.
segenconstructor@gmail.com / 31030502054-3137046645

SEGEN

DISEÑO Y CONSTRUCCION

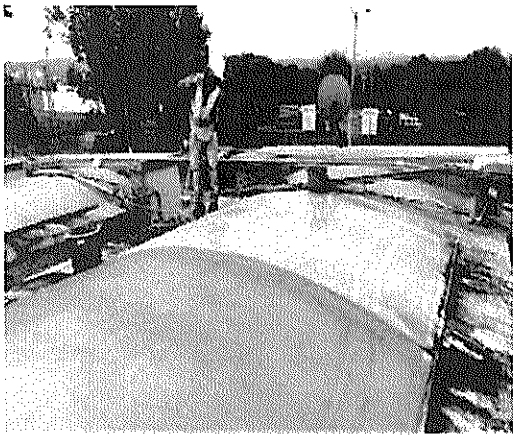

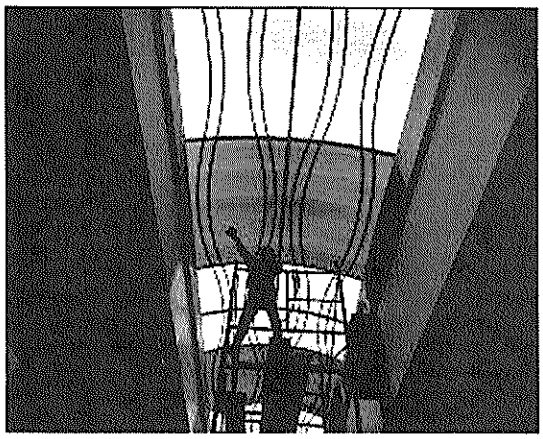

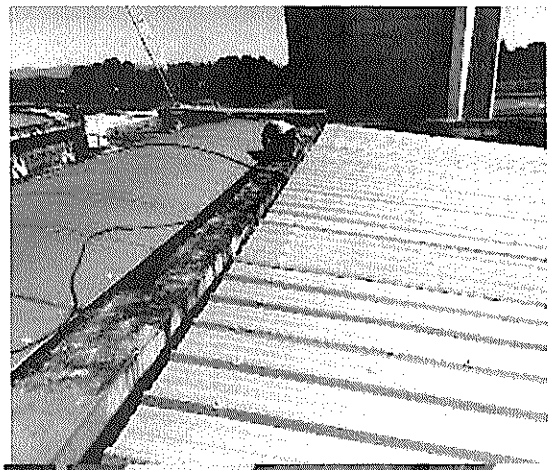









CONTACTANOS
segenconstructor@gmail.com / 31030502054-3137046645


SEGEN

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

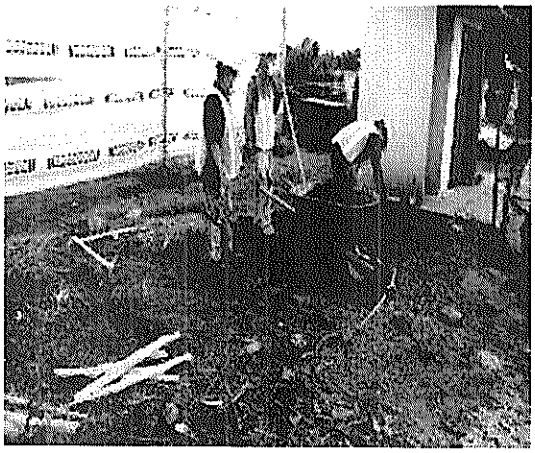



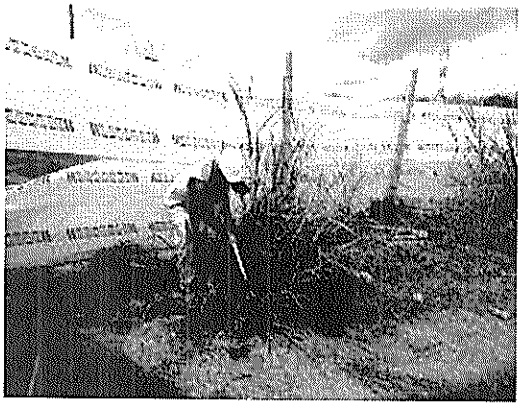

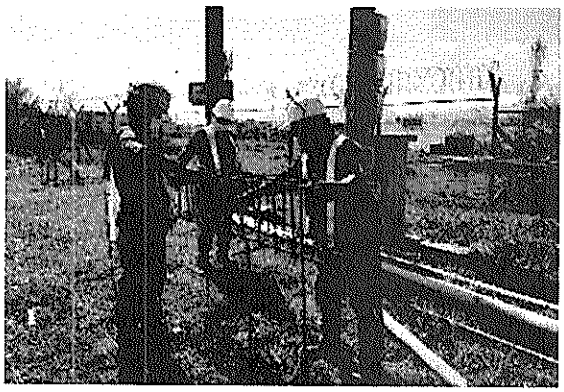







CONTÁCTANOS
segenconstructor@gmail.com / 31030502054-3137046645

SEGEN


DISEÑO Y CONSTRUCCION

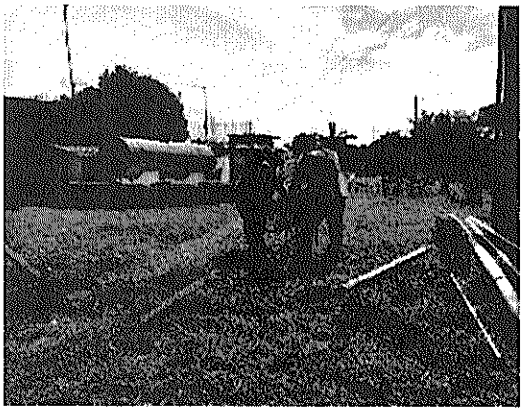

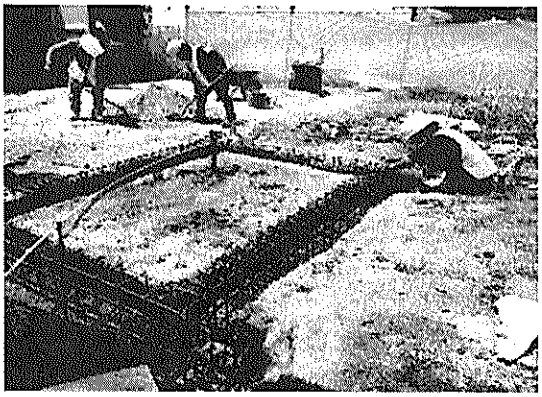





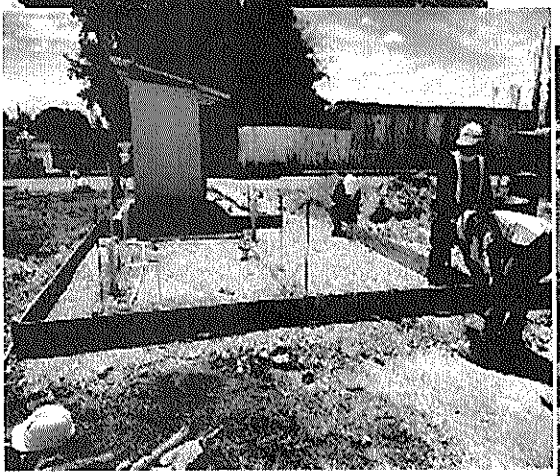




CONTACTANOS
segenconstructor@gmail.com / 31030502054-3137046645


SEGEN


DISEÑO Y CONSTRUCCION

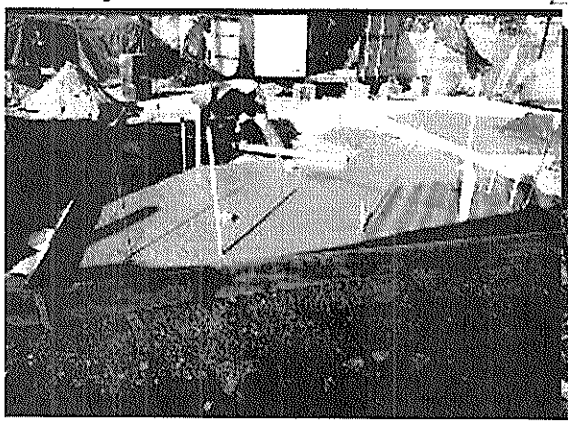





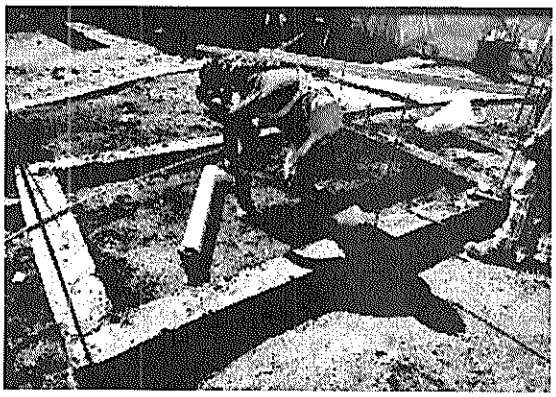

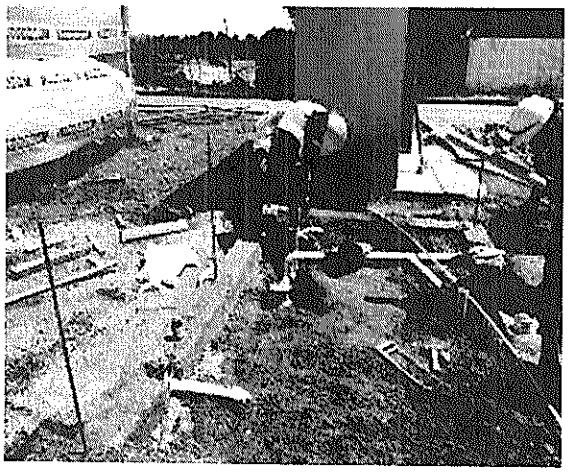





CONTACTANOS
segenconstructor@gmail.com / 31030502054-3137046645


SEGEN


DISEÑO Y CONSTRUCCION

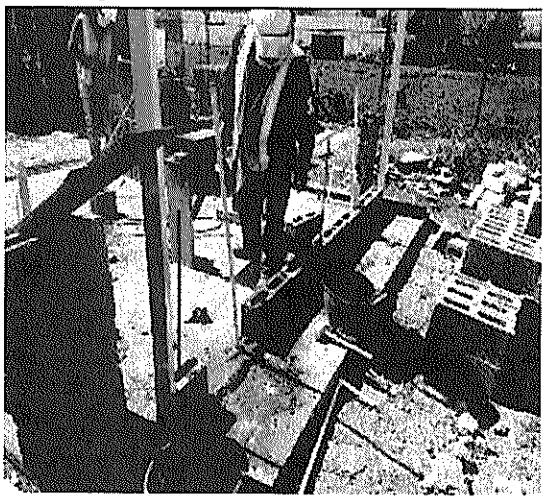




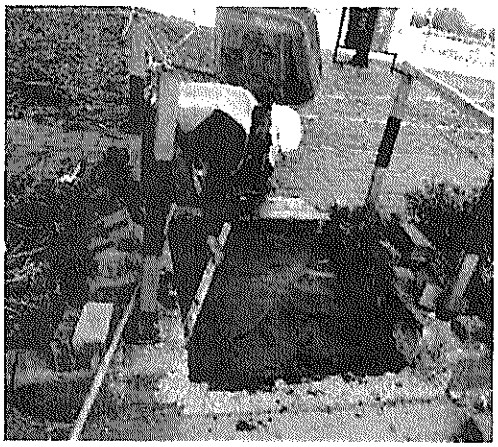


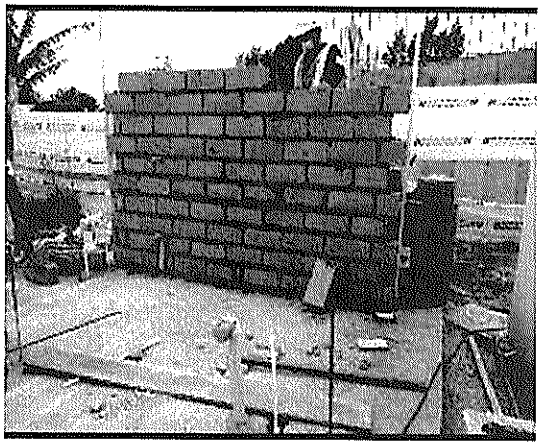

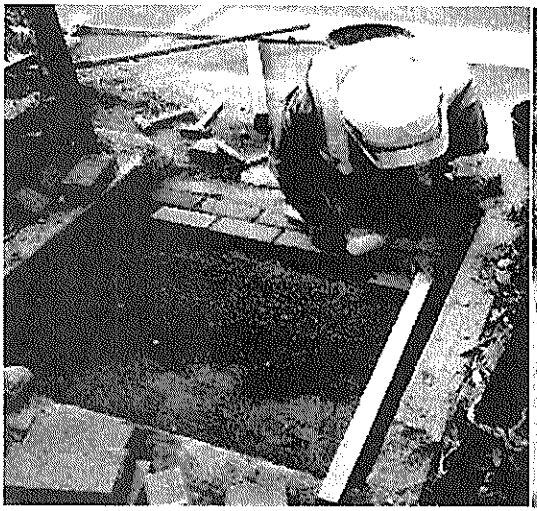

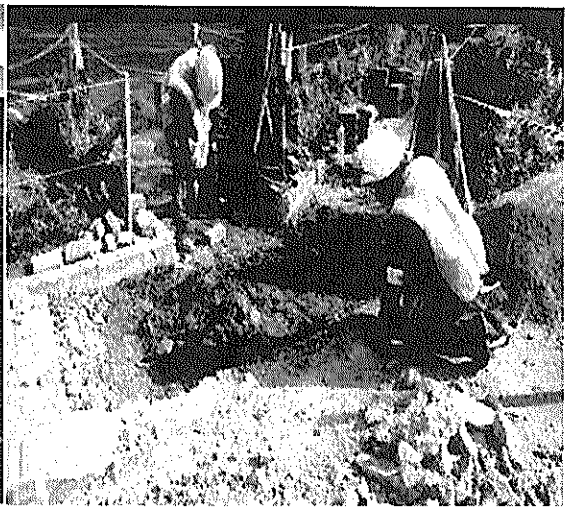

CONTACTANOS
segenconstructor@gmail.com / 31030502054-3137046645

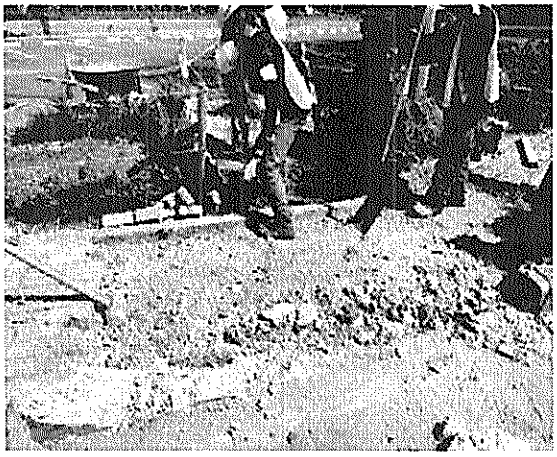

NESTOR RAMOS R.
Representante Legal
SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	

IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No. 21000624- H4 DE 2021.

RVLC0955 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES DEL AEROPUERTO DE POPAYAN.

Nombre del Apoyo a la Supervisión. Juan David Rodriguez Suancha.

Verificación No.1 Fecha **17 de agosto de 2021.**

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.
Apoyo a la Supervisión.

Firma: _____
Apoyo a la Supervisión.

contratacion

SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Direccion: Cra 79 No. 10D 59 Torre 12 Oficina 202
Celular: 310 350 20 54
Email. segenconstructor@gmail.com
Consignar o Transferir a la Cuenta Corriente No. 411059483 Banco Pichincha o a la Cuenta Ahorros No. 411057337 Banco Pichincha

NIT 901166950-3
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764010869345
Fecha 22/02/2021 - 22/02/2022
Autorización de Facturación Electrónica del SEGE-1 al SEGE-50
Actividad Económica 4290 ICA 6.9/1000

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	17	08	2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° SEGE - 6

Cliente:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REG VALLE	**NIT:**	805008407-0	**Fecha de firmado:**	17/08/2021 20:33:52
Dirección:	AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON TERCER PISO	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	4185024
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Agosto 17 del 2021	**Hora emisión:**	15:33:51	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Fecha de pago: 20/08/2021
Total de Lineas: 4

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CO	1,00	Corte de Obra RVLC0955 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES DEL AEROPUERTO DE POPAYAN. CONTRATO No. 21000624-H4 de 2021	WSD	$40.560.399,24	$40.560.399,24
2	A	1,00	Administración ADMINISTRACION	WSD	$8.517.683,84	$8.517.683,84
3	I	1,00	Imprevistos IMPREVISTOS	WSD	$2.433.623,95	$2.433.623,95
4	U	1,00	Utilidad UTILIDAD	WSD	$1.622.415,97	$1.622.415,97

SON: (CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS TRES CENTAVOS)
CUFE: 2673bfdb8209ad25791522495635257d36c9970a8a9821519bd97161aab459325726bdce7d5ad5ed556642cc1ef6f32

NOTAS:
#$24-12-00-500;CONTRATO No. 21000624-H4 de 2021;juand.rodriguez@aerocivil.gov.co#$

SUBTOTAL:	$53.134.123,00
IVA	$308.259,03
TOTAL:	$53.442.382,03

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.622.415,97	19,00%	$308.259,03

Firma Digital:
Hd48NhzepPlO/10jwbB/HSVS5wYKpMSscpYuUhN3SrwxqyUvZzDHP6jO3dFXyKG7lAwjvJklBkLbsDP1r8QKwmEcx85yvWMK5yvPRZXjUQYWD7nzeU2JnVXtnAl3WLBYq8CnwPKcJoExTj6R9XJZtbM4L7+RZe5CAeIqOWJ689ZhJlhEkl/7yRqwBi9+DlbUpTlNGxzRUH+qJ7g7DhEz3v43fjXNo7aSOrA+xuCisPqPjhFlgV2ivIBJCF5km6m2G+f3N/CvCc71W/4T9oXV/c0bMGr3tepy/ByA1WRRSjsQtxG5Q9TyC8Xvvs4zq91pqdvavSoD5m1lG7SPJ2l05w==

AEROCIVIL
Radicado: R 2021075007 Fecha:18/08/2021 15:04:52.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario GRACIELA GOMEZ DIAZ
Asunto 0012 - CUENTAS
Anexos: 0 RECIBIDO

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

Recebido
Gladys
Agosto 20

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2001

En mi condición de Representante Legal, de SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS, identificada con Nit 901.166.950-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2001.

Dada en Bogotá D.C. a los (13) días del mes de agosto de 2021.

FIRMA_____

NESTOR FREDDY RAMOS RODRIGUEZ
Representante Legal
c.c.1.024.484.599

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	901165950-3	SEDEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	U		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
2023	8	2021	52403261		PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14 11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CARRERA 79 Bis 100-59 TV 6 CT 102	BOGOTÁ D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3124734748		segercomputo1@gmail.com	4112	2 937 650	4	2021/09/02	7092917816

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No. AUTOR.	INCAPACIDADES VALOR	LIC. MATERNIDAD No. AUT.	LIC. MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC.	AFP	INTERESES MORA COT.	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC. SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL.
EPS005	830251449-6	23 100	0		0		0	23 100	0	0	0	23 100	0		0	0	23 100	1
EPS037	900156264-2	75 200	0		0		0	75 200	0	0	0	75 200	0		0	0	75 200	2
EPS041	900156264-2	19 400	0		0		0	19 400	0	0	0	19 400	0		0	0	19 400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ. OBLIGAT.	COTIZ VOL. AFILIADO	COTIZ VOL. APORTANT.	FONDO SOLID. PENS.	FAVOR	INTERES MORA COTIZ.	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL.
230201	800229739-0	77 600	0	0	0	0	0	0	77 600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL.
CCF24	860069942-1	117 700	0	0	117 700	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC.	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL.
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	3
SALUD	3
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	8

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No. AUTORIZ.	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESGO	VALOR NETO COTIZACION
14 11	860069780-5	15 600		0	0	15 600

DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ.	SUBTOTAL APORTE COTIZ.	No. RADICACION SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	15 600		0	116	15 600

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	APORTES DE ICBF, SENA Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	470 300	470 300
SALUD	117 700	117 700
RIESGOS LABORALES	15 600	15 600
CCF	117 700	117 700
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	721 300	721 300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																		VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
ITE	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	INC	LAB	AUS	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC R ESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1049648551	ARIAS CHAVEZ LUIS MIGUEL	EPS041	230201	CCF24	A																484 548	484 548	484 548	484 548	0			77 600	0	0	19 400	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO						NOVEDADES																VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
No.	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJA	IBC RIESGOS	VALOR NOVEDAD	DIAS COTIZADOS	DIAS INCAPACIDAD	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1065878224	RODRIGUEZ MIRANDA VICTOR ALFONSO	EPS037	210101	CCF24	X																	484.548	484.548	484.548	484.548	0			77.600	0	0	19.400	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																						VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
No	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1069878221	RODRIGUEZ MIRANDA VICTOR ALFONSO	EPS037	230301	CCF24	X																		484.548	484.548	484.548	484.548	0			37.050	0	0	19.400	0
3	CC	54322582	AZCANATE ACOSTA ANA VIRGINIA	EPS037	230301	CCF24	X																		1.393.334	1.393.334	1.393.334	1.393.334	0			229.000	0	0	55.600	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO						NOVEDADES															VALOR IBC							LIQUIDACIÓN DE APORTES				
Nº	TIPO	NUM.ID	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD. AFP	COD. CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZADOS	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR. PENSION	APORTE VOLUNT. PENSION	COTIZ SALUD	IBC ADICIONAL
2	CC	1065878221	RODRIGUEZ MIRANDA VICTOR ALFONSO	EPS037	230301	CCF24	X																	484.548	484.548	484.548	484.548	0	77.600	0	0	19.400	0
3	CC	34322992	AZCARATE ACOSTA ANA VIRGINIA	EPS037	230301	CCF24	X																	1.393.334	1.393.334	1.393.334	1.393.334	0	223.000	0	0	55.800	0
4	CC	8767269	ARIAS MIGUEL ANTONIO	EPS004	25-14	CCF24	X																	575.400	575.400	575.400	575.400	0	92.100	0	0	23.100	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 6
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	No. 21000624- H4 DE 2021
Nombre del Contratista:	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.
Periodo informe:	30 de Junio de 2021 al 17 de agosto de 2021.
Nombre de Supervisor:	**MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.**
Nombre del Interventor:	**N/A**
Área perteneciente:	**Infraestructura.**

2. OBJETO DEL CONTRATO

RVLC0955 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES DEL AEROPUERTO DE POPAYAN.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 30 de Junio de 2021 al 17 de agosto de 2021.		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**

a. Presentar previo a la iniciación del contrato la matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad ocupacional para contratistas de la aeronáutica civil, debidamente diligenciada en físico y en medio magnético dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo.	Contratista hace entrega de matriz de cumplimiento de requisitos en salud ocupacional – con aceptación y certificación de la parte del área Salud ocupacional fechada el día 26 de Junio de 2021.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000624- H4 DE 2021
b. Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.	Contratista cumple con los protocolos de Bioseguridad según los aprobado y verificado por el área de salud ocupacional y apoyo a la supervisión.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000624- H4 DE 2021 Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
c. Presentar posterior a la suscripción del acta de inicio, el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA de manera detallado, que deberá ser aprobado por el SUPERVISOR, así, como el personal que desarrollará las actividades contratadas.	Contratista hace entrega de cronograma de ejecución en obra el cual es aprobado – con aceptación por parte del supervisor.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000624- H4 DE 2021
d. Adquirir y presentar las GARANTÍAS exigidas por la entidad en el pliego de condiciones.	Certificado de aprobación de Pólizas y garantías actualizadas según acta de inicio.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000624- H4 DE 2021.
e. Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-06 Menor Cuantía	Ejecuta cada ítems según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000624- H4 DE 2021 Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
f. Ejecutar las obras descritas en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-25 Menor Cuantía y las modificaciones que puedan resultar durante la ejecución.	Ejecuta cada ítems según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas y lo descrito en el formulario de presupuesto oficial.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000624- H4 DE 2021 Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. Formato de Excel Acta de Cobro Parcial No.1.
g. Cumplir con los plazos establecidos en el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.	Ejecuta cada ítems según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas y lo descrito en el formulario de presupuesto oficial, se realiza seguimiento mediante el cronograma de actividades y	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. Formato de Excel Acta de Cobro Parcial No.1. Tabla de comparativo de avance y seguimiento a obra.

	se verifica con el flujo de inversión del mismo.	
h. Establecer sitios de acopio de sobrantes, cumpliendo las especificaciones de autoridad ambiental y/o la persona encargada, de tal manera que no interfieran con las actividades que se desarrollan en el sitio de ejecución de la obra, haciéndose la remoción periódica para evitar acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar la obra deberá hacerse en cada una de las áreas intervenidas una limpieza general a total satisfacción del SUPERVISOR.	Contratista realiza acopio de material sobrante de obra (escombros), es retirado por medio de volqueta y dispuesto en botadero.	Evidencia de registro fotográfico.
i. Todos los trabajadores a utilizar por parte del CONTRATISTA en el desarrollo de la obra son responsabilidad de este en su vinculación o remoción al igual que las obligaciones como contratante de los mismos. La AERONAUTICA CIVIL no adquiere compromisos ni obligaciones con persona alguna, empleados u obreros del CONTRATISTA por cualquier concepto, debido a los trabajos contratados. Sin embargo, la AERONAUTICA CIVIL se reserva el derecho de solicitar el retiro de cualquier trabajador previa justificación de la decisión	Cada uno de los trabajadores y profesionales por parte del contratista son responsabilidad netamente del contratista. La aeronáutica no tiene responsabilidad alguna con las personas y/o trabajadores contratados por el contratista.	Planillas de aportes al sistema de seguridad social.
j. Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y diligenciar previo al inicio de la ejecución del presente contrato el documento incluido en el mismo denominado "requisitos de seguridad y salud ocupacional a cumplir durante la ejecución del contrato" y atender las recomendaciones emitidas por el Supervisor en este sentido, que	Se evidencia la implementación y aplicación de la matriz de riesgos laborares en las diferentes áreas de trabajo guiados y supervisados por una profesional en el área.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.

podrán implicar la suspensión de la actividad.		
k. Cumplir con las normas de seguridad aeroportuaria.	Contratista y su personal cumplen de manera exigente la normatividad para la seguridad aeroportuaria.	
l. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos.	Contratista asume la responsabilidad que tiene a su cargo.	
m. En la eventualidad de que las actividades a ejecutar requieran trabajos en altura, el CONTRATISTA deberá garantizar que el personal encargado de tales trabajos, cuente con la certificación vigente, emitida por la autoridad competente al igual que los equipos adecuados para realizar dicha labor.	Contratista posee en obra personal idóneo en seguridad ocupacional y salud en el trabajo el cual es dispuesto para hacer seguimiento en esas áreas en cada una de las actividades que se ejecutan con su previa autorización y verificación.	Cumplimiento matriz de riesgos, registro fotográfico.
n. Reparar a su costa todos los daños causados a los trabajos, equipamiento o edificaciones adyacentes que le sean imputables.	A la fecha no se han reportado daños en ninguna área de trabajo ocasionadas por el contratista.	N/A
o. Presentar para aprobación de la entidad, el cronograma para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.	El plan de calidad se aprobara una vez se realice el acta de recibo final con su previa aprobación de la parte de supervisión con el fin de establecer las fechas exactas.	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato y alcance del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
13. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
19. Las demás inherentes a la ejecución del contrato.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

N/A

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista ejecuta las actividades normalmente bajo el seguimiento y supervisión en campo por parte del ingeniero residente en obra, la profesional en salud ocupacional haciendo seguimiento a la aplicación de la matriz de riesgos y protocolo de bioseguridad.

Las actividades previstas se han ejecutado bajo la verificación y aprobación de la supervisión.
El clima en obra en el junio, julio y agosto ha permitido una ejecución al 100% pero se ha adelantado trabajos en horas extras con el fin de dar cumplimiento.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No Aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

N/A

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	x	
2		

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

46.23%

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ACTAS PARCIALES OBRA							
	VALOR ACTAS	VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES	% EJECUCION	TOTAL A PAGAR	ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	PERIDO DE FACTURACION

ACTA COBRO PARCIAL No.1	$53.442.382,03	$53.442.382,03	46.23 %	$53.442.382,03	$53.442.382,03	$ 62.156.098,74	30 de junio 2021. 13 de agosto de 2021
ACTA COBRO FINAL							

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

46.23%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.
Cc. 16.889.912 de Florida (V).
SUPERVISOR

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Cc. 74.451.949 de Nobsa (Boy).
Apoyo a la supervisión.

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.
