USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 14 DEL DÍA 21 MES 09 AÑO 2020 AL DÍA 27 MES 09 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.:

140 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	3,94%	34,94%
Valor del PAC Programado ($)	$ 509.362.076,91	$ 4.522.204.939,31

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	3,94%	34,94%
Valor del PAC Programado ($)	$ 509.362.076,91	$ 4.522.204.939,31

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
EPMSC ERE CALI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
COLISEO					
Actividades Programadas (%)	3,42%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,71%	92,56%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.121.897	$ 383.681.211,0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.560.949	$ 355.135.329
RM POPAYÀN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA EXTERIOR					$ 151.265.916
Actividades Programadas (%)	19,85%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	8,33%	79,86%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 36.219.451	$ 182.465.746	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 15.199.397	$ 145.717.145
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	100,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	75,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.398.361	$ 7.398.361	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 5.548.771

EPAMS CAS ERE POPAYÁN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PATIO No 8					$ 270.622.676,2
Actividades Programadas (%)	12,19%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	6,67%	76,11%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.077.732	$ 99.079.018	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.608.571	$ 75.409.041
CELDAS PRIMARIAS					
Actividades Programadas (%)	4,15%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	6,77%	73,99%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.949.271	$ 263.837.864	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 17.861.823,4	$ 195.213.635,6

EPMSC PUERTO TEJADA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BAÑO RANCHO					
Actividades Programadas (%)	15,38%	29,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	5,29%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.151.885	$ 8.009.520	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 1.428.054
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA					
Actividades Programadas (%)	5,72%	45,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,72%	48,72%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 931.990	$ 7.332.093	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 606.120	$ 7.938.212

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS					
Actividades Programadas (%)	6,67%	18,34%	Actividades Ejecutadas (%)	3,34%	11,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.384.548	$ 6.556.615	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.192.274	$ 4.182.791

EPMSC - RM PASTO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CAPILLA					
Actividades Programadas (%)	7,14%	41,76%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	42,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.137.398	$ 30.035.710	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 30.423.673
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	6,96%	42,99%	Actividades Ejecutadas (%)	1,10%	35,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 25.426.332	$ 157.050.854	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.018.807	$ 129.332.523
CELDA 1 - RM					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,50%	51,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 18.522.541	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 277.838	$ 9.261.271
CELDA 2 - RM					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	51,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 13.274.841	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 132.748	$ 6.637.421
PATIO 2					
Actividades Programadas (%)	10,00%	27,42%	Actividades Ejecutadas (%)	1,80%	29,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.480.748	$ 15.030.536	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 986.535	$ 15.948.976
CELDAS					
Actividades Programadas (%)	10,00%	27,42%	Actividades Ejecutadas (%)	1,80%	1,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.971.732	$ 9.529.152	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 984.403	$ 984.403

SANIDAD HOMBRES

Actividades Programadas (%)	7,69%	19,36%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.585.539	$ 31.673.608	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

PATIOS

Actividades Programadas (%)	4,54%	12,89%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.020.544	$ 48.279.143	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO

EDUCATIVAS

Actividades Programadas (%)	11,11%	75,94%	Actividades Ejecutadas (%)	0,80%	39,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 26.316.027	$ 179.863.623	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.894.754	$ 93.079.787

PATIO CENTRAL

Actividades Programadas (%)	50,81%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	88,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 26.741.888	$ 52.630.061	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 46.735.494

PATIOS

Actividades Programadas (%)	7,69%	56,91%	Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	37,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.246.827	$ 61.014.023	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.680.219	$ 40.310.489

EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO

BODEGA

Actividades Programadas (%)	9,09%	58,18%	Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	21,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.160.281	$ 109.817.235	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.719.077	$ 40.395.301

CELDAS (HOMBRES)

Actividades Programadas (%)	6,25%	23,24%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.156.923	$ 26.616.268	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

TALLER - RM

Actividades Programadas (%)	6,25%	23,24%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	5,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.843.930	$ 21.733.307	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 467.514	$ 4.675.144

GUARDIAS

Actividades Programadas (%)	6,25%	23,24%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.141.137	$ 22.838.607	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC IPIALES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO

TALLERES

Actividades Programadas (%)	6,67%	22,49%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	1,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.137.798	$ 44.311.257	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.970.670	$ 3.350.138

AULAS

Actividades Programadas (%)	6,67%	22,49%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.978.820	$ 26.911.019	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

PRIMARIAS

Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	4,00%	5,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.795.966	$ 4.744.957

EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO					
Actividades Programadas (%)	10,00%	76,5900%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	73,59%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.664.016	$ 119.970.699	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 115.271.493,7
PABELLON 6					
Actividades Programadas (%)	33,33%	58,33%	Actividades Ejecutadas (%)	40,00%	65,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.475.092	$ 2.581.522	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.770.288,0	$ 2.876.718,0

EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7					
Actividades Programadas (%)	6,90%	60,4000%	Actividades Ejecutadas (%)	4,00%	33,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.975.623	$ 122.337.333	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.101.810,2	$ 66.839.933,8
PABELLON No 4					
Actividades Programadas (%)	18,18%	79,40%	Actividades Ejecutadas (%)	15,00%	87,03%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.637.327	$ 55.192.728	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 10.426.837,8	$ 60.496.512,9

EPMSC BUENAVENTURA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	10,00%	40,8400%	Actividades Ejecutadas (%)	7,00%	20,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.325.747	$ 54.422.349	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 9.328.022,6	$ 26.651.493,2

COJAM JAMUNDI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PATIO 3					
Actividades Programadas (%)	4,55%	17,06%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	1,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.552.452	$ 88.308.753	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.176.363,0	$ 5.176.363,0

EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA					
Actividades Programadas (%)	41,90%	86,9000%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	60,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.411.702	$ 13.297.778	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.060.478,2	$ 9.181.434,6
AULA EDUCATIVA					
Actividades Programadas (%)	33,33%	78,3%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	60,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.821.397	$ 6.630.663	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.693.007,4	$ 5.079.022,2

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	8	5	45
RM POPAYAN	0	0	8	8	8	5	29
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUMACO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUQUERRES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC IPIALES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC LA UNIÓN	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC EL BORDO	0	0	0	0	0	0	0
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SEVILLA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CAICEDONIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC PUERTO TEJADA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CARTAGO	0	0	0	0	0	0	0

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
CELDAS PRIMARIAS	4,15%	6,77%	100,00%	73,99%	26,01%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias), de acuerdo con programación en revisión.
PABELLON No 8	12,19%	6,67%	100,00%	76,11%	23,89%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención zonas de aislamiento (Pabellon No 8), de acuerdo con programación en revisión.
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA	19,85%	8,33%	100,00%	79,86%	20,14%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 4 (Bodega antigua),de acuerdo con programación en revisión.
SANIDAD	100,00%	0,00%	100,00%	75,00%	25,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Sanidad),de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	7,14%	0,00%	41,76%	42,30%	-0,54%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Capilla),de acuerdo con programación en revisión.
TALLERES	6,96%	1,10%	42,99%	35,40%	7,59%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Talleres),de acuerdo con programación en revisión.
CELDA 1 - RM	0,00%	1,50%	100,00%	51,50%	48,50%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Celdas - RM),de acuerdo con programación en revisión.
CELDA 2 - RM	0,00%	1,00%	100,00%	51,00%	49,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Celdas - RM),de acuerdo con programación en revisión.
PATIO 2	10,00%	1,80%	27,42%	29,10%	-1,68%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance en Patio 2 (novedad) , de acuerdo con programación en revisión.
CELDAS	10,00%	1,80%	27,42%	1,80%	25,62%	Porcentaje correspondiente especificamente para celdas (motin), de acuerdo con programación en revisión.
SANIDAD HOMBRES	7,69%	0,00%	19,36%	0,00%	19,36%	Porcentaje correspondiente especificamente para sanidad hombres, de acuerdo con programación en revisión.
PATIOS	4,54%	0,00%	12,89%	0,00%	12,89%	Porcentaje correspondiente especificamente para patios, de acuerdo con programación en revisión.

EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	11,11%	0,80%	75,94%	39,30%	36,64%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Educativas), de acuerdo con programación en revisión.
PATIO CENTRAL	50,81%	0,00%	100,00%	88,80%	11,20%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance reportado por desmanes y mantenimeinto en Patio Central, de acuerdo con programación en revisión.
PATIOS	7,69%	2,50%	56,91%	37,60%	19,3%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance reportado por mantenimeinto en Patios, de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC TUQUERRES						
BODEGA	9,09%	2,50%	58,18%	21,40%	36,78%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Bodega), de acuerdo con programación en revisión.
CELDAS (HOMBRES)	6,25%	0,00%	23,24%	0,00%	23,24%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Celdas patio 3), de acuerdo con programación en revisión.
TALLER - RM	6,25%	0,50%	23,24%	5,00%	18,24%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Talleres - RM), de acuerdo con programación en revisión.
GUARDIAS	6,25%	0,00%	23,24%	0,00%	23,24%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Alojuamiento guardias), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC IPIALES						
TALLERES	6,67%	1,00%	22,49%	1,70%	20,79%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Talleres), de acuerdo con programación en revisión.
AULAS	6,67%	0,00%	22,49%	0,00%	22,49%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Aulass), de acuerdo con programación en revisión.
PRIMARIAS	0,00%	4,00%	0,00%	5,00%	-5,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Celdas Primarias), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC LA UNIÓN						
EPMSC LA UNIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	
COJAM JAMUNDÍ						
PATIO 3	5%	1%	17%	1%	16%	Porcentaje se refiere al inicio de las adecuaciones hidrosanitarias de fachadas en las UTE y CELDAS CONYUGALES
EPMSC BUENAVENTURA						
EPMSC BUENAVENTURA	10%	7%	41%	20%	21%	Corresponde al enchape de muros de zona covid que se aprueba debido a las condiciones agresivas de humedad.
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	3,42%	1,71%	100,00%	92,56%	7,44%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Coliseo), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AULAS	7%	3%	18%	12%	7%	
EPMSC EL BORDO						
EPMSC EL BORDO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	6,90%	4,00%	60,40%	33,00%	27,4%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (PABELLON 7), de acuerdo con programación en revisión.
PABELLON No 4	18,18%	15,00%	79,40%	87,03%	-7,63%	Corresponde a la instlacion de cubierta en teja termoacustica con las obras complementarias adicionales, correas, canales y flanches
EPMSC BOLÍVAR						
EPMSC BOLÍVAR	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SEVILLA						
EPMSC SEVILLA	0%	0%	0%	0%	0%	

EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	42%	20%	87%	60%	27%	Porcentaje corresponde al inicio de actividades en este espacio, en cuanto a retiro de pintura, estuco y pañete afectados por humedades
AULA EDUCATIVA	33%	20%	78%	60%	18%	Inicio de actividades que comprenden el retiro de pintura, estuco y pañete en muros afectados por
EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	15,38%	0,00%	29,67%	5,29%	24%	
EPMSC BUGA						
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	
CPMS TULUÁ						
RANCHO ANTIGUO	10,00%	0,00%	76,59%	73,59%	3,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Rancho Antiguo), de acuerdo con programación en revisión.
PABELLON No. 6	33,33%	40,00%	58,33%	65,00%	-6,67%	Porcentaje referido a las adecuaciones hidrosanitarias realizadas en algunos baños del patio 6.
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SILVIA						
EPMSC SILVIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CARTAGO						
EPMSC CARTAGO	0%	0%	0%	0%	0%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:

* Pulimineto de juntas y arreglo de piso, para aplicación de epoxico, teniendo en cuenta el uso del área y el mantenimiento requerido basados en las condiciones existentes.
* Instalación de malla en cubierta y zona lateral del coliseo.
*Rampa de acceso a tarima.
* Instalación de iluminarias (reflectores).
* Baño para personal de la salud.






CPMS TULUÁ:

RANCHO ANTIGUO.

- Se espera llegada de puertas de acceso y salida de espacio


PABELLON No. 6

- Regatas en piso y muros para instalacion de tuberia hidrosanitaria en area de duchas y baños
- Reposicion de piso afectado por demoliciones.
- Afinado de piso para enchape en duchas y baños.
- Enchape de piso en duchas.







EPMSC - RM PASTO:
TALLERES * Se finalizo con la fundición de pisos
*Se continua con la instalación del pañete y con el mantenimiento de la estructura de cubierta.
*se inicia con la instalación de enchape en baños y con las tejas de cubierta.
RECLUSORIO MUJERES *Se inicio con la instalación del enchape
CELDAS *En las celdas de patio 2 se continua con el hidrolavado.
PATIO 2 *En patio 2 se continua con la construcción de los canales para el desalojo de agua en la cancha.

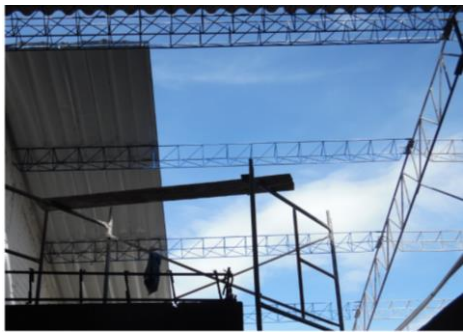




EPMSC TUMACO:
AULAS * Se continúa estucando y pintando los muros.
* Se continúa instalando la maya y el cielo raso en PVC.
* Se continua con la instalación de lámparas. En los patios
PATIOS *Se continúa con el alistado y pintura de los muros a intervenir.
MURO EXTERIOR *Se continua la instalación de los soportes para las concertinas en el muro perimetral.

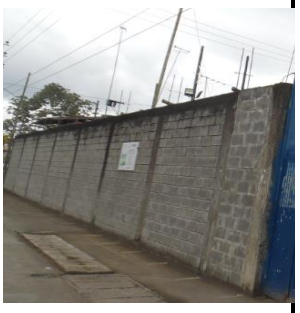

EPMSC TUQUERRES:
BODEGA * Se continua con la construcción de los muros de mampostería e instalación de pañete.
RECLUSORIO MUJERES *Se continua con las demoliciones de piso y se inicia con el flejado de las vigas de cimentación.





EPMSC IPIALES:
CELDA PRIMARIAS *Se continua con la demolición de enchape, muros y pisos.
TALLERES *Se continua con la demolición de muros de mampostería y piso.






EPAMS CAS ERE POPAYÁN:
PRIMARIAS
• Fundición de piso.
Lijado y aplicación de anticorrosivo en reja de patio.

• Limpieza de muros externos de celdas.

CELDAS

•


PABELLÓN 8





RM POPAYAN: Instalación de aparatos electricos, canal en lamina, bajante.






EPMSC PUERTO TEJADA
de Rancho: Demolición de enchape, baño, enchape y puntos hidraulicos.

* Baño







EPMSC SANTANDER QUILICHAO
Demolición de piso, retiro de escombros. * Demolición de enchape de baños aulas.

*Aulas:








EPAMS CAS JP PALMIRA:

- **PATIO 4:** Instalacion de teja termoacustica trapezoidal
- **PATIO 4**: Instalacion caballete de cubierta
- **PATIO 4:** Afinado e impermeabilizacion de losa de concreto
- **PATIO 7:** Instalacion de cableado de celdas internas.
- **PATIO 7:** Retiro cubierta en nave 1 de patio 7
- **PATIO 7:** Mantenimiento de cubierta metalica
- **PATIO 7:** Retiro de espuma de cielo de celdas.




EPAMS BUENAVENTURA:

- **AULAS EDUCATIVAS:** Retiro de enchape existente en muros de aulas educativas existentes por desgaste y perdida de adherencia por humedad
- **AULAS EDUCATIVAS:** Pañete en mortero impermeabilizado sobre muros de aulas educativas por accion agresiva de humedad
- **AULAS EDUCATIVAS:** Enchape sobre muros en aulas educativas.







COJAM JAMUNDI:

PATIO 3:


- Cambio de tuberia sanitaria en fachadas de UTE y Celdas Conyugales de patio 3
- Cambio de tuberia hidraulica en fachadas de UTE






EPMSC CAICEDONIA:

- **BIBLIOTECA:** Pañete impermeabilizado en muros
- **BIBLIOTECA:** Pintura de muros perimetrales
- **BIBLIOTECA:** Demolicion de muro en mamposteria para comunicacion con baño proyectado
- **AULA EDUCATIVA:** Resane en muros afectados por humedad
- **AULA EDUCATIVA:** Demolicion de muro en mamposteria para ampliacion de baterias sanitarias
- **AULA EDUCATIVA:** Vigueta de cimentacion y mamposteria para cerramiento de baños

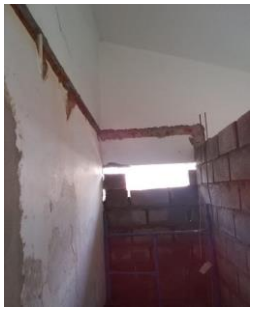


COJAM JAMUNDI: Se detecto una fuga en la red de la tuberia hidraulica del casino por lo que se autorizo la intervencion de este espacio para reparar los daños, y dado que este espacio no se tenia contemplado en presupuesto no tiene porcentajes de avance y contratista se encuentra en la terminacion de cuantificacion de actividades y valoracion de las mismas para anexar en presupuesto.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se realizo pocas actividades ya que se tenia poco personal, se realizaron actividades en celdas primarias, en pabellon 8 no se estan realizando actividades.

RM POPAYAN: Solo se esta realizando instalación de aparatos electricos. Falta ventaneria.

EPAMS CAS JP PALMIRA:
Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecucion de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas electricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente electrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revision y presentacion de solucion para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relacion al desarrollo de la atencion de la demanda, se solicito a contratista la intervencion para instalar una ventana en el area bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellon 4.

CPMS TULUÁ:
Se presento una novedad con relacion a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que deberia instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, tambien se debe instalar una solapa metalica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el EPMSC - RM PASTO: Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista ya presento el presupuesto y debido balance sin embargo la entidad contratante no ha emitido un concepto.

En el EPMSC - RM PASTO: En el patio 2 se presenta un inconveniente con un nacimiento de agua en cual no se ha podido descubrir la procedencia pese a las excavaciones, sondeos y pruebas de color que ha realizado el contratista por esta razón se solicita realizar un estudio particular y detallado (se adjunta acta de reunión).

En el EPMSC - RM PASTO: Se evidencia en el informe que los atrasos en los diferentes frentes empiezan a incrementarse esto se debe a que por directrices del director del establecimiento solo se le ha permitido al contratista atacar únicamente 2 frentes, sin embargo se ha realizado recorridos con el director y así mostrar el avance y la necesidad de abrir mas frentes además el contratista ha realizado varias solicitudes por escrito para iniciar en nuevos frentes sin embargo no se le ha autorizado.

EPMSC- LA UNIÓN: Por COVID-19 el establecimiento esta en aislamiento total, sin posibilidad de ingreso hasta nueva orden.

* Lo correspondiente a HORAS TRABAJADAS se especifica unicamente para trabajo en ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos prespuestales e inicio de actividades en todos los establecinientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio **GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACION INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL** - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO
Directora Interventoría

Firma
