USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 16 DEL DÍA 05 MES 10 AÑO 2020 AL DÍA 11 MES 10 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	4,86%	38,80%
Valor del PAC Programado ($)	$ 629.018.775,19	$ 5.021.795.982,98

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	4,86%	38,80%
Valor del PAC Programado ($)	$ 629.018.775,19	$ 5.021.795.982,98

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

EPMSC ERE CALI / **COLISEO**	**PROGRAMADO** SEMANAL	**PROGRAMADO** ACUMULADO	**EJECUTADO** SEMANAL	**EJECUTADO** ACUMULADO
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	3,42%	100,00%	0,00%	95,98%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 13.121.897	$ 383.681.211,0	$ -	$ 368.257.226

SANIDAD (PASILLO)				
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.299.025	$ 7.299.024,7	$ 7.299.025	$ 7.299.025

RM POPAYÀN / **BODEGA EXTERIOR**	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	19,85%	100,00%	2,09%	86,12%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 36.219.451	$ 182.465.746	$ 3.804.411	$ 157.130.377

SANIDAD				
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	100,00%	100,00%	5,00%	80,00%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.398.361	$ 7.398.361	$ 369.918	$ 5.918.689

EPAMS CAS ERE POPAYÁN

PATIO No 8

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	12,19%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,34%	86,12%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.077.732	$ 99.079.018	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.304.285	$ 85.321.896

CELDAS PRIMARIAS

Actividades Programadas (%)	4,15%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,38%	90,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.949.271	$ 263.837.864	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.924.316	$ 239.835.214

EPMSC PUERTO TEJADA

BAÑO RANCHO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	11,14%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	61,05%	88,56%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 448.758	$ 4.028.348	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.459.306	$ 3.567.505

BIBLIOTECA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	31,19%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	92,53%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.081.955	$ 16.293.539	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.258.708	$ 15.076.412

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

AULAS

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	12,50%	30,83%	Actividades Ejecutadas (%)	6,25%	24,62%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.468.794	$ 11.021.834	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.234.397	$ 8.801.737

EPMSC BOLÍVAR CAUCA

EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	8,33%	8,33%	Actividades Ejecutadas (%)	8,33%	8,33%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.286.309	$ 5.286.309	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.286.309	$ 5.286.309

EPMSC EL BORDO

SANIDAD

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	5,00%	5,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	5,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.871.033	$ 2.871.033	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.871.033	$ 2.871.033

EPMSC SILVIA

TALLERES

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	18,33%	18,33%	Actividades Ejecutadas (%)	18,33%	18,33%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.089.974	$ 9.089.974	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 9.089.974	$ 9.089.974

BODEGA 2

Actividades Programadas (%)	65,00%	65,00%	Actividades Ejecutadas (%)	65,00%	65,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.716.232	$ 1.716.232	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.716.232	$ 1.716.232

EPMSC - RM PASTO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CAPILLA					
Actividades Programadas (%)	8,34%	57,79%	Actividades Ejecutadas (%)	2,30%	44,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.993.631	$ 41.561.924	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.654.242	$ 30.423.673
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	5,29%	53,87%	Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	39,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 19.324.627	$ 196.801.813	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 9.133.653	$ 145.773.098
CELDA 1 - RM					
Actividades Programadas (%)	19,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,20%	54,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.611.502	$ 18.522.541	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 407.496	$ 10.131.830
CELDA 2 - RM					
Actividades Programadas (%)	19,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,20%	54,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.588.312	$ 13.274.841	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 292.047	$ 7.194.964
PATIO 2					
Actividades Programadas (%)	12,50%	51,04%	Actividades Ejecutadas (%)	1,80%	33,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.850.935	$ 27.971.191	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 986.535	$ 18.141.276
CELDAS					
Actividades Programadas (%)	12,50%	51,04%	Actividades Ejecutadas (%)	2,10%	5,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.836.131	$ 27.910.749	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.148.470	$ 2.953.209
SANIDAD HOMBRES					
Actividades Programadas (%)	14,29%	44,76%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.373.145	$ 73.225.865	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIOS					
Actividades Programadas (%)	5,00%	22,66%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.722.598	$ 84.832.788	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD MUJERES					
Actividades Programadas (%)	18,18%	18,18%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.148.785	$ 9.148.785	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	11,56%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	40,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 27.375.088	$ 236.844.241	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 95.211.385
PATIO CENTRAL					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	89,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 52.630.061	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 46.735.494
PATIOS					
Actividades Programadas (%)	10,00%	76,91%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	39,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.720.875	$ 82.455.773	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 42.454.664
MURO EXTERIOR					
Actividades Programadas (%)	18,18%	34,85%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	5,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.310.202	$ 4.427.888	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 635.306

EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA					
Actividades Programadas (%)	10,00%	77,70%	Actividades Ejecutadas (%)	1,90%	25,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.876.309	$ 146.670.981	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.586.499	$ 48.323.351
CELDAS (HOMBRES)					
Actividades Programadas (%)	7,14%	37,05%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.179.340	$ 42.429.659	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
TALLER - RM					
Actividades Programadas (%)	7,14%	37,05%	Actividades Ejecutadas (%)	2,80%	9,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.678.777	$ 34.645.609	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.618.081	$ 8.695.767
GUARDIAS					
Actividades Programadas (%)	7,14%	37,05%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.018.442	$ 36.407.595	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES					
Actividades Programadas (%)	5,55%	11,11%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.187.843	$ 14.375.686	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC IPIALES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	8,33%	38,51%	Actividades Ejecutadas (%)	1,20%	3,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.422.247	$ 75.892.502	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.364.804	$ 6.897.344
AULAS					
Actividades Programadas (%)	8,33%	38,51%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	2,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.973.525	$ 46.090.875	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.196.823	$ 2.393.646
RECLUSORIO MUJERES					
Actividades Programadas (%)	8,34%	16,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.682.939	$ 17.365.878	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AISLAMIENTO VIGILANTES					
Actividades Programadas (%)	22,22%	34,72%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	3,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.462.576	$ 10.097.774	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 581.632	$ 872.448
PRIMARIAS					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,10%	9,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.992.882	$ 8.635.822
BAÑOS PATIOS					
Actividades Programadas (%)	6,25%	6,25%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.131.367	$ 14.131.367	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC LA UNION	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	6,67%	11,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.218.659	$ 12.632.653	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AILMANIENTO 1 (Colec espe)					
Actividades Programadas (%)	2,00%	2,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	2,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 757.208	$ 757.208	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 757.208	$ 757.208

EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO					
Actividades Programadas (%)	23,41%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	75,59%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 36.669.461	$ 156.640.160	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.132.803,2	$ 118.404.296,9
PABELLON 6					
Actividades Programadas (%)	41,67%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	30,00%	95,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.844.198	$ 4.425.720	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.327.716,0	$ 4.204.434,0
PABELLON 7					
Actividades Programadas (%)	41,67%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	40,00%	95,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.248.924	$ 2.997.179	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.198.871,6	$ 2.847.320,1
EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7					
Actividades Programadas (%)	7,41%	67,810%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	58,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.008.603	$ 137.345.937	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 20.254.525	$ 117.476.247
PABELLON No 4					
Actividades Programadas (%)	20,60%	100%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	92,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.319.524	$ 69.512.252	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 64.090.296
EPMSC BUENAVENTURA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	6,67%	47,51%	Actividades Ejecutadas (%)	15,50%	45,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.888.273	$ 63.310.622	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 20.654.907,2	$ 60.632.147
COJAM JAMUNDI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CASINO					
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	6,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.418.000	$ 2.418.000	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 1.570.000
PATIO 2					
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	10,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.274.106	$ 23.274.106	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 23.274.105,5	$ 23.274.105,5
PATIO 3					
Actividades Programadas (%)	12,50%	40,67%	Actividades Ejecutadas (%)	6,50%	10,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 64.704.538	$ 210.522.685	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 33.646.359,8	$ 54.351.811,9
PATIO 4					
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	10,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 33.525.700	$ 33.525.700	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 33.525.700,1	$ 33.525.700,1
EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA					
Actividades Programadas (%)	5,33%	100%	Actividades Ejecutadas (%)	18,00%	98,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 815.617	$ 15.302.391	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.754.430,4	$ 14.996.343,2
AULA EDUCATIVA					
Actividades Programadas (%)	15,42%	100%	Actividades Ejecutadas (%)	17,00%	97,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.305.309	$ 8.465.037	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.439.056,3	$ 8.211.085,9

EPMSC CARTAGO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	25,33%	33,66%	Actividades Ejecutadas (%)	15,00%	15,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 30.762.408	$ 40.878.904	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 18.216.980,4	$ 19.188.552,7

EPMSC SEVILLA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO					
Actividades Programadas (%)	25,00%	50,0%	Actividades Ejecutadas (%)	25,00%	40,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.293.375	$ 4.586.749	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.293.374,5	$ 3.669.399,2
PATIO 4					
Actividades Programadas (%)	25,33%	33,66%	Actividades Ejecutadas (%)	40,00%	42,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.696.101	$ 3.582.738	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.257.561,6	$ 4.470.439,7

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	8	5	45
RM POPAYAN	0	8	0	0	0	0	8
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUMACO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC IPIALES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC LA UNIÓN	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC EL BORDO	0	0	0	8	8	5	21
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC SEVILLA	0	0	8	8	8	5	29
EPMSC CAICEDONIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC PUERTO TEJADA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CARTAGO	0	0	8	8	8	5	29

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
CELDAS PRIMARIAS	4,15%	3,38%	100,00%	90,90%	-9,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias).
PABELLON No 8	12,19%	3,34%	100,00%	86,12%	-13,89%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Pabellón No 8).
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA	19,85%	2,09%	100,00%	86,12%	-13,89%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 4 (Bodega antigua).
SANIDAD	100,00%	5,00%	100,00%	80,00%	-20,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 1 (Sanidad).

EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	8,34%	2,30%	57,79%	44,60%	-13,19%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Capilla).
TALLERES	5,29%	2,50%	53,87%	39,90%	-13,97%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Talleres).
CELDA 1 - RM	19,50%	2,20%	100,00%	54,70%	-45,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
CELDA 2 - RM	19,50%	2,20%	100,00%	54,20%	-45,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
PATIO 2	12,50%	1,80%	51,04%	33,10%	-17,94%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en Patio 2 (novedad).
CELDAS	12,50%	2,10%	51,04%	5,40%	-45,64%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance celdas (motín).
SANIDAD HOMBRES	14,29%	0,00%	44,76%	0,00%	-44,76%	Porcentaje correspondiente específicamente paraavance sanidad hombres.
PATIOS	5,00%	0,00%	22,66%	0,00%	-22,66%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance patios.
SANIDAD MUJERES	18,18%	0,00%	18,18%	0,00%	-18,18%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en sanidad mujeres
EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	11,56%	0,00%	100,00%	40,20%	-59,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Educativas).
PATIO CENTRAL	0,00%	0,00%	100,00%	89,80%	-10,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por desmanes y mantenimiento en Patio Central.
PATIOS	10,00%	0,00%	76,91%	39,60%	-37,31%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios.
MURO EXTERIOR	18,18%	0,00%	34,85%	5,00%	-29,85%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por adecuaciones en el muro exterior.
EPMSC TUQUERRES						
BODEGA	10,00%	1,90%	77,70%	25,60%	-52,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Bodega).
CELDAS (HOMBRES)	7,14%	0,00%	37,05%	0,00%	-37,05%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas patio 3).
TALLER - RM	7,14%	2,80%	37,05%	9,30%	-27,75%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres - RM).
GUARDIAS	7,14%	0,00%	37,05%	0,00%	-37,05%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Alojamiento guardias).
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	5,55%	0,00%	11,11%	0,00%	-11,11%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos hombres.
EPMSC IPIALES						
TALLERES	8,33%	1,20%	38,51%	3,50%	-35,01%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres).
AULAS	8,33%	1,00%	38,51%	2,00%	-36,51%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aulas).
RECLUSORIO MUJERES	8,34%	0,00%	16,67%	0,00%	-16,67%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (reclusorio mujeres).
AISLAMIENTO VIGILANTES	22,22%	2,00%	34,72%	3,00%	-31,72%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (vigilantes).
PRIMARIAS	0,00%	2,10%	0,00%	9,10%	9,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas Primarias).
BAÑOS PATIOS	6,25%	0,00%	6,25%	0,00%	-6,25%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance baños patios.
EPMSC LA UNIÓN						
SANIDAD	6,67%	0,00%	11,67%	0,00%	-11,67%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad.
ZONA DE AILMANIENTO 1 (Colec espe)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Colectivas Especiales).

COJAM JAMUNDÍ						
CASINO	10,00%	0,00%	10,00%	6,50%	-3,50%	Se evidencio una fuga y daño en tubería hidráulica del casino del establecimiento por lo que se priorizo la intervención de este este espacio, que no estaba en presupuesto por ende no tiene porcentajes de avance
RED GENERAL HIDRAULICA	24,18%	15,70%	24,18%	15,70%	-8,48%	Realizando la exploración de las fugas en la red general del establecimiento se detecto otra fuga por lo que decidió su intervención
PATIO 2	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	Corresponde a la instalacion de tuberia sanitaria como reposicion de la que estaba en esta area en mal estado o cristalizada por exposicion a intemperie
PATIO 3	12,50%	6,50%	40,67%	10,50%	-30,17%	Avance representado en la ejecución de obras hidrosanitarias como el cambio de tubería sanitaria por el perímetro de este bloque.
PATIO 4	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	Corresponde a la instalacion de tuberia sanitaria como reposicion de la que estaba en esta area en mal estado o cristalizada por exposicion a intemperie
EPMSC BUENAVENTURA						
EPMSC BUENAVENTURA	7%	16%	48%	46%	-2%	Avance corresponde a la intervención de aulas educativas en cuento a enchapes, mampostería y redes hidrosanitarias y eléctricas y construccion de muros en mamposteria estructural.
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	3,42%	0,00%	100,00%	95,98%	-4,02%	No se están realizando actividades ya que se está interviniendo el pasillo de sanidad y se tiene como ingreso provisional el área de coliseo. Se termine de intervenir el pasillo se da el terminado de piso, retoques y cierre de acceso provisional.
SANIDAD	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	Se esta realizando, cambio de cubierta, Resane de muros en concret.
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AULAS	12,50%	6,25%	30,83%	24,62%	6,21%	Se está realizando demolición de piso en baldosa, retiro de escombros, alistado de piso.
EPMSC EL BORDO						
SANIDAD	5%	5%	5%	5%	0%	Se inicio trabajo en la area de sanidad, demolición de baldosa y cambio de tuberia hidrosanitaria.
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	7,41%	10,00%	67,81%	58,00%	-9,81%	Avance corresponde al desmonte de teja metálica de una de las naves del patio 7, se esta realizando el mantenimiento de la estructura de cubierta y adicionando perfileria para soporte de la teja contractual aprobada.
PABELLON No 4	20,60%	0,00%	100,00%	92,20%	-7,80%	No se presenta avance en esta semana debido a que contratista expresa la dificultad en la busqueda y compra de producto para realizar impermeabilizacion de muro de fachada
EPMSC BOLÍVAR						
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO	8%	8%	8%	8%	0%	Se inicio actividades en la area de educativas (Auditorio), Demolición de pisos en baldosa.
EPMSC SEVILLA						
RANCHO.	25%	25%	50%	40%	-10%	Referido a la demolicion del enchape y del mortero de nivelacion existente
PATIO 4	25%	40%	34%	42%	8%	adecuacion de baños existententes, retiro de pintura, enchape y pañete existentes
EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	5,33%	18,00%	100,00%	97,00%	-3,00%	Avance referido a las adecuaciones de estuco, pintura, baño y red electrica
AULA EDUCATIVA	15,42%	17,00%	100,00%	97,00%	-3,00%	Avance referido a las adecuaciones de estuco, pintura, baño y red electrica
EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	11,14%	61,05%	100,00%	88,56%	-11,44%	Se recomienda al contratista el cambio del mezclador de ducha, cambio de aparatos eléctricos y resane pintura de puerta.
BIBLIOTECA	31,19%	20,00%	100,00%	92,53%	-7,47%	Se retiro piso en baldosa, se enchapo piso y pared contigua a baterías sanitarias, se impermeabilizo techo. Se le recomienda al contratista regatear la tubería eléctrica.

EPMSC BUGA						
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	Se dio apertura de actividades el dia jueves 08 de octubre de 2020, realizando recorrido para entrega de espacios a intervenir, se adecuo punto de desinfeccion en atencion a protocolo de bioseguridad.
CPMS TULUÁ						
RANCHO ANTIGUO	23,41%	2,00%	100,00%	75,59%	-24,41%	Pintura de muro exterior en aceite como medida de prevencion a la accion de humedad y lluvias sobre zona dura o anden perimetral exterior
PABELLON No. 6	41,67%	30,00%	100,00%	95,00%	-5,00%	Avance corresponde a la adecuación de mejoramiento de área de duchas y baños tanto en la parte interna como en la externa del pabellón
PABELLON No. 7	41,67%	40,00%	100,00%	95,00%	-5,00%	Corresponde a la adecuación para mejoramiento y ampliación de baterías sanitarias ya que el pabellón alberga aproximadamente 50 PPL y únicamente cuentan con un baño.
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	No se intervendra por el contrato, por no presencia de PPL, ni requerimientos.
EPMSC SILVIA						
TALLERES	18%	18%	18%	18%	0%	Se inicia actividades en mejoramiento de guarda escobas en concreto, pulimiento de piso.
BODEGA 2	65%	65%	65%	65%	0%	Cielo falso en pvc, red electrica y resanes de paredes.
EPMSC CARTAGO						
EPMSC CARTAGO	25%	15%	34%	16%	18%	Refereido a actividades de demoliciones, excavaciones, instalacion de tuberia hidrosanitaria, mampostria y concretos

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:
* Cambio de cubierta en pasillo y area de sanidad.
* Limpieza de coliseo y alistado de piso.
* Instalación de reja en baños PPL y baño para personal de la salud.






CPMS TULUÁ:
RANCHO ANTIGUO.
- Pintura de muro externo de sanidad
- Solapa en manto foil de aluminio para prevencion de filtracion por losa de cubierta de estructura aledaña a zona de aislamiento.

PABELLON No. 6
- Mamposteria para ampliacion de baños internos de patio
- Repello de muros para baños y duchas

PABELLLON No. 7
- Enchape de baños.











EPMSC - RM PASTO:
TALLERES * Se continua con la instalación del pañete.
*Se continua con el mantenimiento a la estructura de la cubierta y con instalación de las tejas.
*Se continua con la instalación de enchape.
RECLUSORIO MUJERES *Se inicia con la instalación de estuco y seguidamente a pintar.
CELDAS *En las celdas de patio 2 se continua con el hidrolavado.
*Se hacen reparaciones menores con mortero y se inicia con el repello.
CAPILLA* Se inicio con el retiro de las tejas existentes y el mantenimiento a la estructura de la cubierta.



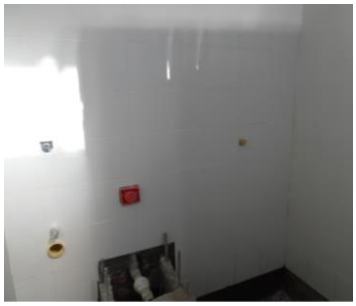






EPMSC TUMACO: NO HUBO ACTIVIDADES EN LA SEMANA

EPMSC TUQUERRES:
BODEGA *Se continua con la construcción de las cajas de inspección, se finaliza con la construcción de la rampa de acceso
* Se continua con la instalación de pañete.
RECLUSORIO MUJERES *Se continua con las excavaciones ara la instalación de tubería sanitaria
*Se continua con el levantamientos de muros de mampostería






EPMSC IPIALES:
CELDA PRIMARIAS *Se continua con la excavación para la instalación de tubería sanitaria y las cajas de inspección.
TALLERES *Se continúa con las excavaciones para la instalación de tubería sanitaria y las cajas de inspección.
AULAS *Se finalizo con la demolición de enchape y muros existentes
SANIDAD *Se continúa con el raspado y limpieza de muros.
GUARDIAS *Se inicia con la demolición de muros y retiro de enchape para realizar la constricción de las nuevas baterías sanitarias.








EPMSC LA UNION:
COLECTIVO ESPECIAL: *Se inicio con la demolición de pisos, retiro de enchape del baño.
*Se inicio con el raspado, lijado y limpieza de muros







EPAMS CAS ERE POPAYÁN:
• Pintura de muros de pasillo.
hidraulica.
PABELLÓN 8
• Limpieza de cubierta.
pintura.

CELDAS PRIMARIAS
• Cambio de tuberia

• Muro de culata, repello y





RM POPAYAN: Instalación de filtro, instalación de lavatraperos y pintura en la area de sanidad.






EPMSC PUERTO TEJADA
Rancho: Arreglo de enchape, cambio de tubería.
contiguo a baños.

Baño de
* Biblioteca: Enchape de piso y muro





EPMSC SANTANDER QUILICHAO

*Aulas: Demolición de piso, retiro de escombros. * Demolición de enchape de baños aulas.






EPMSC BOLÍVAR:

EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Se inicio actividades en la area de educativas (Auditorio), Demolición de pisos en baldosa.






EPMSC EL BORDO:

SANIDAD: Se inicio trabajo en la area de sanidad, demolición de baldosa y cambio de tuberia hidrosanitaria.





EPMSC SILVIA:

TALLERES: Se inicia actividades en BODEGA 2: Cielo falso en pvc, red electrica y resanes de mejoramiento de guarda escobas en concreto, pulimiento de piso. paredes.





EPAMS CAS JP PALMIRA:

- **PATIO 4**: No se presenta avance de obra en esta semana dado que contratista expresa la dificultad en el suministro de producto impermeabilizante para muros de fachada.
- **PATIO 7:** Mantenimiento de estructura para teja termo acústica nueva a instalar
- **PATIO 7:** Fundición de Macizos en concreto para soporte de estructura metálica para voladizo de cubierta y para instalación de canal en lamina.
- **PATIO 7:** Instalacion de parales para estructura de cubierta.
- **PATIO 7:** Instalacion de yumbolon sobre lamina de cielo en celdas de la nave 1.








EPAMS BUENAVENTURA:

- **AULAS EDUCATIVAS:** Pañete en mortero impermeabilizado sobre muros de aulas educativas por acción agresiva de humedad
- **AULAS EDUCATIVAS:** Enchape sobre muros en aulas educativas.
- **AULAS EDUCATIVAS:** Mampostería en ladrillo de cemento para división de área
- **AULAS EDUCATIVAS:** instalación de tubería conduit en piso y muros.
- **AULAS EDUCATIVAS:** Repello sobre mamposteria nueva
- **AULAS EDUCATIVAS:** Instalacion de luminarias en cielos.







COJAM JAMUNDI:

CASINO:

- Realizando la inspección de tubería y evaluando posibles puntos de perdidas en red se detecto que en el casino se presenta fugas en la tubería y perdías de liquido por daños por lo que se autorizo el movimiento de personal a este sector para atacar el problema donde se realizo excavación, demolición de secciones de piso, cambio de tuberías y reposición de piso

RED HIDRAULICA GENERAL

- Realizando la exploración de las fugas se detecto otra de estas cerca del patio 2 por lo que se decidió intervenir para evitar un gasto excesivo de agua.

PATIO 2:

- Retiro e instalacion de tuberia sanitaria en fachadas.

PATIO 3:

- Retiro e instalacion de tuberia sanitaria en fachada.

PATIO 4:


- Retiro de tubería cristalizada y dañada en la parte externa del bloque.
- Instalación de tubería sanitaria por fachada.
- Revision acometidas y cableado electrico en celdas conyugales.






EPMSC CAICEDONIA:

- **BIBLIOTECA:** Pintura tipo 1 de muros y cielo
- **BIBLIOTECA:** Acondicionamiento de baño.
- **BIBLIOTECA:** Instalacion de red electrica.
- **BIBLIOTECA:** Instalación de tubería y cableado eléctrico
- **AULA EDUCATIVA:** Repello o pañete sobre muros en baños
- **AULA EDUCATIVA:** Enchpe de muros de baños
- **AULA EDUCATIVA:** Enchape de piso en baños.
- **AULA EDUCATIVA:** Resanes en muros por afectaciones de humedad

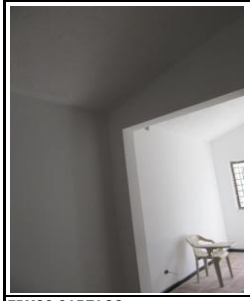






EPMSC CARTAGO:

AULAS EDUCATIVAS

- Demolición de enchape de piso para adecuación de baños en aulas.
- Exploración de cajas de inspección para derivación de adecuaciones de baños.
- Instalacion de tuberia sanitaria para adecuacion de baños en aulas.
- Acero de refuerzo para cimentacion superficial para adecuacion de baños.
- Mamposteria en ladrillo tolete para muros de baños.









EPMSC SEVILLA:

RANCHO

- Demolición de enchape piso.
- Demolicion de mortero existente de nivelacion

PATIO No.4

- Pañete sobre muros en baños
- Instalacion de tuberia hidrosanitaria para adecuacion de baños.







COJAM JAMUNDI: Se detecto una fuga en la red de la tubería hidráulica del casino por lo que se autorizo la intervención de este espacio para reparar los daños, y dado que este espacio no se tenia contemplado en presupuesto no tiene porcentajes de avance y contratista se encuentra en la terminación de cuantificación de actividades y valoración de las mismas para anexar en presupuesto.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se evidencia poco avance durante la semana por falta de material en obra, no se han termino los trabajos en las dos (2) áreas intervenidas, Pabellon 8 y Celdas Primarias.

RM POPAYAN: Durante la semana no se realizaron actividades por falta de materiales y personal, no se refleja avance. La bitacora de obra no se encuentra en el establecimiento.

EPMSC EL BORDO: SANIDAD: Se inicio trabajo en la area de sanidad, demolición de baldosa y cambio de tuberia hidrosanitaria. El establecimiento solicita puntos COVID (gel antibacterial - termometro, etc) y personal de seguridad en el trabajo. La Dirección del establecimiento, esta solicitando las planillas de seguridad social y capacitaciones, el personal NO cumple con los protocolos.

EPMSC SILVIA: TALLERES: Se inicia actividades en mejoramiento de guarda escobas en concreto, pulimiento de piso. BODEGA 2: Cielo falso en PVC, red electrica y resanes de paredes. Solicitan personal de seguridad en el trabajo.

EPMSC BOLÍVAR: EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Se iniciaron actividades en la área de educativas (Auditorio), demolición de pisos en baldosa. El establecimiento solicita puntos COVID (gel antibacterial - termometro, etc) y personal de seguridad en el trabajo. La Dirección del establecimiento, esta solicitando las planillas de seguridad social y capacitaciones, el personal NO cumple con los protocolos.

EPMSC SANTANDER QUILICHAO

*Aulas: Demolición de piso, retiro de escombros. Demolición de enchape de baños aulas.

EPMSC PUERTO TEJADA Baño de Rancho: Arreglo de enchape, cambio de tubería. * Biblioteca: Enchape de piso y muro contiguo a baños.

EPAMS CAS JP PALMIRA:

Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecución de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas eléctricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente eléctrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revisión y presentación de solución para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relación al desarrollo de la atención de la demanda, se solicito a contratista la intervención para instalar una ventana en el área bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellón 4.

CPMS TULUÁ:

Se presento una novedad con relación a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que debería instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, también se debe instalar una solapa metálica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el **EPMSC - RM PASTO:** Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

En el **EPMSC - RM PASTO**: teniendo en cuenta el presente informe, hasta la fecha se deberían haber iniciado mas espacios, sim embargo por parte del establecimiento no han autorizado el ingreso hasta que se entreguen los espacios en los cuales se están trabajano.

En el **EPMSC TUMACO**: teniendo en cuenta la última visita que realizó el día lunes 28 de agosto del año en curso, se apreció que al contratista para terminar las obras en su totalidad le hacen falta detalles menores, sin embargo por parte de la interventoría se le manifestó que no se recibirán pre entregas, se le dio la claridad que se recibirá una vez estén completamente terminadas las obras y una vez se subsane las observaciones realizadas en la visita, cabe resaltar que el contratista ha realizado unas pre entregas a los funcionarios del establecimiento. Adicionalmente el contratista no se encuentra realizando labores no hay personal en obra hasta la fecha por lo cual se le solicito de manera verbal al contratista reanudar labores y finalizar todo lo pendiente.

En el **EPMSC IPIALES:** Se le hizo la solicitud al contratista que se vincule mayor personal y se disponga de mayor cantidad de material, debido a que en el establecimiento se ha autorizado el ingreso a 6 espacio por lo cual se necesita un buen rendimiento para poder cumplir con todos.

De acuerdo con las reuniones sostenidas y las mesas de trabajo adelantadas, el contratista realizo la entrega de un nuevo presupuestos y cronogramas, basados en las actividades definidas en la información inicial suministrada por la USPEC y las condiciones encontradas en los establecimientos intervenidos el día miércoles 02 de septiembre del año en curso.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.


* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos presupuestales e inicio de actividades en todos los establecimientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO

Directora Interventoría



Firma
