USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	17	DEL	DÍA	12	MES	10	AÑO	2020	AL	DÍA	18	MES	10	AÑO	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152	Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -	Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152	Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero	Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A	Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020	Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020	Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020	Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020	Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	4,86%	38,80%	PAC Programado (%)	4,86%	38,80%
Valor del PAC Programado ($)	$ 629.018.775,19	$ 5.021.795.982,98	Valor del PAC Programado ($)	$ 629.018.775,19	$ 5.021.795.982,98

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
EPMSC ERE CALI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
COLISEO					
Actividades Programadas (%)	3,42%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,50%	97,48%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.121.897	$ 383.681.211,0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.755.218	$ 374.012.444
SANIDAD (PASILLO)					
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	20,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.299.025	$ 7.299.024,7	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.299.025	$ 14.598.049
RM POPAYÀN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA EXTERIOR					
Actividades Programadas (%)	19,85%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	87,12%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 36.219.451	$ 182.465.746	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.824.657	$ 158.955.035
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	100,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	85,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.398.361	$ 7.398.361	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 369.918	$ 6.288.607

BODEGA

Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	20,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.004.613	$ 2.004.613	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.004.613	$ 2.004.613

EPAMS CAS ERE POPAYÁN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PATIO No 8					
Actividades Programadas (%)	12,19%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	91,12%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.077.732	$ 99.079.018	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.953.951	$ 90.275.847
CELDAS PRIMARIAS					
Actividades Programadas (%)	4,15%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	92,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.949.271	$ 263.837.864	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.276.757	$ 245.111.972

EPMSC PUERTO TEJADA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BAÑO RANCHO					$ 18.643.917
Actividades Programadas (%)	11,14%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	88,56%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 448.758	$ 4.028.348	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 3.567.505
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA					
Actividades Programadas (%)	31,19%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	92,53%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.081.955	$ 16.293.539	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 15.076.412

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS					
Actividades Programadas (%)	12,50%	30,83%	Actividades Ejecutadas (%)	3,00%	27,62%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.468.794	$ 11.021.834	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.072.511	$ 9.874.247

EPMSC BOLÍVAR CAUCA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO					
Actividades Programadas (%)	9,09%	17,42%	Actividades Ejecutadas (%)	9,09%	17,42%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.768.613	$ 11.054.921	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.768.613	$ 11.054.921

EPMSC EL BORDO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	6,67%	11,67%	Actividades Ejecutadas (%)	6,67%	11,67%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.829.958	$ 6.700.991	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.829.958	$ 6.700.991

EPMSC SILVIA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	12,50%	30,83%	Actividades Ejecutadas (%)	12,50%	30,83%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.198.837	$ 15.288.810	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.198.837	$ 15.288.810
BODEGA 2					
Actividades Programadas (%)	35,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	85,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 924.125	$ 2.640.357	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 528.071	$ 2.244.303

EPMSC - RM PASTO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CAPILLA					
Actividades Programadas (%)	9,09%	66,88%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	45,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.538.507	$ 48.100.431	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 719.236	$ 30.423.673
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	6,44%	60,31%	Actividades Ejecutadas (%)	2,10%	42,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.542.364	$ 220.344.177	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.672.268	$ 153.445.366
CELDA 1 - RM					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	56,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 18.522.541	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 370.451	$ 10.502.281
CELDA 2 - RM					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	56,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 13.274.841	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 265.497	$ 7.460.461
PATIO 2					
Actividades Programadas (%)	14,28%	65,32%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	34,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.829.640	$ 35.800.831	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 548.075	$ 18.689.350
CELDAS					
Actividades Programadas (%)	14,28%	65,32%	Actividades Ejecutadas (%)	2,10%	7,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.812.721	$ 35.723.470	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.148.470	$ 4.101.679
SANIDAD HOMBRES					
Actividades Programadas (%)	16,66%	61,42%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 27.268.669	$ 100.494.534	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIOS					
Actividades Programadas (%)	5,29%	27,92%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 19.707.998	$ 104.540.786	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD MUJERES					
Actividades Programadas (%)	26,22%	44,40%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 11.181.849	$ 20.330.634	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	40,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 236.844.241	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 95.211.385
PATIO CENTRAL					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	89,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 52.630.061	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 46.735.494
PATIOS					
Actividades Programadas (%)	8,33%	85,24%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	39,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.934.062	$ 91.389.835	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 42.454.664
MURO EXTERIOR					
Actividades Programadas (%)	19,23%	54,08%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	5,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.310.202	$ 4.427.888	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 635.306

EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA					
Actividades Programadas (%)	10,53%	88,23%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	26,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 19.869.799	$ 166.540.780	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.887.631	$ 50.210.982
CELDAS (HOMBRES)					
Actividades Programadas (%)	7,70%	44,74%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.808.520	$ 51.238.179	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
TALLER - RM					
Actividades Programadas (%)	9,09%	46,14%	Actividades Ejecutadas (%)	2,20%	11,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.500.261	$ 43.145.870	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.057.063	$ 10.752.831
GUARDIAS					
Actividades Programadas (%)	9,09%	46,14%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.932.563	$ 45.340.158	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES					
Actividades Programadas (%)	6,67%	17,78%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.625.412	$ 23.001.098	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC IPIALES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	10,00%	48,51%	Actividades Ejecutadas (%)	1,80%	5,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 19.706.697	$ 95.599.199	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.547.205	$ 10.444.549
AULAS					
Actividades Programadas (%)	10,00%	48,51%	Actividades Ejecutadas (%)	1,50%	3,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 11.968.230	$ 58.059.104	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.795.234	$ 4.188.880
RECLUSORIO MUJERES					
Actividades Programadas (%)	9,09%	25,76%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.472.297	$ 26.838.175	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AISLAMIENTO VIGILANTES					
Actividades Programadas (%)	28,57%	63,29%	Actividades Ejecutadas (%)	2,20%	5,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.309.026	$ 18.406.800	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 639.795	$ 1.512.243
PRIMARIAS					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,60%	11,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.467.378	$ 11.103.200
BAÑOS PATIOS					
Actividades Programadas (%)	6,67%	12,92%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.073.458	$ 29.204.826	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	33,33%	33,33%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	10,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.675.425	$ 18.675.425	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.602.627	$ 5.602.627

EPMSC LA UNION	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	6,66%	18,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.218.659	$ 19.851.312	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AILMANIENTO 1 (Colec espe)					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,60%	4,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 984.371	$ 1.741.579

EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO					
Actividades Programadas (%)	23,41%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,70%	76,29%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 36.669.461	$ 156.640.160	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.096.481,1	$ 119.500.778,1
PABELLON 6					
Actividades Programadas (%)	41,67%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	95,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.844.198	$ 4.425.720	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 4.204.434,0
PABELLON 7					
Actividades Programadas (%)	41,67%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	96,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.248.924	$ 2.997.179	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 29.971,8	$ 2.877.291,8

EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7					
Actividades Programadas (%)	8,19%	76,000%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	68,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.588.456	$ 153.934.393	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 20.254.525	$ 137.730.773
PABELLON No 4					
Actividades Programadas (%)	20,60%	100%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	93,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.319.524	$ 69.512.252	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 695.122,5	$ 64.785.419

EPMSC BUENAVENTURA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS					$ 67.295.020
Actividades Programadas (%)	12,50%	60,0100%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	50,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.657.183	$ 79.967.805	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.662.873,3	$ 67.295.020

COJAM JAMUNDI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CASINO					
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	6,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.418.000	$ 2.418.000	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 1.570.000
PATIO 2					
Actividades Programadas (%)	19,23%	45,90%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	10,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 44.756.105	$ 106.828.144	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 23.274.105,5
PATIO 3					
Actividades Programadas (%)	11,76%	52,4300%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	11,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 60.874.029	$ 271.396.714	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.588.181,5	$ 56.939.993,4
PATIO 4					
Actividades Programadas (%)	16,67%	26,7%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	11,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 55.887.342	$ 89.413.042	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.352.570,0	$ 36.878.270,1

EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA					
Actividades Programadas (%)	5,33%	100%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	99,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 815.617	$ 15.302.391	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 153.023,9	$ 15.149.367,1
AULA EDUCATIVA					
Actividades Programadas (%)	15,42%	100%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	98,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.305.309	$ 8.465.037	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 84.650,4	$ 8.295.736,3

EPMSC CARTAGO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	12,50%	46,16%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	20,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.180.817	$ 56.059.721	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.072.326,8	$ 25.260.879,5

EPMSC SEVILLA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO					
Actividades Programadas (%)	8,33%	58,3%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	45,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 764.152	$ 5.350.901	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 458.674,9	$ 4.128.074,1
PATIO 4					
Actividades Programadas (%)	12,50%	46,16%	Actividades Ejecutadas (%)	15,00%	57,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.330.488	$ 4.913.226	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.596.585,6	$ 6.067.025,3
BIBLIOTECA					
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%	Actividades Ejecutadas (%)	8,00%	8,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.799.249	$ 7.799.249	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.239.399,5	$ 6.239.399,5

EPMSC BUGA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CUARTO HOSPITALIZACIÓN SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,0%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	10,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.539.281	$ 4.539.281	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.269.640,3	$ 2.269.640,3

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	8	5	45
RM POPAYAN	8	8	8	8	8	5	45
COJAM JAMUNDÍ	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC BUENAVENTURA	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUMACO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC IPIALES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC LA UNIÓN	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC EL BORDO	8	8	8	8	8	5	45
EPAMS CAS JP PALMIRA	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC BOLÍVAR	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC SEVILLA	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC CAICEDONIA	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUGA	0	8	8	8	8	5	37
CPMS TULUÁ	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CARTAGO	0	8	8	8	8	5	37

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
CELDAS PRIMARIAS	4,15%	2,00%	100,00%	92,90%	-7,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias).
PABELLON No 8	12,19%	5,00%	100,00%	91,12%	-8,89%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Pabellón No 8).
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA	19,85%	1,00%	100,00%	87,12%	-12,89%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 4 (Bodega antigua).
SANIDAD	100,00%	5,00%	100,00%	85,00%	-15,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 1 (Sanidad).
EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	9,09%	1,00%	66,88%	45,60%	-21,28%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Capilla).
TALLERES	6,44%	2,10%	60,31%	42,00%	-18,31%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Talleres).
CELDA 1 - RM	0,00%	2,00%	100,00%	56,70%	-43,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
CELDA 2 - RM	0,00%	2,00%	100,00%	56,20%	-43,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
PATIO 2	14,28%	1,00%	65,32%	34,10%	-31,22%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en Patio 2 (novedad).
CELDAS	14,28%	2,10%	65,32%	7,50%	-57,82%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance celdas (motín).
SANIDAD HOMBRES	16,66%	0,00%	61,42%	0,00%	-61,42%	Porcentaje correspondiente específicamente paraavance sanidad hombres.
PATIOS	5,29%	0,00%	27,92%	0,00%	-27,92%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance patios.
SANIDAD MUJERES	26,22%	0,00%	44,40%	0,00%	-44,40%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en sanidad mujeres
EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	0,00%	0,00%	100,00%	40,20%	-59,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Educativas).
PATIO CENTRAL	0,00%	0,00%	100,00%	89,80%	-10,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por desmanes y mantenimiento en Patio Central.
PATIOS	8,33%	0,00%	85,24%	39,60%	-45,64%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios.
MURO EXTERIOR	19,23%	0,00%	54,08%	5,00%	-49,08%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por adecuaciones en el muro exterior.
EPMSC TUQUERRES						
BODEGA	10,53%	1,00%	88,23%	26,60%	-61,63%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Bodega).
CELDAS (HOMBRES)	7,70%	0,00%	44,74%	0,00%	-44,74%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas patio 3).
TALLER - RM	9,09%	2,20%	46,14%	11,50%	-34,64%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres - RM).
GUARDIAS	9,09%	0,00%	46,14%	0,00%	-46,14%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Alojamiento guardias).
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	6,67%	0,00%	17,78%	0,00%	-17,78%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos hombres.

EPMSC IPIALES						
TALLERES	10,00%	1,80%	48,51%	5,30%	-43,21%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres).
AULAS	10,00%	1,50%	48,51%	3,50%	-45,01%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aulas).
RECLUSORIO MUJERES	9,09%	0,00%	25,76%	0,00%	-25,76%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (reclusorio mujeres).
AISLAMIENTO VIGILANTES	28,57%	2,20%	63,29%	5,20%	-58,09%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (vigilantes).
PRIMARIAS	0,00%	2,60%	0,00%	11,70%	11,70%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas Primarias).
BAÑOS PATIOS	6,67%	0,00%	12,92%	0,00%	-12,92%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance baños patios.
SANIDAD	33,33%	10,00%	33,33%	10,00%	-23,33%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en la zona de sanidad.
EPMSC LA UNIÓN						
SANIDAD	6,66%	0,00%	18,33%	0,00%	-18,33%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad.
ZONA DE AILMANIENTO 1 (Colec espe)	0,00%	2,60%	0,00%	4,60%	4,60%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Colectivas Especiales).
COJAM JAMUNDÍ						
CASINO	10,00%	0,00%	10,00%	6,50%	-3,50%	Se evidencio una fuga y daño en tubería hidráulica del casino del establecimiento por lo que se priorizo la intervención de este este espacio, que no estaba en presupuesto por ende no tiene porcentajes de avance
RED GENERAL HIDRAULICA	24,18%	15,70%	24,18%	15,70%	-8,48%	Realizando la exploración de las fugas en la red general del establecimiento se detecto otra fuga por lo que decidió su intervención
PATIO 2	19,23%	0,00%	45,90%	10,00%	-35,90%	No se realizo ninguna actividad en esta semana puesto que se estan adelantando exploraciones de fugas en el sitema de la red hidraulica
PATIO 3	11,76%	0,50%	52,43%	11,00%	-41,43%	Avance representado en la ejecución de obras hidrosanitarias como el cambio de tubería sanitaria por el perímetro de este bloque.
PATIO 4	16,67%	1,00%	26,67%	11,00%	-15,67%	Avance representado en la ejecución de obras hidrosanitarias como el cambio de tubería sanitaria por el perímetro de este bloque.
EPMSC BUENAVENTURA						
EPMSC BUENAVENTURA	13%	5%	60%	51%	-10%	Avance corresponde a la intervención de aulas educativas en cuento a enchapes, mamposteria y redes hidrosanitarias y eléctricas y construccion de muros en mamposteria estructural.
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	3,42%	1,50%	100,00%	97,48%	-2,52%	No se están realizando actividades ya que se está interviniendo el pasillo de sanidad y se tiene como ingreso provisional el área de coliseo. Se termine de intervenir el pasillo se da el terminado de piso, retoques y cierre de acceso provisional.
SANIDAD	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	Se esta realizando, cambio de cubierta, Resane de muros en concret.
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AULAS	12,50%	3,00%	30,83%	27,62%	3,21%	Se está realizando demolición de piso en baldosa, retiro de escombros, alistado de piso.
EPMSC EL BORDO						
SANIDAD	7%	7%	12%	12%	0%	Se inicio trabajo en la area de sanidad, demolición de baldosa y cambio de tuberia hidrosanitaria.

EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	8,19%	10,00%	76,00%	68,00%	-8,00%	Avance corresponde al desmonte de teja metálica de una de las naves del patio 7, se esta realizando el mantenimiento de la estructura de cubierta y adicionando perfileria para soporte de la teja contractual aprobada.
PABELLON No 4	20,60%	1,00%	100,00%	93,20%	-6,80%	Se realiza el raspado de la superficie y pañete de muros afectados por humedades.
EPMSC BOLÍVAR						
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO	9%	9%	17%	17%	0%	Se inicio actividades en la area de educativas (Auditorio), Demolición de pisos en baldosa.
EPMSC SEVILLA						
RANCHO.	8%	5%	58%	45%	-13%	Referido a la demolicion del enchape y del mortero de nivelacion existente
PATIO 4	13%	15%	46%	57%	11%	adecuacion de baños existententes, retiro de pintura, enchape y pañete existentes
BIBLIOTECA	10%	8%	10%	8%	2%	Demolicion de piso, excavaciones para cimentacines, armado de acero de refuerzo para cimentacion y estructura, mamposteria para divisiones.
EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	5,33%	1,00%	100,00%	98,00%	-2,00%	Avance referido a las adecuaciones de estuco, pintura, baño y red electrica, y esta en mas del 100% dado que se ampliaron cantidades para adecuacion
AULA EDUCATIVA	15,42%	1,00%	100,00%	98,00%	-2,00%	Avance referido a las adecuaciones de estuco, pintura, baño y red electrica, y esta en mas del 100% dado que se ampliaron cantidades para adecuacion
EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	11,14%	0,00%	100,00%	88,56%	-11,44%	Se recomienda al contratista el cambio del mezclador de ducha, cambio de aparatos eléctricos y resane pintura de puerta.
BIBLIOTECA	31,19%	0,00%	100,00%	92,53%	-7,47%	Se retiro piso en baldosa, se enchapo piso y pared contigua a baterías sanitarias, se impermeabilizo techo. Se le recomienda al contratista regatear la tubería eléctrica.
EPMSC BUGA						
EPMSC BUGA	20%	10%	20%	10%	-10%	Se dio apertura de actividades el dia jueves 08 de octubre de 2020, realizando recorrido para entrega de espacios a intervenir, se adecuo punto de desinfeccion en atencion a protocolo de bioseguridad.
CPMS TULUÁ						
RANCHO ANTIGUO	23,41%	0,70%	100,00%	76,29%	-23,71%	Pintura de muro exterior en aceite como medida de prevencion a la accion de humedad y lluvias sobre zona dura o anden perimetral exterior
PABELLON No. 6	41,67%	0,00%	100,00%	95,00%	-5,00%	Avance corresponde a la adecuación de mejoramiento de área de duchas y baños tanto en la parte interna como en la externa del pabellón
PABELLON No. 7	41,67%	1,00%	100,00%	96,00%	-4,00%	Dado a la ampliacion de las baterias sanitarias el porcentaje de ejecucion supera el 100% puesto que las actividades se ampliaron, se espera ajuste por parte de contratista para continuar con seguimiento y control.
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	No se intervendra por el contrato, por no presencia de PPL, ni requerimientos.
EPMSC SILVIA						
TALLERES	13%	13%	31%	31%	0%	Se inicia actividades en mejoramiento de guarda escobas en concreto, pulimiento de piso.
BODEGA 2	35%	20%	100%	85%	15%	Cielo falso en pvc, red electrica y resanes de paredes.
EPMSC CARTAGO						
EPMSC CARTAGO	13%	5%	46%	21%	25%	Refereido a actividades de demoliciones, excavaciones, instalacion de tuberia hidrosanitaria, mamposteria y concretos

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:
* Pintura en pasillo de sanidad.
* Limpieza de coliseo y alistado de piso.
* Limpieza de paredes y pintura en paredes de coliseo.








CPMS TULUÁ:
RANCHO ANTIGUO.
- Pintura en base de aceite de muro externo de sanidad

PABELLON No. 6
- No se realiza avance en esta semana dado que esta pendiente por suministrar e instalar puertas.

PABELLLON No. 7
- Enchape de piso baños.
- Enchape de duchas en ampliacion de baños.











EPMSC - RM PASTO:
TALLERES * Se continua con la instalación del pañete.
*Se finaliza con el mantenimiento a la estructura de la cubierta y con instalación de las tejas.
*Se continua con la instalación de enchape y la instalación de los baños.
RECLUSORIO MUJERES *Se continua con la pintura y la instalación de guarda escobas.
CELDAS *En las celdas de patio 2 se continua con el hidrolavado.
*Se continua con las reparaciones menores con mortero, con la instalación de repello y se inicia con la pintura.
*Se inicia con la construcción y arreglo de los camastros.
CAPILLA* Se continua con el retiro de las tejas existentes y el mantenimiento a la estructura de la cubierta.

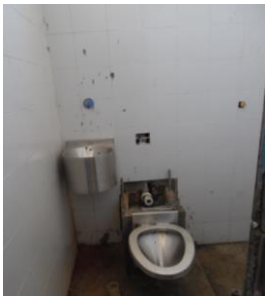






EPMSC TUMACO: NO HUBO ACTIVIDADES EN LA SEMANA

EPMSC TUQUERRES:
BODEGA *NO HUBO ACTIVIDADES EN LA SEMANA
RECLUSORIO MUJERES *Se continua con las excavaciones para la instalación de tubería sanitaria
*Se continua con la instalación de tubería sanitaria y tubería hidraulica
*Se continua con el levantamiento de muros de mampostería





EPMSC IPIALES:
CELDA PRIMARIAS *Se instala la tubería sanitaria y se funde solados de las cajas de inspección.
*Se retiran las puertas existentes
TALLERES *se funde los solados para las cajas de inspección.
*Se funde las vigas de cimentación y se inicia con el levantamiento de muros.
AULAS *Se continua con las excavaciones para la instalación de tubería sanitaria.
* Se funde las vigas de cimentación y se inicia con el levantamiento de muros.
SANIDAD *Se continúa con el raspado y limpieza de muros.
GUARDIAS *Se continua con la demolición de la losa de piso y las excavaciones para la instalación de la tubería sanitaria.








EPMSC LA UNION:
COLECTIVO ESPECIAL: *Se inicio con la demolición de pisos, retiro de enchape del baño.
*Se inicio con el raspado, lijado y limpieza de muros







EPAMS CAS ERE POPAYÁN:
• Pintura de muros de pasillo.
PABELLÓN 8
• Instalación de aparatos sanitarios en zonas comunes.
Limpieza general.
esclusas.

CELDAS PRIMARIAS
• Resane de registros.
•
• Instalación de vidrios en







RM POPAYAN: Fundición de anden en zona de bodega y sanidad, arreglo de losa de bodega, instalación de lavamanos y lavatraperos en sanidad.





EPMSC PUERTO TEJADA
Rancho: No se estan realizando actividades.

Baño de
* Biblioteca: No se estan realizando actividades.





EPMSC SANTANDER QUILICHAO
se recomienda retiro de escombros.
recomienda cambio de tuberia hidraulica y sanitaria.

*Aulas: Demolición de piso,
* Demolición de enchape de baños aulas, se





EPMSC BOLÍVAR:
2) AUIDOTORIO: Se esta realizando nivelación con material de prestamo, fundición de graderia e instalación de tuberia sanitaria.

EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO






EPMSC EL BORDO:
sanitaria, demolición para ventana.

SANIDAD: Concexión de tuberia






EPMSC SILVIA:
Construcción de esclusa para guardia, baños para ppl.

TALLERES: Pulimiento de piso,
BODEGA 2: Camastro, anden de patio trasero.












EPAMS CAS JP PALMIRA:

- **PATIO 4**: Retiro de pintura y pañete existende en muros afectados por humedad en fachada a partir de la celda 7 hasta la 1
- **PATIO 7:** Mantenimiento de estructura para teja termo acústica nueva a instalar
- **PATIO 7:** Instalacion de yumbolon sobre lamina de cielo en celdas de la nave 1.
- **PATIO 7:** Instalacion de teja termoacustica en nave 1.
- **PATIO 7:** Media caña en area de baños y duchas, pintura epoxica.
- **PATIO 7:** Pintura de esmalte en los paneles externos de la nave 1



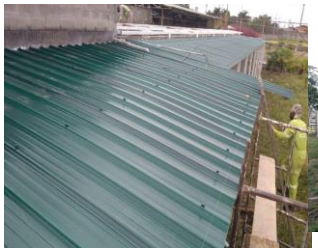



EPAMS BUENAVENTURA:

- **SANIDAD:** Retiro de pintura epoxica existente en muros de sanidad para evaluacion si humedad sigue activa.
- **AULAS EDUCATIVAS:** Pañete en mortero impermeabilizado sobre muros de aulas educativas por acción agresiva de humedad
- **AULAS EDUCATIVAS:** Enchape sobre muros en aulas educativas.
- **AULAS EDUCATIVAS:** Mampostería en ladrillo de cemento para división de área y en exterior para manejo de aguas de tanques
- **AULAS EDUCATIVAS:** instalación de tubería conduit en piso y muros.
- **AULAS EDUCATIVAS:** Repello sobre mamposteria nueva
- **AULAS EDUCATIVAS:** Estuco sobre muros de aulas educativas y en pasillo.








COJAM JAMUNDI:

CASINO:

- Realizando la inspección de tubería y evaluando posibles puntos de perdidas en red se detecto que en el casino se presenta fugas en la tubería y perdías de liquido por daños por lo que se autorizo el movimiento de personal a este sector para atacar el problema donde se realizo excavación, demolición de secciones de piso, cambio de tuberías y reposición de piso

RED HIDRAULICA GENERAL

- Realizando la exploración de las fugas se detecto otra de estas cerca del patio 2 por lo que se decidió intervenir para evitar un gasto excesivo de agua.

PATIO 2:


- No se realiza actividades dado que el personal esta realizando la exploracion de fugas en la red hidraulica

PATIO 3:

- Retiro e instalacion de tuberia sanitaria en fachada.
- Pintura de recubrimiento en tuberia sanitaria instalada.

PATIO 4:

- Retiro de tubería cristalizada y dañada en la parte externa del bloque.
- Instalación de tubería sanitaria por fachada.
- Pintura e recubrimiento en tuberia sanitaria instalada.
- Suministro e instalacion de luminarias en area externa y en pasillo de convugales.










EPMSC CAICEDONIA:

- BIBLIOTECA: Pintura tipo 1 de muros y cielo
- BIBLIOTECA: Instalación luminarias de sobreponer en cielo
- AULA EDUCATIVA: Enchpe de muros de baños
- AULA EDUCATIVA: Enchape de piso en baños.
- AULA EDUCATIVA: Resanes en muros por afectaciones de humedad

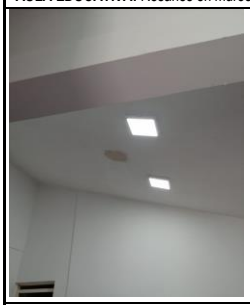






EPMSC CARTAGO:

AULAS EDUCATIVAS

- Exploración de cajas de inspección para derivación de adecuaciones de baños.
- Instalacion de tuberia sanitaria para adecuacion de baños en aulas.
- Acero de refuerzo para para columnetas y viguetas para mamposteria
- Mamposteria en ladrillo tolete para muros de baños.






EPMSC SEVILLA:

RANCHO

- Demolicion de mortero existente de nivelacion



PATIO No.4

- Pañete sobre muros en baños
- Mamposteria para divisiones de baño.

BIBLIOTECA

- Demolicion de piso para cimentacion de muros divisorios para adecuaciones.
- Excavacion para viga de cimentacion de divisiones.
- Armado y amarre de acero de refuerzo para cimentacion y estructura
- Mamposteria en divisiones




EPMSC BUGA:

HOSPITALIZACION SANIDAD

- Se realizo apertura o inicio de obrasel dia 8 de octubre de 2020.
- No se presenta registro de avance de obras dado que establecimiento no permitio el ingreso de camara fotografica.
- Se inicia con la demolicion de los enchapes en muros y piso de baterias sanitarias.
- Retiro de pañete sobre muros.






COJAM JAMUNDI: Se detecto una fuga en la red de la tubería hidráulica del casino por lo que se autorizo la intervención de este espacio para reparar los daños, y dado que este espacio no se tenia contemplado en presupuesto no tiene porcentajes de avance y contratista se encuentra en la terminación de cuantificación de actividades y valoración de las mismas para anexar en presupuesto.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se evidencia poco avance durante la semana por falta de material en obra, no se han termino los trabajos en las dos (2) áreas intervenidas, Pabellon 8 y Celdas Primarias. Se recomienda al contratista realizar resanes de cajas exteriores en pabellon 8.

RM POPAYAN: Se estan realizando fundición de anden en zona de bodega y sanidad, instalación de lavadero y lavamanos en sanidad, demolición de enchape de losa de cubierta de bodega.

EPMSC EL BORDO: SANIDAD: Se esta instalando
tuberia sanitaria, demolición de pared para ventana. El establecimiento solicita puntos COVID (gel antibacterial - termometro, etc) y personal de seguridad en el trabajo. La Dirección del establecimiento, esta solicitando las planillas de seguridad social y capacitaciones, el personal NO cumple con los protocolos.

EPMSC SILVIA: TALLERES: Esclusa para guardia con
baño, baños y duchas para ppl, alistado de piso, resane de paredes. BODEGA 2: Camastro y fundición de anden en patio trasero.

EPMSC BOLÍVAR: EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO
2) AUIDOTORIO: Nivelación de piso con material de prestamos, instalación de tuberia sanitaria y fundición de graderias. El establecimiento solicita puntos COVID (gel antibacterial - termometro, etc) y personal de seguridad en el trabajo. La Dirección del establecimiento, esta solicitando las planillas de seguridad social y capacitaciones, el personal NO cumple con los protocolos.

EPMSC SANTANDER QUILICHAO
*Aulas: Demolición de piso, retiro de escombros, enchape de baños, se solicita el cambio total de tuberia hidraulica y sanitaria.

EPMSC PUERTO TEJADA No se estan
realizando trabajos. Baño de Rancho: Se solicita por el establecimiento
cambio de enchape en su totalidad, lavamanos mal instalado. Mantenimiento completo a la puerta de acceso.
* Biblioteca: regata con tueria de la red electrica.

EPAMS CAS JP PALMIRA:
Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecución de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas eléctricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente eléctrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revisión y presentación de solución para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relación al desarrollo de la atención de la demanda, se solicito a contratista la intervención para instalar una ventana en el área bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellón 4.

CPMS TULUÁ:
Se presento una novedad con relación a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que debería instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, también se debe instalar una solapa metálica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el **EPMSC - RM PASTO:** Teniendo en cuenta el presente informe, hasta la fecha se observa que el atraso que se presenta es considerable y con el fin de cumplir con las obligaciones como interventoría, se solicita realizar una reprogramación o plan de choque, en el cual se debe contemplar que se cuenta con aproximadamente 2 meses para la terminación del contrato y contemplando los inconvenientes por parte del establecimiento.

En el **EPMSC TUMACO**: Teniendo en cuenta la última visita que realizó el día lunes 28 de agosto del año en curso, se apreció que al contratista para terminar las obras en su totalidad le hacen falta detalles menores, sin embargo por parte de la interventoría se le manifestó que no se recibirán pre entregas, se le dio la claridad que se recibirá una vez estén completamente terminadas las obras y una vez se subsane las observaciones realizadas en la visita, cabe resaltar que el contratista ha realizado unas pre entregas a los funcionarios del establecimiento. Adicionalmente el contratista no se encuentra realizando labores no hay personal en obra hasta la fecha por lo cual se le solicito de manera verbal al contratista reanudar labores, finalizar todo lo pendiente y asi evitar atrasos innecesarios.

En el **EPMSC - RM TUQUERRES**: Teniendo en cuenta las visitas que se realizaron en la semana no se ha mirado un gran avance y según la revisión del cronograma se presenta un gran atraso por lo cual se le hizo la anotación al contratista de realizar el ingreso de mas personal de manera inmediata y de tener un buen acopio de material para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se hace la solicitud de una reprogramación o plan de choque de igual manera que en Pasto.

En el **EPMSC IPIALES:** Se le hizo la solicitud al contratista que se vincule mayor personal y se disponga de mayor cantidad de material, debido a que en el establecimiento se ha autorizado el ingreso a 6 espacio por lo cual se necesita un buen rendimiento para poder cumplir con todos.

En el **EPMSC - RM UNION:** Teniendo en cuenta la programación que se cuenta de la Unión no coincide con el tiempo restante de acuerdo al contrato, por lo cual se solicita entregar una nueva reprogramación para poder realizar un seguimiento adecuado a las obras.

De acuerdo con las reuniones sostenidas y las mesas de trabajo adelantadas, el contratista realizo la entrega de un nuevo presupuestos y cronogramas, basados en las actividades definidas en la información inicial suministrada por la USPEC y las condiciones encontradas en los establecimientos intervenidos el día miércoles 02 de septiembre del año en curso.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos presupuestales e inicio de actividades en todos los establecimientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_162 -RECIBO Y ESTADO DE LAS OBRAS EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC TUMACO-; Se solicta dar cierre y finalizar las obras en el establecimiento de Tumaco, hacer la correspondiente entrega y protocolizar el proceso de acuerdo a lo establecido contractualmente.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_164 -SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA – EJECUCIÓN- CONTRATO 140 DE 2020-; Se requiere al contratista presentar PLAN DE CONTINGENCIA para ejecución del contrato dentro de los plazos y montos establecidos contractualmente. Se evidencia un avance de obra semanal muy bajo, lo que genera preocupación con respecto al plazo de ejecución contractual, lo cual nos lleva a calcular que, bajo las condiciones actuales, de continuar el mismo comportamiento difícilmente estarán ejecutadas la totalidad de las actividades en todos los establecimientos y así mismo, agotados los recursos asignados al contrato.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_167 -OBSERVACIONES ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCIÓN - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita informar y/o manifestar la situación dada en cada establecimiento, las razones por las cuales las obras se encuentran paralizadas o ejecutadas a bajo ritmo y el suministro de los documentos requeridos junto con la disponibilidad en la implementación de las solicitudes COVID-19.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_169 -OBSERVACIONES CALIDAD DE OBRA EPMSC PUERTO TEJADA - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita al contratista reparar las observaciones mencionadas de manera imperiosa, así mismo, mejorar la calidad de los acabados e instalaciones y tomar medidas correctivas en los procesos constructivos ya que se ve comprometida la calidad y estabilidad de las obras, además de la disponibilidad del establecimiento en la entrega de áreas para el óptimo avance en la ejecución de los trabajos.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO
Directora Interventoría



Firma
