USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	18	DEL	DÍA	19	MES	10	AÑO	2020	AL	DÍA	25	MES	10	AÑO	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152	Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -	Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152	Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero	Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A	Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020	Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020	Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020	Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020	Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	4,86%	38,80%	PAC Programado (%)	4,86%	38,80%
Valor del PAC Programado ($)	$ 629.018.775,19	$ 5.021.795.982,98	Valor del PAC Programado ($)	$ 629.018.775,19	$ 5.021.795.982,98

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
EPMSC ERE CALI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
COLISEO					
Actividades Programadas (%)	3,42%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	98,48%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.121.897	$ 383.681.211,0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.836.812	$ 377.849.257
SANIDAD (PASILLO)					
Actividades Programadas (%)	11,11%	21,11%	Actividades Ejecutadas (%)	6,11%	26,11%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.109.216	$ 15.408.241,1	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.459.704	$ 19.057.753
RM POPAYÀN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA EXTERIOR					
Actividades Programadas (%)	19,85%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	7,88%	95,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 36.219.451	$ 182.465.746	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 14.378.301	$ 173.342.459
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	100,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	90,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.398.361	$ 7.398.361	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 369.918	$ 6.658.525

BODEGA						
Actividades Programadas (%)	25,00%	45,00%		Actividades Ejecutadas (%)	25,00%	45,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.505.766	$ 4.510.379		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.505.766	$ 4.510.379

EPAMS CAS ERE POPAYÁN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PATIO No 8					
Actividades Programadas (%)	12,19%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	96,12%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.077.732	$ 99.079.018	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.953.951	$ 95.234.752
CELDAS PRIMARIAS					
Actividades Programadas (%)	4,15%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	94,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.949.271	$ 263.837.864	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.276.757	$ 250.388.729

EPMSC PUERTO TEJADA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BAÑO RANCHO					
Actividades Programadas (%)	11,14%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	88,56%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 448.758	$ 4.028.348	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 3.567.505
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA					
Actividades Programadas (%)	31,19%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	92,53%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.081.955	$ 16.293.539	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 15.076.412

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS					
Actividades Programadas (%)	10,00%	40,83%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	27,62%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.575.035	$ 14.596.869	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 9.874.247

EPMSC BOLÍVAR CAUCA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUDITORIO					
Actividades Programadas (%)	10,00%	27,42%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	27,42%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.346.109	$ 17.401.030	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.346.109	$ 17.401.030

EPMSC EL BORDO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	6,66%	18,33%	Actividades Ejecutadas (%)	6,66%	18,33%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.824.216	$ 10.525.207	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.824.216	$ 10.525.207

EPMSC SILVIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	16,67%	47,50%	Actividades Ejecutadas (%)	16,67%	47,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.266.768	$ 23.555.579	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.266.768	$ 23.555.579
BODEGA 2					
Actividades Programadas (%)	35,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	95,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 924.125	$ 2.640.357	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 264.036	$ 2.508.339

EPMSC - RM PASTO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CAPILLA					
Actividades Programadas (%)	11,11%	77,99%	Actividades Ejecutadas (%)	3,20%	48,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.991.508	$ 56.091.939	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.301.554	$ 30.423.673
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	4,28%	64,59%	Actividades Ejecutadas (%)	3,50%	45,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.642.263	$ 235.986.440	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 12.787.114	$ 166.232.480
CELDA 1 - RM					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	56,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 18.522.541	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 10.502.281
CELDA 2 - RM					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	56,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 13.274.841	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 7.460.461
PATIO 2					
Actividades Programadas (%)	16,67%	81,99%	Actividades Ejecutadas (%)	1,20%	35,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.134.580	$ 44.935.410	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 657.690	$ 19.347.040
CELDAS					
Actividades Programadas (%)	16,67%	81,99%	Actividades Ejecutadas (%)	2,10%	9,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.114.841	$ 44.838.311	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.148.470	$ 5.250.149
SANIDAD HOMBRES					
Actividades Programadas (%)	18,18%	79,60%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 29.747.639	$ 130.242.172	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIOS					
Actividades Programadas (%)	5,55%	33,47%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.802.887	$ 125.343.673	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD MUJERES					
Actividades Programadas (%)	28,58%	68,98%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.376.663	$ 34.707.297	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	40,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 236.844.241	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 95.211.385
PATIO CENTRAL					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	89,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 52.630.061	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 46.735.494
PATIOS					
Actividades Programadas (%)	14,76%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	39,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.818.913	$ 107.208.748	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 42.454.664
MURO EXTERIOR					
Actividades Programadas (%)	20,00%	74,08%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	5,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.541.223	$ 9.412.594	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 635.306

EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA					
Actividades Programadas (%)	11,77%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	27,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 22.222.310	$ 188.763.090	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.887.631	$ 52.098.613
CELDAS (HOMBRES)					
Actividades Programadas (%)	8,33%	53,08%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.542.564	$ 60.780.742	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
TALLER - RM					
Actividades Programadas (%)	9,53%	55,67%	Actividades Ejecutadas (%)	3,60%	15,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.905.036	$ 52.050.906	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.366.104	$ 14.118.934
GUARDIAS					
Actividades Programadas (%)	9,53%	55,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.357.923	$ 54.698.081	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES					
Actividades Programadas (%)	7,69%	25,47%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.952.398	$ 32.953.496	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC IPIALES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	12,50%	61,01%	Actividades Ejecutadas (%)	2,10%	7,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 24.633.371	$ 120.232.570	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.138.406	$ 14.582.956
AULAS					
Actividades Programadas (%)	12,50%	61,01%	Actividades Ejecutadas (%)	1,80%	5,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.960.287	$ 73.019.392	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.154.281	$ 6.343.162
RECLUSORIO MUJERES					
Actividades Programadas (%)	9,09%	34,85%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.472.297	$ 36.310.472	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AISLAMIENTO VIGILANTES					
Actividades Programadas (%)	36,71%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,60%	7,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.674.790	$ 29.081.590	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 756.121	$ 2.268.364
PRIMARIAS					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,10%	14,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.941.874	$ 14.045.074
BAÑOS PATIOS					
Actividades Programadas (%)	7,14%	20,06%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.150.134	$ 45.354.960	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	33,34%	66,67%	Actividades Ejecutadas (%)	3,80%	13,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.675.425	$ 37.350.849	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.128.998	$ 7.731.626

EPMSC LA UNION	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	12,50%	30,83%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.534.986	$ 33.386.298	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AILMANIENTO 1 (Colectivas Especiales)					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,20%	6,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 832.929	$ 2.574.508
EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	77,29%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 156.640.160	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.566.401,6	$ 121.067.180
PABELLON 6					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	4,00%	99,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 4.425.720	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 177.028,8	$ 4.381.462,8
PABELLON 7					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	96,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 2.997.179	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 2.877.291,8
EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7					
Actividades Programadas (%)	12,50%	88,50%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	73,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 25.318.157	$ 179.252.550	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 10.127.263	$ 147.858.035
PABELLON No 4					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,00%	96,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 69.512.252	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.085.367,6	$ 66.870.786
EPMSC BUENAVENTURA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	20,00%	80,01%	Actividades Ejecutadas (%)	12,00%	62,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 26.651.493	$ 106.619.299	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 15.990.895,9	$ 83.285.916
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	10,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
COJAM JAMUNDI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CASINO					
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	6,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.418.000	$ 2.418.000	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 1.570.000
PATIO 2					
Actividades Programadas (%)	19,23%	45,90%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	10,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 44.756.105	$ 106.828.144	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.163.705,3	$ 24.437.810,8

PATIO 3						
Actividades Programadas (%)	0,00%	52,43%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	11,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 271.396.714		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 56.939.993,4
PATIO 4						
Actividades Programadas (%)	19,23%	45,93%		Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	12,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 64.469.921	$ 153.983.541		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.352.570,0	$ 40.230.840,1
EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA						
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	99,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 15.302.391		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 15.149.367,1
AULA EDUCATIVA						
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	99,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 8.465.037		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 84.650,4	$ 8.380.386,6
SANIDAD						
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%		Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	10,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.849.145	$ 2.849.145		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.849.145,2	$ 2.849.145,2
EPMSC CARTAGO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS						
Actividades Programadas (%)	12,50%	58,66%		Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	22,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.180.817	$ 71.240.538		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.428.930,7	$ 27.689.810,2
EPMSC SEVILLA	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO						
Actividades Programadas (%)	12,50%	70,80%		Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	50,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.146.687	$ 6.494.837		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 458.674,9	$ 4.586.749,0
PATIO 4						
Actividades Programadas (%)	25,00%	71,16%		Actividades Ejecutadas (%)	8,00%	65,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.660.976	$ 7.574.202		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 851.512,3	$ 6.918.537,6
BIBLIOTECA						
Actividades Programadas (%)	10,00%	20,00%		Actividades Ejecutadas (%)	6,00%	14,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.799.249	$ 15.598.499		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.679.549,6	$ 10.918.949,2
EPMSC BUGA	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
CUARTO HOSPITALIZACION SANIDAD						
Actividades Programadas (%)	10,83%	30,83%		Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	20,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.458.020	$ 6.997.301		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.269.640,3	$ 4.539.280,6

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	8	5	45
RM POPAYAN	8	8	8	8	8	5	45
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUMACO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC IPIALES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC LA UNIÓN	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC EL BORDO	8	8	8	8	8	5	45
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC SEVILLA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CAICEDONIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUGA	8	8	8	8	8	5	45
CPMS TULUÁ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CARTAGO	8	8	8	8	8	5	45

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
CELDAS PRIMARIAS	4,15%	2,00%	100,00%	94,90%	-5,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias).
PABELLON No 8	12,19%	5,00%	100,00%	96,12%	-3,88%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Pabellón No 8).
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA	19,85%	7,88%	100,00%	95,00%	-5,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 4 (Bodega antigua).
SANIDAD	100,00%	5,00%	100,00%	90,00%	-10,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 1 (Sanidad).
EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	11,11%	3,20%	77,99%	48,80%	-29,19%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Capilla).
TALLERES	4,28%	3,50%	64,59%	45,50%	-19,09%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Talleres).
CELDA 1 - RM	0,00%	0,00%	100,00%	56,70%	-43,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
CELDA 2 - RM	0,00%	0,00%	100,00%	56,20%	-43,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
PATIO 2	16,67%	1,20%	81,99%	35,30%	-46,69%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en Patio 2 (novedad).
CELDAS	16,67%	2,10%	81,99%	9,60%	-72,39%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance celdas (motín).
SANIDAD HOMBRES	18,18%	0,00%	79,60%	0,00%	-79,60%	Porcentaje correspondiente específicamente paraavance sanidad hombres.
PATIOS	5,55%	0,00%	33,47%	0,00%	-33,47%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance patios.
SANIDAD MUJERES	28,58%	0,00%	68,98%	0,00%	-68,98%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en sanidad mujeres


EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	0,00%	0,00%	100,00%	40,20%	-59,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Educativas).
PATIO CENTRAL	0,00%	0,00%	100,00%	89,80%	-10,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por desmanes y mantenimiento en Patio Central.
PATIOS	14,76%	0,00%	100,00%	39,60%	-60,40%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios.
MURO EXTERIOR	20,00%	0,00%	74,08%	5,00%	-69,08%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por adecuaciones en el muro exterior.
EPMSC TUQUERRES						
BODEGA	11,77%	1,00%	100,00%	27,60%	-72,40%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Bodega).
CELDAS (HOMBRES)	8,33%	0,00%	53,08%	0,00%	-53,08%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas patio 3).
TALLER - RM	9,53%	3,60%	55,67%	15,10%	-40,57%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres - RM).
GUARDIAS	9,53%	0,00%	55,67%	0,00%	-55,67%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Alojamiento guardias).
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	7,69%	0,00%	25,47%	0,00%	-25,47%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos hombres.
EPMSC IPIALES						
TALLERES	12,50%	2,10%	61,01%	7,40%	-53,61%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres).
AULAS	12,50%	1,80%	61,01%	5,30%	-55,71%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aulas).
RECLUSORIO MUJERES	9,09%	0,00%	34,85%	0,00%	-34,85%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (reclusorio mujeres).
AISLAMIENTO VIGILANTES	36,71%	2,60%	100,00%	7,80%	-92,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (vigilantes).
PRIMARIAS	0,00%	3,10%	0,00%	14,80%	14,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas Primarias).
BAÑOS PATIOS	7,14%	0,00%	20,06%	0,00%	-20,06%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance baños patios.
SANIDAD	33,34%	3,80%	66,67%	13,80%	-52,87%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en la zona de sanidad.
EPMSC LA UNIÓN						
SANIDAD	12,50%	0,00%	30,83%	0,00%	-30,83%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad.
ZONA DE AILMANIENTO 1 (Colectivas Especiales)	0,00%	2,20%	0,00%	6,80%	6,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Colectivas Especiales).
COJAM JAMUNDÍ						
CASINO	10,00%	0,00%	10,00%	6,50%	-3,50%	Se evidencio una fuga y daño en tubería hidráulica del casino del establecimiento por lo que se priorizo la intervención de este este espacio, el cual no estaba en presupuesto, por ende no tiene porcentajes de avance.
RED GENERAL HIDRAULICA	24,18%	15,70%	24,18%	15,70%	-8,48%	Realizando la exploración de las fugas en la red general del establecimiento, se detectó otra fuga, por lo que decidió realizar la intervención.
PATIO 2	19,23%	0,50%	45,90%	10,50%	-35,40%	Exploracion de daños en red hidraulica
PATIO 3	0,00%	0,00%	52,43%	11,00%	-41,43%	No se ejecutaron actividades, dado que se recomienda dar prioridad a zonas COVID-19.
PATIO 4	19,23%	1,00%	45,93%	12,00%	-33,93%	Se instalaron luminarias e hizo reposicion de tuberia sanitaria.


EPMSC BUENAVENTURA						
EDUCATIVAS	20,00%	12,00%	80,01%	62,50%	-17,51%	El avance corresponde a la intervención de aulas educativas en cuento a enchapes, mampostería y redes hidrosanitarias y eléctricas y construccion de muros en mamposteria estructural.
SANIDAD	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	Se iniciaron actividades de demolicion de pañetes y retiro de pintura, exploracion de daños por humedades en cielos donde se observo filtraciones en losa de entrepiso que coresponde a patio 4, pendiente por entregar balance y programacion.
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	3,42%	1,00%	100,00%	98,48%	-1,52%	No se están realizando actividades; que se está interviniendo el pasillo de sanidad y se tiene como ingreso provisional el área de coliseo. Cuando se termine de intervenir el pasillo, se da el acabado de piso, retoques y cierre de acceso provisional.
SANIDAD	11,11%	6,11%	21,11%	26,11%	5,00%	Se esta realizando, cambio de cubierta, resane de muros en concreto.
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AULAS	10,00%	0,00%	40,83%	27,62%	-13,21%	Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%
EPMSC EL BORDO						
SANIDAD	6,66%	6,66%	18,33%	18,33%	0,00%	Se inicio trabajo en la area de sanidad, demolición de baldosa y cambio de tuberia hidrosanitaria.
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	12,50%	5,00%	88,50%	73,00%	-15,50%	El avance corresponde al desmonte de teja metálica de una de las naves del patio 7, se esta realizando el mantenimiento de la estructura de cubierta y adicionando perfileria para soporte de la teja contractual aprobada. Pintura interna de baños
PABELLON No 4	0,00%	3,00%	100,00%	96,20%	-3,80%	Se realiza el raspado de la superficie y pañete de muros afectados por humedades.
EPMSC BOLÍVAR						
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO	10%	10%	27%	27%	0%	Se inicio actividades en la area de educativas (Auditorio), Demolición de pisos en baldosa.
EPMSC SEVILLA						
RANCHO.	13%	5%	71%	50%	-21%	Referido a la demolicion del enchape y del mortero de nivelacion existente
PATIO 4	25%	8%	71%	65%	-6%	adecuacion de baños existentes, retiro de pintura, enchape y pañete existentes
BIBLIOTECA	10%	6%	20%	14%	6%	Demolicion de piso, excavaciones para cimentacines, armado de acero de refuerzo para cimentacion y estructura, mamposteria para divisiones.
EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	0,00%	0,00%	100,00%	99,00%	-1,00%	Avance referido a las adecuaciones de estuco, pintura, baño y red electrica, y esta en mas del 100% dado que se ampliaron cantidades para adecuacion
AULA EDUCATIVA	0,00%	1,00%	100,00%	99,00%	-1,00%	Avance referido a las adecuaciones de estuco, pintura, baño y red electrica, y esta en mas del 100% dado que se ampliaron cantidades para adecuacion
SANIDAD	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	Inicio de actividades en sanidad por afectaciones de humedades en muros y cielos, ademas de deficiencias en red electrica
EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	11,14%	0,00%	100,00%	88,56%	-11,44%	Se recomienda al contratista el cambio del mezclador de ducha, cambio de aparatos eléctricos y resane pintura de puerta. Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%
BIBLIOTECA	31,19%	0,00%	100,00%	92,53%	-7,47%	Se retiro piso en baldosa, se enchapo piso y pared contigua a baterías sanitarias, se impermeabilizo techo. Se le recomienda al contratista regatear la tubería eléctrica. Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%

EPMSC BUGA						
EPMSC BUGA	11%	10%	31%	20%	-11%	Se dio apertura de actividades el dia jueves 08 de octubre de 2020, realizando recorrido para entrega de espacios a intervenir, se adecuo punto de desinfeccion en atencion a protocolo de bioseguridad.
CPMS TULUÁ						
RANCHO ANTIGUO	0,00%	1,00%	100,00%	77,29%	-22,71%	Pintura de muro exterior en aceite como medida de prevencion a la accion de humedad y lluvias sobre zona dura o anden perimetral exterior, Instalacion de puertas.
PABELLON No. 6	0,00%	4,00%	100,00%	99,00%	-1,00%	Avance corresponde a la adecuación de mejoramiento de área de duchas y baños tanto en la parte interna como en la externa del pabellón
PABELLON No. 7	0,00%	0,00%	100,00%	96,00%	-4,00%	pendiente entrega de balance por parte de contratista para ajustar porcentajes de ejecucion debido a la ampliacion de actividades
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	No se intervendra por el contrato, por no presencia de PPL, ni requerimientos.
EPMSC SILVIA						
TALLERES	17%	17%	48%	48%	0%	Se inicia actividades en mejoramiento de guarda escobas en concreto, pulimiento de piso.
BODEGA 2	35%	10%	100%	95%	5%	Cielo falso en pvc, red electrica y resanes de paredes.
EPMSC CARTAGO						
EPMSC CARTAGO	13%	2%	59%	23%	36%	Refereido a actividades de demoliciones, excavaciones, instalacion de tuberia hidrosanitaria, mampostria y concretos

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:
* Pintura en pasillo de sanidad.
* Limpieza de coliseo y alistado de piso.
* lLimpieza de paredes y pintura en paredes de coliseo.

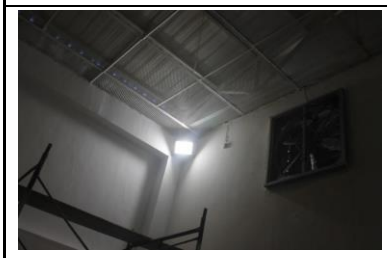

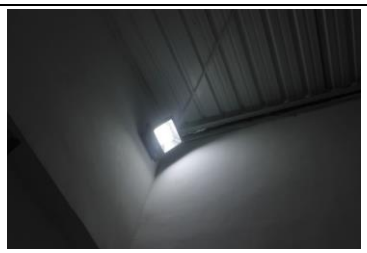


CPMS TULUÁ:
RANCHO ANTIGUO.
- Pintura en base de aceite de muro externo de sanidad
- Instalacion de puertas para futura sanidad

PABELLON No. 6
- Instalacion de sanitarios y lavamanos
- Pintura en base acrilica

NOTA:
Pendiente por entregar balance y programacion para ajustar porcentaje de avance y terminacion dabido a la ampliacion de actividades










EPMSC - RM PASTO:
TALLERES * Se continua con la instalación del pañete y estuco.
*Se inicia con la instalación de enchape de piso
*Se continua con la instalación de enchape de baños
*Se continua con la instalación de los baños.
CELDAS *En las celdas de patio 2 se continua con el hidrolavado.
*Se continua con las reparaciones de camastros y resanes con mortero en los muros
*Se continua con la instalación de repello y pintura.
*Se continua con la construcción y arreglo de los camastros.
*Se inicia con el retiro de puertas para las adecuaciones
CAPILLA* Se finaliza con el mantenimiento a la estructura de la cubierta y se instala las tejas nuevas.

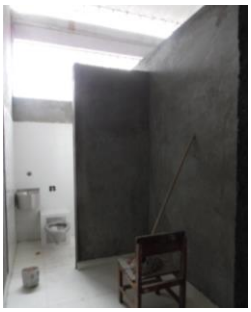








EPMSC TUMACO: No hubo actividades durante la semana.

EPMSC TUQUERRES:
BODEGA *Se continua con demolición de piso
*Se realiza la instalación de push de los baños
RECLUSORIO MUJERES *Se continua con la instalación de tubería sanitaria
*Se finaliza con el levantamiento de muros de mampostería y se continua con el repello de ellos
*Se continua con la fundición de la losa de piso






EPMSC IPIALES:
CELDA PRIMARIAS *Se construyen las cajas de inspección.
*Se inicia con el levante de muro y con la fundición de piso
TALLERES *Se continua con la instalación de tubería sanitaria.
*Se continua con la fundición de vigas de cimentación y con el levantamiento de muros.
AULAS *Se inicia con la instalación de tubería sanitaria.
* Se continua con la fundicion las vigas de cimentación y levantamiento de muros.
SANIDAD *Se continúa con el raspado y limpieza de muros.
GUARDIAS *Se continua con la instalación de la tubería sanitaria.











EPMSC LA UNION:
COLECTIVO ESPECIAL: *Se continuo con la demolición de pañete o repello existente.
*Se realizo la demolición de muros
*Se inicio con la instalación del repello






EPAMS CAS ERE POPAYÁN:
• Pintura de muros de pasillo.
PABELLÓN 8:
• Instalación de aparatos sanitarios en zonas comunes.
Limpieza general.
esclusas.

CELDAS PRIMARIAS:
• Resane de registros.
•
• Instalación de vidrios en






RM POPAYAN: Enchape de placa superior de bodega, instalación de ventanas en celdas exteriores, repello de bodega.







EPMSC PUERTO TEJADA
Rancho: No se estan realizando actividades, se solicita por parte de dirección e Interventoria demolición de enchape de baño.
* Biblioteca: No se estan realizando actividades.
trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%

* Baño de

* Por calidad de los

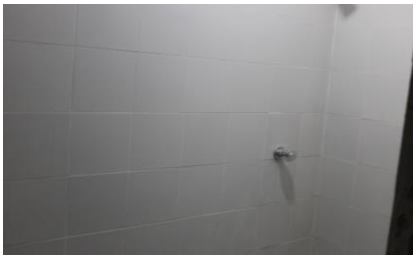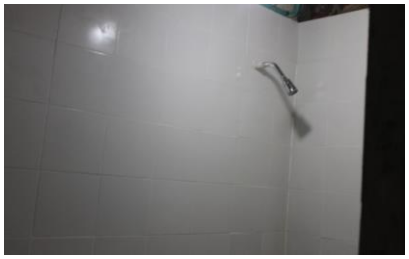EPMSC SANTANDER QUILICHAO * Aulas: NO se están

realizando actividades, se solicita por parte de la Interventoría verificar calidad de los trabajos y manejo de personal de obra.

* Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%





EPMSC BOLÍVAR: EDUCATIVAS (ZONA

AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Fundición de losa de piso, instalación de tuberia hidrosanitaria, pega de muro en ladrillo comun.






EPMSC EL BORDO: SANIDAD: Muro para cerramiento

de puerta, demolición para ventana, media caña, e instalación de tuberia hidrosanitaria.






EPMSC SILVIA: TALLERES: Pulimiento de piso,

Construcción de esclusa para guardia, enchape para ppl. BODEGA 2: Cielo falso, estuco y pintura.







EPAMS CAS JP PALMIRA:

- **PATIO 4**: Retiro de pintura y pañete existende en muros afectados por humedad en fachada a partir de la celda 7 hasta la 1
- PATIO 4: Enpañetado de muros, estuco y pinturas
- **PATIO 7:** Mantenimiento de estructura para teja termo acústica nueva a instalar
- **PATIO 7:** Instalacion de teja termoacustica en nave 1.
- **PATIO 7:** Instalacion de canal en lamina galvanizada en nave 1.
- **PATIO 7:** Media caña en area de baños y duchas, pintura epoxica.
- **PATIO 7:** Pintura de esmalte en los paneles externos y en baño interno de la nave 1

NOTA: A la fecha no se ha entregado balance de actividades de presupuesto y ajustes de cronograma para revalidar los porcentajes de avance de obra dado que se han realizado ampliaciones en la ejecucion de actividades lo cual ampliaria presupuesto de establecimiento y podria reducir porcentajes de avance en cuanto a ejecucion de obra.








EPAMS BUENAVENTURA:

- SANIDAD: Retiro de pintura epoxica existente en muros de sanidad para evaluacion si humedad sigue activa.
- SANIDAD: Demolicion de pañetes existentes sobre muros
- SANIDAD: Pañete sobre muros de sanidad
- **AULAS EDUCATIVAS:** Pañete en mortero impermeabilizado sobre muros de aulas educativas por acción agresiva de humedad
- **AULAS EDUCATIVAS:** Enchape sobre muros en aulas educativas.
- AULAS EDUCATIVAS: Estuco sobre muros de aulas educativas y en pasillo.
NOTA: Pendiente por entregar balance de presupuesto y actividades asi como cronograma ajustado para validar porcentajes de ejecucion dado que se ampliarion algunas actividades y se restringieron otras.






COJAM JAMUNDI:

RED HIDRAULICA GENERAL
- Realizando la exploración de las fugas se detecto otra de estas cerca del patio 2 por lo que se decidió intervenir para evitar un gasto excesivo de agua.
PATIO 2:
- Excavaciones para reparaciones en red hidraulica
PATIO 4:
- Retiro de tubería cristalizada y dañada en la parte externa del bloque.
- Instalación de tubería sanitaria por fachada.
- Pintura e recubrimiento en tuberia sanitaria instalada.
- Suministro e instalacion de luminarias en area externa y en pasillo de conyugales.
NOTA: Pendiente por entregar balance de actividades y programacion para ajustar porcentajes de avance dado la ampliacion de actividades y la restriccion de otras








EPMSC CAICEDONIA:

- BIBLIOTECA: Pintura tipo 1 de muros y cielo
- BIBLIOTECA: Instalación luminarias de sobreponer en cielo
- AULA EDUCATIVA: Enchpe de muros de baños
- AULA EDUCATIVA: Enchape de piso en baños.
- AULA EDUCATIVA: Resanes en muros por afectaciones de humedad
- SANIDAD: retiro de pintura epoxica en muros afectado por humedad
NOTA: Pendiente por entregar balance ajustado y programacion para validacion de porcentajes de avance ejecutados dado la ampliacion de algunas actividades y la restriccion de otras






EPMSC CARTAGO:

AULAS EDUCATIVAS
- Acero de refuerzo para para columnetas y viguetas para mamposteria
- Mamposteria en ladrillo tolete para muros de baños.
- Pañete de muros internos para baños
- Estuco de muros para muros de duchas por la parte externa








EPMSC SEVILLA:

RANCHO

- Excavacion para revision de acometidas sanitarias

PATIO No.4

- Pañete sobre muros en baños
- Mamposteria para divisiones de baño.
- Caja de inspeccion e instalacion de tuberia hidrosanitaria

BIBLIOTECA

- Demolicion de piso para cimentacion de muros divisorios para adecuaciones.
- Excavacion para viga de cimentacion de divisiones.
- Armado y amarre de acero de refuerzo para cimentacion y estructura
- Mamposteria en divisiones







EPMSC BUGA:

HOSPITALIZACION SANIDAD

- Se realizo apertura o inicio de obrasel dia 8 de octubre de 2020.
- Se inicia con la demolicion de los enchapes en muros y piso de baterias sanitarias.
- Retiro de pañete sobre muros.
- Pañete sobre cielo







COJAM JAMUNDI: Se detecto una fuga en la red de la tubería hidráulica del casino por lo que se autorizo la intervención de este espacio para reparar los daños, y dado que este espacio no se tenia contemplado en presupuesto no tiene porcentajes de avance y contratista se encuentra en la terminación de cuantificación de actividades y valoración de las mismas para anexar en presupuesto.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se evidencia poco avance durante la semana por falta de material en obra, no se han termino los trabajos en las dos (2) áreas intervenidas, Pabellon 8 y Celdas Primarias. Se recomienda al contratista realizar resanes de cajas exteriores en pabellon 8.

RM POPAYAN: Se estan realizando fundición de anden en zona de bodega y sanidad, instalación de lavadero y lavamanos en sanidad, demolición de enchape de losa de cubierta de bodega.

EPMSC EL BORDO: SANIDAD: Se esta instalando tuberia sanitaria, demolición de pared para ventana. El establecimiento solicita puntos COVID (gel antibacterial - termometro, etc) y personal de seguridad en el trabajo. La Dirección del establecimiento, esta solicitando las planillas de seguridad social y capacitaciones, el personal NO cumple con los protocolos.

EPMSC SILVIA: TALLERES: Esclusa para guardia con baño, baños y duchas para ppl, alistado de piso, resane de paredes. BODEGA 2: Camastro y fundición de anden en patio trasero.

EPMSC BOLÍVAR: EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Nivelación de piso con material de prestamos, instalación de tuberia sanitaria y fundición de graderias. El establecimiento solicita puntos COVID (gel antibacterial - termometro, etc) y personal de seguridad en el trabajo. La Dirección del establecimiento, esta solicitando las planillas de seguridad social y capacitaciones, el personal NO cumple con los protocolos.

EPMSC SANTANDER QUILICHAO

*Aulas: Demolición de piso, retiro de escombros, enchape de baños, se solicita el cambio total de tuberia hidraulica y sanitaria. * Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%

EPMSC PUERTO TEJADA No se estan realizando trabajos. Baño de Rancho: Se solicita por el establecimiento cambio de enchape en su totalidad, lavamanos mal instalado. Mantenimiento completo a la puerta de acceso.
* Biblioteca: regata con tueria de la red electrica. * Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%

EPAMS CAS JP PALMIRA:

Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecución de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas eléctricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente eléctrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revisión y presentación de solución para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relación al desarrollo de la atención de la demanda, se solicito a contratista la intervención para instalar una ventana en el área bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellón 4.

CPMS TULUÁ:

Se presento una novedad con relación a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que debería instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, también se debe instalar una solapa metálica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el **EPMSC - RM PASTO:** Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

En el **EPMSC - RM PASTO:** Teniendo en cuenta el presente informe, hasta la fecha se observa que el atraso que se presenta es considerable y con el fin de cumplir con las obligaciones como interventoría, se solicito al contratista realizar una reprogramación o plan de choque, en el cual se debe contemplar que se cuenta con aproximadamente 2 meses para la terminación del contrato y contemplando los inconvenientes por parte del establecimiento.

En el **EPMSC TUMACO**: Teniendo en cuenta la última visita que realizó el día lunes 28 de agosto del año en curso, se apreció que al contratista para terminar las obras en su totalidad le hacen falta detalles menores, sin embargo por parte de la interventoría se le manifestó que no se recibirán pre entregas, se le dio la claridad que se recibirá una vez estén completamente terminadas las obras y una vez se subsane las observaciones realizadas en la visita, cabe resaltar que el contratista ha realizado unas pre entregas a los funcionarios del establecimiento. Adicionalmente el contratista no se encuentra realizando labores no hay personal en obra hasta la fecha por lo cual se le solicito de manera verbal al contratista reanudar labores, finalizar todo lo pendiente y asi evitar atrasos innecesarios.

En el **EPMSC - RM TUQUERRES**: Teniendo en cuenta las visitas que se realizaron en la semana no se ha mirado un gran avance y según la revisión del cronograma se presenta un gran atraso por lo cual se le hizo la anotación al contratista de realizar el ingreso de mas personal de manera inmediata y de tener un buen acopio de material para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se hace la solicitud de una reprogramación o plan de choque de igual.

En el **EPMSC IPIALES:** Se le hizo la solicitud al contratista que se vincule mayor personal y se disponga de mayor cantidad de material, debido a que en el establecimiento se ha autorizado el ingreso a 6 espacio por lo cual se necesita un buen rendimiento para poder cumplir con todos, adicionalmente se hace la solicitud de una reprogramación o plan de choque de igual..

En el **EPMSC - RM UNION:** Teniendo en cuenta la programación que se cuenta de la Unión no coincide con el tiempo restante de acuerdo al contrato, por lo cual se solicita entregar una nueva reprogramación para poder realizar un seguimiento adecuado a las obras, adicionalmente no cuenta con suficiente personal en obra ni materiales, se hace dicha anotacion.

De acuerdo con las reuniones sostenidas y las mesas de trabajo adelantadas, el contratista realizo la entrega de un nuevo presupuestos y cronogramas, basados en las actividades definidas en la información inicial suministrada por la USPEC y las condiciones encontradas en los establecimientos intervenidos el día miércoles 02 de septiembre del año en curso.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos presupuestales e inicio de actividades en todos los establecimientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_162 -RECIBO Y ESTADO DE LAS OBRAS EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC TUMACO-; Se solicta dar cierre y finalizar las obras en el establecimiento de Tumaco, hacer la correspondiente entrega y protocolizar el proceso de acuerdo a lo establecido contractualmente.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_164 -SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA – EJECUCIÓN- CONTRATO 140 DE 2020-; Se requiere al contratista presentar PLAN DE CONTINGENCIA para ejecución del contrato dentro de los plazos y montos establecidos contractualmente. Se evidencia un avance de obra semanal muy bajo, lo que genera preocupación con respecto al plazo de ejecución contractual, lo cual nos lleva a calcular que, bajo las condiciones actuales, de continuar el mismo comportamiento difícilmente estarán ejecutadas la totalidad de las actividades en todos los establecimientos y así mismo, agotados los recursos asignados al contrato.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_167 -OBSERVACIONES ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCIÓN - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita informar y/o manifestar la situación dada en cada establecimiento, las razones por las cuales las obras se encuentran paralizadas o ejecutadas a bajo ritmo y el suministro de los documentos requeridos junto con la disponibilidad en la implementación de las solicitudes COVID-19.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_169 -OBSERVACIONES CALIDAD DE OBRA EPMSC PUERTO TEJADA - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita al contratista reparar las observaciones mencionadas de manera imperiosa, así mismo, mejorar la calidad de los acabados e instalaciones y tomar medidas correctivas en los procesos constructivos ya que se ve comprometida la calidad y estabilidad de las obras, además de la disponibilidad del establecimiento en la entrega de áreas para el óptimo avance en la ejecución de los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_171 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas de los establecimientos EPMSC CARTAGO Y EPMSC SEVILLA.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO

Directora Interventoría



Firma
