USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	21	DEL	DÍA	09	MES	11	AÑO	2020	AL	DÍA	15	MES	11	AÑO	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	9,70%	48,50%
Valor del PAC Programado ($)	$ 1.255.683.988,37	$ 6.277.244.978,72

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	9,70%	48,50%
Valor del PAC Programado ($)	$ 1.255.448.995,74	$ 6.277.244.978,72

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

	PROGRAMADO		**EJECUTADO**	
EPMSC ERE CALI	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
COLISEO				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 469.185.442	$ -	$ 469.185.442
SANIDAD	$ 89.372.196,00			
Actividades Programadas (%)	11,11%	21,11%	5,00%	43,61%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.929.251	$ 18.866.471	$ 4.468.610	$ 38.975.215
TUNEL DE ACCESO A SANIDAD	$ 80.533.118,00			
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 80.533.118	$ -	$ 80.533.118
PATIO 10	$ 258.832.405,00			
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 258.832.405	$ -	$ -
RM POPAYÀN	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA EXTERIOR	$ 182.121.141,00			
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	0,00%	97,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 182.121.141	$ -	$ 176.657.507

SANIDAD	$ 9.164.202,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	98,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 9.164.202	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 91.642	$ 8.980.918	
BODEGA	$ 12.415.369,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	65,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 12.415.369	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 620.768	$ 8.069.990	
RANCHO	$ 60.128.279,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 60.128.279	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	

EPAMS CAS ERE POPAYÁN		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON 8 (DESMANES)	$ 111.957.143					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	98,12%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 111.957.143	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 109.852.349	
CELDAS PRIMARIAS	$ 279.988.062					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	96,90%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 279.988.062	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 271.308.432	
EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)	$ 203.758.579					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	76,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 20.375.858	$ 154.856.520	
PABELLON 2 (DESMANES)	$ 185.941.463					
Actividades Programadas (%)	11,11%	21,11%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.658.097	$ 39.252.243	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PABELLON 4 (DESMANES)	$ 126.432.507					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 126.432.507	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS)	$ 35.330.288					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PABELLON 12 (DESMANES)-CUBIERTA	$ 188.518.451					
Actividades Programadas (%)	11,11%	21,11%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.944.400	$ 39.796.245	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	

EPMSC PUERTO TEJADA		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BAÑO RANCHO	$ 5.196.492					
Actividades Programadas (%)	20,00%	88,56%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	92,56%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.039.298	$ 4.602.013	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 103.930	$ 4.809.873	
		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA	$ 29.984.511					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	98,53%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 29.984.511	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 299.845	$ 29.543.739	
RANCHO	$ 60.611.261					
Actividades Programadas (%)	22,22%	40,40%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.467.822	$ 24.486.949	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AISLAMIENTO (UTE)	$ 21.636.858				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 21.636.858	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AULAS EDUCATIVAS	$ 96.333.459				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	35,62%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 96.333.459	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.816.673	$ 34.313.978

EPMSC BOLÍVAR CAUCA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUDITORIO	$ 133.367.596				
Actividades Programadas (%)	9,09%	17,42%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	61,04%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.123.114	$ 23.232.635	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 13.336.760	$ 81.407.581
CONYUGALES UTE	$ 63.336.604				
Actividades Programadas (%)	14,29%	61,90%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.050.801	$ 39.205.358	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC EL BORDO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD	$ 32.909.779				
Actividades Programadas (%)	20,00%	66,11%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	48,11%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.581.956	$ 21.756.655	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 658.196	$ 15.832.895
CELDAS COLECTIVAS	$ 30.326.253				
Actividades Programadas (%)	11,11%	16,11%	Actividades Ejecutadas (%)	27,22%	27,22%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.369.247	$ 4.885.559	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.254.806	$ 8.958.042
CELDAS PRIMARIAS	$ 25.839.150				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 82.818.186				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC SILVIA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES	$ 36.435.423				
Actividades Programadas (%)	6,67%	47,50%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	90,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.430.243	$ 17.306.826	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.643.542	$ 32.791.880
BODEGA TALLERES	$ 3.187.230				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 3.187.230	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 3.187.230
BODEGA SANIDAD	$ 8.046.817				
Actividades Programadas (%)	25,00%	45,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	76,67%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.011.704	$ 3.621.068	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 804.682	$ 2.443.649
SANIDAD	$ 8.775.832				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

AMPLIACIÓN SANIDAD	$ 32.070.451					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC - RM PASTO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
CAPILLA	$ 89.086.568,00					$ 330.669.347
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	54,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 89.086.568		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.227.164	$ 48.284.920
TALLERES	$ 397.461.217,00					
Actividades Programadas (%)	5,11%	79,60%		Actividades Ejecutadas (%)	5,10%	54,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.310.268	$ 316.379.129		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 20.270.522	$ 217.411.286
CELDA 1 - RM	$ 21.473.392					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	3,80%	66,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 21.473.392		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 815.989	$ 14.344.226
CELDA 2 - RM	$ 16.324.773					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	4,20%	67,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 16.324.773		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 685.640	$ 11.051.871
PATIO 2 (EMERGENCIA)	$ 65.343.688					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	4,60%	44,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 65.343.688		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.005.810	$ 29.208.629
CELDAS HOMBRES	$ 39.107.941					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	4,50%	23,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 39.107.941		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.759.857	$ 9.151.258
SANIDAD HOMBRES	$ 200.580.598					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 200.580.598		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO 5 Y 6	$ 277.254.177					
Actividades Programadas (%)	6,66%	52,27%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.465.128	$ 144.920.758		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD MUJERES	$ 58.042.336					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 58.042.336		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3)	$ 33.809.914					
Actividades Programadas (%)	8,33%	15,00%		Actividades Ejecutadas (%)	2,60%	3,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.816.366	$ 5.071.487		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 879.058	$ 1.217.157
ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO	$ 25.942.744					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EMERGENCIA PATIO 4	$ 342.718.171					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS	$ 198.988.490					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	49,00%	89,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 198.988.490		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 97.504.360	$ 177.497.733
PATIO CENTRAL	$ 62.176.240					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	3,00%	92,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 62.176.240		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.865.287	$ 57.761.727

PATIOS (DESMANES)	$ 92.746.485					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	47,00%	84,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 92.746.485		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 43.590.848	$ 78.463.526
MURO EXTERIOR	$ 11.066.374					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	77,00%	82,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 11.066.374		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.521.108	$ 9.074.427
EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES	$ 233.768.115					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	2,10%	34,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 233.768.115		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.909.130	$ 79.948.695
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	$ 98.197.644					
Actividades Programadas (%)	11,11%	74,19%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.909.758	$ 72.852.832		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	$ 115.401.431					
Actividades Programadas (%)	10,53%	76,19%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	16,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.151.771	$ 87.924.350		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 18.810.433
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 121.642.050					
Actividades Programadas (%)	10,53%	76,19%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.808.908	$ 92.679.078		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD HOMBRES	$ 36.664.389					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 46.307.503					
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.261.501	$ 9.261.501		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	$ 160.220.935					
Actividades Programadas (%)	9,09%	42,89%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.564.083	$ 68.718.759		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	$ 76.843.598					
Actividades Programadas (%)	11,11%	21,11%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.537.324	$ 16.221.684		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC IPIALES	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES)	$ 216.167.719					
Actividades Programadas (%)	24,70%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	2,10%	14,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 53.393.427	$ 216.167.719		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.539.522	$ 31.344.319
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	$ 148.217.753					
Actividades Programadas (%)	24,70%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	2,40%	12,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 36.609.785	$ 148.217.753		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.557.226	$ 18.082.566
RECLUSORIO MUJERES	$ 129.064.593					
Actividades Programadas (%)	16,66%	64,02%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 21.502.161	$ 82.627.152		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	$ 36.018.808					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	16,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 36.018.808		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 900.470	$ 5.799.028

PRIMARIAS	$ 117.541.723					
Actividades Programadas (%)	23,33%	53,33%		Actividades Ejecutadas (%)	2,10%	19,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 27.422.484	$ 62.685.001		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.468.376	$ 22.803.094
BAÑOS PATIOS	$ 279.956.057					
Actividades Programadas (%)	8,33%	36,09%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.320.340	$ 101.036.141		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD	$ 57.727.535					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	3,10%	23,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 57.727.535		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.789.554	$ 13.450.516
RANCHO	$ 112.123.554					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC LA UNION	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD	$ 106.655.228					
Actividades Programadas (%)	6,67%	47,50%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.113.904	$ 50.661.233		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	$ 46.881.576					
Actividades Programadas (%)	8,33%	16,67%		Actividades Ejecutadas (%)	4,10%	17,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.905.235	$ 7.815.159		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.922.145	$ 8.157.394
AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	$ 50.399.271					
Actividades Programadas (%)	8,33%	16,67%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.198.259	$ 8.401.558		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 42.476.595					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO COLECTIVO	$ 20.542.234					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO	$ 13.519.222					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO COMÚN BATERÍA	$ 42.440.317					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO	$ 140.143.499					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,35%	79,95%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 140.143.499		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 490.502	$ 112.044.727
PABELLON 6	$ 15.595.903					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 15.595.903		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 155.959	$ 15.595.903,0
PABELLON 7	$ 11.262.583					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	4,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 11.262.583		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 450.503	$ 11.262.583,0

EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7	$ 386.208.686				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,12%	58,1%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 386.208.686	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.325.537	$ 224.464.488
PABELLON No 4	$ 105.731.591				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,50%	91,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 105.731.591	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.585.974	$ 96.955.869

EPMSC BUENAVENTURA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS	$ 143.132.032				$ 108.695.161
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,25%	68,75%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 143.132.032	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.220.471	$ 98.403.272
SANIDAD	$ 171.531.486				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	6,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 10.291.889
AISLAMIENTO MUJERES	$ 42.432.237				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 42.432.237	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 90.610.246				
Actividades Programadas (%)	10,43%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	1,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.450.649	$ 90.610.246	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 906.102,5	$ 906.102
REDES ELECTRICAS	$ 104.459.837				
Actividades Programadas (%)	10,43%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.895.161	$ 104.459.837	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE	$ 26.510.628				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 45.113.987				
Actividades Programadas (%)	8,33%	13,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.757.995	$ 6.013.694	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

COJAM JAMUNDI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PATIO 5	$ 151.430.305				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO 2-UTE Y CONYUGALES	$ 273.317.964				
s Programadas (%)	15,92%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	12,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 43.512.220	$ 273.317.964	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.366.589,8	$ 32.798.155,7
PATIO 3-UTE Y CONYUGALES	$ 344.229.661				
s Programadas (%)	23,95%	100,0000%	Actividades Ejecutadas (%)	0,35%	11,35%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 82.443.004	$ 344.229.661	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.204.803,8	$ 39.070.066,5
PATIO 4-UTE Y CONYUGALES	$ 292.045.460				
s Programadas (%)	16,67%	26,7%	Actividades Ejecutadas (%)	2,59%	18,59%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 48.683.978	$ 77.888.524	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.563.977,4	$ 54.291.251,0

GARITAS Y TRINCHERAS	$ 96.828.303					
s Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
BIBLIOTECA	$ 13.214.834				$ 63.474.149,7	
Actividades Programadas (%)	13,10%	100,0000%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.731.143	$ 13.214.834	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 13.214.834	
AULA EDUCATIVA	$ 39.058.025					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	99,500%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 195.290,1	$ 38.862.735	
SANIDAD	$ 28.491.452					
Actividades Programadas (%)	16,67%	64,0200%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	40,0%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.749.525	$ 18.240.228	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.698.290,4	$ 11.396.581	
EPMSC CARTAGO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
AULAS EDUCATIVAS	$ 141.145.561					
Actividades Programadas (%)	10,00%	46,67%	Actividades Ejecutadas (%)	2,15%	42,95%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.114.556	$ 65.872.633	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.034.629,6	$ 60.622.018,4	
PATIO 4	$ 78.825.272					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
EPMSC SEVILLA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
RANCHO	$ 23.838.150					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	4,65%	54,7%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.108.474,0	$ 13.027.549,0	
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)	$ 36.587.412					
Actividades Programadas (%)	22,22%	42,2200%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.129.723	$ 15.447.205	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
BIBLIOTECA	$ 59.675.771					
Actividades Programadas (%)	10,00%	50,8300%	Actividades Ejecutadas (%)	7,55%	34,6%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.967.577	$ 30.333.194	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.505.520,7	$ 20.617.978,9	
SANIDAD	$ 23.624.972					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,0%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO 4 (BAÑO)	$ 12.885.805					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	90,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 11.597.224,5	
EPMSC BUGA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
CUARTO HOSPITALIZACION SANIDAD	$ 34.172.663					
Actividades Programadas (%)	25,00%	45,00%	Actividades Ejecutadas (%)	6,70%	31,70%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.543.166	$ 15.377.698	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.289.568,4	$ 10.832.734,2	
ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS	$ 22.139.552					
Actividades Programadas (%)	6,67%	47,50%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.476.708	$ 10.516.287	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARIAS	$ 45.470.556					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	

BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2	$ 11.116.793					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7	$ 2.852.892					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	8	5	45
RM POPAYAN	8	8	8	8	8	5	45
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC TUMACO	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC TUQUERRES	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC IPIALES	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC LA UNIÓN	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	8	8	5	21
EPMSC EL BORDO	8	8	8	8	8	5	45
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC SEVILLA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CAICEDONIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	8	8	5	21
EPMSC BUGA	0	8	8	8	8	5	37
CPMS TULUÁ	0	0	0	8	8	5	21
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CARTAGO	8	8	8	8	8	5	45

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
PABELLON No 8	0,00%	0,00%	100,00%	98,12%	-1,88%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Pabellón No 8).
CELDAS PRIMARIAS	0,00%	0,00%	100,00%	96,90%	-3,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias).
EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)	0,00%	10,00%	0,00%	76,00%	76,00%	Se realizo el cambio de la tuberia exterior en pabellon No. 8. En su totalidad.
PABELLON 2 (DESMANES)	11,11%	0,00%	21,11%	0,00%	-21,11%	No se han iniciado actividades.
PABELLON 4 (DESMANES)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	No se han iniciado actividades.
PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.
PABELLON 12 (DESMANES)-CUBIERTA	11,11%	0,00%	21,11%	0,00%	-21,11%	No se han iniciado actividades.
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA (EXTERIOR)	0,00%	0,00%	100,00%	97,00%	-3,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 4 (Bodega antigua).
SANIDAD	0,00%	1,00%	100,00%	98,00%	-2,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 1 (Sanidad).
BODEGA	0,00%	5,00%	100,00%	65,00%	-35,00%	Se estan realizando repellos de piso y paredes.
RANCHO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	No se han iniciado actividades.
EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	0,00%	2,50%	100,00%	54,20%	-45,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Capilla).
TALLERES	5,11%	5,10%	79,60%	54,70%	-24,90%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Talleres).

CELDA 1 - RM	0,00%	3,80%	100,00%	66,80%	-33,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
CELDA 2 - RM	0,00%	4,20%	100,00%	67,70%	-32,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
PATIO 2 (EMERGENCIA)	0,00%	4,60%	100,00%	44,70%	-55,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en Patio 2 (novedad).
CELDAS HOMBRES	0,00%	4,50%	100,00%	23,40%	-76,60%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance celdas (motín).
SANIDAD HOMBRES	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente paraavance sanidad hombres.
PATIO 5 Y 6	6,66%	0,00%	52,27%	0,00%	-52,27%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance patios.
SANIDAD MUJERES	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en sanidad mujeres
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3)	8,33%	2,60%	15,00%	3,60%	-11,40%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en zona comun patios
ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.
EMERGENCIA PATIO 4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.
EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	0,00%	49,00%	100,00%	89,20%	-10,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Educativas).
PATIO CENTRAL	0,00%	3,00%	100,00%	92,90%	-7,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por desmanes y mantenimiento en Patio Central.
PATIOS (DESMANES)	0,00%	47,00%	100,00%	84,60%	-15,40%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios.
MURO EXTERIOR	0,00%	77,00%	100,00%	82,00%	-18,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por adecuaciones en el muro exterior.
EPMSC TUQUERRES						
ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES	0,00%	2,10%	100,00%	34,20%	-65,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Bodega).
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	11,11%	0,00%	74,19%	0,00%	-74,19%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas patio 3).
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	10,53%	0,00%	76,19%	16,30%	-59,89%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres - RM).
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	10,53%	0,00%	76,19%	0,00%	-76,19%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Alojamiento guardias).
SANIDAD HOMBRES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.
RANCHO	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	-20,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance de obra para el area de rancho.
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	9,09%	0,00%	42,89%	0,00%	-42,89%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos hombres.
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	11,11%	0,00%	21,11%	0,00%	-21,11%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos mujeres.
EPMSC IPIALES						
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES)	24,70%	2,10%	100,00%	14,50%	-85,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres).
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	24,70%	2,40%	100,00%	12,20%	-87,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aulas).
RECLUSORIO MUJERES	16,66%	0,00%	64,02%	0,00%	-64,02%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (reclusorio mujeres).
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	0,00%	2,50%	100,00%	16,10%	-83,90%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (vigilantes).
PRIMARIAS	23,33%	2,10%	53,33%	19,40%	-33,93%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas Primarias).
BAÑOS PATIOS	8,33%	0,00%	36,09%	0,00%	-36,09%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance baños patios.
SANIDAD	0,00%	3,10%	100,00%	23,30%	-76,70%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en la zona de sanidad.
RANCHO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.

EPMSC LA UNIÓN						
SANIDAD	6,67%	0,00%	47,50%	0,00%	-47,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad.
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	8,33%	4,10%	16,67%	17,40%	0,73%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Colectivas Especiales).
AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	8,33%	0,00%	16,67%	0,00%	-16,67%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aislamiento guardias y UT).
RANCHO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.
PATIO COLECTIVO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.
ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.
PATIO COMÚN BATERÍA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.
COJAM JAMUNDÍ						
CASINO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Contratista no ha enviado presupuesto de actividades ejecutadas por lo que no se ha reportado avance de terminacion dado que todas las actividades en este espacio ya se ejecutaron, se atendio como emergencia.
PATIO 5 (RED GENERAL HIDRAULICA)	24,18%	15,70%	24,18%	15,70%	-8,48%	No se ha iniciado actividades por la falta de material en cuanto a tuberia de presion para el cambio en redes.
PATIO 2-UTE Y CONYUGALES	15,92%	0,50%	100,00%	12,00%	-88,00%	Excavaciones por daños en red hidraulica pero se suspendieron por falta de material o tuberia para reparacion, se esta cambiando tuberia hidrosanitaria en fachadas que esta dañada o cristalizada.
PATIO 3 -UTE Y CONYUGALES	23,95%	0,35%	100,00%	11,35%	-88,65%	Cambio de tuberia en fachadas, adecuaciones electricas e instalacion de push de presion en baños
PATIO 4- UTE Y CONYUGALES	16,67%	2,59%	26,67%	18,59%	-8,08%	Cambio de tuberia en fachadas, adecuaciones electricas e instalacion de push de presion en baños
GARITAS Y TRINCHERAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.
EPMSC BUENAVENTURA						
EDUCATIVAS	0,00%	2,25%	100,00%	68,75%	-31,25%	El avance corresponde a la intervención de aulas educativas en cuento a enchapes, mampostería y redes hidrosanitarias y eléctricas y construccion de muros en mamposteria estructural.
SANIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	No se realizo ninguna intervencion en esta semana dado que los problemas de humedades en el cielo son por las malas conexiones hidrosanitarias en la placa de entrepiso que corresponde en la parte superior a los alojamientos de personal femenino del inpec.
AISLAMIENTO MUJERES	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Por directriz de la USPEC, esta area no se intervendra ya que hace parte del alcance de otro contrato proximo a ejecutarse con otra entidad.
RANCHO	10,43%	1,00%	100,00%	1,00%	-99,00%	Se inicio en esta semana con la demolicion de los enchapes existentes del piso para revision de conexiones y desagues y una vez mejorado este sistema se enchapara toda el area, contemplando la nivelacion del piso de ser necesaria.
REDES ELECTRICAS	10,43%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	No se ha ejecutado dado que estabelcimiento requiere que se entreguen primero las areas que en este momento estan en ejecucion.
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se ha ejecutado dado que estabelcimiento requiere que se entreguen primero las areas que en este momento estan en ejecucion. Ademas el contratista no ha solicitado el inicio de esta area por posibles problemas que se puedan general al intervenir una estructura hidraulica que tiene un deterioro notable.
AISLAMIENTO GUARDIAS	8,33%	0,00%	13,33%	0,00%	-13,33%	No se ha ejecutado dado que estabelcimiento requiere que se entreguen primero las areas que en este momento estan en ejecucion.

EPMSC ERE CALI						
COLISEO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ENTREGADO
SANIDAD	11,11%	5,00%	21,11%	43,61%	22,50%	Se esta realizando, cambio de cubierta, resane de muros en concreto.
TUNEL DE ACCESO A SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se esta terminando de instalar cuierta en teja termoacustica.
PATIO 10	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	No se han iniciado actividades.
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AISLAMIENTO (UTE)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	No se han iniciado actividades.
AULAS EDUCATIVAS	0,00%	5,00%	100,00%	35,62%	-64,38%	Se esta realizando demolición de enchape y cambio de tuberia hidraulico.
EPMSC EL BORDO						
SANIDAD	20,00%	2,00%	66,11%	48,11%	18,00%	Se inicio trabajo en la area de sanidad, Pintura en epoxica y media caña.
CELDAS COLECTIVAS	11,11%	27,22%	16,11%	27,22%	-11,11%	No se han iniciado actividades.
CELDAS PRIMARIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.
RANCHO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades.
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	0,00%	1,12%	100,00%	58,12%	-41,88%	Dado que se autorizo que se retirara la pintura interna de todas las celdas para aplicar pintura para placas metalicas, contratista se encuentra realizando el retiro de este producto, ha sido demorado el rendiminento, por tanto, el avance no esperado.
PABELLON No 4	0,00%	1,50%	100,00%	91,70%	-8,30%	Puesto que se esta trabajando en las celdas internas y los PPL estan en este espacio el rendimiento no ha sido mayor, manifiesta el contratista puesto que todos los dias les toca realizar los traciegos de materiales herramientas y equipos.
EPMSC BOLÍVAR						
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO	9%	10%	17%	61%	-44%	Se inicio actividades en la area de educativas (Auditorio), Instalación de cielo falso en pvc y enchape de baños.
CONYUGALES UTE	14%	0%	62%	0%	62%	No se han iniciado actividades.
EPMSC SEVILLA						
RANCHO.	0%	5%	0%	55%	55%	Referido a la demolicion del enchape y del mortero de nivelacion existente
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)	22%	0%	42%	0%	-42%	No se ha iniciado porque no se ha entregado biblioteca
BIBLIOTECA	10%	8%	51%	35%	-16%	se esta realizando pinturas y enchapes
SANIDAD	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades.
PATIO 4	22%	0%	42%	0%	-42%	Adecuacion de baños existentes, retiro de pintura, enchape y pañete existentes
EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	13,10%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Adecuaciones entregadas al establecimiento para uso.
AULA EDUCATIVA	0,00%	0,50%	0,00%	99,50%	99,50%	Pendiente reparar afectacion por filtracion en cubierta
SANIDAD	16,67%	20,00%	64,02%	40,00%	-24,02%	Inicio de actividades en sanidad por afectaciones de humedades en muros y cielos, ademas de deficiencias en red electrica

EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	20,00%	2,00%	88,56%	92,56%	4,00%	Se recomienda al contratista el cambio del mezclador de ducha, cambio de aparatos eléctricos y resane pintura de puerta. Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%
BIBLIOTECA	0,00%	1,00%	100,00%	98,53%	-1,47%	Se retiro piso en baldosa, se enchapó piso y pared contigua a baterías sanitarias, se impermeabilizo techo. Se le recomienda al contratista regatear la tubería eléctrica. Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%
RANCHO	22,22%	0,00%	40,40%	0,00%	-40,40%	No se han iniciado actividades.
EPMSC BUGA						
CUARTO HOSPITALIZACIÓN SANIDAD	25%	7%	45%	32%	-13,30%	Se esta interviniendo celdas primarias unicamente pero dabido a que se presento un brote de covid positivo la direccion del establecimiento suspendio los permisos de ingreso para todos los contratistas e interventoria
ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS	7%	0%	48%	0%	-47,50%	No se han iniciado actividades.
ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARÍAS	0%	0%	0%	0%	0,00%	No se han iniciado actividades.
BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	Por solicitud del establecimiento no se intervendrá
ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	Por solicitud del establecimiento no se intervendrá
CPMS TULUÁ						
RANCHO ANTIGUO	0,00%	0,35%	100,00%	79,95%	-20,05%	Se trabajo en la acometida para energia regulada, se presentan retrasos debido a falta de personal para realizar esta actividad y falta de material, ademas se evidencion el afloraiento de humedades en muros.
PABELLON No. 6	0,00%	1,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realiza entrega al establecimiento de las adecuaciones realizadas en este pabellon, se redacta documento formal de entrega y se firma para dejar constancia.
PABELLON No. 7	0,00%	4,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realiza entrega al establecimiento de las adecuaciones realizadas en este pabellon, se redacta documento formal de entrega y se firma para dejar constancia.
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	No se intervendra por el contrato, por no presencia de PPL, ni requerimientos.
EPMSC SILVIA						
TALLERES	7%	10%	48%	90%	-42,50%	Se inicia actividades en mejoramiento de guarda escobas en concreto, pulimiento de piso.
BODEGA 2 TALLERES	0%	0%	100%	100%	0%	Cielo falso en pvc, red electrica y resanes de paredes.
BODEGA SANIDAD	25%	10%	45%	77%	-32%	No se han iniciado actividades.
SANIDAD	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades.
AMPLIACIÓN SANIDAD	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades.
EPMSC CARTAGO						
AULAS EDUCATIVAS	10%	2%	47%	43%	4%	Se esta repellando y estucando muros nuevos de baños, pendiente realizar el cerramineto en las aulas, contratista debe presentar plan de accion por retraso
PATIO 4	0%	0%	0%	0%	0%	Direccion de establecimiento no entregara esta area hasta tanto no se defina el cerramiento del patio de aulas educativas y que el contratista entrege obras ejecutadas.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:
* Desmonte y monte de cubierta en pasillo de sanidad y sanidad.
* Repellos de piso de sanidad.






CPMS TULUÁ:
RANCHO ANTIGUO.
- Se inicio a trabajar el dia miercoles 11 en primer lugar no habia todo el material ni tampoco se habia definido el personal para terminar con la instalacion de la energia regulada en este espacio.
- Se evidencio el afloramiento de humedades en muros laterales perimetrales por lo que se exigio a contratista subsanar estos puntos, para esto se realizo recorrido de chequeo e inspeccion donde se noto que una de las humedades se puede deber a la obstruccion o daño de tuberia hidrosanitaria en las duchas y baños del patio del pabellon 8, dado que la humedad la presenta en la parte inferior de los muros, se autoriza intervenir estos baños con el fin de tratar la humedad de uno de los muros.
- El otro muro que presento humedad nuevamente da hacia el pasillo de comunicacion de ingreso al rancho antiguo, aqui se presenta humedad en la parte baja del muro por lo que se recomienda realizar un enchape a una altura promedio de 1.20 m con el fin de que la lluvia que cae sobre la zona dura (anden) no salpique directamente al muro.

PABELLON No. 6
- Se realiza la entrega al establecimiento de las adecuaciones realizadas en este patio, se recibe a conformidad y se deja plasmado mediante documento formal de acta de entrega.

PABELLON No. 7
- Se realiza la entrega al establecimiento de las adecuaciones realizadas en este patio, se recibe a conformidad y se deja plasmado mediante documento formal de acta de entrega.





EPMSC - RM PASTO:
TALLERES * Se continua con la instalación de la parte eléctrica.
*Se inicia con la instalación del cielo raso en PVC
CELDAS *En las celdas de patio 2 se continua con el hidrolavado de las puertas para continuar con el mantenimiento de ellas.
*Se continua con la instalación de repello o pañete y pintura.
*Se continua con el mantenimiento de las rejas.
CAPILLA* Se continua con la instalación de enchape. **CELDAS RM**
* Se inicia con la demolición del baño de una celda para así subsanar la humedad que esta generando en la zona de aislamiento 1.
PATIO 3 *Se inicia con la demolición de baños, pisos y muros.










EPMSC TUMACO: *Se realizo la adecuación de los pisos que se habían instalado, se instalaron las puertas en la zona de aislamiento (aulas) y la de acceso al establecimiento, se realizo el recorrido de entrega de obra en el cual asistió el personal de la interventoría, contratista y del establecimiento, se realizo el acta de entrega sin embargo por parte del contratista tiene que realizar algunas adecuaciones y unas solicitudes min realizadas por el Directo del establecimiento.



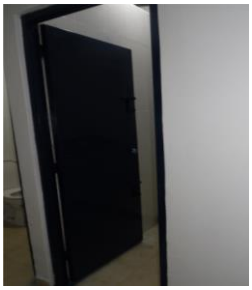



EPMSC TUQUERRES:
BODEGA *Se finalizo con la fundición de losa de piso.
*Se finaliza con la instalación de pañete de muro existente.
*Se inicia con el retiro de las tejas existentes y seguidamente con el mantenimiento de la estructura.
RECLUSORIO MUJERES No se pudo trabajar, debido a que por rebrote de COVID-19 en el establecimiento la Dirección no autoriza el ingreso a trabajadores hasta nueva orden.






EPMSC IPIALES:
CELDA PRIMARIAS *Se inicia con la instalación de tubería hidráulica.
*Se alista el piso para seguidamente iniciar con la instalación del enchape.
TALLERES *Se inicia con la instalación de tubería hidráulica.
AULAS *Se inicia con la instalación de tubería hidráulica.
SANIDAD *Se continua con la aplicación de estuco y se inicia con la pintura epoxica de las paredes.
GUARDIAS *Se inicia con el repello o pañete de muros.
*Se realiza demoliciones y excavaciones para la instalación de tubería sanitaria.



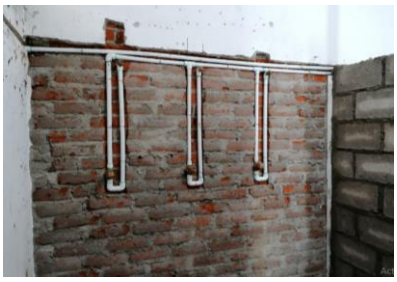




EPMSC LA UNION:
COLECTIVO ESPECIAL *Se inicia con la instalación de tubería sanitaria e hidráulica.
*Se finaliza con la instalación de piso.







EPAMS CAS ERE POPAYÁN:
• Instalación de baterias antibandalicas.
general.
PABELLÓN 8:
• Fundición de cajas exteriores.
• Cambio de luminarias en pasillos.

CELDAS PRIMARIAS:
• Resanes en

• Limpieza general.





RM POPAYAN: Enchape de placa superior de bodega, instalación de ventanas en celdas exteriores, repello de bodega, desagüe de aguas lluvias provisional.






EPMSC PUERTO TEJADA
Rancho: Nuevo enchape de baño e instalación de bateria sanitaria. Se recomienda punto electrico y tapa de bomba. Aseo en general.
* Biblioteca: Falta parte electrica, malla imt y mantenimiento de reja de ventana. Aseo en general.

* Baño de





EPMSC SANTANDER QUILICHAO
realizando resane en paredes.
* Baños: Demolición de enchape en orinal y lavamanos corrido para cambio de tuberia hidrosanitaria.

* Aulas: Se estan





EPMSC BOLÍVAR:
AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Intalación de cielo falso en pvc y enchape de baños.

EDUCATIVAS (ZONA





EPMSC EL BORDO:

SANIDAD: Pintura con epoxica y media caña. Se debe mejorar en los acabados. CELDAS COLECTIVAS: enchape, pintura de puertas y cambio de baterias sanitarias.






EPMSC SILVIA:

instalación de iluminarias.

TALLERES: Pintura de muros,

BODEGA: Instalación de perlines y cubierta.





EPAMS CAS JP PALMIRA:

- **PATIO 4**: Retiro de pintura y pañete existende en muros afectados por humedad en fachada a partir de la celda 7 hasta la 1
- **PATIO 4:** Enpañetado de muros, estuco y pinturas
- **PATIO 7:** Retiro de pintura en placas metalicas y rejas de puertas en celdas de nave 1.
- **PATIO 7:** Instalacion de estructura metalica para cubiera en nave 1, zona de acceso principal
- **PATIO 7:** Retiro de malla eslabonada de cielo en pasillo de nave 1.








EPAMS BUENAVENTURA:

- SANIDAD:

No se esta interviniendo directamente esta area, dado que las humedades en los cielos corresponden a malas conexiones hidrosanitarias en la placa de entrepiso que en su nivel superior corresponde a los alojamientos del personal femenino del inpec, por lo que el contratista esta corrigiendo estas conexiones y realizando las reparaciones necesarias para subsanar el problema.

- **AULAS EDUCATIVAS:**

Enchape sobre muros en aulas educativas.

Estuco sobre muros de aulas educativas y en pasillo

Pintura en pasillo y aulas educativas

- RANCHO:

Se da inicio a la intervencion de esta area, con la demolicion de los enchapes del piso






COJAM JAMUNDI:

RED HIDRAULICA GENERAL

- Realizando la exploración de las fugas se detecto otra de estas cerca del patio 2 por lo que se decidió intervenir para evitar un gasto excesivo de agua.

PATIO 2:

- Excavaciones para reparaciones en red hidraulica

PATIO 4:

- Adecuaciones en muros livianos de sanidad, incluyendo la pintura.
- Instalación de tubería sanitaria por fachada.
- Pintura e recubrimiento en tuberia sanitaria instalada.
- Instalacion de push de presion de duchas en utes.

PATIO 3:

- Cambio de tuberia cristalizada hidrosanitaria, reparaciones electricas






EPMSC CAICEDONIA:

- AULA EDUCATIVA:

Resanes en muros por afectaciones de humedad

Pañete o repello en muros de ampliacion por la parte externa

- SANIDAD:

-retiro de pintura epoxica en muros afectado por humedad

- Resanes en muros internos.
- Pintura de muros internos






EPMSC CARTAGO:

AULAS EDUCATIVAS

- Estuco de muros para muros de duchas por la parte externa
- Instalacion de tuberia hidraulica para lavamanos
- Instalacion de tuberia sanitaria para desagues de baños






EPMSC SEVILLA:

PATIO No.4



- Pendiente suministrar e instalar puertas

BIBLIOTECA

- Pañetes o repellos en mamposteria
- Estuco y pintura de muros
- Enchape de muros

RANCHO:

- Demolicion de enchapes en muros




EPMSC PALMIRA:

PATIO 7: NAVE 1.

Debido a las condiciones generales de las celdas internamente se autorizo el mantenimiento general de todos lo modulos metalicos y la pintura correspondiente, ademas se autorizo el cambio de toda la malla eslabonada del cielo en el pasillo de esta nave, en este sentido se debe realizar un nuevo balance y presupuesto con estas cantidades y tambien la reprogramacion, estos dos documentos se solicitaron a contratista para dar seguimiento al avance semanal.


EPMSC BUGA:

CELDAS PRIMARIAS

- Mampoesteria para muros divisorios de duchas y baños
- Demolicion de mamposteria para proyeccion de columnas de apoyo para viga descolgada y mamposteria
- Columnetas de apoyo de muros en mamposteria
- Pañetes en muros







COJAM JAMUNDI: Se detecto una fuga en la red de la tubería hidráulica del casino por lo que se autorizo la intervención de este espacio para reparar los daños, y dado que este espacio no se tenia contemplado en presupuesto no tiene porcentajes de avance y contratista se encuentra en la terminación de cuantificación de actividades y valoración de las mismas para anexar en presupuesto.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se evidencia poco avance durante la semana por falta de material en obra, no se han termino los trabajos en las dos (2) áreas intervenidas, Pabellon 8 y Celdas Primarias. Estan pendientes lavaderos y baños.

RM POPAYAN: Se están realizando trabajos en bodega, sanidad y caja para aguas lluvias se espera conexión para tubería principal.

EPMSC EL BORDO:
SANIDAD: Se esta aplicando pintura epoxica, instalación de puntos electricos, el personal NO cumple con los protocolos. Se recomienda mejorar el acabado de la pintura.

EPMSC SILVIA:
TALLERES: Pintura de muros, puntos electricos, falta puerta y ventanas.
BODEGA: Instalación de perfiles de cubierta y teja termoacustica.

EPMSC BOLÍVAR:
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Instalación de cielo falso en pvc, repello de paredes y enchape de baños.

EPMSC SANTANDER QUILICHAO
*Aulas: Demolición de piso, retiro de escombros, enchape de baños, se solicita el cambio total de tuberia hidraulica y sanitaria. * Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%

EPMSC PUERTO TEJADA
Baño de Rancho: demolición de enchape y enchape nuevo con tuberia hidrosanitaria. *
Biblioteca: Faltan puntos electricos,mantenimiento reja de ventana e instalación de malla imt. * Se recomienda resanar filos de columnas.

EPAMS CAS JP PALMIRA:
Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecución de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas eléctricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente eléctrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revisión y presentación de solución para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relación al desarrollo de la atención de la demanda, se solicito a contratista la intervención para instalar una ventana en el área bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellón 4.

CPMS TULUÁ:
Se presento una novedad con relación a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que debería instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, también se debe instalar una solapa metálica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el **EPMSC - RM PASTO:** Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

En el EPMSC - RM PASTO: Teniendo en cuenta el presente informe, hasta la fecha se observa que el atraso que se presenta es considerable y que no se está dando cumpliendo a lo estipulado en el plan de contingencia entregado por el contratista, los rendimientos no son los esperados y no se tiene un flujo continuo de material, adicionalmente se entrego los presupuestos ajustados sin continua teniendo falencias y no se entregó una nueva programación por lo tanto no se puede realizar un buen seguimiento.

En el **EPMSC TUMACO**:Una vez el contratista manifestó haber terminado las obras en el establecimiento se realizo una visita el día miércoles 11 de noviembre del año en curso en la cual asistió el personal de interventoría, contratista y del establecimiento, se evidencio que se subsanaron las observaciones realizadas en la anterior visita y se terminaron las obras pendientes, sin embargo en el recorrido hubieron algunas solicitudes por parte del establecimiento las cuales el contratista se comprometió a realizarlas y una vez se terminen se informara a la interventoría para proceder a su revisión y aprobación, cabe aclarar que el acta de entrega se firmo y el contratista.

En el EPMSC - RM TUQUERRES:Teniendo en cuenta el presente informe se observa que el contratista presenta un gran atraso y los rendimientos en obra son los esperados y en obra no hay materiales disponibles para continuar con las actividades programadas, dando como resultado el no cumplimiento al plan de contingencia entregado por el contratista por esta razón se le reitera al contratista el ingreso de más personal de manera inmediata y de tener continuo suministro de material, para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se solicita que se entregue una nueva reprogramación teniendo en cuenta el nuevo balance o presupuesto entregado.

En el EPMSC IPIALES: Teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en el informe, los rendimientos bajos y el no cumplimiento de lo estipulado en el plan de contingencia, se le reitera al contratista que se vincule mayor personal y se tenga una disponibilidad continua de material, debido a que en el establecimiento le ha autorizado el ingreso a 6 espacio por lo cual se necesita un buen rendimiento para poder cumplir con todos, adicionalmente se solicita la entrega del nuevo cronograma o programación la cual este ajustada con el balance que se entrego.

En el EPMSC - RM UNION: Teniendo en cuenta la programación que se cuenta de la Unión no coincide con el tiempo restante de acuerdo al contrato, por lo cual se solicita entregar una nueva reprogramación para poder realizar un seguimiento adecuado a las obras, adicionalmente no cuenta con suficiente personal en obra ni materiales, por lo cual no hay buenos rendimientos en obra y esto genera mayores atrasos.
Adicionalmente no se estan cumpliendo los protocolos de bioseguridad

De acuerdo con las reuniones sostenidas y las mesas de trabajo adelantadas, el contratista realizo la entrega de un nuevo presupuestos y cronogramas, basados en las actividades definidas en la información inicial suministrada por la USPEC y las condiciones encontradas en los establecimientos intervenidos el día miércoles 02 de septiembre del año en curso.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos presupuestales e inicio de actividades en todos los establecimientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_162 -RECIBO Y ESTADO DE LAS OBRAS EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC TUMACO-; Se solicta dar cierre y finalizar las obras en el establecimiento de Tumaco, hacer la correspondiente entrega y protocolizar el proceso de acuerdo a lo establecido contractualmente.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_164 -SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA – EJECUCIÓN- CONTRATO 140 DE 2020-; Se requiere al contratista presentar PLAN DE CONTINGENCIA para ejecución del contrato dentro de los plazos y montos establecidos contractualmente. Se evidencia un avance de obra semanal muy bajo, lo que genera preocupación con respecto al plazo de ejecución contractual, lo cual nos lleva a calcular que, bajo las condiciones actuales, de continuar el mismo comportamiento difícilmente estarán ejecutadas la totalidad de las actividades en todos los establecimientos y así mismo, agotados los recursos asignados al contrato.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_167 -OBSERVACIONES ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCIÓN - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita informar y/o manifestar la situación dada en cada establecimiento, las razones por las cuales las obras se encuentran paralizadas o ejecutadas a bajo ritmo y el suministro de los documentos requeridos junto con la disponibilidad en la implementación de las solicitudes COVID-19.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_169 -OBSERVACIONES CALIDAD DE OBRA EPMSC PUERTO TEJADA - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita al contratista reparar las observaciones mencionadas de manera imperiosa, así mismo, mejorar la calidad de los acabados e instalaciones y tomar medidas correctivas en los procesos constructivos ya que se ve comprometida la calidad y estabilidad de las obras, además de la disponibilidad del establecimiento en la entrega de áreas para el óptimo avance en la ejecución de los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_171 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas de los establecimientos EPMSC CARTAGO Y EPMSC SEVILLA.

SI BIEN EL SEGUIMIENTO SE ESTA REALIZANDO BASADOS EN LOS VALORES CALCULADOS Y PROYECTADOS POR EL CONTRATISTA PARA CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES, SE HA IDENTIFICADO QUE, LOS VALORES DEL DIAGNISTICO NO SON PRECISOS CONSIDERANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ÁREA. EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN UN ÁREA ESPECIFICA, SE CALCULA CON EL AVANCE REGISTRADO DE LAS OBRAS DURANTE LA SEMANA vs VALOR ANTES REFERENCIADO.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO
Directora Interventoría



Firma
