USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 25 DEL DÍA 07 MES 11 AÑO 2020 AL DÍA 13 MES 12 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	10,46%	57,16%
Valor del PAC Programado ($)	$ 1.353.285.969,00	$ 7.398.089.133,68

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	10,46%	57,16%
Valor del PAC Programado ($)	$ 1.353.814.071,70	$ 7.398.089.133,68

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

EPMSC ERE CALI	**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**		
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
COLISEO					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 469.185.442	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 469.185.442
SANIDAD $ 89.372.196,00					
Actividades Programadas (%)	12,50%	82,45%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	72,61%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 11.171.525	$ 73.687.376	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.937.220	$ 64.893.152
TUNEL DE ACCESO A SANIDAD $ 80.533.118,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 80.533.118	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 80.533.118
PATIO 10 $ 258.832.405,00					
Actividades Programadas (%)	14,29%	41,62%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 107.726.047	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

RM POPAYÀN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA EXTERIOR	$ 182.121.141,00				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	97,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 182.121.141	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 176.657.507
SANIDAD	$ 9.164.202,00				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 9.164.202	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 9.164.202
BODEGA	$ 12.415.369,00				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	90,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 12.415.369	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 620.768	$ 11.173.832
RANCHO	$ 60.128.279,00				
Actividades Programadas (%)	15,38%	50,38%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	2,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.247.729	$ 30.292.627	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 1.202.566

EPAMS CAS ERE POPAYÁN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON 8 (DESMANES)	$ 111.957.143				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	99,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 111.957.143	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 110.837.572
CELDAS PRIMARIAS	$ 279.988.062				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	98,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 279.988.062	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 274.388.301
EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)	$ 203.758.579				
Actividades Programadas (%)	0,67%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.365.182	$ 203.758.579	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 203.758.579
PABELLON 2 (DESMANES)	$ 185.941.463				
Actividades Programadas (%)	14,29%	61,90%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 26.571.035	$ 115.097.766	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PABELLON 4 (DESMANES)	$ 126.432.507				
Actividades Programadas (%)	14,29%	60,51%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.067.205	$ 76.504.310	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS	$ 35.330.288				
Actividades Programadas (%)	53,77%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	16,23%	76,23%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.997.096	$ 35.330.288	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.734.106	$ 26.932.279
PABELLON 12 (DESMANES)-CUBIE	$ 188.518.451				
Actividades Programadas (%)	14,29%	60,51%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 26.939.287	$ 114.072.515	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC PUERTO TEJADA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BAÑO RANCHO	$ 5.196.492				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 5.196.492	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 5.196.492
	SEMANAL	ACUMULADO			
BIBLIOTECA	$ 29.984.511				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 29.984.511	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 29.984.511
RANCHO	$ 60.611.261				
Actividades Programadas (%)	11,11%	32,55%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	15,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.733.911	$ 19.728.965	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 9.091.689

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AISLAMIENTO (UTE)	$ 21.636.858				
Actividades Programadas (%)	16,67%	36,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.606.864	$ 7.934.236	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AULAS EDUCATIVAS	$ 96.333.459				
Actividades Programadas (%)	8,33%	81,83%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	47,62%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.024.577	$ 78.829.669	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 45.873.993

EPMSC BOLÍVAR CAUCA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUDITORIO	$ 133.367.596				
Actividades Programadas (%)	9,09%	66,88%	Actividades Ejecutadas (%)	2,47%	87,79%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.123.114	$ 89.196.248	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.294.180	$ 117.083.413
CONYUGALES UTE	$ 63.336.604				
Actividades Programadas (%)	25,00%	41,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.834.151	$ 26.392.363	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC EL BORDO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD	$ 32.909.779				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,89%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 32.909.779	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.280.190	$ 32.909.779
CELDAS COLECTIVAS	$ 30.326.253				
Actividades Programadas (%)	25,00%	45,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.581.563	$ 13.646.814	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 30.326.253
CELDAS PRIMARIAS	$ 25.839.150				
Actividades Programadas (%)	25,00%	45,00%	Actividades Ejecutadas (%)	7,22%	27,22%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.459.788	$ 11.627.618	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.865.587	$ 8.958.042
RANCHO	$ 82.818.186				
Actividades Programadas (%)	25,00%	45,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.704.547	$ 37.268.184	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC SILVIA		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES	$ 36.435.423					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	95,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 36.435.423	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 364.354	$ 34.613.651
BODEGA TALLERES	$ 3.187.230					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 3.187.230	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 3.187.230
BODEGA SANIDAD	$ 8.046.817					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,33%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 8.046.817	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 831.236	$ 3.187.230
SANIDAD	$ 8.775.832					
Actividades Programadas (%)		25,00%	41,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 2.193.958	$ 3.656.889	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AMPLIACIÓN SANIDAD	$ 32.070.451					
Actividades Programadas (%)		0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC - RM PASTO		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CAPILLA	$ 89.086.568,00					$ 423.489.213
Actividades Programadas (%)		6,25%	76,86%	Actividades Ejecutadas (%)	2,10%	67,30%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 5.567.911	$ 68.471.936	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.870.818	$ 59.955.260
TALLERES	$ 397.461.217,00					
Actividades Programadas (%)		11,15%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	62,70%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 44.316.926	$ 397.461.217	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.974.612	$ 249.208.183
CELDA 1 - RM	$ 21.473.392					
Actividades Programadas (%)		1,04%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	8,00%	78,90%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 223.323	$ 21.473.392	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.717.871	$ 16.942.507
CELDA 2 - RM	$ 16.324.773					
Actividades Programadas (%)		0,34%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	71,50%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 55.504	$ 16.324.773	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 11.672.213
PATIO 2 (EMERGENCIA)	$ 65.343.688					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,10%	61,70%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 65.343.688	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.332.528	$ 40.317.056
CELDAS HOMBRES	$ 39.107.941					
Actividades Programadas (%)		38,21%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	4,70%	43,50%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 14.943.144	$ 39.107.941	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.838.073	$ 17.011.954
SANIDAD HOMBRES	$ 200.580.598					
Actividades Programadas (%)		16,67%	78,45%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 33.436.786	$ 157.355.479	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO 5 Y 6	$ 277.254.177					
Actividades Programadas (%)		8,00%	82,92%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 22.180.334	$ 229.899.164	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

SANIDAD MUJERES	$ 58.042.336				
Actividades Programadas (%)	10,00%	71,79%	Actividades Ejecutadas (%)	15,00%	33,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.804.234	$ 41.668.593	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.706.350	$ 19.502.225
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3)	$ 33.809.914				
Actividades Programadas (%)	16,67%	78,45%	Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	14,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.636.113	$ 26.523.878	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 845.248	$ 4.767.198
ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO	$ 25.942.744				
Actividades Programadas (%)	14,29%	69,40%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.707.218	$ 18.004.264	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EMERGENCIA PATIO 4	$ 342.718.171				
Actividades Programadas (%)	12,50%	67,62%	Actividades Ejecutadas (%)		1,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 42.839.771	$ 231.746.027	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 4.112.618
EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS	$ 198.988.490				$ 300.659.116,71
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,60%	90,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 198.988.490	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.183.816	$ 180.681.549
PATIO CENTRAL	$ 62.176.240				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	7,10%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 62.176.240	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.414.513	$ 62.176.240
PATIOS (DESMANES)	$ 92.746.485				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	50,39%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 92.746.485	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 46.734.954
MURO EXTERIOR	$ 11.066.374				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	18,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 11.066.374	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.991.947	$ 11.066.374
EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES	$ 233.768.115				$ 126.900.352,300
Actividades Programadas (%)	5,56%	99,68%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	40,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.997.507	$ 233.020.057	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.337.681	$ 94.676.087
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	$ 98.197.644				
Actividades Programadas (%)	16,67%	30,95%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.369.547	$ 30.392.171	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	$ 115.401.431				
Actividades Programadas (%)	6,67%	90,63%	Actividades Ejecutadas (%)	3,20%	23,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.697.275	$ 104.588.317	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.692.846	$ 26.542.329
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 121.642.050				
Actividades Programadas (%)	25,00%	39,29%	Actividades Ejecutadas (%)	2,10%	4,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 30.410.513	$ 47.793.161	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.554.483	$ 4.987.324

SANIDAD HOMBRES	$ 36.664.389					
Actividades Programadas (%)	16,67%	30,95%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.111.954	$ 11.347.628		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 46.307.503					
Actividades Programadas (%)	16,67%	30,95%		Actividades Ejecutadas (%)	1,50%	1,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.719.461	$ 14.332.172		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 694.613	$ 694.613
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	$ 160.220.935					
Actividades Programadas (%)	16,67%	30,95%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 26.708.830	$ 49.588.379		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	$ 76.843.598					
Actividades Programadas (%)	16,67%	30,95%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.809.828	$ 23.783.094		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC IPIALES	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLER	$ 216.167.719					$ 117.741.933,66
Actividades Programadas (%)	8,33%	89,37%		Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	18,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.006.771	$ 193.189.090		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.161.677	$ 38.910.189
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	$ 148.217.753					
Actividades Programadas (%)	6,22%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	14,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.219.144	$ 148.217.753		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 21.343.356
RECLUSORIO MUJERES	$ 129.064.593					
Actividades Programadas (%)	13,33%	48,71%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.204.310	$ 62.867.363		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	$ 36.018.808					
Actividades Programadas (%)	12,50%	52,34%		Actividades Ejecutadas (%)	5,30%	27,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.502.351	$ 18.852.244		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.908.997	$ 9.977.210
PRIMARIAS	$ 117.541.723					
Actividades Programadas (%)	20,00%	81,79%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	22,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.508.345	$ 96.137.375		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 26.094.263
BAÑOS PATIOS	$ 279.956.057					
Actividades Programadas (%)	13,33%	48,71%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 37.318.142	$ 136.366.595		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD	$ 57.727.535					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	1,20%	37,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 57.727.535		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 692.730	$ 21.416.915
RANCHO	$ 112.123.554					
Actividades Programadas (%)	13,33%	48,71%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.946.070	$ 54.615.383		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC LA UNION	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD	$ 106.655.228				$ 12.048.565
Actividades Programadas (%)	16,67%	29,17%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.779.427	$ 31.111.330	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	$ 46.881.576				
Actividades Programadas (%)	7,38%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,40%	25,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.459.860	$ 46.881.576	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.593.974	$ 12.048.565
AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	$ 50.399.271				
Actividades Programadas (%)	16,67%	29,17%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.401.558	$ 14.701.467	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 42.476.595				
Actividades Programadas (%)	16,67%	29,17%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.080.848	$ 12.390.423	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO COLECTIVO	$ 20.542.234				
Actividades Programadas (%)	33,33%	53,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.846.727	$ 10.955.173	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO	$ 13.519.222				
Actividades Programadas (%)	33,33%	53,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.505.957	$ 7.209.801	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO COMÚN BATERÍA	$ 42.440.317				
Actividades Programadas (%)	33,33%	53,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.145.358	$ 22.633.421	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO	$ 140.143.499				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,87%	81,820%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 140.143.499	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.219.248	$ 114.665.411
PABELLON 6	$ 15.595.903				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 15.595.903	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 15.595.903,0
PABELLON 7	$ 11.262.583				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 11.262.583	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 11.262.583,0
EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7	$ 386.208.686				
Actividades Programadas (%)	5,00%	96,14%	Actividades Ejecutadas (%)	4,56%	73,7%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 19.310.434	$ 371.301.031	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 17.611.116	$ 284.481.318
PABELLON No 4	$ 105.731.591				
Actividades Programadas (%)	17,86%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	97,950%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.883.662	$ 105.731.591	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 103.564.093

EPMSC BUENAVENTURA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS	$ 143.132.032				
Actividades Programadas (%)	3,47%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,35%	82,4000%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.966.682	$ 143.132.032	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.794.923	$ 117.940.794
SANIDAD	$ 171.531.486				
Actividades Programadas (%)	10,00%	81,27%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	6,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.153.149	$ 139.403.639	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 10.291.889
AISLAMIENTO MUJERES	$ 42.432.237				
Actividades Programadas (%)	9,09%	45,18%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.857.090	$ 19.170.885	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 90.610.246				
Actividades Programadas (%)	9,09%	45,18%	Actividades Ejecutadas (%)	1,25%	15,750%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.236.471	$ 40.937.709	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.132.628,1	$ 14.271.114
REDES ELECTRICAS	$ 104.459.837				
Actividades Programadas (%)	9,09%	45,18%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.495.399	$ 47.194.954	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE	$ 26.510.628				
Actividades Programadas (%)	33,33%	53,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.835.992	$ 14.138.118	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 45.113.987				
Actividades Programadas (%)	16,67%	36,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.520.502	$ 16.543.299	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
COJAM JAMUNDI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PATIO 5	$ 151.430.305				
Actividades Programadas (%)	16,67%	29,17%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 25.243.432	$ 44.172.220	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO 2-UTE Y CONYUGALES	$ 273.317.964				
Actividades Programadas (%)	6,25%	67,7800%	Actividades Ejecutadas (%)	0,85%	16,850%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.082.373	$ 185.254.916	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.323.202,7	$ 46.054.076,9
PATIO 3-UTE Y CONYUGALES	$ 344.229.661				
Actividades Programadas (%)	6,25%	50,7200%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	12,350%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 21.514.354	$ 174.593.284	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 42.512.363,1
PATIO 4-UTE Y CONYUGALES	$ 292.045.460				
Actividades Programadas (%)	10,53%	40,8%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	27,19%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 30.752.387	$ 119.242.161	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.460.227,3	$ 79.407.160,6
GARITAS Y TRINCHERAS	$ 96.828.303				
Actividades Programadas (%)	16,67%	29,17%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.141.278	$ 28.244.816	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA	$ 13.214.834				$ 78.905.120,1
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,0000%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 13.214.834	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 13.214.834
AULA EDUCATIVA	$ 39.058.025				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)		99,500%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 39.058.025	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 38.862.735
SANIDAD	$ 28.491.452				
Actividades Programadas (%)	7,14%	44,8600%	Actividades Ejecutadas (%)	2,56%	94,2%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.034.290	$ 12.781.265	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 729.381,2	$ 26.827.551

EPMSC CARTAGO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS	$ 141.145.561				
Actividades Programadas (%)	8,93%	81,4600%	Actividades Ejecutadas (%)	3,35%	61,65%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.604.299	$ 114.977.174	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.728.376,3	$ 87.016.238,4
PATIO 4	$ 78.825.272				
Actividades Programadas (%)	11,76%	43,40%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.269.852	$ 34.210.168	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC SEVILLA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO	$ 23.838.150				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,45%	69,6%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 23.838.150	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 584.034,7	$ 16.579.433,3
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)	$ 36.587.412				
Actividades Programadas (%)	25,00%	41,6700%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.146.853	$ 15.245.975	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
BIBLIOTECA	$ 59.675.771				
Actividades Programadas (%)	5,38%	62,2800%	Actividades Ejecutadas (%)	7,65%	56,1%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.210.556	$ 37.166.070	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.565.196,5	$ 33.448.269,6
SANIDAD	$ 23.624.972				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,0%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 23.624.972	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO 4 (BAÑO)	$ 12.885.805				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	97,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 12.885.805	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 12.499.230,9

EPMSC BUGA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CUARTO HOSPITALIZACION SANIDAD	$ 34.172.663				
Actividades Programadas (%)	18,18%	56,0%	Actividades Ejecutadas (%)	6,35%	78,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.212.590	$ 19.123.022	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.169.964,1	$ 26.962.231,1
ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS	$ 22.139.552				
Actividades Programadas (%)	18,18%	55,9600%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.024.971	$ 12.389.293	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARIAS	$ 45.470.556					
Actividades Programadas (%)	9,96%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.528.867	$ 45.470.556		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2	$ 11.116.793					
Actividades Programadas (%)	18,18%	34,85%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.021.033	$ 3.874.202		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7	$ 2.852.892					
Actividades Programadas (%)	18,18%	55,96%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 518.656	$ 1.596.478		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	8	5	45
RM POPAYAN	8	8	8	8	8	5	45
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUMACO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUQUERRES	0	0	8	8	8	5	29
EPMSC IPIALES	0	0	4	8	8	5	25
EPMSC LA UNIÓN	0	0	8	8	8	5	29
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC EL BORDO	8	8	8	8	8	5	45
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC SEVILLA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CAICEDONIA	0	0	0	8	8	5	21
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUGA	8	8	8	8	8	5	45
CPMS TULUÁ	0	0	8	8	8	5	29
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CARTAGO	8	8	8	8	8	5	45

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
PABELLON No 8	0,00%	0,00%	100,00%	99,00%	-1,00%	No se ha realizado entrega de esta zona, falta botoneras, 7 tapas de cajas, reja de esclusa.
CELDAS PRIMARIAS	0,00%	0,00%	100,00%	98,00%	-2,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias). No se ha terminado parte electrica y botoneras. (No se estan realizando actividades).
EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)	0,67%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realizo el cambio de la tuberia exterior en pabellon No. 8. En su totalidad. (No se estan realizando actividades).
PABELLON 2 (DESMANES)	14,29%	0,00%	61,90%	0,00%	-61,90%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
PABELLON 4 (DESMANES)	14,29%	0,00%	60,51%	0,00%	-60,51%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS)	53,77%	16,23%	100,00%	76,23%	-23,77%	Se inicio actividades (redes electricas).
PABELLON 12 (DESMANES)-CUBIERTA	14,29%	0,00%	60,51%	0,00%	-60,51%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).

RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA (EXTERIOR)	0,00%	0,00%	100,00%	97,00%	-3,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 4 (Bodega antigua). Se espera solucionar aguas lluvias.
SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 1 (Sanidad). Se espera realizar entrega del espacio.
BODEGA	0,00%	5,00%	100,00%	90,00%	-10,00%	Se estan realizando enchape de piso y pintura de paredes.
RANCHO	15,38%	0,00%	50,38%	2,00%	-48,38%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	6,25%	2,10%	76,86%	67,30%	-9,56%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Capilla).
TALLERES	11,15%	1,00%	100,00%	62,70%	-37,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Talleres).
CELDA 1 - RM	1,04%	8,00%	100,00%	78,90%	-21,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
CELDA 2 - RM	0,34%	0,00%	100,00%	71,50%	-28,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
PATIO 2 (EMERGENCIA)	0,00%	5,10%	100,00%	61,70%	-38,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en Patio 2 (novedad).
CELDAS HOMBRES	38,21%	4,70%	100,00%	43,50%	-56,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance celdas (motín).
SANIDAD HOMBRES	16,67%	0,00%	78,45%	0,00%	-78,45%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad hombres.
PATIO 5 Y 6	8,00%	0,00%	82,92%	0,00%	-82,92%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance patios.
SANIDAD MUJERES	10,00%	15,00%	71,79%	33,60%	-38,19%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en sanidad mujeres
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3)	16,67%	2,50%	78,45%	14,10%	-64,35%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en zona comun patios
ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO	14,29%	0,00%	69,40%	1,20%	-68,20%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
EMERGENCIA PATIO 4	12,50%	0,00%	67,62%	1,20%	-66,42%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	0,00%	1,60%	100,00%	90,80%	-9,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Educativas).
PATIO CENTRAL	0,00%	7,10%	100,00%	100,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por desmanes y mantenimiento en Patio Central.
PATIOS (DESMANES)	0,00%	0,00%	100,00%	50,39%	-49,61%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios.
MURO EXTERIOR	0,00%	18,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por adecuaciones en el muro exterior.
EPMSC TUQUERRES						
ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES	5,56%	1,00%	99,68%	40,50%	-59,18%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Bodega).
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	16,67%	0,00%	30,95%	0,00%	-30,95%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas patio 3).
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	6,67%	3,20%	90,63%	23,00%	-67,63%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres - RM).
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	25,00%	2,10%	39,29%	4,10%	-35,19%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Alojamiento guardias).
SANIDAD HOMBRES	16,67%	0,00%	30,95%	0,00%	-30,95%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
RANCHO	16,67%	1,50%	30,95%	1,50%	-29,45%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance de obra para el area de rancho.
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	16,67%	0,00%	30,95%	0,00%	-30,95%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos hombres.
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	16,67%	0,00%	30,95%	0,00%	-30,95%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos mujeres.

EPMSC IPIALES						
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES)	8,33%	1,00%	89,37%	18,00%	-71,37%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres).
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	6,22%	0,00%	100,00%	14,40%	-85,60%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aulas).
RECLUSORIO MUJERES	13,33%	0,00%	48,71%	0,00%	-48,71%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (reclusorio mujeres).
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	12,50%	5,30%	52,34%	27,70%	-24,64%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (vigilantes).
PRIMARIAS	20,00%	0,00%	81,79%	22,20%	-59,59%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas Primarias).
BAÑOS PATIOS	13,33%	0,00%	48,71%	0,00%	-48,71%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance baños patios.
SANIDAD	0,00%	1,20%	100,00%	37,10%	-62,90%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en la zona de sanidad.
RANCHO	13,33%	0,00%	48,71%	0,00%	-48,71%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
EPMSC LA UNIÓN						
SANIDAD	16,67%	0,00%	29,17%	0,00%	-29,17%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad.
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	7,38%	3,40%	100,00%	25,70%	-74,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Colectivas Especiales).
AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	16,67%	0,00%	29,17%	0,00%	-29,17%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aislamiento guardias y UT).
RANCHO	16,67%	0,00%	29,17%	0,00%	-29,17%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
PATIO COLECTIVO	33,33%	0,00%	53,33%	0,00%	-53,33%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO	33,33%	0,00%	53,33%	0,00%	-53,33%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
PATIO COMÚN BATERÍA	33,33%	0,00%	53,33%	0,00%	-53,33%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
COJAM JAMUNDÍ						
CASINO	16,67%	0,00%	29,17%	0,00%	-29,17%	Contratista no ha enviado presupuesto de actividades ejecutadas por lo que no se ha reportado avance de terminacion dado que todas las actividades en este espacio ya se ejecutaron, se atendio como emergencia.
PATIO 5 (RED GENERAL HIDRAULICA)	24,18%	15,70%	24,18%	15,70%	-8,48%	No se ha iniciado actividades por la falta de material en cuanto a tuberia de presion para el cambio en redes.
PATIO 2-UTE Y CONYUGALES	6,25%	0,85%	67,78%	16,85%	-50,93%	Cambio de valvulas de lavamanos y sanitarios, mantenimiento de redes hidrosanitarias, cambio de tuberia sanitaria cristalizada.
PATIO 3 -UTE Y CONYUGALES	6,25%	0,00%	50,72%	12,35%	-38,37%	No se ejecutaron actividades en este patio durante esta semana dado que se esta priorizando la ejecucion de actividades para entrega de zonas covid
PATIO 4- UTE Y CONYUGALES	10,53%	0,50%	40,83%	27,19%	-13,64%	Cambio de valvulas para lavamanos, push de sanitarios y de duchas, en conyugales y utes, cambio de tuberia sanitaria, cambio de luminarias en utes y conyugales
GARITAS Y TRINCHERAS	16,67%	0,00%	29,17%	0,00%	-29,17%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
EPMSC BUENAVENTURA						
EDUCATIVAS	3,47%	3,35%	100,00%	82,40%	-17,60%	Se termina de enchapar la zona de baños y se da inicio a la instalacion de sanitarios, lavamanos, y duchas, se espera que humedades disminuyan para terminar de pintar muros.
SANIDAD	10,00%	0,00%	81,27%	6,00%	-75,27%	No se han reiniciado las actividades en este espacio dado que contratista no ha logrado coordinar con la empresa autorizada para retirar el equipo de odontologia del consultorio, ademas volvio a aflorar humedades por capilaridad al igual que en rancho, por lo que se debe realizar la exploracion para determinar si habira que realizar el mismo trabajo que en
AISLAMIENTO MUJERES	9,09%	0,00%	45,18%	0,00%	-45,18%	Por directriz de la USPEC, esta area no se intervendra ya que hace parte del alcance de otro contrato proximo a ejecutarse con otra entidad.

RANCHO	9,09%	1,25%	45,18%	15,75%	-29,43%	Continua la demolicion de enchape existente y se observo que debajo de este enchape se encontro un afinado en malas condiciones puesto que al demoler se pudo apreciar que existio otro enchape en un nivel mas bajo por lo que se autoriza la demolicion completa.
REDES ELECTRICAS	9,09%	0,00%	45,18%	0,00%	-45,18%	No se ha ejecutado dado que estabelcimiento requiere que se entreguen primero las areas que en este momento estan en ejecucion.
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE	33,33%	0,00%	53,33%	0,00%	-53,33%	No se ha ejecutado dado que estabelcimiento requiere que se entreguen primero las areas que en este momento estan en ejecucion. Ademas el contratista no ha solicitado el inicio de esta area por posibles problemas que se puedan general al intervenir una estructura hidraulica que tiene un deterioro notable.
AISLAMIENTO GUARDIAS	16,67%	0,00%	36,67%	0,00%	-36,67%	No se ha ejecutado dado que estabelcimiento requiere que se entreguen primero las areas que en este momento estan en ejecucion.
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ENTREGADO
SANIDAD	12,50%	10,00%	82,45%	72,61%	-9,84%	Se esta realizando, Estuco de paredes, pintura epoxica y acabados de muros en drywall.
TUNEL DE ACCESO A SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ENTREGADO
PATIO 10	14,29%	0,00%	41,62%	0,00%	-41,62%	No se han iniciado actividades. Retrasos en la entrega de las otras areas.
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AISLAMIENTO (UTE)	16,67%	0,00%	36,67%	0,00%	-36,67%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
AULAS EDUCATIVAS	8,33%	0,00%	81,83%	47,62%	-34,21%	Se esta realizando enchape de piso, pintura de muros. (No se estan realizando actividades).
EPMSC EL BORDO						
SANIDAD	0,00%	3,89%	100,00%	100,00%	0,00%	Por entregar.
CELDAS COLECTIVAS	25,00%	0,00%	45,00%	100,00%	-55,00%	Finalizado en espera por realizar entrega.
CELDAS PRIMARIAS	25,00%	7,22%	45,00%	27,22%	17,78%	Cimentación.
RANCHO	25,00%	0,00%	45,00%	0,00%	45,00%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	5,00%	4,56%	96,14%	73,66%	-22,48%	Se termina de realizar el retiro de pintura de laminas metalicas de las celdas internas, y re realizo la limpieza y lavado para aplicación de anticorrosvio color blanco y pintura a base de aceite, se retiran las rejas de las celdas para realizar la limpieza y terito de pintura para pintarlas de color azul, estuco de cuerto de ingreso para personal medico y guardias
PABELLON No 4	17,86%	0,00%	100,00%	97,95%	-2,05%	Se esta terminando de realizar los tratamientos para humedades en las losas de cubierta de escalera y cocina del pabellon 4.
EPMSC BOLÍVAR						
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO	9%	2%	67%	88%	-21%	Se inicio actividades en la area de educativas (Auditorio), Pintura de muros, solucionando filtración de agua.
CONYUGALES UTE	25%	0%	42%	0%	42%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.

EPMSC SEVILLA						
RANCHO.	0%	2%	100%	70%	-30%	Enchape y pintura en muros
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)	25%	0%	42%	0%	-42%	No se ha iniciado porque no se ha entregado biblioteca
BIBLIOTECA	5%	8%	62%	56%	-6%	Estucos, pinturas y enchapes en muros, Mantenimiento y adicion de estructura metalica para cubierta, cambio de tejas termoacusticas
SANIDAD	0%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
PATIO 4	25%	0%	42%	0%	-42%	Se instalaron los sanitarios, lavamanos y duchas, se termino de realizar enchapes y pinturas
EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Adecuaciones entregadas al establecimiento para uso.
AULA EDUCATIVA	0,00%	0,00%	100,00%	99,50%	-0,50%	Se reparo muro por afloramiento de humedad y se esta a la espera de que no se presente esta novedad para entregar. Se auotorizo el enchape a media altura de muro por la parte externa ya que esta expuesto a intemperie.
SANIDAD	7,14%	2,56%	44,86%	94,16%	49,30%	Se esta trabajando en el cambio de pañetes en muros, estucos, enchapes y pinturas epoxicas en muros.
EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
BIBLIOTECA	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se instalo malla de reja de ventana, se recomienda cambio de aparatos electricos. (No se estan realizando actividades).
RANCHO	11,11%	0,00%	32,55%	15,00%	-17,55%	Se inicio área a intervenir con el retiro de enchape. (No se estan realizando actividades).
EPMSC BUGA						
CUARTO HOSPITALIZACIÓN SANIDAD	18%	6%	56%	79%	22,94%	Se termino de levantar la mamposteria, de empañetar y estucar los muros interna y externamente, se realizo la construccion de pileta para lavamanos y de banca corrida en concreto
ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS	18%	0%	56%	0%	-55,96%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARÍAS	10%	0%	100%	0%	-100,00%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2	18,18%	0%	35%	0%	-34,85%	Por solicitud del establecimiento esta área no se intervendrá
ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7	18,18%	0%	56%	0%	-55,96%	Por solicitud del establecimiento esta área no se intervendrá
CPMS TULUÁ						
RANCHO ANTIGUO	0,00%	0,87%	100,00%	81,82%	-18,18%	Contratista ingreso personal y material para atender y corregir los afloramientos de humedades en esta area.
PABELLON No. 6	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realiza entrega al establecimiento de las adecuaciones realizadas en este pabellon, se redacta documento formal de entrega y se firma para dejar constancia.
PABELLON No. 7	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realiza entrega al establecimiento de las adecuaciones realizadas en este pabellon, se redacta documento formal de entrega y se firma para dejar constancia.
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	No se intervendra por el contrato, por no presencia de PPL, ni requerimientos.
EPMSC SILVIA						
TALLERES	0%	1%	100%	95%	5,00%	Se espera el acabado del piso, carpinteria metalica.
BODEGA 2 TALLERES	0%	0%	100%	100%	0%	Finalizado actividades espera de realizar entrega.
BODEGA SANIDAD	0%	10%	100%	100%	0%	Estuco de paredes, pintura y carpinteria metalica.
SANIDAD	25%	0%	42%	0%	42%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
AMPLIACIÓN SANIDAD	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.

EPMSC CARTAGO						
AULAS EDUCATIVAS	9%	3%	81%	62%	20%	Estuco y pintura al interior de aulas educativas, instalacion de estructura de soporte para instalacion de malla de seguridad en acero expandido, inicio de instalacion de malla
PATIO 4	12%	0%	43%	0%	43%	Direccion de establecimiento no entregara esta area hasta tanto no se defina el cerramiento del patio de aulas educativas y que el contratista entrege obras ejecutadas.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:
* Se realiza Instalación de estructura para la instalación del cielo raso PVC.
*Se realiza tendido de tubería conduit para cableado eléctrico.
* Se realiza la instalación de tuberia IMT para conducción de cable hasta tomas e interruptores.
* Se realiza instalación de cielo raso en PVC.
* Se realiza instalación de luminarias redondas de 18W.
*Se realiza regatas para sistema sanitario.
*Se realiza instalación de tubería sanitaria.
*Se realiza resane de filos en vanos de ventanas.
*Se realiza aplicación de revoque.








CPMS TULUÁ:
RANCHO ANTIGUO.
- El contratista ingreso materiales y personal para realizar correcciones y reparaciones por afloramientos de humedades en muros laterales externos.
- Limpieza y picada de muro externo para enchape de ceramica sobre muro
- Enchape de ceramica en muro lateral externo.






EPMSC - RM PASTO:
CELDAS RM * A la fecha no se ha realizado el arreglo de humedad en una de las celdas, se realizó recorrido con la supervisora Dayana Lancheros quien solicito al contratista la visita de un especialista hidráulico para determinar la causa de la humedad, cabe resaltar que la celda 1 está para entrega en la semana siguiente y la celda 2 una vez se solucione lo de la humedad se hará la entrega porque también se encuentra en un 95% de ejecución.
SANIDAD MUJERES *Este espacio esta en un 95% de ejecución se compromete el contratista terminar de pintura las rejas de las ventanas y se realizara la entrega del espacio la siguiente semana.
TALLERES * Se continua con la instalación puertas, arreglos menores y por solicitud del establecimiento sobre la colocación de una reja sobre los consultorios , no se ha podido terminar este espacio, se está a la espera de un oficio que se debe realizar por parte del establecimiento y con esto directamente la arquitecta Dayana Lancheros dará su respuesta.
CELDAS *En las celdas de patio 2 se continua con el mantenimiento de las puertas.
*Se continua con la actividad de instalación de las lámparas
PATIO 2 *Se continua con la actividad de demoliciones para la construcción de los baños comunes
*Se continua con el mantenimiento de la estructura de la teja existente.
CAPILLA* Se continua con la actividad de instalación de enchape.
*Se inicia con el mantenimiento a las ventanas existentes y se pintó todo el espacio
PATIO 3 *Se continua con la actividad de demolición de pisos y se inicia con las excavaciones para instalar tubería sanitaria.



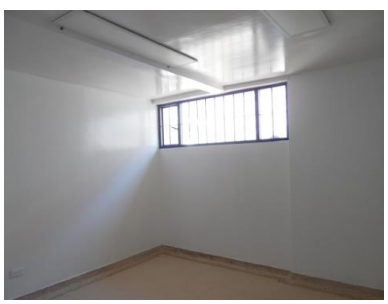







EPMSC TUMACO *El día viernes 11 de diciembre del presente año se realizo la visita final en compañía de la Arquitecta Dayana Lancheros como supervisora de la UPEC, el contratista, la interventoría y el establecimiento, dicha visita era con el fin de realizar la entrega final de los espacios completos, sin embargo en el recorrido a las zonas que se intervinieron se realizaron algunas observaciones por parte de la Arquitecta, las cuales el contratista se comprometió en realizarlas en un tiempo mínimo de 25 días, dichas subsanaciones están sujetas a la firma del acta final de entrega, por esta razón el contratista informara a la interventoría una ves termine la subsanación y ella procederá a realizar la visita y avalar las obras informando así a la supervisión para realizar la firma del documento (se anexa acta).

EPMSC TUQUERRES:
ALOJAMIENTO GUARDIAS *Se realizo las adecuaciones en los baños, se realiza la demolición de enchape existente, se resanaron los muros, se realizó levante de muro en mampostería y seguidamente se inició con la instalación de enchape.
RANCHO *Se inicio con la demolición de piso en la parte externa al rancho y se construyó la trampa de grasas






EPMSC IPIALES:
SANIDAD *El espacio ya se encuentra pintado y limpio, está pendiente la instalación de cajas, chapas y una puerta de bodega para la entrega formal.
GUARDIAS *Se continua con la aplicación de estuco y enchape.
AULAS *Se termino de instalar las llaves de paso y se inicia con la aplicación de estuco

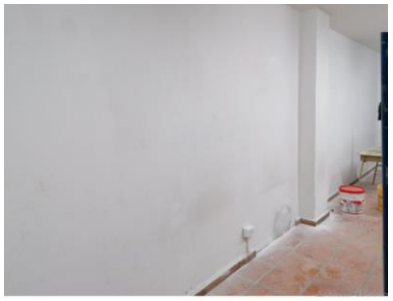


EPMSC LA UNION:
*Se instalo el enchape de piso y se continuo con la palicacion de estuco





EPAMS CAS ERE POPAYÁN:
CELDAS PRIMARIAS:
SE SOLICITA CAMBIO DE MANTO ASFALTICO POR HUMEDADES. (250 M2 APROX.)
PABELLÓN 8:
AMARRE DE ACERO PARA TAPAS FALTANTES.

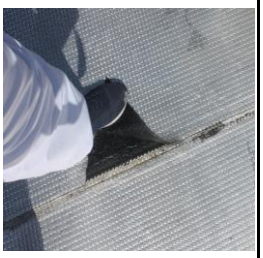


RM POPAYAN:Se esta terminando de conectar la tuberia a la caja exterior.







EPMSC PUERTO TEJADA
EN LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.

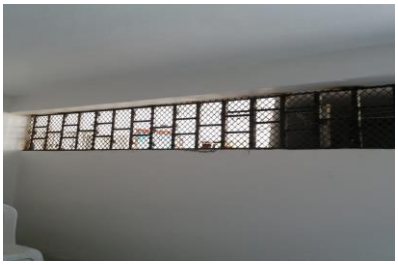




EPMSC SANTANDER QUILICHAO
(ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES).





EPMSC BOLÍVAR:
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Se esta realizando actividad de enchape de piso, zona de baño. Se soluciono el arreglo de filtración de agua.






EPMSC EL BORDO:
CELDAS COLECTIVAS: Se realiza corte de placa para cimentación. Falta pintura para terminar consultorio y realizar la entrega de sanidad.






EPMSC SILVIA:
TALLERES: Estan pendiente las puertas, ventana, malla IMT, baterias sanitarias y mejoramiento de piso.
BODEGA: Repello de muros.








EPAMS CAS JP PALMIRA:
- PATIO 7: Aplicacion de anticorrosivo balnco sobre laminas de celdas internas, y se inicia con pitura de estas en las primeras celdas
- PATIO 7: Retiro de rejas de seguridad de celdas para retiro de pintura, mantenimiento y aplicacion de pintura azul
- PATIO 7: Estuco de cuarto para cambio de personal medico o guardias inpec.
- PATIO 7: Pintura de placas metalicas de celdas en la nave 1.







EPAMS BUENAVENTURA:
- SANIDAD:
Contratista no ha coordinado el retiro del equipo de odontologia para retornar a realizar las adecuaciones en este espacio ademas del afloramiento de humedad por capilaridad en la mayoria de los muros por lo que se sospecha que puede ocurrir lo mismo que en rancho, se hara la exploracion de estos muros para determinar las obras a ejecutar.
- **AULAS EDUCATIVAS:**
Instalacion de sanitarios, lavamanos y duchas
Pintura de muros y cielos de aulas y pasillos
- RANCHO:
Se inicia la demolicion de toda el area de contrapiso de rancho debido a la aparicion de nivel freatico en la superficie de relleno de contrapiso
Construccion de caja de inspeccion






COJAM JAMUNDI:

PATIO 2:

- Cambio de valvulas defectuosas de lavamanos y sanitarios
- Mantenimiento de push de presion en celdas conyugales y ute
- Se realiza el cambio de tuberia sanitaria expuesta a intemperie que esta cristalizada
- Suministro e Instalacion de luminarias

PATIO 4:

- Se realiza actividad de Instalación de tubería sanitaria por fachada.
- Se realiza aplicación de pintura y recubrimiento en tuberia sanitaria instalada.
- Se realiza actividad de Instalacion de valvulas push de presion de duchas en utes.

NOTA: SE EXIGE A CONTRATISTA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE AREAS O ZONAS COVID, PUESTO QUE SE SE ESTA ENFOCANDO EN EL CAMBIO DE TUBERIA POR LA PARTE EXTERNA DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL PARA LOS CAMBIOS DE LOS PUSH DE PRESION, CONTRATISTA NOTIFICA QUE PROVEEDOR INFORMO QUE ESTAN EN PRODUCCION









EPMSC CAICEDONIA:

- AULA EDUCATIVA:

Se realizo el resane por afloramiento de humedad y se esta a la espera de que no reaparezca para realizar entrega al establecimiento. Se autorizo el enchape de muro a media altura por la parte externa ya que el muro esta expuesto a intemperie

- SANIDAD:

- Resanes en muros internos.
- Pintura epoxica de muros internos







EPMSC CARTAGO:

AULAS EDUCATIVAS

- Estuco en muros internos de aulas escolares
- Pintura sobre muros al interior de aulas
- Instalacion de perfileria para soporte de malla de seguridad.
- Instalacion de malla de seguridad en acero expandido








EPMSC SEVILLA:

RANCHO:

- Enchape en carima de muros internos
- Resanes, repellos, y estuco de muros

BIBLIOTECA:


- Estuco y pintura de muros internos
- Enchape de piso
- Mantenimiento de estructura metalica de cubierta
- Instalacion de teja termoacustica





EPMSC BUGA:
CELDAS PRIMARIAS
- Instalacion de tuberia sanitaria e hidraulica para baterias de baños
- Estuco en muros
- Construccion de pileta para lavamanos
- Banca en concreto reforzado

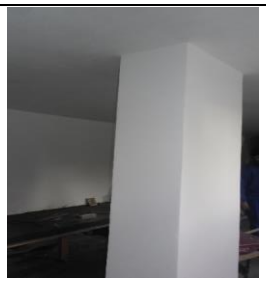

EPMSC BUENAVENTURA: Se evidencia que el afloramiento de nivel freatico se encuentra al mismo nivel superficial del piso, lo cual ocaciona que el material de relleno del contrapiso tenga exceso de humedad, lo cual genera socavacion y perdida en la compactacion, este fenomeno se presento en las zanjas excavadas donde se esta proyectando realizar el cambio de la tuberia sanitaria, por lo mencionado anteriormente se requiere definir el alcance que se dara a este espacio con el fin de no perjudicar al establecimiento y poder realizar un trabajo acorde a las necesidades de este.
Se realizan actividades en las áreas de Aulas educativas y Rancho.

COJAM JAMUNDI: Se detecta una fuga en la red de la tubería hidráulica del casino, debido a la emergencia se autoriza la intervención de este espacio para reparar los daños, vale la pena señalar que este espacio no estaba contemplado en el presupuesto por ser un imprevisto, por ende no tiene porcentajes de avance. El contratista se encuentra en la valoración de la intervención del área para anexar en el presupuesto.
Se realizan antividades en las áreas de Patio 2 y Patio 4.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se evidencia poco avance durante la semana debido a la falta de material en obra, no se han termino los trabajos en las dos (2) áreas intervenidas, Pabellon 8 y Celdas Primarias. Estan pendiente por por el suministro e intalación siete (7) tapas de cajas de exteriores en pabellon 8, las botoneras y las rejas en esclusas. En celdas primarias está pendiente por realizar la parte electrica y las botoneras.

RM POPAYAN: Se evidencia falta de material, el personal de obra manifiesta falta de pago por sus labores realizadas, se esta realizando la conexión en la parte exterior de la tuberia de aguas negras con la caja principal del alcantarillado.

EPMSC EL BORDO:
SANIDAD: Pendiente por entregar.
CELDAS EXTERIORES: Se realiza corte de piso para cimentación.

EPMSC SILVIA:
TALLERES: Se encuentra pendiente realizar el suministro y la instalación de las puertas y las ventanas, baterias sanitarias, reja IMT. Se recomienda mejorar el acabado del piso.
BODEGA: Pendiente por entregar.

EPMSC BOLÍVAR:
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Se esta realizando enchape de pisos. Se soluciono filtración de agua.

EPMSC SANTANDER QUILICHAO
*Aulas: Demolición de piso, retiro de escombros, enchape de baños, se solicita el cambio total de tuberia hidraulica y sanitaria. * Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%,ESTA SEMANA NO SE REALIZO ACTIVIDADES.

EPMSC PUERTO TEJADA
*Baño de Rancho: Se realiza demolición de enchape y enchape nuevo con tuberia hidrosanitaria.
* Biblioteca: Faltan puntos electricos, se realiza mantenimiento de la reja de ventana e instalación de malla imt. ESTA SEMANA NO SE REALIZO ACTIVIDADES
* Se recomienda resanar filos de columnas.

EPAMS CAS JP PALMIRA:
Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecución de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas eléctricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente eléctrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revisión y presentación de solución para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relación al desarrollo de la atención de la demanda, se solicito a contratista la intervención para instalar una ventana en el área bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellón 4.

CPMS TULUÁ:
Se presento una novedad con relación a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que debería instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, también se debe instalar una solapa metálica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el **EPMSC - RM PASTO:** Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

En el EPMSC - RM PASTO: Teniendo en cuenta el presente informe, hasta la fecha se observa que el atraso que se presenta es considerable y que no se está dando cumpliendo a lo estipulado en el plan de contingencia entregado por el contratista, los rendimientos no son los esperados y no se tiene un flujo continuo de material, adicionalmente se entrego los presupuestos ajustados sin embargo continua teniendo falencias y no se entregó una nueva programación por lo tanto no se puede realizar un buen seguimiento semanal.
Otro punto que se debe tener en cuenta es la visita de la Arquitecta Dayana Lancheros quien realiza un comite en el cual se llegaron a unos ocmpromisos los cuales se hara el seguiemiento para su cumplimiento (se anexa acta).

En el EPMSC TUMACO: El día viernes 11 de diciembre del año en cuero se realizo la visita final en compañía de la Arquitecta Dayana Lancheros como supervisora de la UPEC, el contratista, la interventoría y el establecimiento, dicha visita era con el fin de realizar la entrega final de los espacios completos, sin embargo en el recorrido a las zonas que se intervinieron se realizaron algunas observaciones por parte de la Arquitecta, las cuales el contratista se comprometió en realizarlas en un tiempo mínimo de 25 días, dichas subsanaciones están sujetas a la firma del acta final de entrega, por esta razón el contratista informara a la interventoría una ves termine la subsanación y ella procederá a realizar la visita y avalar las obras informando así a la supervisión para realizar la firma del documento (se anexa acta).

En el EPMSC - RM TUQUERRES: Teniendo en cuenta el presente informe se observa que el contratista presenta un gran atraso, los rendimientos en obra no son los esperados, dando como resultado el no cumplimiento al plan de contingencia entregado por el contratista por esta razón se le reitera al contratista el ingreso de más personal de manera inmediata y de tener continuo suministro de material, para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se solicita que se entregue una nueva reprogramación teniendo en cuenta el nuevo balance o presupuesto entregado.
Adicionalmente en la visita de la ingeniera Adriana Jimenes, se realizaron unos compromisos por parte de contratista los cuales no se han dado cumplimiento (registrado en acta) hasta la fecha.

En el EPMSC IPIALES: Teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en el informe, los rendimientos bajos y el no cumplimiento de lo estipulado en el plan de contingencia, se le reitera al contratista se tenga una disponibilidad continua de material, debido a que en el establecimiento le ha autorizado el ingreso a 6 espacio por lo cual se necesita un buen rendimiento para poder cumplir con todos.
Adicionalmente se solicita la entrega del nuevo cronograma o programación la cual este ajustada con el balance que se entregó.
Otro punto que se debe tener en cuenta es que en la visita de la ingeniera Adriana Jimenes, se realizaron unos compromisos por parte de contratista los cuales no se han dado cumplimiento (registrado en acta).

En el EPMSC - RM UNION: Teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en el informe, los rendimientos bajos y el no cumplimiento de lo estipulado en el plan de contingencia, se le reitera al contratista se tenga una disponibilidad continua de material, Teniendo en cuenta la programación que se cuenta de la Unión no coincide con el tiempo restante de acuerdo al contrato, por lo cual se solicita entregar una nueva reprogramación para poder realizar un seguimiento adecuado a las obras

De acuerdo con las reuniones sostenidas y las mesas de trabajo adelantadas, el contratista realizo la entrega de un nuevo presupuestos y cronogramas, basados en las actividades definidas en la información inicial suministrada por la USPEC y las condiciones encontradas en los establecimientos intervenidos el día miércoles 02 de septiembre del año en curso.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos presupuestales e inicio de actividades en todos los establecimientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_162 -RECIBO Y ESTADO DE LAS OBRAS EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC TUMACO-; Se solicta dar cierre y finalizar las obras en el establecimiento de Tumaco, hacer la correspondiente entrega y protocolizar el proceso de acuerdo a lo establecido contractualmente.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_164 -SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA – EJECUCIÓN- CONTRATO 140 DE 2020-; Se requiere al contratista presentar PLAN DE CONTINGENCIA para ejecución del contrato dentro de los plazos y montos establecidos contractualmente. Se evidencia un avance de obra semanal muy bajo, lo que genera preocupación con respecto al plazo de ejecución contractual, lo cual nos lleva a calcular que, bajo las condiciones actuales, de continuar el mismo comportamiento difícilmente estarán ejecutadas la totalidad de las actividades en todos los establecimientos y así mismo, agotados los recursos asignados al contrato.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_167 -OBSERVACIONES ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCIÓN - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita informar y/o manifestar la situación dada en cada establecimiento, las razones por las cuales las obras se encuentran paralizadas o ejecutadas a bajo ritmo y el suministro de los documentos requeridos junto con la disponibilidad en la implementación de las solicitudes COVID-19.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_169 -OBSERVACIONES CALIDAD DE OBRA EPMSC PUERTO TEJADA - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita al contratista reparar las observaciones mencionadas de manera imperiosa, así mismo, mejorar la calidad de los acabados e instalaciones y tomar medidas correctivas en los procesos constructivos ya que se ve comprometida la calidad y estabilidad de las obras, además de la disponibilidad del establecimiento en la entrega de áreas para el óptimo avance en la ejecución de los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_171 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas de los establecimientos EPMSC CARTAGO Y EPMSC SEVILLA.

SI BIEN EL SEGUIMIENTO SE ESTA REALIZANDO BASADOS EN LOS VALORES CALCULADOS Y PROYECTADOS POR EL CONTRATISTA PARA CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES, SE HA IDENTIFICADO QUE, LOS VALORES DEL DIAGNISTICO NO SON PRECISOS CONSIDERANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ÁREA. EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN UN ÁREA ESPECIFICA, SE CALCULA CON EL AVANCE REGISTRADO DE LAS OBRAS DURANTE LA SEMANA vs VALOR ANTES REFERENCIADO.

*Teniendo en cuenta el avance de las obras, la Interventoría ha solicitado de manera insistente que se tomen las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento del plazo contractual; por parte del contratista, se han presentado problemas de suministros de materiales e inusmos, pero paralelo con ello se ha visto afectada la ejecución de las obras por las condiciones inherentes al funcionmaiento de los centros penitenciarios.

*Por último, se informa que, mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_211 del día 08 de diciembre de 2020 con radicado No. R-2020-014934 y GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_215 del día 09 de diciembre de 2020 con radicado No. R-2020-015160, se solicitó ante la entidad USPEC la prorroga para terminación de los trabajos por dos (2) meses

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO
Directora Interventoría



Firma
