USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 31 DEL DÍA 18 MES 01 AÑO 2020 AL DÍA 24 MES 01 AÑO 2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC: CATALINA MEDINA HERNANDEZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión: N/A

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	6,3 meses Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	2 meses
Plazo Actualizado	8,3 meses
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	28 de febrero de 2021

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ 561.610.123
Valor Actualizado	$ 5.112.299.321
Plazo Inicial	6,3 meses Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	2 meses
Plazo Actualizado	8,3 meses
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	01 de marzo de 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	10,22%	28,69%
Valor del PAC Programado ($)	$ 1.322.623.616,88	$ 3.713.281.617,30

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	10,22%	28,69%
Valor del PAC Programado ($)	$ 1.322.623.616,88	$ 3.713.281.617,30

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

EPMSC ERE CALI	**PROGRAMADO SEMANAL**	**PROGRAMADO ACUMULADO**	**EJECUTADO SEMANAL**	**EJECUTADO ACUMULADO**
COLISEO				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 469.185.442	$ -	$ 469.185.442
SANIDAD (AREA DE FISIOTERAPIA Y TBC) $ 89.372.196,00				
Actividades Programadas (%)	7,81%	61,59%	2,00%	92,61%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.979.969	$ 55.044.336	$ 1.787.444	$ 82.767.591
TUNEL DE ACCESO A SANIDAD $ 80.533.118,00				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 80.533.118	$ -	$ 80.533.118
PATIO 10 $ 258.832.405,00				
Actividades Programadas (%)	5,56%	18,27%	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.391.082	$ 47.288.680	$ -	$ -

RM POPAYÀN	**PROGRAMADO SEMANAL**	**PROGRAMADO ACUMULADO**	**EJECUTADO SEMANAL**	**EJECUTADO ACUMULADO**
BODEGA EXTERIOR $ 182.121.141,00				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 182.121.141	$ -	$ 182.121.141
SANIDAD $ 9.164.202,00				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 9.164.202	$ -	$ 9.164.202

BODEGA	$ 12.415.369,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 12.415.369	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 12.415.369
RANCHO	$ 60.128.279,00					
Actividades Programadas (%)	3,85%	41,15%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	2,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.314.939	$ 24.742.787	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 1.202.566

EPAMS CAS ERE POPAYÁN					
	SEMANAL	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
PABELLON 8 (DESMANES)	$ 111.957.143				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	99,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 111.957.143	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 110.837.572
CELDAS PRIMARIAS	$ 279.988.062				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	98,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 279.988.062	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 275.788.241
EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)	$ 203.758.579				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 203.758.579	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 203.758.579
PABELLON 2 (DESMANES)	$ 185.941.463				
Actividades Programadas (%)	8,33%	26,90%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.488.924	$ 50.018.254	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PABELLON 4 (DESMANES)	$ 126.432.507				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS)	$ 35.330.288				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	97,23%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 35.330.288	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 353.303	$ 34.351.639
PABELLON 12 (DESMANES) - CUBIERTA	$ 188.518.451				
Actividades Programadas (%)	7,69%	30,77%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.497.069	$ 58.007.127	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 188.518.451

EPMSC PUERTO TEJADA					
	SEMANAL	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
BAÑO RANCHO	$ 5.196.492				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	90,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 5.196.492	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 4.676.843
	SEMANAL	ACUMULADO			
BIBLIOTECA	$ 29.984.511				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	90,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 29.984.511	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 26.986.060
RANCHO	$ 60.611.261				
Actividades Programadas (%)	7,14%	46,61%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	29,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.327.644	$ 28.250.909	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 17.577.266

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AISLAMIENTO (UTE)	$ 21.636.858				
Actividades Programadas (%)	14,29%	43,93%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.091.907	$ 9.505.072	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AULAS EDUCATIVAS	$ 96.333.459				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	52,62%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 96.333.459	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 50.690.666

EPMSC BOLÍVAR CAUCA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUDITORIO	$ 133.367.596				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	93,79%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 133.367.596	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 125.085.468
CONYUGALES UTE	$ 63.336.604				
Actividades Programadas (%)	5,26%	19,16%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.331.505	$ 12.135.293	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC EL BORDO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD	$ 32.909.779				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 32.909.779	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 32.909.779
CELDAS COLECTIVAS	$ 30.326.253				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 30.326.253	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 30.326.253
CELDAS PRIMARIAS	$ 25.839.150				
Actividades Programadas (%)	14,29%	47,90%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	39,22%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.692.415	$ 12.376.953	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 12.907.215
RANCHO	$ 82.818.186				
Actividades Programadas (%)	8,33%	27,28%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.898.755	$ 22.592.801	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC SILVIA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES	$ 36.435.423				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	97,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 36.435.423	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 35.342.360
BODEGA TALLERES	$ 3.187.230				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 3.187.230	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 3.187.230
BODEGA SANIDAD	$ 8.046.817				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 8.046.817	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 3.187.230
SANIDAD	$ 8.775.832				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 8.775.832	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

AMPLIACIÓN SANIDAD	$ 32.070.451					
Actividades Programadas (%)	14,20%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.554.004	$ 32.070.451	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
EPMSC - RM PASTO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
CAPILLA	$ 89.086.568,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	9,30%	90,10%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 89.086.568	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.285.051	$ 80.266.998	
TALLERES	$ 397.461.217,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	62,70%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 397.461.217	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 249.208.183	
CELDA 1 - RM	$ 21.473.392					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 21.473.392	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 21.473.392	
CELDA 2 - RM	$ 16.324.773					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	88,30%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 16.324.773	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 14.414.775	
PATIO 2 (EMERGENCIA)	$ 65.343.688					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,00%	98,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 65.343.688	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.960.311	$ 64.036.815	
CELDAS HOMBRES	$ 39.107.941					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 39.107.941	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.955.397	$ 39.107.941	
SANIDAD HOMBRES	$ 200.580.598					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 200.580.598	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO 5 Y 6	$ 277.254.177					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 277.254.177	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
SANIDAD MUJERES	$ 58.042.336					
Actividades Programadas (%)	8,33%	33,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	52,40%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.834.927	$ 19.345.511	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 30.414.184	
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3)	$ 33.809.914					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	15,40%	90,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 33.809.914	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.206.727	$ 30.428.923	
ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO	$ 25.942.744					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	10,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 3.380.991	
EMERGENCIA PATIO 4	$ 342.718.171					
Actividades Programadas (%)	8,33%	33,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	1,20%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 28.548.424	$ 114.227.966	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 4.112.618	
EPMSC TUMACO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
EDUCATIVAS	$ 198.988.490				$ 300.659.116,71	
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	90,80%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 198.988.490	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 180.681.549	
PATIO CENTRAL	$ 62.176.240					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 62.176.240	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 62.176.240	

PATIOS (DESMANES)	$ 92.746.485					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	50,39%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 92.746.485	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 46.734.954	
MURO EXTERIOR	$ 11.066.374					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 11.066.374	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 11.066.374	
EPMSC TUQUERRES	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES	$ 233.768.115				$ 158.058.521,146	
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	43,40%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 233.768.115	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.168.841	$ 101.455.362	
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	$ 98.197.644					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	$ 115.401.431					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,10%	35,80%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 115.401.431	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.577.444	$ 41.313.712	
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 121.642.050					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,10%	9,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.338.063	$ 10.947.785	
SANIDAD HOMBRES	$ 36.664.389					
Actividades Programadas (%)	7,69%	14,36%	Actividades Ejecutadas (%)	7,80%	7,80%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.819.492	$ 5.265.006	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.859.822	$ 2.859.822	
RANCHO	$ 46.307.503					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	3,20%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 1.481.840	
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	$ 160.220.935					
Actividades Programadas (%)	8,33%	22,62%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.346.404	$ 36.241.975	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	$ 76.843.598					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
EPMSC IPIALES	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES)	$ 216.167.719				$ 175.470.322,59	
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,10%	31,60%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 216.167.719	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 21.832.940	$ 68.308.999	
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	$ 148.217.753					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	15,40%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 148.217.753	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 22.825.534	
RECLUSORIO MUJERES	$ 129.064.593					
Actividades Programadas (%)	6,67%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.608.608	$ 25.812.919	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	$ 36.018.808					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,30%	44,70%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 36.018.808	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 828.433	$ 16.100.407	

PRIMARIAS	$ 117.541.723					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	6,90%	38,80%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 117.541.723	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.110.379	$ 45.606.189	
BAÑOS PATIOS	$ 279.956.057					
Actividades Programadas (%)	5,25%	18,89%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.697.693	$ 52.883.699	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
SANIDAD	$ 57.727.535					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	39,20%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 57.727.535	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 22.629.194	
RANCHO	$ 112.123.554					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
EPMSC LA UNION	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
SANIDAD	$ 106.655.228				$ 23.347.025	
Actividades Programadas (%)	4,55%	16,24%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.852.813	$ 17.320.809	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	$ 46.881.576					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	4,80%	49,80%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 46.881.576	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.250.316	$ 23.347.025	
AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	$ 50.399.271					
Actividades Programadas (%)	10,00%	22,36%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.039.927	$ 11.269.277	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
RANCHO	$ 42.476.595					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO COLECTIVO	$ 20.542.234					
Actividades Programadas (%)	8,33%	15,48%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.711.168	$ 3.179.938	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO	$ 13.519.222					
Actividades Programadas (%)	10,00%	18,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.351.922	$ 2.478.073	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO COMÚN BATERÍA	$ 42.440.317					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
EPMSC TULUA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
RANCHO ANTIGUO	$ 140.143.499					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,63%	84,850%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 140.143.499	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 882.904	$ 118.911.759	
PABELLON 6	$ 15.595.903					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 15.595.903	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 15.595.903,0	
PABELLON 7	$ 11.262.583					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 11.262.583	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 11.262.583,0	

EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7	$ 386.208.686				
Actividades Programadas (%)	2,89%	91,82%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	80,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 11.161.431	$ 354.616.815	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 19.310.434	$ 312.442.827
PABELLON No 4	$ 105.731.591				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	97,950%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 105.731.591	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 103.564.093
EPMSC BUENAVENTURA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
AULAS EDUCATIVAS	$ 143.132.032				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	89,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 143.132.032	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.431.320	$ 127.673.773
SANIDAD	$ 171.531.486				
Actividades Programadas (%)	6,85%	69,35%	Actividades Ejecutadas (%)	2,35%	14,95%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 11.749.907	$ 118.957.086	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.030.990	$ 25.643.957
AISLAMIENTO MUJERES	$ 42.432.237				
Actividades Programadas (%)	10,00%	55,18%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.243.224	$ 23.414.108	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 90.610.246				
Actividades Programadas (%)	5,75%	66,01%	Actividades Ejecutadas (%)	6,50%	33,550%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.210.089	$ 59.811.823	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.889.666,0	$ 30.399.738
REDES ELECTRICAS	$ 104.459.837				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE	$ 26.510.628				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 45.113.987				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
COJAM JAMUNDI	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
PATIO 5	$ 151.430.305				
Actividades Programadas (%)	3,70%	7,20%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.602.921	$ 10.902.982	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO 2-UTE Y CONYUGALES	$ 273.317.964				
Actividades Programadas (%)	4,20%	77,59%	Actividades Ejecutadas (%)		19,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 11.479.354	$ 212.067.408	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 52.203.731,1
PATIO 3-UTE Y CONYUGALES	$ 344.229.661				
Actividades Programadas (%)	6,25%	56,29%	Actividades Ejecutadas (%)		13,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 21.514.354	$ 193.766.876	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 45.094.085,6
PATIO 4-UTE Y CONYUGALES	$ 292.045.460				
Actividades Programadas (%)	3,70%	38,5%	Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	33,58%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.805.682	$ 112.466.707	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.301.136,5	$ 98.068.865,5
GARITAS Y TRINCHERAS	$ 96.828.303				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 96.828.303	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA	$ 13.214.834				$ 80.506.283,8
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,0000%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 13.214.834	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 13.214.834
AULA EDUCATIVA	$ 39.058.025				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	99,85%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 39.058.025	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 38.999.438
SANIDAD	$ 28.491.452				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,0000%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	99,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 28.491.452	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 28.292.012
EPMSC CARTAGO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
AULAS EDUCATIVAS	$ 141.145.561				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,0000%	Actividades Ejecutadas (%)	3,50%	84,46%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 141.145.561	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.940.094,6	$ 119.211.540,8
PATIO 4	$ 78.825.272				
Actividades Programadas (%)	5,29%	39,85%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.169.857	$ 31.411.871	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC SEVILLA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
RANCHO	$ 23.838.150				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,50%	97,45%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 23.838.150	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 834.335,3	$ 23.230.277,2
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)	$ 36.587.412				
Actividades Programadas (%)	8,33%	26,91%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.047.731	$ 9.845.673	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
BIBLIOTECA	$ 59.675.771				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,50%	79,25%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 59.675.771	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.088.652,0	$ 47.293.048,5
SANIDAD	$ 23.624.972				
Actividades Programadas (%)	6,51%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,0%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.537.986	$ 23.624.972	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO 4 (BAÑO)	$ 12.885.805				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	97,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 12.885.805	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 12.499.230,9
EPMSC BUGA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
CUARTO HOSPITALIZACION SANIDAD	$ 34.172.663				
Actividades Programadas (%)	5,00%	17,3%	Actividades Ejecutadas (%)	0,30%	99,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.708.633	$ 5.905.036	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 102.518,0	$ 34.070.145,0
ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS	$ 22.139.552				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARIAS	$ 45.470.556				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 45.470.556	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2	$ 11.116.793				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7	$ 2.852.892				
Actividades Programadas (%)	18,18%	72,73%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 518.656	$ 2.074.908	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	0	0	0	0	0	0	0
RM POPAYAN	0	0	0	0	0	0	0
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	8	8	8	8	8	0	40
EPMSC TUMACO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	8	8	8	8	8	0	40
EPMSC IPIALES	8	8	8	8	8	0	40
EPMSC LA UNIÓN	8	8	8	8	8	0	40
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC EL BORDO	0	0	0	0	0	0	0
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SEVILLA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CAICEDONIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUGA	8	8	8	8	8	5	45
CPMS TULUÁ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CARTAGO	0	0	0	8	8	5	21

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
PABELLON No 8	0,00%	0,00%	100,00%	99,00%	-1,00%	No se ha realizado entrega de esta zona. Esta pendiente la instalación de dos rejas de esclusa y 25 iluminarias en celdas. (No se estan realizando actividades).
CELDAS PRIMARIAS	0,00%	0,00%	100,00%	98,50%	-1,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias). Esta pendiente terminar parte electrica y botoneras. Se finaliza cambio de manto asfaltico.
EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realizo el cambio de la tuberia exterior en pabellon No. 8. En su totalidad. Se entrego en un 100%
PABELLON 2 (DESMANES)	8,33%	0,00%	26,90%	0,00%	-26,90%	La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de -26,90%. (redes electricas).
PABELLON 4 (DESMANES)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021
PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS)	0,00%	1,00%	100,00%	97,23%	-2,77%	La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de -2,77% (redes electricas). Esta pendiente realizar la adecuaciion de tablero principal
PABELLON 12 (DESMANES)-CUBIERTA	7,69%	0,00%	30,77%	100,00%	69,23%	Se termino reparación de cubierta en fibrocemento. Se encuentra pendiente por entregar.
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA (EXTERIOR)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Area entregada, solucionado manejo de aguas lluvias. Se entrego en un 100%
SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
BODEGA	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
RANCHO	3,85%	0,00%	41,15%	2,00%	-39,15%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento en la entrega del área por parte del contratista de obra.
EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	0,00%	9,30%	100,00%	90,10%	-9,90%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Capilla).
TALLERES	0,00%	0,00%	100,00%	62,70%	-37,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Talleres). El área presenta un atraso de -37,30% con respecto a programación de obra.
CELDA 1 - RM	0,00%	0,00%	100,00%	95,00%	-5,00%	Se realizo la entrega del espacio sin embargo está pendiente un repello en la parte exterior, cabe aclarar que la parte interna todo se encuentra a satisfacción.
CELDA 2 - RM	0,00%	0,00%	100,00%	88,30%	-11,70%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM). El área presenta un atraso de -11,70% con respecto a programación de obra.
PATIO 2 (EMERGENCIA)	0,00%	3,00%	100,00%	98,00%	-2,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en Patio 2 (novedad). El área presenta un atraso de -2,00% con respecto a programación de obra.
CELDAS HOMBRES	0,00%	5,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance celdas (motín). Se entrega área en 100%.

SANIDAD HOMBRES	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad hombres. No se ha iniciado intervención en el área, por lo cual presenta un atraso de -100% respecto a programación de obra.
PATIO 5 Y 6	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance patios. No se ha iniciado intervención en el área, por lo cual presenta un atraso de -100% respecto a programación de obra.
SANIDAD MUJERES	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3)	0,00%	15,40%	100,00%	90,00%	-10,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en zona comun patios. El área presenta un atraso de -10,00% con respecto a programación de obra.
ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento en la entrega del área por parte del contratista de obra.
EMERGENCIA PATIO 4	8,33%	0,00%	33,33%	1,20%	-32,13%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en emergencia patio4. El área presenta un atraso de -32,13% con respecto a programación de obra.
EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	0,00%	0,00%	100,00%	90,80%	-9,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Educativas).
PATIO CENTRAL	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
PATIOS (DESMANES)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
MURO EXTERIOR	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
EPMSC TUQUERRES						
ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES	0,00%	0,50%	100,00%	43,40%	-56,60%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Bodega). El área presenta un atraso de -56,60% con respecto a programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	0,00%	3,10%	100,00%	35,80%	-64,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres - RM). El área presenta un atraso de -64,20% con respecto a programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	0,00%	1,10%	0,00%	9,00%	9,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Alojamiento guardias).
SANIDAD HOMBRES	7,69%	7,80%	14,36%	7,80%	-6,56%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de sanidad hombres . El área presenta un atraso de -6,56% con respecto a programación de obra.
RANCHO	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	3,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance de obra para el area de rancho.
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	8,33%	0,00%	22,62%	0,00%	-22,62%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos hombres. El área presenta un atraso de -22,62% con respecto a programación de obra.
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021
EPMSC IPIALES						
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES)	0,00%	10,10%	100,00%	31,60%	-68,40%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres). El área presenta un atraso de -68,40% con respecto a programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	0,00%	0,00%	100,00%	15,40%	-84,60%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aulas). El área presenta un atraso de -84,60% con respecto a programación de obra.
RECLUSORIO MUJERES	6,67%	0,00%	20,00%	0,00%	-20,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (reclusorio mujeres). El área presenta un atraso de -20,00% con respecto a programación de obra.
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	0,00%	2,30%	100,00%	44,70%	-55,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (vigilantes). El área presenta un atraso de -55,30% con respecto a programación de obra.
PRIMARIAS	0,00%	6,90%	100,00%	38,80%	-61,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas Primarias). El área presenta un atraso de -61,20% con respecto a programación de obra.
BAÑOS PATIOS	5,25%	0,00%	18,89%	0,00%	-18,89%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance baños patios. El área presenta un atraso de -18,89% con respecto a programación de obra.
SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	39,20%	-60,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en la zona de sanidad. El área presenta un atraso de -60,80% con respecto a programación de obra.
RANCHO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021
EPMSC LA UNIÓN						
SANIDAD	4,55%	0,00%	16,24%	0,00%	-16,24%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad. No se han iniciado actividades en el área. El área presenta un atraso de -16,24% con respecto a programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	0,00%	4,80%	100,00%	49,80%	-50,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Colectivas Especiales). El área presenta un atraso de -50,20% con respecto a programación de obra.

AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	10,00%	0,00%	22,36%	0,00%	-22,36%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Aislamiento guardias y UT). El área presenta un atraso de -22,36% con respecto a programación de obra.
RANCHO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021
PATIO COLECTIVO	8,33%	0,00%	15,48%	0,00%	-15,48%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de Patio Colectivo. El área presenta un atraso de -15,48% con respecto a programación de obra.
ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO	10,00%	0,00%	18,33%	0,00%	-18,33%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de Alojamiento Guardias. El área presenta un atraso de -18,33% con respecto a programación de obra.
PATIO COMÚN BATERÍA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021
COJAM JAMUNDÍ						
CASINO	3,70%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Una vez se tenga el presupuesto de actividades ejecutadas por el contratista de obra, se realizara el reporte de avance de terminacion dado que todas las actividades en este espacio ya se ejecutaron, se atendio como emergencia.
PATIO 5 (RED GENERAL HIDRAULICA)	24,18%	15,70%	24,18%	15,70%	-8,48%	No se han continuado con las actividades por la falta de material en cuanto a tuberia de presion para el cambio en redes. El área presenta un atraso de -8,48% con respecto a programación de obra.
PATIO 2-UTE Y CONYUGALES	4,20%	0,00%	77,59%	19,10%	-58,49%	Se trabajo en ute y pabellones en cuanto al cambio de valvulas para sanitarios y lavamanos, ademas se realizo el mantenimiento de valvulas de duchas, cambio de luminarias en la parte externa y pintura epoxica en duchas. El área presenta un atraso de -58,49% con respecto a programación de obra.
PATIO 3 -UTE Y CONYUGALES	6,25%	0,00%	56,29%	13,10%	-43,19%	Se esta adelantando la instalacion de acometidas electricas con cableado nuevo dado el deficiente estado en el que esta el sistema en ute. El área presenta un atraso de -43,19% con respecto a programación de obra.
PATIO 4- UTE Y CONYUGALES	3,70%	2,50%	38,51%	33,58%	-4,93%	S realiza aplicación de pintura epoxica en duchas de conyugales y en ute. El área presenta un atraso de -4,93% con respecto a programación de obra.
GARITAS Y TRINCHERAS	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de 100%.
EPMSC BUENAVENTURA						
EDUCATIVAS	0,00%	1,00%	100,00%	89,20%	-10,80%	Esta pendiente por suministrar e instalar las puertas para baños, terminar de pintar muros y cielos, se espera que tratamiento de humedades aplicado sirva para realizar entrega. El área presenta un atraso de -10,80% con respecto a programación de obra.
SANIDAD	6,85%	2,35%	69,35%	14,95%	-54,40%	Se retomaron las actividades en sanidad donde se esta retirando la pintura y pañetes de muros debido a las afectaciones por humedades, a se aplicara pañetes impermeabilizados, estuco y pintura epoxica. El área presenta un atraso de -54,40% con respecto a programación de obra.
AISLAMIENTO MUJERES	10,00%	0,00%	55,18%	0,00%	-55,18%	Por directriz de la USPEC, esta area no se intervendra ya que hace parte del alcance de otro contrato proximo a ejecutarse con otra entidad. El área presenta un atraso de -55,18% con respecto a programación de obra.
RANCHO	5,75%	6,50%	66,01%	33,55%	-32,46%	Demolicion de contrapisos existentes, retiro de tuberia sanitaria de piso, modificaciones de tuberia hidraulica, excavaciones para construccion de filtro tipo frances.El área presenta un atraso de -33,46% con respecto a programación de obra.
REDES ELECTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021
AISLAMIENTO GUARDIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ENTREGADO
SANIDAD (ZONA DE FISIOTERAPIA Y TBC)	7,81%	2,00%	61,59%	92,61%	31,02%	Se esta realizando, Estuco de paredes, pintura epoxica y acabados de muros en drywall. Pisos y tuberia de aguas lluvias.
TUNEL DE ACCESO A SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ENTREGADO
PATIO 10	5,56%	0,00%	18,27%	0,00%	-18,27%	No se han iniciado actividades. Retrasos en la entrega de las otras areas. El área presenta un atraso de -18,27% con respecto a programación de obra.
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AISLAMIENTO (UTE)	14,29%	0,00%	43,93%	0,00%	-43,93%	No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de -43,93% en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).

AULAS EDUCATIVAS	0,00%	0,00%	100,00%	52,62%	-47,38%	(No se estan realizando actividades). el área presenta un atraso de -47,38% en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
EPMSC EL BORDO						
SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregado
CELDAS COLECTIVAS	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregado celdas 1, 2 y 3.
CELDAS PRIMARIAS	14,29%	0,00%	47,90%	39,22%	-8,68%	Cimentación, tuberia sanitarial, muros. Esta semana no se realizo actividades.
RANCHO	8,33%	0,00%	27,28%	0,00%	-27,28%	No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de -27,28% en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	2,89%	5,00%	91,82%	80,90%	-10,92%	Se esta realizando la limpieza y pintura de las rejas de las celdas, continua la pintura de muros y cielos internos de celdas. Construccion Modulos para malla eslabonada para instalacion en cielo
PABELLON No 4	0,00%	0,00%	100,00%	97,95%	-2,05%	Se esta terminando de realizar los tratamientos para humedades en las losas de cubierta de escalera y cocina del pabellon 4. NO se ejecuto obrra esta semana.el área presenta un atraso de -2,05% en la programación de obra.
EPMSC BOLÍVAR						
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO	0%	0%	100%	94%	6%	Se inicio actividades en la area de educativas (Auditorio), Pintura de muros, acabados. Esta semana no se ha realizado actividades.
CONYUGALES UTE	5%	0%	19%	0%	-19%	No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de -19% en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
EPMSC SEVILLA						
RANCHO.	0%	4%	100%	97%	-3%	Se ha realizado enchape con fichas de granito pulido en piso, enchapes de ceramica, repellos y estucos en muros. Esta pendiente por llegar teja para cambio en cubierta
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)	8%	0%	27%	0%	-27%	No se ha iniciado porque no se ha entregado el área de la biblioteca
BIBLIOTECA	0%	4%	100%	79%	-21%	Se ha realizado actividad de instalación de estucos, aplicación de pinturas e instalación de enchapes en muros, Mantenimiento y adicion de estructura metalica para cubierta, cambio de tejas termoacusticas, enchape en ceramica de pisos, instalacion de malla en acero expandido en cielo
SANIDAD	7%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de 100% en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
PATIO 4	0%	0%	100%	97%	-3%	Se instalaron los sanitarios, lavamanos y duchas, se termino de realizar enchapes y pinturas
EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Adecuaciones entregadas al establecimiento para uso.
AULA EDUCATIVA	0,00%	0,00%	100,00%	99,85%	-0,15%	Se reparo muro por afloramiento de humedad y se esta a la espera de que no se presente esta novedad para entregar. Se auotorizo el enchape a media altura de muro por la parte externa ya que esta expuesto a intemperie.
SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	99,30%	-0,70%	Se realizo el tratamiento de humedad en muro de fachada y se instalo un lavatraperos que estaba al interior de sanidad
EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	0,00%	0,00%	100,00%	90,00%	-10,00%	Se entrego, con la observación de mejorar aparatos eléctricos y tapa de motobomba. (No se estan realizando actividades).Por lo tanto no se reporta el 100% hasta no ser subsanadas las observaciones
BIBLIOTECA	0,00%	0,00%	100,00%	90,00%	-10,00%	Esta pendiente la observación de instalar malla IMT y arreglo de puntos eléctricos. (No se estan realizando actividades). Por lo tanto no se reporta el 100% hasta no ser subsanadas las observaciones
RANCHO	7,14%	0,00%	46,61%	29,00%	-17,61%	Se esta realizando pega de enchape y estuco.
EPMSC BUGA						
CUARTO HOSPITALIZACIÓN SANIDAD	5%	0%	17%	99,70%	82,42%	Se esta terminando de realizar los enchapes de piso y enchapes en muros y pisos de duchas y baños, pinturas y la construccion de una pileta de lavamanos
ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS	0%	0%	0%	0%	0,00%	No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021
ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARÍAS	0%	0%	100%	0%	-100,00%	No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de 100% en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021

ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7	18,18%	0%	73%	0%	-72,73%	No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de --72,73% en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
CPMS TULUÁ						
RANCHO ANTIGUO	0,00%	0,63%	100,00%	84,85%	-15,15%	Contratista esta realizando el retiro de enchapes en los baños de patios en el pabellon 8 dado que humedad en rancho interno volvio a aflorar, ademas se autorizo realizar enchape en muro externo sobre pasillo de comunicación en rancho por humedades
PABELLON No. 6	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	YA SE ENTREGO A ESTABLECIMIENTO
PABELLON No. 7	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	YA SE ENTREGO A ESTABLECIMIENTO
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	No se intervendra por el contrato, por no presencia de PPL, ni requerimientos.
EPMSC SILVIA						
TALLERES	0%	0%	100%	97%	-3,00%	Se espera la instalación de carpinteria metalica, para hacer entrega de esta area.
BODEGA 2 TALLERES	0%	0%	100%	100%	0%	ENTREGADA.
BODEGA SANIDAD	0%	0%	100%	100%	0%	ENTREGADA.
SANIDAD	0%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado actividades, presentan un atraso de 100% de acuerdo a la programación de obra.
AMPLIACIÓN SANIDAD	14%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado actividades, presentan un atraso de -100% de acuerdo a la programación de obra.
EPMSC CARTAGO						
AULAS EDUCATIVAS	0%	4%	100%	84%	-16%	Instalacion de malla de seguridad en acero expandido en cielos de aulas educativas, adecuaciones electricas, estucos y pinturas de muros, enchape de piso y cielo falso en pvc de cuarto medico. Se presenta atraso en las actividades del área.
PATIO 4	5%	0%	40%	0%	-40%	Direccion de establecimiento no entregara esta area hasta tanto no se defina el cerramiento del patio de aulas educativas y que el contratista entrege obras ejecutadas. Se presenta atraso en las actividades del área.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI: ZONA DE FISIOTERAPIA Y TBC

* Se realiza Instalación de estructura para la instalación del cielo raso en PVC.
*Se realiza tendido de tuberia conduit para cableado eléctrico.
* Se realiza la instalación de tuberia IMT para conducción de cable hasta tomas e interruptores.
* Se realiza instalación de cielo raso en PVC.
* Se realiza instalación de luminarias redondas de 18W.
*Se realiza regatas para sistema sanitario.
*Se realiza instalación de tubería para bajantes de aguas lluvias.
*Se realiza resane de filos en vanos de ventanas.
*Se realiza aplicación de revoque.






CPMS TULUÁ:

RANCHO ANTIGUO.

- Pañetes en muros de duchas en baños del patio 8
- Afinado de nivelacion para contrapiso en baños del patio 8
- Enchapes en piso y paredes en ceramica de baños de patio 8

NOTA: SE SOLICITÓ A CONTRATISTA LA INCORPORACION DE MAS PERSONAL PARA TERMINAR ADECUACIONES ADICIONALES PARA CONTRARESTAR EFECTOS DE HUMEDADES.








EPMSC - RM PASTO:
CELDAS RM * En la celda numero 2 hasta la fecha no se ha realizado el arreglo de humedad en una de las celdas, se solicitó al contratista la visita de un especialista hidráulico para determinar la causa de la humedad
TALLERES * Se está a la espera de que las mallas para su instalación y cabe resaltar que se le solicito al contratista realizar una revisión de presiones en los baños, adicionalmente se hace claridad que le contratista se comprometió a entregar este espacio hasta el 31 de enero del 2021 para así poder iniciar la intervención de sanidad hombres.
CELDAS *Se termino el aseo final y se hizo entrega de este espacio (se anexa acta de entrega).
PATIO 2 *Se continua con la instalación de rejas, aplicación de pintura en la zona de corredor.
CAPILLA* Se continua con la actividad de instalación de enchape y lavamanos antivandálicos.
PATIO 3 *Se continua con el levante de muro de mampostería e instalación de tubería hidráulica.
En la semana se realizo la entrega por parte del Establecimiento al Contratista de 3 espacios más, los cuales se inician a intervenir la semana que viene, los espacio que se inician a intervenir son, Rancho y Patio 4, Sanidad se iniciara el 1 de febrero siempre y cuando hasta esa fecha el espacio de taller se encuentre al 100%.






EPMSC TUMACO *El día viernes 11 de diciembre del año en curso se realizo la visita final en compañía de la Arquitecta Dayana Lancheros como supervisora de la UPEC, el contratista, la interventoría y el establecimiento, dicha visita era con el fin de realizar la entrega final de los espacios completos, sin embargo en el recorrido a las zonas que se intervinieron se realizaron algunas observaciones por parte de la Arquitecta, las cuales el contratista se comprometió en realizarlas en un tiempo mínimo de 25 días, dichas subsanaciones están sujetas a la firma del acta final de entrega, por esta razón el contratista informara a la interventoría una ves termine la subsanación y ella procederá a realizar la visita y avalar las obras informando así a la supervisión para realizar la firma del documento, cabe aclarar que hasta la fecha no se han realizado las subsanacioones.

EPMSC TUQUERRES:
RECLUSORIO MUJERES *Se finaliza con la instalación de enchape de pared, de piso y la instalación de sanitarios y lavamanos
ALOJAMIENTO GUARDIAS * Se finaliza con la instalación de enchape de piso e instalación de los sanitarios y lavamanos.
AILAMIENTO COVID 1 BODEGA *Se instalo el techo y se inicia la instalación de la malla con varilla de ½"

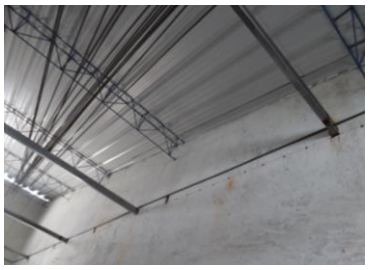




EPMSC IPIALES:
ALOJAMIENTO GUARDIAS *Se finalizo con la instalación del enchape de pared de los baños internos y seguidamente se realizó la instalación de los aparatos sanitarios.
AULAS Y TALLERES *Se continua con la instalación de enchape de piso.
*Se continúa con la aplicación de pintura
PRIMARIAS *Se continua con la aplicación de pintura e instalación de enchape de piso.








EPMSC LA UNION:
*Se continua con el enchape de piso y pared, se continuo con la aplicacion de estuco, pintura e instalacion de cielo raso en PVC, Se solicito al contratista revisar la humedad que presenta un muro.






EPAMS CAS ERE POPAYÁN:
CELDAS PRIMARIAS:
NO SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES.
PABELLÓN 8:
NO SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES.
PABELLON 11: NO SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES.
PABELLON 12: POR ENTREGAR.






RM POPAYAN: No se estan realizando actividades.





EPMSC PUERTO TEJADA
RANCHO:NO SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES. SE RECOMIENDA RETIRO DE ESCOMBROS. No se tiene material en obra.
QUEDA PENDIENTE LAS ADECUACIONES PENDIENTES EN BAÑO Y BIBLIOTECA. YA QUE SE ESTA DETERIORANDO LA OBRA.








EPMSC SANTANDER QUILICHAO
No se estan realizando actividades, se recomienda seguir el cronograma de actividades ya que algunas actividades que falta por realizar afectaran las ya realizadas. Se requiere personal y materiales, revisar humedad de baños ha aula educativa. Se solicita realizar el diagnóstico de la red eléctrica del establecimiento.





EPMSC BOLÍVAR:
ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.







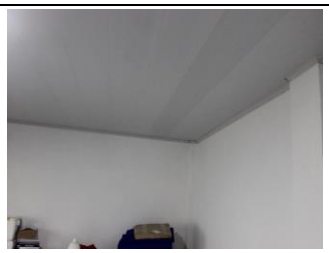
EPMSC EL BORDO:
CELDAS COLECTIVAS: ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.






EPMSC SILVIA:
TALLERES: Esta semana no se realizaron actividades. Falta de puertas y ventanas.
BODEGA: Entregado.

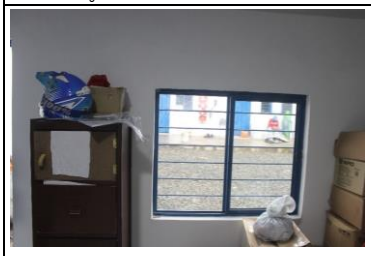





EPAMS CAS JP PALMIRA:
- PATIO 7: No ha llegado divisiones en acero para baños, contratista argumenta que proveedor tiene retrasos en la entrega y que ya se cancelo parte del trabajo con este por lo que es muy dificil cambiar de empresa proveedora
- PATIO 7: Construccion de marcos metalicos para modulos de malla eslabonada a instalar en el cielo dle pasillo de las celdas de la nave 1 del patio
- PATIO 7: Continua la pintura de rejas de celdas y de paneles metalicos por la parte interna.







EPAMS BUENAVENTURA:
- SANIDAD:
Panetes en muros y estucos en muros y cielo internos
- **AULAS EDUCATIVAS:**
Limpieza definitiva
- RANCHO:
Exvacaciones para instalacion de filtro tipo frances
Demoliciones de contrapiso y enchapes de piso









COJAM JAMUNDI:
BLOQUE 2:
- Se movilizo personal a bloque 4 para terminar adecuaciones para entrega
PATIO 3:
- Se movilizo personal a bloque 4 para terminar adecuaciones para entrega
PATIO 4:
- Se realiza actividad de Instalacion de valvulas push de presion de duchas en utes.
- Pintura epoxica en duchas de baños en ute y conyugales
- Cambio de tuberia cristalizada o dañada
- Instalacion de tuberia emt y cableado electrico
NOTA: SE EXIGE A CONTRATISTA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE AREAS O ZONAS COVID, PUESTO QUE SE SE ESTA ENFOCANDO EN EL CAMBIO DE TUBERIA POR LA PARTE EXTERNA DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL PARA LOS CAMBIOS DE LOS PUSH DE PRESION, CONTRATISTA NOTIFICA QUE PROVEEDOR INFORMO QUE ESTAN EN PRODUCCION







EPMSC CAICEDONIA:
- AULA EDUCATIVA:
Se esta esperando que no aparezcan nuevos afloramientos de humedades para enttegar
- SANIDAD:
- Se esta esperando que pintura y resanes sequen para revision y entrega


EPMSC CARTAGO:
AULAS EDUCATIVAS
- Instalacion de malla de seguridad en acero expandida en vanos de ventanas de aulas escolares
- Repello en muros de aulas deteriorados o afectados por humedades





EPMSC SEVILLA:
RANCHO:
- Pañetes area de almacenamiento, baños
- Estuco y pintura de muros
- Media Caña Piso
BIBLIOTECA:
- Enchapes baños y pisos
- Instalacion de cielo falso en pvc mas luminarias




EPMSC BUGA:
CELDAS PRIMARIAS
- Constuccion de cerramiento para tablero de energia
- Dilataciones en meson
- Pintura Epoxica muros
- Mantenimiento de reja de seguridad








EPMSC BUENAVENTURA: Se evidencia que el afloramiento de nivel freatico se encuentra al mismo nivel superficial del piso, lo cual ocaciona que el material de relleno del contrapiso tenga exceso de humedad, lo cual genera socavacion y perdida en la compactacion, este fenomeno se presento en las zanjas excavadas donde se esta proyectando realizar el cambio de la tuberia sanitaria, por lo mencionado anteriormente se requiere definir el alcance que se dara a este espacio con el fin de no perjudicar al establecimiento y poder realizar un trabajo acorde a las necesidades de este.
Se realizan actividades en las áreas de Aulas educativas y Rancho.

COJAM JAMUNDI: Se detecta una fuga en la red de la tubería hidráulica del casino, debido a la emergencia se autoriza la intervención de este espacio para reparar los daños, vale la pena señalar que este espacio no estaba contemplado en el presupuesto por ser un imprevisto, por ende no tiene porcentajes de avance. El contratista se encuentra en la valoración de la intervención del área para anexar en el presupuesto.
Se realizan antividades en las áreas de Patio 2 y Patio 4.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: No se tiene material en obra, no se tiene personal. Pendiente por entregar patio 8 y celdas primarias. Retrasos considerables.

RM POPAYAN: No se estan realizando actividades, no se tiene material ni personal en el establecimiento se solicito reunión el dia 25 de diciembre con dirección al contratista.

EPMSC EL BORDO: No se tiene personal ni material en obra. Se recomienda iniciar con las actividades, Solucionar humedad ne colectivo 2.
SANIDAD: Entregado.
CELDAS EXTERIORES: En esta semana no se ha realizado actividades.

EPMSC SILVIA: No se tiene personal ni material en obra.
TALLERES: En esta semana no se ha realizado actividades.
BODEGA: zona entregada.

EPMSC BOLÍVAR:
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2)
AUIDOTORIO: Se esta realizando enchape de gradas y pintura de paredes.

EPMSC SANTANDER QUILICHAO
*Aulas: No se estan realizando actividades, se solicita mas personal y material en obra, seguir el cronograma de trabajo ya que se estan realizando actividades que se veran afectatas con las que se va a realizar. Mejorar acabados de baños.

EPMSC PUERTO TEJADA: No se esta realizando actividades se solicita personal y materiales en obra.
*Baño de Rancho: Mejorar puntos electricos, Tapa de bomba.
* Biblioteca: Faltan puntos electricos, se realiza mantenimiento de la reja de ventana e instalación de malla imt.
* Se recomienda resanar filos de columnas.
RANCHO: En esta semana no se ha realizado actividades.

EPAMS CAS JP PALMIRA:
Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecución de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas eléctricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente eléctrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revisión y presentación de solución para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relación al desarrollo de la atención de la demanda, se solicito a contratista la intervención para instalar una ventana en el área bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellón 4.

CPMS TULUÁ:
Se presento una novedad con relación a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que debería instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, también se debe instalar una solapa metálica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el EPMSC - RM PASTO: Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

En el EPMSC - RM PASTO: Teniendo en cuenta el presente informe, hasta la fecha se observa que el atraso que se presenta es considerable y que no se está dando cumpliendo a lo estipulado en el plan de contingencia entregado por el contratista, los rendimientos no son los esperados y no se tiene un flujo continuo de material.
Hasta la fecha no se cuenta con la programación y el balance ajustados los cuales deben ser entregados por el contratista para así nosotros como interventoría realizar un seguimiento más detallado y certero.
El día dieciocho (18) de enero del 2021 se realizó recorrido en compañía del personal del establecimiento, Interventoría y contratista, por los 3 espacios que fueron entregados por el Establecimiento al Contratista, Rancho y Patio 4 para que dé inicio a las intervenciones de manera inmediata y Sanidad hombres para dar inicio el 1 de febrero del 2021 una vez se entregue talleres en un 100%. (se anexa acta)

En el EPMSC TUMACO: El día viernes 11 de diciembre del año de 2020 se realizo la visita final en compañía de la Arquitecta Dayana Lancheros como supervisora de la UPEC, el contratista, la interventoría y el establecimiento, dicha visita era con el fin de realizar la entrega final de los espacios completos, sin embargo en el recorrido a las zonas que se intervinieron se realizaron algunas observaciones por parte de la Arquitecta, las cuales el contratista se comprometió en realizarlas en un tiempo mínimo de 25 días, dichas subsanaciones están sujetas a la firma del acta final de entrega, por esta razón el contratista informara a la interventoría una ves termine la subsanación y ella procederá a realizar la visita y avalar las obras informando así a la supervisión para realizar la firma del documento.

En el EPMSC - RM TUQUERRES: En el presente informe se observa que el contratista presenta un atraso considerable, los rendimientos en obra no son los esperados, dando como resultado el no cumplimiento al plan de contingencia entregado, por esta razón se le reitera al contratista tomar las medidas necesarias para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se solicita dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad.
Hasta la fecha no se cuenta con la programación y el balance ajustados los cuales deben ser entregados por el contratista para así nosotros como interventoría realizar un seguimiento más detallado y certero.

En el EPMSC IPIALES: En el presente informe se observa que el contratista presenta un atraso considerable, los rendimientos en obra no son los esperados, dando como resultado el no cumplimiento al plan de contingencia entregado, por esta razón se le reitera al contratista tomar las medidas necesarias para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se solicita dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad.
Hasta la fecha no se cuenta con la programación y el balance ajustados los cuales deben ser entregados por el contratista para así nosotros como interventoría realizar un seguimiento más detallado y certero.

En el EPMSC - RM UNION: En el presente informe se observa que el contratista presenta un atraso considerable, los rendimientos en obra no son los esperados, dando como resultado el no cumplimiento al plan de contingencia entregado, por esta razón se le reitera al contratista tomar las medidas necesarias para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se solicita dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad.
Hasta la fecha no se cuenta con la programación y el balance ajustados los cuales deben ser entregados por el contratista para así nosotros como interventoría realizar un seguimiento más detallado y certero.
Adicionalmente el establecimiento manifiesta una gran preocupación porque ya existen varios contagios y debido a que no se cuenta con un lugar de aislamiento adicional porque el establecimiento es muy reducido el Director manifiesta que una vez se aumenten los casos no tendrá espacio para el debido aislamiento, por esta razón se le ha solicitado de manera urgente al contratista dar celeridad en este espacio.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos presupuestales e inicio de actividades en todos los establecimientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_162 -RECIBO Y ESTADO DE LAS OBRAS EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC TUMACO-; Se solicta dar cierre y finalizar las obras en el establecimiento de Tumaco, hacer la correspondiente entrega y protocolizar el proceso de acuerdo a lo establecido contractualmente.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_164 -SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA – EJECUCIÓN- CONTRATO 140 DE 2020-; Se requiere al contratista presentar PLAN DE CONTINGENCIA para ejecución del contrato dentro de los plazos y montos establecidos contractualmente. Se evidencia un avance de obra semanal muy bajo, lo que genera preocupación con respecto al plazo de ejecución contractual, lo cual nos lleva a calcular que, bajo las condiciones actuales, de continuar el mismo comportamiento difícilmente estarán ejecutadas la totalidad de las actividades en todos los establecimientos y así mismo, agotados los recursos asignados al contrato.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_167 -OBSERVACIONES ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCIÓN - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita informar y/o manifestar la situación dada en cada establecimiento, las razones por las cuales las obras se encuentran paralizadas o ejecutadas a bajo ritmo y el suministro de los documentos requeridos junto con la disponibilidad en la implementación de las solicitudes COVID-19.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_169 -OBSERVACIONES CALIDAD DE OBRA EPMSC PUERTO TEJADA - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita al contratista reparar las observaciones mencionadas de manera imperiosa, así mismo, mejorar la calidad de los acabados e instalaciones y tomar medidas correctivas en los procesos constructivos ya que se ve comprometida la calidad y estabilidad de las obras, además de la disponibilidad del establecimiento en la entrega de áreas para el óptimo avance en la ejecución de los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_171 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.- , se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas de los establecimientos EPMSC CARTAGO Y EPMSC SEVILLA.
SI BIEN EL SEGUIMIENTO SE ESTA REALIZANDO BASADOS EN LOS VALORES CALCULADOS Y PROYECTADOS POR EL CONTRATISTA PARA CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES, SE HA IDENTIFICADO QUE, LOS VALORES DEL DIAGNISTICO NO SON PRECISOS CONSIDERANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ÁREA. EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN UN ÁREA ESPECIFICA, SE CALCULA CON EL AVANCE REGISTRADO DE LAS OBRAS DURANTE LA SEMANA vs VALOR ANTES REFERENCIADO.
*Teniendo en cuenta el avance de las obras, la Interventoría ha solicitado de manera insistente que se tomen las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento del plazo contractual; por parte del contratista, se han presentado problemas de suministros de materiales e inusmos, pero paralelo con ello se ha visto afectada la ejecución de las obras por las condiciones inherentes al funcionmaiento de los centros penitenciarios. **Avance Fisico Acumulado 36,54% Correspondiente a un valor de $4.445.571.926** **Avance Financiero Acumulado de 28,69% Correspondiente a un valor de $3.713.281.617,30**
*Se suscribe prorroga al Contrato Obra 140-2020 celebrado entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios "USPEC" y el Consorcio MTO ERON 2020 mediante Otro Si N°4, el cual establece en la "CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGAR: El plazo de ejecución del contrato de obra No. 140 de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. De acuerdo a la prorroga mencionada en el Otro Si, se le solicita al contratista realizar los respectivos ajustes a las programaciones de los centros penitenciarios de acuerdo al nuevo plazo de ejecución del contrato. *Se suscribe prorroga y adicción al Contrato Obra 129-2020 celebrado entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios "USPEC" y GNG Ingeniería SAS mediante Otro Si N°1, el cual establece en la "CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGAR: El plazo de ejecución del contrato de obra No. 129 de 2020 hasta el 01 de fmarzo de 2021 y en la "CLÁUSULA SEGUNDA – ADICIONAR un valor de $ 561.610.123 M/CTE.
* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_237 -CONMINACIÓN POR PARALIZACIÓN DE OBRAS, AUSENCIA DE PERSONAL Y FALTA DE INSUMOS Y MATERIALES, EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CONTRATO 140 de 2020- adiado del 28 de diciembre de 2020, se requeire al contratista (i) informar el cronograma de entregas, de acuerdo con la programación recibida para el trámite y suscripción de Otrosí No 4; (ii) exponer los mecanismos y acciones de mejora a implementar, para dar cumplimiento al objeto del contrato dentro del plazo vigente, considerando objetivamente que, de acuerdo con lo evidenciado a la fecha y bajo lo dispuesto hasta el momento, difícilmente se logrará la inversión total de los recursos asignados a este contrato; (iii) entregar un balance real que permita definir el avance porcentual preciso de ejecución de las obras; deja esta interventoría expresa constancia que, durante el desarrollo del contrato se ha identificado que, los valores establecidos en la matriz de seguimiento no corresponden a lo realmente invertido por áreas y establecimientos; (iv) suministrar un cronograma por establecimiento ajustado al plazo actual vigente del contrato y (v) incluir dentro del cronograma las fechas de entrega de las actividades que se registran "sin intervenir" o que no registran fechas de entrega; sin a la fecha recibir ninguna información.
LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO Directora Interventoría Liliana Sánchez Firma
